INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
No. 1914, MUNICIPIO DE COROZAL- DEPARTAMENTO DE SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	**Coordenadas geográficas:** **9°19´31.86´´Latitud Norte** **75°17´02.19´´Longitud Oeste** Número de Matrícula Inmobiliaria: 342-24084 No. Catastral: N°70215000100000001089600000000 Calle 40 # 34 -826 Salida de Corozal hacia el municipio de Los Palmitos, con frente hacia la carretera troncal margen derecho, a 700m antes de la entrada del Aeropuerto Las Brujas de Corozal.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO COROZAL – DEPARTAMENTO SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.952.556.111,07
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$2.447.914.327,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$16.400.470.438,07
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/08/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ.		
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2022VFE001	18/07/2022	DD/MM/AAAA

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 240-00046	31/01/2024	DD/MM/AAAA
	No. 240-00107	27/02/2024	DD/MM/AAAA
	No. 240-00129	12/03/2024	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000022350	16/12/2022 - 1/07/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	ADICION UNO (1)		FECHA: 28/12/2023
	ADICION DOS (2)		FECHA: 22/03/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/07/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 663.023.252,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.810.385.620,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA según otro si #4	15.161.952.856,69		
VALOR INTERVENTORÍA según otro si #2	$1.810.385.620,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la	NO APLICA	21/02/2024	$5.944.059.397

	entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. Perfeccionamiento de la modificación de la adición B. Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. C.	NO APLICA	11/03/2024	$2.064.437.318 ,07

	Cronograma del convenio actualizado.			
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$4.755.247.517
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto	100%	DD/MM/AAAA	$1.188.811.879

	avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$ 8.008.496.715,07**
TOTAL DESEMBOLSOS MUNICIPIO DE COROZAL				**$2.447.914.327**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) cuenta municipio				$ **10.632.113.397,19**
Pago 15% anticipo contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23. Cuenta de Ahorros No. 11100001656			02/02/2024	$1.625551.024,11
Pago saldo15% anticipo contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23 Cuenta de Ahorros No. 11100001656.			02/02/2024	$138.391.743,00
Pago de acta parcial No. 1. Contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23. Cuenta Ahorros 11100001378			20/03/2024	$563.568.320,90
Pago de acta parcial No. 1. Contrato de obra CM- AM- CS -001 – 01 -23. Cuenta Ahorros 11100001378			09/04/2024	$397.813.951,00
Pago de acta parcial No. 2. Contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23. Cuenta Ahorros 11100001378			17/05/2024	$1.444.641.832,95
Pago de acta parcial No. 2 Contrato de Consultoría CM- AM – CS – 001 -01 – 23. Cuenta de Ahorros No. 11100001656.			31/05/2024	$120.090.999,00
Pago de anticipo 15% adición No. 2. Contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23. Cuenta Ahorros 11100001378			01/08/2024	$309.716.205,76
Pago de acta parcial No. 3. Contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23. Cuenta Ahorros 11100001378			27/08/2024	$817.628.244,70
Pago de acta parcial No. 3 Contrato de Consultoría CM- AM – CS – 001– 01 -23. Cuenta de Ahorros No. 11100001656.			07/11/2024	$67.943.559,00
Pago saldo acta parcial No. 3 Contrato de Consultoría CM- AM – CS – 001– 01 -23. Cuenta de Ahorros No. 11100001656			26/12/2024	$161.965.447,00
Pago acta parcial No. 4. Contrato de Obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23. Cuenta Ahorros 11100001378.			2/12/2024	$3.411.810.584,15

Pago saldo acta parcial No. 4. Contrato de Obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23. Cuenta Ahorros 11100001378.	02/12/2024	$398.466.672,95
Pago de acta parcial No. 4 Contrato de Consultoría CM-AM – CS – 001 -01 – 23. Cuenta de Ahorros No. 11100001656.	26/12/2024	$275.723.265,47
Pago saldo acta parcial No. 4 Contrato de Consultoría CM- AM – CS – 001– 01 -23. Cuenta de Ahorros No. 11100001378	29/12/2024	$113.757.823,47
Pago acta parcial No. 5 del contrato CM – AM – CS 001 – 01 – 2023. Cuenta de Ahorros No. 11100001378.	09/04/2025	$41.110.409,76
Pago acta parcial No. 5 del contrato L – AM – CS – 001 – 01 – 23.Cuenta de Ahorros No. 11100001378.	16/05/2025	$532.325.056,97
Pago acta parcial No. 5. Contrato de Obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23. Cuenta Ahorros 11100001656	16/05/2025	$211.608.257,00
Saldo Cuenta Ahorros 11100001378 Convenio + rendimientos financieros con corte 30/06/2025	30/06/2025	**$1.308.647,98**
Saldo Cuenta Ahorros Municipio 11100001656 con corte 30/06/2025	30/06/2025	**$426.260.376,68**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000022350	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	28/09/2022	1/07/2025

Según PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE - OTROSÍ No. 01

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000022350	Cumplimiento	$ 1.640.047.043,80	28/09/2022	1/07/2025

Observación: Anexo 1 de póliza expedido el día 09/01/2024, aprobada por el Ministerio del Interior el día 15/01/2024.

Según SEGUNDA ADICIÓN Y PRÓROGA 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000022350	Cumplimiento	1.702.047.043,80	28/09/2022	01/07/2025

Observación: Anexo 2 de póliza de cumplimiento expedido el día 24/01/2025 correspondiente a la segunda adición al convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1914 de 2022 según otro sí No. 2.

Anexo 3 de póliza de cumplimiento expedido el día 27/01/2025 correspondiente a la segunda adición al convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1914 de 2022 según ajuste según otro si No. 2.

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: L-AM-CS-001-01-23	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	$12.575.307.132
Etapa del proceso	Teniendo en cuenta los atrasos sustanciales del avance de la obra por parte del Consorcio EP-C, durante los comités de seguimiento, ha sido reiterativo el requerimiento	

	por parte del Ministerio del Interior hacia el municipio de Corozal, respecto a la adopción de acciones administrativas por parte de la supervisión, en razón a los atrasos de las actividades de ejecución, luego del reinicio 2 de fecha 12 de mayo de 2025, por lo que el contratista ha venido incumpliendo el cronograma establecido, pese a los compromisos acordados para el ajuste al plan de trabajo. En este sentido, la supervisión ha requerido al señor alcalde municipal y a la Secretaria Jurídica y Asuntos Contractuales mediante oficio 0304/SPM-2025.	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	29/12/2023	$ 350.000.000,00
	11/03/2024	$ 2.064.777.686,07
Nombre contratista	CONSORCIO EP-C identificado con el Nit: 901.694.070-1, representado legalmente por JESUS DAVID DURAN ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 15.679.759 de Planeta Rica.	
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA / DD/MM/AAAA	
	Otro si (1) / 29/12/2023	
	Otro si (2) / 22/03/2024	
	Otro si (3) / 05/11/2024	

	Otro sí (4)	26/12/2024	
	SUSPENSIÓN	18/08/2023	
	REINICIO	29/01/2024	
	SUSPENSIÓN DOS	10/04/2025	
	REINICIO 2	12/05/2025	$171.530651,62
Fecha de terminación del contrato	**31/08/2025**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 15.161.952.856,69
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**		
PÓLIZA No.	15 - 44 -101277891		
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	31/03/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1	25/04/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2	25/04/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3	13/06/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4	10/01/2024		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5	29/02/2024		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 6	01/03/2024		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 7	10/0/2024		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 8	10/05/2024		

FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 9	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 10	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 12	09/01/2025
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 13	21/05/2025
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 14	21/05/2025
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 15	09/06/2025
FECHA DE LA PÓLIZA DE RCE ANEXO 0	31/03/2023
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE RCE ANEXO 1	31/03/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 2	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 3	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 3	13/06/2023
PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 4	13/06/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 5	10/01/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 6	29/02/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 7	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 8	10/05/2024

FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 9	21/05/2025
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 10	09/06/2025

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CM-AM-CS-001-01-23	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 1.410.385.620
Etapa del proceso	El contrato de obra se encuentra en ejecución conforme al acta de reinicio No. 3 de fecha 12 de mayo de 2025. Actualmente representa un avance de actividades acumulado del 70,35 % según informe semanal No. 88 con corte del 23 al 29 de junio de 2025. No obstante, su ejecución sigue presentando un retraso del 5, 28% de acuerdo al cronograma de trabajo del contrato de obra y retrasos sustanciales respecto al cronograma del Ministerio del Interior, por lo que el municipio de Corozal ha solicitado una nueva adición en tiempo al convenio interadministrativo 1914 de 2022. Se realizó entrega del plan de compras y del plan de	

	contingencia para mitigar los retrasos en el avance y evitar la imposición de sanciones administrativas por parte del municipio por presunto incumplimiento al objeto contractual, tal como lo solicitó la interventoría según el último informe semanal de avances del mes de junio de 2025.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	26/12/2024		$ 400.000.000,00
	26/12/2024		$ 1.810.385.620,00
Nombre contratista	CONSORCIO I – POLICE identificado con el NIT 901.694.067-9, representado legalmente por OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.007.801.563 de Sahagún		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA Otro sí (1)	DD/MM/AAAA 05/11/2024	
	Otro si (2)	26/12/2024	
	SUSPENSIÓN	18/08/2023	
	REINICIO	29/01/2024	
	SUSPENSION	10/04/2025	
	REINICIO 2	12/05/2025	
Fecha de terminación del contrato	**31/08/2025**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.810.385.620
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	15-44-101277693		
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	27/03/2023		

FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1	13/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4	15/06/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5	29/02/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 6	01/03/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 11	24/01/2025

4. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**x**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

5. RESUMEN TECNICO DE AVANCE DE ACTIVIDADES EN OBRA.

Las actividades ejecutadas de acuerdo con los módulos y espacios de trabajo en el periodo del presente informe son las siguientes:

- Alfagías en concreto
- Estuco en piso 1
- Gabinetes y Bombas de red contra incendios
- Instalación de puertas y ventanas
- Pisos en granito piso 1 y piso 2
- Figuración, armado y fundición de parqueadero frontal

5.1. MAMPOSTERÍA Y PAÑETES:

- Mampostería bloque 1 y 2 piso 3.
- Pañete sobre muros en bloque 1 y 2 piso 3
- Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac

5.2. SISTEMA ELECTRICO

- Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 3

5.3. VIGUETAS DE COLUMNETAS.

- Armado, figurado encofrado y fundida de viguetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3.

5.4. REDES DE REFRIGERACION

- Suministro e Instalación de Red de refrigeración para equipos de aire acondicionado.
- Instalación de aires acondicionados

6. RESUMEN JURIDICO

Los retrasos en el avance de las actividades de ejecución de la obra siguen siendo sustanciales, según los informes semanales de avance y visita en obra, ésta representa un 5,28% de atraso conforme al informe semanal #88 con fecha de corte 23 al 29 de junio de 2025, a través de los cuales la interventoría ha insistido en el incumplimiento del contratista de obra respecto al plan de compras.

Dada esta situación, en el comité de seguimiento del 18 y 19 de junio de 2025, se solicitó al contratista la entrega del plan de contingencia y el plan de compras, como medidas para mitigar los atrasos sustanciales presentes.

Así mismo, la supervisión solicitó al Ministerio del Interior nueva prorroga al convenio por dos meses a partir de la fecha de terminación del contrato de obra, dados los retrasos de la obra y la imposibilidad de realizar su entrega en la fecha estipulada en el contrato.

7. INFORME DEL SUPERVISOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**75,63%**
% EJECUTADO DE OBRA	**70,35%**

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Las actividades administrativas desarrolladas por la supervisión del municipio en el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2025, en el marco de la ejecución del convenio suscrito entre el Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior Fondo para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON, son las siguientes:

- El 3 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, envió correo informando sobre la reprogramación de la visita presencial debido a la falta de documentos de balance y memorias de mapeo correspondientes a la ejecución del 60% de la obra.

- El 4 de junio de 2025, el Consorcio I Police envió información subsanada conforme a las observaciones realizadas por la supervisión del municipio, en relación a: semanales de avance No. 82 y 83, mensual de interventoría No. 15, acta parcial No. 6, registro fotográfico y certificado de avances.

- El 5 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió oficio 399/SPM- 2025, a través del cual solicitó la actualización de pólizas conforme a las actas modificatorias No. 5 de obra y acta No. 3 del contrato de interventoría, carta de interventoría del mes adicional, informe semanal de interventoría 84 y 85, y

la subsanación de informe mensual de interventoría de abril de 2025 y del acta parcial 6 conforme a observaciones realizadas.

- El 5 de junio de 2025, se llevó a cabo comité de seguimiento virtual convocado por el Ministerio de Interior.

- El 10 de junio de 2025, el Consorcio I pólice envió correspondencia CIP- V1 – 2025 – 087 a través de la cual manifiestan el atraso de ejecución de actividades en obra por falta de suministro del contratista de obra.

- El 10 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió citación a comité de supervisión al coronel Aimer Alonso Triana, comandante del Departamento de Policía de Sucre, para los días 18 y 19 de junio de 2025.

- El 10 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió correspondencia 0414/SPM- 2025, a los consorcios I Police y EPC citando a comité de seguimiento presencial durante la visita programada para los días 18 y 19 de junio por parte del Ministerio del Interior.

- El 10 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, envió citación a comité de seguimiento virtual para el día 12 de junio de 2025, para realizar seguimiento a los compromisos y verificar los documentos de soporte del avance del 60%.

- El 11 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, envió requerimiento por presunto incumplimiento de obligaciones del convenio No. 1914 de 2022, por parte del municipio en relación a la no remisión del cronograma de ejecución de los contratos derivados, cronograma del convenio conforme a las actas de reinicio del 12 de mayo de 2025, el informe mensual de mayo del PIGA, certificado de pago de parafiscales, informe financiero del mes de mayo, actualización de información en el SECOP I y II, informes semanales de avance, extractos bancarios y soportes para el cobro de la cuenta 3 del convenio.

- El 11 de junio de 2025, la supervisión del municipio, envió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, información financiera correspondiente al mes de abril de 2025, con los respectivos soportes financieros de los pagos realizados con recursos del Ministerio del Interior.

- El 12 de junio de 2025, el Consorcio I Police, envió requerimiento al contratista de obra mediante oficio CIP – V1- 2025 – 090, por el atraso de actividades de obra.

- El 12 de junio de 2025, el Consorcio I Police envió a la supervisión del municipio, informes semanales 84 y 85.

- El 12 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió comunicación 0426/SPM-2025 al Consorcio I Police en la cual se solicita las subsanaciones al acta parcial 6.

- El 12 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, información financiera correspondiente al mes de abril de 2025, conforme a las observaciones realizadas.

- El 12 de junio de 2025, la supervisión del municipio, envió correspondencia 0420/SPM-2025, al Consorcio I Police en la cual se le solicita corrección de las fechas en pólizas e informes de interventoría.

- El 13 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió a la tesorera Julieth Duque Linero, solicitud de subsanación de la información financiera reportada en el mes de abril de 2025.

- El 13 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió correspondencia al alcalde municipal y a la Secretaria Jurídica del municipio de Corozal, solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de obra.

- El 13 de junio de 2025, la supervisión del municipio, envió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, informe semanal No. 85, informe mensual de implementación del PIGA correspondiente al mes de mayo de 2025.

- El 14 de junio de 2025, el Consorcio I Police realizó remisión del certificado de avances y acta parcial No. 6 subsanada.

- El 16 de junio de 2025, la supervisión del municipio envió información financiera del periodo 2024 – 2025, correspondiente a la ejecución de recursos del Convenio y los soportes de pagos de actas parciales.

- El 16 de junio de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior, envió citación al Consorcio I Police y EP-C para el comité de seguimiento presencial a realizarse los días 18 y 19 de junio de 2025.

- El 16 de junio, la supervisión del municipio, envió correspondencia al alcalde municipal y a la secretaria Jurídica y de Asuntos Contractuales, de citación al comité de seguimiento presencial a realizarse los días 18 y 18 de junio de 2025.

- El 16 de junio de 2025, el Consorcio I Police, remitió el informe semanal de avances No. 86.

- El 16 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, envió citación a comité de seguimiento presencial convocado para las los días 18 y 19 de junio de 2025.

- El 17 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, envió solicitud de cumplimiento de compromisos relacionada con el suministro de información de minutas de obra e interventoría, informes mensuales de obra e interventoría, informe de inspección RETIE y RETILAB, cronograma de obra y acta parcial del 60% de avance de actividades.

- El 17 de junio de 2025, el Consorcio I Police, envió correspondencia CEP – V1 – 2025 – 024 y acta de visita RETIE.

- El 17 de junio de 2025, la supervisión del municipio, envió al Consorcio I Police correspondencia 0433/SPM – 2025, a través de la cual reitera el cumplimiento de compromisos relacionados con la entrega de información pendiente.

- El 17 de junio de 2025, se llevó a cabo comité de seguimiento virtual convocado por el Ministerio del Interior.

- los días 18 y 19 de junio de 2025, se llevó a cabo comité de seguimiento presencial y visita a la obra por parte de la supervisión del Ministerio del Interior.

- El 18 de junio de 2025, el Consorcio I Police realizó la entrega de informes semanales de avance No. 82, 83, 84, 85 y 86 subsanados conforme a las observaciones realizadas por la supervisión.

- El 18 de junio de 2025, la supervisión del municipio, envió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, informe de visita RETIE e informe semanal No. 83 subsanado.

- El 19 de junio de 2025, el Consorcio I Police remitió incapacidad médica de interventoría.

- El de junio de 2025, la supervisión del municipio remitió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, acta de comité presencial y asistencia de visita del Ministerio del Interior.

- El 19 de junio de 2025, el Consorcio I Police envió los informes semanales de avance No. 82, 83, 84, 85 y 86 subsanados conforme a las observaciones realizadas por la supervisión.

- El 20 de junio de 2025, el Consorcio I Police remitió oficio sobre seguridad social del mes de mayo de 2025.

- El 20 de junio de 2025, la supervisión del municipio remitió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, informes semanales de avance No. 82. 83, 84, 85 y 86.

- El 24 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, envió citación a comité de seguimiento virtual.

- El 24 de junio de 2025, se llevó a cabo comité de seguimiento virtual para evaluar los compromisos acordados durante la visita presencial realizada por la supervisión del Ministerio del Interior.

- El 24 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, remitió correo con las observaciones al informe financiero del mes de abril de 2025.

- El 26 de junio de 2025, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, solicitó a la supervisión del municipio, registro fotográfico de avances desde el 19 de junio a la fecha.

- E 26 de junio de 2025, la supervisión del Municipio solicitó al Consorcio I Police, la remisión del registro foto gráfico según oficio 0458/SPM- 2025.

- El 27 de junio de 2025, la supervisión del municipio, remitió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, acta de reinicio No. 1 del contrato de obra y acta de reinicio del contrato de interventoría.

- El 27 de junio de 2025, se remitió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, registro fotográfico de avances del 19 de junio al 27 de junio de 2025.

- El 27 de junio de 2025, el Consorcio I pólice remitió el informe mensual de interventoría No. 16 correspondiente a la ejecución del mes de mayo de 2025.

RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente el contrato de obra se encuentra ejecución según acta de reinicio No. 2 de obra e interventoría, el cual sigue registrando un retraso del 5,28% conforme al informe semanal No. 88 con corte del 23 al 29 de junio de 2025, mismo en el cual la interventoría solicita al contratista de obra la entrega del plan de contingencia y del plan de compras, a fin de mitigar el incremento en el retraso de la obra.

Teniendo en cuenta los retrasos en el avance y el próximo vencimiento del Convenio Interadministrativo, se solicitó al Ministerio del Interior la extensión de prorroga al Convenio por dos meses a partir de la fecha de terminación del contrato de obra, para poder dar cumplimiento en la entrega de la obra en la presente vigencia fiscal.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Las actividades en obra se han venido ejecutando según plan de trabajo y cronograma del contratista de obra, siguiendo la secuencia lógica de las actividades constructivas las cuales son necesarias para poder continuar las actividades programadas dentro del cronograma de actividades del convenio, tales como instalaciones de acabados, mampostería y pañetes e instalaciones eléctricas en cocina, baños, etc.

8. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
08/02/2023	18/01/2024	22/02/2024	30/04/2024	29/05/2024	30/06/2024
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
31/07/2024	26/09/2024	10/10/2024	18/06/2025	19/06/2025	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

9. SUPERVISOR

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO Alcalde Municipal	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ** Secretaria de Planeación Municipal Supervisora

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Ing. Civil Samira Lara Díaz	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

REPROGRAMACIÓN DE VISITA DE VERIFICACIÓN CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 3 de junio de 2025, 7:30 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisora Convenio No. 1914-2022
Municipio de Corozal

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Reprogramación Visita de Verificación

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto (...)*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE "(...),* se informa al Municipio de Corozal que la visita programada para el 5 y 6 de junio de 2025 fue reprogramada teniendo en cuenta que ala fecha no se ha remitido por parte del Municipio los balances y memorias de mapeo que soporten la ejecución del 60%, documentos necesarios para adelantar la visita programada por parte del Ministerio del Interior.

Por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, solicitan se remita la información indicada de manera inmediata que permita verificarla y programar la fecha de la visita.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ENTREGA DE INFORMACIÓN PERTINENTE

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, <consorcioepc23@gmail.com>
Cc <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-04 4:28 pm

OFICIO CIP-V1-2025-085.pdf (~166 KB) INFORME SEMANAL COROZAL 82.xlsx (~3,6 MB) INFORME SEMANAL COROZAL 83.xlsx (~6,4 MB)
Flujo de caja por Actividad - (Cronograma de obra fin Julio 2025).xlsx (~612 KB) INFORME DE CUADRILLAS.pdf (~201 KB)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CORTE 30 MAYO 2025.pdf (~5,5 MB) CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA.pdf (~3,1 MB)

Corozal, Sucre, 04 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCR

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA N° 15 - 2025.pdf
ACTA N° 6 60,01%.xlsx
E".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de información pertinente según observaciones.

Cordial saludo,

Mediante el presente, la Interventoría en virtud de sus funciones y cumpliendo a cabalidad con la información requerida por la secretaria de Planeación Municipal de Corozal, se hace entrega de los siguientes documentos:

1. Informe semanal de avance de interventoría N° 82 y N° 83.
2. Informe mensual de interventoría N° 15, corte mes de abril de 2025.
3. Cronograma de obra julio 2025.
4. Informe de cuadrillas.
5. Acta N°6 remitida por el Consorcio EP-C con las respectivas memorias de cantidades.
6. Registro fotográfico de avance de obra con corte de 30 de mayo de 2025.
7. Certificado de avance de obra, 60.01%.

Oficio 0399/SPM-2025

Corozal, junio 5 de 2025.

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

Con copia,

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Ministerio del Interior

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior

REFERENCIA: Contrato de Obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Solicitud de información pendiente y observaciones al acta parcial.

Cordial saludo:

En cumplimiento de los compromisos acordados en el pasado comité de seguimiento virtual llevado a cabo el día 26 de mayo de 2025, me permito solicitar de manera urgente la siguiente información:

1. Actualización de pólizas según acta modificatoria No. 5 del contrato de obra y acta modificatoria No. 3 del contrato de interventoría.
2. Carta de interventoría para el mes adicional según lo manifestado por el contratista en el comité de seguimiento.

3. Informe semanal de avance de interventoría No. 84 y 85.
4. Informe mensual de obra e interventoría correspondiente al mes de mayo de 2025.

De igual manera se reitera la remisión del informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.

Respecto al acta parcial No. 6, correspondiente al 60% de ejecución de actividades en obra, se remiten las siguientes observaciones:

- Ítems 17.61,18.06, 18.07 y 18.08, las memorias de cantidades no coinciden con el valor acumulado en el Acta No. 6.
- La memoria de cantidad del ítem 17.67 no está anexa en el archivo del Acta.
- Las memorias de cantidades no contienen fotografías que evidencien la ejecución de la actividad.
- Las memorias de cantidades de los ítems 4.15, 19.01, 19.02 y 19.03 no contiene mapeo de imágenes de referencia, ni registro fotográfico.

Es preciso manifestar que, las demoras en el reporte de información por parte de la interventoría, repercute en el trámite que desde la supervisión se haga al Ministerio del Interior para efectos del tercer desembolso correspondiente al 60% del avance según el cronograma de actividades, máxime cuando nos encontramos a menos dos meses de terminar el convenio.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – Apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0415/SPM-2025

Corozal, junio 10 de 2025.

Coronel
AIMER FREDY ALONSO TRIANA
Comandante Departamento de Policía de Sucre

ASUNTO: Citación comité de seguimiento virtual Convenio 1914 de 2022.

Cordial saludo:

En el marco de los compromisos contractuales derivados del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, celebrado entre el Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior, y conforme a citación de la supervisión del Ministerio, se convoca a comité de seguimiento virtual para el día jueves 12 de junio de 2025, de 8:00 a 9:00 a.m.; con el objetivo de evaluar el estado actual de la ejecución física del contrato de obra, así como la situación jurídica del mismo, ya que de acuerdo al cronograma del convenio, la obra tiene prevista como fecha de terminación el 26 de junio de 2025.

El link de la reunión se compartirá media hora antes de iniciar la misma.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Perez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

ATRASO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <consorcioepc23@gmail.com>
Cc <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha 2025-06-10 3:41 pm

OFICIO CIP-V1-2025-087.pdf (~184 KB)

Corozal, Sucre, 10 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Atraso de ejecución de actividades en obra.

CIP-V1-2025-087

Corozal, Sucre, 10 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Atraso de ejecución de actividades en obra.

Cordial saludo,

Mediante el presente, la Interventoría en virtud de sus funciones, y haciendo una revisión exhaustiva de lo que se encuentra actualmente en obra. Se tiene que, el Contratista al presente cuenta con la cantidad de personal operativo necesario para poder adelantar diferentes actividades técnicas, sin embargo, no se han realizado debido a la falta de suministro de materiales en obra.

A continuación, se presentan las actividades que se pueden ejecutar y sus especificaciones:

1. Instalación de ventanas piso 2 Bloque 1: los vanos se encuentran listos y no se ha iniciado con la instalación.
2. Instalación de puertas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2, y piso 2 Bloque 1: los vanos se encuentran terminados, pero no se ha iniciado su instalación.
3. Estuco piso 1 Bloque 1 y Bloque 2, y piso 2 Bloque 1: la mampostería se encuentra finalizada y completamente pañetada, pero no se ha dado inicio a esta actividad, aun cuando el material ya se encuentra disponible en obra.
4. Instalación de piso para baños piso 1 Bloque 1 y Bloque 2; y piso 2 Bloque 1 y Bloque 2: la actividad no se ha ejecutado por falta de suministro de material, pese a que los espacios ya se encuentran listos para la misma.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

5. Instalación de piso de cocina piso 1 Bloque 1: no se ha efectuado esta actividad por falta de material específico para la misma.
6. Instalación de tubería sanitaria colgante piso 2 Bloque 1 y Bloque 2: no se ha iniciado la actividad por falta de suministro de material.
7. Fundición de mesones para los siguientes espacios:
   - ✓ Guardia, piso 1 Bloque 2.
   - ✓ Cocina, piso 1 Bloque 2.
   - ✓ Baños, piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
   - ✓ Baños, piso 2 Bloque 1.
8. Instalación de cielo raso piso 1 Bloque 1 y Bloque 2, y piso 2 Bloque 1.
9. Cableado para instalaciones eléctricas Bloque 1 y Bloque 2 piso 1, 2 y 3.

Agradecemos y solicitamos al Contratista su disposición para el respectivo y oportuno despacho y suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución y continuidad de la obra, siendo esta una de las obligaciones contractuales del Contratista, CONSORCIO EP-C, estipulada en el **Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5)** Ejecutar el contrato tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto. **6)** Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Esta solicitud se realiza con el propósito de velar por el cumplimiento de todas las actividades, puesto que la baja cantidad de materiales disminuye el rendimiento y avance de la construcción.

Agradecemos su pronta atención y respuesta a este requerimiento, informando a esta Interventoría el despacho y entrega de los materiales en obra.

Atentamente,

Oscar Carrascal S.

OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
R.L. CONSORCIO I-POLICE
Interventoría

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

Oficio 0414/SPM-2025

Corozal, junio 10 de 2025.

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

CONSORCIO EP-C
Atn: **ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA**
Representante legal

ASUNTO: Citación comité de seguimiento virtual Convenio 1914 de 2022.

Cordial saludo:

En el marco de los compromisos contractuales derivados del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, celebrado entre el Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior, y conforme a citación de la supervisión del Ministerio, se convoca a comité de seguimiento virtual para el día jueves 12 de junio de 2025, de 8:00 a 9:00 a.m.; con el objetivo de evaluar el estado actual de la ejecución física del contrato de obra, así como la situación jurídica del mismo, ya que de acuerdo al cronograma del convenio, la obra tiene prevista como fecha de terminación el 26 de junio de 2025.

Se solicita al contratista de interventoría organizar la presentación del informe de avances con el respectivo registro fotográfico del avance real a la fecha. Además, se solicita la presencia indelegable de los representantes legal de los consorcios en la reunión.

El link de la reunión se compartirá media hora antes de iniciar la misma.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO No.. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 10 de junio de 2025, 4:32 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 10 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Citación Comité de seguimiento.

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, y teniendo en cuenta el estado del proyecto a la fecha, se convoca a comité de seguimiento virtual al Señor Alcalde y Supervisión del Convenio el jueves 12 de junio de 2025 a las 10:00 am, para realizar seguimiento a los compromisos de los comités anteriores.

De igual manera se debe contar con la totalidad de la documentación que soporte el avance del 60% del proyecto, con el fin de poder agendar la visita de verificación al proyecto.

El siguiente es el link mediante el cual se pueden unir a la reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY2ODdlMzQtMzE3ZC00MTdkLTkzNmMtMmY2YzYwNzk1ZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2218ebd6cb-7f4b-43d2-bcd7-9c7c33ae6626%22%7d

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

De Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Destinatario PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
Cc Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-11 10:37 am

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Posible Incumplimiento de obligaciones del Convenio No. 1914-2022

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del interior solicita el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

(...) "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

3) Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, acta que deberá contener los hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros. El cronograma deberá ser aprobado por escrito por el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR. Los eventuales ajustes al cronograma deberán sustentarse técnicamente, y serán evaluados y aprobados previamente por el supervisor designado por el MINISTERIO DEL INTERIOR.

El Municipio de Corozal, no está dando cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que indicó al Ministerio del Interior que se habían prorrogado los contratos derivados por 2 meses, sin embargo, a la fecha no ha remitido los cronogramas de ejecución de los contratos derivados, ni tampoco el cronograma del convenio. Los cronogramas se debían haber remitido 5 días después de la suscripción de los modificatorios, los cuales se suscribieron el 10 de mayo de 2025.

7) Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.

El Municipio de Corozal, no está dando cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que a la fecha no ha remitido la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

13) Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que no ha remitido los documentos que certifiquen el cumplimiento de la citada obligación. parafiscales. → oficio. consorcio

31) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el informe financiero del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y mayo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025).

Con respecto al Informe del mes de abril de 2025, solo se remitió el correspondiente a la cuenta en la cual se manejan los recursos del Ministerio del Interior, no se remitió el informe de la cuenta donde se manejan los recursos del Municipio de Corozal.

35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el informe de supervisión del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y mayo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025). Así mismo, no ha remitido los informes del Contrato de Estudios, diseños y obra del mes de marzo, abril y mayo de 2025, e informes del Contrato de Interventoría a los Estudios, diseños y obra del mes de mayo de 2025.

De igual manera verificando la plataforma SECOP II y SECOP I (Contratación derivada), el Municipio de Corozal, no ha publicado:

1. Informes de supervisión desde el mes de enero de 2024, los cuales deben incluir los informes financieros y extractos mensuales.
2. Informes de los Contratos de Estudios, diseños, obra.
3. Informes de los Contratos de Interventoría a los Estudios, Diseños, Obra.

36) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el informe de supervisión del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y mayo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025).

37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que no ha remitido el Informe Semanal de Interventoría No. 83 con corte al 24 de mayo de 2025, Informe semanal de interventoría No. 84 con corte al 1 de junio de 2025, informe semanal de interventoría No. 85 con corte al 8 de junio de 2025.

39) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de estudios, diseños y obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico.

El Municipio de Corozal, no ha remitido las modificaciones de los contratos derivados por los 2 meses de prórroga, con los soportes de aprobación de la interventoría, pólizas y aprobación de pólizas.

51) Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el extracto bancario del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y amyo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025).

Con respecto al Informe del mes de abril de 2025, solo se remitió el correspondiente a la cuenta en la cual se manejan los recursos del Ministerio del Interior, no se remitió el informe de la cuenta donde se manejan los recursos del Municipio de Corozal.

57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligacipon, teniendo en cuenta que ante los atrasos del contratista de obra e interventoría de obra, no ha remitido los soportes de las acciones adelantadas a los mismos.

En consecuencia, se solicita al Señor Alcalde del Municipio de Corozal y su supervisión, dar cumplimiento a las obligaciones pendientes a la fecha, remitiendo de manera inmediata la información al Ministerio del Interior.

Es necesario recordar que para el trámite de desembolso por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal, además del cumplimiento de requisitos plasmados en la minuta del Convenio No. 1914 de 2022, se debe dar cumplimiento a cada una de las obligaciones del citado convenio.

De igual manera, de no dar cumplimiento de manera inmediata el Ministerio del Interior tramitará ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

OBSERVACIONES INFORME Y SOPORTES FINANCIEROS - CONVENIO No. 1914-2020 MUNICIPIO DE COROZAL

De Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Destinatario PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
Cc Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-11 5:22 pm

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Observaciones Informe y soportes Financieros

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior remite observaciones al Municipio de Corozal de la Información Financiera remitida con corte al mes de abril de 2025, así:

1. En el informe de abril de 2025, se indican los valores pagados de los contratos derivados: No. L-.AM-CS.001-01-23 y al Contrato No. CM-AM-CS-001-01-23, sin embargo, en el objeto del pago solo hace referencia al Contrato de Estudios, diseños y construcción de Estación Base de Distrito Tipo A en el Municipio de Corozal Departamento de Sucre.

   L-AM-CS-001-01-23: Contrato de Estudios, diseños y Construcción.
   CM-AM-CS-001- 01-23: Interventoría al Contrato de Estudios, diseño y Construcción.

Con respecto a los pagos:

2. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 1 por valor de $563.568.320,90 (Acta parcial, factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
3. Contrato CM-AM-CS-001- 01-23: No se anexa el Acta No. 1, factura, por valor de $397.813.951,00.
4. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 2 por valor de $1.444.641.832,95 (Acta parcial, factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
5. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes 15% de anticipo adicional 1 por valor de $309.716.205,76.
6. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de obra No. 3 por valor de $817.628.244,70 (Acta Parcial, Factura).
7. Contrato CM-AM-CS-001- 01-23: No se anexa el Acta No. 4, factura, por valor de $113.757.823,47
8. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 4 por valor de $3.411.810.584,15 (Acta parcial (sin firma), factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
9. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 4 por valor de $398.466.672,95 (Acta parcial (sin firma), factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
10. Contrato CM-AM-CS-001- 01-23: No se anexa el Acta No. 5, factura, por valor de $41.110.409,73.

De acuerdo con la revisión anterior, se solicita remitir la documentación faltante de manera inmediata, teniendo en cuenta la necesidad de realizar la legalización de recursos de manera inmediata ante la Coordinación Financiera y Contable del Ministerio del Interior.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ATRASO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <consorcioepc23@gmail.com>
Cc <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha 2025-06-12 3:25 pm

OFICIO CIP-V1-2025-090.pdf (~189 KB)

Corozal, Sucre, 12 de junio del 2025

Señores
CONSORCIO EP-C
Atn. **ROGER ESTEBAN GUTIERREZ**
Representante Legal
Email: consorcioepc23@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Atraso de ejecución de actividades en obra.

INFORME SEMANAL 84 Y 85 - DISTRITO COROZAL

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-12 11:46 am

INFORME SEMANA SEMANA 85.xlsx (~3,3 MB) INFORME SEMANA SEMANA 84.xlsx (~4,9 MB)

Corozal, Sucre, 12 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 84 Y 85

Oficio 0426/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 12 de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, Cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Solicitud de subsanación a observaciones acta parcial No. 6.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, me permito solicitar, con carácter urgente la remisión del acta parcial No. 6 con las observaciones realizadas.

1. Las cantidades reportadas en el acta de los siguientes ítems no corresponden a las contempladas dentro de las memorias de cantidades: 3.04, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.12, 17.13 y 17.14.

2. En las memorias de los ítems 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11 y 4.12 no reportan el registro fotográfico correspondiente a las cantidades en el segundo piso.

Así mismo, se solicita la remisión del informe semanal No. 83 subsanado conforme a las observaciones realizadas en oficio 0420 de fecha 13 de junio de 2025.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barbaza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0417/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 12 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:


En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y teniendo en cuenta requerimiento del Ministerio del Interior por presunto incumplimiento de obligaciones Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal, de fecha 11 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

1. **Informe financiero del mes de abril de 2025**

Se remite informe financiero de la cuenta del municipio de Corozal, correspondiente al mes de abril de 2025.


2. Informe mensual de supervisión del mes de abril de 2025.

Se remite informe de supervisión correspondiente al mes de abril con los respectivos soportes, el cual fue remitido por primera vez el día 22 de mayo de 2025.

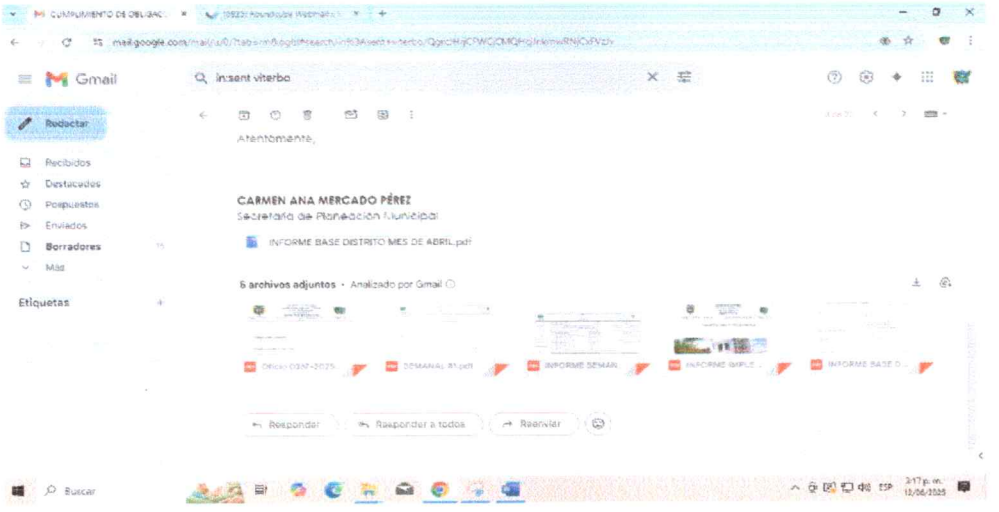

3. Informes mensuales de interventoría

Se remite informe mensual de interventoría No. 15 de abril de 2025, el cual fue remitido por primera vez el día 5 de junio de 2025.

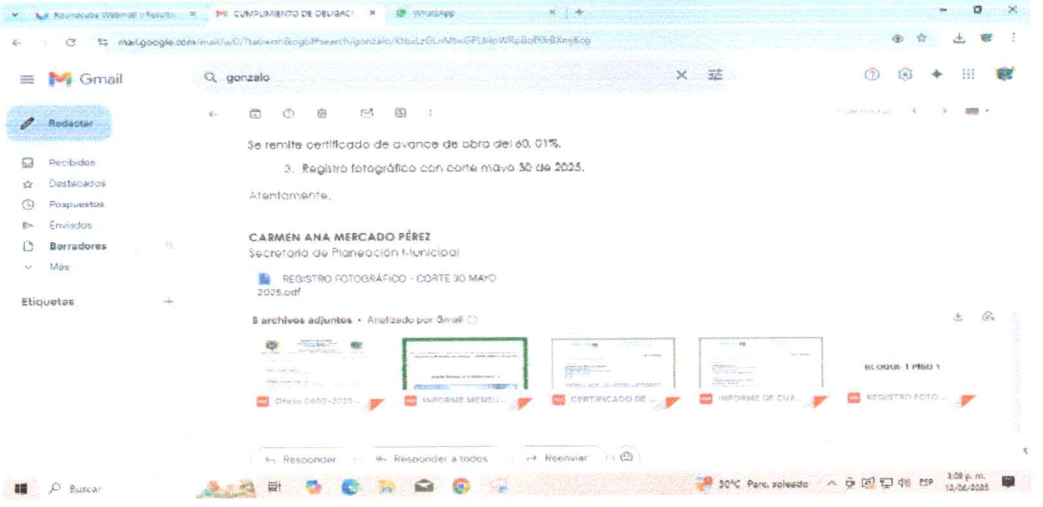

4. Informe de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental – PIGA.

Se remite en el día de mañana, debido a que se están realizando visitas de inspección para verificar el cumplimiento de recomendaciones.

5. Informes semanales de avance No. 83, 84 y 85.

Se remiten en el día de mañana, debido a que se están realizando las revisiones y respectivas observaciones a los mismos en el día de hoy.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Dirección Carrera 28 N.º 31A-08 piso 2° Barrio san juan. Telefax: (605)2858659
Página Web: alcaldía@corozal-sucre.gov.co E-mail: alcadia@corozal-sucre.gov.co

Oficio 0420/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 12 de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, Cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Solicitud de corrección de fechas en pólizas e informes de interventoría

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, me permito solicitar, con carácter urgente, la entrega de los informes semanales de interventoría N° 82 y 83, debidamente ajustados conforme a las correcciones requeridas el día 06 de junio de 2025 al ingeniero Erick Camargo.

- **Informe semanal de avance 83:**

- De acuerdo al acta de reinicio No. 2 de obra e interventoría, es del 12 de mayo del 2025, no del 9 de mayo tal como aparece en la información inicial y en las observaciones.

- En los capítulos de SISTEMA HIDROSANITARIO, PUERTAS Y VENTANAS, MURO DE CERRAMIENTO, SISTEMA DE DETECCIÓN RCI y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO no mencionan las principales actividades que se han ejecutado pese a que se estipula el porcentaje de avance. Así mismo, anexar registro fotográfico de estas actividades.

- **Informe semanal de avance 84:**

- De acuerdo al acta de reinicio No. 2 de obra e interventoría, es del 12 de mayo del 2025, no del 9 de mayo tal como aparece en la información inicial y en las observaciones.

Así mismo, me permito solicitar:

- Corrección de la fecha en las pólizas de obra e interventoría actualizadas al Acta de Reinicio N°. 2, teniendo en cuenta que la fecha correcta de dicha acta es del 12 de mayo de 2025 y no el 9 de mayo.
- Remisión urgente de los informes de obra correspondientes a los meses de abril y mayo de 2025,

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0421/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 13 de 2025

13.6.25. 3.02

Doctora
JULIETH DUQUE LINERO
Representante legal

ASUNTO: Solicitud de subsanación de información financiera.

Cordial saludo:

De acuerdo a observaciones del Ministerio del Interior, se solicita la subsanación del informe financiero del mes de abril de 2025.

- Contrato de obra No. L – AM – CS – 001 – 01 – 23, el objeto es: Contrato de estudios, diseño y construcción de Estación Base de Distrito Tipo A en el municipio de Corozal – Departamento de Sucre.
- Contrato de interventoría No. CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, el objeto es: Interventoría al contrato de Estudios, diseño y construcción de Estación Base de Distrito Tipo A en el municipio de Corozal – Departamento de Sucre.

En el informe de abril de 2025, se indican valores pagados de los contratos derivados No. L – AM – CS – 001 – 01 – 23 y al Contrato No. CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, sin embargo, en el objeto del pago solo se hace referencia al contrato de estudios, diseño y construcción de Estadio Base de Distrito Tipo A en el municipio de Corozal, Departamento de Sucre.

Respecto a los pagos:

- Acta parcial #1 contrato de obra, por valor de $563.568.320,90 de fecha 20/03/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 1 contrato de interventoría por valor de $397.813.951 de fecha 05/04/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 2 contrato de obra por valor de $1.444.641.832,95 de fecha 17/05/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial pago anticipo 15% de adicional 2, contrato de interventoría por valor de $309.716.205,76, de fecha 29/07/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #3 Contrato de obra por valor de $817.628.244,70 de fecha 23/08/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #4 contrato de consultoría por valor de $113.757.823,47 de fecha 30/05/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #3 contrato de obra por valor de$3.411.810.584,15 de fecha 2/12/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 3 contrato de interventoría por valor de $67.943.559 de fecha 6/11/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #4 contrato de interventoría por valor de $275.723.265,47 de fecha 26/12/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 4 contrato de interventoría por valor de $41.110.409,76, de fecha 09/04/2025, no se anexa factura electrónica.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, ya que, de acuerdo a los compromisos del comité de seguimiento del día de ayer 12 de junio, el plazo para el envío de las subsanaciones es el día lunes sin falta.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0422/SPM-2025

Corozal – Sucre, 13 de junio de 2025

Señor
BAYRON OSPINA TRESPALACIO
Alcalde Municipal de Corozal

Con copia,

Doctora
PATRICIA URZOLA BADEL
Secretaria Jurídica y Asuntos Contractuales

ASUNTO: Solicitud de apertura de proceso por presunto incumplimiento al contrato de obra publica **L-AM-CS-001-01-23.**

Cordial Saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de Secretaria de Planeación Municipal, de acuerdo al Decreto de nombramiento N° 024 de fecha 22 de enero del 2024, me permito solicitar dar inicio al trámite de presunto incumplimiento contractual en el marco del Contrato de Obra Pública No. L-AM-CS-001-01-23, cuyo objeto es "Estudios, diseño y construcción de estación base de distrito tipo A en el municipio de Corozal – Departamento de Sucre", teniendo como contratista al CONSORCIO EP-C.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la interventoría del proyecto, a cargo del Consorcio I-POLICE, ha dado la recomendación de manera reiterada, a través de los informes semanales de avance, el inicio del proceso por incumplimiento, en razón a los atrasos evidenciados en el cronograma de obra.

De acuerdo con el último informe semanal No. 85, con corte al 9 de junio de 2025, se reporta un atraso del 11,24% respecto a lo programado contractualmente. Para los fines pertinentes se anexa dicho informe al presente.

En atención a lo anterior y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los intereses de la entidad, se solicita dar inicio al respectivo procedimiento administrativo, ya que de no tomarse las medidas administrativas correspondientes por parte del municipio, el Ministerio del Interior dará inicio a la apertura de proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, celebrado entre el Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior; teniendo en cuenta que el plazo de terminación del convenio es el 31 de agosto de 2025 y de acuerdo a los atrasos en el avance de obra, probablemente está no se logré terminar en el plazo estipulado en el contrato de obra.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Diaz	Contratista	
Aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación	

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Recibí:
Brenda L. Mejia
13-06-2025
11:52 A.M

Oficio 0423/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 13 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y teniendo en cuenta requerimiento del Ministerio del Interior por presunto incumplimiento de obligaciones Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal, de fecha 11 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

1. Informe semanal de interventoría No. 85 con corte

2. Informe mensual de implementación del PIGA, correspondiente al mes de mayo de 2025.

Respecto a la información financiera del mes de abril de 2025, se está realizando la revisión de la información mes a mes de manera conjunta con el área de contabilidad, con el fin realizar los ajustes a la información reportada en los informes de supervisión de los meses de enero a abril de 2025, ya que se han hallado inconsistencias entre lo reportado en los mismos y los informes financieros de los mismos periodos, por lo que la Tesorería se ha comprometido a remitir toda la información de actas de pagos y soportes el día lunes, para ser enviada al Ministerio del Interior con los debidos ajustes a los informes de supervisión.

En relación a los informes mensuales de obra pendientes de los meses de abril y mayo de 2025, a la fecha el contratista de interventoría no ha realizado el reporte, por lo que se envió requerimiento por escrito en el día de hoy.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-14 11:52 am

CERTIFICADO DE AVANCE CIP-V1-2025-093.pdf (~205 KB)

Corozal, Sucre, 14 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Certificación de Avance de Obra

ACTA 6 - 61.44.xlsx

Oficio 0424/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 16 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y teniendo en cuenta requerimiento del Ministerio del Interior por presunto incumplimiento de obligaciones Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal, de fecha 11 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

1. **Información financiera periodos 2024 – 2025 del contrato de obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23.**

- Soportes pago de anticipo 15% del contrato de obra.
- Soportes pago de acta parcial 1.
- Soportes pago de acta parcial 2
- Soportes anticipo 15% adición 2.

- Soportes pago acta parcial 3.
- Soportes pago acta parcial 4.
- Soportes pago acta parcial 5

2. Información financiera periodos 2024 – 2025 del contrato CM – AM – CS – 001 – 01 – 23.

- Soportes pago de acta parcial 1.
- Soportes pago de acta parcial 2.
- Soportes pago de acta parcial 3.
- Soportes pago de acta parcial 4.
- Soportes pago de acta parcial 5.

El informe financiero del mes de mayo se encuentra en proceso por parte del área de contabilidad en el día de hoy, el cual no ha sido remitido a la supervisión, debido a que el área de presupuesto se encuentra en proceso de auditoria desde la semana anterior; no obstante, la Tesorera ha manifestado su disposición para reunirse con usted en el día de mañana.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Alcaldía de Corozal

ORDEN DE PAGO

No. 2024000
lunes 29 julio 2024

Alcaldia Municipal de
COROZAL

Beneficiario: 901694070 - CONSORCIO EP C			
Número de cuenta: 880089792	Banco: BANCO DE BOGOTA		Tipo de cuenta: CORRIENTE
CDP No: 24000046	Fecha Expedición CDP: 31/01/2024	RP No: 24000447	Fecha Expedición RP: 22/05/2024
Contrato Asociado: ADLAMCS001-01-23-2024	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $1.754.721.112,31

Concepto Orden De Pago

PAGO DEL 15% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL 2 DEL CONTRATO N° L-AM-CS-001-01-23, CUYO OBJETO ES EL ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 309.716.205,76 **Valor Liquidiacion:** $ 21.680.134,41 **Valor Neto:** $ 288.036.071,35

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
4501100007	7101	$ 309.716.205,76
	Valor Total	$ 309.716.205,76

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
24 - Retención Contratos De Construccion y Urbanización	2%	$ 309.716.205,76	$ 6.194.324,12
7 - Contribución Contrato de Obra	5%	$ 309.716.205,76	$ 15.485.810,29
		Valor Total	$ 21.680.134,41

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
24362601 - Contratos De Obra Publica 2%		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 0,00	$ 6.194.324,12
41102705 - Fondo de Seguridad Ciudadana (5%)		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 0,00	$ 15.485.810,29
19060401 - Anticipos Para Adquision de Bienes y Servivicos		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 309.716.205,76	$ 0,00
24010101 - Bienes Y Servicios Vigencia Actual		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 0,00	$ 288.036.071,35
		Totales	$ 309.716.205,76	$ 309.716.205,76

Para la constancia se firma la orden de pago No. 2024000840.

ROBERTO ESPINOSA VERGARA

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO

Orden de Pago

Radicó yconde - Radicado # 831 - Fecha Radicación: 22/07/2024 00:00 AM, Revisó: yconde - Fecha de revisión: 23/07/2024 09:59 AM
Generó: respinosa - Imprime: respinosa

Alcaldia Municipal de
COROZAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE

NIT: 892280032

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 2024001101

02/08/2024

Beneficiario CONSORCIO EP C **NIT:** 901694070

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 288.036.071,35
VALOR A PAGAR	**$ 288.036.071,35**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: ADLAMCS001-01-23-2024

CDP: 24000046 **RP:** 24000447 **OP:** 2024000840

Rubro	Financiación	Descripción
4501100007	7101	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNCIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** AHORROS

Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.

Nombre Cuenta: COFINANCIACION CONVENIO 1914 - ESTACION DE POLICIA MINISTERIO **Cuenta:** 11100001378

Beneficiario: 901694070 - CONSORCIO EP C

Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA

Numero de Cuenta: 880089792 - **Tipo Cuenta:** C

Concepto

PAGO DEL 15% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL 2 DEL CONTRATO N° L-AM-CS-001-01-23, CUYO OBJETO ES EL ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 0

Observaciones:

JULIETH V. DUQUE LINERO
Tesorera Municipal

BENEFICIARIO
Alcalde

Elaboró: MGARRIDO	Imprimió: MGARRIDO	Fecha 02/08/2024 10.53 AM	IP Imprimió	186.43.33.4

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE COROZAL
NIT: 892280032
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 15anticipo
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 11100001378

Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 10:57:34
Fecha de Generación: 01-08-2024

Fecha de envio del pago: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2024

Impreso por: Bayron38

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $288,036,071.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $288,036,071.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000892826918	Ahorros	8300540762	FIDUOCCIDENTE 3190	288,036,071.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2024

Oficio 0428/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 16 de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

CONSORCIO EP – C
Atn: **ROGER ESTEBAN GUTIEREZ CORDOBA**
Representante legal

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, cuyo objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE*"

ASUNTO: Citación visita Ministerio del Interior.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, de acuerdo a citación del Ministerio del Interior, me permito convocar a comité de seguimiento presencial durante los días 18 y 19 de junio de 2025, acorde a la siguiente agenda:

- Miércoles 18 de junio de 2025: Visita de seguimiento al proyecto para verificación del avance de la obra al 60%, de 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

- Jueves 19 de junio de 2025: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60%.

- Comité de seguimiento presencial de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones de la alcaldía Municipal.

Es imprescindible la asistencia presencial e indelegable de los representantes legales de los Consorcios.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0429/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 16 de 2025

Señores
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde Municipal de Corozal

Doctora
PATRICIA URZOLA BADEL
Secretaria Jurídica y Asuntos Contractuales

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, cuyo objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE*"

ASUNTO: Citación visita Ministerio del Interior.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, de acuerdo a citación del Ministerio del Interior, me permito convocar a comité de seguimiento presencial durante los días 18 y 19 de junio de 2025, acorde a la siguiente agenda:

- Miércoles 18 de junio de 2025: Visita de seguimiento al proyecto para verificación del avance de la obra al 60%, de 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

- Jueves 19 de junio de 2025: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60%.

- Comité de seguimiento presencial de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones de la alcaldía Municipal.

Es imprescindible la asistencia presencial e indelegable de los representantes legales de los Consorcios, así como la participación del señor alcalde municipal y de la Secretaría Jurídica.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

INFORME SEMANAL 86 - DISTRITO COROZAL

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-16 10:47 am

INFORME SEMANA SEMANA 86.xlsx (~7,0 MB)

Corozal, Sucre, 16 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 86

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO No. 1546-2020

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 16 de junio de 2025, 3:56 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 16 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Citación Visita de seguimiento a la ejecución contractual.

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior de acuerdo con lo indicado en el comité del 12 de junio de 2025, confirma la visita al proyecto de acuerdo con la siguiente agenda:

1. Miércoles 18 de junio de 2025: 8:00 am - 8:00 pm: Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60%.
2. Jueves 19 de junio de 2025: 8:00 am - 2:00 pm: Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60% -.3:00 pm - 5:30 pm. Comité Alcaldía de Corozal - Sucre

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 17 de junio de 2025, 12:08 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

Bogotá D.C., 17 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, y de acuerdo con el último comité de seguimiento, se recuerdan los compromisos y las fechas de cumplimiento:

1. Minuta de los 2 meses de prorroga hasta el 26 de julio de 2025: Fecha de
   ↓
   José Vergara
2. Informe de obra del mes de mayo de 2025: Fecha de cumplimiento
   ↓
   EP-C lo remitió a I-Police pero estos no lo han entregado a la Sec.
3. Informe de interventoría de obra del mes de abril y mayo de 2025: Fecha de
   ↓
   Abril ya, falta mayo.
4. Informe visita de inspección RETIE y RETILAP: Fecha de cumplimiento
   ↓
   No lo han enviado
5. Cronograma con plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2025: Fecha de cumplimiento 16 de junio de 2025.
   ↓
   No lo han enviado
6. Balance de la obra al 60% y las memorias: Fecha de cumplimiento
   ↓
   Ing. Angelica

, cumplimiento 13 de junio de 2025.	16 de junio de 2025.	cumplimiento 16 de junio de 2025.	16 de junio de 2025.	16 de junio de 2025.

Teniendo en cuenta que los plazos están vencidos, se solicita el envío de la información de manera inmediata.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

CONSORCIO EP-C

NIT: 901.694.070

Corozal, Sucre, 17 de junio de 2025

CEPC-V1-2025-024

Ingeniero
OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ
R.L. CONSORCIO I - POLICE
INTERVENTORÍA
Email: consorcioipolice@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO N°L-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE VISITA RETIE.

Cordial saludo.

De acuerdo a lo requerido para la correcta ejecución del proyecto en mención, es necesario la realización de visitas parciales por parte de la empresa certificadora en RETIE y RETILAP, en este caso, la empresa EINCE S.A.S., con quién tiene contrato este consorcio para la realización de estos procesos, en días anteriores realizó una visita técnica, dando como resultado, el acta de visita que se encuentra anexa a esta comunicación.

Para fines pertinentes.

Atentamente,

ROGER ESTEBAN GUTIÉRREZ CÓRDOBA
R.L. CONSORCIO EP-C
CONTRATISTA.
C.C. Secretaría de Planeación Municipal / email: planeacion@corozal-sucre.gov.co

Eince SAS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
09-OIN-112

ACTA DE INSPECCION RETIE

FI 47
VERSIÓN 7
AGOSTO 2022

PROYECTO	Estación-de-policía-Corozal						
DIRECCIÓN	Municipio Corozal			CIUDAD	Sucre		
FECHA	13/06/2025	VISITA NÚMERO	1	ORDEN DE SERVICIO	No. 00882	Año. 2025	Ciudad. MON	Cod. Comercial 211	Reglamento RE

REALIZA ANÁLISIS DE RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN ACORDE AL FSA 47: SI

Tipo de Instalación	Básica	Líneas de transmisión y/o subestaciones de Alta Tensión aledañas?	no

	ÍTEMS A EVALUAR CRITERIO TÉCNICO	RESULTADO C/NC/NA/PR	OBSERVACIÓN
1	Tableros	NA	En construcción
2	Espacios de trabajo	NA	En construcción
3	Identificación de circuitos - canalizaciones - tableros	NA	En construcción
4	Señalización (Diagrama unifilar, directorio de circuitos, símbolo de riesgo eléctrico, mímicos)	NA	En construcción
5	Alimentadores – Acometidas	NA	En construcción
6	Código de colores	NA	En construcción
7	Conductores (material/aislamiento/capacidad de corriente)	NA	En construcción
8	Selección de protecciones y capacidad de funcionamiento (sobrecorrientes – sobretensiones)	NA	En construcción
9	Conectores, terminales, barrajes	NA	En construcción
10	Continuidad de conductores - ejecución de conexiones	NA	En construcción
11	Circuitos ramales	NA	En construcción
12	Cajas, canalizaciones, bandejas portacables, electrobarras	NA	En construcción
13	Métodos de alambrado	NA	En construcción
14	Ensayos funcionales	NA	En construcción
15	Tomacorrientes mínimos	NA	
16	Tomacorrientes, aparatos, ducha eléctrica	NA	
17	Tomacorrientes sobre mesones (penínsulas e islas)	NA	
18	Protección GFCI	NA	
19	Conductores HFFRLS (Libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos)	NA	En construcción
20	Agentes deteriorantes - Condiciones ambientales	NA	
21	Compatibilidad térmica de equipos y materiales	NA	En construcción
22	Ejecución mecánica de los trabajos - sujeciones y soportes	NA	En construcción
23	Nivel de tensión - Aislamiento eléctrico (equipos – conductores – aparatos)	NA	En construcción
24	Protección de partes energizadas y barreras de acceso	NA	
25	Subestación - celda MT - transformador	NA	
26	Montaje y ventilación de equipos - Accesibilidad	NA	
27	Bóveda subestación – Barreras de acceso – Brocal	NA	
28	Cámaras - canalizaciones adecuadas - cajas de paso	NA	En construcción
29	Apoyos, estructuras y herrajes	NA	En construcción
30	Distancias de seguridad - Zonas de servidumbre	NA	
31	Campos electromagnéticos	NA	
32	Sistema de puesta a tierra	NA	En construcción
33	Sistema de protección contra rayos	NA	En construcción
34	Nivel de iluminación o iluminación de emergencia	NA	
35	Sistemas de emergencia - planta eléctrica	NA	
36	Bomba contra Incendio	NA	
37	Ascensor	NA	
38	Piscina	NA	
39	Cerca eléctrica	NA	
	DOCUMENTALES	**RESULTADO**	**OBSERVACIÓN**
40	Certificados de producto RETIE	NA	En construcción
41	Memorias de cálculo y planos firmados de acuerdo al Artículo 10.1	NA	En construcción
42	Declaración de cumplimiento constructor	NA	En construcción
43	Matrícula profesional diseñador y constructor	NA	En construcción
44	Soporte de experiencia diseñador y constructor (Instalaciones especiales)	NA	En construcción
45	Registro RUPI-SIC Constructor	NA	En construcción
46	Fichas técnicas (Productos de instalaciones especiales)	NA	

ALCANCE INSPECCIONADO:

Se programo primera visita, solicitada por el cliente, Se realiza recorrido de la obra se identifica que la obra todavia esta en construccion , falta instalar salidas de iluminación ,construir sistema de apantallamiento,Instalar subestación y tableros electricos, hace falta la red de MT y se evidencia que las instalaciones electricas construidas hasta la fecha cumplen con la normativa actual se programara una segunda visita.

RESULTADO DE LA INSPECCION :	SE RECOMIENDA APROBAR EL ALCANCE INSPECCIONADO	SI	X	NO	

Se emplea formato de anexo — No [X] — Si [ ] — N° hojas [1]

Nombre	Firma
Yosandra Cavadia Perez	
Carlos Eduardo Hernández Bula	

LA INFORMACION RECOGIDA POR EL INSPECTOR Y LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS SERAN REVISADOS Y EVALUADOS POR EL COMITÉ DE INSPECCIONES DE EINCE SAS

Aprobación del comité	si		No		
Firma					

Se pueden generar No Conformidades (NC), al verificar la información de los ítems documentales marcados como Pendientes por Revisar (PR).

Oficio 0433/SPM-2025

Corozal, 17 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, Cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

REFERENCIA: Contrato de Obra No. L – AM – CS - 001 – 01 – 23, cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSRUCCIÓN DE BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Reiteración por tercera vez de solicitud de información pendiente.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, me permito solicitar de manera reiterativa, la remisión urgente la siguiente información:

- Informe de obra de abril y mayo de 2025.
- Informe de interventoría mayo de 2025.

Así mismo, se solicita, información pendiente acorde a los compromisos pactados en comité de seguimiento virtual llevado a cabo el 12 de junio de 2025.

- Cronograma de obra con plazo de ejecución de obra hasta el 30 de julio de 2025, cuya fecha de entrega es el 16 de junio de 2025.

- Balance de obra al 60% y hasta el 30 de julio de 2025 y memorias de cantidades, con fecha de entrega el 16 de junio de 2025.

- Informe semanal 84 subsanado conforme a las observaciones realizadas por la supervisión.

Atentamente,

CARMEN MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Revisó	Alfonso Barrios Pérez	Técnico Operativo	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

ENTREGA DE INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA 82, 83, 84, 85 Y 86

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-18 8:47 am

INFORME SEMANA SEMANA 85.xlsx (~3,3 MB) INFORME SEMANAL COROZAL 82.xlsx (~3,6 MB) INFORME SEMANA SEMANA 84.xlsx (~4,9 MB)
INFORME SEMANAL COROZAL 83.xlsx (~6,4 MB) INFORME SEMANA SEMANA 86.xlsx (~7,0 MB)

Corozal, Sucre, 18 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 82, 83, 84, 85 Y 86

Cordial saludo,

Atendiendo a las correcciones recibidas por parte de la secretaría de planeación, se adjuntan los informes con las fechas correspondientes y lo demás solicitado.

Oficio 0438/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 18 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y conforme a los compromisos acordados en comité de seguimiento virtual del 12 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

- Acta de visita de inspección RETIE y RETILAB.
- Informe semanal No. 83

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

COMITÉ 19 DE JUNIO DE 2025

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 19 de junio de 2025, 7:11 a.m.
Para: planeacion@corozal-sucre.gov.co, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC: consorcioepc23@gmail.com

Corozal, Sucre, 19 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Incapacidad para asistencia a comité.

3 archivos adjuntos

OFICIO CIP-V1-2025-094.pdf
160K

INCAPACIDAD MEDICA ERIC CAMARGO - 92640459.pdf
112K

HISTORIA CLINICA ERICK CAMARGO - 92640459.pdf
85K

Gmail

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

ACTA DE VISITA Y COMITE DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 19 de junio de 2025, 3:48 p.m.
Para: viterbo.gomez@mininterior.gov.co, Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>, planeacion@corozal-sucre.gov.co
CC: consorcioepc23@gmail.com, CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
CCO: samiralaradiaz@gmail.com, desuc.gubir@policia.gov.co

2 archivos adjuntos

ACTA COMITE PRESENCIAL 18 Y 19 DE JUNIO.pdf
3999K

ASISTENCIA VISITA MININTERIOR.pdf
655K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 82, 83, 84, 85 Y 86

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 19 de junio de 2025, 6:32 p.m.
Para: planeacion@corozal-sucre.gov.co, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, gonzalo.florez@mininterior.gov.co
CC: consorcioepc23@gmail.com

Corozal, Sucre, 19 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 82, 83, 84, 85 Y 86

Cordial saludo,

Atendiendo a las correcciones recibidas, se adjuntan los informes con las fechas correspondientes y ajustes pertinentes.

5 archivos adjuntos

INFORME SEMANAL COROZAL 85.xlsx
3248K

INFORME SEMANAL COROZAL 82.xlsx
3603K

INFORME SEMANAL COROZAL 84.xlsx
4859K

INFORME SEMANAL COROZAL 83.xlsx
6338K

INFORME SEMANAL COROZAL 86.xlsx
6919K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

SEGURIDAD SOCIAL MAYO DE 2025

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 20 de junio de 2025, 9:21 a.m.
Para: consorcioepc23@gmail.com
CC: planeacion@corozal-sucre.gov.co, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Corozal, Sucre, 20 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Seguridad social del mes de mayo de 2025.

OFICIO SEGURIDAD SOCIAL MAYO.PDF
125K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONVENIO 1914 DE 2022

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 20 de junio de 2025, 9:06 a.m.
Para: viterbo.gomez@mininterior.gov.co, Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>, planeacion@corozal-sucre.gov.co

Corozal - Sucre, junio 20 de 2025

Doctor
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Ministerio del Interior

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

ASUNTO: Remisión de informes semanales ajustados.

Cordial saludo:

En cumplimiento de los compromisos acordados en comité presencial llevado a cabo el día de ayer, 19 de junio de 2025, me permito remitir los informes semanales ajustados.

1. Informe semanal 82
2. Informe semanal 83
3. Informe semanal 84
4, Informe semanal 85
5 Informe semanal 86

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

5 archivos adjuntos

INFORME SEMANAL COROZAL 82.pdf
603K

INFORME SEMANAL COROZAL 83.pdf
1053K

INFORME SEMANAL COROZAL 84.pdf
790K

INFORME SEMANAL COROZAL 85.pdf
687K

INFORME SEMANAL COROZAL 86.pdf
1039K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

AJUSTE - OBSERVACIONES LEGALIZACIÓN RECURSOS ABRIL 2025

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 24 de junio de 2025, 7:00 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 20 de junio de 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación
Supervisora Convenio No. 1914-2022
Municipio de Corozal

RE: Convenio No.1914-2022

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME FINANCIERO:

Cordial saludo:

En el marco del Convenio de la referencia suscrito por parte del Ministerio del Interior y Municipio de Corozal con el asunto de (...) "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE*" (...), y una vez realizado el informe de la legalización de los recursos desembolsados por parte del Ministerio del Interior al mes de abril de 2025, se solicita subsanar las siguientes observaciones:

1. En el Informe presentado con corte al mes de abril de 2025, se indica que el pago Acta No.5 CM-AM-CS-001-01-23 corresponde a $41.110.409,73, sin embargo, en la factura el valor es $41.110.409,76.
2. Los rendimientos financieros solo se incluyeron hasta el mes de marzo de 2025.
3. Saldo en caja falta sumar lo rendimientos del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

2 archivos adjuntos

50. INFORME FINANCIERO DISTRITO ABRIL 2025.pdf
2417K

9. ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5.pdf
2382K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

COMITÉ CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 24 de junio de 2025, 7:58 a.m.
Para: Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Seguimiento a la ejecución Contractual del Convenio No. 1914-2022 y cumplimiento de compromisos de la visita realizada del 17 al 19 de junio de 2025

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 211 148 269 102 9

Código de acceso: qP3Gm74s

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

---

invite.ics
5K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CITACIÓN COMITÉ - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 24 de junio de 2025, 8:41 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 24 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: CITACIÓN COMITÉ - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y de acuerdo con los compromisos de la visita realizada al Municipio de Corozal del 17 al 19 de junio de 2025, se confirma el comité de seguimiento para el martes 24 de junio de 2025 a las 2:00 pm, para el cual se solicita convocar al representante legal del Contrato de Estudios, Diseños, Obra e Interventoría a los mismos.

Así mismo, se solicita convocar a la Tesorera teniendo en cuenta que verificado el informe financiero y los documentos de legalización se evidenciaron observaciones en la misma.

Se remite el link mediante el cual se pueden unir a la reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FmOThkMDItODczOC00MDA0LTgxYjgtNDI2M2Q1ODdmMDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2218ebd6cb-7f4b-43d2-bcd7-9c7c33ae6626%22%7d

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUALIZADO - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 26 de junio de 2025, 7:23 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 26 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: REGISTRO FOTOGRÁFICO - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, se solicita presentar registro fotográfico el cual permita verificar el avance de la obra del jueves 19 de junio de 2025 al día de hoy.

Se solicita dar cumplimiento al requerimiento de manera inmediata, teniendo claridad que se cuenta en obra con profesionales del Contratista de Estudios, diseños, obra, Interventoría del Contrato de Estudios, diseños, obra y por parte de la Supervisión del Municipio de Corozal.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Oficio 0458/SPM – 2025

Corozal – Sucre, 26 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

Con copia,

CONSORCIO EP-C
Atn: **ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA**

REFERENCIA: Contrato de obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23.

ASUNTO: Solicitud de registro fotográfico actualizado de actividades en obra.

Cordial saludo:

En atención a solicitud de la supervisión del Ministerio del Interior en el día de hoy, se solicita la remisión de manera inmediata del registro fotográfico actualizado de actividades desarrolladas en obra del 19 de junio a la fecha, teniendo en cuenta que se cuenta con profesionales tanto del contratista como de la interventoría en obra.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Alfonso Barrios Pérez	Técnico Operativo	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

REMISION DE ACTAS DE SUSPENSION CONTRATOS DERIVADOS

De <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
Destinatario Viterbo Gomez <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Gonzalo Florez <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-27 3:09 pm

ACTA DE SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf (~580 KB) ACTA DE SUSPENSION 1 CONTRATO DE OBRA.pdf (~2,1 MB)

Corozal - Sucre, junio 27 de 2025

Ingeniero
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Ministerio del Interior

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

Cordial saludo:

Conforme a su solicitud, se remite la siguiente información:

1. Acta de suspensión de obra No. 1
2. Acta de suspensión de interventoria No.1

CIP-V1-2025-099

Corozal, Sucre, 27 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de informe mensual de interventoría N° 16.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, me permito hacer entrega adjunto del Informe de interventoría N° 16 correspondiente al periodo del 12 de mayo al 11 de junio de 2025, del proyecto denominado **ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE,** el cual contiene:

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION
INTRODUCCION GENERAL DEL PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO
INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA
RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA
OBLIGACIONES DEL CONTRATO
ORGANIGRAMAS DE OBRA
ORGANIGRAMA ADMISTRATIVO DE OBRA
ORGANIGRAMA TECNICO OBRA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

PERSONAL DE CONTRATISTA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA DE INTERVENTORIA
5.2 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA
5.3 ORGANIGRAMA DE INTERVENTORIA
5.3.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA
5.3.2 ORGANIGRAMA TECNICO INTERVENTORIA
5.3.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORIA
6. ESTADO GARANTIAS DE CONTRATO DE OBRA
6.1 POLIZA DE OBRA ACTUALIZACIÓN (1)
7. ESTADO GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA
7.1 POLIZA DE INTERVENTORIA ACTUALIZACIÓN (1)
8. ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION
8.1. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
8.1.1. DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
8.1.2. MANEJO DE ANTICIPO
8.1.3. ACTAS PARCIALES DE COBRO
8.1.4 BALANCE GENERAL
8.2 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
8.2.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
8.2.2 FORMA DE PAGO
8.2.3 ACTA PARCIAL DE COBRO
9. PRESUPUESTO INICIAL (ITEM, CANTIDAD Y VALORES CONTRATADOS)
9.1 PRESUPUESTO RESULTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS
10. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.
10.1 DIAGRAMA DE GANTT Y INICIO.
10.2 PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE OBRA PROGRAMANDO
10.3 PORCETAJE DE SEGUIMIENTO DE OBRA EJECUTADO
11. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO “CURVA S”
11.1 ANALISIS DE CURVAS DE AVANCE DE SEGUIMIENTO “CURVA S”
12. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
12.1 LISTADO DE ITEM INTERVENIDOS
12.1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE CADA ITEM
13. ASPECTOS ADMINISTRATIVO Y LEGALES
14. ACTA Y COMITES DE OBRA
14.1 ACTA DE INICIO
14.2 COMITÉ DE OBRA
15. CORRESPONDENCIA
15.1 CORREPONDENCIA CONTRATO DE OBRA
15.1.1 ENVIADA
15.1.2 RECIBIDA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

15.2 CORREPONDENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA
15.2.1. ENVIADA
15.2.2 RECIBIDA
16 CONTROLES TECNICOS DE CALIDAD
16.1 ENSAYOS REALIZADOS
17 BITACORA DE SEGUIMIENTO DE OBRA
18. ESTADO DEL CLIMA
19. MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
19.1 CONDICIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
19.2 SEÑALIZACION
19.3 PORTE ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
20 MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES EN LA OBRA
21 GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD.
22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
22 ANEXOS

Atentamente,

Oscar Carrascal S.

OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
R.L. CONSORCIO I-POLICE
Interventoría

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

1. FECHA ELABORACIÓN:	2	5	2025	2. No. INFORME	63			3. SEMANA No.	84		
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL:	26/05/2025	AL:	1/06/2025			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 12.575.307.132		
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. SUSPENSIONES:	18	8	2023	11. PLAZO:	19	Meses	
12. REINICIO:	29	1	2024	13. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	5	11	2024	14. ADICIONES:	$ 2.414.774.705		
15. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024	16. SUSPENSIONES:	10	4	2025	17. REINICIO:	12	5	2025
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 05 (ADICIONAL EN TIEMPO - 2 MES)	9	5	2025	19, TERMINACION	27	7	2025				
20. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE										
21. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C										
22. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			23. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	24. VALOR CONTRATO:	$ 1.410.385.620		
25. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	26. SUSPENSIONES:	18	8	2024	27. PLAZO:	19	Meses	
28. REINICIO:	29	1	2024	29. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES:	5	11	2024	30. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 02 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4	26	12	2024
31. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE							32. FECHA DE TERMINACIÓN:	27	7	2025
33. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							33. SUSPENSIONES:	10	4	2025
34. REINICIO:	9	5	2025	35, TERMINACION	27	7	2025				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


30. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	31. % PROGRAMADO	32. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,55%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	38,21%	39,82%	Corte y figuración de acero columnetas y vigas piso 3 Fundida de vigas y columnetas de confinamiento de muros armado piso 3	**95,96%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	1,50%	2,12%		
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	9,85%	9,81%	Levante en mampostería bloque 2 piso 2 y 3 Pañete sobre muro bloque 1 Y 2 piso 2	**99,59%**
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	2,11%	2,10%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,58%	0,05%		
DIVISIONES	0,15%	0,00%		
CIELO FALSO	0,85%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	0,13%	0,00%		
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,00%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,33%	0,02%	Excavación manual para vigas de escalones acceso frontal piso 1 bloque 2, armado de vigas para escalones acceso frontal	**6,06%**
MURO DE CERRAMIENTO	0,86%	3,92%		
RED CONTRA INCENDIOS	0,85%	0,00%		
GAS NATURAL	0,42%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	8,55%	6,47%	Se continua con las instalaciones electrica piso 2 y 3, bloque 2	**75,67%**
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,68%	0,35%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,08%	0,01%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,04%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,03%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,01%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,01%	0,00%		
TOTAL	68,37%	68,13%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	67,81%	67,03%	0,78%
Durante el periodo	0,32%	1,34%	-1,02%
Acumulado Actual	68,13%	68,37%	-0,24%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,34%	68,37%
Valor de la Obra Programada	$ 192.469.052,63	$ 11.444.532.474,16

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,32%	68,13%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 47.968.261,88	$ 10.227.732.837,43

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

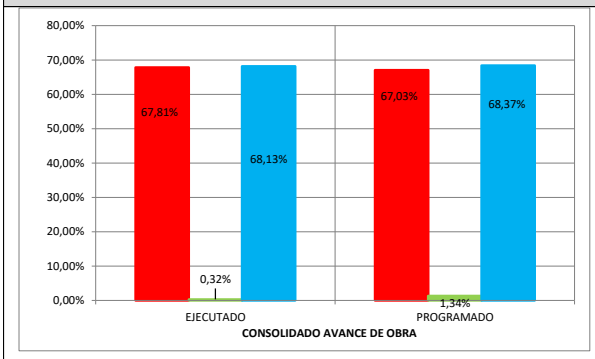

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	DOMINGO	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	SABADO	S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	Vibrador de concreto	2	LUNES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	Mezcladoras	1	MARTES	S
ENCHAPADORES	0	Estación topográfica	0	MIERCOLES	S
ELECTRICISTAS	2	Plumilla	1	JUEVES	S
MAESTRO	1	Pica	7	VIERNES	S
OFICIAL	14	Paladraga	8		
AYUDANTE	30	Martillo, pala, buggy	20		
ALMACENISTA	1	Mini cargador	0	LLUVIOSO (L) NUBLADO (N) SOLEADO (S)	
VIGILANTE	2	Venetin para compactacion	0		
MAQUINISTA	0	Volqueta	1		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación para la próxima semana las actividades a realizar son:
Mampostería bloque 1 y 2 piso 3
Armado, figurado encofrado y fundida de vigetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3
Pañete bloque 2 piso 2
Pañete bloque 1 piso 3
Figuración, armado y fundición de vigas para escalones acceso frontal bloque 2 piso 1
Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 1, 2 y 3

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de - 0,24% entre lo programado con lo ejecutado, presentando un
avance acumulado de las actividades ejecutadas solo de un 68,13%.
Se realizo el figurado, encofrado y fundida de columnetas y vigetas de confinamiento piso 3.
Instalaciones electricas piso 2 Y 3 bloque 1 y 2
Pañete bloque 2 segundo piso y bloque 1 tercer piso
Excavación manual para vigas de escalones, rampa peatonal y vehicular acceso frontal bloque 2 piso 1
Mapostería piso 2 y 3 bloque 1 y 2
El contratista debe iniciar las actividades de acabados e intalacion de cielos rasos, además de los suministros de aires acondicionados, instalación de piso para baños y cocina, estuco, instalación de puertas y ventanas, fundición de mesones e instalación de tubería sanitaria colgante. Ademas de suministro e instalación de subestación y Suministro e instalación de plantra electrica cabinada de 150KVA ya que son items que le ayudaran a reducir el atraso que viene presentando.
Se informeo al contratista que de no aumentar el avance semanal no alcanzará a ejecutar el proyecto en el tiempo estipulado.
Para la presente semana el contratista avanzo un 0,32%, pero este porcentaje no es suficiente para alcanzar el objeto contractual en los tiempos estipulados a la fecha, por lo que se requiere al contratista que implemente las medidas necesarias para que pueda mantener un porcentaje semanal por encima del 5,5%.

Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PEREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PIOS 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGUETAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	9	6	2025	2. No. INFORME	64	3. SEMANA No.	85	
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL: 2/06/2025	AL:	8/06/2025	

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO: $ 12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. SUSPENSIONES:	18	8	2023	11. PLAZO: 19 Meses
12. REINICIO:	29	1	2024	13. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	5	11	2024	14. ADICIONES: $ 2.414.774.705
15. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024	16. SUSPENSIONES:	10	4	2025	17. REINICIO: 12 / 5 / 2025
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 05 (ADICIONAL EN TIEMPO - 2 MES)	9	5	2025	19, TERMINACION	27	7	2025	
20. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE							
21. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C							
22. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			23. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	24. VALOR CONTRATO: $ 1.410.385.620
25. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	26. SUSPENSIONES:	18	8	2024	27. PLAZO: 19 Meses
28. REINICIO:	29	1	2024	29. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES:	5	11	2024	30. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 02 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4	26	12	2024
31. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE							32. FECHA DE TERMINACIÓN:	27	7	2025
33. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							33. SUSPENSIONES:	10	4	2025
34. REINICIO:	12	5	2025	35, TERMINACION	27	7	2025				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


30. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	31. % PROGRAMADO	32. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,55%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	38,21%	39,82%	Corte y figuración de acero columnetas y vigas piso 3 Fundida de vigas y columnetas de confinamiento de muros armado piso 3	**95,96%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	1,50%	2,12%		
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	9,85%	9,81%	Levante en mampostería bloque 2 piso 2 y 3 Pañete sobre muro bloque 1 Y 2 piso 2	**99,59%**
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	2,21%	2,10%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,58%	0,05%		
DIVISIONES	0,15%	0,00%		
CIELO FALSO	1,25%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	0,20%	0,00%		
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,00%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,33%	0,02%	Excavación manual para vigas de escalones acceso frontal piso 1 bloque 2, armado de vigas para escalones acceso frontal	**6,06%**
MURO DE CERRAMIENTO	0,86%	3,92%		
RED CONTRA INCENDIOS	1,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,42%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	8,56%	6,47%	Se continua con las instalaciones electrica piso 2 y 3, bloque 2	**75,58%**
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,80%	0,35%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,08%	0,01%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,05%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,03%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,02%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,02%	0,00%		
TOTAL	69,25%	68,52%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	68,13%	68,37%	-0,24%
Durante el periodo	0,39%	0,88%	-0,49%
Acumulado Actual	68,52%	69,25%	-0,73%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,88%	69,25%
Valor de la Obra Programada	$ 125.751.907,08	$ 11.570.284.381,23

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,39%	68,52%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 58.461.319,16	$ 10.271.204.074,76

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

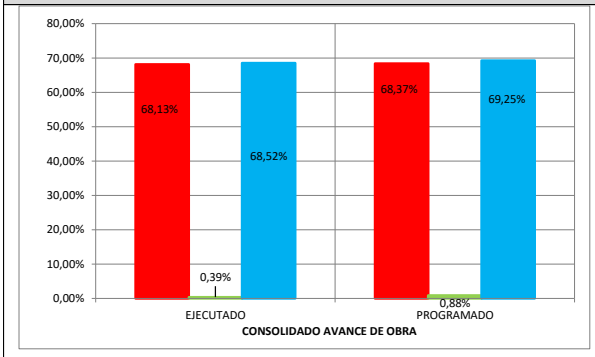

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	DOMINGO	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	SABADO	N
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	Vibrador de concreto	2	LUNES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	Mezcladoras	1	MARTES	N
ENCHAPADORES	0	Estación topográfica	0	MIERCOLES	S
ELECTRICISTAS	2	Plumilla	1	JUEVES	S
MAESTRO	1	Pica	7	VIERNES	N
OFICIAL	14	Paladraga	8	LLUVIOSO (L) NUBLADO (N) SOLEADO (S)	
AYUDANTE	30	Martillo, pala, buggy	20		
ALMACENISTA	1	Mini cargador	0		
VIGILANTE	2	Venetin para compactacion	0		
MAQUINISTA	0	Volqueta	1		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación para la próxima semana las actividades a realizar son:
Mampostería bloque 1 y 2 piso 3
Armado, figurado encofrado y fundida de vigetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3
Pañete bloque 2 piso 2 y 3
Pañete bloque 1 y 2 piso 3
Figuración, armado y fundición de vigas para escalones acceso frontal bloque 2 piso 1
Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 1, 2 y 3
Estuco bloque 2 piso 1
Instalaciones hidráulicas piso 2 bloque 1 y 2

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de - 0,73% entre lo programado con lo ejecutado, presentando un
avance acumulado de las actividades ejecutadas solo de un 68,52%.
Se realizo el figurado, encofrado y fundida de columnetas y vigetas de confinamiento piso 3.
Instalaciones electricas piso 2 Y 3 bloque 1 y 2
Pañete bloque 2 segundo piso y bloque 1 tercer piso
Excavación manual para vigas de escalones, rampa peatonal y vehicular acceso frontal bloque 2 piso 1
Mampostería piso 3 bloque 1
El contratista debe iniciar las actividades de acabados e intalacion de cielos rasos, además de los suministros de aires acondicionados, instalación de piso para baños y cocina, estuco, instalación de puertas y ventanas, fundición de mesones e instalación de tubería sanitaria colgante. Ademas de suministro e instalación de subestación y Suministro e instalación de plantra electrica cabinada de 150KVA ya que son items que le ayudaran a reducir el atraso que viene presentando.
Se informeo al contratista que de no aumentar el avance semanal no alcanzará a ejecutar el proyecto en el tiempo estipulado.
Para la presente semana el contratista avanzo un 0,39%, pero este porcentaje no es suficiente para alcanzar el objeto contractual en los tiempos estipulados a la fecha, por lo que se reitera al contratista que implemente las medidas necesarias para que pueda mantener un porcentaje semanal por encima del 5,5% para avanzar de forma constante en la ejecución de las actividades.

Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PEREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE COLUMNETAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGAS PARA ESCALONES ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2




DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE VIGAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE DE MUROS INTERNOS PISO 2 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	6	2025	2. No. INFORME	65	3. SEMANA No.	86	
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL: 9/06/2025	AL:	15/06/2025	

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO: $ 12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	11. PLAZO: 19 Meses
12. REINICIO:	29	1	2024	13. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	5	11	2024	14. ADICIONES: $ 2.414.774.705
15. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024	16. SUSPENSIONES 2:	10	4	2025	17. REINICIO: 12 5 2025
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 05 (ADICIONAL EN TIEMPO - 2 MES)	12	5	2025	19, TERMINACION	27	7	2025	
20. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE							
21. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C							
22. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			23. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	24. VALOR CONTRATO: $ 1.410.385.620
25. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	26. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	27. PLAZO: 19 Meses
28. REINICIO:	29	1	2024	29. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES:	5	11	2024	30. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 02 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES) 26 12 2024
31. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE							32. FECHA DE TERMINACIÓN: 27 7 2025
33. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							33. SUSPENSIONES 2: 10 4 2025
34. REINICIO 2:	12	5	2025	35, TERMINACION	27	7	2025	

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


30. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	31. % PROGRAMADO	32. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,55%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	38,21%	39,82%	Corte y figuración de acero columnetas y vigas piso 3 Fundida de vigas y columnetas de confinamiento de muros armado piso 3	**95,96%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	2,50%	3,12%	Instalaciones hidraulicas piso 2 bloque 2	**80,13%**
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	9,93%	9,91%	Levante en mampostería bloque 2 piso 3 Pañete sobre muro bloque 1 Y 2 piso 2 y 3	**99,80%**
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	2,21%	2,10%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,58%	0,05%		
DIVISIONES	0,15%	0,00%		
CIELO FALSO	1,30%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	1,12%	0,30%	Estuco plástico para muros bloque 2 piso 1	**26,79%**
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,00%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,34%	0,12%	Fundida de concreto para vigas de escalones, fundida de escalones , Rampa de acceso frontal discapacitados y rampa de acceso vehicular piso 1 bloque 2.	**10,00%**
MURO DE CERRAMIENTO	0,85%	3,92%		
RED CONTRA INCENDIOS	1,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,42%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	8,60%	6,49%	Se continua con las instalaciones electrica piso 2 y 3, bloque 2	**75,47%**
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,85%	0,35%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,08%	0,01%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,05%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,03%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,02%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,02%	0,00%		
TOTAL	71,39%	69,33%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	68,52%	69,25%	-0,73%
Durante el periodo	0,81%	2,14%	-1,33%
Acumulado Actual	69,33%	71,39%	-2,06%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,14%	71,39%
Valor de la Obra Programada	$ 306.297.859,36	$ 11.876.582.240,60

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,81%	69,33%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 121.419.662,88	$ 10.392.623.737,64

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

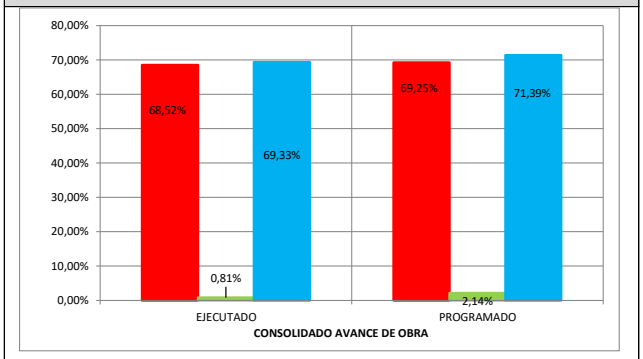

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	DOMINGO	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	SABADO	S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	Vibrador de concreto	2	LUNES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	Mezcladoras	1	MARTES	S
ENCHAPADORES	0	Estación topográfica	0	MIERCOLES	S
ELECTRICISTAS	2	Plumilla	1	JUEVES	S
MAESTRO	1	Pica	7	VIERNES	S
OFICIAL	14	Paladraga	8	LLUVIOSO (L) NUBLADO (N) SOLEADO (S)	
AYUDANTE	30	Martillo, pala, buggy	20		
ALMACENISTA	1	Mini cargador	0		
VIGILANTE	2	Venetin para compactacion	0		
MAQUINISTA	0	Volqueta	1		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación para la próxima semana las actividades a realizar son:
Mampostería bloque 1 y 2 piso 3
Armado, figurado encofrado y fundida de vigetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3
Pañete bloque 1 y 2 piso 2 y 3
Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac
Figuración, armado y fundición de vigas para escalones acceso frontal bloque 2 piso 1
Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 1, 2 y 3
Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado
Sistema Electrico Iluminacion y otros
Gabinetes y Bombas de red contra incendios
Instalacion de Ventanas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de - 2,06% entre lo programado con lo ejecutado, presentando un
avance acumulado de las actividades ejecutadas solo de un 69,33%.
Se realizo el figurado, encofrado y fundida de columnetas y vigetas de confinamiento piso 3.
Instalaciones electricas piso 3 bloque 1 y 2
Pañete bloque 2 segundo piso y bloque 1 tercer piso
Fundida de concreto para vigas de escalones, fundida de escalones , Rampa de acceso frontal discapacitados y rampa de acceso vehicular piso 1 bloque 2.
Mapostería piso 3 bloque 1 y 2
Para la presente semana se dio inicio con la actividad de Estuco plástico para muros ingresando personal nuevo por lo que se requirió Afiliación previa al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP), en contravía de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015. Además, se evidencio que dos de estos trabajadores se encontraban laborando sin el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), lo cual representa una amenaza directa para su integridad física y la de sus compañeros. lo cual incumple el numeral 7.1.4 del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las especificaciones mínimas del Decreto 1072. Por lo que se le oficio al contratista informado que estas actividades son bajo su cuenta y riesgo ya que hasta la fecha no ha presentado las afiliaciones de este personal y no cuentan con la dotacion de estos.
Se expone que, la Interventoría en virtud de sus funciones y mediante el análisis semanal informe 85 revisado por oficio CIP-V1-2025-090 de 12 de junio 2025, la obra actualmente cuenta con un porcentaje de avance programado del 71,39% frente a un acumulado ejecutado del 69,33%, teniendo un atraso del 2,06%. Al presente, el Contratista cuenta con la cantidad de personal operativo necesario para poder adelantar diferentes actividades técnicas, sin embargo, no se han realizado debido a la falta de suministro de materiales en obra
Solicitamos al Contratista su disposición para el respectivo y oportuno despacho y suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución y continuidad de la obra, siendo esta una de las obligaciones contractuales del Contratista, CONSORCIO EP-C, estipulada en el Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5) Ejecutar el contrato tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto. 6) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. Se le reitera al Contratista, que implemente un plan de contingencia acompañado de un plan de compras que le ayude a mitigar el atraso presentado, puesto que, de continuar con el mismo ritmo de trabajo, no alcanzará a culminar la obra en el tiempo estipulado y esto conllevará a que se le impongan multas por atrasos en la ejecución y entrega de la obra. Tal como se estipula en el Contrato de obra No. L-AM-CS-001-01-23- CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del Contratista, el CONTRATANTE podrá imponer mediante resolución motivada, multas en proporción a los términos previstos del monto del contrato. Su valor total se podrá hacer efectivo de la respectiva póliza que garantiza el cumplimiento del contrato.

Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PEREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 3



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 3



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 3



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 3



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BLOQUE 1 PISO 3



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 1 PISO 3



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 1 PISO 3



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 1 PISO 3



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 3



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 3



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MALLA PARA RAMPA PEATONAL ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MALLA PARA RAMPA PEATONAL ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MALLA PARA RAMPA PEATONAL ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA PEATONAL ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA PEATONAL ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA PEATONAL ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA PEATONAL ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES HIDRÁULICAS BLOQUE 2 PISO 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES HIDRÁULICAS BLOQUE 1 PISO 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 1 PISO 3



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS BLOQUE 1 PISO 3



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 2 PISO 3



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE ESCALONES ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE ESCALONES ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE ESCALONES ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE ACERO PARA RAMPA VEHICULAR ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA VEHICULAR ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE ACERO PARA RAMPA VEHICULAR ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA VEHICULAR ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA VEHICULAR ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 1 PISO 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE RAMPA VEHICULAR ACCESO FRONTAL BLOQUE 2 PISO 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	6	2025	2. No. INFORME	65	3. SEMANA No.	87	
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL: 16/06/2025	AL:	22/06/2025	

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO: $ 12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	11. PLAZO: 19 Meses
12. REINICIO:	29	1	2024	13. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	5	11	2024	14. ADICIONES: $ 2.414.774.705
15. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024	16. SUSPENSIONES 2:	10	4	2025	17. REINICIO: 12 / 5 / 2025
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 05 (ADICIONAL EN TIEMPO - 2 MES)	12	5	2025	19, TERMINACION	27	7	2025	
20. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE							
21. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C							
22. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			23. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	24. VALOR CONTRATO: $ 1.410.385.620
25. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	26. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	27. PLAZO: 19 Meses
28. REINICIO:	29	1	2024	29. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES:	5	11	2024	30. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 02 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES) 26 / 12 / 2024
31. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE							32. FECHA DE TERMINACIÓN: 27 / 7 / 2025
33. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							33. SUSPENSIONES 2: 10 / 4 / 2025
34. REINICIO 2:	12	5	2025	35, TERMINACION	27	7	2025	

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


30. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	31. % PROGRAMADO	32. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,55%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	38,21%	39,82%	Corte y figuración de acero columnetas y vigas piso 3 Fundida de vigas y columnetas de confinamiento de muros armado piso 3	**95,96%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	2,50%	3,12%	Instalaciones hidraulicas piso 2 bloque 2	**80,13%**
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	9,93%	9,91%	Levante en mampostería bloque 2 piso 3 Pañete sobre muro bloque 1 Y 2 piso 2 y 3	**99,80%**
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	2,25%	2,10%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,62%	0,05%		
DIVISIONES	0,15%	0,00%		
CIELO FALSO	1,33%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	1,82%	0,70%	Estuco plástico para muros bloque1 y 2 piso 1	**38,46%**
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,00%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,34%	0,12%		
MURO DE CERRAMIENTO	0,85%	3,92%		
RED CONTRA INCENDIOS	1,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,42%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	8,60%	6,51%	Se continua con las instalaciones electrica piso 2 y 3, bloque 2	**75,70%**
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,85%	0,35%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,08%	0,01%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,05%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,03%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,02%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,02%	0,00%		
TOTAL	72,20%	69,75%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	69,33%	71,39%	-2,06%
Durante el periodo	0,42%	0,81%	-0,39%
Acumulado Actual	69,75%	72,20%	-2,45%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,81%	72,20%
Valor de la Obra Programada	$ 115.895.061,65	$ 11.991.182.667,94

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,42%	69,75%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 62.958.343,72	$ 10.455.582.081,36

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

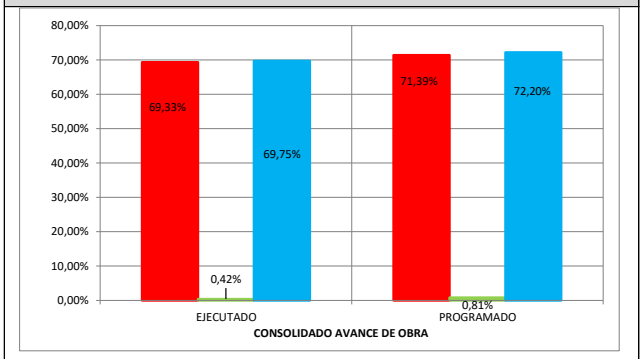

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA	
CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ENCHAPADORES	0
ESTUCADORES	3
ELECTRICISTAS	2
MAESTRO	1
OFICIAL	13
AYUDANTE	29
ALMACENISTA	1
VIGILANTE	2
MAQUINISTA	0

36. EQUIPOS EN OBRA	
EQUIPO	CANTIDAD
PC	1
PC	1
Vibrador de concreto	2
Mezcladoras	1
Estación topográfica	0
Plumilla	1
Pica	7
Paladraga	8
Martillo, pala, buggy	20
Mini cargador	0
Venetin para compactacion	0
Volqueta	1

37. ESTADO DEL TIEMPO	
DIA	ESTADO
DOMINGO	S
SABADO	S
LUNES	N
MARTES	N
MIERCOLES	S
JUEVES	S
VIERNES	S

LLUVIOSO (L)
NUBLADO (N)
SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación para la próxima semana las actividades a realizar son:
Mampostería bloque 1 y 2 piso 3
Armado, figurado encofrado y fundida de vigetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3
Pañete bloque 1 y 2 piso 2 y 3
Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac
Figuración, armado y fundición de vigas para escalones acceso frontal bloque 2 piso 1
Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 1, 2 y 3
Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado
Sistema Electrico Iluminacion y otros
Gabinetes y Bombas de red contra incendios
Instalacion de Ventanas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de - 2,45% según reprogramacion actualizada, presentando un
avance acumulado de las actividades ejecutadas solo de un 69,75%.
Se realizo el figurado, encofrado y fundida de columnetas y vigetas de confinamiento piso 3.
Instalaciones electricas piso 3 bloque 1 y 2
Pañete bloque 2 segundo piso y bloque 1 tercer piso
Mapostería piso 3 bloque 1 y 2
Se expone que, la Interventoría en virtud de sus funciones y mediante el análisis y teniendo encuenta el avance de esta semana, la obra actualmente cuenta con un porcentaje de avance programado del 72,20% frente a un acumulado ejecutado del 69,75%, teniendo un atraso del -2,45%. Al presente, el Contratista cuenta con la cantidad de personal operativo necesario para poder adelantar diferentes actividades técnicas, sin embargo, no se han realizado debido a la falta de suministro de materiales en obra
Solicitamos al Contratista su disposición para el respectivo y oportuno despacho y suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución y continuidad de la obra, siendo esta una de las obligaciones contractuales del Contratista, CONSORCIO EP-C, estipulada en el Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5) Ejecutar el contrato tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto. 6) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. Se le reitera al Contratista, que implemente un plan de contingencia acompañado de un plan de compras que le ayude a mitigar el atraso presentado, puesto que, de continuar con el mismo ritmo de trabajo, no alcanzará a culminar la obra en el tiempo estipulado y esto conllevará a que se le impongan multas por atrasos en la ejecución y entrega de la obra. Tal como se estipula en el Contrato de obra No. L-AM-CS-001-01-23- CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del Contratista, el CONTRATANTE podrá imponer mediante resolución motivada, multas en proporción a los términos previstos del monto del contrato. Su valor total se podrá hacer efectivo de la respectiva póliza que garantiza el cumplimiento del contrato.

Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE PARA ASTAS DE BANDERAS ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE PARA ASTAS DE BANDERAS ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE PARA ASTAS DE BANDERAS ACCESO FRONTAL PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: VISITA DE OBRA MINISTERIOR DEL INTERIOR, ALCALDÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA



DESCRIPCIÓN: VISITA DE OBRA MINISTERIOR DEL INTERIOR, ALCALDÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA



DESCRIPCIÓN: VISITA DE OBRA MINISTERIOR DEL INTERIOR, ALCALDÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA



DESCRIPCIÓN: VISITA DE OBRA MINISTERIOR DEL INTERIOR, ALCALDÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MURO DE CERRAMIENTO



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MURO DE CERRAMIENTO



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MURO DE CERRAMIENTO



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE ACERO PARA MESÓN GUARDIA PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE ACERO PARA MESÓN GUARDIA PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE ACERO PARA MESÓN GUARDIA PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESÓN GUARDIA PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESÓN GUARDIA PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESÓN GUARDIA PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1




DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2




DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1 Y 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1 Y 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1 Y 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PISO 3 BLOQUE 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	6	2025	2. No. INFORME	88	3. SEMANA No.	88	
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL: 23/06/2025	AL:	29/06/2025	

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO: $ 12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	11. PLAZO: 19 Meses
12. REINICIO:	29	1	2024	13. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	5	11	2024	14. ADICIONES: $ 2.414.774.705
15. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024	16. SUSPENSIONES 2:	10	4	2025	17. REINICIO: 12 5 2025
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 05 (ADICIONAL EN TIEMPO - 2 MES)	12	5	2025	19, TERMINACION	27	7	2025	
20. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE							
21. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C							
22. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			23. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	24. VALOR CONTRATO: $ 1.410.385.620
25. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	26. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	27. PLAZO: 19 Meses
28. REINICIO:	29	1	2024	29. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES:	5	11	2024	30. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 02 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES) 26 12 2024
31. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE							32. FECHA DE TERMINACIÓN: 27 7 2025
33. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							33. SUSPENSIONES 2: 10 4 2025
34. REINICIO 2:	12	5	2025	35, TERMINACION	27	7	2025	

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


30. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	31. % PROGRAMADO	32. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,55%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	38,21%	39,82%	Corte y figuración de acero columnetas y vigas piso 3 Fundida de vigas y columnetas de confinamiento de muros armado piso 3	**95,96%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	2,50%	3,12%	Instalaciones hidraulicas piso 2 bloque 2	**80,13%**
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	9,10%	8,97%	Levante en mampostería bloque 2 piso 3 Pañete sobre muro bloque 1 Y 2 piso 2 y 3	**98,57%**
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	2,68%	2,10%		
PUERTAS Y VENTANAS	1,02%	0,10%		
DIVISIONES	0,63%	0,00%		
CIELO FALSO	1,33%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	2,82%	1,40%	Estuco plástico para muros bloque1 y 2 piso 1	**49,65%**
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,00%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,47%	0,12%		
MURO DE CERRAMIENTO	0,85%	3,92%		
RED CONTRA INCENDIOS	1,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,42%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	8,76%	7,30%	Se continua con las instalaciones electrica piso 2 y 3, bloque 2	**83,33%**
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,85%	0,35%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,92%	0,01%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,05%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,68%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,16%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,05%	0,00%		
TOTAL	75,63%	70,35%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	69,75%	72,10%	-2,35%
Durante el periodo	0,60%	3,53%	-2,93%
Acumulado Actual	70,35%	75,63%	-5,28%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,53%	75,63%
Valor de la Obra Programada	$ 506.215.678,18	$ 10.836.474.300,53

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,60%	70,35%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 89.940.491,02	$ 10.545.522.572,38

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

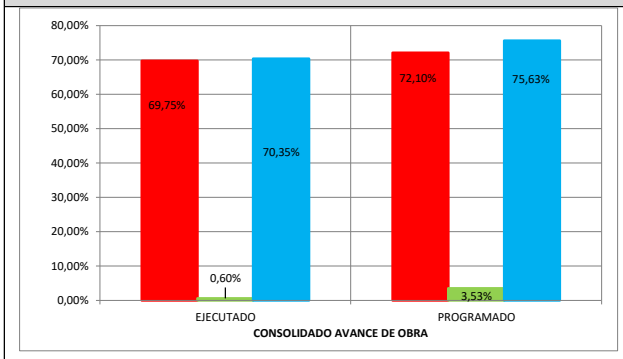

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	DOMINGO	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	SABADO	S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	Vibrador de concreto	2	LUNES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	Mezcladoras	1	MARTES	S
ENCHAPADORES	0	Estación topográfica	0	MIERCOLES	S
ELECTRICISTAS	2	Plumilla	1	JUEVES	S
MAESTRO	1	Pica	7	VIERNES	N
OFICIAL	13	Paladraga	8		
AYUDANTE	29	Martillo, pala, buggy	20		
ALMACENISTA	1	Mini cargador	0	LLUVIOSO (L) NUBLADO (N) SOLEADO (S)	
VIGILANTE	2	Venetin para compactacion	0		
ESTUCADORES	2	Volqueta	1		
MAQUINISTA	0				

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación para la próxima semana las actividades a realizar son:
Mampostería bloque 1 y 2 piso 3
Armado, figurado encofrado y fundida de vigetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3
Pañete bloque 1 y 2 piso 3
Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac
Figuración, armado y fundición de parqueadero frontal
Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 3
Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado
Instalacion de aires acondicionados
Gabinetes y Bombas de red contra incendios
Instalacion de puertas y ventanas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de - 5,28% según reprogramacion actualizada, presentando un
avance acumulado de las actividades ejecutadas solo de un 70,35%.
Se realizo el figurado, encofrado y fundida de columnetas y vigetas de confinamiento piso 3.
Instalaciones electricas piso 3 bloque 1 y 2
Pañete bloque 2 segundo piso y bloque 1 tercer piso
Mapostería piso 3 bloque 1 y 2
Se expone que, la Interventoría en virtud de sus funciones y mediante el análisis y teniendo encuenta el avance de esta semana, la obra actualmente cuenta con un porcentaje de avance programado del 75,63% frente a un acumulado ejecutado del 70,35%, teniendo un atraso del -5,28%. Al presente, el Contratista cuenta con la cantidad de personal operativo en obra para adelantar diferentes actividades técnicas, sin embargo, no se han realizado debido a la falta de suministro y disponiblilidad suficientes de materiales en obra, que puedan ayudar a aumentar blos rendimientos y avance en la obra.
Nuevamente reiteramos al Contratista su disposición para el respectivo y oportuno despacho y suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución y continuidad de la obra, siendo esta una de las obligaciones contractuales del Contratista, CONSORCIO EP-C, estipulada en el Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5) Ejecutar el contrato tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto. 6) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. Se le reitera al Contratista, que implemente un plan de contingencia acompañado de un plan de compras que le ayude a mitigar el atraso presentado, puesto que, de continuar con el mismo ritmo de trabajo, no alcanzará a culminar la obra en el tiempo estipulado y esto conllevará a que se le impongan multas por atrasos en la ejecución y entrega de la obra. Tal como se estipula en el Contrato de obra No. L-AM-CS-001-01-23- CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del Contratista, el CONTRATANTE podrá imponer mediante resolución motivada, multas en proporción a los términos previstos del monto del contrato. Su valor total se podrá hacer efectivo de la respectiva póliza que garantiza el cumplimiento del contrato.

Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PEREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE COLUMNETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ENCOFRE DE COLUMNETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MESÓN PARA COCINA PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESÓN PARA DESPENSA DE COCINA PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESÓN PARA BAÑO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESÓN PARA COCINA PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESÓN PARA BAÑO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	7	2025	2. No. INFORME	89			3. SEMANA No.	89		
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL:	30/06/2025	AL:	6/07/2025			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	12.575.307.132	
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	11. PLAZO:	19	Meses	
12. REINICIO:	29	1	2024	13. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 03 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES)	5	11	2024	14. ADICIONES:	$	2.414.774.705	
15. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 04 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024	16. SUSPENSIONES 2:	10	4	2025	17. REINICIO:	12	5	2025
18. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 05 (ADICIONAL EN TIEMPO - 2 MES)	12	5	2025	19, TERMINACION	27	7	2025				
20. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE										
21. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C										
22. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			23. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	24. VALOR CONTRATO:	$	1.410.385.620	
25. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	26. SUSPENSIONES 1:	18	8	2023	27. PLAZO:	19	Meses	
28. REINICIO:	29	1	2024	29. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 01 (ADICIONAL EN TIEMPO - 1 MES:	5	11	2024	30. OTRO SÍ MODIFICATORIO Nº 02 (ADICIONAL EN TIEMPO - 4 MES)	26	12	2024
31. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE							32. FECHA DE TERMINACIÓN:	27	7	2025
33. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL							33. SUSPENSIONES 2:	10	4	2025
34. REINICIO 2:	12	5	2025	35, TERMINACION	27	7	2025				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


30. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	31. % PROGRAMADO	32. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	33. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,55%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	38,21%	39,82%	Corte y figuración de acero columnetas y vigas piso 3 Fundida de vigas y columnetas de confinamiento de muros armado piso 3	**95,96%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	2,50%	3,12%	Instalaciones hidraulicas piso 2 bloque 2	**80,13%**
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	9,10%	9,30%	Levante en mampostería bloque 2 piso 3 Pañete sobre muro bloque 1 Y 2 piso 2 y 3	**102,20%**
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	2,68%	2,10%		
PUERTAS Y VENTANAS	1,02%	0,10%		
DIVISIONES	0,71%	0,02%	Armado de mesones para baños piso 2 bloque 1 - Fundición de mesones para baños piso 1 bloque 2	
CIELO FALSO	1,55%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	2,99%	1,70%	Estuco plástico para muros bloque1 y 2 piso 1 y 2	**56,86%**
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,34%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,51%	0,12%		
MURO DE CERRAMIENTO	0,85%	3,92%		
RED CONTRA INCENDIOS	1,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,42%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	9,29%	7,50%	Se continua con las instalaciones electrica piso 2 y 3, bloque 2	**80,73%**
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,85%	0,35%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	1,10%	0,01%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,05%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	1,01%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,16%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,05%	0,00%		
TOTAL	77,52%	71,20%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	70,35%	75,63%	-5,28%
Durante el periodo	0,85%	1,89%	-1,04%
Acumulado Actual	71,20%	77,52%	-6,32%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,89%	77,52%
Valor de la Obra Programada	$ 270.368.172,54	$ 11.106.842.473,07

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,85%	71,20%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 127.415.695,62	$ 10.672.938.267,99

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

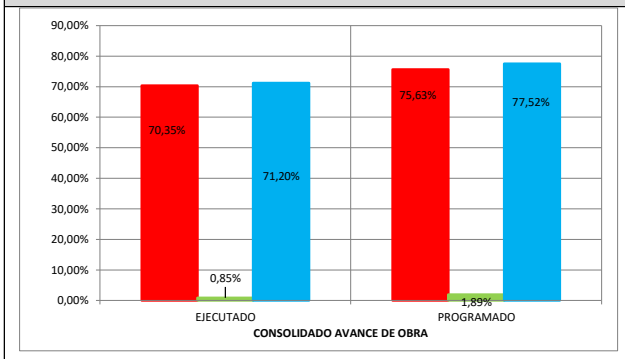

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	DOMINGO	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	SABADO	L
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	Vibrador de concreto	2	LUNES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	Mezcladoras	1	MARTES	S
ENCHAPADORES	0	Estación topográfica	0	MIERCOLES	S
ELECTRICISTAS	3	Plumilla	1	JUEVES	S
MAESTRO	1	Pica	7	VIERNES	L
OFICIAL	13	Paladraga	8		
AYUDANTE	28	Martillo, pala, buggy	20		
ALMACENISTA	1	Mini cargador	0	LLUVIOSO (L) NUBLADO (N) SOLEADO (S)	
VIGILANTE	2	Venetin para compactacion	0		
ESTUCADORES	5	Volqueta	1		
MAQUINISTA	0				

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación para la próxima semana las actividades a realizar son:
Mampostería bloque 1 y 2 piso 3
Armado, figurado encofrado y fundida de vigetas columnetas pisos bloque 1 y 2 piso 3
Pañete bloque 1 y 2 piso 3
Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac
Figuración, armado y fundición de parqueadero frontal
Instalaciones eléctricas, tomas, tubería PVC y cajas bloque 1 y 2 piso 3
Suministro e Instalacion de Red de refrigeración para equipos de aire acondiconado
Instalacion de aires acondicionados
Gabinetes y Bombas de red contra incendios
Instalacion de puertas y ventanas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de - 6,32% según reprogramacion actualizada, presentando un
avance acumulado de las actividades ejecutadas solo de un 71,20%.
Se realizo el figurado, encofrado y fundida de columnetas y vigetas de confinamiento piso 3.
Instalaciones electricas piso 3 bloque 1 y 2
Pañete bloque 1 tercer piso
Se adelantaron actividades en la construccion de mesones de baños, estuco de primer y segundo piso, instalaciones hidro sanitarias tercer piso.
Se expone que, la Interventoría en virtud de sus funciones y mediante el análisis y teniendo encuenta el avance de esta semana, la obra actualmente cuenta con un porcentaje de avance programado del 77,52% frente a un acumulado ejecutado del 71,20%, teniendo un atraso del -6,32%. Al presente, el Contratista cuenta con la cantidad de personal operativo en obra para adelantar diferentes actividades técnicas, sin embargo, el tiempo restante no es suficiente para culminar con las actividades faltantes en obra por lo que el contratista solicitara la adicion de dos meses mas a esta interventoria y al municipio. Esto esta sujeto a la solicitud del municipio de ampliacion del convenio ante el ministerio del interior.
Nuevamente al Contratista se le reitera el respectivo y oportuno despacho para los suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución y continuidad de la obra, siendo esta una de las obligaciones contractuales del Contratista, CONSORCIO EP-C, estipulada en el Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5) Ejecutar el contrato tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto. 6) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. Se le reitera al Contratista, que implemente un plan de contingencia acompañado de un plan de compras que le ayude a mitigar el atraso presentado, puesto que, de continuar con el mismo ritmo de trabajo, no alcanzará a culminar la obra en el tiempo estipulado y esto conllevará a que se le impongan multas por atrasos en la ejecución y entrega de la obra. Tal como se estipula en el Contrato de obra No. L-AM-CS-001-01-23- CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del Contratista, el CONTRATANTE podrá imponer mediante resolución motivada, multas en proporción a los términos previstos del monto del contrato. Su valor total se podrá hacer efectivo de la respectiva póliza que garantiza el cumplimiento del contrato.

Nombre: ERICK CAMARGO MORALES
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PEREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MESONES PARA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MESONES PARA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESONES PARA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MESONES PARA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1




DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES HIDRÁULICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES HIDRÁULICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESONES PARA BAÑOS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESONES PARA BAÑOS PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE MESONES PARA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN:MAMPOSTERÍA PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES HIDRÁULICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN:MAMPOSTERÍA PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN:MAMPOSTERÍA PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN:MAMPOSTERÍA PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: PAÑETE PARA MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN DE VIGUETAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: LEVANTE DE MUROS INTERNOS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: MAMPOSTERÍA PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: ARMADO DE MESONES PARA BAÑOS PISO 2 BLOQUE 1



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO 3 BLOQUE 2



DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLÁSTICO PISO 1 BLOQUE 2

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

REPROGRAMACIÓN DE VISITA DE VERIFICACIÓN CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 3 de junio de 2025, 7:30 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA TRESPALACIO
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisora Convenio No. 1914-2022
Municipio de Corozal

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Reprogramación Visita de Verificación

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto (...)*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE "(...),* se informa al Municipio de Corozal que la visita programada para el 5 y 6 de junio de 2025 fue reprogramada teniendo en cuenta que ala fecha no se ha remitido por parte del Municipio los balances y memorias de mapeo que soporten la ejecución del 60%, documentos necesarios para adelantar la visita programada por parte del Ministerio del Interior.

Por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, solicitan se remita la información indicada de manera inmediata que permita verificarla y programar la fecha de la visita.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ENTREGA DE INFORMACIÓN PERTINENTE

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, <consorcioepc23@gmail.com>
Cc <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-04 4:28 pm

OFICIO CIP-V1-2025-085.pdf (~166 KB) INFORME SEMANAL COROZAL 82.xlsx (~3,6 MB) INFORME SEMANAL COROZAL 83.xlsx (~6,4 MB)
Flujo de caja por Actividad - (Cronograma de obra fin Julio 2025).xlsx (~612 KB) INFORME DE CUADRILLAS.pdf (~201 KB)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CORTE 30 MAYO 2025.pdf (~5,5 MB) CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA.pdf (~3,1 MB)

Corozal, Sucre, 04 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCR

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA N° 15 - 2025.pdf
ACTA N° 6 60,01%.xlsx
E".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de información pertinente según observaciones.

Cordial saludo,

Mediante el presente, la Interventoría en virtud de sus funciones y cumpliendo a cabalidad con la información requerida por la secretaria de Planeación Municipal de Corozal, se hace entrega de los siguientes documentos:

1. Informe semanal de avance de interventoría N° 82 y N° 83.
2. Informe mensual de interventoría N° 15, corte mes de abril de 2025.
3. Cronograma de obra julio 2025.
4. Informe de cuadrillas.
5. Acta N°6 remitida por el Consorcio EP-C con las respectivas memorias de cantidades.
6. Registro fotográfico de avance de obra con corte de 30 de mayo de 2025.
7. Certificado de avance de obra, 60.01%.

Oficio 0399/SPM-2025

Corozal, junio 5 de 2025.

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

Con copia,

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Ministerio del Interior

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior

REFERENCIA: Contrato de Obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Solicitud de información pendiente y observaciones al acta parcial.

Cordial saludo:

En cumplimiento de los compromisos acordados en el pasado comité de seguimiento virtual llevado a cabo el día 26 de mayo de 2025, me permito solicitar de manera urgente la siguiente información:

1. Actualización de pólizas según acta modificatoria No. 5 del contrato de obra y acta modificatoria No. 3 del contrato de interventoría.
2. Carta de interventoría para el mes adicional según lo manifestado por el contratista en el comité de seguimiento.

3. Informe semanal de avance de interventoría No. 84 y 85.
4. Informe mensual de obra e interventoría correspondiente al mes de mayo de 2025.

De igual manera se reitera la remisión del informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.

Respecto al acta parcial No. 6, correspondiente al 60% de ejecución de actividades en obra, se remiten las siguientes observaciones:

- Ítems 17.61,18.06, 18.07 y 18.08, las memorias de cantidades no coinciden con el valor acumulado en el Acta No. 6.
- La memoria de cantidad del ítem 17.67 no está anexa en el archivo del Acta.
- Las memorias de cantidades no contienen fotografías que evidencien la ejecución de la actividad.
- Las memorias de cantidades de los ítems 4.15, 19.01, 19.02 y 19.03 no contiene mapeo de imágenes de referencia, ni registro fotográfico.

Es preciso manifestar que, las demoras en el reporte de información por parte de la interventoría, repercute en el trámite que desde la supervisión se haga al Ministerio del Interior para efectos del tercer desembolso correspondiente al 60% del avance según el cronograma de actividades, máxime cuando nos encontramos a menos dos meses de terminar el convenio.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – Apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0415/SPM-2025

Corozal, junio 10 de 2025.

Coronel
AIMER FREDY ALONSO TRIANA
Comandante Departamento de Policía de Sucre

ASUNTO: Citación comité de seguimiento virtual Convenio 1914 de 2022.

Cordial saludo:

En el marco de los compromisos contractuales derivados del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, celebrado entre el Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior, y conforme a citación de la supervisión del Ministerio, se convoca a comité de seguimiento virtual para el día jueves 12 de junio de 2025, de 8:00 a 9:00 a.m.; con el objetivo de evaluar el estado actual de la ejecución física del contrato de obra, así como la situación jurídica del mismo, ya que de acuerdo al cronograma del convenio, la obra tiene prevista como fecha de terminación el 26 de junio de 2025.

El link de la reunión se compartirá media hora antes de iniciar la misma.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Perez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

ATRASO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <consorcioepc23@gmail.com>
Cc <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha 2025-06-10 3:41 pm

OFICIO CIP-V1-2025-087.pdf (~184 KB)

Corozal, Sucre, 10 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Atraso de ejecución de actividades en obra.

CIP-V1-2025-087

Corozal, Sucre, 10 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Atraso de ejecución de actividades en obra.

Cordial saludo,

Mediante el presente, la Interventoría en virtud de sus funciones, y haciendo una revisión exhaustiva de lo que se encuentra actualmente en obra. Se tiene que, el Contratista al presente cuenta con la cantidad de personal operativo necesario para poder adelantar diferentes actividades técnicas, sin embargo, no se han realizado debido a la falta de suministro de materiales en obra.

A continuación, se presentan las actividades que se pueden ejecutar y sus especificaciones:

1. Instalación de ventanas piso 2 Bloque 1: los vanos se encuentran listos y no se ha iniciado con la instalación.
2. Instalación de puertas piso 1 Bloque 1 y Bloque 2, y piso 2 Bloque 1: los vanos se encuentran terminados, pero no se ha iniciado su instalación.
3. Estuco piso 1 Bloque 1 y Bloque 2, y piso 2 Bloque 1: la mampostería se encuentra finalizada y completamente pañetada, pero no se ha dado inicio a esta actividad, aun cuando el material ya se encuentra disponible en obra.
4. Instalación de piso para baños piso 1 Bloque 1 y Bloque 2; y piso 2 Bloque 1 y Bloque 2: la actividad no se ha ejecutado por falta de suministro de material, pese a que los espacios ya se encuentran listos para la misma.

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

5. Instalación de piso de cocina piso 1 Bloque 1: no se ha efectuado esta actividad por falta de material específico para la misma.
6. Instalación de tubería sanitaria colgante piso 2 Bloque 1 y Bloque 2: no se ha iniciado la actividad por falta de suministro de material.
7. Fundición de mesones para los siguientes espacios:
   - ✓ Guardia, piso 1 Bloque 2.
   - ✓ Cocina, piso 1 Bloque 2.
   - ✓ Baños, piso 1 Bloque 1 y Bloque 2.
   - ✓ Baños, piso 2 Bloque 1.
8. Instalación de cielo raso piso 1 Bloque 1 y Bloque 2, y piso 2 Bloque 1.
9. Cableado para instalaciones eléctricas Bloque 1 y Bloque 2 piso 1, 2 y 3.

Agradecemos y solicitamos al Contratista su disposición para el respectivo y oportuno despacho y suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución y continuidad de la obra, siendo esta una de las obligaciones contractuales del Contratista, CONSORCIO EP-C, estipulada en el **Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5)** Ejecutar el contrato tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto. **6)** Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Esta solicitud se realiza con el propósito de velar por el cumplimiento de todas las actividades, puesto que la baja cantidad de materiales disminuye el rendimiento y avance de la construcción.

Agradecemos su pronta atención y respuesta a este requerimiento, informando a esta Interventoría el despacho y entrega de los materiales en obra.

Atentamente,

Oscar Carrascal S.

OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
R.L. CONSORCIO I-POLICE
Interventoría

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

Oficio 0414/SPM-2025

Corozal, junio 10 de 2025.

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

CONSORCIO EP-C
Atn: **ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA**
Representante legal

ASUNTO: Citación comité de seguimiento virtual Convenio 1914 de 2022.

Cordial saludo:

En el marco de los compromisos contractuales derivados del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, celebrado entre el Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior, y conforme a citación de la supervisión del Ministerio, se convoca a comité de seguimiento virtual para el día jueves 12 de junio de 2025, de 8:00 a 9:00 a.m.; con el objetivo de evaluar el estado actual de la ejecución física del contrato de obra, así como la situación jurídica del mismo, ya que de acuerdo al cronograma del convenio, la obra tiene prevista como fecha de terminación el 26 de junio de 2025.

Se solicita al contratista de interventoría organizar la presentación del informe de avances con el respectivo registro fotográfico del avance real a la fecha. Además, se solicita la presencia indelegable de los representantes legal de los consorcios en la reunión.

El link de la reunión se compartirá media hora antes de iniciar la misma.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO No.. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 10 de junio de 2025, 4:32 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 10 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Citación Comité de seguimiento.

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, y teniendo en cuenta el estado del proyecto a la fecha, se convoca a comité de seguimiento virtual al Señor Alcalde y Supervisión del Convenio el jueves 12 de junio de 2025 a las 10:00 am, para realizar seguimiento a los compromisos de los comités anteriores.

De igual manera se debe contar con la totalidad de la documentación que soporte el avance del 60% del proyecto, con el fin de poder agendar la visita de verificación al proyecto.

El siguiente es el link mediante el cual se pueden unir a la reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY2ODdlMzQtMzE3ZC00MTdkLTkzNmMtMmY2YzYwNzk1ZWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2218ebd6cb-7f4b-43d2-bcd7-9c7c33ae6626%22%7d

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

De Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Destinatario PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
Cc Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-11 10:37 am

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Posible Incumplimiento de obligaciones del Convenio No. 1914-2022

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del interior solicita el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

(...) "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

3) Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, acta que deberá contener los hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros. El cronograma deberá ser aprobado por escrito por el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR. Los eventuales ajustes al cronograma deberán sustentarse técnicamente, y serán evaluados y aprobados previamente por el supervisor designado por el MINISTERIO DEL INTERIOR.

El Municipio de Corozal, no está dando cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que indicó al Ministerio del Interior que se habían prorrogado los contratos derivados por 2 meses, sin embargo, a la fecha no ha remitido los cronogramas de ejecución de los contratos derivados, ni tampoco el cronograma del convenio. Los cronogramas se debían haber remitido 5 días después de la suscripción de los modificatorios, los cuales se suscribieron el 10 de mayo de 2025.

7) Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.

El Municipio de Corozal, no está dando cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que a la fecha no ha remitido la actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

13) Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que no ha remitido los documentos que certifiquen el cumplimiento de la citada obligación. parafiscales. → oficio. consorcio

31) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el informe financiero del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y mayo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025).

Con respecto al Informe del mes de abril de 2025, solo se remitió el correspondiente a la cuenta en la cual se manejan los recursos del Ministerio del Interior, no se remitió el informe de la cuenta donde se manejan los recursos del Municipio de Corozal.

35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el informe de supervisión del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y mayo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025). Así mismo, no ha remitido los informes del Contrato de Estudios, diseños y obra del mes de marzo, abril y mayo de 2025, e informes del Contrato de Interventoría a los Estudios, diseños y obra del mes de mayo de 2025.

De igual manera verificando la plataforma SECOP II y SECOP I (Contratación derivada), el Municipio de Corozal, no ha publicado:

1. Informes de supervisión desde el mes de enero de 2024, los cuales deben incluir los informes financieros y extractos mensuales.
2. Informes de los Contratos de Estudios, diseños, obra.
3. Informes de los Contratos de Interventoría a los Estudios, Diseños, Obra.

36) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el informe de supervisión del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y mayo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025).

37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que no ha remitido el Informe Semanal de Interventoría No. 83 con corte al 24 de mayo de 2025, Informe semanal de interventoría No. 84 con corte al 1 de junio de 2025, informe semanal de interventoría No. 85 con corte al 8 de junio de 2025.

39) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de estudios, diseños y obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico.

El Municipio de Corozal, no ha remitido las modificaciones de los contratos derivados por los 2 meses de prórroga, con los soportes de aprobación de la interventoría, pólizas y aprobación de pólizas.

51) Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligación, temiendo en cuenta que no ha remitido a la fecha el extracto bancario del mes de abril de 2025 (vencimiento de la entrega 8 de mayo de 2025) y amyo de 2025 (vencimiento en la entrega el 7 de junio de 2025).

Con respecto al Informe del mes de abril de 2025, solo se remitió el correspondiente a la cuenta en la cual se manejan los recursos del Ministerio del Interior, no se remitió el informe de la cuenta donde se manejan los recursos del Municipio de Corozal.

57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

El Municipio de Corozal, no ha dado cumplimiento a la obligacipon, teniendo en cuenta que ante los atrasos del contratista de obra e interventoría de obra, no ha remitido los soportes de las acciones adelantadas a los mismos.

En consecuencia, se solicita al Señor Alcalde del Municipio de Corozal y su supervisión, dar cumplimiento a las obligaciones pendientes a la fecha, remitiendo de manera inmediata la información al Ministerio del Interior.

Es necesario recordar que para el trámite de desembolso por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal, además del cumplimiento de requisitos plasmados en la minuta del Convenio No. 1914 de 2022, se debe dar cumplimiento a cada una de las obligaciones del citado convenio.

De igual manera, de no dar cumplimiento de manera inmediata el Ministerio del Interior tramitará ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

OBSERVACIONES INFORME Y SOPORTES FINANCIEROS - CONVENIO No. 1914-2020 MUNICIPIO DE COROZAL

De Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Destinatario PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
Cc Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-11 5:22 pm

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Observaciones Informe y soportes Financieros

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior remite observaciones al Municipio de Corozal de la Información Financiera remitida con corte al mes de abril de 2025, así:

1. En el informe de abril de 2025, se indican los valores pagados de los contratos derivados: No. L-.AM-CS.001-01-23 y al Contrato No. CM-AM-CS-001-01-23, sin embargo, en el objeto del pago solo hace referencia al Contrato de Estudios, diseños y construcción de Estación Base de Distrito Tipo A en el Municipio de Corozal Departamento de Sucre.

   L-AM-CS-001-01-23: Contrato de Estudios, diseños y Construcción.
   CM-AM-CS-001- 01-23: Interventoría al Contrato de Estudios, diseño y Construcción.

Con respecto a los pagos:

2. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 1 por valor de $563.568.320,90 (Acta parcial, factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
3. Contrato CM-AM-CS-001- 01-23: No se anexa el Acta No. 1, factura, por valor de $397.813.951,00.
4. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 2 por valor de $1.444.641.832,95 (Acta parcial, factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
5. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes 15% de anticipo adicional 1 por valor de $309.716.205,76.
6. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de obra No. 3 por valor de $817.628.244,70 (Acta Parcial, Factura).
7. Contrato CM-AM-CS-001- 01-23: No se anexa el Acta No. 4, factura, por valor de $113.757.823,47
8. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 4 por valor de $3.411.810.584,15 (Acta parcial (sin firma), factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
9. Contrato L-AM-CS-001-01-23: No se anexaron los soportes del Acta Parcial de Obra No. 4 por valor de $398.466.672,95 (Acta parcial (sin firma), factura, Orden de pago, Comprobante de egreso, transferencia).
10. Contrato CM-AM-CS-001- 01-23: No se anexa el Acta No. 5, factura, por valor de $41.110.409,73.

De acuerdo con la revisión anterior, se solicita remitir la documentación faltante de manera inmediata, teniendo en cuenta la necesidad de realizar la legalización de recursos de manera inmediata ante la Coordinación Financiera y Contable del Ministerio del Interior.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ATRASO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <consorcioepc23@gmail.com>
Cc <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Fecha 2025-06-12 3:25 pm

OFICIO CIP-V1-2025-090.pdf (~189 KB)

Corozal, Sucre, 12 de junio del 2025

Señores
CONSORCIO EP-C
Atn. **ROGER ESTEBAN GUTIERREZ**
Representante Legal
Email: consorcioepc23@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Atraso de ejecución de actividades en obra.

INFORME SEMANAL 84 Y 85 - DISTRITO COROZAL

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-12 11:46 am

INFORME SEMANA SEMANA 85.xlsx (~3,3 MB) INFORME SEMANA SEMANA 84.xlsx (~4,9 MB)

Corozal, Sucre, 12 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 84 Y 85

Oficio 0426/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 12 de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, Cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Solicitud de subsanación a observaciones acta parcial No. 6.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, me permito solicitar, con carácter urgente la remisión del acta parcial No. 6 con las observaciones realizadas.

1. Las cantidades reportadas en el acta de los siguientes ítems no corresponden a las contempladas dentro de las memorias de cantidades: 3.04, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.12, 17.13 y 17.14.

2. En las memorias de los ítems 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11 y 4.12 no reportan el registro fotográfico correspondiente a las cantidades en el segundo piso.

Así mismo, se solicita la remisión del informe semanal No. 83 subsanado conforme a las observaciones realizadas en oficio 0420 de fecha 13 de junio de 2025.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barbaza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0417/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 12 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:


En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y teniendo en cuenta requerimiento del Ministerio del Interior por presunto incumplimiento de obligaciones Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal, de fecha 11 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

1. **Informe financiero del mes de abril de 2025**

Se remite informe financiero de la cuenta del municipio de Corozal, correspondiente al mes de abril de 2025.


2. Informe mensual de supervisión del mes de abril de 2025.

Se remite informe de supervisión correspondiente al mes de abril con los respectivos soportes, el cual fue remitido por primera vez el día 22 de mayo de 2025.

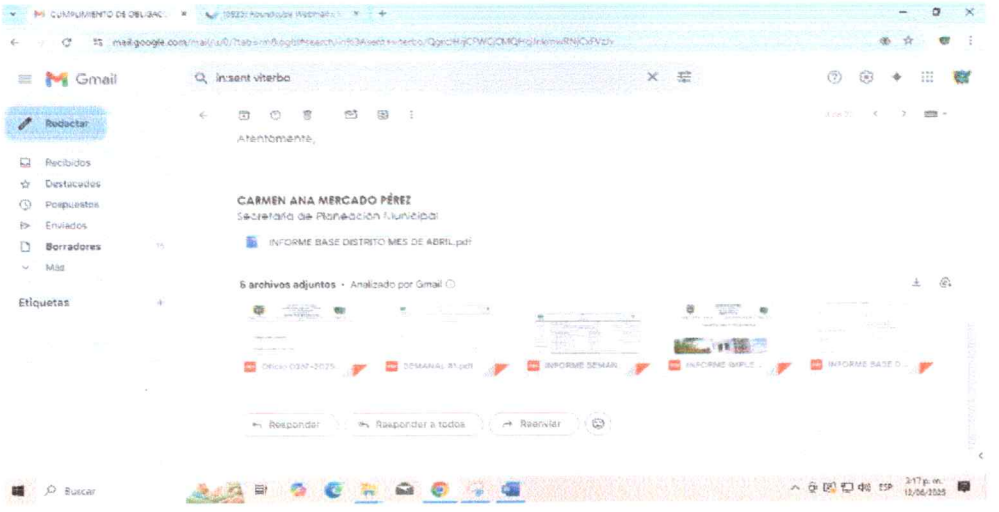

3. Informes mensuales de interventoría

Se remite informe mensual de interventoría No. 15 de abril de 2025, el cual fue remitido por primera vez el día 5 de junio de 2025.

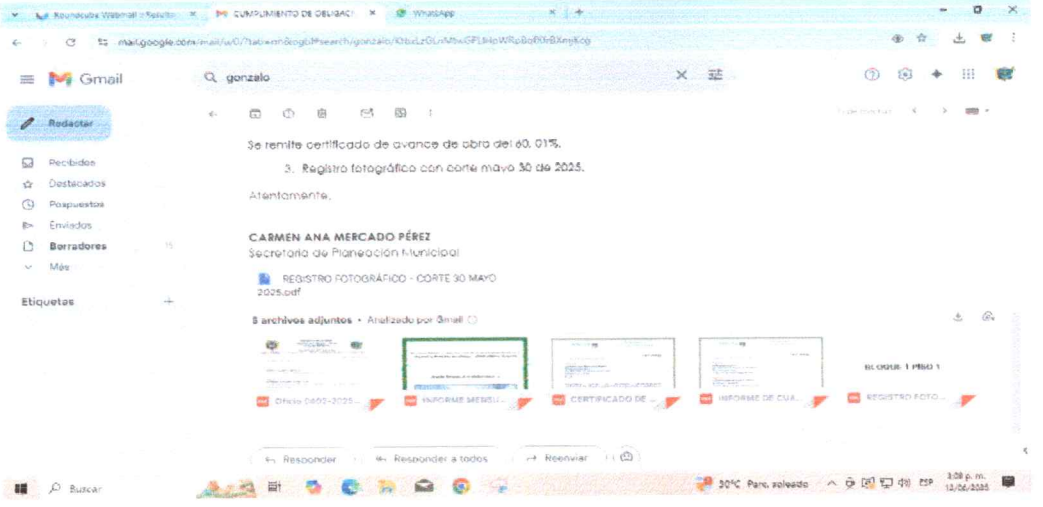

4. Informe de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental – PIGA.

Se remite en el día de mañana, debido a que se están realizando visitas de inspección para verificar el cumplimiento de recomendaciones.

5. Informes semanales de avance No. 83, 84 y 85.

Se remiten en el día de mañana, debido a que se están realizando las revisiones y respectivas observaciones a los mismos en el día de hoy.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Dirección Carrera 28 N.º 31A-08 piso 2° Barrio san juan. Telefax: (605)2858659
Página Web: alcaldía@corozal-sucre.gov.co E-mail: alcadia@corozal-sucre.gov.co

Oficio 0420/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 12 de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, Cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Solicitud de corrección de fechas en pólizas e informes de interventoría

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, me permito solicitar, con carácter urgente, la entrega de los informes semanales de interventoría N° 82 y 83, debidamente ajustados conforme a las correcciones requeridas el día 06 de junio de 2025 al ingeniero Erick Camargo.

- **Informe semanal de avance 83:**

- De acuerdo al acta de reinicio No. 2 de obra e interventoría, es del 12 de mayo del 2025, no del 9 de mayo tal como aparece en la información inicial y en las observaciones.

- En los capítulos de SISTEMA HIDROSANITARIO, PUERTAS Y VENTANAS, MURO DE CERRAMIENTO, SISTEMA DE DETECCIÓN RCI y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO no mencionan las principales actividades que se han ejecutado pese a que se estipula el porcentaje de avance. Así mismo, anexar registro fotográfico de estas actividades.

- **Informe semanal de avance 84:**

- De acuerdo al acta de reinicio No. 2 de obra e interventoría, es del 12 de mayo del 2025, no del 9 de mayo tal como aparece en la información inicial y en las observaciones.

Así mismo, me permito solicitar:

- Corrección de la fecha en las pólizas de obra e interventoría actualizadas al Acta de Reinicio N°. 2, teniendo en cuenta que la fecha correcta de dicha acta es del 12 de mayo de 2025 y no el 9 de mayo.
- Remisión urgente de los informes de obra correspondientes a los meses de abril y mayo de 2025,

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0421/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 13 de 2025

13.6.25. 3.02

Doctora
JULIETH DUQUE LINERO
Representante legal

ASUNTO: Solicitud de subsanación de información financiera.

Cordial saludo:

De acuerdo a observaciones del Ministerio del Interior, se solicita la subsanación del informe financiero del mes de abril de 2025.

- Contrato de obra No. L – AM – CS – 001 – 01 – 23, el objeto es: Contrato de estudios, diseño y construcción de Estación Base de Distrito Tipo A en el municipio de Corozal – Departamento de Sucre.
- Contrato de interventoría No. CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, el objeto es: Interventoría al contrato de Estudios, diseño y construcción de Estación Base de Distrito Tipo A en el municipio de Corozal – Departamento de Sucre.

En el informe de abril de 2025, se indican valores pagados de los contratos derivados No. L – AM – CS – 001 – 01 – 23 y al Contrato No. CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, sin embargo, en el objeto del pago solo se hace referencia al contrato de estudios, diseño y construcción de Estadio Base de Distrito Tipo A en el municipio de Corozal, Departamento de Sucre.

Respecto a los pagos:

- Acta parcial #1 contrato de obra, por valor de $563.568.320,90 de fecha 20/03/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 1 contrato de interventoría por valor de $397.813.951 de fecha 05/04/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 2 contrato de obra por valor de $1.444.641.832,95 de fecha 17/05/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial pago anticipo 15% de adicional 2, contrato de interventoría por valor de $309.716.205,76, de fecha 29/07/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #3 Contrato de obra por valor de $817.628.244,70 de fecha 23/08/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #4 contrato de consultoría por valor de $113.757.823,47 de fecha 30/05/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #3 contrato de obra por valor de$3.411.810.584,15 de fecha 2/12/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 3 contrato de interventoría por valor de $67.943.559 de fecha 6/11/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial #4 contrato de interventoría por valor de $275.723.265,47 de fecha 26/12/2024, no se anexa factura electrónica.

- Acta parcial # 4 contrato de interventoría por valor de $41.110.409,76, de fecha 09/04/2025, no se anexa factura electrónica.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, ya que, de acuerdo a los compromisos del comité de seguimiento del día de ayer 12 de junio, el plazo para el envío de las subsanaciones es el día lunes sin falta.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0422/SPM-2025

Corozal – Sucre, 13 de junio de 2025

Señor
BAYRON OSPINA TRESPALACIO
Alcalde Municipal de Corozal

Con copia,

Doctora
PATRICIA URZOLA BADEL
Secretaria Jurídica y Asuntos Contractuales

ASUNTO: Solicitud de apertura de proceso por presunto incumplimiento al contrato de obra publica **L-AM-CS-001-01-23.**

Cordial Saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de Secretaria de Planeación Municipal, de acuerdo al Decreto de nombramiento N° 024 de fecha 22 de enero del 2024, me permito solicitar dar inicio al trámite de presunto incumplimiento contractual en el marco del Contrato de Obra Pública No. L-AM-CS-001-01-23, cuyo objeto es "Estudios, diseño y construcción de estación base de distrito tipo A en el municipio de Corozal – Departamento de Sucre", teniendo como contratista al CONSORCIO EP-C.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la interventoría del proyecto, a cargo del Consorcio I-POLICE, ha dado la recomendación de manera reiterada, a través de los informes semanales de avance, el inicio del proceso por incumplimiento, en razón a los atrasos evidenciados en el cronograma de obra.

De acuerdo con el último informe semanal No. 85, con corte al 9 de junio de 2025, se reporta un atraso del 11,24% respecto a lo programado contractualmente. Para los fines pertinentes se anexa dicho informe al presente.

En atención a lo anterior y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los intereses de la entidad, se solicita dar inicio al respectivo procedimiento administrativo, ya que de no tomarse las medidas administrativas correspondientes por parte del municipio, el Ministerio del Interior dará inicio a la apertura de proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, celebrado entre el Municipio de Corozal y el Ministerio del Interior; teniendo en cuenta que el plazo de terminación del convenio es el 31 de agosto de 2025 y de acuerdo a los atrasos en el avance de obra, probablemente está no se logré terminar en el plazo estipulado en el contrato de obra.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó	Samira Lara Diaz	Contratista	
Aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación	

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

Recibí:
Brenda L. Mejia
13-06-2025
11:52 A.M

Oficio 0423/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 13 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y teniendo en cuenta requerimiento del Ministerio del Interior por presunto incumplimiento de obligaciones Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal, de fecha 11 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

1. Informe semanal de interventoría No. 85 con corte

2. Informe mensual de implementación del PIGA, correspondiente al mes de mayo de 2025.

Respecto a la información financiera del mes de abril de 2025, se está realizando la revisión de la información mes a mes de manera conjunta con el área de contabilidad, con el fin realizar los ajustes a la información reportada en los informes de supervisión de los meses de enero a abril de 2025, ya que se han hallado inconsistencias entre lo reportado en los mismos y los informes financieros de los mismos periodos, por lo que la Tesorería se ha comprometido a remitir toda la información de actas de pagos y soportes el día lunes, para ser enviada al Ministerio del Interior con los debidos ajustes a los informes de supervisión.

En relación a los informes mensuales de obra pendientes de los meses de abril y mayo de 2025, a la fecha el contratista de interventoría no ha realizado el reporte, por lo que se envió requerimiento por escrito en el día de hoy.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-14 11:52 am

CERTIFICADO DE AVANCE CIP-V1-2025-093.pdf (~205 KB)

Corozal, Sucre, 14 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Certificación de Avance de Obra

ACTA 6 - 61.44.xlsx

Oficio 0424/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 16 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y teniendo en cuenta requerimiento del Ministerio del Interior por presunto incumplimiento de obligaciones Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal, de fecha 11 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

1. **Información financiera periodos 2024 – 2025 del contrato de obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23.**

- Soportes pago de anticipo 15% del contrato de obra.
- Soportes pago de acta parcial 1.
- Soportes pago de acta parcial 2
- Soportes anticipo 15% adición 2.

- Soportes pago acta parcial 3.
- Soportes pago acta parcial 4.
- Soportes pago acta parcial 5

2. Información financiera periodos 2024 – 2025 del contrato CM – AM – CS – 001 – 01 – 23.

- Soportes pago de acta parcial 1.
- Soportes pago de acta parcial 2.
- Soportes pago de acta parcial 3.
- Soportes pago de acta parcial 4.
- Soportes pago de acta parcial 5.

El informe financiero del mes de mayo se encuentra en proceso por parte del área de contabilidad en el día de hoy, el cual no ha sido remitido a la supervisión, debido a que el área de presupuesto se encuentra en proceso de auditoria desde la semana anterior; no obstante, la Tesorera ha manifestado su disposición para reunirse con usted en el día de mañana.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Alcaldía de Corozal

ORDEN DE PAGO

No. 2024000
lunes 29 julio 2024

Alcaldia Municipal de
COROZAL

Beneficiario: 901694070 - CONSORCIO EP C			
Número de cuenta: 880089792	Banco: BANCO DE BOGOTA		Tipo de cuenta: CORRIENTE
CDP No: 24000046	Fecha Expedición CDP: 31/01/2024	RP No: 24000447	Fecha Expedición RP: 22/05/2024
Contrato Asociado: ADLAMCS001-01-23-2024	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $1.754.721.112,31

Concepto Orden De Pago

PAGO DEL 15% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL 2 DEL CONTRATO N° L-AM-CS-001-01-23, CUYO OBJETO ES EL ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 309.716.205,76 **Valor Liquidiacion:** $ 21.680.134,41 **Valor Neto:** $ 288.036.071,35

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
4501100007	7101	$ 309.716.205,76
	Valor Total	$ 309.716.205,76

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
24 - Retención Contratos De Construccion y Urbanización	2%	$ 309.716.205,76	$ 6.194.324,12
7 - Contribución Contrato de Obra	5%	$ 309.716.205,76	$ 15.485.810,29
		Valor Total	$ 21.680.134,41

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
24362601 - Contratos De Obra Publica 2%		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 0,00	$ 6.194.324,12
41102705 - Fondo de Seguridad Ciudadana (5%)		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 0,00	$ 15.485.810,29
19060401 - Anticipos Para Adquision de Bienes y Servivicos		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 309.716.205,76	$ 0,00
24010101 - Bienes Y Servicios Vigencia Actual		901694070 - CONSORCIO EP C	$ 0,00	$ 288.036.071,35
		Totales	$ 309.716.205,76	$ 309.716.205,76

Para la constancia se firma la orden de pago No. 2024000840.

ROBERTO ESPINOSA VERGARA

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO

Orden de Pago

Radicó yconde - Radicado # 831 - Fecha Radicación: 22/07/2024 00:00 AM, Revisó: yconde - Fecha de revisión: 23/07/2024 09:59 AM
Generó: respinosa - Imprime: respinosa

Alcaldia Municipal de
COROZAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE

NIT: 892280032

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 2024001101

02/08/2024

Beneficiario CONSORCIO EP C **NIT:** 901694070

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 288.036.071,35
VALOR A PAGAR	**$ 288.036.071,35**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: ADLAMCS001-01-23-2024

CDP: 24000046 **RP:** 24000447 **OP:** 2024000840

Rubro	Financiación	Descripción
4501100007	7101	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNCIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** AHORROS

Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.

Nombre Cuenta: COFINANCIACION CONVENIO 1914 - ESTACION DE POLICIA MINISTERIO **Cuenta:** 11100001378

Beneficiario: 901694070 - CONSORCIO EP C

Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA

Numero de Cuenta: 880089792 - **Tipo Cuenta:** C

Concepto

PAGO DEL 15% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL 2 DEL CONTRATO N° L-AM-CS-001-01-23, CUYO OBJETO ES EL ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 0

Observaciones:

JULIETH V. DUQUE LINERO
Tesorera Municipal

BENEFICIARIO
Alcalde

Elaboró: MGARRIDO	Imprimió: MGARRIDO	Fecha 02/08/2024 10.53 AM	IP Imprimió	186.43.33.4

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE COROZAL
NIT: 892280032
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 15anticipo
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 11100001378

Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 10:57:34
Fecha de Generación: 01-08-2024

Fecha de envio del pago: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2024

Impreso por: Bayron38

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $288,036,071.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $288,036,071.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000892826918	Ahorros	8300540762	FIDUOCCIDENTE 3190	288,036,071.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2024

Oficio 0428/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 16 de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

CONSORCIO EP – C
Atn: **ROGER ESTEBAN GUTIEREZ CORDOBA**
Representante legal

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, cuyo objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE*"

ASUNTO: Citación visita Ministerio del Interior.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, de acuerdo a citación del Ministerio del Interior, me permito convocar a comité de seguimiento presencial durante los días 18 y 19 de junio de 2025, acorde a la siguiente agenda:

- Miércoles 18 de junio de 2025: Visita de seguimiento al proyecto para verificación del avance de la obra al 60%, de 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

- Jueves 19 de junio de 2025: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60%.

- Comité de seguimiento presencial de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones de la alcaldía Municipal.

Es imprescindible la asistencia presencial e indelegable de los representantes legales de los Consorcios.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Oficio 0429/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 16 de 2025

Señores
BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde Municipal de Corozal

Doctora
PATRICIA URZOLA BADEL
Secretaria Jurídica y Asuntos Contractuales

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, cuyo objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE*"

ASUNTO: Citación visita Ministerio del Interior.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, de acuerdo a citación del Ministerio del Interior, me permito convocar a comité de seguimiento presencial durante los días 18 y 19 de junio de 2025, acorde a la siguiente agenda:

- Miércoles 18 de junio de 2025: Visita de seguimiento al proyecto para verificación del avance de la obra al 60%, de 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

- Jueves 19 de junio de 2025: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60%.

- Comité de seguimiento presencial de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones de la alcaldía Municipal.

Es imprescindible la asistencia presencial e indelegable de los representantes legales de los Consorcios, así como la participación del señor alcalde municipal y de la Secretaría Jurídica.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Revisó	Samira Lara Díaz	Contratista – apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

INFORME SEMANAL 86 - DISTRITO COROZAL

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-16 10:47 am

INFORME SEMANA SEMANA 86.xlsx (~7,0 MB)

Corozal, Sucre, 16 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 86

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO No. 1546-2020

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 16 de junio de 2025, 3:56 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 16 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: Citación Visita de seguimiento a la ejecución contractual.

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior de acuerdo con lo indicado en el comité del 12 de junio de 2025, confirma la visita al proyecto de acuerdo con la siguiente agenda:

1. Miércoles 18 de junio de 2025: 8:00 am - 8:00 pm: Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60%.
2. Jueves 19 de junio de 2025: 8:00 am - 2:00 pm: Visita de seguimiento al proyecto, verificación del avance de la obra al 60% -.3:00 pm - 5:30 pm. Comité Alcaldía de Corozal - Sucre

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 17 de junio de 2025, 12:08 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

Bogotá D.C., 17 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, y de acuerdo con el último comité de seguimiento, se recuerdan los compromisos y las fechas de cumplimiento:

1. Minuta de los 2 meses de prorroga hasta el 26 de julio de 2025: Fecha de
   ↓
   José Vergara
2. Informe de obra del mes de mayo de 2025: Fecha de cumplimiento
   ↓
   EP-C lo remitió a I-Police pero estos no lo han entregado a la Sec.
3. Informe de interventoría de obra del mes de abril y mayo de 2025: Fecha de
   ↓
   Abril ya, falta mayo.
4. Informe visita de inspección RETIE y RETILAP: Fecha de cumplimiento
   ↓
   No lo han enviado
5. Cronograma con plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2025: Fecha de cumplimiento 16 de junio de 2025.
   ↓
   No lo han enviado
6. Balance de la obra al 60% y las memorias: Fecha de cumplimiento
   ↓
   Ing. Angelica

, cumplimiento 13 de junio de 2025.	16 de junio de 2025.	cumplimiento 16 de junio de 2025.	16 de junio de 2025.	16 de junio de 2025.

Teniendo en cuenta que los plazos están vencidos, se solicita el envío de la información de manera inmediata.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

CONSORCIO EP-C

NIT: 901.694.070

Corozal, Sucre, 17 de junio de 2025

CEPC-V1-2025-024

Ingeniero
OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ
R.L. CONSORCIO I - POLICE
INTERVENTORÍA
Email: consorcioipolice@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO N°L-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE VISITA RETIE.

Cordial saludo.

De acuerdo a lo requerido para la correcta ejecución del proyecto en mención, es necesario la realización de visitas parciales por parte de la empresa certificadora en RETIE y RETILAP, en este caso, la empresa EINCE S.A.S., con quién tiene contrato este consorcio para la realización de estos procesos, en días anteriores realizó una visita técnica, dando como resultado, el acta de visita que se encuentra anexa a esta comunicación.

Para fines pertinentes.

Atentamente,

ROGER ESTEBAN GUTIÉRREZ CÓRDOBA
R.L. CONSORCIO EP-C
CONTRATISTA.
C.C. Secretaría de Planeación Municipal / email: planeacion@corozal-sucre.gov.co

Eince SAS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
09-OIN-112

ACTA DE INSPECCION RETIE

FI 47
VERSIÓN 7
AGOSTO 2022

PROYECTO	Estación-de-policía-Corozal						
DIRECCIÓN	Municipio Corozal			CIUDAD	Sucre		
FECHA	13/06/2025	VISITA NÚMERO	1	ORDEN DE SERVICIO	No. 00882	Año. 2025	Ciudad. MON	Cod. Comercial 211	Reglamento RE

REALIZA ANÁLISIS DE RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN ACORDE AL FSA 47: SI

Tipo de Instalación	Básica	Líneas de transmisión y/o subestaciones de Alta Tensión aledañas?	no

	ÍTEMS A EVALUAR CRITERIO TÉCNICO	RESULTADO C/NC/NA/PR	OBSERVACIÓN
1	Tableros	NA	En construcción
2	Espacios de trabajo	NA	En construcción
3	Identificación de circuitos - canalizaciones - tableros	NA	En construcción
4	Señalización (Diagrama unifilar, directorio de circuitos, símbolo de riesgo eléctrico, mímicos)	NA	En construcción
5	Alimentadores – Acometidas	NA	En construcción
6	Código de colores	NA	En construcción
7	Conductores (material/aislamiento/capacidad de corriente)	NA	En construcción
8	Selección de protecciones y capacidad de funcionamiento (sobrecorrientes – sobretensiones)	NA	En construcción
9	Conectores, terminales, barrajes	NA	En construcción
10	Continuidad de conductores - ejecución de conexiones	NA	En construcción
11	Circuitos ramales	NA	En construcción
12	Cajas, canalizaciones, bandejas portacables, electrobarras	NA	En construcción
13	Métodos de alambrado	NA	En construcción
14	Ensayos funcionales	NA	En construcción
15	Tomacorrientes mínimos	NA	
16	Tomacorrientes, aparatos, ducha eléctrica	NA	
17	Tomacorrientes sobre mesones (penínsulas e islas)	NA	
18	Protección GFCI	NA	
19	Conductores HFFRLS (Libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos)	NA	En construcción
20	Agentes deteriorantes - Condiciones ambientales	NA	
21	Compatibilidad térmica de equipos y materiales	NA	En construcción
22	Ejecución mecánica de los trabajos - sujeciones y soportes	NA	En construcción
23	Nivel de tensión - Aislamiento eléctrico (equipos – conductores – aparatos)	NA	En construcción
24	Protección de partes energizadas y barreras de acceso	NA	
25	Subestación - celda MT - transformador	NA	
26	Montaje y ventilación de equipos - Accesibilidad	NA	
27	Bóveda subestación – Barreras de acceso – Brocal	NA	
28	Cámaras - canalizaciones adecuadas - cajas de paso	NA	En construcción
29	Apoyos, estructuras y herrajes	NA	En construcción
30	Distancias de seguridad - Zonas de servidumbre	NA	
31	Campos electromagnéticos	NA	
32	Sistema de puesta a tierra	NA	En construcción
33	Sistema de protección contra rayos	NA	En construcción
34	Nivel de iluminación o iluminación de emergencia	NA	
35	Sistemas de emergencia - planta eléctrica	NA	
36	Bomba contra Incendio	NA	
37	Ascensor	NA	
38	Piscina	NA	
39	Cerca eléctrica	NA	
	DOCUMENTALES	**RESULTADO**	**OBSERVACIÓN**
40	Certificados de producto RETIE	NA	En construcción
41	Memorias de cálculo y planos firmados de acuerdo al Artículo 10.1	NA	En construcción
42	Declaración de cumplimiento constructor	NA	En construcción
43	Matrícula profesional diseñador y constructor	NA	En construcción
44	Soporte de experiencia diseñador y constructor (Instalaciones especiales)	NA	En construcción
45	Registro RUPI-SIC Constructor	NA	En construcción
46	Fichas técnicas (Productos de instalaciones especiales)	NA	

ALCANCE INSPECCIONADO:

Se programo primera visita, solicitada por el cliente, Se realiza recorrido de la obra se identifica que la obra todavia esta en construccion , falta instalar salidas de iluminación ,construir sistema de apantallamiento,Instalar subestación y tableros electricos, hace falta la red de MT y se evidencia que las instalaciones electricas construidas hasta la fecha cumplen con la normativa actual se programara una segunda visita.

RESULTADO DE LA INSPECCION :	SE RECOMIENDA APROBAR EL ALCANCE INSPECCIONADO	SI	X	NO	

Se emplea formato de anexo — No [X] — Si [ ] — N° hojas [1]

Nombre	Firma
Yosandra Cavadia Perez	
Carlos Eduardo Hernández Bula	

LA INFORMACION RECOGIDA POR EL INSPECTOR Y LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS SERAN REVISADOS Y EVALUADOS POR EL COMITÉ DE INSPECCIONES DE EINCE SAS

Aprobación del comité	si		No		
Firma					

Se pueden generar No Conformidades (NC), al verificar la información de los ítems documentales marcados como Pendientes por Revisar (PR).

Oficio 0433/SPM-2025

Corozal, 17 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA CM – AM – CS – 001 – 01 – 23, Cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

REFERENCIA: Contrato de Obra No. L – AM – CS - 001 – 01 – 23, cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSRUCCIÓN DE BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Reiteración por tercera vez de solicitud de información pendiente.

Cordial saludo:

CARMEN ANA MERCADO PEREZ, actuando en calidad de supervisora del Municipio de Corozal en el marco del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, me permito solicitar de manera reiterativa, la remisión urgente la siguiente información:

- Informe de obra de abril y mayo de 2025.
- Informe de interventoría mayo de 2025.

Así mismo, se solicita, información pendiente acorde a los compromisos pactados en comité de seguimiento virtual llevado a cabo el 12 de junio de 2025.

- Cronograma de obra con plazo de ejecución de obra hasta el 30 de julio de 2025, cuya fecha de entrega es el 16 de junio de 2025.

- Balance de obra al 60% y hasta el 30 de julio de 2025 y memorias de cantidades, con fecha de entrega el 16 de junio de 2025.

- Informe semanal 84 subsanado conforme a las observaciones realizadas por la supervisión.

Atentamente,

CARMEN MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Revisó	Alfonso Barrios Pérez	Técnico Operativo	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

ENTREGA DE INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA 82, 83, 84, 85 Y 86

De CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
Destinatario <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
Cc <consorcioepc23@gmail.com>
Fecha 2025-06-18 8:47 am

INFORME SEMANA SEMANA 85.xlsx (~3,3 MB) INFORME SEMANAL COROZAL 82.xlsx (~3,6 MB) INFORME SEMANA SEMANA 84.xlsx (~4,9 MB)
INFORME SEMANAL COROZAL 83.xlsx (~6,4 MB) INFORME SEMANA SEMANA 86.xlsx (~7,0 MB)

Corozal, Sucre, 18 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 82, 83, 84, 85 Y 86

Cordial saludo,

Atendiendo a las correcciones recibidas por parte de la secretaría de planeación, se adjuntan los informes con las fechas correspondientes y lo demás solicitado.

Oficio 0438/SPM-2025

Corozal- sucre, junio 18 de 2025

Doctor
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio Interadministrativo 1914 de 2022

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Programas para Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1914 DE 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Cordial saludo:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022, y conforme a los compromisos acordados en comité de seguimiento virtual del 12 de junio de 2025, se remite la siguiente información:

- Acta de visita de inspección RETIE y RETILAB.
- Informe semanal No. 83

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Patricia Amaya Barboza	Contratista	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

COMITÉ 19 DE JUNIO DE 2025

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 19 de junio de 2025, 7:11 a.m.
Para: planeacion@corozal-sucre.gov.co, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC: consorcioepc23@gmail.com

Corozal, Sucre, 19 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Incapacidad para asistencia a comité.

3 archivos adjuntos

OFICIO CIP-V1-2025-094.pdf
160K

INCAPACIDAD MEDICA ERIC CAMARGO - 92640459.pdf
112K

HISTORIA CLINICA ERICK CAMARGO - 92640459.pdf
85K

Gmail

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

ACTA DE VISITA Y COMITE DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 19 de junio de 2025, 3:48 p.m.
Para: viterbo.gomez@mininterior.gov.co, Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>, planeacion@corozal-sucre.gov.co
CC: consorcioepc23@gmail.com, CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>
CCO: samiralaradiaz@gmail.com, desuc.gubir@policia.gov.co

2 archivos adjuntos

ACTA COMITE PRESENCIAL 18 Y 19 DE JUNIO.pdf
3999K

ASISTENCIA VISITA MININTERIOR.pdf
655K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 82, 83, 84, 85 Y 86

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 19 de junio de 2025, 6:32 p.m.
Para: planeacion@corozal-sucre.gov.co, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, gonzalo.florez@mininterior.gov.co
CC: consorcioepc23@gmail.com

Corozal, Sucre, 19 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 82, 83, 84, 85 Y 86

Cordial saludo,

Atendiendo a las correcciones recibidas, se adjuntan los informes con las fechas correspondientes y ajustes pertinentes.

5 archivos adjuntos

INFORME SEMANAL COROZAL 85.xlsx
3248K

INFORME SEMANAL COROZAL 82.xlsx
3603K

INFORME SEMANAL COROZAL 84.xlsx
4859K

INFORME SEMANAL COROZAL 83.xlsx
6338K

INFORME SEMANAL COROZAL 86.xlsx
6919K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

SEGURIDAD SOCIAL MAYO DE 2025

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 20 de junio de 2025, 9:21 a.m.
Para: consorcioepc23@gmail.com
CC: planeacion@corozal-sucre.gov.co, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Corozal, Sucre, 20 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Seguridad social del mes de mayo de 2025.

OFICIO SEGURIDAD SOCIAL MAYO.PDF
125K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONVENIO 1914 DE 2022

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 20 de junio de 2025, 9:06 a.m.
Para: viterbo.gomez@mininterior.gov.co, Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>, planeacion@corozal-sucre.gov.co

Corozal - Sucre, junio 20 de 2025

Doctor
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Ministerio del Interior

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

ASUNTO: Remisión de informes semanales ajustados.

Cordial saludo:

En cumplimiento de los compromisos acordados en comité presencial llevado a cabo el día de ayer, 19 de junio de 2025, me permito remitir los informes semanales ajustados.

1. Informe semanal 82
2. Informe semanal 83
3. Informe semanal 84
4, Informe semanal 85
5 Informe semanal 86

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

5 archivos adjuntos

INFORME SEMANAL COROZAL 82.pdf
603K

INFORME SEMANAL COROZAL 83.pdf
1053K

INFORME SEMANAL COROZAL 84.pdf
790K

INFORME SEMANAL COROZAL 85.pdf
687K

INFORME SEMANAL COROZAL 86.pdf
1039K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

AJUSTE - OBSERVACIONES LEGALIZACIÓN RECURSOS ABRIL 2025

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 24 de junio de 2025, 7:00 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 20 de junio de 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación
Supervisora Convenio No. 1914-2022
Municipio de Corozal

RE: Convenio No.1914-2022

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME FINANCIERO:

Cordial saludo:

En el marco del Convenio de la referencia suscrito por parte del Ministerio del Interior y Municipio de Corozal con el asunto de (...) "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE*" (...), y una vez realizado el informe de la legalización de los recursos desembolsados por parte del Ministerio del Interior al mes de abril de 2025, se solicita subsanar las siguientes observaciones:

1. En el Informe presentado con corte al mes de abril de 2025, se indica que el pago Acta No.5 CM-AM-CS-001-01-23 corresponde a $41.110.409,73, sin embargo, en la factura el valor es $41.110.409,76.
2. Los rendimientos financieros solo se incluyeron hasta el mes de marzo de 2025.
3. Saldo en caja falta sumar lo rendimientos del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

2 archivos adjuntos

50. INFORME FINANCIERO DISTRITO ABRIL 2025.pdf
2417K

9. ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5.pdf
2382K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

COMITÉ CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 24 de junio de 2025, 7:58 a.m.
Para: Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Seguimiento a la ejecución Contractual del Convenio No. 1914-2022 y cumplimiento de compromisos de la visita realizada del 17 al 19 de junio de 2025

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 211 148 269 102 9

Código de acceso: qP3Gm74s

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

---

invite.ics
5K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

CITACIÓN COMITÉ - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 24 de junio de 2025, 8:41 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 24 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: CITACIÓN COMITÉ - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y de acuerdo con los compromisos de la visita realizada al Municipio de Corozal del 17 al 19 de junio de 2025, se confirma el comité de seguimiento para el martes 24 de junio de 2025 a las 2:00 pm, para el cual se solicita convocar al representante legal del Contrato de Estudios, Diseños, Obra e Interventoría a los mismos.

Así mismo, se solicita convocar a la Tesorera teniendo en cuenta que verificado el informe financiero y los documentos de legalización se evidenciaron observaciones en la misma.

Se remite el link mediante el cual se pueden unir a la reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FmOThkMDItODczOC00MDA0LTgxYjgtNDI2M2Q1ODdmMDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2218ebd6cb-7f4b-43d2-bcd7-9c7c33ae6626%22%7d

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUALIZADO - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 26 de junio de 2025, 7:23 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeación email <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 26 de junio de 2025

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre
alcaldia@corozal-sucre.gov.co

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal
planeación@corozal-sucre.gov.co

Ref: Convenio No. 1914 de 2022 Municipio de Corozal - Sucre

Asunto: REGISTRO FOTOGRÁFICO - CONVENIO No. 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio de la referencia, suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, se solicita presentar registro fotográfico el cual permita verificar el avance de la obra del jueves 19 de junio de 2025 al día de hoy.

Se solicita dar cumplimiento al requerimiento de manera inmediata, teniendo claridad que se cuenta en obra con profesionales del Contratista de Estudios, diseños, obra, Interventoría del Contrato de Estudios, diseños, obra y por parte de la Supervisión del Municipio de Corozal.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Oficio 0458/SPM – 2025

Corozal – Sucre, 26 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO I POLICE
Atn: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
Representante legal

Con copia,

CONSORCIO EP-C
Atn: **ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA**

REFERENCIA: Contrato de obra L – AM – CS – 001 – 01 – 23.

ASUNTO: Solicitud de registro fotográfico actualizado de actividades en obra.

Cordial saludo:

En atención a solicitud de la supervisión del Ministerio del Interior en el día de hoy, se solicita la remisión de manera inmediata del registro fotográfico actualizado de actividades desarrolladas en obra del 19 de junio a la fecha, teniendo en cuenta que se cuenta con profesionales tanto del contratista como de la interventoría en obra.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE CARGO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Alfonso Barrios Pérez	Técnico Operativo	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

REMISION DE ACTAS DE SUSPENSION CONTRATOS DERIVADOS

De <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
Destinatario Viterbo Gomez <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, Gonzalo Florez <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Fecha 2025-06-27 3:09 pm

ACTA DE SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf (~580 KB) ACTA DE SUSPENSION 1 CONTRATO DE OBRA.pdf (~2,1 MB)

Corozal - Sucre, junio 27 de 2025

Ingeniero
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Ministerio del Interior

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

Cordial saludo:

Conforme a su solicitud, se remite la siguiente información:

1. Acta de suspensión de obra No. 1
2. Acta de suspensión de interventoria No.1

CIP-V1-2025-099

Corozal, Sucre, 27 de junio del 2025

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de informe mensual de interventoría N° 16.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, me permito hacer entrega adjunto del Informe de interventoría N° 16 correspondiente al periodo del 12 de mayo al 11 de junio de 2025, del proyecto denominado **ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE,** el cual contiene:

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION
INTRODUCCION GENERAL DEL PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO
INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA
RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA
OBLIGACIONES DEL CONTRATO
ORGANIGRAMAS DE OBRA
ORGANIGRAMA ADMISTRATIVO DE OBRA
ORGANIGRAMA TECNICO OBRA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

PERSONAL DE CONTRATISTA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 RESUMEN DEL CONTRATO Y FICHA TECNICA DE INTERVENTORIA
5.2 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA
5.3 ORGANIGRAMA DE INTERVENTORIA
5.3.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA
5.3.2 ORGANIGRAMA TECNICO INTERVENTORIA
5.3.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORIA
6. ESTADO GARANTIAS DE CONTRATO DE OBRA
6.1 POLIZA DE OBRA ACTUALIZACIÓN (1)
7. ESTADO GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA
7.1 POLIZA DE INTERVENTORIA ACTUALIZACIÓN (1)
8. ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION
8.1. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO
8.1.1. DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
8.1.2. MANEJO DE ANTICIPO
8.1.3. ACTAS PARCIALES DE COBRO
8.1.4 BALANCE GENERAL
8.2 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
8.2.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
8.2.2 FORMA DE PAGO
8.2.3 ACTA PARCIAL DE COBRO
9. PRESUPUESTO INICIAL (ITEM, CANTIDAD Y VALORES CONTRATADOS)
9.1 PRESUPUESTO RESULTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS
10. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.
10.1 DIAGRAMA DE GANTT Y INICIO.
10.2 PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE OBRA PROGRAMANDO
10.3 PORCETAJE DE SEGUIMIENTO DE OBRA EJECUTADO
11. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO “CURVA S”
11.1 ANALISIS DE CURVAS DE AVANCE DE SEGUIMIENTO “CURVA S”
12. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
12.1 LISTADO DE ITEM INTERVENIDOS
12.1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE CADA ITEM
13. ASPECTOS ADMINISTRATIVO Y LEGALES
14. ACTA Y COMITES DE OBRA
14.1 ACTA DE INICIO
14.2 COMITÉ DE OBRA
15. CORRESPONDENCIA
15.1 CORREPONDENCIA CONTRATO DE OBRA
15.1.1 ENVIADA
15.1.2 RECIBIDA

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981

15.2 CORREPONDENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA
15.2.1. ENVIADA
15.2.2 RECIBIDA
16 CONTROLES TECNICOS DE CALIDAD
16.1 ENSAYOS REALIZADOS
17 BITACORA DE SEGUIMIENTO DE OBRA
18. ESTADO DEL CLIMA
19. MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
19.1 CONDICIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
19.2 SEÑALIZACION
19.3 PORTE ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
20 MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES EN LA OBRA
21 GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD.
22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
22 ANEXOS

Atentamente,

Oscar Carrascal S.

OSCAR CARRASCAL SANCHEZ
R.L. CONSORCIO I-POLICE
Interventoría

TV 5 #21-55 BARRIO LA GRANJA Email: consorcioipolice@gmail.com Tel: 3117833981
