
Id	N° Item (Texto1)	Referencia	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1			**"ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMAMARCA."**			**$ 0,00**	**$ 588.935.770,00**	**92,5 días**	**lun 14/07/25**	**mar 14/10/25**
2	**1**		**RETIRO Y DEMOLICIONES**			**$ 0,00**	**$ 35.091.372,40**	**15 días**	**lun 14/07/25**	**lun 28/07/25**
3	1,1	APU 1,1	RETIRO DE CIELO FALSO, EN PVC. INCLUYE LÁMINA, PERFILES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, Y LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y/O SU TRANSPORTE HASTA LA BODEGA O EL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M2	542,86	$ 20.455,47	$ 11.104.456,44	7 días	lun 14/07/25	dom 20/07/25
4	1,2	APU 1,2	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES Y TUBERÍAS. INCLUYE EL CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	ML	228,00	$ 16.738,66	$ 3.816.414,48	15 días	lun 14/07/25	lun 28/07/25
5	1,3	APU 1,3	DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ZÓCALO, REFUERZO E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	M2	542,86	$ 15.019,31	$ 8.153.382,63	15 días	lun 14/07/25	lun 28/07/25
6	1,4	APU 1,4	DEMOLICIÓN DE MORTERO H =7 CM SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE REFUERZOS E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	M2	542,86	$ 20.854,14	$ 11.320.878,44	15 días	lun 14/07/25	lun 28/07/25
7	1,5	APU 1,5	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REVOQUES Y ENCHAPES APLICADOS EN EL MURO A DEMOLER E INSTALACIONES EMBEBIDAS, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDI	M2	24,28	$ 28.675,47	$ 696.240,41	15 días	lun 14/07/25	lun 28/07/25
8	**SUBTOTAL**					$ 0,00	$ 0,00			
9	**2**		**REPARACIÓN DE CUBIERTA**			**$ 0,00**	**$ 34.922.068,17**	**30 días**	**sáb 19/07/25**	**dom 17/08/25**
10	2,1	APU 2,1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN TEJA DE PVC O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS. Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2	65,14	$ 98.378,33	$ 6.408.364,42	30 días	sáb 19/07/25	dom 17/08/25
11	2,2	APU 2,2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCHAS METALICAS O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA RECUBRIMIENTO ANTE LA OXIDACIÓN . Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	ML	16,93	$ 94.840,99	$ 1.605.657,96	30 días	sáb 19/07/25	dom 17/08/25
12	2,3	APU 2,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE PLUS BLANCO 0.6X1.13MT 2MM UPVC A DOS AGUAS INCLUYE FIJACIONES CON TONILLOS AUTOPERFORANTES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	16,51	$ 113.994,96	$ 1.882.056,79	30 días	sáb 19/07/25	dom 17/08/25
13	2,4	APU 2,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN ALUM BAND, DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, PESTAÑA DE 5 CM, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA.	ML	76,46	$ 42.901,55	$ 3.280.252,51	30 días	sáb 19/07/25	dom 17/08/25
14	2,5	APU 2,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, DESARROLLO 1.00 M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO, ACABADO CON ESMAL	ML	110,12	$ 125.941,36	$ 13.868.662,56	30 días	sáb 19/07/25	dom 17/08/25
15	2,6	APU 2,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES CON UN DIÁMETRO DE 4", AGUA RESIDUAL. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, BOCAS, ACCESORIOS, PEGANTE, LIMPIADOR, WASH PRIMER, ACABADO EN ESMALTE MATE, COLO	ML	111,00	$ 70.964,63	$ 7.877.073,93	30 días	sáb 19/07/25	dom 17/08/25
16	**SUBTOTAL**					$ 0,00	$ 0,00			
17	**3**		**REPARACIÓN MURO**			**$ 0,00**	**$ 56.253.868,08**	**60 días**	**sáb 26/07/25**	**mar 23/09/25**




Id	N° Item (Texto1)	Referencia	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
18	3,1	APU 3,1	CORTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS PERIMETRALES ENTRE COLUMNAS Y MUROS CON YUMBOLON Y BRONCO SISMO RESISTENTE O SIMILAR, INCLUYE CORTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ES	ML	237,44	$ 16.718,11	$ 3.969.548,04	30 días	sáb 26/07/25	dom 24/08/25
19	3,2	APU 3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 10X15X30, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL	M2	24,15	$ 188.764,08	$ 4.558.652,53	30 días	sáb 26/07/25	dom 24/08/25
20	3,3	APU 3,3	REPARACIÓN DE GRIETA EN ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO MEDIANTE EL COSIDO CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GRADO 60 (FY=4200 KG/CM²), DE 8 MM DE DIÁMETRO, COLOCADAS CADA 300 MM, MORTERO DE RESINA EPOXI Y ARENA DE SÍLICE, DE ENDURECIMIENTO RÁP	ML	35,00	$ 125.400,21	$ 4.389.007,35	30 días	sáb 26/07/25	dom 24/08/25
21	3,4	APU 3,4	LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO VISTO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR Y MUROS INTERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, HIDROFUGO TIPO SIKA ANTI SALITRE Y SIKA MATA HONGOS, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDA	M2	1.473,82	$ 29.404,31	$ 43.336.660,16	60 días	sáb 26/07/25	mar 23/09/25
22	**SUBTOTAL**					$ 0,00	$ 0,00			
23	**4**		**ACABADOS**			**$ 0,00**	**$ 233.954.536,39**	**30 días**	**mar 5/08/25**	**mié 3/09/25**
24	4,1	APU 4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CHAPA EN LADRILLO CATALÁN 10×30 CM. COLOR MARRÓN CLARO, PEGA HORIZONTAL Y VERTICAL. UTILIZAR CORTADORA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 0,25:1:3(CAL-CEMENTO-ARENA), MORTERO COLOR GRIS PARA REBITAR/RANURAR, Y TODOS LOS ELEME	M2	62,06	$ 116.932,24	$ 7.256.814,81	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
25	4,2	APU 4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5. CON UN ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, VARILLA DE DILATACIÓN EN PVC DE 2" E= 4 MM, CUADRÍCULAS MÁXIMAS DE 2.40 X 2.40 M, EN	M2	542,86	$ 222.730,49	$ 120.911.473,80	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
26	4,3	APU 4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, FORMADO POR LAMINAS DE PVC, DE 85 MM DE ANCHURA, INCLUYE PERFILES Y ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	542,86	$ 104.809,11	$ 56.896.673,45	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
27	4,4	APU 4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE CON MORTERO 1:4 ESPESOR DE 2 CM. IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O EQUIVALENTE, EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA S	M2	37,50	$ 42.467,26	$ 1.592.522,25	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
28	4,5	APU 4,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 MANOS MÍNIMO, O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, DILA	M2	75,00	$ 16.079,69	$ 1.205.976,75	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
29	4,6	APU 4,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 DE PRIMERA CALIDAD SOBRE MUROS REVOCADOS Y/O ESTUCADOS, TRES MANOS O LAS NECESARIAS HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, INCLUYE RESANES, TAPA POROS EN	M2	502,91	$ 22.372,10	$ 11.251.152,81	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
30	4,7	APU 4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ZÓCALO RECTO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5 DE 0,07 A 0,10M DE ALTURA, DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN DE LA BALDOSA DE PISO, CON ARISTAS BISELADAS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, P	M	463,78	$ 27.019,14	$ 12.530.936,75	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25

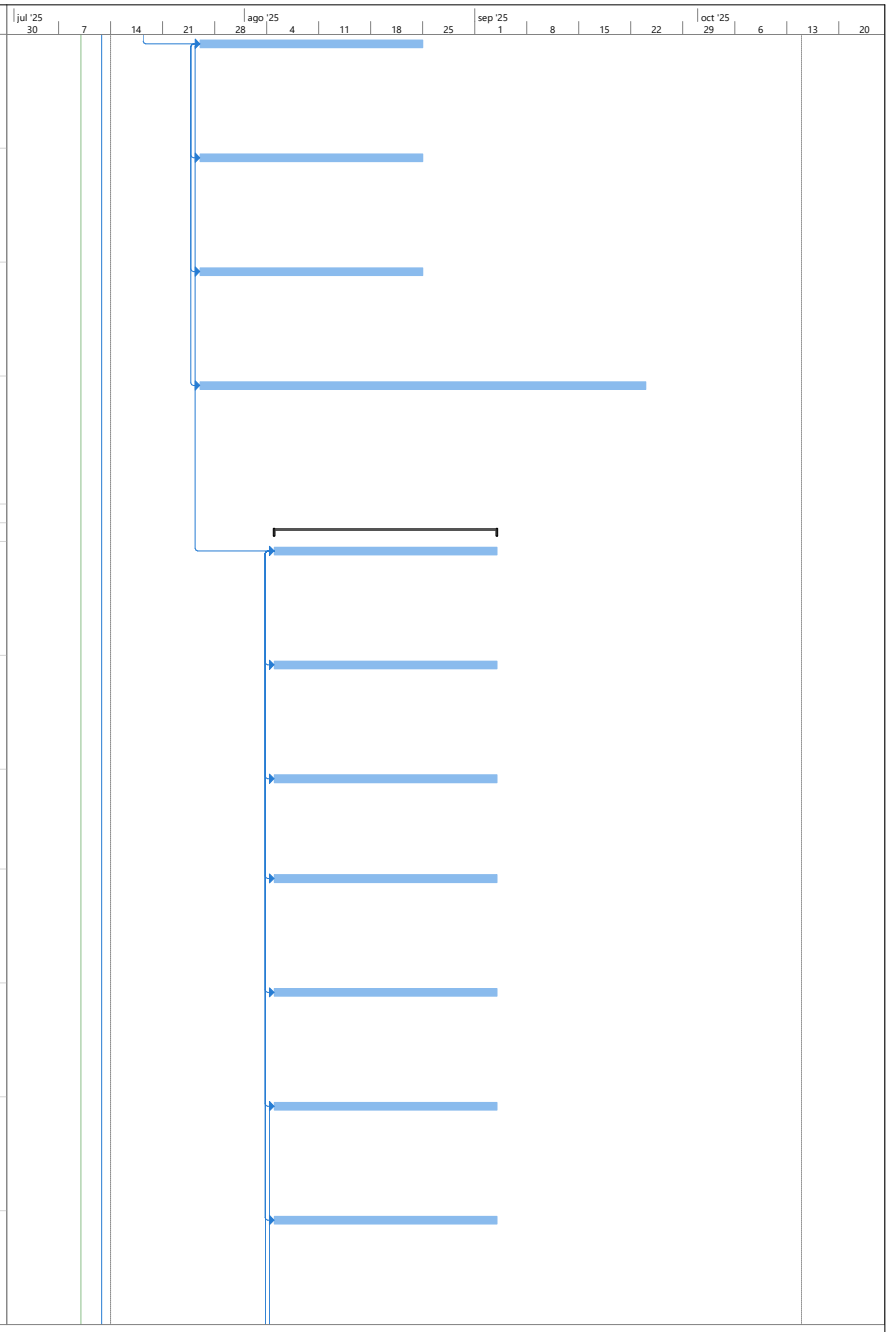

Siloh Group SAS
Mantenimiento ICCU

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	N° Item (Texto1)	Referencia	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
31	4,8	APU 4,8	REPARACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS.	UND	18,00	$ 188.925,74	$ 3.400.663,32	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
32	4,9	APU 4,9	REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS.	UND	3,00	$ 358.730,39	$ 1.076.191,17	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
33	4,10	APU 4,10	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	542,86	$ 32.848,49	$ 17.832.131,28	30 días	mar 5/08/25	mié 3/09/25
34	**SUBTOTAL**					$ 0,00	$ 0,00			
35	**5**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**$ 0,00**	**$ 99.248.208,29**	**74,5 días**	**lun 14/07/25**	**vie 26/09/25**
36			**RETIRO DE INSTALACIONES**			**$ 0,00**	**$ 4.386.942,80**	**21 días**	**lun 14/07/25**	**dom 3/08/25**
37	5,1	APU 5,1	RETIRO DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	UND	95,00	$ 11.857,35	$ 1.126.448,25	7 días	lun 14/07/25	dom 20/07/25
38	5,2	APU 5,2	RETIRO DE CABLEADO. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	ML	633,00	$ 2.211,18	$ 1.399.677,00	14 días	lun 21/07/25	dom 3/08/25
39	5,3	APU 5,3	RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	UND	116,00	$ 6.700,67	$ 777.277,70	14 días	lun 21/07/25	dom 3/08/25
40	5,4	APU 5,4	RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	UND	2,00	$ 171.625,38	$ 343.250,76	14 días	lun 21/07/25	dom 3/08/25
41	5,5	APU 5,5	RETIRO DE CANALETAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA.	ML	87,00	$ 8.509,07	$ 740.289,09	14 días	lun 21/07/25	dom 3/08/25
42			**SUMINITRO E INSTALACION DE TOMAS**			**$ 0,00**	**$ 33.253.440,08**	**25 días**	**mié 20/08/25**	**sáb 13/09/25**
43	5,6	APU 5,6	S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V)	UND	70,00	$ 79.536,72	$ 5.567.570,40	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
44	5,7	APU 5,7	S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR NARANJO CON POLO A TIERRA AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V)	UND	40,00	$ 118.343,34	$ 4.733.733,60	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
45	5,8	APU 5,8	S.E.I DE TOMA LEVITÓN GFCI NEMA 5-20R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO Y PROTECCIÓN GFCI, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA LEVITON, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCI	UND	8,00	$ 146.581,78	$ 1.172.654,24	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
46	5,9	APU 5,9	S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	354,00	$ 16.666,05	$ 5.899.781,70	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
47	5,10	APU 5,10	S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	354,00	$ 44.857,91	$ 15.879.700,14	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
48			**SUMINITRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**			**$ 0,00**	**$ 44.833.687,05**	**25 días**	**mié 20/08/25**	**sáb 13/09/25**
49	5,11	APU 5,11	S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILIAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, PARA LUMINARIA, INCLUYE APARATO MARCA HALUX O SIMILAR, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	31,00	$ 79.536,72	$ 2.465.638,32	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25

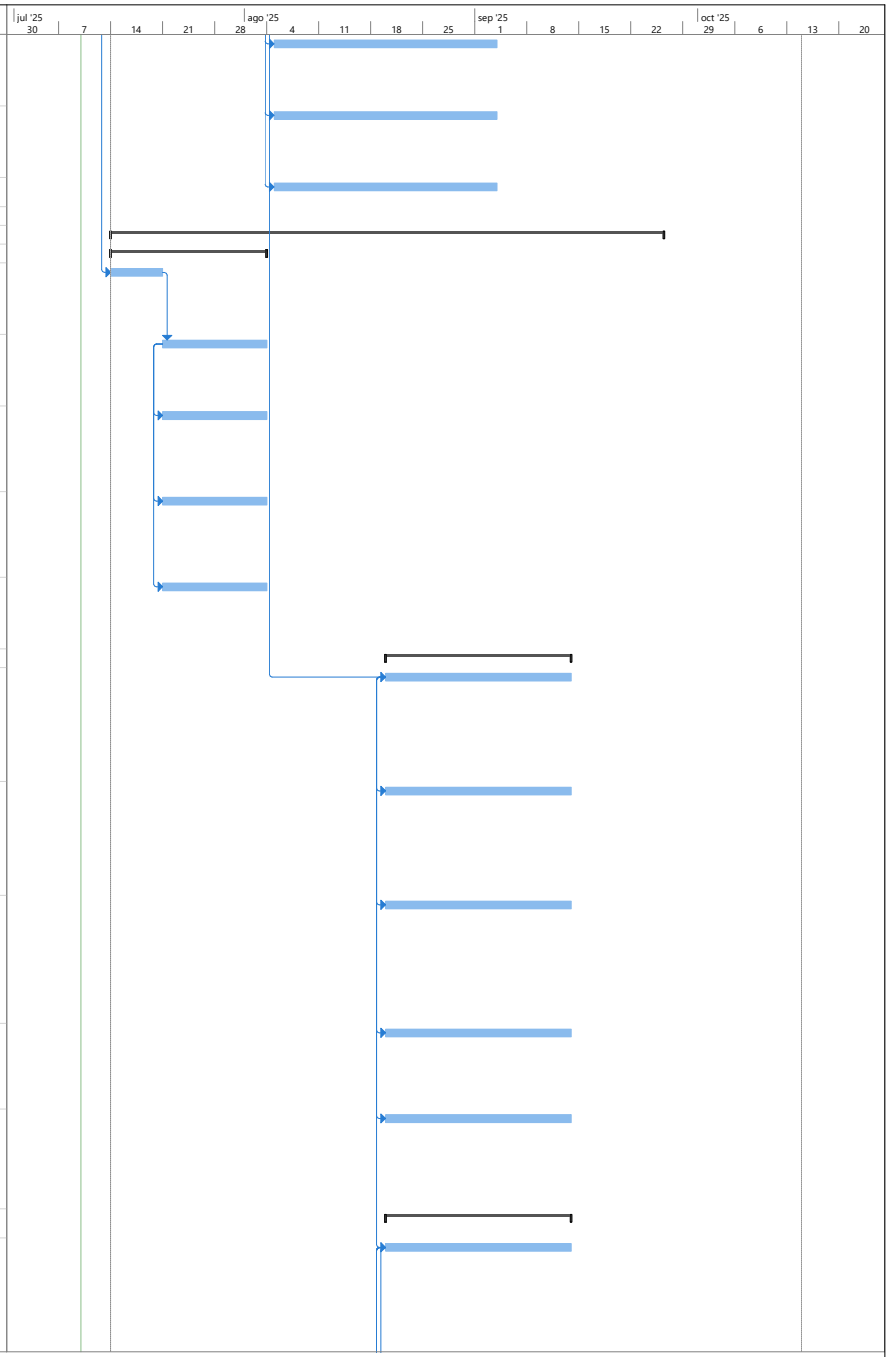


Id	N° Item (Texto1)	Referencia	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
50	5,12	APU 5,12	S.E.I DE REFLECTOR LED SLIM G2,100W VCP O SIMILAR. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG PROMEDIO DE 100 CM, CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA Y SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED.	UND	6,00	$ 1.113.293,51	$ 6.679.761,06	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
51	5,13	APU 5,13	S.E.I DE LUMINARIA POCKET 60X60/INC 40W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON E	UND	24,00	$ 189.464,15	$ 4.547.139,60	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
52	5,14	APU 5,14	S.E.I DE LUMINARIA CIRCULAR DE 24W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RET	UND	71,00	$ 121.346,38	$ 8.615.593,00	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
53	5,15	APU 5,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA 1X26W REDONDA CON VISERA CORTADA, IP - 65, BALASTRO ELECTRÓNICO 2X26W, MULTIVOLTAJE, FACTOR DE POTENCIA >0.95, FACTOR DE BALASTRO >0.9, THD<10%, FACTOR DE CRESTA< 1.7, PROTECCIÓN TÉRMICA INTEG	UND	17,00	$ 96.223,32	$ 1.635.796,44	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
54	5,16	APU 5,16	S.I.E DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO DEL TIPO LEMUR M1 DE VCP O SIMILAR. INCLUYE SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED O TECHO	UND	8,00	$ 311.166,73	$ 2.489.333,84	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
55	5,17	APU 5,17	S.E.I DE INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEGRAND LÍNEA DECORA O SIMILAR, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	30,00	$ 87.629,31	$ 2.628.879,30	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
56	5,18	APU 5,18	S.E.I DE INTERRUPTOR DOBLE MARCA SIMON LÍNEA DECORA, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	$ 89.169,19	$ 267.507,57	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
57	5,19	APU 5,19	S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	252,00	$ 16.666,05	$ 4.199.844,60	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
58	5,20	APU 5,20	S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	252,00	$ 44.857,91	$ 11.304.193,32	25 días	mié 20/08/25	sáb 13/09/25
59			**SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA**			**$ 0,00**	**$ 10.422.518,86**	**25 días**	**lun 1/09/25**	**vie 26/09/25**
60	5,21	APU 5,21	ALIMENTADOR TABLERO TEN 1 EN CABLE 3NO6+1NO.8+1NO.10	ML	30,00	$ 79.528,50	$ 2.385.855,00	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
61	5,22	APU 5,22	ALIMENTADOR TABLERO TEN 2 EN CABLE 3NO8+1NO.10+1NO.10	ML	20,00	$ 57.071,46	$ 1.141.429,20	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
62	5,23	APU 5,23	ALIMENTADOR TABLERO TER EN CABLE 3NO10+1NO.10 CU	ML	20,00	$ 38.862,79	$ 777.255,80	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
63	5,24	APU 5,24	SUMINITRO E INSTALACION DE TABLEROS			$ 0,00	$ 0,00	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
64	5,25	APU 5,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 36 CIRCUITOS DOBLE TAPA, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS NORMAL, EQUIPADOS CON 22 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN1). O REFERENCIAS SIMILARES	UND	1,00	$ 2.483.589,43	$ 2.483.589,43	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
65	5,26	APU 5,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 18 CIRCUITOS DOBLE TAPA,PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 18 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TER). O REFERENCIAS SIMILARES	UND	1,00	$ 1.088.876,00	$ 1.088.876,00	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25



Id	N° Item (Texto1)	Referencia	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
66	5,27	APU 5,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 24 CIRCUITOS DOBLE TAPA, CON TOTALIZADOR SCHNEIDER 3 X 70 AMPERIOS, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 25 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN2). O R	UND	1,00	$ 2.545.513,43	$ 2.545.513,43	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
67			**CANALIZACION**			**$ 0,00**	**$ 6.351.619,50**	**25 días**	**lun 1/09/25**	**vie 26/09/25**
68	5,28	APU 5,28	S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 20X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	50,00	$ 94.761,53	$ 4.738.076,50	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
69	5,29	APU 5,29	S.E.I DE TUBO IMC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	25,50	$ 63.276,19	$ 1.613.543,00	25 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25
70	**SUBTOTAL**					$ 0,00	$ 0,00			
71	**6**		**RED VOZ Y DATOS**			**$ 0,00**	**$ 39.879.994,25**	**30 días**	**lun 1/09/25**	**mié 1/10/25**
72			**RETIRO DE INSTALACIONES**			**$ 0,00**	**$ 502.268,03**	**30 días**	**lun 1/09/25**	**mié 1/10/25**
73	6,1	APU 6,1	DESISTALACIÓN DE RACK 22UR (0.8M), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: MULTITOMA DE 6 SALIDAS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE T	UND	1,00	$ 127.257,93	$ 127.257,93	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
74	6,2	APU 6,2	DESMONTAJE DE SALIDAD PARA DATOS INCLUYE RETIRO CABLEADO, FACEPLATE Y TODOS SUS ELEMENTOS, INCLUYE TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORIA	UND	31,00	$ 12.097,10	$ 375.010,10	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
75			**SUMINITRO E INSTALACION DE REDES**			**$ 0,00**	**$ 39.377.726,22**	**30 días**	**lun 1/09/25**	**mié 1/10/25**
76	6,3	APU 6,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK 42UR (0.8M DE PROFUNDIDAD), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: DISTRIBUIDOR DE FIBRA ODF, CINCO ORGANIZADORES HORIZONTALES 2 UR, MULTITOMA DE 8 SALI	UND	1,00	$ 8.263.774,24	$ 8.263.774,24	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
77	6,4	APU 6,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN MURO) NO INCLUYE CABLE	UND	45,00	$ 85.316,75	$ 3.839.253,75	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
78	6,5	APU 6,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A BLINDADO Y APANTALLADO	ML	450,00	$ 8.000,80	$ 3.600.360,00	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
79	6,6	APU 6,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA AP (REPETIDOR) INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN CIELO DE DRYWALL) NO INCLUYE CABLE	UND	2,00	$ 87.403,26	$ 174.806,52	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
80	6,7	APU 6,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA ENMALLADA DE 20 CM *5,4 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACCION EN VARRILLA ROSCADA CON SOPORTE LATERAL ANCLADO A LOSA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	48,89	$ 70.607,06	$ 3.451.979,16	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
81	6,8	APU 6,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PATCH CORD BLINDADO Y APANTALLADO CATEGORIA 6A DE 7 PIES DE LONGITUD	UND	45,00	$ 43.652,31	$ 1.964.354,00	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
82	6,9	APU 6,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "SWITCH CAPA 2, CAPA 3,SOLUCION VOZ, DATOS Y VIDEOVIGILANCIA(CARACTERISITICAS ADICIONALES) INSTALACIÓN PARA RACK DE 22" Y 42" ,2 UR, 24 PUERTOS(24 X 10/100/1000BASE-T POE, 4 X 10/100/1000 GBE/SFP COMBO) HASTA 30W PO	UND	3,00	$ 6.027.732,85	$ 18.083.198,55	30 días	lun 1/09/25	mié 1/10/25
83	**SUBTOTAL**					$ 0,00	$ 0,00			
84	**7**		**RCI**			**$ 0,00**	**$ 89.585.722,42**	**36 días**	**lun 8/09/25**	**mar 14/10/25**
85			**REDES**			**$ 0,00**	**$ 16.625.370,65**	**30 días**	**lun 8/09/25**	**mié 8/10/25**
86	7,1	APU 7,1	S.E.I. TUBERIAPVC C900 4" INC. ACCESORIOS	ML	6,00	$ 280.255,42	$ 1.681.532,52	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
87	7,2	APU 7,2	S.E.I. TAPON RANURADO UL/FM 4"	UN	2,00	$ 117.341,87	$ 234.683,74	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
88	7,3	APU 7,3	S.E.I. ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 4"	UN	2,00	$ 514.045,92	$ 1.028.091,84	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
89	7,4	APU 7,4	S.E.I. BRIDA RANURADA 4"	UN	1,00	$ 98.445,46	$ 98.445,46	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
90	7,5	APU 7,5	S.E.I. TUBERIASCH40ACCONCOSTURA 4"	ML	40,00	$ 264.716,88	$ 10.588.675,20	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25

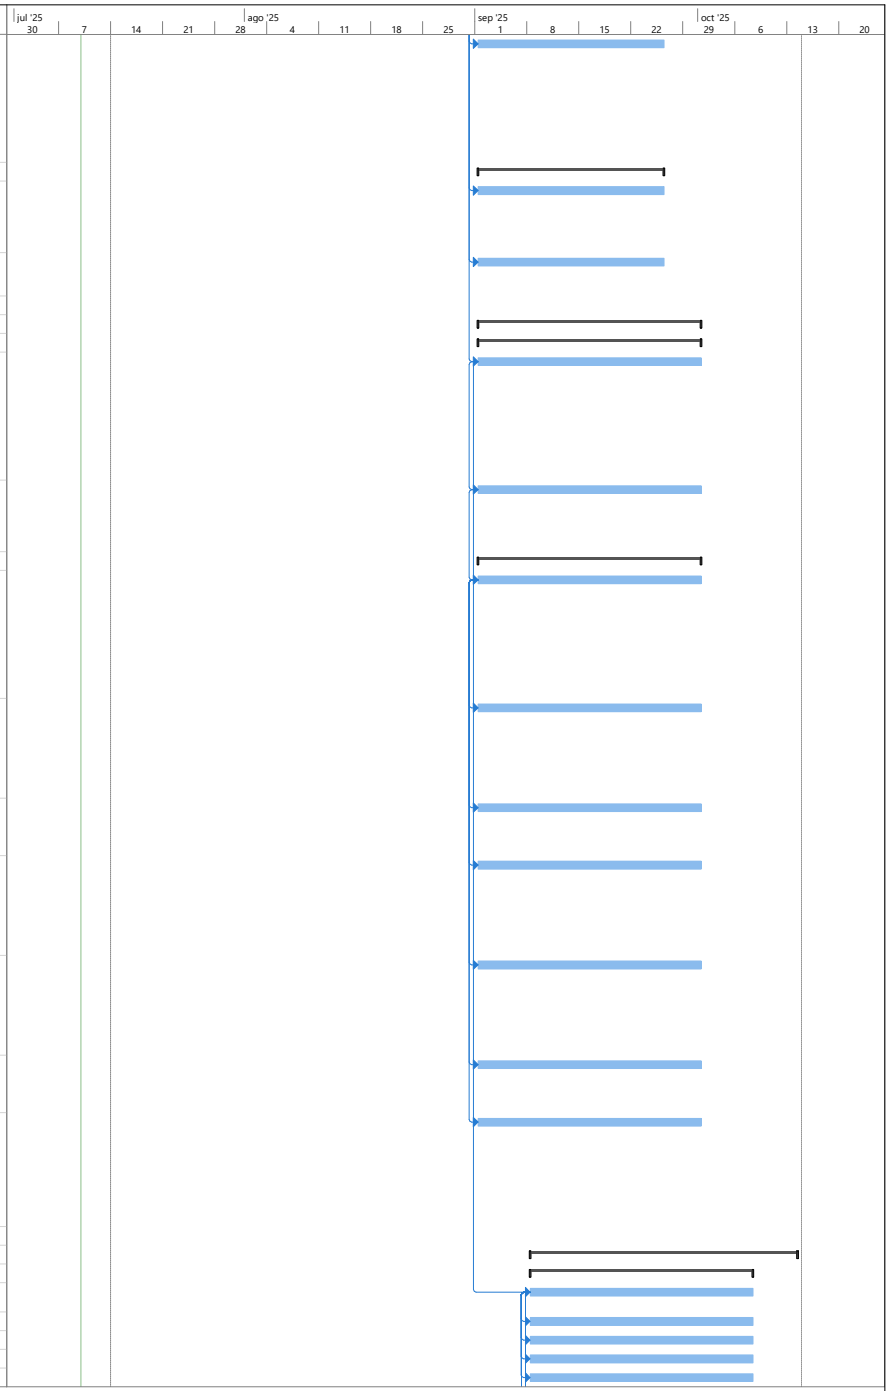

Id	N° Item (Texto1)	Referencia	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
91	7,6	APU 7,6	S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 4"	UN	3,00	$ 67.860,21	$ 203.580,63	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
92	7,7	APU 7,7	S.E.I. TEE HD RANURADO UL/FM 4"	UN	1,00	$ 96.578,15	$ 96.578,15	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
93	7,8	APU 7,8	S.E.I. TUBERIASCH40ACCONCOSTURA 2½"	ML	10,00	$ 146.539,31	$ 1.465.393,10	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
94	7,9	APU 7,9	S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 2½"	UN	6,00	$ 39.698,49	$ 238.191,00	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
95	7,10	APU 7,10	S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 2½"	UN	3,00	$ 32.595,04	$ 97.785,12	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
96	7,11	APU 7,11	S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 4"	UN	17,00	$ 39.939,61	$ 678.973,37	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
97	7,12	APU 7,12	S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 4"X2½"	UN	3,00	$ 71.146,84	$ 213.440,52	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
98			**ACCESORIOS TUBERÍA ENTERRADA**			**$ 0,00**	**$ 1.360.927,86**	**30 días**	**lun 8/09/25**	**mié 8/10/25**
99	7,13	APU 7,13	S.E.I. CODO 90° HIERRO DUCTIL MJ X MJ 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4"	ML	20,00	$ 30.209,87	$ 604.197,40	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
100	7,14	APU 7,14	S.E.I. ADAPTADOR HIERRO DUCTIL MJ X BRIDA 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4"	UN	25,00	$ 18.071,67	$ 451.791,75	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
101	7,15	APU 7,15	S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA PVC 4"	UN	1,00	$ 224.333,39	$ 224.333,39	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
102	7,16	APU 7,16	S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO ACCESORIO HIERRO DUCTIL 4"	UN	1,00	$ 80.605,32	$ 80.605,32	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
103			**VALVULAS**			**$ 0,00**	**$ 9.454.538,51**	**30 días**	**lun 8/09/25**	**mié 8/10/25**
104	7,17	APU 7,17	S.E.I. VALVULA VENTOSA 3/4"	UN	5,00	$ 605.816,74	$ 3.029.083,70	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
105	7,18	APU 7,18	S.E.I. VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 4"	UN	3,00	$ 1.550.904,39	$ 4.652.713,17	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
106	7,19	APU 7,19	S.E.I. VALVULA SIAMESA DE 4"	UN	1,00	$ 1.772.741,64	$ 1.772.741,64	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
107			**SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIONES PARA BOMBEROS**			**$ 0,00**	**$ 3.797.165,98**	**30 días**	**lun 8/09/25**	**mié 8/10/25**
108	7,20	APU 7,20	S.E.I. GABINETES TIPO III (CONTIENE) TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 2 1/2" TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 1 1/2" CODO 90° INSTALACIÓN RÁPIDA 2 1/2" MECHANICAL TEE ROSCADA 2 1/2" X 1 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 2 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 1	UN	2,00	$ 1.898.582,99	$ 3.797.165,98	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
109			**SOPORTES**			**$ 0,00**	**$ 5.782.616,56**	**30 días**	**lun 8/09/25**	**mié 8/10/25**
110	7,21	APU 7,21	S.E.I. SOPORTE PIE AMIGO (PERFIL EN L) 2 1/2"	UN	99,00	$ 16.746,88	$ 1.657.941,12	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
111	7,22	APU 7,22	S.E.I. SOPORTE TIPO PERA 4"	UN	20,00	$ 27.186,28	$ 543.725,60	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
112	7,23	APU 7,23	S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE LONGITUDINAL 4"	UN	4,00	$ 320.322,44	$ 1.281.289,76	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
113	7,24	APU 7,24	S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE TRANSVERSAL 4"	UN	8,00	$ 287.457,51	$ 2.299.660,08	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25
114			**PINTURA**			**$ 0,00**	**$ 1.699.060,30**	**30 días**	**dom 14/09/25**	**mar 14/10/25**
115	7,25	APU 7,25	PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø2"-Ø2½- Ø3"	ML	314,00	$ 4.329,20	$ 1.359.368,80	30 días	dom 14/09/25	mar 14/10/25
116	7,26	APU 7,26	PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø4"	ML	58,00	$ 5.856,75	$ 339.691,50	30 días	dom 14/09/25	mar 14/10/25
117	**SUBTOTAL**					$ 0,00	$ 0,00			
118	**8**		**RDI**			**$ 0,00**	**$ 50.866.042,56**	**25 días**	**lun 15/09/25**	**vie 10/10/25**
119			**SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO**			**$ 0,00**	**$ 28.370.799,81**	**25 días**	**lun 15/09/25**	**vie 10/10/25**
120	8,1	APU 8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DIRECCIONABLE 127 DIRECCIONES, 6 SALIDAS DE NAC Y DE POTENCIA, EXPANDIBLE, CON BATERÍAS 12 AH	UND	1,00	$ 7.587.249,06	$ 7.587.249,06	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
121	8,2	APU 8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATAERIA SISTEMA DE ALARMAS 12V 12AH PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	UND	1,00	$ 382.476,60	$ 382.476,60	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
122	8,3	APU 8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE INCENDIO FOTOELECTRICO. SENSOR FOTOELÉCTRICO DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9714 SIMPLEX O SIMILAR	UND	36,00	$ 312.138,06	$ 11.236.970,16	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
123	8,4	APU 8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DUAL HUMO/TERMICO. SENSOR TÉRMICO DE TEMPERATURA DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9733 SIMPLEX O SIMILAR	UND	1,00	$ 229.362,66	$ 229.362,66	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
124	8,5	APU 8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION MANUAL DOBLE ACCIÓN DIRECCIONABLE DEL TIPO 4099-9006 SIMPLEX O SIMILAR	UND	4,00	$ 540.629,40	$ 2.162.517,60	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
125	8,6	APU 8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO DE ZONAS DEL TIPO 4090-9101 MBZAM SIMPLEX O SIMILAR, INSTALADO SOBRE EN UNA CAJA ELÉCTRICA CUADRADA ESTÁNDAR DE 4 PULGADAS.	UND	1,00	$ 581.332,10	$ 581.332,10	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
126	8,7	APU 8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE PARED DEL TIPO MULTI-CANDELA TRUEALERT A / V CON BOCINA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA SINCRONIZADA 4906-9127 (AV) SIMPLEX O SIMILAR.	UND	11,00	$ 562.808,33	$ 6.190.891,63	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25

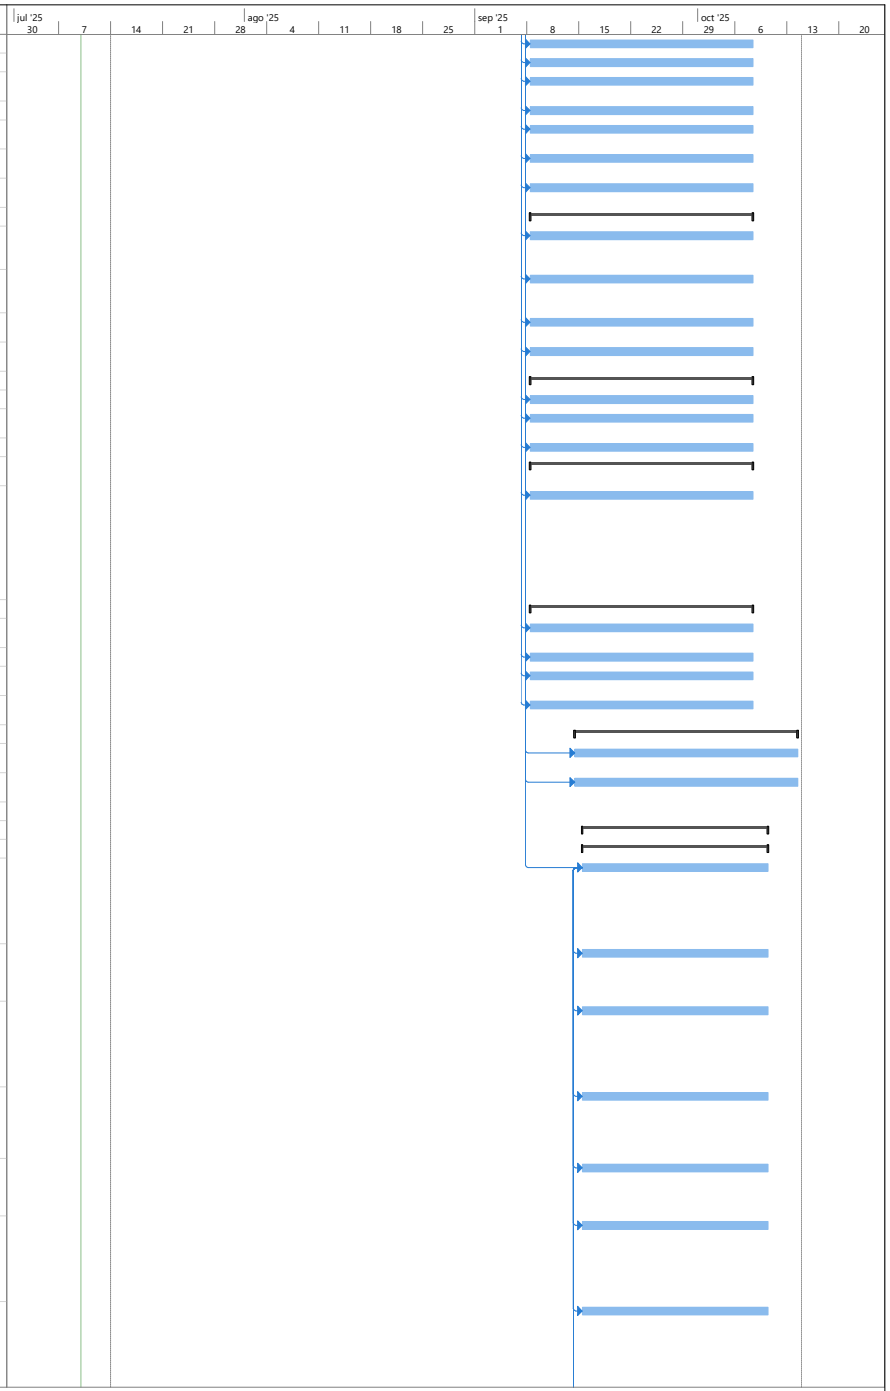

Id	N° Ítem (Texto1)	Referencia	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
127			**INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO**			**$ 0,00**	**$ 22.495.242,75**	**25 días**	**lun 15/09/25**	**vie 10/10/25**
128	8,8	APU 8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT UL 3/4" GALVANIZADO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	232,10	$ 60.625,24	$ 14.071.118,20	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
129	8,9	APU 8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN APANTALLADO	ML	189,00	$ 9.492,73	$ 1.794.126,00	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25
130	8,10	APU 8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×14 APANTALLADO	ML	185,00	$ 35.837,83	$ 6.629.998,55	25 días	lun 15/09/25	vie 10/10/25

