CONTRATO 2024-3665: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 4).

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 02.
PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2025 AL 29 DE MARZO DE 2025
INFORME TÉCNICO 02
Revisión 1.





MARZO DE 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ


CONTROL DE REVISIONES



REVISION	DESCRIPCION	MODIFICACION	FECHA
0	**DOCUMENTO ORIGINAL**		14/04/2025
1	**ATENCION DE OBERVACIONES**		05/05/2025

ELABORADO POR:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Residente de interventoría (diurno)	Jhon Fredy Torres Duque	
Residente de interventoría (nocturno)	Gerson Harley Zapata Delgado	
Ingeniero auxiliar y de garantías	Ferney Velasco Cala	
Profesional siso	Daissy Nataly Pulido Rodríguez	
Especialista de transito	Jovanny Alejandro Vargas Rodríguez	

LA PRESENTE SE FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES DE CADA COMPONENTE:

CARGO	COMPONENTE	NOMBRE	FIRMA
CONTADOR	Contable/Financiero	Wilmer Danilo Clavijo Ortega	
ABOGADO	Jurídico	Diego Enrique Gómez Vera	

CARGO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Miguel Geovanny Torres Burgos	Director de interventoría	
REVISÓ	Luis Nicolai Wilches Palomo	Supervisor del contrato SDM	

Contenido

Contenido 3

1. GENERALIDADES 9

1.1. Introducción 9

1.2. Calendario del proyecto para el presente informe 10

1.3. Localización 10

1.4. Directorio telefónico contrato de obra 12

1.5. Directorio telefónico contrato de interventoría 13

1.6. Directorio telefónico Supervisión 14

1.7. Antecedentes 14

1.8. Descripción del proyecto 15

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 20

2.1. Información de los contratos 20

2.1.1. Contrato de obra 20

2.1.2. Contrato de interventoría 22

2.2. Cuadro de control legal del contratista y de la interventoría 24

2.2.1. Cuadro control legal contrato de obra 24

2.2.2. Cuadro de control legal contrato de interventoría 24

2.3. Cuadro control evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y convenios asociados 24

2.3.1. Cumplimiento de las obligaciones contractuales 24

2.4. Estado y avance presupuestal de los contratos de obra e interventoría 25

2.4.1. Programación del PAC 25

2.4.2. Estado financiero contrato de obra 26

2.4.3. Estado financiero contrato de interventoría 28

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 29

3.1. Cronograma detallado del contrato 29

3.2. Relación de personal interventoría 30

3.3. Actividades desarrolladas por la interventoría 31

3.3.1. Actividades ejecutadas de carácter técnico 31

3.3.2. Actividades ejecutadas de carácter jurídico 38
3.3.3. Actividades de carácter administrativo 39
3.3.4. Actividades de carácter financiero 40
3.3.5. Modificaciones y problemas. 40
3.4. Recursos utilizados por el contrato de obra 40
3.4.1. Personal administrativo ejecución contrato de obra 40
3.4.2. Relación del personal contratista 41
3.5. Relación de equipos contrato de obra 44
3.6. Relación de lluvias 45
3.7. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos 53
3.8. Estado de avance contrato 53
3.8.1. Avance físico de obra 53
3.8.2. Componente de Georreferenciación 57
3.8.3. Componente de Transito 58
3.8.4. Corredores intervenidos 100
3.8.5. Actividades de seguimiento semanal 100
3.8.6. Informe mensual de Obra 101
3.9. Registro fotográfico 101
3.10. Control de calidad 101
3.10.1. Equipo de control en campo y ensayos de laboratorio y toma de reflectividad 106
3.11. Control computadores interventoría 107
3.12. Control vehículos interventoría 108
3.13. Gestiones adelantadas ante las ESP y otras entidades 109
3.14. Informe del estado de las garantías durante el corte del mes 109
3.15. Descripción de obras adicionales y/o complementarias 109
3.16. Correspondencia enviada y recibida 109
3.17. Reporte de producto no conforme 109
3.18. Bitácora de obra 109
3.19. Actas de comité de seguimiento 110

4. INFORMACIÓN SOCIAL 110
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 110
6. COMENTARIOS, CONCLUSIONES 110
7. RECOMENDACIONES 111
8. ANEXOS 111

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Zonas por intervenir 11
Tabla 2. Directorio personal contratista 12
Tabla 3. Directorio personal interventoría 13
Tabla 4. Directorio personal Supervisión 14
Tabla 5. Información General Contrato de Obra 20
Tabla 6. Conformación del consorcio 21
Tabla 7. Pólizas contrato de obra 21
Tabla 8. Información General Contrato de Interventoría 22
Tabla 9. Pólizas de interventoría 23
Tabla 10. Cuadro control legal contrato de obra 24
Tabla 11. Contrato de control legal contrato interventoría 24
Tabla 12. Programación PAC 25
Tabla 13. Avance presupuestal contrato de obra 27
Tabla 14. Cronograma 29
Tabla 15. Relación del Personal 30
Tabla 16. Relación de ID´s Recibidos 36
Tabla 17. Relación obras ejecutadas 38
Tabla 18. Relación de diseños asignados 38
Tabla 19. Personal administrativo contrato de obra 40
Tabla 20. Relación del personal operativo por cuadrillas 41
Tabla 21. Equipos ofrecidos por el contratista 44

Tabla 22. Relación de lluvias 45
Tabla 23. Registro de lluvias presentadas en el periodo 52
Tabla 24. Avance físico contrato de obra mes 2 de ejecución 54
Tabla 25. Línea base de medición de obra 55
Tabla 26. Id´s intervenidos en cuenta 1 57
Tabla 27. Id´s intervenidos en cuenta 2 58
Tabla 28. Otras actividades realizadas en el periodo (reuniones) 59
Tabla 29. Planes de manejo de tránsito vigentes en el periodo 74
Tabla 30. Planes de manejo de tránsito negados en el periodo 98
Tabla 31. Corredores intervenidos 100
Tabla 32. Comités de seguimiento desarrollados en el periodo 100
Tabla 33. Elementos medida y control 102
Tabla 34. Control computadores interventoría 107
Tabla 35. Control vehículos interventoría. 108

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Calendario referente al mes 02 10
Ilustración 2. Mapa localidades Bogotá 11
Ilustración 3. Análisis gráfico avance contrato de obra 27
Ilustración 4. Sticker para identificación de señales en terreno 33
Ilustración 5. Forma de diligenciar el sticker en una señal nueva (Dis_Nue) 34
Ilustración 6. Forma de diligenciar el sticker en una señal reemplazada (Dis_Rep: Prg_Ree) 34
Ilustración 7. Verificación de stickers 36
Ilustración 8. Registro fotografico seguimiento a implementacion de PMT´s 60
Ilustración 9. Registro fotografico seguimiento a implementacion de PMT´s 60
Ilustración 10. Algunos elementos utilizados en campo, flexómetros, odómetros, regleta para medición en micrones de espesor de pintura, pie de rey, termómetro e higrómetro, nivel de mano. 103

Ilustración 11. Elementos utilizados para medir la calidad de las implementaciones realizadas, equipo de retrorreflexión vertical, termohigrómetro digital, lupa con linterna, equipo de retrorreflexión horizontal.....104

Adicionalmente para la ejecución del contrato se cuenta con elementos que permiten el manejo de información tanto física como virtual (impresora, escritorios, plotter, modem de internet), a continuación, su registro fotográfico:.....104

Ilustración 12. Impresoras.....104

Ilustración 13. Escritorios y equipos de computo.....105

Ilustración 14. Plotter.....105

Ilustración 15. Modem de internet.....105

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. STOCK DE SEÑALES VERTICALES.....112

ANEXO 2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES.....113

ANEXO N. 3 TRABAJADORES PROVENIENTES DE POBLACION VULNERABLE.....114

ANEXO N. 4 BITACORA DE OBRA.....115

ANEXO N. 5 CERTIFICADO CALIDAD EQUIPOS.....116

ANEXO N. 6 COMITES SEMANALES.....117

ANEXO N. 7 INDICADORES DE GESTION.....118

ANEXO N. 8 INFORME CALIDAD LABORATORIO DE MUESTRAS.....119

ANEXO N. 9 SOPORTE DE OFICINA.....120

ANEXO 10. INFORMES SEMANALES.....121

ANEXO N. 11 PLANILLAS DE OBRA.....122

ANEXO N. 12 INFORME SST.....123

(INCLUYE PLANILLAS).....123

ANEXO N.13 RELACION CORRESPONDENCIA.....124

ANEXO N. 14 POLIZAS.....125

ANEXO N. 15 REGISTRO FOTOGRAFICO.....126

ANEXO N. 16 INFORME SOCIAL 127
ANEXO N. 17 GEORREFERENCIACION 128
ANEXO N. 18 COMPONENTE DE PMT´S 129
ANEXO N. 19 APROBACIÓN INFORME DE OBRA 130
ANEXO N. 20 HOJA DE VIDA CONTRATO 131

1. GENERALIDADES

1.1. Introducción

Entre **JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.558.244, nombrado mediante Resolución No 85343 del 13 de febrero de 2023 y acta de posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** (en adelante la "Entidad") por una parte; y por la otra **CONSORCIO INTERVAL IP** (en adelante el "Interventor") en mi condición de representante legal, identificado como aparece en el "Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta" hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

Que mediante Resolución 333892 del 27 de septiembre de 2024 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación **SDM-CMA-116-2024.**

Que a través de la Resolución 765799 del 12 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el contrato al oferente **CONSORCIO INTERVIAL IP.**

El contrato de obra tiene como alcance realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C." lote 4- zona centro-sur, implementando la señalización de los diseños, compromisos prioritarios y emergencias y demás solicitudes por parte de la entidad.

Para el control y seguimiento de la ejecución realizada por los contratistas, la Entidad contratante mediante concurso de méritos abierto **SDM-CMA-116-2024** abrió proceso con el objeto de contratar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 4)", una vez adjudicado a CONSORCIO INTERVIAL IP, se celebró el contrato No. 2024-3665 del 27 de diciembre de 2024.

Como parte de las obligaciones contractuales, la Interventoría debe presentar informes mensuales con la información requerida en el Anexo Técnico, que forma parte de los Términos de Referencia de la Interventoría.

De acuerdo con lo anterior se relacionan en este informe básico, las actividades realizadas en desarrollo del contrato durante el segundo mes, comprendido entre el 1 de marzo y el 29 de marzo de 2025.

En el presente informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, con el fin de garantizar la calidad de las obras,

el servicio y seguridad de los usuarios, de la misma manera garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las normas técnicas, ambientales y de seguridad industrial de la Empresa y la Legislación vigente.

En el periodo de referencia correspondiente al "Periodo N°2 (marzo), se cubrieron solicitudes específicas de la secretaría Distrital de Movilidad (en adelante SDM) entre las que se destacan:

- Inspecciones viales, pruebas de verificación de señalización vial implementada, empleando equipos de retro reflexión, resistencia de deslizamiento y probetas en lámina galvanizada.
- Velar por la correcta ejecución de los diseños suministrados por la SDM, tanto en el componente horizontal y vertical, y su respectivo cierre.
- Asistir y presidir las reuniones y comités que cite la interventoría y/o la Entidad.
- Verificar el cumplimiento de los plazos y metas contractuales.
- Coordinar, liderar y verificar que se realicen oportunamente las actividades relacionadas con la revisión y control de las garantías de acuerdo con la matriz de garantías y el protocolo de Garantías.

1.2. Calendario del proyecto para el presente informe

Marzo 2025 (Colombia)

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Ilustración 1. Calendario referente al mes 02

1.3. Localización

La obra objeto de seguimiento y control de la interventoría, se realiza en la ciudad de Bogotá, específicamente en la zona Centro-Sur que corresponde a las localidades de Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, como se puede observar resaltada en azul.

Tabla 1. Zonas por intervenir

ZONA 4	NOMBRE ZONA	LOCALIDADES	CORREDORES VIALES
CONTRACTUAL	CENTRO SUR	Los Mártires	Av. Calle 26
		Rafael Uribe Uribe	NQS
		Puente Aranda	Autopista Sur
		Antonio Nariño	

Fuente: Elaboración propia

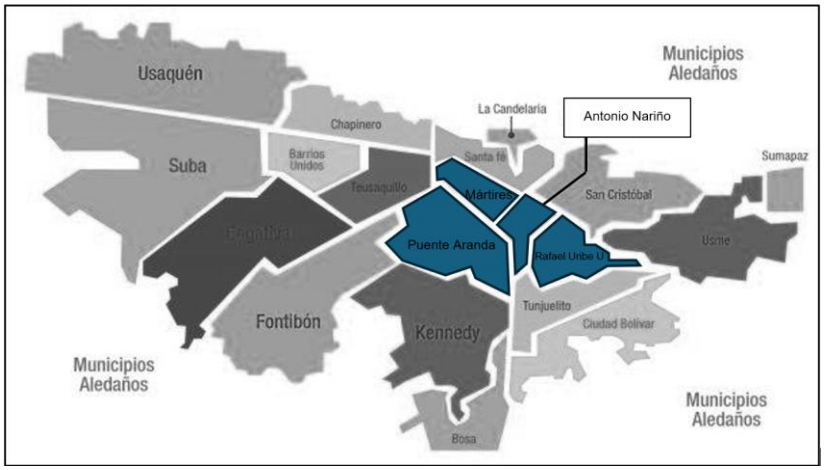


Ilustración 2. Mapa localidades Bogotá

A continuación, se indica cómo están conformadas las localidades por Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), a intervenir por parte del contrato de la zona cuatro – Centro - Sur.

- En la localidad de LOS MÁRTIRES se establece dos UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Santa Isabel, La sabana.

En la localidad de RAFAEL URIBE URIBE se establece cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Diana Turbay, Marco Fidel Suárez, Marruecos, Quiroga y San José.

En la localidad de ATONIO NARIÑO se establece dos UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Ciudad Jardín, Restrepo.

- En la localidad de Puente Aranda se establece cuatro UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Ciudad Montes, Muzú, Puente Aranda, San Rafael

1.4. Directorio telefónico contrato de obra

Tabla 2. Directorio personal contratista

NOMBRE	CARGO	CELULAR	CORREO
MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**3152543813**	consorcio.segvial@gmail.com
JULIAN ANDRES CHARRY ARIZA	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	**3012447077**	especialista.transito.z4@gmail.com
ANDREA KATHERINA ANDRADE ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**3028004536**	consorcio.segvial@gmail.com
MAURICIO FERNANDO LAVERDE ACOSTA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**3104810560**	fmauricio55@gmail.com
KAREN SOFIA LOPEZ PEREZ	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	**304 5906404**	Vinculacionsig@gmail.com
YESSICA YADIRA HERNANDEZ BARRIOS	TRABAJADORA SOCIAL	**3134090156**	socialcsegvial@gmail.com
ANGIE PAOLA LOPEZ ROJAS	PROFESIONAL SST	**3197497494**	uniontemportalsst3648@gmail.com
MARTHA NUBIA ROCHA AREVALO	SECRETARIA	**3223445151**	consorcio.segvial@gmail.com
CALLE 46A # 82-54			

Fuente: Elaboración propia

1.5. Directorio telefónico contrato de interventoría

Tabla 3. Directorio personal interventoría

NOMBRE	CARGO	CELULAR	CORREO
ING. MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**3003410829**	consorciointervialip@coninterpro.com.co
ING. JOVANNY ALEJANDRO VARGAS RODRÍGUEZ	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	**3143480794**	proyectosaprovar@gmail.com
ING. JOHN FREDY TORRES DUQUE	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**3103120594**	intervial.residente@gmail.com
ING. GERSON ZAPATA DELGADO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**3102895594**	residentenocturnosdm@gmail.com
ING. MADELEINE PORRAS MEZA	TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	**3053711017**	ingeniera.sigcad@gmail.com
ING. FERNEY VELASCO CALA	INGENIERO AUXILIAR Y DE APOYO PARA OBRA Y GARANTÍAS	**3006582192**	ing.ferneyvelasco@gmail.com
ING. JUAN SEBASTIAN CASTRO ARAGON	INGENIERO AUXILIAR Y DE APOYO PARA OBRA Y GARANTÍAS	**3012036207**	ingjuansebastianc@gmail.com
ING. DAISSY NATALY PULIDO RODRIGUEZ	PROFESIONAL SST	**3118305085**	consorcio2025sst@gmail.com
BAYRON OSWALDO GARCIA GAITAN	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	**3158455377**	inspbayrongarcia@gmail.com
MARCELA RIVERA CARRASCO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	**3013486851**	inspmarcelarivera@gmail.com
ANGIE LIZETH DAZA VEGA	SECRETARIA	**3142877022**	intervialip@gmail.com
DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA	ABOGADO	**3204499784**	Gerenciageneral@interpro.com.co
WILMER DANILO CLAVIJO ORTEGA	CONTADOR	**3209182208**	Contador@interpro.com.co
CALLE 12B # 27 - 40 OFICINA 201			

Fuente: Elaboración propia

1.6. Directorio telefónico Supervisión

Tabla 4. Directorio personal Supervisión

NOMBRE	CARGO	CELULAR	CORREO
FRANCY ANDREA GUTIERREZ	SUBDIRECTORA DE SEÑALIZACIÓN	**3214420780**	Fagutierrez@movilidadbogota.com.co
LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO	SUPERVISOR CONTRATO	**3002196475**	lwilches@movilidadbogota.gov.co
CRISTEL CAROLINA CASTIBLANCO LOPEZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN	**3124337242**	ccastiblanco@movilidadbogota.gov.co

Fuente: Elaboración propia

1.7. Antecedentes

(…)"(…)Dentro de las principales problemáticas que se evidencian en el sistema de movilidad en Bogotá se resaltan aspectos como: la siniestralidad vial, asociada principalmente a la víctimas lesionadas y fatales (más de quinientas (500) al año) causadas por siniestros de tránsito; la falta de accesibilidad y la ausencia o deficiencia de infraestructura vial en condiciones óptimas en ciertos sectores de la ciudad; y la congestión vial que repercute en altos tiempos de viaje en los desplazamientos diarios de los ciudadanos.
Con el fin de combatir estas problemáticas, la ciudad requiere contar con un sistema de señalización integral para todos los usuarios viales, con enfoque en medidas de gestión de la velocidad y zonas de tránsito seguro, con el fin de brindar condiciones adecuadas de Seguridad vial, movilidad y accesibilidad en la ciudad. Es así como con el Plan Distrital de Desarrollo, la señalización se refuerza como un eje fundamental para lograr parte de los propósitos descritos dentro del principio de prosperidad, pues se busca mejorar la experiencia de los viajes o desplazamientos de los ciudadanos en términos de tiempo, calidad y costo, impactando directamente en la calidad de vida de los Bogotanos y haciendo que los ciudadanos tengan una vida próspera con progreso económico, social y tecnológico en armonía con el medio ambiente y el entorno que los rodea.

Para realizar el cubrimiento y atención de las necesidades de señalización en la ciudad, se deben diseñar e implementar diseños integrales que incluyan elementos para reglamentar,

prevenir e informar al usuario sobre las condiciones adecuadas de operación en las diferentes zonas de la ciudad, lo anterior con el fin de reducir o mitigar los impactos generados por el tránsito y promover la seguridad vial en la ciudad. (…)" (Secretaria Distrital de Movilidad)

1.8. Descripción del proyecto

Para la ejecución del proyecto se requiere planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la instalación y/o implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal en las diferentes zonas de la ciudad de Bogotá D.C.

Una vez se ha asignado un diseño o compromiso de implementación éste debe ser incluido en la hoja de vida del contrato y proceder a ejecutar los siguientes pasos:

- **Paso 1:** Entrega de diseños, verificación de que corresponda a la última versión y factibilidad de implementación de la señalización: Recibidos los diseños asignados, se deberá solicitar al grupo SIG la última versión de estos. Así mismo, el contratista verificará la existencia de otros proyectos (como ciclorrutas en calzada, intervenciones de otras entidades públicas o privadas, Instituto de Desarrollo Urbano, Fondos de Desarrollo Local, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, etc.) en la zona de influencia del diseño entregado con el fin de verificar la factibilidad de implementar la señalización solicitada sin que se cruce con otro proyecto o intervención, para tal fin deberá generar las acciones pertinentes (comunicaciones, reuniones, consultas vía web, entre otras) para realizar la consulta con otras entidades ejecutoras, no obstante, también deberá consultar la herramienta ofimática http://sig.simur.gov.co/Visor_DCV/, al igual que la herramienta de seguimiento a proyectos – SIGIDU y la página de Servicios geográficos del IDU https://webidu.idu.gov.co/sigidu/ entre otras. De las acciones realizadas, se deberá llevar un registro y sus soportes correspondientes (radicados, actas, pantallazos, oficios, etc.) en el que se describa los pormenores de cada gestión y este reporte debe ser incluido en el informe mensual.

En caso de omitir el proceso anterior o desconocer el desarrollo o prevalencia de otros proyectos en la zona y si se procede con la implementación, ésta será a riesgo y costo del contratista y de la Interventoría.

Realizada la verificación anterior, el diseño o compromiso de implementación deberá ser incluido en la hoja de vida del contrato, el contenido de este formato se describe en el numeral 3.18.1. Comité Técnico de Seguimiento Semanal de este anexo técnico.

- **Paso 2:** Programar y realizar la visita de inspección conjunta entre la interventoría y el contratista al sitio en donde se desarrollarán las actividades de implementación de la señalización vial, con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía.

  Así mismo verificar que las condiciones operacionales y de movilidad del sector correspondan a lo planteado en el diseño de señalización a implementar.

  Como soporte de dicha visita de inspección se debe consolidar en el formato de resultado el registro de las evidencias de la visita, con soporte de registro fotográfico y las recomendaciones y conclusiones para la implementación o no del diseño de señalización.

  El formato de resultado de la visita de inspección debe contener como mínimo la siguiente información:

  - ✓ Información general del contrato de obra e Interventoría
  - ✓ ID de diseño, localidad, UPZ, versión del diseño
  - ✓ Fecha de inspección
  - ✓ Nombre del código de identificación vial CIV de cada tramo inspeccionado, código de identificación de calzada PKID o código que aplique al espacio público especifico y características del mismo para la valoración de la duración de las garantías (clasificación del TPD por CIV, valoración de la contaminación, estado del pavimento, tipo de pavimento, entre otros)
  - ✓ Resultado de la inspección y valoración de garantía según aplique
  - ✓ Registro fotográfico
  - ✓ Recomendaciones y conclusiones para la implementación o no del diseño de señalización.

- **Paso 3:** Como resultado del paso anterior, el contratista y la interventoría realizarán una valoración preliminar del costo de implementación del diseño correspondiente tanto en componente horizontal como vertical. Esta información será incorporada en la hoja de vida del contrato que deberán diligenciar ambas partes.

  Adicionalmente, a partir del paso anterior se definirán los tiempos de garantía aplicables a cada una de las marcas, señales y elementos de señalización que se implementen, información que deberá reportarse a la Entidad.

- **Paso 4:** Programar la ejecución de las actividades de obra para la implementación de señalización horizontal y/o vertical, para lo cual el Contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar afectaciones, riesgos o siniestros a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emitidas de las Entidades Distritales.

  El Contratista adelantará los trámites y consultas que sean necesarios con las demás Entidades del Distrito, a fin de coordinar la concurrencia en desarrollo de proyectos y mitigar afectaciones a la señalización implementada por intervenciones programadas o reservadas para la malla vial. En el informe mensual se incluirá registro de los trámites y consultas adelantados y de las acciones realizadas.

- **Paso 5:** Realizar las actividades para la aprobación del plan de manejo de tránsito de acuerdo con las normas vigentes al momento de la ejecución y debe tener en cuenta la respectiva señalización de obra, el contratista presentará el plan de manejo de tránsito - PMT- a la Interventoría, quien una vez revisará, avalará y radicará ante la SDM para su aprobación y publicación en el COI.

- **Paso 6:** Realizar las actividades de divulgación y sensibilización a la comunidad dando a conocer las características del proyecto, los elementos que componen el diseño de señalización a implementar y las ventajas y desventajas de este dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.9 del anexo técnico.

- **Paso 7:** Presentar, para aprobación de la interventoría, un cronograma o programación de las actividades de obra específico para los diseños y compromisos asignados para ejecutar.

  Se deberá cumplir y hacer seguimiento a las actividades de instalación de señales, verificando que se ajusten en todo a lo presentado en el informe de la visita de campo y propuesta técnica de señalización. De no ser así generar el reporte respectivo.

  Se deberá suministrar y transportar los diferentes materiales, maquinaria y elementos al sitio de instalación, cuidando de no afectar la circulación vehicular y peatonal del sector a intervenir y aplicando las medidas de seguridad establecidas en el PMT aprobado.

  De no cumplir con la implementación del PMT tal cual fue aprobado por la Entidad, se aplicará el Acuerdo de Nivel de Servicio. Si esta situación es reiterativa y supera el tope de descuentos establecidos en el ANS, se iniciarán las acciones legales para adelantar un debido proceso y definir posible incumplimiento, si hay lugar a ello.

- **Paso 8:** El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido sobre la preservación de redes y protección del espacio público, de acuerdo con lo definido por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, el IDU y las demás entidades competentes.

  En caso de afectarse durante la ejecución de las actividades de obra alguna red o el espacio público deberá cumplirse lo establecido en el numeral 3.3. AFECTACIÓN EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS, del anexo técnico.

  Cuando se afecte la estructura de andenes, separadores y espacio público peatonal se deberá recuperar de acuerdo con los requerimientos y condiciones establecidas para tal fin (Secretaría Distrital de Planeación – Cartilla de Andenes).

  De estos eventos se deberá incluir en el informe mensual, registro e información sobre las acciones adelantadas para darle solución, así como las evidencias.

- **Paso 9:** Para iniciar las labores de implementación de señalización, el contratista deberá, en coordinación con la interventoría, adelantar las acciones de verificación de los equipos y su óptimo funcionamiento. Para los equipos de aplicación deberá tener en cuenta los factores que afectan la velocidad, presión de aplicación, apertura y altura de boquillas para garantizar: ancho de línea, espesores solicitados en las especificaciones técnicas y cantidades de obra.

  Durante el proceso de implementación deberá:

  a. Reportar a diario las intervenciones realizadas registrando información básica como: ID (Identificación del diseño), CIV (Código de identificación vial), PKID (código de identificación de calzada) o codificación que aplique al espacio público específico, dirección, fecha de intervención o de inicio de la implementación, jornada (diurna o nocturna), condiciones meteorológicas (humedad relativa, temperatura, estado del tiempo, entre otros), personal y equipos en obra, item, cantidad ejecutada por ítem, porcentaje de avance en la implementación del CIV (cuando no se termina en una jornada), este porcentaje debe actualizarse cada día según el avance de las actividades hasta que se culmina o se llega al 100% de implementación en el CIV, fecha de finalización de la implementación del CIV y la demás requerida por la entidad (por ejemplo: cupos de estacionamiento, zonas escolares y otros según proyectos estratégicos). Este reporte se hará a la Entidad a través del sistema de información que se indique durante el desarrollo del contrato (aplicativo, medio de comunicación, bases de datos o cualquier otro desarrollado).

b. Reportar registro fílmico o fotográfico que permita evidenciar las condiciones previas y posteriores a la implementación, para lo cual deberá seguir las recomendaciones establecidas para la toma de fotos y videos en el Apéndice C "Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video", tenga en cuenta que para tomar el registro fotográfico, se deben establecer unos puntos de referencia, desde los cuales se realizarán las capturas en los diferentes momentos de la intervención (antes, durante y después). Así mismo las imágenes de las fotografías deben poder observarse con claridad para evidenciar cambios, avance y estado final de la implementación, por lo tanto, no deben estar cargadas de información como textos, logos de empresa contratista, de ubicación de la imagen o mapas que interfieran con la imagen principal que se quiere mostrar. Lo que se solicita es que la foto contenga la información básica como Fecha y hora de la captura, dirección de la implementación (coordenadas opcionales) e identificación del diseño.

c. Todas las señales verticales instaladas deberán contar con el adhesivo de identificación que cumpla con el modelo e información establecidos por la Entidad.

Nota: En el último mes de ejecución del contrato, el contratista deberá tener previsto en el plan de trabajo que las actividades de implementación y georreferenciación en ese último periodo deberán ejecutarse dentro del término contractual y contar con el concepto favorable de verificación de la georreferenciación por parte de la Entidad, este último trámite no podrá superar el plazo contractual.

- **Paso 10:** Deberá actualizarse en la hoja de vida del contrato la información relativa a las fechas de ejecución y costos de la implementación por cada ID de diseño o compromiso ejecutado. Deberá entregarse también para cada implementación un registro fotográfico de la condición antes, durante y después de la intervención (cumpliendo con parámetros adecuados para su visualización y entendimiento, conforme al Apéndice C "Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video") y como se explica en el paso 9.

- **Paso 11:** En un paso previo a la radicación de las cuentas mensuales ante la subdirección financiera, el contratista con acompañamiento de la interventoría deberá formalizar ante el almacén para el registro contable, la entrega de los elementos de señalización implementados (diferentes a la demarcación en pintura) y el inventario de las señales verticales retiradas de vía (tanto de pedestal como elevadas).

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1. Información de los contratos

2.1.1. Contrato de obra

2.1.1.1. Objeto

Contrato de obra No 2024 - 3650 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y Consorcio Seg Vial Bogotá, cuyo objeto es "**REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 4 - ZONA CENTRO-SUR.**

A continuación, en la siguiente tabla, se relacionan los actos administrativos y las fechas de suscripción del contrato de obra:

Ver Anexo 14, Pólizas

Tabla 5. Información General Contrato de Obra

CONTRATO No.	2024-3650
CONTRATANTE	SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL	MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
NIT	901.898.342-6
MODALIDAD DE CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE DE 2027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$18.771.473.428,00

Fuente: Elaboración propia

2.1.1.2. Conformación del consorcio

El consorcio Seg Vial Bogotá está integrado por los siguientes componentes:

Tabla 6. Conformación del consorcio

Integrante	Participación (%)
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	10
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	45
PINTUVIAL SAS	45

Fuente: Elaboración propia

2.1.1.3. Pólizas contrato de obra

En atención a la obligación contractual establecida en la Cláusula Décima Octava-Garantías - del Contrato de Obra No.2024-3650, el contratista Consorcio Seg Vial Bogotá remitió para aprobación a la secretaria Distrital de Bogotá la Póliza Única de Cumplimiento No. 96-44-101194633 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101069047

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 7. Pólizas contrato de obra

Amparo	Vigencia		No póliza	Valor asegurado
	Desde	Hasta		
Cumplimiento	27/12/2024	27/04/2028	96-44-101194633	$5.631´442.028,40
Pago de salarios, prestaciones	27/12/2024	27/10/2030	96-44-101194633	$3.754´294.685,60

Amparo	Vigencia		No póliza	Valor asegurado
	Desde	Hasta		
sociales e indemnizaciones				
Estabilidad y calidad de la obra	27/10/2027	27/10/2032	96-44-101194633	$5.631´442.028,40
Calidad del bien	27/10/2027	27/04/2028	96-44-101194633	$5.631´442.028,40
Responsabilidad civil extracontractual	27/12/2024	27/10/2027	96-40-101069047	$938´573.671,40

Fuente: Elaboración propia

2.1.2. Contrato de interventoría

2.1.2.1. Objeto

Contrato de Interventoría No. 2024-3665 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y CONSORCIO INTERVIAL IP, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 4).**

A continuación, en la siguiente tabla se relacionan los actos administrativos y las fechas de suscripción del contrato de interventoría:

Ver Anexo 14, Pólizas

Tabla 8. Información General Contrato de Interventoría

CONTRATO No.	2024-3665
CONTRATANTE	SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAL IP
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA

NIT No.	901.898.791-1
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE DE 2027
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.401.092.521,00

Fuente: Elaboración propia

2.1.2.2. Pólizas de la interventoría

En atención a la obligación contractual establecida en la Cláusula Décima Séptima- Garantías - del Contrato de Obra No.2024-3665, CONSORCIO INTERVIAL IP. remitió para aprobación a la Secretaría Distrital de Bogotá la Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales No. 14-44-101227241.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Tabla 9. Pólizas de interventoría

Amparo	Vigencia		No póliza	Valor asegurado
	Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	27/12/2024	27/05/2028	14-44-101227241	$1.620´327.756,30
Pago de salaries, prestaciones sociales e indemnizaciones	27/12/2024	27/11/2030	14-44-101227241	$1.080´218.504,20
Calidad del servicio	27/11/2027	27/11/2032	14-44-101227241	$1.620´327.756,30

Fuente: Elaboración propia

2.2. Cuadro de control legal del contratista y de la interventoría

2.2.1. Cuadro control legal contrato de obra

En la siguiente tabla se presenta la relación de actas legales suscritas por el Contratista hasta la fecha de corte del periodo en evaluación.

Tabla 10. Cuadro control legal contrato de obra

ACTA No.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	Acta de Inicio Contrato de obra No. 2024-3650	ENERO 30 DE 2025
2	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (30/01/2025 – 28/02/2025)	MARZO 10 DE 2025
3	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (01/03/2025 – 29/03/2025)	ABRIL 7 DE 2025

Fuente: Elaboración propia

2.2.2. Cuadro de control legal contrato de interventoría

En la siguiente tabla se presenta la relación de actas legales tramitadas por la Interventoría hasta la fecha de corte del periodo en evaluación.

Tabla 11. Contrato de control legal contrato interventoría

ACTA No.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	Acta de Inicio Contrato de interventoría No. 2024-3665	ENERO 30 DE 2025
2	Acta de pago No. 1 (30/01/2025 – 28/02/2025)	MARZO 10 DE 2025
3	Acta de pago No. 2 (01/03/2025 – 29/03/2025)	ABRIL 7 DE 2025

Fuente: Elaboración propia

2.3. Cuadro control evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y convenios asociados

2.3.1. Cumplimiento de las obligaciones contractuales

Para el presente periodo no se presentan incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del Consorcio Seg Vial Bogotá.

2.4. Estado y avance presupuestal de los contratos de obra e interventoría

2.4.1. Programación del PAC

Tabla 12. Programación PAC

PERIODO	PARA PAGO EN	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INTERVENTORÍA
30/01/2025 A 28/02/2025	MARZO DE 2025	$ 30.000.000,00	1,60%	$ 113.994.823,33
01/03/2025 A 31/03/2025	ABRIL DE 2025	$ 1.393.186.671,00	7,42%	$ 239.732.257,21
01/04/2025 A 30/04/2025	MAYO DE 2025	$ 398.573.671,00	5,00%	$ 187.449.681,61
01/05/2025 A 31/05/2025	JUNIO DE 2025	$ 750.858.937,00	4,00%	$ 165.845.311,53

2.4.2. Estado financiero contrato de obra

A la fecha de corte del presente informe, se han presentado dos Actas de recibo parcial de obra por parte del Contratista; correspondientes a los periodos 30/01/2025-28/02/2025, 01/03/2025-29/03/2025

2.4.2.1. Estado y avance presupuestal al contrato de obra

A continuación, se relaciona el estado, avance y control financiero del Contrato de Obra

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 2024 - 3650

VALOR INICIAL	$ 18.771.473.428,00
MODIFICACIONES	
VALOR TOTAL	**$ 18.771.473.428,00**

								GEOREFERENCACIÓN APROBADA				
PAGOS EFECTUADOS	PERIODO		COSTO TOTAL	COSTO BÁSICO (Redondeado al peso)	SUMINISTROS Y PASACALLES	VALOR TOTAL ACTA	RETEGARANTÍA (5%)	ESTA CUENTA	CUENTA ANTERIOR	DESCUENTO 15% GEOREFERENCIACIÓN	NETO A GIRAR	ESTADO
CUENTA No 1	30/01/2025	28/02/2025	$ 149.588.349,00	$ 149.588.349,00	$ 140.633.214,00	$ 290.221.563,00	$ 14.511.078,15			$ 22.159.068,00	$ 253.551.417,00	PAGADA
CUENTA No 2	1/03/2025	29/03/2025	$ 837.103.559,00	$ 837.103.559,00		$ 837.103.559,00	$ 41.855.178,00	$ 141.935.808,00	$ 22.159.068,00	$ 103.924.332,00	$ 713.483.117,00	
				$ 986.691.908,00	TOTALES	$ 1.127.325.122,00	$ 56.366.256,15		$ 22.159.068,00			

TOTAL FACTURADO PRESENTE PERIODO	$	837.103.559.00
TOTAL ACUMULADO	$	1.127.325.122.00
SALDO POR FACTURAR	$	17.644.148.306.00

Tabla 13. Avance presupuestal contrato de obra

Periodo	Programado	Ejecutado	Variación	Atraso
Semana 1	$ 141.724.624,25	$ -	0,75%	0,75%
Semana 2	$ 141.724.624,25	$ -	0,75%	1,51%
Semana 3	$ 141.724.624,25	$ 52.613.458,00	0,47%	1,98%
Semana 4	$ 141.724.624,25	$ 291.463.279,00	-0,79%	1,19%
Semana 5	$ 225.257.681,00	$ 282.019.362,08	-0.31%	0,88%
Semana 6	$ 225.257.681,00	$ 159.771.370,89	0.35	1,23%
Semana 7	$ 225.257.681,00	$ 72.013.228,70	0.82%	2,05%
Semana 8	$ 225.257.681,00	$ 204.933044,33	0.11%	2.16%
Semana 9	$ 225.257.681,00	$ 217.486.094,78	0.04%	2.2 %

Fuente: Elaboración propia

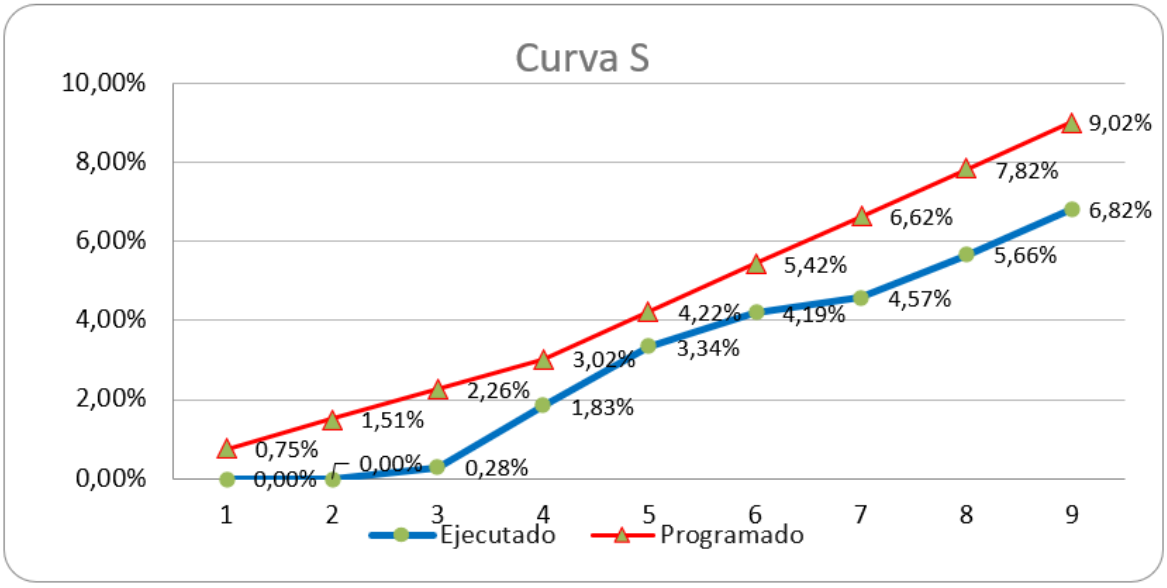


Ilustración 3. Análisis gráfico avance contrato de obra

2.4.3. Estado financiero contrato de interventoría

A la fecha de corte del presente informe, se han presentado dos cuentas; correspondientes a los periodos 30/01/2025-28/02/2025, 01/03/2025-31/03/2025.

2.4.3.1. Estado y avance presupuestal al contrato de interventoría

A continuación, se relaciona el estado, avance y control financiero del Contrato de Interventoría.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2024 - 3665

		FIJO (50%)	AVANCE (40%)	LIQUIDACIÓN (10%)	VALOR TOTAL
VALOR INICIAL	$ 5.401.092.521,00	$ 2.700.546.260,50	$ 2.160.437.008,40	$ 540.109.252,10	$ 5.401.092.521,00
MODIFICACIONES		$ -	$ -	$ -	$ -

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO		VALOR FIJO	VALOR VARIABLE	VALOR A DESCONTAR	VALOR A FACTURAR	DESCUENTO 15% GEOREFERENCIACIÓN	GEO APROBADA CUENTA ANTERIOR	NETO A GIRAR	ESTADO
CUENTA No 1	30/01/2025	28/02/2025	$ 79.427.831,00	$ 33.402.035,00		$ 112.829.866,00	$ 5.010.305,00		$ 107.819.561,00	PAGADA
CUENTA No 2	1/03/2025	29/03/2025	$ 79.427.831,00	$ 96.343.503,00		$ 175.771.334,00	$ 14.451.525,00	$ 5.010.305,00	$ 166.330.114,00	
	TOTALES		$ 158.855.662,00	$ 129.745.538,00		$ 288.601.200,00				

TOTAL VALOR BÁSICO FACTURADO	$ 158.855.662,00
TOTAL VALOR FIJO	$ 2.700.546.260,50
SALDO POR FACTURAR	$ 2.541.690.598,50

TOTAL AVANCE DE OBRA FACTURADO	$ 129.745.538,00
TOTAL AVANCE DE OBRA	$ 2.160.437.008,40
SALDO POR FACTURAR	$ 2.030.691.470,40

TOTAL FACTURADO PRESENTE PERIODO	$ 175.771.334,00
TOTAL ACUMULADO	$ 288.601.200,00
SALDO POR FACTURAR	$ 5.112.491.321,00

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1. Cronograma detallado del contrato

Tabla 14. Cronograma

ACTIVIDAD	DURACION	AÑO 1												AÑO 2												AÑO 3									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CONSORCIO SEG. VIAL BOGOTÁ	**34**																																		
ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA IMPLEMENTACION Y ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACION	***33***																																		
1. Entrega de los Diseños, Verificacion de que Corresponda a la Ùltima Versiòn y Factibilidad de la Implementaciòn de la Señalizaciòn.	33																																		
2. Visita de Inspecciòn	33																																		
3. Valoracion del Costo de la Implementaciòn	33																																		
4. Programacion de la Ejecuciòn de las Actividades	33																																		
5. Elaboraciòn y Tràmite de Aprobaciòn del PMT	33																																		
6. Actividades de Divulgaciòn y Sensibilizaciòn.	33																																		
7. Programacion de Actividades.	33																																		
8. Tràmites Adelantados por Afectaciòn de Redes de Servicio Pùblicos y Recuperaciòn a Condiciones Originales del Espacio Pùblico Afectado.	33																																		
9. Implementaciòn de la Señalizaciòn, Registro Fotogràfico y/o Filmico	33																																		
10. Actualizaciòn de la Hoja de Vida del Contrato	33																																		
11. Entrega de Elementos Implementados y Retirados del Almacen	33																																		
ACTIVIDADES DE GEOREFERENCIACIÒN	***33***																																		
12. Elaboraciòn de Planos Rècord y Diligenciamiento de Planillas de Obra.	33																																		
ACTIVIDADES DE CIERRE DE GEOREFERENCIACIÒN Y CIERRE DE CONTRATO	***1***																																		

3.2. Relación de personal interventoría

Tabla 15. Relación del Personal

CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN		PROFESIONAL APROBADO
Director de Interventoría	1	MES	70%	Miguel Geovanny Torres Burgos
Especialista Transito	1	MES	50%	Jovanny Alejandro Vargas Rodríguez
Ingeniero Residente (Diurno)	1	MES	100%	John Fredy Torres Duque
Ingeniero Residente (Nocturno)	1	MES	100%	Gerson Zapata Delgado
Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y garantías (Diurno)	1	MES	100%	Ferney Velasco Cala
Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y garantías (Nocturno)	1	MES	100%	Juan Sebastián Castro Aragón
Inspector de Interventoría (Diurno)	1	MES	100%	Byron Oswaldo García Gaitán
Inspector de Interventoría (Nocturno)	1	MES	100%	Marcela Rivera Carrasco
Profesional SST	1	MES	40%	Daissy Nataly Pulido Rodríguez
Tecnólogo en georreferenciación	1	MES	100%	Madeleine Porras
Abogado	1	MES	20%	Diego Enrique Gómez Vera
Contador	1	MES	20%	Wilmer Danilo Clavijo Ortega
Secretaria	1	MES	100%	Angie Lizeth Daza Vega
Conductor (Diurno)	2	MES	100%	Javier Andrade // Naguid Quiroga Cardona
Conductor (Nocturno)	2	MES	100%	Nelson Bohórquez // John Bermúdez

Fuente: Elaboración propia

3.3. Actividades desarrolladas por la interventoría

3.3.1. Actividades ejecutadas de carácter técnico

El Consorcio Intervial IP, en este segundo periodo de ejecución que corresponde desde el 01 de marzo de 2025 al 29 de marzo 2025, ha realizado seguimiento al cumplimiento de las exigencias de la Secretaría de Movilidad a cargo del contratista de obra Consorcio Seg Vial Bogotá, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría de la SDM.

De igual manera se han venido desarrollando las siguientes actividades:

Se trabajó en el cumplimiento de las metas contractuales e igualmente en la medición de los indicadores establecidos por la secretaria de Movilidad.

Se ha realizado seguimiento diario, semanal y mensual sobre el atraso de obra que se presenta, causado por un factor importante, la presencia de lluvias en jornada nocturna, así mismo se trabajó en un plan de contingencia para compensar el retraso actual.

Se realizó de forma conjunta con el contratista la inspección, inventario y recorrido de todos los sectores viales recibidos, para establecer las garantías, condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos los demás factores que puedan afectar la correcta ejecución en virtud de las directrices emitidas por la supervisión de la secretaria de movilidad, así mismo la aprobación de los presupuestos de obra para su implementación.

Aprobación del plan de intervención y el cronograma de actividades en cuanto a señalización horizontal y vertical e instalación de dispositivos.

Se han realizado comités técnicos semanales, para informar el estado del contrato a la secretaria de movilidad y aclarar inquietudes y dudas respecto a la ejecución de las obras.

Se realizó control de ensayos de laboratorio establecidas por el instituto colombiano de normas técnicas ICONTEC, el cual se anexa y hace parte de este informe.

Se ha realizado seguimiento y control en la adecuada implementación de Los Planes de Manejo de Transito aprobado para la ejecución de las obras, por parte del equipo técnico en campo.

La interventoría ha realizado día a día el seguimiento y verificación del proceso de instalación e implementación de la señalización de acuerdo con las normas técnicas existentes.

En cuanto al libro de bitácora, este se ha venido diligenciando de manera clara registrando las actividades ejecutadas diarias, a fin de llevar el control cronológico del proceso de ejecución del proyecto, firmado por el personal técnico a cargo de las actividades.

3.3.1.1. Hoja de vida de contrato

Dentro de las actividades técnicas que realiza esta interventoría, se encuentra la actualización de la hoja de vida del contrato, en el anexo No.20 se encuentra el documento con corte al 29 de marzo, en el cual se encuentran las actividades ejecutadas por el contrato de obra 2024-3650 verificado y aprobado por esta interventoría.

3.3.1.2. Indicadores de gestión

Desde la implementación de señalización de la zona Centro - Sur, se llevan a cabo las siguientes acciones con el fin de contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital – PDD 2024-2027: **BOGOTA CAMINA SEGURA**, en las cuales se contemplan los siguientes Proyectos de inversión:

- PI 8000 "Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en Bogotá D. C.". El cual su objetivo es: **Fortalecer el sistema de señalización en función de la gestión del tránsito, circulación segura y eficiente en la infraestructura vial y el espacio público de la ciudad.** Y sus metas producto son:

Meta 1: Intervenir 16 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal.

Meta 2: Intervención integral de 7.732 segmentos viales de la malla vial arterial con señalización horizontal y vertical.

Meta 3: Intervención integral de 22.668 segmentos viales de la malla vial intermedia y local con señalización horizontal y vertical.

- PI 7998 "Fortalecimiento de la red de ciclo infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C.". El cual su objetivo es: **Fortalecer el sistema de señalización de las ciclo infraestructuras para una movilidad segura, eficiente y sostenible en la ciudad de Bogotá.** Y sus metas producto son:

Meta 4: Realizar 60 km de mantenimiento de señalización y/o demarcación en ciclo-infraestructura en la ciudad.

Meta 5: Implementar 28 Km de señalización y /o demarcación de ciclo-infraestructura en la ciudad.

En lo corrido del mes de marzo se implementaron 1.786,44 m2 en Demarcación en los diferentes ID´S, en los cuales se destacan 18 pasos peatonales implementados, 4 Zonas escolares, se implementaron 12,208 km de carril demarcados, se implementaron 5 zonas con dispositivos de control de velocidad y se instalaron 62 señales verticales.

Las acciones de señalización implementadas durante el mes de marzo se encuentran en el Anexo No 7, donde se muestra el seguimiento semana a semana.

3.3.1.3. Seguimiento a la implementación de los stickers

Apéndice A, numeral 2.2.5 Sticker, pág. 17:

"Una vez instalada la señal vertical de pedestal, en la parte posterior de todos los tableros de las señales deberá ubicarse un sticker de identificación en el cual se incluya la información y datos de su instalación, como lo es la entidad contratante, numero de contrato, día, mes y año de instalación y/o reemplazo."

Ilustración 4. Sticker para identificación de señales en terreno



Fuente: Apéndice A Especificaciones Técnicas de la señalización vertical, horizontal y otros dispositivos


"El papel para la fabricación de los sticker debe ser papel reflectivo grado Ingeniería, con respaldo de papel bond con laminación plástica siliconada para adherencia a una superficie plana, que no se enrosque y facilite la alimentación al momento de efectuar la impresión del formato base del sticker."

"Para diligenciar el sticker se debe contar con una perforadora individual, de tal forma que la apertura de los orificios se efectúe de forma precisa en los números y/o letras correspondientes. "

"El número de identificador corresponderá al número ID de identificación de cada señal dado en el diseño de señalización. "


"Cuando la señal corresponda a una nueva (diseño nuevo), se diligenciará la fecha de instalación (día, mes y año) en la que se realizará esta actividad. A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo de diligenciar el sticker en forma correcta en el caso que la señal corresponda a una nueva:"

Ilustración 5. Forma de diligenciar el sticker en una señal nueva (Dis_Nue)

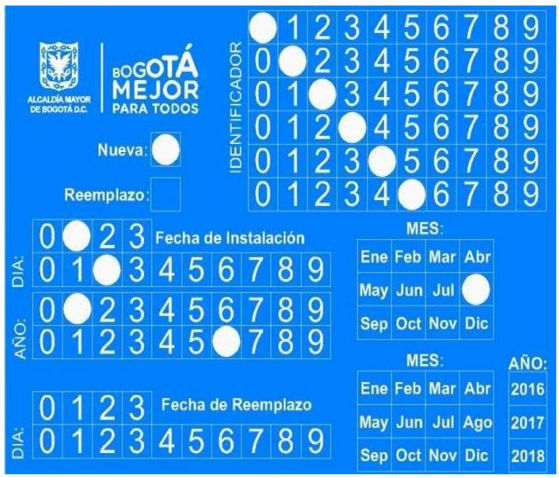

Fuente: Apéndice A Especificaciones Técnicas de la señalización vertical, horizontal y otros dispositivos

Ilustración 6. Forma de diligenciar el sticker en una señal reemplazada (Dis_Rep: Prg_Ree)

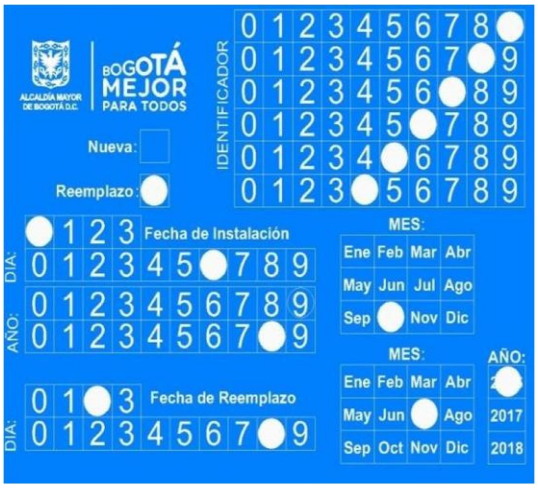

Fuente: Apéndice A Especificaciones Técnicas de la señalización vertical, horizontal y otros dispositivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el consorcio Intervial IP encargado de realizar la interventoría a las actividades de señalización realizadas en zona 4, centro sur, ha hecho seguimiento de la correcta implementación de los stickers de identificación de la señalización vertical, a continuación, se da conocer lo encontrado durante la ejecución de las actividades:







Ilustración 7. Verificación de stickers

- Los sticker están siendo instalados en la parte superior izquierda con su respectiva fecha de instalación, numero de interno y especificando si es instalación nueva o reemplazo, según las indicaciones allegadas.

- Los sticker cuentan con las medidas especificadas en el Apéndice A.

- El tipo de papel utilizado por el contratista **NO** es el especificado según el apéndice A, "*El papel para la fabricación de los sticker debe ser papel reflectivo grado Ingeniería, con respaldo de papel bond con laminación plástica siliconada para adherencia a una superficie plana, que no se enrosque y facilite la alimentación al momento de efectuar la impresión del formato base del sticker.*"

La interventoría notificó al contratista sobre este hallazgo mediante comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-071-2025 del 02 de abril de 2025, el contratista ya subsanó dicha observación, cambiando el tipo de papel utilizado, la interventoría seguirá realizando seguimiento referente a este tema.

3.3.1.4. RELACION DE ID´s RECIBIDOS

A continuación, se presentan los Id´s asignados por parte de la entidad hasta la fecha.

Tabla 16. Relación de ID´s Recibidos

Numero de id	ID	LOCALIDAD
0,1	MV_AC26_643_24_V0	LOS MARTIRES
0,2	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO
0,3	MV_AV_NQS_1073_24	LOS MARTIRES - PUENTE ARANDA

1	EX_18_002_1445_14_V5	RAFAEL URIBE URIBE
2	MV_16_181_1249_11_V6	PUENTE ARANDA
3	EX_15_95_1867_12_V5	ANTONIO NARIÑO
4	EX_14_104_1881_12_V5	LOS MARTIRES
5	EX_14_084_1249_11_V3	LOS MARTIRES
6	MV_14_015_V17	LOS MARTIRES
7	EX_15_349_826_10_V7	ANTONIO NARIÑO
8	EX_16_047_1556_10_V10	PUENTE ARANDA
9	EX_16_194_1881_12_V2	PUENTE ARANDA
10	EX_15_93_1867_12_V2	ANTONIO NARIÑO
11	EX_14_097_1881_12_V3	LOS MARTIRES
12	EX_16_208_1881_12_V2	PUENTE ARANDA
13	EX_14_096_1881_12_V6	LOS MARTIRES
14	EX_14_001_2487_21_V0	LOS MARTIRES
15	EX_16_198_1881_12_V2	PUENTE ARANDA
16	EX_15_032_1561_10_V8	ANTONIO NARIÑO
17	PMT POR EMERGENCIA 001 (SDM-202461204171712)	RAFAEL URIBE URIBE
18	PMT POR EMERGENCIA 002 (DI 21453 - SDQS 158932025)	RAFAEL URIBE URIBE
19	SUMINISTRO 1	
20	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	LOS MARTIRES
21	CP_20243650_001 (EX_16_004_716_24)	PUENTE ARANDA
22	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13)	PUENTE ARANDA
23	CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7)	LOS MARTIRES
24	CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V13)	LOS MARTIRES
25	CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11)	LOS MARTIRES
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_ OUTLET_AMERICAS_V1	PUENTE ARANDA
27	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	RAFAEL URIBE URIBE
28	EX_18_235_937_09_V9	PUENTE ARANDA

Fuente: Elaboración propia

3.3.1.5. Relación de obras ejecutadas

Para el periodo del presente informe MES 2, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial en los siguientes puntos:

Tabla 17. Relación obras ejecutadas

No.	ID	Localidad	Tipo de implementación	Estado
1	MV_AUTO_SUR_643_24 _V0	MULTI-LOCALIDAD	Vertical y horizontal	EJECUTADO
2	MV_AV_NQS_1073_24	MULTI-LOCALIDAD	Vertical y horizontal	EN EJECUCIÓN
3	EX_18_002_1445_14_V5	RAFAEL URIBE URIBE	Vertical y horizontal	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

3.3.1.6. Reporte acumulado de asignaciones

Tabla 18. Relación de diseños asignados

ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTIÓN	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIA
ASIGNADOS	19	1	0	7	2
INSPECCIONADOS	7	1	0	5	2
POR INSPECCIONAR	12	0	0	2	0
POR IMPLEMENTAR	15	0	0	6	0
EN EJECUCIÓN	3	0	0	0	0
EJECUTADOS	1	1	0	1	2

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Actividades ejecutadas de carácter jurídico

Teniendo en cuenta el segundo periodo de tiempo transcurrido, este componente realizó las siguientes actividades:

- Durante el periodo evaluado no se generó el requerimiento de suspensión, adición o prórroga de los contratos de obra e interventoría.
- Se verifica el estado de las pólizas del contrato de obra.
- El Contrato de Obra se está desarrollando dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- No se han presentado ante la Interventoría solicitudes de reclamaciones por parte del Contratista.

- Se ha dado visto bueno a los informes semanales y mensuales, avalando así el contenido correspondiente a las funciones jurídicas de la Interventoría que se registran en ellos.

3.3.3. Actividades de carácter administrativo

A continuación, se describen las actividades administrativas realizadas en el periodo correspondiente al presente informe:

- La interventoría ha asistido oportunamente a comités técnicos y presupuestales.
- La interventoría ha atendido las reuniones solicitadas tanto por la SDM y el contratista de obra.
- La interventoría a dado atención y subsanado las observaciones de los informes presentados a la SDM
- Realizar el registro fotográfico del antes, durante y después con formato en fecha y hora de ejecución de las actividades desarrolladas, para cada contrato. El registro fotográfico se debe realizar con base en el documento "Tips de fotografía y video".
- Vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes (verificación de pago de aportes parafiscales, riesgos profesionales, capacitaciones ARL, dotaciones).
- Vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes (verificación de pago de aportes parafiscales, riesgos profesionales, capacitaciones ARL, dotaciones).

- Vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes (verificación de pago de aportes parafiscales, riesgos profesionales, capacitaciones ARL, dotaciones).
- Elaborar, revisar y aprobar las actas de recibo parcial de obra que surjan en el desarrollo del contrato; revisar las cantidades de obra, llevar el control de las actas de recibo de obra con las respectivas firmas por parte del contratista de obra y por parte de la interventoría.
- Elaborar el reporte de indicadores, metas semanales y mensuales de señalización horizontal y vertical del contrato, de acuerdo con las indicaciones de la SDM.
- Atender y resolver por escrito las solicitudes que presente el contratista de obra y la Secretaría, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.

3.3.4. Actividades de carácter financiero

A continuación, se describen las actividades financieras realizadas en el periodo correspondiente al presente informe:

- Revisar las cuentas de cobro, estados financieros, dando su visto bueno a los documentos validando así su contenido.
- Hacer los seguimientos correspondientes dentro del aspecto financiero y/o contable que se han requerido.
- Contestar interrogantes y demás precisiones financieras y/o contables que han tenido lugar.
- Dar visto bueno a los informes semanales, comités de seguimiento técnico e informes mensuales, avalando así el contenido correspondiente a las funciones financieras y contables de la Interventoría que se registran en ellos.

3.3.5. Modificaciones y problemas.

Dentro del periodo numero 2 comprendido entre el 01 de marzo de 2025 al 29 de marzo de 2025, no se presentaron modificaciones en el contrato o problemas que impidieran el correcto desarrollo de las actividades ejecutadas por parte del contratista.

3.4. Recursos utilizados por el contrato de obra

3.4.1. Personal administrativo ejecución contrato de obra

Tabla 19. Personal administrativo contrato de obra

N°	NOMBRE	CARGO
1	Mauro Andrés González cantor	Rep. Legal
2	María Virginia Rocha Gracia	Directora de proyecto
3	Julián Andrés Charry Ariza	Especialista en transito
4	Andrea Katherine Andrade Arias	Ing. residente diurno
5	Mauricio Fernando Laverde Acosta	Ing. residente nocturno
6	Karen Sofia López Pérez	Georreferenciador

7	Yessica Yadira Hernández Barrios	Trabajadora Social
8	Angie Paola López Rojas	Profesional SISO
9	Martha Nubia Rocha Arévalo	Secretaria

Fuente: Elaboración propia

3.4.2. Relación del personal contratista

Tabla 20. Relación del personal operativo por cuadrillas

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	JAIRO LUIS CANTILLO SOTTO	19.706.376	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	CLÍMACO SOGAMOSO CACAIS	1.005.728.389	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	CARLOS MARIO SAN MARTIN AYALA	92.229.398	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	DEIVER MANUEL ARRIETA LÓPEZ	1.069.504.142	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
5	JHON JAIRO SÁNCHEZ	14.321.058	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
6	HUGO JAVIER BEJARANO	3.032.947	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	OTTO FERNANDO ESPITIA GUEVARA	1.062.680.249	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	MAURICIO JAVIER BABILONIA VILLADIEGO	1.128.053.800	SURA	AXA COLPATRIA	COLFONDOS
3	MARISOL FRANCO MONTENEGRO	1.033.752.600	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	DAVID JOSÉ SALAZAR SUAREZ	19.619.584	COOSALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	JOSÉ EDUARDO PANTOJA LÓPEZ	1.069.476.046	CAJACOPI	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	LUZ DARY TORRES VACA	46.457.329	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	WILSON EDUARDO LAVERDE ACOSTA	19.471.806	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
2	CARMEN LUCILA TIRADO SANTOS	36.293.012	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	COLFONDOS
3	RAFAEL URREGO ROJAS	1.015.456.461	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	MARLON ENRIQUE AMADO AMAYA	1.014.195.961	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
5	JOSÉ EDUARDO GÓMEZ TORRES	1.007.712.934	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	CAROL JINETH PEÑA GALÁN	1.022.792.446	CAPITAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	GONZALO ALBERTO ZONATI PÉREZ	641967	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
2	HAREN LIBIA GARCÍA CASTAÑEDA	1127962808	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
3	ENRIQUE JUNIOR GARCÍA CEBALLOS	1034309527	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
4	ELVIS ANTONIO ZONATI PÉREZ	6114040	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	LEONARDO JOSÉ HERRERA VARGAS	5524863	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	OSCAR JOSÉ GONZÁLEZ	7452670	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	AGUSTÍN GONZÁLEZ MORA	1.019.014.977	SANITAS	SURA	PORVENIR
2	JEFFERSON ENRIQUE GONZÁLEZ SIERRA	1.019.034.933	COMPENSAR	SURA	PORVENIR
3	CARLOS ANDRES SÁNCHEZ BARRERO	79.922.124	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCIÓN
4	DANIEL EDUARDO PORRAS PALACIOS	80.755.162	SANITAS	SURA	PORVENIR
5	JUAN CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ	1.105.672.107	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
6	LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ BARRERO	11.222.984	ALIANSALUD	SURA	COLFONDOS
7	MILLER MAURICIO GÓMEZ BENÍTEZ	79.954.626	FAMISANAR	SURA	PORVENIR

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	JUAN CARLOS GÓMEZ TICORA	80.734.970	FAMISANAR	SURA	COLFONDOS
2	MERWIN DIXON DE LA ROSA GONZÁLEZ	1.127.669.903	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	ELKIN ENRIQUE FRAGOZO VÁSQUEZ	1.121.338.663	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	JONATHAN DAVID ARIZA CASTILLO	1.099.542.335	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	RICARDO ROCHA RAMÍREZ	88.203.506	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
2	ALEXANDER MANCILLA ARRIETA	1.065.985.035	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	EDINSON JESÚS ACOSTA SALAZAR	1.065.124.612	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	ANDERSON DAVID LÓPEZ MONTENEGRO	1.065.126.686	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	GONZALO JONATHAN NARANJO	80.203.203	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
2	SANDRO DAVID ARIAS SÁNCHEZ	1.010.002.341	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	CRISTIAN CAMILO VILLA GUEVARA	1.062.675.626	MULTIMEDICA EPS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
4	BLEIDY GIOVANNA ÁLVAREZ CHAUTA	1.010.229.868	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Informe mes 02 contratista

3.5. Relación de equipos contrato de obra

Tabla 21. Equipos ofrecidos por el contratista

EQUIPO MANUAL

MARCA	MODELO
TITAN	POWRTWIN 4900
TITAN	POWRTWIN 6900 DI PLUS
TITAN	POWRLINER 6955
TITAN	PROMARK 150

EQUIPO AUTOPROPULSADO

MARCA	MODELO
HOFMANN	H-16-3
HOFMANN	H-26-2
MINI MAC	MRL MIN MAC 400
TERMOPIN	TATU-CWL380

Fuente: Elaboración propia

3.6. Relación de lluvias

En la siguiente tabla se presenta en forma consolidada el estado de las lluvias en el **segundo mes** de ejecución de obra:

Tabla 22. Relación de lluvias

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
1 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X		N	8:00:00 p. m.	3:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	MV_AUTO_SUR_643_24_V0 MV_AV_NQS_1073_24 EX_18_002_1445_14
3 de marzo de 2025	X		D	1:00:00 p. m.	3:00:00 p. m.	LEVE	SEÑALIZACION VERTICAL	EX_18_002_1445_14
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
4 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X		N	11:00:00 p. m.	3:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	MV_AUTO_SUR_643_24_V0 MV_AV_NQS_1073_24 EX_18_002_1445_14
6 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X		N	8:00:00 p. m.	2:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	MV_AUTO_SUR_643_24_V0 MV_AV_NQS_1073_24 EX_18_002_1445_14

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
8 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X		N	8:00:00 p. m.	1:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	MV_AUTO_SUR_643_24_V0 MV_AV_NQS_1073_24

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
12 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X		N	9:00:00 p. m.	1:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	MV_AUTO_SUR_643_24_V0 MV_AV_NQS_1073_24 EX_18_002_1445_14
14 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
15 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17 de marzo de 2025	X		D	8:00:00 a. m.	11:30:00 a. m.	FUERTE	SEÑALIZACION VERTICAL	EX_18_002_1445_14
	X		N	11:00:00 p. m.	1:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	EX_18_002_1445_15

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
18 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X		N	11:00:00 a. m.	3:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	EX_18_002_1445_15
19 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X		N	12:00:00 a. m.	2:00:00 a. m.	FUERTE	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	MV_AV_NQS_1073_24
20 de marzo de 2025	X		D	8:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	FUERTE	SEÑALIZACION VERTICAL	EX_18_002_1445_14
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
21 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	LLUVIA		JORNADA	INICIO	TERMINA	INTENSIDAD	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ID AFECTADO
	SI	NO						
28 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29 de marzo de 2025		X	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		X	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Registro de lluvias presentadas en el periodo

Total, días de lluvia (Diurna)	3	10,34%
Total, días de lluvia (Nocturna)	8	27,59%
Total, días de lluvia (Diurna y Nocturna)	11	37,93%

Fuente: Elaboración propia

3.7. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos

Durante el periodo del presente informe (01 de marzo de 2025 al 29 de marzo de 2025) no se han presentado daños a los servicios públicos en ninguno de los diferentes puntos de implementación.

3.8. Estado de avance contrato

3.8.1. Avance físico de obra

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría se realizó durante el periodo del presente informe, el seguimiento a la ejecución de los diseños, compromisos generales o prioritarios y emergencias, asignados al Contrato de Obra 2024-3650 por la Secretaría Distrital de Movilidad. En la siguiente tabla, se presenta el avance físico ejecutado por el contratista durante el primer mes, verificado por parte de la Interventoría a diario.

El contrato de obra se llevó a cabo por el Consorcio Seg Vial Bogotá, quien fue adjudicatario del lote 4 de la licitación Pública llevada a cabo por la Secretaria Distrital de Movilidad y cuya acta de inicio fue firmada el día 30 de enero de 2025, con una duración inicial de treinta y cuatro (34) meses, es decir tendrá una fecha de finalización inicial para el 29 de noviembre de 2027.

Para el presente periodo se realizaron actividades de obra en los siguientes Id´s:

- MV_AV_NQS_1073_24, Implementación de señalización horizontal e imprimación de marcas viales e Implementación de señales verticales.
- MV_AUTO_SUR_643_24_V0, Implementación de señalización horizontal e imprimación de marcas viales e Implementación de señales verticales.
- EX_18_002_1445_14_V5, Implementación de señalización horizontal e imprimación de marcas viales e Implementación de señales verticales.

Es importante señalar que en la siguiente tabla, se presenta el avance físico ejecutado por el Contratista durante el mes por ID de Diseño asignado e implementado, a partir del cálculo de avance estimado diario con información propia de la Interventoría.

Tabla 24. Avance físico contrato de obra mes 2 de ejecución

ID	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VR. VERTICAL EJECUTADO	VR. HORIZONTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL
OBRA						
MV_AV_NQS_1073_24	11/02/2025	Pendiente	Pendiente	$ 10´514.109	$ 462´228.987,00	$ 472´743.096,00
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	11/02/2025	27/03/2025	07/04/2025	$ 8´091.714	$ 316´063.285,00	$ 324´154.999,00
EX_18_002_1445_14	24/02/2025	Pendiente	Pendiente	$ 11´976.640	$ 136´201.705,00	$ 148´178.345,00

Fuente: Elaboración propia

El contratista a partir del mes de febrero presentó un plan de contingencia, mediante oficio No. CE-3650-Z4-073 con fecha 28 de febrero de 2025, el cual establece una fecha límite para nivelar el contrato de obra que se extiende hasta el día 31 de julio de 2025.

Se detalla la línea base de seguimiento para el contrato actualizada para la vigencia 2025, como la distribución mensual de recursos acumulada para la finalización del contrato de obra.

Tabla 25. Línea base de medición de obra

	MES	% MINIMO DE EJECUCIÓN	VALOR DE EJECUCIÓN
feb-25	1	3,02%	$ 566.898.498
mar-25	2	6%	$ 1.126.288.406
abr-25	3	5%	$ 938.573.671
may-25	4	4%	$ 750.858.937
jun-25	5	4%	$ 750.858.937
jul-25	6	4%	$ 750.858.937
	7	2,76%	$ 518.092.667
	8	2,76%	$ 518.092.667
	9	2,76%	$ 518.092.667
	10	2,76%	$ 518.092.667
	11	2,76%	$ 518.092.667
	12	2,76%	$ 518.092.667
	13	2,76%	$ 518.092.667
	14	2,76%	$ 518.092.667
	15	2,85%	$ 534.986.993
	16	2,85%	$ 534.986.993
	17	2,85%	$ 534.986.993

	MES	% MINIMO DE EJECUCIÓN	VALOR DE EJECUCIÓN
	18	2,85%	$ 534.986.993
	19	2,85%	$ 534.986.993
	20	2,85%	$ 534.986.993
	21	2,85%	$ 534.986.993
	22	2,85%	$ 534.986.993
	23	2,85%	$ 534.986.993
	24	2,85%	$ 534.986.993
	25	2,85%	$ 534.986.993
	26	2,85%	$ 534.986.993
	27	2,55%	$ 478.672.572
	28	2,55%	$ 478.672.572
	29	2,55%	$ 478.672.572
	30	2,55%	$ 478.672.572
	31	2,55%	$ 478.672.572
	32	2,25%	$ 422.358.152
	33	2,25%	$ 422.358.152
	34	0,45%	$ 84.471.630
		100,00%	$ 18.771.473.428

Fuente: Elaboración propia

3.8.2. Componente de Georreferenciación

El presente informe corresponde a los parámetros establecidos por la interventoría para la adecuada ejecución del contrato, el cual hace referencia a los lineamientos técnicos, administrativos y legales necesarios para el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de georreferenciación del contrato integral de señalización en la ciudad de Bogotá D.C.

Para permitir una adecuada administración y manejo de las señales implementadas, se genera la georreferenciación de obra, de manera que sea posible visualizar las señales horizontales y verticales, bien sean en mantenimiento, retiro o instalación como reemplazo o de diseño nuevo. Lo anterior para un correcto seguimiento por parte de la secretaria de Movilidad.

Esta georreferenciación debe estar asociada a una planilla de vinculación la cual especifica la fase y acción de la entidad espacial, reflejando un conjunto de eventos históricos de dicha obra.

Para la optimización de los recursos, la secretaría de Movilidad suministró las plantillas y la base de datos para que el contratista pueda realizar una correcta ejecución en la vinculación de la base de datos y su respectivo plano récord, según los parámetros estipulados en el respectivo manual de la entidad.

3.8.2.1. Cuadro de seguimiento

Para efectos de estandarización de la información, la interventoría del contrato suministró una planilla de vinculación donde va la información de la obra ejecutada tanto de vertical como horizontal por ID ejecutado.

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en la cuenta 1.

Tabla 26. Id´s intervenidos en cuenta 1

ID	PROCESO
EX_18_208_1561_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_18_043_1561_10	Aprobado por Interventoría y SDM
EX_16_004_716_24	Aprobado por Interventoría y SDM
MV_AC26_643_24	Aprobado por Interventoría y SDM

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestran los ID que se intervinieron en la cuenta 2.

Tabla 27. Id´s intervenidos en cuenta 2

ID	PROCESO
MV_AUTO_SUR_643_24	Aprobado m2
MV_AUTO_SUR_643_24	En revisión de verticales por la interventoría
MV_AV_NQS_1073_24	En revisión de la interventoría
MV_AV_NQS_1073_24	En revisión de verticales por la interventoría

Fuente: Elaboración propia

Ver anexo No. 17 Georreferenciación

3.8.3. Componente de Transito

Durante el periodo el CONTRATISTA CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ realizó las siguientes actividades relacionadas con el componente del Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos:

- ✓ El día 1 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico, el contratista atiende las observaciones de la SDM emitidas al PMT por emergencias 04
- ✓ El día 3 de marzo de 2025 mediante correo electrónico, el contratista presenta para revisión y aprobación de la Interventoría la retroalimentación del PMT general
- ✓ El día 5 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico, el contratista atiende las observaciones realizadas por la Interventoría del PMT general (retroalimentación)

Durante el periodo LA INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVIAL IP realizó las siguientes actividades relacionadas con el componente del Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos:

- El jueves 13 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico, La Interventoría envía el reporte semanal de actividades solicitadas por el contratista para revisión y publicación de la SDM en el COI siguiente, conforme a los oficios 202531200475331 y 202561200775782. Localidad de Puente Aranda y Los Mártires
- El lunes 17 de marzo de 2025 a través de correo electrónico, la Interventoría envía el reporte semanal de actividades solicitadas por el contratista para revisión y publicación de la SDM en el COI siguiente, conforme a los oficios 202531200475331 y 202561200775782. Localidad de Puente Aranda

- El jueves, 20 de marzo de 2025 mediante correo electrónico, la Interventoría envía el reporte semanal de actividades solicitadas por el contratista para revisión y publicación de la SDM en el COI siguiente, conforme a los oficios 202531200475331 y 202561200775782. Localidad de Puente Aranda
- El miércoles, 26 de marzo de 2025 por medio de correo electrónico, la Interventoría envía el reporte semanal de actividades solicitadas por el contratista para revisión y publicación de la SDM en el COI siguiente, conforme a los oficios 202531200475331 y 202561200775782. Localidad de Puente Aranda y Los Mártires

3.8.3.1. Comités semanales

Durante el periodo se realizaron 4 reuniones semanales de seguimiento a contrato, los días 5, 12, 19 y 26 de marzo de manera presencial en las instalaciones de la SDM

Tabla 28. Otras actividades realizadas en el periodo (reuniones)

No	FECHA	TEMA	ASISTENTES
1	5 de marzo de 2025	Resumen general de Pmt's aprobados y vigentes en el periodo presentado por la Interventoría y solicitudes del contratista	INTERVENTORÍA, CONTRATISTA y SDM
2	12 de marzo de 2025	Resumen general de Pmt's aprobados y vigentes en el periodo presentado por la Interventoría y solicitudes del contratista	INTERVENTORÍA, CONTRATISTA y SDM
3	19 de marzo de 2025	Resumen general de Pmt's aprobados y vigentes en el periodo presentado por la Interventoría y solicitudes del contratista	INTERVENTORÍA, CONTRATISTA y SDM
4	26 de marzo de 2025	Resumen general de Pmt's aprobados y vigentes en el periodo presentado por la Interventoría y solicitudes del contratista	INTERVENTORÍA, CONTRATISTA y SDM

Fuente: Elaboración propia

3.8.3.2. Calificación de PMT´S

Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó inspección y seguimiento en los diferentes frentes de obra en donde se desarrollaron actividades, con Plan de Manejo de Tránsito vigente. A continuación, se incluye registro fotográfico de seguimiento a los PMT in situ. Se evidenció durante la ejecución de actividades que los Pmt's para cierre de carriles se han ejecutado de acuerdo a lo plasmado en los esquemas aprobados.



Ilustración 8. Registro fotografico seguimiento a implementacion de PMT´s



Ilustración 9. Registro fotografico seguimiento a implementacion de PMT´s

3.8.3.3. Pmt´s aprobados en el periodo

Para el periodo evaluado se aprobaron ciento veinte PMTs.

La siguiente tabla indica los PMTs vigentes en el mes en donde se aprecia el número de autorización, COI de aprobación, CIV de inicio, CIV final, dirección de inicio, final, periodo de ejecución, horario de trabajo y de cierre.

Planes de manejo de tránsito aprobados en el periodo

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6280	14000015	14000961	11-25	AV NQS (AK 30) AC 24	AV NQS (AK 30) CL 1F	18-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
6281	14000015	14000961	11-25	AV NQS (AK 30) AC 24	AV NQS (AK 30) CL 1F	18-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
6283	13002725	14001842	11-25	AC 26 KR 19B	AC 26 KR 27A	18-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
6294	13000255	N/A	11-25	AV NQS (AK 30) CL 60	N/A	7-mar-25	21-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	CORREDOR
6858	50008276	N/A	11-25	CL 20A AV DE LAS	CL 20A KR 44	14-mar-25	11-sep-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
				AMÉRICAS (AC 20)						
6284	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6285	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6288	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6289	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6290	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6291	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6286	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6287	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6859	5007645	N/A	11-25	CL 137 SUR KR 13	CL 137 SUR KR 14	3-mar-25	17-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	USME

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6860	5007612	N/A	11-25	AV CARACAS (KR 14) CL 137 SUR	AV CARACAS (KR 14) CL 136C SUR	3-mar-25	17-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	CORREDOR
6861	5007589	N/A	11-25	AV CARACAS (KR 14) CL 136C SUR	AV CARACAS (KR 14) CL 136A SUR	3-mar-25	17-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	CORREDOR
6862	18005060	18005152	11-25	CL 50B SUR KR 5Z	CL 50B SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6863	18005060	18005152	11-25	CL 50B SUR KR 5Z	CL 50B SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6864	18005152	18005151	11-25	KR 5R CL 50B SUR	KR 5R DG 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6865	18005152	18005151	11-25	KR 5R CL 50B SUR	KR 5R DG 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6866	18005126	18004722	11-25	CL 50A SUR KR 5R	CL 50A SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6867	18005126	18004722	11-25	CL 50A SUR KR 5R	CL 50A SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6868	18004962	N/A	11-25	KR 5Z CL 50B SUR	KR 5Z CL 50A SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6869	18004962	N/A	11-25	KR 5Z CL 50B SUR	KR 5Z CL 50A SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6870	18004925	N/A	11-25	KR 5Z CL 50A SUR	KR 5Z DG 49GBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6871	18004925	N/A	11-25	KR 5Z CL 50A SUR	KR 5Z DG 49GBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6872	18005091	N/A	11-25	KR 5T CL 50A SUR	KR 5T CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6873	18005091	N/A	11-25	KR 5T CL 50A SUR	KR 5T CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6874	18005073	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 5R	CL 49G SUR KR 5T	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6875	18005073	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 5R	CL 49G SUR KR 5T	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6876	18005033	18004960	11-25	CL 49G SUR KR 5T	CL 49G SUR KR 5Y	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6877	18005033	18004960	11-25	CL 49G SUR KR 5T	CL 49G SUR KR 5Y	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6878	18004905	18004864	11-25	DG 49GBIS SUR KR 5Y	DG 49GBIS SUR KR 6	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6879	18004905	18004864	11-25	DG 49GBIS SUR KR 5Y	DG 49GBIS SUR KR 6	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6880	18004876	18004849	11-25	KR 6 CL 50A SUR	KR 6 DG 49GBIS S	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6881	18004876	18004849	11-25	KR 6 CL 50A SUR	KR 6 DG 49GBIS S	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6883	18004904	N/A	11-25	KR 5Y DG 49GBIS SUR	KR 5Y CL 49DBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6884	18004904	N/A	11-25	KR 5Y DG 49GBIS SUR	KR 5Y CL 49DBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6885	18004980	N/A	11-25	CL 49DBIS SUR KR 5X	CL 49DBIS SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6886	18004980	N/A	11-25	CL 49DBIS SUR KR 5X	CL 49DBIS SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6887	18005001	18004943	11-25	KR 5U CL 49G SUR	KR 5U DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6888	18005001	18004943	11-25	KR 5U CL 49G SUR	KR 5U DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6889	18007820	18007760	11-25	KR 6B CL 49D SUR	KR 6B CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6890	18007820	18007760	11-25	KR 6B CL 49D SUR	KR 6B CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6891	18007815	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 6B	CL 49G SUR KR 6A	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6892	18007815	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 6B	CL 49G SUR KR 6A	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6893	18004781	18004749	11-25	KR 6A CL 50 SUR	KR 6A CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6894	18004781	18004749	11-25	KR 6A CL 50 SUR	KR 6A CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6895	18004850	18004675	11-25	CL 50 SUR KR 6	CL 50 SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6896	18004850	18004675	11-25	CL 50 SUR KR 6	CL 50 SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6897	18004674	N/A	11-25	KR 7BIS CL 50 SUR	KR 7BIS CL 49H SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6898	18004674	N/A	11-25	KR 7BIS CL 50 SUR	KR 7BIS CL 49H SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6899	18004579	18004729	11-25	CL 49H SUR KR 9	CL 49H SUR KR 7	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6900	18004579	18004729	11-25	CL 49H SUR KR 9	CL 49H SUR KR 7	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6901	18004644	18004552	11-25	KR 7 CL 49H SUR	KR 7 CL 49D SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6902	18004644	18004552	11-25	KR 7 CL 49H SUR	KR 7 CL 49D SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6903	18004538	N/A	11-25	CL 49D SUR KR 7	CL 49D SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6904	18004538	N/A	11-25	CL 49D SUR KR 7	CL 49D SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6905	18004943	N/A	11-25	KR 5U CL 49C SUR	KR 5U DG 48Y SUR	14-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6906	18004943	N/A	11-25	KR 5U CL 49C SUR	KR 5U DG 48Y SUR	14-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6907	18005203	18005198	11-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6908	18005203	18005198	11-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6909	18005172	18005162	11-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6910	18005172	18005162	11-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6911	18005197	N/A	11-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6912	18005197	N/A	11-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6913	18005169	18005141	11-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6914	18005169	18005141	11-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6915	18005171	18005157	11-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6916	18005171	18005157	11-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6917	18005158	N/A	11-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6918	18005158	N/A	11-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6919	18005164	18008134	11-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6920	18005164	18008134	11-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6921	18005072	18004978	11-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6922	18005072	18004978	11-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
7334	6001874	15001526	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) 220m AL ORIENTE DE LA KR 51D	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	22:00-04:00	22:00-04:00	CORREDOR
7335	6001953	16004821	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) KR 52A	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	23:00-04:00	23:00-04:00	CORREDOR
7336	16002543	16000638	12-25	AC 6 AV NQS (AK 30)	AC 6 KR 47	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7337	16002543	16000638	12-25	AC 6 AV NQS (AK 30)	AC 6 KR 47	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7338	16002420	N/A	12-25	KR 31C AC 6	KR 31C 20m AL SUR	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7340	16001367	N/A	12-25	KR 41A AC 6	KR 41A 20m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7341	14001364	14000617	12-25	AC 6 AV CARACAS (AK 14)	AC 6 AV NQS (AK 30)	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7342	14000816	14000617	12-25	AC 6 KR 24	AC 6 AV NQS (AK 30)	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7344	14000855	N/A	12-25	KR 24 AC 6	KR 24 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7345	14000701	N/A	12-25	AK 27 AC 6	AK 27 CL 6BIS	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7346	14000748	N/A	12-25	KR 27 AC 6	N/A	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7347	14001795	N/A	12-25	AC 6 KR 29A	AC 6 AV NQS (AK 30)	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7348	14001794	N/A	12-25	AV NQS (AK 30) AC 6	N/A	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7708	16002525	N/A	12-25	KR 31 AC 6	KR 31 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7709	16002227	N/A	12-25	KR 34A AC 6	KR 34A 20m AL SUR	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
7710	16002227	N/A	12-25	KR 34A AC 6	KR 34A 20m AL SUR	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
7711	16000637	N/A	12-25	KR 47 AC 6	KR 47 20m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7712	16000637	N/A	12-25	KR 47 AC 6	KR 47 20m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7713	16000444	N/A	12-25	AK 50 AC 6	N/A	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7714	16000897	N/A	12-25	KR 44 AC 6	KR 44 KR 18A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
7715	6001874	15001526	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) 220m AL ORIENTE DE LA KR 51D	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
7716	6001953	16004821	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) KR 52A	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7718	14001359	N/A	12-25	DG 4A AC 6	DG 4A 30m AL OCCIDENTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7719	14000981	N/A	12-25	KR 19A AC 6	KR 19A CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7720	14000871	14000871	12-25	KR 22 AC 6	KR 22 CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7721	14000839	N/A	12-25	KR 23 AC 6	KR 23 CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7722	14000827	N/A	12-25	KR 23A AC 6	KR 23A CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7723	14000772	N/A	12-25	KR 25A AC 6	KR 25A CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7724	14000825	N/A	12-25	KR 25A AC 6	KR 25A CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7725	14000737	N/A	12-25	KR 26 AC 6	KR 26 CL 6BIS	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7726	14000786	N/A	12-25	KR 26 AC 6	KR 26 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7727	14000659	N/A	12-25	KR 28 AC 6	KR 28 CL 7	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7728	14000616	N/A	12-25	KR 29 AC 6	KR 29 CL 7	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7729	14001225	N/A	12-25	KR 16 AC 6	KR 16 30m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7730	14000981	N/A	12-25	KR 19A AC 6	KR 19A CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7731	14000897	N/A	12-25	KR 21 AC 6	KR 21 CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7732	14000955	N/A	12-25	KR 21 AC 6	KR 21 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7733	14000888	N/A	12-25	KR 21A AC 6	KR 21A CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7734	14000922	N/A	12-25	KR 22 AC 6	KR 22 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7735	14000857	N/A	12-25	KR 22BIS AC 6	KR 22BIS CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7736	14000886	N/A	12-25	KR 23 AC 6	KR 23 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7737	14000706	N/A	12-25	KR 27B AC 6	KR 27B CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7738	14000680	N/A	12-25	KR 28A AC 6	KR 28A CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7739	14000650	N/A	12-25	KR 29 AC 6	KR 29 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES

Fuente: Elaboración propia

3.8.3.4. Pmt´s vigentes en el periodo

En total están vigentes dos cientos once (211) PMTs.

La siguiente tabla indica los PMTs vigentes en el mes en donde se aprecia el número de autorización, COI de aprobación, IVS de inicio, CIV final, dirección de inicio, final, periodo de ejecución, horario de trabajo y de cierre.

Tabla 29. Planes de manejo de tránsito vigentes en el periodo

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
204	18007116	18005202	18-feb-25	KR 5L CL 48P SUR	KR 5L CL 50 SUR	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
205	18007116	18005202	18-feb-25	KR 5L CL 48P SUR	KR 5L CL 50 SUR	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
206	18005105	18004971	18-feb-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
207	18005105	18004971	18-feb-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
277	18005203	18005198	18-feb-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
278	18005203	18005198	18-feb-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
279	18005172	18005162	18-feb-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
280	18005172	18005162	18-feb-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
281	18005197	N/A	18-feb-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
282	18005197	N/A	18-feb-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
283	18005169	18005141	18-feb-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
284	18005169	18005141	18-feb-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
285	18005171	18005157	18-feb-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
286	18005171	18005157	18-feb-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
287	18005158	18005122	18-feb-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5R	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
288	18005158	18005122	18-feb-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5R	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
289	18005164	18004984	18-feb-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
290	18005164	18004984	18-feb-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	17-feb-25	4-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
291	18005072	18004978	18-feb-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
292	18005072	18004978	18-feb-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	17-feb-25	4-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
244	14000015	14000961	20-feb-25	AV NQS (AK 30) AC 24	AV NQS (AK 30) CL 1F	26-feb-25	12-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
245	14000015	14000961	20-feb-25	AV NQS (AK 30) AC 24	AV NQS (AK 30) CL 1F	26-feb-25	12-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
246	14000015	14001848	20-feb-25	AV NQS (AK 30) AC 24	AV NQS (AK 30) CL 8 SUR	21-feb-25	7-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
247	16004821	16004785	20-feb-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 68	26-feb-25	12-mar-25	22:00-04:00	22:00-04:00	CORREDOR
248	16004821	16004783	20-feb-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 68	26-feb-25	12-mar-25	23:00-04:00	23:00-04:00	CORREDOR
249	13002725	14001842	20-feb-25	AC 26 KR 19B	AC 26 KR 27A	26-feb-25	12-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
382	16004821	16004785	20-feb-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 68	21-feb-25	8-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
377	18005128	18005202	4-mar-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
378	18005128	18005202	4-mar-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
379	18005105	18004971	4-mar-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
380	18005105	18004971	4-mar-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
472	18005060	18005152	4-mar-25	CL 50B SUR KR 5Z	CL 50B SUR KR 5R	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
473	18005060	18005152	4-mar-25	CL 50B SUR KR 5Z	CL 50B SUR KR 5R	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
474	18005151	N/A	4-mar-25	KR 5R CL 50B SUR	KR 5R DG 50 SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
475	18005151	N/A	4-mar-25	KR 5R CL 50B SUR	KR 5R DG 50 SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
476	18005126	18004722	4-mar-25	CL 50A SUR KR 5R	CL 50A SUR KR 9	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
477	18005126	18004722	4-mar-25	CL 50A SUR KR 5R	CL 50A SUR KR 9	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
478	18004962	N/A	4-mar-25	KR 5Z CL 50B SUR	KR 5Z CL 50A SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
479	18004962	N/A	4-mar-25	KR 5Z CL 50B SUR	KR 5Z CL 50A SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
480	18004925	N/A	4-mar-25	KR 5Z CL 50A SUR	KR 5Z DG 49GBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
481	18004925	N/A	4-mar-25	KR 5Z CL 50A SUR	KR 5Z DG 49GBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
482	18005091	N/A	4-mar-25	KR 5T CL 50A SUR	KR 5T CL 49G SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
483	18005091	N/A	4-mar-25	KR 5T CL 50A SUR	KR 5T CL 49G SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
484	18005073	N/A	4-mar-25	CL 49G SUR KR 5R	CL 49G SUR KR 5T	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
485	18005073	N/A	4-mar-25	CL 49G SUR KR 5R	CL 49G SUR KR 5T	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
486	18005033	18004960	4-mar-25	CL 49G SUR KR 5T	CL 49G SUR KR 5Y	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
487	18005033	18004960	4-mar-25	CL 49G SUR KR 5T	CL 49G SUR KR 5Y	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
488	18004905	18004864	4-mar-25	DG 49GBIS SUR KR 5Y	DG 49GBIS SUR KR 6	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
489	18004905	18004864	4-mar-25	DG 49GBIS SUR KR 5Y	DG 49GBIS SUR KR 6	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
490	18004876	18004849	4-mar-25	KR 6 CL 50A SUR	KR 6 DG 49GBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
491	18004876	18004849	4-mar-25	KR 6 CL 50A SUR	KR 6 DG 49GBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
492	18004904	N/A	4-mar-25	KR 5Y DG 49GBIS SUR	KR 5Y CL 49DBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
493	18004904	N/A	4-mar-25	KR 5Y DG 49GBIS SUR	KR 5Y CL 49DBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
494	18004980	N/A	4-mar-25	CL 49DBIS SUR KR 5X	CL 49DBIS SUR KR 5U	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
495	18004980	N/A	4-mar-25	CL 49DBIS SUR KR 5X	CL 49DBIS SUR KR 5U	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
496	18005001	18004988	4-mar-25	KR 5U CL 49G SUR	KR 5U CL 49DBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
497	18005001	18004988	4-mar-25	KR 5U CL 49G SUR	KR 5U CL 49DBIS SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
498	18007820	18007760	4-mar-25	KR 6B CL 49D SUR	KR 6B CL 49G SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
499	18007820	18007760	4-mar-25	KR 6B CL 49D SUR	KR 6B CL 49G SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
500	18007815	N/A	4-mar-25	CL 49G SUR KR 6B	CL 49G SUR KR 6A	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
501	18007815	N/A	4-mar-25	CL 49G SUR KR 6B	CL 49G SUR KR 6A	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
502	18004781	18004749	4-mar-25	KR 6A CL 50 SUR	KR 6A CL 49G SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
503	18004781	18004749	4-mar-25	KR 6A CL 50 SUR	KR 6A CL 49G SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
504	18004850	18004675	4-mar-25	CL 50 SUR KR 6	CL 50 SUR KR 9	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
505	18004850	18004675	4-mar-25	CL 50 SUR KR 6	CL 50 SUR KR 9	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
506	18004674	N/A	4-mar-25	KR 7BIS CL 50 SUR	KR 7BIS CL 49H SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
507	18004674	N/A	4-mar-25	KR 7BIS CL 50 SUR	KR 7BIS CL 49H SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
508	18004579	18004729	4-mar-25	CL 49H SUR KR 9	CL 49H SUR KR 6	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
509	18004579	18004729	4-mar-25	CL 49H SUR KR 9	CL 49H SUR KR 6	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
510	18004644	18004552	4-mar-25	KR 7 CL 49H SUR	KR 7 CL 49D SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
511	18004644	18004552	4-mar-25	KR 7 CL 49H SUR	KR 7 CL 49D SUR	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
512	18004538	N/A	4-mar-25	CL 49D SUR KR 7	CL 49D SUR KR 9	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
513	18004538	N/A	4-mar-25	CL 49D SUR KR 7	CL 49D SUR KR 9	3-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
514	18004979	18004943	4-mar-25	KR 5U CL 49DBIS SUR	KR 5U DG 48Y SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
515	18004979	18004943	4-mar-25	KR 5U CL 49DBIS SUR	KR 5U DG 48Y SUR	3-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
516	18005203	18005198	4-mar-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
517	18005203	18005198	4-mar-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
518	18005172	18005162	4-mar-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
519	18005172	18005162	4-mar-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
520	18005197	N/A	4-mar-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
521	18005197	N/A	4-mar-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
522	18005169	18005141	4-mar-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
523	18005169	18005141	4-mar-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
524	18005171	18005157	4-mar-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
525	18005171	18005157	4-mar-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
526	18005158	N/A	4-mar-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5P	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
527	18005158	N/A	4-mar-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5P	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
528	18005164	18008134	4-mar-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
529	18005164	18008134	4-mar-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE
530	18005072	18004978	4-mar-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
531	18005072	18004978	4-mar-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	4-mar-25	17-mar-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE
6280	14000015	14000961	11-25	AV NQS (AK 30) AC 24	AV NQS (AK 30) CL 1F	18-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
6281	14000015	14000961	11-25	AV NQS (AK 30) AC 24	AV NQS (AK 30) CL 1F	18-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
6283	13002725	14001842	11-25	AC 26 KR 19B	AC 26 KR 27A	18-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6294	13000255	N/A	11-25	AV NQS (AK 30) CL 60	N/A	7-mar-25	21-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	CORREDOR
6858	50008276	N/A	11-25	CL 20A AV DE LAS AMERICAS (AC 20)	CL 20A KR 44	14-mar-25	11-sep-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
6284	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6285	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6288	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6289	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6290	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6291	18005105	18004971	11-25	CL 49 SUR KR 5L	CL 49 SUR DG 48Y SUR	4-mar-25	17-mar-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6286	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6287	18005128	18005202	11-25	KR 5L CL 49 SUR	KR 5L CL 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6859	5007645	N/A	11-25	CL 137 SUR KR 13	CL 137 SUR KR 14	3-mar-25	17-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	USME
6860	5007612	N/A	11-25	AV CARACAS (KR 14) CL 137 SUR	AV CARACAS (KR 14) CL 136C SUR	3-mar-25	17-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	CORREDOR
6861	5007589	N/A	11-25	AV CARACAS (KR 14) CL 136C SUR	AV CARACAS (KR 14) CL 136A SUR	3-mar-25	17-mar-25	22:00-05:00	22:00-05:00	CORREDOR
6862	18005060	18005152	11-25	CL 50B SUR KR 5Z	CL 50B SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6863	18005060	18005152	11-25	CL 50B SUR KR 5Z	CL 50B SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6864	18005152	18005151	11-25	KR 5R CL 50B SUR	KR 5R DG 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6865	18005152	18005151	11-25	KR 5R CL 50B SUR	KR 5R DG 50 SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6866	18005126	18004722	11-25	CL 50A SUR KR 5R	CL 50A SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6867	18005126	18004722	11-25	CL 50A SUR KR 5R	CL 50A SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6868	18004962	N/A	11-25	KR 5Z CL 50B SUR	KR 5Z CL 50A SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6869	18004962	N/A	11-25	KR 5Z CL 50B SUR	KR 5Z CL 50A SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6870	18004925	N/A	11-25	KR 5Z CL 50A SUR	KR 5Z DG 49GBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6871	18004925	N/A	11-25	KR 5Z CL 50A SUR	KR 5Z DG 49GBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6872	18005091	N/A	11-25	KR 5T CL 50A SUR	KR 5T CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6873	18005091	N/A	11-25	KR 5T CL 50A SUR	KR 5T CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6874	18005073	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 5R	CL 49G SUR KR 5T	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6875	18005073	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 5R	CL 49G SUR KR 5T	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6876	18005033	18004960	11-25	CL 49G SUR KR 5T	CL 49G SUR KR 5Y	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6877	18005033	18004960	11-25	CL 49G SUR KR 5T	CL 49G SUR KR 5Y	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6878	18004905	18004864	11-25	DG 49GBIS SUR KR 5Y	DG 49GBIS SUR KR 6	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6879	18004905	18004864	11-25	DG 49GBIS SUR KR 5Y	DG 49GBIS SUR KR 6	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6880	18004876	18004849	11-25	KR 6 CL 50A SUR	KR 6 DG 49GBIS S	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6881	18004876	18004849	11-25	KR 6 CL 50A SUR	KR 6 DG 49GBIS S	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6883	18004904	N/A	11-25	KR 5Y DG 49GBIS SUR	KR 5Y CL 49DBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6884	18004904	N/A	11-25	KR 5Y DG 49GBIS SUR	KR 5Y CL 49DBIS SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6885	18004980	N/A	11-25	CL 49DBIS SUR KR 5X	CL 49DBIS SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6886	18004980	N/A	11-25	CL 49DBIS SUR KR 5X	CL 49DBIS SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6887	18005001	18004943	11-25	KR 5U CL 49G SUR	KR 5U DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6888	18005001	18004943	11-25	KR 5U CL 49G SUR	KR 5U DG 48Y SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6889	18007820	18007760	11-25	KR 6B CL 49D SUR	KR 6B CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6890	18007820	18007760	11-25	KR 6B CL 49D SUR	KR 6B CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6891	18007815	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 6B	CL 49G SUR KR 6A	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6892	18007815	N/A	11-25	CL 49G SUR KR 6B	CL 49G SUR KR 6A	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6893	18004781	18004749	11-25	KR 6A CL 50 SUR	KR 6A CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6894	18004781	18004749	11-25	KR 6A CL 50 SUR	KR 6A CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6895	18004850	18004675	11-25	CL 50 SUR KR 6	CL 50 SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6896	18004850	18004675	11-25	CL 50 SUR KR 6	CL 50 SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6897	18004674	N/A	11-25	KR 7BIS CL 50 SUR	KR 7BIS CL 49H SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6898	18004674	N/A	11-25	KR 7BIS CL 50 SUR	KR 7BIS CL 49H SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6899	18004579	18004729	11-25	CL 49H SUR KR 9	CL 49H SUR KR 7	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6900	18004579	18004729	11-25	CL 49H SUR KR 9	CL 49H SUR KR 7	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6901	18004644	18004552	11-25	KR 7 CL 49H SUR	KR 7 CL 49D SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6902	18004644	18004552	11-25	KR 7 CL 49H SUR	KR 7 CL 49D SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6903	18004538	N/A	11-25	CL 49D SUR KR 7	CL 49D SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6904	18004538	N/A	11-25	CL 49D SUR KR 7	CL 49D SUR KR 9	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6905	18004943	N/A	11-25	KR 5U CL 49C SUR	KR 5U DG 48Y SUR	14-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6906	18004943	N/A	11-25	KR 5U CL 49C SUR	KR 5U DG 48Y SUR	14-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6907	18005203	18005198	11-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6908	18005203	18005198	11-25	CL 50 SUR KR 5L	CL 50 SUR KR 5N	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6909	18005172	18005162	11-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6910	18005172	18005162	11-25	DG 50 SUR KR 5N	DG 50 SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6911	18005197	N/A	11-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6912	18005197	N/A	11-25	KR 5M CL 50 SUR	KR 5M CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6913	18005169	18005141	11-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6914	18005169	18005141	11-25	CL 49G SUR KR 5M	CL 49G SUR KR 5R	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6915	18005171	18005157	11-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6916	18005171	18005157	11-25	KR 5N CL 50 SUR	KR 5N CL 49G SUR	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6917	18005158	N/A	11-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6918	18005158	N/A	11-25	CL 49H SUR KR 5N	CL 49H SUR KR 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6919	18005164	18008134	11-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6920	18005164	18008134	11-25	CL 49C SUR KR 5L	CL 49C SUR KR 5U	18-mar-25	24-abr-25	21:00-05:00	21:00-05:00	RAFAEL URIBE URIBE
6921	18005072	18004978	11-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
6922	18005072	18004978	11-25	CL 48X SUR KR 5L	CL 48X SUR TV 5P	18-mar-25	24-abr-25	24 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE
7334	6001874	15001526	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) 220m AL ORIENTE DE LA KR 51D	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	22:00-04:00	22:00-04:00	CORREDOR

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7335	6001953	16004821	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) KR 52A	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	23:00-04:00	23:00-04:00	CORREDOR
7336	16002543	16000638	12-25	AC 6 AV NQS (AK 30)	AC 6 KR 47	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7337	16002543	16000638	12-25	AC 6 AV NQS (AK 30)	AC 6 KR 47	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7338	16002420	N/A	12-25	KR 31C AC 6	KR 31C 20m AL SUR	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7340	16001367	N/A	12-25	KR 41A AC 6	KR 41A 20m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7341	14001364	14000617	12-25	AC 6 AV CARACAS (AK 14)	AC 6 AV NQS (AK 30)	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7342	14000816	14000617	12-25	AC 6 KR 24	AC 6 AV NQS (AK 30)	24-mar-25	22-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7344	14000855	N/A	12-25	KR 24 AC 6	KR 24 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7345	14000701	N/A	12-25	AK 27 AC 6	AK 27 CL 6BIS	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7346	14000748	N/A	12-25	KR 27 AC 6	N/A	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7347	14001795	N/A	12-25	AC 6 KR 29A	AC 6 AV NQS (AK 30)	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7348	14001794	N/A	12-25	AV NQS (AK 30) AC 6	N/A	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7708	16002525	N/A	12-25	KR 31 AC 6	KR 31 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
7709	16002227	N/A	12-25	KR 34A AC 6	KR 34A 20m AL SUR	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
7710	16002227	N/A	12-25	KR 34A AC 6	KR 34A 20m AL SUR	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
7711	16000637	N/A	12-25	KR 47 AC 6	KR 47 20m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7712	16000637	N/A	12-25	KR 47 AC 6	KR 47 20m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7713	16000444	N/A	12-25	AK 50 AC 6	N/A	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	PUENTE ARANDA
7714	16000897	N/A	12-25	KR 44 AC 6	KR 44 KR 18A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	PUENTE ARANDA
7715	6001874	15001526	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) 220m AL ORIENTE DE LA KR 51D	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
7716	6001953	16004821	12-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) KR 52A	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	21-mar-25	1-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	CORREDOR
7718	14001359	N/A	12-25	DG 4A AC 6	DG 4A 30m AL OCCIDENTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7719	14000981	N/A	12-25	KR 19A AC 6	KR 19A CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7720	14000871	14000871	12-25	KR 22 AC 6	KR 22 CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7721	14000839	N/A	12-25	KR 23 AC 6	KR 23 CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7722	14000827	N/A	12-25	KR 23A AC 6	KR 23A CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7723	14000772	N/A	12-25	KR 25A AC 6	KR 25A CL 7	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7724	14000825	N/A	12-25	KR 25A AC 6	KR 25A CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7725	14000737	N/A	12-25	KR 26 AC 6	KR 26 CL 6BIS	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7726	14000786	N/A	12-25	KR 26 AC 6	KR 26 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7727	14000659	N/A	12-25	KR 28 AC 6	KR 28 CL 7	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7728	14000616	N/A	12-25	KR 29 AC 6	KR 29 CL 7	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7729	14001225	N/A	12-25	KR 16 AC 6	KR 16 30m AL NORTE	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7730	14000981	N/A	12-25	KR 19A AC 6	KR 19A CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7731	14000897	N/A	12-25	KR 21 AC 6	KR 21 CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7732	14000955	N/A	12-25	KR 21 AC 6	KR 21 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7733	14000888	N/A	12-25	KR 21A AC 6	KR 21A CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7734	14000922	N/A	12-25	KR 22 AC 6	KR 22 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7735	14000857	N/A	12-25	KR 22BIS AC 6	KR 22BIS CL 6A	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7736	14000886	N/A	12-25	KR 23 AC 6	KR 23 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	21:00-05:00	21:00-05:00	LOS MARTIRES
7737	14000706	N/A	12-25	KR 27B AC 6	KR 27B CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7738	14000680	N/A	12-25	KR 28A AC 6	KR 28A CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES
7739	14000650	N/A	12-25	KR 29 AC 6	KR 29 CL 5C	24-mar-25	8-may-25	24 HORAS	24 HORAS	LOS MARTIRES

Fuente: Elaboración propia

3.8.3.5. Pmt´s solicitados y/o en revisión

Al finalizar el periodo se presentaron, no se tienen para revisión por parte de la Interventoría y/o SDM PMTS:

3.8.3.6. Pmt´s negados

En el presente periodo se negaron once (11) PMTs por parte de la SDM, los cuales se muestran a continuación

Tabla 30. Planes de manejo de tránsito negados en el periodo

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
6282	14001750	50008120	11-25	AV NQS (AK 30) CL 1F	AV NQS (AK 30) AC 8 SUR	-	-	-	-	CORREDOR
6292	16004821	16004783	11-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 68	-	-	-	-	CORREDOR
6293	N/A	N/A	11-25	VARIOS KENNEDY	N/A	-	-	-	-	KENNEDY
6882	18004864	18006870	11-25	DG 49GBIS SUR KR 6	DG 49GBIS SUR KR 5Y	-	-	-	-	RAFAEL URIBE URIBE
7339	16001025	N/A	12-25	KR 43 AC 6	KR 43 CL 9	-	-	-	-	PUENTE ARANDA
7343	N/A	N/A	12-25	VARIOS LOS MARTIRES	N/A	-	-	-	-	LOS MARTIRES

No	CIV INICIO	CIV FINAL	COI	DIRECCIÓN INICIO	DIRECCIÓN FINAL	DESDE	HASTA	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD
7717	14001364	14000617	12-25	AC 6 AV CARACAS (AK 14)	AC 6 AV NQS (AK 30)	-	-	-	-	LOS MARTIRES
8080	6001874	15001526	13-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) 220m AL ORIENTE DE LA KR 51D	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	-	-	-	-	CORREDOR
8081	6001953	16004821	13-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) KR 52A	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	-	-	-	-	CORREDOR
8482	6001874	15001526	13-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) 220m AL ORIENTE DE LA KR 51D	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	-	-	-	-	CORREDOR
8483	6001953	16004821	13-25	AUTO SUR (AC 45A SUR) KR 52A	AUTO SUR (AC 45A SUR) AK 50	-	-	-	-	CORREDOR

Fuente: Elaboración propia

Ver Anexo No 18 Componente de Pmt´s

- Aprobaciones coi
- Planos de señalización Pmt
- Reportes semanales

3.8.4. Corredores intervenidos

Durante este segundo mes se intervinieron dos corredores viales, MV_AUTO_SUR_643_24_V0 y MV_AV_NQS_1073_24.

Tabla 31. Corredores intervenidos

ID	LOCALIDAD	DESDE	HASTA
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	Puente Aranda-Antonio Nariño	Av. Calle 8 sur	Av. Carrera 68
MV_AV_NQS_1073_24	Los Mártires-Puente Aranda	Av. Américas	Av. Calle 8 sur

3.8.5. Actividades de seguimiento semanal

Durante la vigencia del contrato se han desarrollado cuatro (4) comités técnicos semanales, detallados, remitidos y radicados semanalmente en concordancia al anexo técnico.

Tabla 32. Comités de seguimiento desarrollados en el periodo

DESDE	HASTA	FECHA DE REALIZADO	INFORME No.
24/02/2025	02/03/2025	5/03/2025	5
03/03/2025	09/03/2025	12/03/2025	6
10/03/2025	16/03/2025	19/03/2025	7
17/03/2025	23/03/2025	26/03/2025	8

Para el periodo se ejecutaron actividades de:

- Aplicación de imprimante para metro lineal y metro cuadrado
- Aplicación de pintura plástico en frio (llana) para metro cuadrado
- Aplicación de metro lineal en termoplástico
- Instalación y retiro de señales verticales
- Instalación de dispositivos (tachas reflectivas)
- Borrado mecánico de marcas viales
- Inspecciones (diseños normales, compromisos prioritarios, emergencias)

3.8.6. Informe mensual de Obra

La aprobación del informe mensual de OBRA se adjunta en el **Anexo 19.**

3.9. Registro fotográfico

En el **Anexo No. 15**, se incluye el registro fotográfico de las implementaciones realizadas durante el periodo de corte del presente informe.

3.10. Control de calidad

Dicho proceso fue llevado a cabo por esta interventoría en campo, en donde se realizó verificación de que los equipos de control de calidad estén en buen funcionamiento y en cada frente de trabajo, pues es de carácter obligatorio de acuerdo con el anexo técnico qué forma parte de los pliegos de condiciones.

Se han realizado ensayos de laboratorio para observar la calidad de todos los materiales.

Se realiza acompañamiento directo por parte de cada residente diurno y nocturno para verificar la calidad de los trabajos.

Adicionalmente se realiza capacitación del personal de interventoría, con el fin de asegurar de que el personal a cargo de la supervisión de las actividades garantice que se cumpla con las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

Para lo cual se empleó los equipos de medición precisa que se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 33. Elementos medida y control

EQUIPO SOLICITADO	CANTIDAD	MARCA	SERIAL	No. CERTIFICADO CALIBRACIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIBRACIÓN	FECHA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
					DÍA/MES/AÑO	DÍA/MES/AÑO
Para control de la calidad de la señalización vertical						
Micrómetro	8	Ubermann	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Nivel de burbuja vertical	8	Bauker	STHT42074-LA	N.A.	N.A.	N.A.
Flexómetro	8	Stanley	30-626	N.A.	N.A.	N.A.
Equipo de Retroreflexión vertical	1	Vialab	VSR-10007-202310004	S.N.	7/10/2024	7/10/2025
Para control de la calidad de la señalización horizontal						
Termohigrómetro digital	8	HTC-1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Regleta para medición en micrones de espesor de pintura (en húmedo)	8	Diversified Enterprise	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Lupa con linterna	8	Genérico	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Cronómetro	8	Decathlon	CR2032	N.A.	N.A.	N.A.
Odómetro	8	Redline	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Equipo de Retroreflexión horizontal	1	Vialab MGR20	MGR20-01-007	S.N.	4/06/2024	5/06/2025

Elementos para toma de muestras de pintura in situ						
Lámina galvanizada calibre 16 de 1,22 m x 2,44 m, corte de esta, en secciones de 15x10 cm para recolección de muestras de pintura (192 secciones por lámina)	6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



Ilustración 10. Algunos elementos utilizados en campo, flexómetros, odómetros, regleta para medición en micrones de espesor de pintura, pie de rey, termómetro e higrómetro, nivel de mano.



Ilustración 11. Elementos utilizados para medir la calidad de las implementaciones realizadas, equipo de retrorreflexión vertical, termohigrómetro digital, lupa con linterna, equipo de retrorreflexión horizontal.

Adicionalmente para la ejecución del contrato se cuenta con elementos que permiten el manejo de información tanto física como virtual (impresora, escritorios, plotter, modem de internet), a continuación, su registro fotográfico:







Ilustración 12. Impresoras

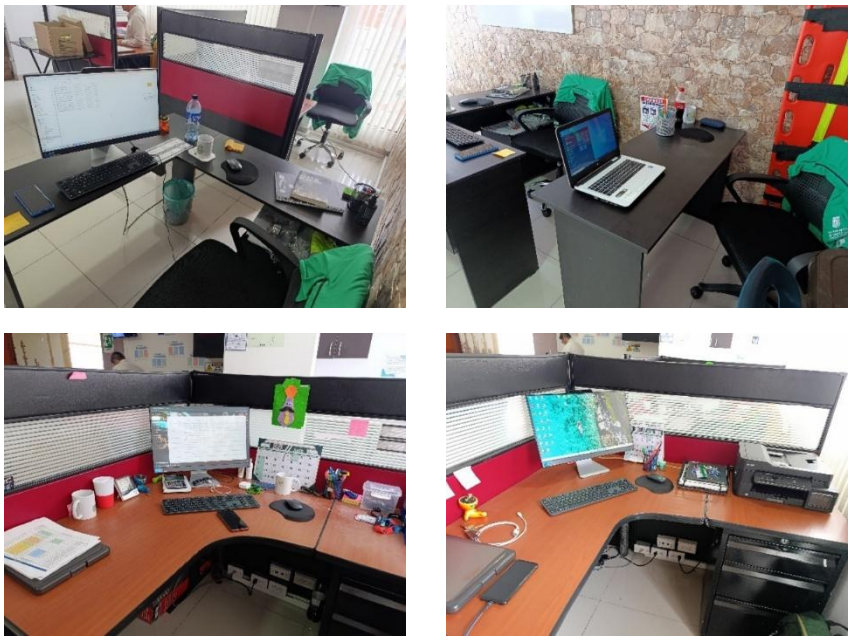


Ilustración 13. Escritorios y equipos de computo



Ilustración 14. Plotter



Ilustración 15. Modem de internet

- Se validó y verifico la relación de personal de obra e interventoría adscrito en la ejecución del proyecto, en cuanto a las afiliaciones en aportes parafiscales, según el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Reglamentada parcialmente por el Decreto 2581 de 2007, por el Decreto 2190 de 2009, y por el Decreto 1160 de 2010.
- Se revisaron las pólizas y garantías exigidas por la entidad, para que se encuentren vigentes y debidamente aprobadas, en los plazos propuestos por la secretaria de Movilidad, así como revisión del acta de inicio y su aclaratorio para su firma entre las partes.
- Se ha llevado el estricto control de la correspondencia enviada y recibida entre las partes.

3.10.1. Equipo de control en campo y ensayos de laboratorio y toma de reflectividad

La interventoría lleva a cabo control de calidad de las implementaciones realizadas en los diferentes puntos de trabajo mediante la utilización de equipos especializados para este fin, los equipos se encuentren en buen funcionamiento, esta actividad es llevada a cabo entre de los ingenieros residentes y los inspectores de obra en jornada diurna y jornada nocturna de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico.

Durante el periodo correspondiente al presente informe se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio para llevar el debido control de calidad de los materiales utilizados en las implementaciones:

- Granulometrías
- Flexión y compresión de tachas
- Índice de deslizamiento
- Medidas de retrorreflexión, horizontal y vertical
- Espesores de pintura, colorimetría y adhesión de pintura

En el **Anexo No.8 Informe de calidad laboratorio de muestras**, se describen las actividades realizadas y se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos y registro fotográfico.

3.11. Control computadores interventoría

Tabla 34. Control computadores interventoría

CONTROL COMPUTADORES INTERVENTORÍA 2024 - 3665								
CPU (Marca)	REFERENCIA	RAM (Gigas)	DISCO DURO (Gigas)	PROCESADOR (Marca / Ref)	PANTALLA (Marca)	TECLADO	MOUSE	SISTEMA OPERATIVO
ASUS	A3402WBAK	8	500	Intel core i5 3,2 hz	23,8 "	ASUS	ASUS	WINDOWS 11
ASUS	A3402WBAK	8	500	Intel core i5 3,2 hz	23,8 "	ASUS	ASUS	WINDOWS 11
ASUS	A3402WBAK	8	500	Intel core i5 3,2 hz	23,8 "	ASUS	ASUS	WINDOWS 11
ASUS	M3402WFAK	16	500	Intel core i5 3,2 hz	23,8 "	ASUS	ASUS	WINDOWS 11
DELL	VOSTRO	8	500	Intel core i5	14	DELL	DELL	WINDOWS 11
ASUS	DESKTOP-P2RGOVJ	16	1000	Intel core i7	ASUS	ASUS	ASUS	WINDOWS 11
ASUS	TUF	8	500	Rizen 5 3,4 Hz	15,6	ASUS	ASUS	WINDOWS 11

Fuente: Elaboración propia

3.12. Control vehículos interventoría

Tabla 35. Control vehículos interventoría.

TIPO DE VEHÍCULO	MODELO	PLACA	MARCA	COLOR	LICENCIA DE TRANSITO	TARJETA DE OPERACIONES	SOAT	REVISIÓN TECNOMECANICA	POLIZA RC	CONDUCTOR ASIGNADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
CAMIONETA	2.022	KQR534	RENAULT DUSTER	BLANCO	10029478047	409388	8987068-610860559	177937303	900001179928	Javier Andrade Tique y Nelson Armando Bohorquez Acosta	
CAMIONETA	2.024	LUM498	RENAULT DUSTER	BLANCO	10031729918	363789	3100014156	179849621	900001181037	Naguid Quiroga Cardona y John Guillermo Bermudez	

Fuente: Elaboración propia

3.13. Gestiones adelantadas ante las ESP y otras entidades

Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2025 y el 29 de marzo de 2025 no se efectuaron gestiones adelantadas ante el IDU, UMV, UAESP y Alcaldías locales.

3.14. Informe del estado de las garantías durante el corte del mes

Para el presente periodo conformado entre el 01 de marzo de 2025 al 29 de marzo de 2025 no se presenta informe de estado de las garantías, ya que el protocolo de garantías solicita que una vez transcurrido el 20%, 50% y 70% del tiempo promedio de garantía establecida en meses se debe realizar su respectiva verificación. Una vez mencionado lo anterior, se reitera que en el presente periodo no se realizan informes de verificación de garantías, debido a que no se cuenta con ID´S que cumplan con los porcentajes acumulados establecidos (20%, 50% y 70%), para la realización de visita e informe de estado de garantías.

3.15. Descripción de obras adicionales y/o complementarias

Durante el periodo del presente informe (01 de marzo de 2025 al 29 de marzo de 2025) no se han presentado **OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS.**

3.16. Correspondencia enviada y recibida

La información referente a la correspondencia para el periodo del presente informe correspondiente al 01 de marzo y el 29 de marzo se encuentra en el **Anexo No. 13 Relación de correspondencia.**

3.17. Reporte de producto no conforme

Durante el periodo del presente informe (01 de marzo de 2025 al 29 de marzo de 2025) no hay **REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME.**

3.18. Bitácora de obra

El registro de Bitácora de obra diurno y nocturno se encuentra en el **Anexo 4.**

3.19. Actas de comité de seguimiento

El registro de actas y asistencia a comités se encuentra en el **Anexo 6.**

4. INFORMACIÓN SOCIAL

La interventoría en cumplimiento de sus funciones ha verificado y aprobado la documentación entregada por el contratista en cuanto a población vulnerable, porcentaje de jóvenes, porcentaje de mujeres contratadas y sujetos de especial protección, de acuerdo con la normatividad vigente asegurando así el respeto a los principios de inclusión y equidad en el desarrollo de este contrato.

Se ha verificado que el contratista realice las actividades de divulgación socialización o jornadas informativas con la comunidad en los casos en los que el diseño ha incluido elementos que requieren actas de aceptación de la comunidad en etapa previa a la implementación de los elementos.

La información referente a este componente se relaciona en el **Anexo No. 16 Componente social**.

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La información referente a este componente se relaciona en el **Anexo No. 12**

6. COMENTARIOS, CONCLUSIONES

- El contrato presenta un avance de obra del 6,82% al corte del presente informe, respecto al plan de contingencia y presenta una desviación del -2,20%.
- La interventoría realiza revisión del componente SST y remite las respectivas observaciones para que se realice dicho cumplimiento
- Se realiza revisión de documentos de personal de obra y de elementos de protección personal en los frentes de trabajo.
- Se realiza la verificación de documentos de los vehículos, adicionalmente se verifica que cuenten los vehículos con todos los equipos de carretera.

- Una vez finalizada la elaboración de esta metodología, se llega a establecer que no es posible abordar una tarea tan compleja como la georreferenciación de los elementos ejecutados en obra, sin tener un marco metodológico común para toda la localización de dichos elementos y no puede ser abordada a través de una sola herramienta, puesto que los componentes que conforman la señalización deben ser vinculados, por lo que se tiene un plano y una base de datos en Excel. Con una carga de información tan abundante y variada, es necesario realizar una organización de los datos de acuerdo a características en común, el hecho que la base de datos, cuente con información georreferenciada proveniente de una sola fuente, dio origen a una información enfocada y con un único resultado.
- El proceso de georreferenciación permite tener la información geográfica con un sistema coordenado y una base de datos, con la cual se conoce el histórico de cada señal.
- Uno de los problemas más visibles en el proceso de georreferenciación consiste en que la persona que está realizando el trabajo, debe tener mucho cuidado al completar la base de datos para evitar un error excesivo que pueda causar que se tenga que repetir este proceso.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista contar de manera física y en campo con la documentación requerida respecto a documentos del personal para poder ser verificada por la interventoría.

Se recomienda al contratista la atención oportuna de los requerimientos técnicos, implementar de manera correcta la instalación de dispositivos tipo estoperol.

Se recomienda al contratista agilizar la entrega de la dotación debidamente marcada a las cuadrillas, así mismo se hace la recomendación y solicitud de contar con los sticker identificadores del contrato en cada uno de los vehículos.

8. ANEXOS

ANEXO 1. STOCK DE SEÑALES VERTICALES

ANEXO 2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

ANEXO N. 3 TRABAJADORES PROVENIENTES DE POBLACION VULNERABLE

ANEXO N. 4 BITACORA DE OBRA

ANEXO N. 5 CERTIFICADO CALIDAD EQUIPOS

ANEXO N. 6 COMITES SEMANALES

ANEXO N. 7 INDICADORES DE GESTION

ANEXO N. 8 INFORME CALIDAD LABORATORIO DE MUESTRAS

ANEXO N. 9 SOPORTE DE OFICINA

ANEXO 10. INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 11 PLANILLAS DE OBRA

ANEXO N. 12 INFORME SST

(INCLUYE PLANILLAS)

ANEXO N.13 RELACION CORRESPONDENCIA

ANEXO N. 14 POLIZAS

ANEXO N. 15 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO N. 16 INFORME SOCIAL

ANEXO N. 17 GEORREFERENCIACION

ANEXO N. 18 COMPONENTE DE PMT´S

ANEXO N. 19 APROBACIÓN INFORME DE OBRA

ANEXO N. 20 HOJA DE VIDA CONTRATO
