INFORME DE AVANCE DE OBRA N°4

CONTRATO No: SI-LP-002-2024

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: DEL 17 DE JUNIO DE 2025 A 16 DE JULIO DE 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
ALCANCE DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR 5
PLAZO DE EJECUCIÓN 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 10
ASPECTOS CONTRACTUALES 11
FORMA DE PAGO 11
CONTROL DE PÓLIZAS 12
INORMES SEMANALES Y ACTAS SUSCRITAS 14
INFORMES SEMANALES 14
ACTAS SUSCRITAS 15
INFORME DE AVANCE 15
FRENTES DE TRABAJO 15
ASISTENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL 16
MAQUINARIA Y EQUIPOS 17
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 17
PORCENTAJE DE AVANCE 20
INFORMACIÓN FINANCIERA 22
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 22
SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 22
REGISTRO FOTOGRÁFICO 23
CONCLUSIONES 30
ANEXO 1. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN 31
ANEXO 2. INFORMES SEMANALES 32
ANEXO 3. ACTAS SUSCRITAS 33
ANEXO 4. PLANILLAS 34
ANEXO 6. BITACORA 35
ANEXO 7. INFORME PGIO 36

Fotografía 3. Figuracion acero de estructuras 26
Fotografía 4. Figuracion acero de estructuras 26
Fotografía 5. Instalacion de tuberias 26
Fotografía 6. Instalacion de tuberias 27
Fotografía 7. Instalcion de cinta pvc 27
Fotografía 8. Levante de muros 28
Fotografía 9. Levante de muros 28
Fotografía 10.Concreto de columnas 28
Fotografía 11. Concreto de columnas 28
Fotografía 12. Concreto de vigas 29
Fotografía 13. Instalcion de cubierta 29
Fotografía 14.Instalacion de cubierta 29
Fotografía 15.Instalacion de perfileria 30
Fotografía 16.Instalaciones electricas 30
Fotografía 17. Plantilla en concreto 31
Fotografía 18. Plantilla en concreto 31
Fotografía 19.Instalacion de ceramica 31
Fotografía 20.Instalacion de ceramica 32
Fotografía 21.Demoliciones 32
Fotografía 22.Demoliciones 32

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe del primer periodo mensual del contrato de Obra No. SI-LP-002-2024, comprendido del 17 DE JUNIO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2025; cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

En el presente informe, se detallan los aspectos más relevantes del contrato de obra y se describen las actividades desarrolladas en el periodo, el proyecto consiste en la intervención de 10 instituciones educativas en los diferentes municipios del departamento de Córdoba cuyo objeto es mantenimiento y adecuación que permitan el óptimo funcionamiento de las instalaciones, para brindar un servicio de calidad a la población estudiantil ;se contemplan actividades como excavaciones, rellenos ,concretos, impermeabilización, instalación de redes hidrosanitarias redes eléctricas, instalación de cubiertas, pintura enchapes; entre otras actividades.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, Departamento de Córdoba. Específicamente en los municipios de Cereté (I.E. Marceliano Polo), San Pelayo (I.E. Santa Teresita sede general Santander), Ciénaga de Oro (I.E. Marco Fidel Suarez), Moñitos (I.E. San José de Moñitos sede principal), Tierralta (I.E. Junín), Planeta Rica (I.E. Plaza bonita), San Bernardo del Viento (I.E. El Castillo), Canalete (I.E. San José de Canalete), San Andrés de Sotavento (I.E. San Simón sede sagrado corazón de Jesús) y Los Córdobas (I.E. El Ébano).



Ilustración 1. Localización General del Proyecto

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ALCANCE DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR

El proyecto tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAEESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA". Y las actividades a ejecutar, de acuerdo al Balance de obra N°1 son las siguientes:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.872,00
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	1.872,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	444,00
	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	171,00
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	409,00
2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (60/20)	M3	57,00
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	730,20
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	270,15
	3. CIMENTACIÓN		
3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	5,70
3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	34,20
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	365,40
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	7.173,00
3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	596,40
	4. ESTRUCTURAS		
4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	438,00
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	318,00
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	12.107,40
4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	131,00
4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @0.25 MTS	M2	108,00
4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @.15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	9,60
	5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE		
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	1.236,00
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	2.662,00
5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	2.362,00
5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	2.362,00

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

6. ESTRUCTURA - CUBIERTA			
6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	1.304,00
6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	7.925,30
6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	4.379,96
7. PISOS			
7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	985,80
7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	985,80
7,03	ENCHAPE CERÁMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	266,40
7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	707,40
8. CARPINTERIA METALICA			
8,01	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	42,00
8,02	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	12,00
8,03	S/I PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, DE 1,50 X 2,20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJAS DE 30 CMS EN AMBAS PUERTAS Y POR AMBOS LADOS.	UN	12,00
8,04	S/I CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO DE 0,6 MM ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS, APERTURA MANUAL.	M2	21,60
8,05	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	42,72
8,06	S/I PROTECTOR DE VENTANAS EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	62,16
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS			
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE			
9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	246,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	105,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	54,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	87,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	42,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UN	18,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UN	24,00
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UN	6,00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UN	6,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UN	12,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UN	6,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UN	12,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UN	12,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	42,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	18,00

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

	TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA		
9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	351,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	108,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	45,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	114,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	72,00
9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	84,00
9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00
9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	18,00
	EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO		
9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)	UN	12,00
9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	6,00
	APARATOS SANITARIOS		
9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UN	6,00
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	12,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UN	12,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UN	54,00
9,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADOS METÁLICOS	UN	12,00
9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	12,00
	TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE		
9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	36,00
9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	12,00
9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13,82
9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	8,40
9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	28,98
9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	24,00
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	1.615,80
	TANQUE DE AGUA POTABLE		
9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20
9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00
9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56
9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	10,80
9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	117,60
9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20
9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20
	TANQUE DE AGUAS RESIDUALES		
9,48	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20
9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00
9,50	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56
9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20
9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20
9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20

10. INSTALACIONES ELECTRICAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA - I.E JUNIN, TIERRALTA)			
10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	42,00
10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	18,00
10,03	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UN	72,00
10,04	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W- Wallpack LED 30W)	UN	234,00
10,05	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	UN	60,00
10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	126,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UN	6,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tuberia PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	25,00
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE MEDIDA Y ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE PROTECCIONES (incluye Tuberia PVC, Tuberia IMC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00
10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UN	12,00
10,12	CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final	UN	6,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR		
10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	UND	6,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	6,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	6,00
10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	48,00
10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES	UND	48,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	18,00

11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN LA I.E SAN JOSE CANALETE			
ACTIVIDADES PRELIMINARES			
11,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	1,00
11,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	102,00
11,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	55,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS			
11,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	18,00
11,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	41,60
11,06	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	6,00
11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	66,80
11,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	28,27
CIMENTACIÓN			
11,09	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,60
11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,60
11,11	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	36,20
11,12	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	856,20
11,13	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	40,00
ESTRUCTURAS			
11,14	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	40,00
11,15	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	21,60
11,16	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1.241,80
11,17	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI (PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @0.25 MTS	M2	18,00
ESTRUCTURA - CUBIERTA			
11,18	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	130,40
11,19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	825,55
11,20	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	417,14
PISOS			
11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	98,60
11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	98,60
11,25	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	12,00
PINTURA COCINA EXISTENTE			
11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	124,30
11,27	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	124,30

12. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E EL CASTILLO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO			
12,01	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO E= 0.10 MTS DE CONCRETO Y SOPORTE EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Und	1,00
12,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	75,00
12,03	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	70,70
12,04	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,00
12,05	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	75,00
12,06	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	48,38
12,07	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	41,60
12,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	70,70
13. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS - MUNICIPIO SAN ANDRES DE SOTAVENTO			
13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	48,00
13,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE ENTRAMADO EN CERCHAS METALICAS	M2	48,00
13,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	171,40
13,04	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	48,00
13,05	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	48,00
13,06	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	48,00
13,07	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	47,00
13,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	57,80
14. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN I.E EL EBANO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS			
14,01	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	46,46
14,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON ROJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	80,96
14,03	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	80,96
14,04	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOSION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	28,30
14,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	46,46
14,06	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	40,40
14,07	DESMONTE DE VENTILADORES EN MAL ESTADO	UND	4,00
14,08	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	4,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución inicial del contrato, es de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita entre contratista y supervisión el día **17 de MARZO de 2025.**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El contratista presentó una programación de actividades, de acuerdo al plazo contractual del proyecto, de 08 meses, con fecha de finalización 16 de noviembre de 2025. Se anexa programación de obra y flujo financiero del contrato por semanas; para su seguimiento.

ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No:	SI-LP-002-2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 Nit: 901915670-0 R.L María Isabel Quintero González C.C 1.010.007.099
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESO M/CTE ($4.135.056.075)
CDP:	4625 11 de febrero de 2025
ACTA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (08) MESES
INTERVENTORIA	ANTICA SAS BIC

FORMA DE PAGO

El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: **1.- PAGOS PARCIALES**, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 30% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **PARÀGRAFO PRIMERO:** Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el Interventor y/o supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestión social y planos. **2.- PAGO FINAL,** equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y

riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA** deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO SEGUNDO. -** Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. **PARÁGRAFO TERCERO**. Para efectos del último pago deberá presentarse el Acta de Liquidación del contrato. **PARÁGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA** deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **El CONTRATISTA** deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. **PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA** deberá acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones en materia laboral, frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de cada factura. **NOTA: EL DEPARTAMENTO** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se presenta un resumen de las garantías del contrato de obra SI-LP -002-2024:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100369947
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

AMPARO	**VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO**	**VALOR ASEGURADO**

	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2026	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	1210/2025	12/10/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	$41.226.771,00

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/05/2026	$413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	17/03/2025	17/05/2026	$1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	17/11/2028	$413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/11/2025	17/11/2030	$398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/03/2025	17/05/2026	$41.226.771,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza contractual	NB-100095688
Aprobación de Póliza	19 DE FEBRERO 2025

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	$569.400.000,00
AMPARO	**VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	17/11/2025	$569.400.000,00

Las garantías fueron revisas y aprobadas por el área jurídica de la Gobernación de Córdoba, inicialmente se realizó la aprobación con fecha 19/02/2025, donde se establece que las garantías cumplen con los requisitos exigidos por el contrato y por la ley; en lo que corresponde a las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

El contratista realizó la actualización de las vigencias de las garantías contractuales, con la fecha del acta de inicio suscrita entre contratista y supervisión, y con las actas de suspensión, reinicio y prorroga las cuales fueron aprobadas con fecha 28/04/2025 por la entidad contratante.

INORMES SEMANALES Y ACTAS SUSCRITAS

INFORMES SEMANALES

Con una periodicidad semanal se elaboran informes con el resumen de las actividades desarrolladas durante la semana. Durante el periodo correspondiente al primes mes de ejecución de obra, se elaboraron 4 informes semanales; de los cuales se anexa copia.

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL INFORME	FECHA
Informe Semanal N°14	16/06/2025-22/06/2025
Informe Semanal N°15	23/06/2025-29/06/2025
Informe Semanal N°16	30/06/2025-06/07/2025
Informe Semanal N°17	07/07/2025-13/07/2025
Informe Semanal N°18	14/07/2025-20/07/2025

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025

INFORME DE AVANCE

FRENTES DE TRABAJO

INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO	MUNICIPIO DE CERETE
INSTITUCION EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ	MUNICIPIO DE CIENEGA DE ORO
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER	MUNICIPIO DE SAN PELAYO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS	MUNICIPIO DE MOÑITOS
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE	MUNICIPIO DE CANALETE

ASISTENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL

A continuación, se relaciona el personal profesional propuesto por el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 para dar cumplimiento a equipo requerido por entidad contratante en el anexo técnico del contrato:

No	PROFESIONAL	DEDICACIÓN	NOMBRE
1	DIRECTOR DE OBRA	50%	KAMAL AUGUSTO BEJRANO FERNANDEZ
2	RESIDENTE DE OBRA 1	100%	ANDY MIGUEL AGAMEZ GENEY
3	RESIDENTE DE OBRA 2	100%	JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA
4	RESIDENTE DE OBRA 3	100%	RICARDO JAVIER CASTRO ESCOBAR
5	INGENIERO ELECTRICO	50%	HECTOR RAMIREZ LIBREROS
6	INGENIERO AMBIENTAL	50%	SHARON MELISA CORRALES MARTINEZ
7	SECRETARIO	100%	JHOAN VERGARA

De acuerdo con la dedicación requerida de cada uno de los profesionales para el desarrollo del contrato, se estableció un control de asistencia, ya sea en obra u oficina, para verificar el cumplimiento:

NOMBRE	JUNIO													JULIO															TOTAL DE DIAS
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNADEZ	X		X					X		X				X			X				X		X					X		X		11
ANDY AGAMEZ GENEY	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	25
CASTRO ESCOBAR RICARDO JAVIER	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	25
ALVAREZ ORTEGA JOSE CARLOS	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	25
CORRALES MARTINEZ SHARON MELISA		X		X				X		X				X			X				X			X		X		X		X		11
RAMIREZ LIBREROS HECTOR		X		X				X		X				X			X				X			X		X		X		X		11
JHOAN VERGARA	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	25

Ilustración 2. Control de Asistencia

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se destaca el uso de los siguientes equipos:

- Mezcladora de Concreto
- Placa Vibratoria (Compactador Rana)
- Vibrador de concreto
- Herramienta Menor
- Pulidora
- Taladro

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas en el periodo del presente informe, corresponden principalmente a:

- Instalación de enchapes
- Instalación de cubierta
- Remoción de pintura
- Pañete de muros
- Instalación de perfilería metálica
- Figuración de acero
- Pañete para muros
- Concreto de zapata y columna
- Tanque elevado.
- Pintura en vinilo

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

	DESCRIPCION	UND.	VALOR	CANTIDADES	VALOR EJECUTADO
	3. CIMENTACIÓN				
3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	$ 40.066,00	108,75	$ 4.357.177,50
	4. ESTRUCTURAS				
4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI (PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) , REF 4 D 3/8" Y	M2	$ 157.726,00	25,00	$ 3.943.150,00
	5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE				
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	$ 56.791,00	1075,40	$ 61.073.041,40
	6. ESTRUCTURA - CUBIERTA				
6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	$ 281.430,00	160,80	$ 45.253.944,00
	7. PISOS				
7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$ 127.857,00	90,93	$ 11.626.037,01
7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	$ 163.779,00	118,95	$ 19.481.512,05
7,03	ENCHAPE CERAMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	$ 172.440,00	135,72	$ 23.403.556,80
7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	$ 35.593,00	252,63	$ 8.991.859,59
	9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS				
9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	$ 39.259,00	18,60	$ 730.217,40
9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$ 206.382,00	6,00	$ 1.238.292,00
9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 200.188,00	13,25	$ 2.652.491,00
9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$ 890.152,00	0,60	$ 534.091,20
9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	$ 1.020.946,00	4,20	$ 4.287.973,20
9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$ 177.056,00	14,49	$ 2.565.541,44
9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	$ 403.099,00	12,00	$ 4.837.188,00
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	$ 9.658,00	815,80	$ 7.878.996,40

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

11	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	$	39.259,00	15,00	$ 588.885,00
11,1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	$	6.543,00	40,40	$ 264.337,20
11,1	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	$	206.382,00	5,00	$ 1.031.910,00
11,1	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$	200.140,00	3,64	$ 728.509,60
11,1	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	$	22.827,00	24,23	$ 553.098,21
	CIMENTACIÓN					
11,1	SOLADO EN CONCRETO E= 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	$	890.152,00	0,50	$ 445.076,00
11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	$	1.020.946,00	3,00	$ 3.062.838,00
11,1	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$	124.557,00	36,20	$ 4.508.963,40
11,1	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	$	9.658,00	610,30	$ 5.894.277,40
	ESTRUCTURAS					
11,1	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$	135.860,00	40,00	$ 5.434.400,00
11,2	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	$	135.759,00	21,60	$ 2.932.394,40
11,2	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	$	9.658,00	1128,39	$ 10.897.990,62
						$ 840.674.177,78

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com


PORCENTAJE DE AVANCE

Durante el periodo correspondiente al presente informe; se ejecutaron las siguientes cantidades de obra; resultando en un avance de $ 440.839.651,87

A continuación, se presenta un resumen de los porcentajes de avance programados, de acuerdo con la programación presentada, la cual cuenta con la aprobación de la supervisión y con base en la cual se medirá el avance del proyecto mes a mes; la programación de obra fue elaborada con base a las cantidades de obra contratadas.

PERIODO	PROGRAMADO PESOS	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO (PESOS)	PORCENTAJE EJECUTADO %	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE ATRASO O AVANCE
MES 4	$ 750.187.050,00	18,14%	46,80%	$ 440.829.651,87	10,66%	40,70%	-6,10%
TOTAL	$ 750.187.050,00		46,80%				

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

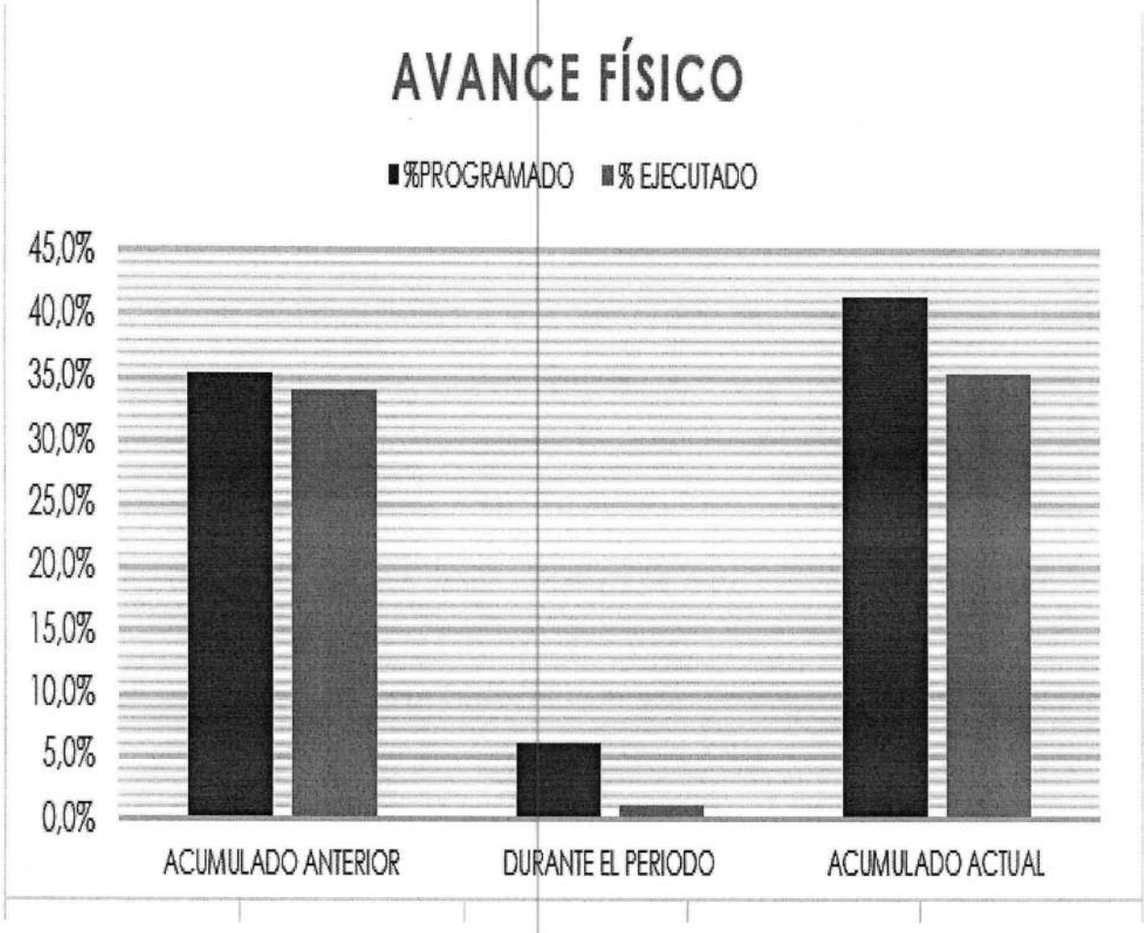

Con base en la programación de obra, en el presente periodo, el proyecto debía avanzar un 18.14%, equivalente a $750.187.050. De acuerdo a las cantidades de obra ejecutada; durante este mes el proyecto tuvo un avance correspondiente al 10.66% que financieramente representa $440.829.651,87

Teniendo en cuenta el avance presentado durante el Cuarto mes de obra, en el cual se desarrolla la etapa de ejecución de obra, él proyecto cuenta con un avance acumulado del 40.70% y presenta un atraso en el cronograma del 6.10% Debido a variaciones en el clima poco favorables con lluvias continuas

Se espera aumentar rendimiento para el próximo periodo, mostrando un avance significativo en el la ejecución de la obra.

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

INFORMACIÓN FINANCIERA

Durante el periodo de tiempo correspondiente al presente informe no se presentó cobro alguno por parte del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, en el marco del contrato SI-LP-002-2024

ACTA DE EJECUCION No	Vr ACTA	AMORTIZACION 30%	SALDO PAGADO
ACTA ANTICIPO	$1.240.516.522,50		$1.240.516522,50
ACTA No.1	$1261.079.816,77	$378.323.945,03	$882.755.871,74

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el tiempo de ejecución del contrato, en el periodo correspondiente al presente informe, se presentaron algunos días de lluvias, el comportamiento del clima se caracterizó por ser parcialmente lluvioso.

En total fueron 5 días en los que se presentaron lluvias en el proyecto, los cuales afectaron la ejecución de actividades con normalidad.

ESTADO DEL TIEMPO	
09/07/2025	MAÑANA LLUVIOSO/TARDE LLUVIOSO
10/07/2025	MAÑANA LLUVIOSO/TARDE SOLEADO
12/07/2025	MAÑANA LLUVIOSO/TARDE LLUVIOSO
13/07/2025	MAÑANA SOLEADO/TARDE LLUVIOSO
17/07/2025	MAÑANA LLUVIOSO/TARDE LLUVIOSO

SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa planilla de pago de seguridad social del consorcio y trabajadores independientes.


Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades realizadas entre el 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025, en el desarrollo del contrato No. SI-LP-002-2024



Fotografía 3. Instalación de cerámica

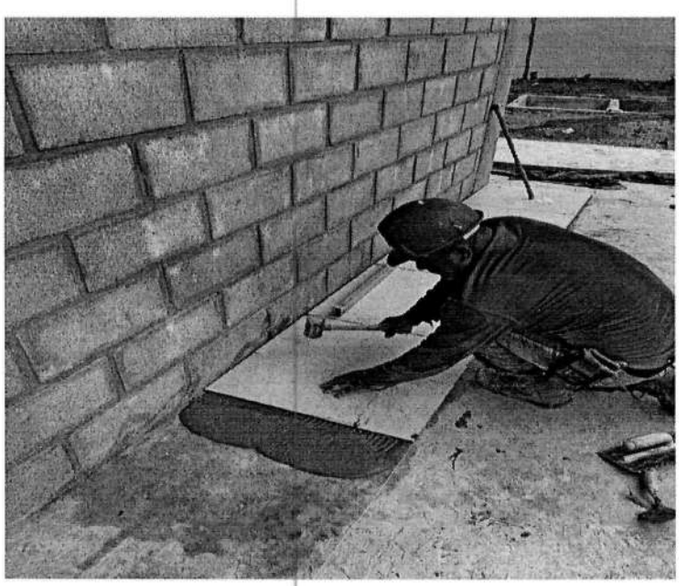


Fotografía 4. Instalación de cerámica


Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com




Fotografía 5 rampa de acceso

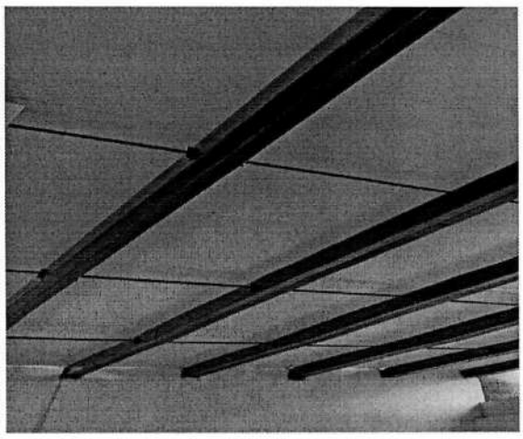


Fotografía 6. Instalación de cubierta

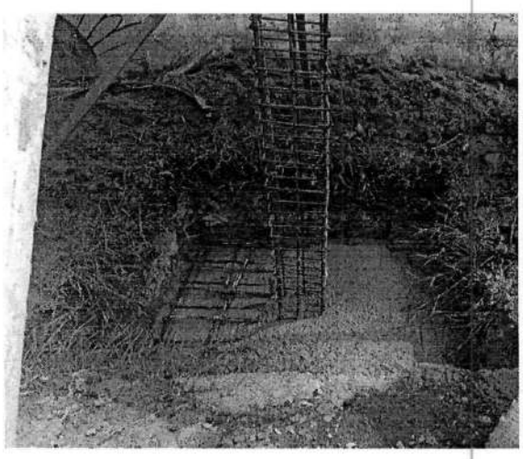


Fotografía 7. Acero de refuerzo

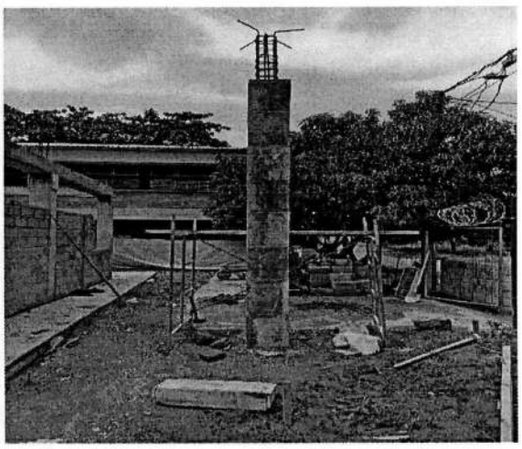


Fotografía 8. Concreto columna tanque elevado

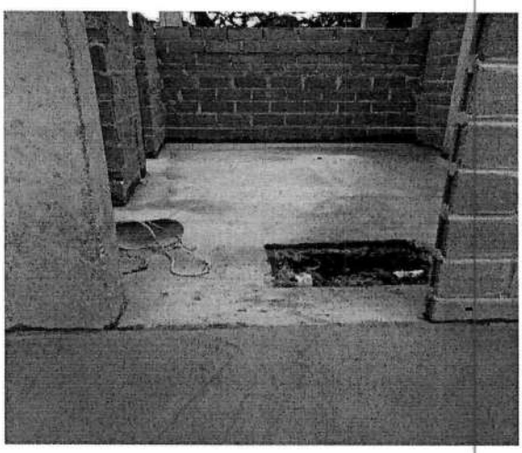


Fotografía 9. plantilla

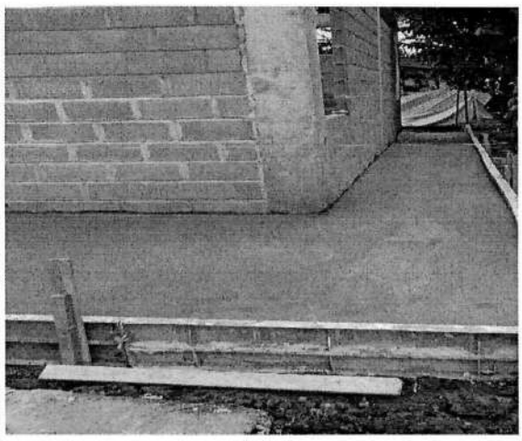


Fotografía 10. plantilla

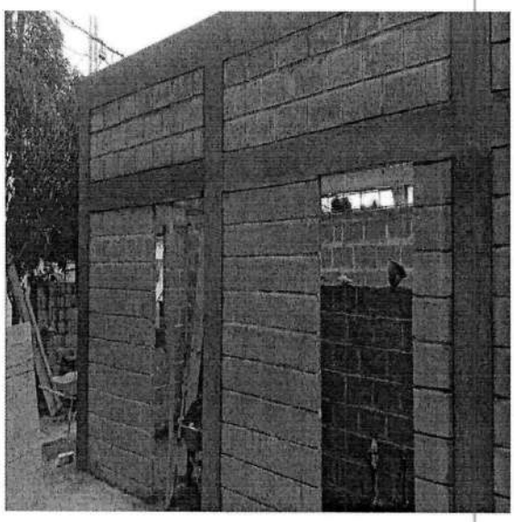


Fotografía 11. Levante de muros

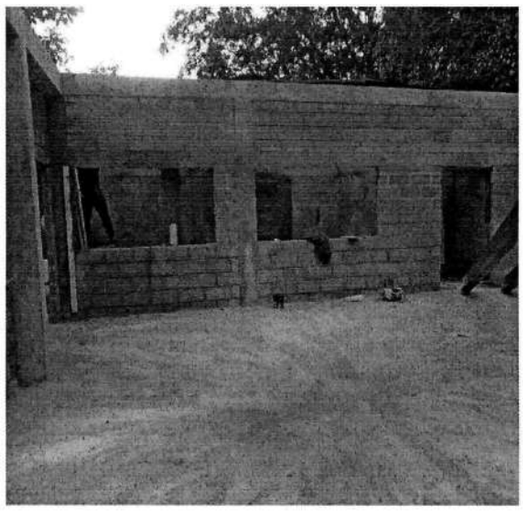


Fotografía 12. Levante de muros

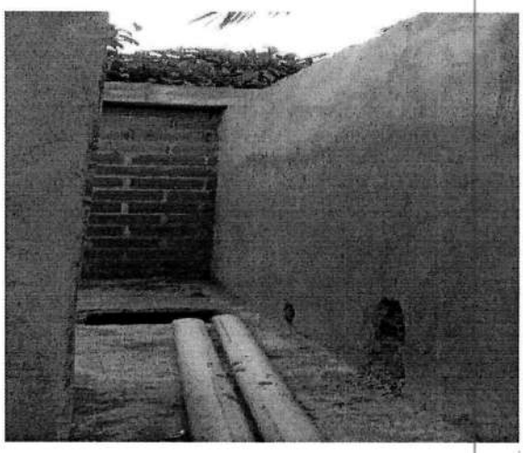


Fotografía 13. Pañete para muros

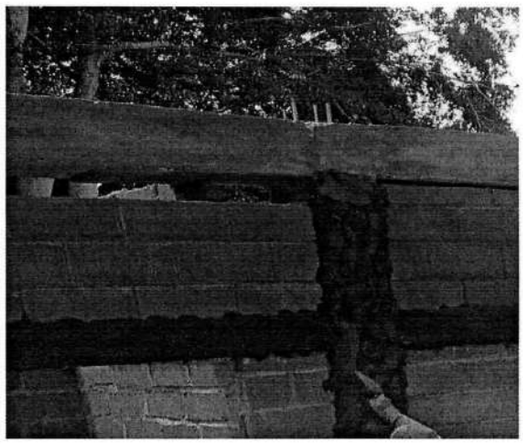

Fotografía 14. Pañete para muros

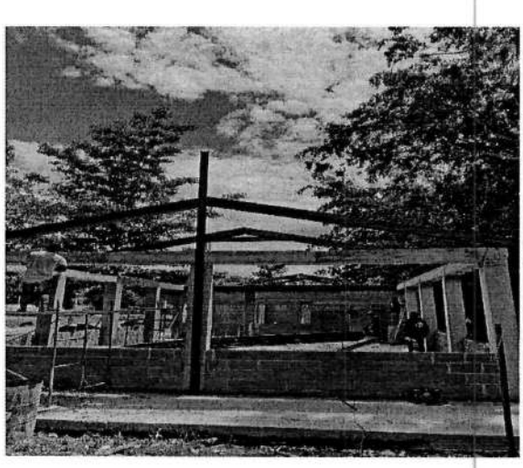

Fotografía 15. Instalacion de perfileria

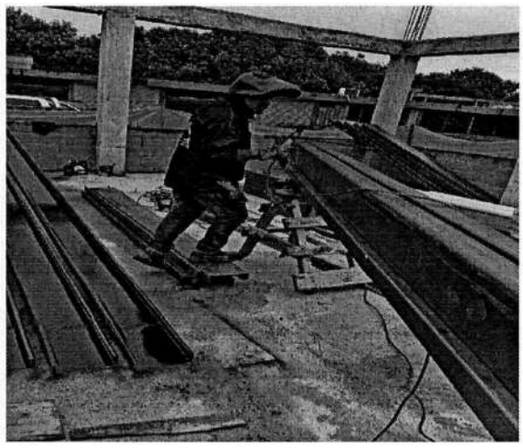

Fotografía16.Concretos

CONCLUSIONES

Dentro del periodo comprendido del 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025; correspondiente al presente informe podemos mencionar las siguientes conclusiones más relevantes:

- El contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, ha ejecutado actividades de instalación de valla informativa del proyecto, localización trazado y replanteo, nivelación de terreno, cerramiento provisional, excavaciones, concretos de cimentación entre otras; alcanzando un porcentaje de avance de 10.66% para este periodo, que comparado con el avance programado del 18.14%, nos indica que, durante el Cuarto mes de ejecución del contrato, el proyecto presentó un avance menor al programado.

- Durante el presente periodo, el avance acumulado del proyecto es 40.70%, que comparado con el 46.80 % programado; indica un atraso con respecto a lo programado de 6.1 %, se espera continuar aumentando este porcentaje de ejecución para el siguiente periodo.

- Las obras se vienen ejecutando de conformidad con los diseños suministrados por la entidad contratante; dando cumplimiento a las especificaciones técnicas de construcción y de acuerdo a los plazos establecidos.

- Se emplean los equipos necesarios y materiales de calidad para la ejecución de las obras.

- Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista CONSORCIO infraestructura educativa 002, en lo correspondiente a la parte técnica, financiera y jurídica.

- Se incluye como anexo al presente informe, el reporte de las actividades y seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo.

María Q.

MARIA ISABEL QUINTERO GONGALEZ
RL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

ANEXO 1. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN


Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION SEMANAL		
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (COSTO DIRECTO)	4.135.056.075,00	


	PERIODO DE EJECUCION			Semanal				Semana Acumulada				
Mes	Semana	PERIODO		Programado (P)	% P.S	Ejecutado (E)	% E.S	% Programado	% P	% Ejecutado	% E	% AVG. Avance
1	Semana 1	lun 17-mar-2025	dom 23-mar-2025	$ 20.099.075,00	0,486%	$ 15.709.290,00	0,380%	$ 20.099.075,00	0,486%	$ 15.709.290,00	0,380%	
	Semana 2	lun 24-mar-2025	dom 30-mar-2025	$ 57.747.504,00	1,397%	$ 37.162.883,72	0,899%	$ 77.846.579,00	1,883%	$ 52.872.173,72	1,279%	
	Semana 3	lun 31-mar-2025	dom 6-abr-2025	$ 26.705.425,00	0,646%	$ 68.272.083,38	1,651%	$ 104.552.004,00	2,528%	$ 121.144.257,10	2,930%	
	Semana 4	lun 7-abr-2025	dom 13-abr-2025	$ 56.717.560,00	1,372%	$ 41.671.560,59	1,008%	$ 161.269.564,00	3,900%	$ 162.815.817,69	3,937%	
2	Semana 5	lun 14-abr-2025	dom 20-abr-2025	$ 43.539.481,00	1,053%	$ 21.320.216,72	0,516%	$ 204.809.045,00	4,953%	$ 184.136.034,41	4,453%	
	Semana 6	lun 21-abr-2025	dom 27-abr-2025	$ 281.542.006,00	6,809%	$ 52.982.810,32	1,281%	$ 486.351.051,00	11,762%	$ 237.118.844,73	5,734%	
	Semana 7	lun 28-abr-2025	dom 4-may-2025	$ 200.539.670,00	4,850%	$ 47.007.846,96	1,137%	$ 686.890.721,00	16,611%	$ 284.126.691,69	6,871%	
	Semana 8	lun 5-may-2025	dom 11-may-2025	$ 52.161.034,00	1,261%	$ 52.253.467,96	1,264%	$ 739.051.755,00	17,873%	$ 336.380.159,65	8,135%	
	Semana 9	lun 12-may-2025	dom 18-may-2025	$ 81.699.098,00	1,976%	$ 65.067.398,54	1,574%	$ 820.750.853,00	19,849%	$ 401.447.558,19	9,708%	
3	Semana 10	lun 19-may-2025	dom 25-may-2025	$ 60.985.678,00	1,475%	$ 46.288.216,69	1,119%	$ 881.736.531,00	21,323%	$ 447.735.774,88	10,828%	
	Semana 11	lun 26-may-2025	dom 1-jun-2025	$ 49.975.236,00	1,209%	$ 49.056.520,84	1,186%	$ 931.711.767,00	22,532%	$ 496.792.295,72	12,014%	
	Semana 12	lun 2-jun-2025	dom 8-jun-2025	$ 162.732.843,00	3,935%	$ 154.799.936,40	3,744%	$ 1.094.444.610,00	26,467%	$ 651.592.232,12	15,758%	
	Semana 13	lun 9-jun-2025	dom 15-jun-2025	$ 91.872.712,00	2,222%	$ 590.516.569,66	14,281%	$ 1.186.317.322,00	28,689%	$ 1.242.108.801,78	30,038%	
4	Semana 14	lun 16-jun-2025	dom 22-jun-2025	$ 170.632.029,00	4,126%	$ 133.035.737,00	3,217%	$ 1.356.949.351,00	32,816%	$ 1.375.144.538,78	33,256%	
	Semana 15	lun 23-jun-2025	dom 29-jun-2025	$ 109.934.490,00	2,659%	$ 35.362.945,99	0,855%	$ 1.466.883.841,00	35,474%	$ 1.410.507.484,77	34,111%	
	Semana 16	lun 30-jun-2025	dom 6-jul-2025	$ 249.820.044,00	6,042%	$ 49.230.670,12	1,191%	$ 1.716.703.885,00	41,516%	$ 1.459.738.154,89	35,302%	
	Semana 17	lun 7-jul-2025	dom 13-jul-2025	$ 199.023.710,00	4,813%	$ 162.677.794,45	3,934%	$ 1.915.727.595,00	46,329%	$ 1.622.415.949,34	39,236%	
5	Semana 18	lun 14-jul-2025	dom 20-jul-2025	$ 20.776.777,00	0,502%	$ 62.073.725,40	1,501%	$ 1.936.504.372,00	46,831%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 19	lun 21-jul-2025	dom 27-jul-2025	$ 43.033.201,00	1,041%		0,000%	$ 1.979.537.573,00	47,872%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 20	lun 28-jul-2025	dom 3-ago-2025	$ 266.078.042,00	6,435%		0,000%	$ 2.245.615.615,00	54,307%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 21	lun 4-ago-2025	dom 10-ago-2025	$ 47.173.002,00	1,141%		0,000%	$ 2.292.788.617,00	55,448%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
6	Semana 22	lun 11-ago-2025	dom 17-ago-2025	$ 29.255.348,00	0,707%		0,000%	$ 2.322.043.965,00	56,155%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 23	lun 18-ago-2025	dom 24-ago-2025	$ 342.880.767,00	8,292%		0,000%	$ 2.664.924.732,00	64,447%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 24	lun 25-ago-2025	dom 31-ago-2025	$ 103.740.205,00	2,509%		0,000%	$ 2.768.664.937,00	66,956%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 25	lun 1-sep-2025	dom 7-sep-2025	$ 37.786.040,00	0,914%		0,000%	$ 2.806.450.977,00	67,870%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 26	lun 8-sep-2025	dom 14-sep-2025	$ 57.182.957,00	1,383%		0,000%	$ 2.863.633.934,00	69,253%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
7	Semana 27	lun 15-sep-2025	dom 21-sep-2025	$ 21.648.689,00	0,524%		0,000%	$ 2.885.282.623,00	69,776%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 28	lun 22-sep-2025	dom 28-sep-2025	$ 19.301.731,00	0,467%		0,000%	$ 2.904.584.354,00	70,243%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 29	lun 29-sep-2025	dom 5-oct-2025	$ 124.938.434,00	3,021%		0,000%	$ 3.029.522.788,00	73,264%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 30	lun 6-oct-2025	dom 12-oct-2025	$ 185.482.072,00	4,486%		0,000%	$ 3.215.004.860,00	77,750%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 31	lun 13-oct-2025	dom 19-oct-2025	$ 114.132.100,00	2,760%		0,000%	$ 3.329.136.960,00	80,510%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
8	Semana 32	lun 20-oct-2025	dom 26-oct-2025	$ 75.763.733,00	1,832%		0,000%	$ 3.404.900.693,00	82,342%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 33	lun 27-oct-2025	dom 2-nov-2025	$ 275.169.790,00	6,655%		0,000%	$ 3.680.070.483,00	88,997%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 34	lun 3-nov-2025	dom 9-nov-2025	$ 42.102.771,00	1,018%		0,000%	$ 3.722.173.254,00	90,015%	$ 1.684.489.674,74	40,737%	
	Semana 35	lun 10-nov-2025	dom 16-nov-2025	$ 412.882.821,00	9,985%		0,000%	$ 4.135.056.075,00	100,000%	$ 496.792.295,72	40,737%	
				$ 4.135.056.075,00	100,00%	$ 1.684.489.674,74	40,74%			$ 1.684.489.674,74	40,74%	


RESUMEN EJECUCION MENSUAL


MES	P. Mensual		E. Mensual		P. Mensual		P. Mensual		Avg E (%)
Mes 1	161.269.564,000	3,90%		0,00%	161.269.564	3,90%	162.815.818	3,94%	0,00%
Mes 2	659.481.289,000	15,95%		0,00%	820.750.853	19,85%	401.447.558	9,71%	0,00%
Mes 3	365.566.469,000	8,84%		0,00%	1.186.317.322	28,69%	1.242.108.802	39,24%	
Mes 4	729.410.273,000	17,64%		0,00%	1.915.727.595	46,33%	1.684.489.675	40,73%	
Mes 5	377.061.022,000	9,12%		0,00%	2.292.788.617	55,45%			
Mes 6	570.845.317,000	13,81%		0,00%	2.863.633.934	69,25%			
Mes 7	465.503.026,000	11,26%		0,00%	3.329.136.960	80,51%			
Mes 8	805.919.115,000	19,49%		0,00%	4.135.056.075	100,00%	496.792.296	12,01%	0,00%
	4.135.056.075,000	100,00%	-	0,00%					

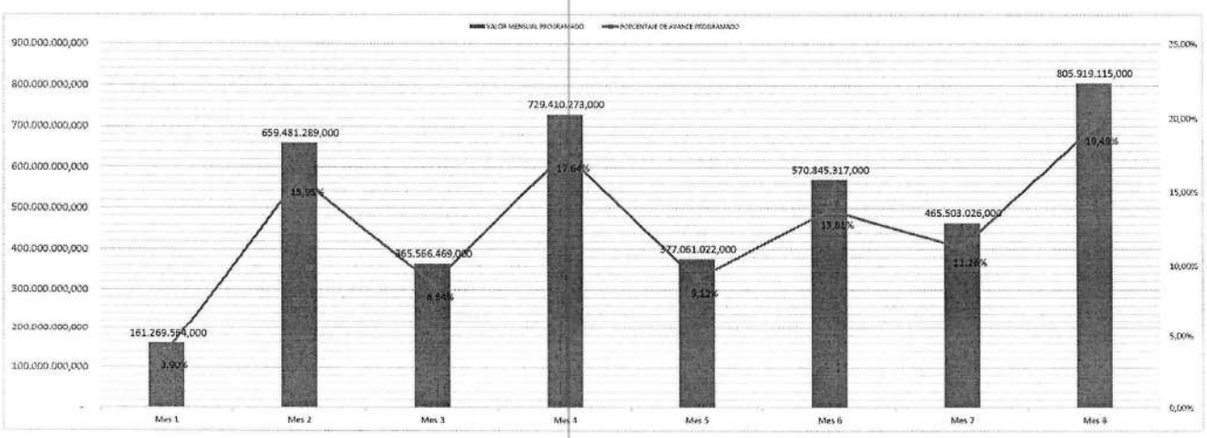

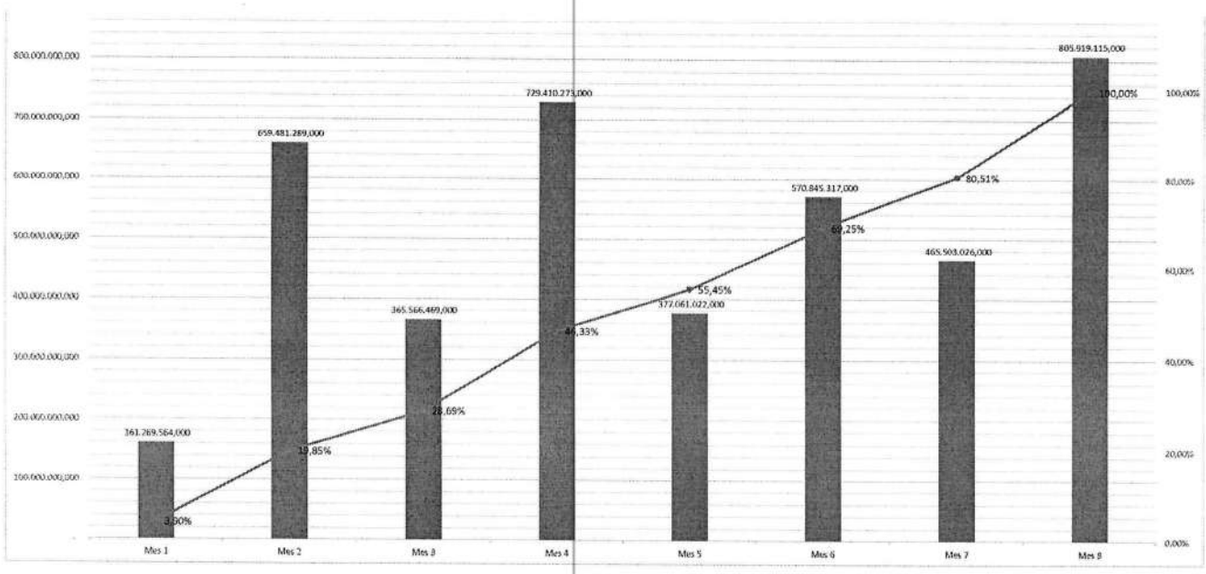


800.000.000.000
700.000.000.000
600.000.000.000
500.000.000.000
400.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000
100.000.000.000
161.269.564,000
659.481.289,000
365.566.469,000
729.410.273,000
372.061.022,000
570.845.317,000
465.903.026,000
805.919.115,000
3,00%
18,85%
28,69%
46,33%
55,45%
69,25%
80,51%
100,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8

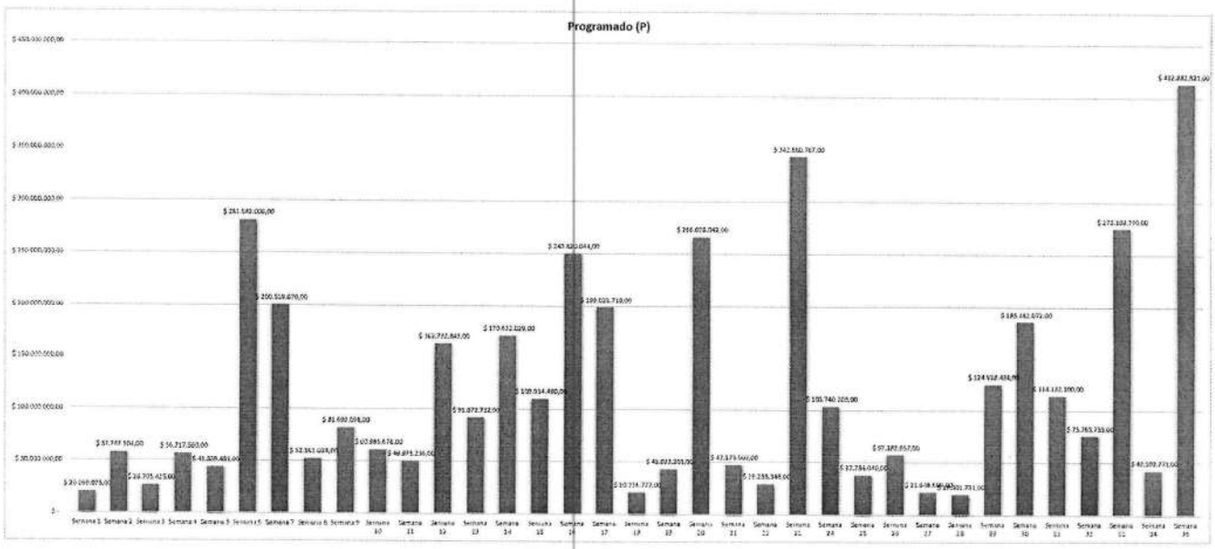
Programado (P)

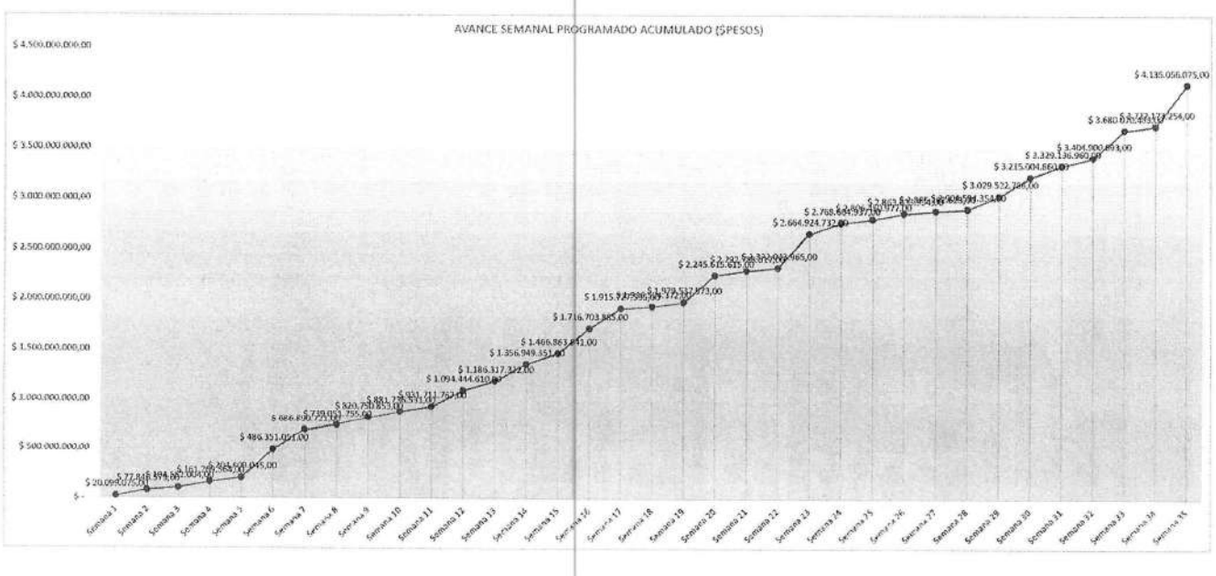
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUMULADO ($PESOS)

ANEXO 3. INFORMES SEMANALES

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INFORMES DE AVANCE DE OBRA
REPORTE SEMANAL

CÓRDOBA OBRA Bien

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14/04/2025	SEMANA No. :	14	DEL	16/06/2025	HASTA	22/06/2025

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002		
REP. LEGAL:	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ		
CONTRATO No.:	SI-LP -002-2024	**VALOR INICIAL:**	$ 4.135.056.075,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
PLAZO TOTAL:	8 MESES	**ADICIONES:**	$ -
INICIO :	17/03/2025		
SUSPENSION 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A	**VALOR TOTAL:**	$ 4.135.056.075,00
VENCIMIENTO:	16/11/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		PORCENTAJE AVANCE (%)	VALOR PAGADO ACUMULADO
ANTICIPO:	$ -	0,00%	$ -
PARCIAL 1:	$ -	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -	0,00%	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)
PARCIAL 3:	$ -	0,00%	0,00%
FINAL:	$ -	0,00%	

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODODEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO	ML	108,75	$ 40.066,00	$ 4.357.177,50
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	217,39	$ 56.791,00	$ 12.345.795,49
6,01	ANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENT	M2	160,80	$ 281.430,00	$ 45.253.944,00
7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	118,95	$ 163.779,00	$ 19.481.512,05
7,03	X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	135,72	$ 172.440,00	$ 23.403.556,80
10,08	O E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (Incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu	UND	3,00	$ 1.914.256,00	$ 5.742.768,00
11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	41,82	$ 200.140,00	$ 8.369.854,80
11,13	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO	ML	36,80	$ 40.066,00	$ 1.474.428,80
11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	98,60	$ 127.857,00	$ 12.606.700,20
					$ 133.035.737,64
					3,22%

2,00	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	%EJECUTADO / % PROGRA.
ACUMULADO ANTERIOR	28,696%	30,04%	0,434%
DURANTE EL PERIODO	4,126%	3,22%	
ACUMULADO ACTUAL	32,8%	33,26%	

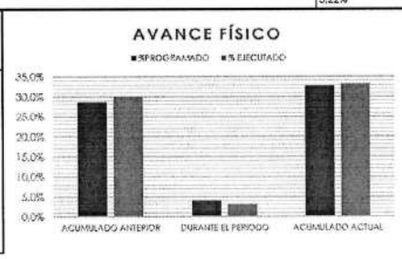

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se exigen a cada proveedor los certificados de calidad de los materiales empleados para la ejecución de las actividades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta culminar las actividades de instalaciones de tuberías para iniciar con plantilla

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

De acuerdo a la programación de obra, el proyecto para el fin de la semana 14

Se avanzó en actividades instalcion de cubierta

Se realizan instalcion de enchapes en zonas humedas

Se avanza en actividades defundida de plantilla en concreto


Se avanza en actividades de excavacion manual para zapatas No se presentaron accidentes laborales.



ENCHAPE DE PISO



PLANTILLA DE PISO



INSTALACION DE TUBERIA



SALIDAS PARA TOMA CORRIENTES

Kamal Bejarano F

KAMAL BEJARANO FERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INFORMES DE AVANCE DE OBRA
REPORTE SEMANAL

CÓRDOBA OBRA Bien

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14/04/2025	SEMANA No. :	15	DEL	23/06/2025	HASTA	29/06/2025

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002		
REP. LEGAL:	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ		
CONTRATO No.:	SI-LP -002-2024	**VALOR INICIAL:**	$ 4.135.056.075,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
PLAZO TOTAL:	8 MESES	**ADICIONES:**	$ -
INICIO :	17/03/2025		
SUSPENSION 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A	**VALOR TOTAL:**	$ 4.135.056.075,00
VENCIMIENTO:	16/11/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		PORCENTAJE AVANCE (%)	VALOR PAGADO ACUMULADO
ANTICIPO:	$ -	0,00%	$ -
PARCIAL 1:	$ -	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -	0,00%	**PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)**
PARCIAL 3:	$ -	0,00%	0,00%
FINAL:	$ -	0,00%	

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODODEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D		24,00	$ 157.726,00	$ 3.785.424,00
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4		62,88	$ 56.791,00	$ 3.571.018,08
7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI. E= 0.10MT. INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA		90,93	$ 127.857,00	$ 11.626.037,01
7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS		149,66	$ 35.593,00	$ 5.326.848,38
9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS		18,60	$ 39.259,00	$ 730.217,40
9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)		6,00	$ 206.382,00	$ 1.238.292,00
9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		13,25	$ 200.188,00	$ 2.652.491,00
9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)		0,60	$ 890.152,00	$ 534.091,20
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE		610,74	$ 9.658,00	$ 5.898.526,92
					$ 35.362.945,99
					0,86%

2,00	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	%EJECUTADO / % PROGRA.
ACUMULADO ANTERIOR	32,822%	33,26%	-1,370%
DURANTE EL PERIODO	2,659%	0,86%	
ACUMULADO ACTUAL	35,5%	34,11%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se exigen a cada proveedor los certificados de calidad de los materiales empleados para la ejecución de las actividades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta culminar las actividades de instalaciones de tuberías para iniciar con plantilla

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

De acuerdo a la programación de obra, el proyecto para el fin de la semana 15

Se avanzó en actividades complementarias. Instalcion de acero de zapata y tanque elevado

Se realizan actividades de pañete hipermeabilizado

Se avanza en actividades de instalcion de enchapes

Se avanza en actividades de excavacion para zapta de 2.00x2.00 para tanque elevado No se presentaron accidentes laborales.


Se anexa registro fotográfico




PAÑETE DE MUROS



GUARDAESCOBA



ACERO DE REFUERZO TANQUE ELEVADO



PAÑETE DE MUROS

Kamal Bejarano F

KAMAL BEJARANO FERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INFORMES DE AVANCE DE OBRA
REPORTE SEMANAL

CÓRDOBA OBRA Bien

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14/04/2025	SEMANA No. :	16	DEL	30/06/2025	HASTA	6/07/2025

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002			
REP. LEGAL:	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ	VALOR INICIAL:	$	4.135.056.075,00
CONTRATO No.:	SI-LP -002-2024			
PLAZO INICIAL:	8 MESES			
PLAZO ADICIONAL:	N/A	ADICIONES:	$	-
PLAZO TOTAL:	8 MESES			
INICIO :	17/03/2025			
SUSPENSION 1:	N/A	VALOR TOTAL:	$	4.135.056.075,00
REINICIO 1:	N/A			
VENCIMIENTO:	16/11/2025			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		PORCENTAJE AVANCE (%)	VALOR PAGADO ACUMULADO
ANTICIPO:	$ -	0,00%	$ -
PARCIAL 1:	$ -	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -	0,00%	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)
PARCIAL 3:	$ -	0,00%	0,00%
FINAL:	$ -	0,00%	

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODODEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D	M2	1,00	$ 60.002,00	$ 60.002,00
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	560,55	$ 56.791,00	$ 31.834.195,05
7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	102,97	$ 35.593,00	$ 3.665.011,21
9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	4,20	$ 1.020.946,00	$ 4.287.973,20
9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	14,49	$ 177.056,00	$ 2.565.541,44
9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	12,00	$ 403.099,00	$ 4.837.188,00
9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANGUE	KG	205,09	$ 9.658,00	$ 1.980.759,22
					$ 49.230.670,12
					1,19%

2,00	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	%EJECUTADO / % PROGRA.
ACUMULADO ANTERIOR	35,481%	34,11%	-6,221%
DURANTE EL PERIODO	6,042%	1,19%	
ACUMULADO ACTUAL	41,5%	35,30%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se exigen a cada proveedor los certificados de calidad de los materiales empleados para la ejecución de las actividades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta culminar las actividades de instalaciones de tuberias para iniciar con plantilla

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES


De acuerdo a la programación de obra, el proyecto para el fin de la semana 16

Se avanzó en actividades complementarias. Se realizaron actividades de armado de acero para vigas de cimentacion y estructuras

Se realizan actividades de instalacion de cinta pvc en placa de fondo de tanques

Se avanza en actividades de sinstalaciones de tuberia sanitaria y puntos electricos

Se avanza en actividades de excavacion manual para zapatas No se presentaron accidentes laborales.




PLANTILLA EN CONCRETO



COLUMNA EN CONCRETO TANQUE ELEVADO



PAÑETE DE MUROS



RAMPAS DE ACCESO

Kamal Bejarano F

KAMAL BEJARANO FERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INFORMES DE AVANCE DE OBRA
REPORTE SEMANAL

CÓRDOBA OBRA Bien

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14/04/2025	SEMANA No. :	17	DEL	7/07/2025	HASTA	13/07/2025

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002		
REP. LEGAL:	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ		
CONTRATO No.:	SI-LP -002-2024	**VALOR INICIAL:**	$ 4.135.056.075,00
PLAZO INICIAL:	8 MESES		
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO TOTAL:	8 MESES		
INICIO :	17/03/2025		
SUSPENSION 1:	N/A	**VALOR TOTAL:**	$ 4.135.056.075,00
REINICIO 1:	N/A		
VENCIMIENTO:	16/11/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		PORCENTAJE AVANCE (%)	VALOR PAGADO ACUMULADO
ANTICIPO:	$ -	0,00%	$ -
PARCIAL 1:	$ -	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -	0,00%	**PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)**
PARCIAL 3:	$ -	0,00%	0,00%
FINAL:	$ -	0,00%	

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODODEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4		234,58	$ 56.791,00	$ 13.321.805,62
10,03	ye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3		36,00	$ 1.246.819,00	$ 44.885.484,00
10,04	cluye Tubería EMT, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauch		117,00	$ 624.202,00	$ 73.031.634,00
10,05	uye Tubería EMT, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauche		30,00	$ 945.986,00	$ 28.379.580,00
10,09	MINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tubería PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquill		12,51	$ 147.633,00	$ 1.846.888,83
10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado C		6,00	$ 202.067,00	$ 1.212.402,00
					$ 162.677.794,45
					3,93%

2,00	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	%EJECUTADO / % PROGRA.
ACUMULADO ANTERIOR	41,523%	35,72%	-6,682%
DURANTE EL PERIODO	4,813%	3,93%	
ACUMULADO ACTUAL	46,3%	39,65%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se exigen a cada proveedor los certificados de calidad de los materiales empleados para la ejecución de las actividades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta culminar las actividades de instalaciones de tuberías para iniciar con plantilla

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

De acuerdo a la programación de obra, el proyecto para el fin de la semana 17


Se avanzó en actividades complementarias. de pañete hipermeabilizado

Se redizan actividades de instalacion de tubería electrica


Se avanza en actividades de sinstalaciones de tubería sanitaria y puntos electricos

No se presentaron accidentes laborales.

Se anexa registro fotográfico

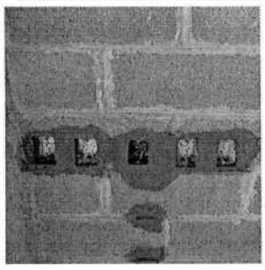

TOMACORRIENTES SALIDAS

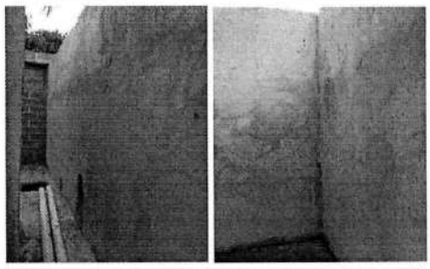

PAÑETE

Kamal Bejarano F

KAMAL BEJARANO FERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

INFORMES DE AVANCE DE OBRA
REPORTE SEMANAL

CÓRDOBA OBRA Bien

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14/04/2025	SEMANA No.:	18	DEL	14/07/2025	HASTA	20/07/2025

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002		
REP. LEGAL:	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ	VALOR INICIAL:	$ 4.135.056.075,00
CONTRATO No.:	SI-LP -002-2024		
PLAZO INICIAL:	8 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
PLAZO TOTAL:	8 MESES	VALOR TOTAL:	$ 4.135.056.075,00
INICIO :	17/03/2025		
SUSPENSION 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
VENCIMIENTO:	16/11/2025		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		PORCENTAJE AVANCE (%)	VALOR PAGADO ACUMULADO
ANTICIPO:	$ -	0,00%	$ -
PARCIAL 1:	$ -	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -	0,00%	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)
PARCIAL 3:	$ -	0,00%	0,00%
FINAL:	$ -	0,00%	

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODODEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
11,17	CESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) , REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1	M2	6,00	$ 157.726,00	$ 946.356,00
11,18	SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTO	M2	130,40	$ 281.430,00	$ 36.698.472,00
11,19	N DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013. INCLUYE PINTURA ANTICORI	KG	700,70	$ 22.867,00	$ 16.022.906,90
11,20	AS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A	KG	417,14	$ 18.468,00	$ 7.703.741,52
11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	124,30	$ 5.611,00	$ 697.447,30
					$ 62.068.923,72
					1,50%

2,00	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	%EJECUTADO / % PROGRA.
ACUMULADO ANTERIOR	46,330%	39,24%	-6,089%
DURANTE EL PERIODO	0,500%	1,50%	
ACUMULADO ACTUAL	46,8%	40,74%	

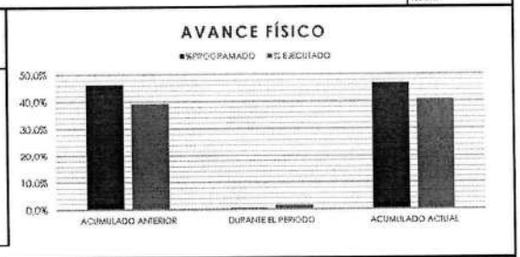

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se exigen a cada proveedor los certificados de calidad de los materiales empleados para la ejecución de las actividades

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta culminar las actividades de instalaciones de tuberias para iniciar con plantilla

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

De acuerdo a la programación de obra, el proyecto para el fin de la semana 13


Se avanzó en actividades complementarias. Se realizaron actividades de armado de acero para vigas de cimentacion y estructuras

Se realizan actividades de instalacion de cinta pvc en placa de fondo de tanques

Se avanza en actividades de sinstalaciones de tuberia sanitaria y puntos electricos

Se avanza en actividades de excavacion manual para zapatas No se presentaron accidentes laborales.


Se anexa registro fotográfico

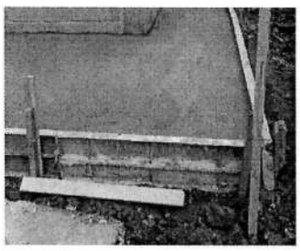

RAMPA DE ACCESO



INSTALACION DE CUBIERTA

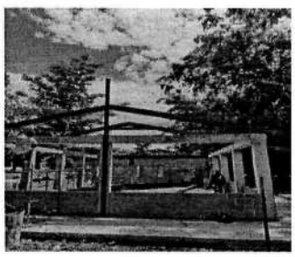

INSTALACION DE PERFILERIA



REMOCION DE PINTURA

Kamal Bejarano F

KAMAL BEJARANO FERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ANEXO 4. ACTAS SUSCRITAS

ANEXO 5. PLANILLAS

Dirección: Cra9 #6-36 Ofi202 **Teléfono:**3217764749 **E-Mail:** consorcioinfraeducativo022@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9490018861	9490018861	E	2025/07/16	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	21	$10,126,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067940218	AGAMEZ ANDY	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	1066735527	ALEAN NEVER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1233340397	ALVAREZ JOSE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	1064976924	ARGUELLO CESAR	231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1003100819	ARROYO LEYDER	230301	8	$379,600	$60,800	EPS042	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
6	CC	78025167	AYALA JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1020789957	BEJARANO KAMAL	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
8	CC	78748099	CASTRO RICARDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS009	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	1073813229	COGOLLO CARMELO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	1126245995	CONTRERAS EDINSON	230301	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
11	CC	1067942893	CORRALES SHARON	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1003457959	FRANCO OSCAR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	11165809	GUERRA RUBERCINDO	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC07	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
14	CC	15092179	MEDRANO MAXIMO	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	1073825958	MENDOZA SAIBIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	8374898	MERCADO MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
17	CC	11171831	PEREZ JORGE	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
18	CC	7382988	PLAZA OLIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	19191822	RAMIREZ HECTOR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	15031979	ROJAS ALCIBIADES	231001	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
21	CC	1068656210	RUIZ JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
22	CC	1063719364	RUIZ YEISON	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC	1073155444	TORRES HERIBERTO	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	6888826	VERGARA HERNAN		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	72237694	VERGARA JHOJAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					$31,582,650	$5,054,100			$33,006,150	$1,321,300			$33,006,150	$1,321,300			$33,006,150	$2,298,000		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/08/12 03:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,054,100	$66,500	$0	$5,120,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$972,000	$12,800	$0	$984,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$6,000	$0	$461,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,623,100	$34,500	$0	$2,657,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,003,400	$13,200	$0	$1,016,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,298,000	$30,200	$0	$2,328,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$2,298,000	$30,200	$0	$2,328,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,321,300	$17,400	$0	$1,338,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$1,321,300	$17,400	$0	$1,338,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	$1,321,300	$17,600	$0	$1,338,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$142,500	$1,900	$0	$144,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$15,200	$200	$0	$15,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$144,400	$1,900	$0	$146,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$800	$0	$57,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$414,200	$5,500	$0	$419,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$137,000	$1,800	$0	$138,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,500	$0	$115,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$217,000	$2,900	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$1,100	$0	$81,100
TOTAL				25	$9,994,700	$131,700	$0	$10,126,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/08/12 03:06 PM

ANEXO 6. BITACORA

Martes 17 de Junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretè

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Muro de impermeabilizado con mortero de 1:4
- Cubierta tipo sandwich en acero laminado A300 grado C color blanco con aislante en poliestireno 18 - 20 mm.
- S/I de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 MTS color blanco o beige

Andy Agamez.
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 27 de Junio de 2023

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramientas de punta

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros con mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich en acero luminado A500 grado
- color blanco con aislante en poliestireno .48-20mm
- S/T de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 MTs color blanco o beige

Jhon Cadavid.
Residente de obra

Yoyolibe Eljach
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 17 de Junio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibra de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros con mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich en acero laminado A500 grado C Color blanco con aislante en poliestireno 18-20 mm
- S/I de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 MTS color blanco o beige

Residente de obra

Yuyelibe Eljuri
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

120

Martes 17 de junio de 2025

Institución educativa: San José de Montes sede principal
Municipio de Montes

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra:

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque macizo de concreto de 0,10M x 0,20M x 0,40 M y pega con mortero 1:4

Jair Cruz
Residente de obra

Mayulida Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 17 de junio de 2025

Institución educativa: San José de Concelete
Municipio de Concelete

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Relleno del área con material seleccionado compactado
- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque macizo de concreto de 0,40 m x 0,20 m x 0,40 m y pega con mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 psi, e=0,10 MT, incluye malla electrosoldada

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 18 de Junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretá

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo Sandwich 18 mm en acero laminado A500 grado color blanco con aislante en poliestireno 18 - 20 mm
- Alt. de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 MTS color blanco o beige

Andy Agamez
Residente de Obra

Nayulide Eljuch
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 18 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Cienaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich 18 mm en acero laminado A500 grado C color blanco con aislante en poliestireno 19-20 mm
- S/E de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 INV color blanco obeige

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 18 de Junio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander, Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich en acero luminoso A500 grado C color blanco con aislante en poliestireno 18-20 mm.
- S/I de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 MTS color blanca o beige

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 18 de Junio de 2025

Institución educativa: San José sede Montitos sede principal.
Municipio de Montitos

Estado del clima: soleado

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque macizo de concreto de 0,10M x 0,20M x 0,40M y pega con mortero de 1:4

Jwcs
Residente de obra

Yorgelita Espinoza
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 18 de Junio de 2025

Institución educativa: San José de Conalete
Municipio de Conalete

Estado del Clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de Obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Relleno del área con material seleccionado compactado
- Sobrecimiento impermeabilizado → hiladas en bloque macizo de concreto de 0,10M x 0,20M x 0,40M y pega con mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, de 0,10MT, incluye malla electrosoldada

SwCB
Residente de Obra

Yayalibe Espinel
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de Junio de 2023

Institución educativa: Marcelano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Nivel de pantul
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo sanduvich 18 mm en acero laminado A300 grado c color blanco con aislante en poliestireno 18 - 20 mm.
- S/I de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 mts color blanco o beige

Andy Aguilez
Residente de obra

Yaquelin Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 19 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del Clima: Soleado

Personal de Obra

- Residente de Obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich en acero luminoso Asoo grado C color blanco con aislante en poliestireno 18-20 mm
- S/I de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 MTS Color blanco o Seige

Residente de Obra

Nayulide Elgueda
Residente de Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 19 de Junio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rama compactadora
- vibro de pontur
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich en acero luminado A500 grado C color blanco con aislante en poliestireno 18-20 mm
- S/I de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 MTS color blanco o beige

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 19 de Junio de 2025

Institución educativa: San José de Montes sede principal
Municipio de Montes

Estado del clima: soleado

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Pala
- Vibro de punta
- Herramientas menor

Actividades ejecutadas

- Sobrecimiento impermeabilizado e hilada en bloque de macizo de concreto de 0,10M x 0,20M x 0,40M y pega con mortero 1:4

Luis C B
Residente de obra

Yajulith Eljuri
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de Junio de 2025

Institución educativa: San José de Corabota
Municipio de Corabota

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas:

- Relleno del área con material seleccionado compactado
- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque macizo de Concreto de 0,10 M x 0,20 M x 0,40 M y pega con mortero 1:4
- Placa Huella en concreto 3000 PSI, e= 0,10 MT, incluye malla electrosoldada

Juc8
Residente de Obra

Nayuluby Eljuach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 20 de junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich 18mm en acero laminado A500 grado C Color blanco con aislante en poliestireno 12-20 mm
- SIC de piso cerámica antideslizante 0,50x0,50 MTS color blanco o beige

Nayalibe Estrada
Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes 20 de Junio de 2025

Institución educativa Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Revolvedora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en morteros 1:4
- Cobierta tipo sandwich 18 mm en acero luminado A700 grado C color blanco con aislante en poliestireno 18-20 mm
- S/E de piso cerámica antideslizante 0,50x0,50 mts color blanco o beige

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 20 de Junio de 2023

Institución educativa: San José de Montes sede principal
Municipio de Montes

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque macizo de concreto de 0,10 M x 0,20 M x 0,40 M y pega con mortero 1:4

JuCB
Residente de obra

Yazmin Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 20 de Junio de 2025

Institución educativa: San José de Cunucleta
Municipio de Cunucleta

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de Obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramientas menor

Actividades ejecutadas

- Relleno del área con material seleccionado compactado
- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque mac de concreto de 0,10 M x 0,20 M x 0,40 M y pega con mort
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e=0,10 MT, incluye malla electrosoldada

Luis C.B
Residente de obra

Nayalibe Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 21 de Junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretè

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Suministro e instalación sistema puesta a tierra
-

Jornada de limpieza

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 21 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Suministro e instalación sistema puesta a tierra

Jornadas de limpieza

Residente de obra

Yuyuliet Eglees
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Sábado 21 de Junio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede general Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Ramas compactadoras
- Vibro de ganta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Suministro e instalación sistema puesta a tierra

Jornada de limpieza

Residente de obra

Nayulibe Egüez
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Sábado 21 de Junio de 2025

Institución educativa: San José de Maíta sede Principal
Municipio de Maíta

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque macizo de Concreto de 0,10M x 0,20 M x 0,40M y pega con mortero 1:4

Yazulitee Eljach
Residente de interventoría

Residente de obra

Scanned with CamScanner

Sábado 21 de mayo de 2025

Institución educativa: San José de Canaleta
Municipio de Canaleta

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor
-

Actividades ejecutadas

- Relleno del área con material seleccionado compactado
- Sobrecimiento impermeabilizado 3 hiladas en bloque macizo de Concreto de 0,10 M x 0,20 M x 0,40 M y pegas con mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e= 0,10 MT, incluye malla electrosoldada

Sin CE
Residente de obra

Yaqueline Espinach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 23 de Junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceseté

Estado del clima: Soleado

No se realizaron actividades por festivo

Scanned with CamScanner

Lunes 23 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

No se realizaron actividades por festivo

Scanned with CamScanner

Martes 24 de junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en interior 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, E=0,10 MT, incluye malla electrosoldada
- Guardaescoba en cerámica H= 0,10 MTS
- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI

Andy Agamez
Residente de obra

Nayulile Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 24 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e=0,10 M, incluye malla electrosoldada
- Cuneta de escurrimiento en cerámica H= 0,10 MTS
- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI

Residente de obra

Yayulile Elfinch
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 24 de junio de 2023

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- plantilla en concreto 3000 PSI, e=0,10 M, incluye malla electrosoldada
- Guardaescoba en cerámica H=0,10 MTS
- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

348

Miércoles 25 de Junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Pana compactadora
- Vibro de pontón
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e=0,10 MTS, incluye malla electrosoldada
- Guardaescoba en cerámica H=0,10 MTS
- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI.

Andy Agamez.
Residente de Obra

Yuyulide Egfiad
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Miércoles 25 de Junio de 2025

Institución educativa : Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima : soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI , e= 0,10 MTS , incluye malla electrosoldada
- Guardaescoba en cerámica H = 0,10 MTS
- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 25 de Junio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Roma compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e= 0,10 MTS, incluye malla electrosoldada
- Guardaescoba en cerámica H= 0,10 MTS
- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI

Residente de obra

Yuyubeth Eljach
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 26 de Junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Caretá

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de pantos
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Excavación manual para zapata de 2.00 x 2.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo en piedra roja
- Relleno de área con material seleccionado compactado

Ordy Agamez.
Residente de obra

Yaysilda Egljech
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 26 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Excavación manual para zapata de 2.00 x 2.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajón
- Relleno del área con material seleccionado compactado

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 26 de Junio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: soleado

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Excavación manual para zapata de 2.00 x 2.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajón
- Relleno del área con material seleccionado compactado

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 27 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Excavación manual para zapata de 2.00 x 2.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajón
- Relleno del área con material seleccionado compactado

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 27 de Junio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Excavación manual para zapatas de 2.00 x 2.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapatas en piedra Rajón
- Relleno del área con material seleccionado compactado

Residente de obra

Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

54

Viernes 27 de Junio de 2025

Institución educativa: Marcelino Polo
Municipio de Ceretè

Estado del clima: ~~Estado~~ Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividad(es) ejecutada(s)

- Excavación manual para zapata de 2.00 x 2.00 MTS
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra tajón
- Relleno del área con material seleccionado compactado

Andy Agamez.
Residente de Obra

Nayalibe Eljuri
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Sábado 28 de junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretá

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Solado en concreto e=0,05 MTS de 14 MPa (2000 PSI)
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para columna y zapata tanque

Andy Agamez.
Residente de obra

Yaryulile Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

XV

Sábado 28 de Junio de 2025

Institución educativa: Manuel Tidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Solado en concreto e=0,05 mts de 14 MPa (2000 PSI)
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para Columna y zapata tanque

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 28 de junio de 2025

Institución educativa : Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima : Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Solado en concreto e=0,05 mts de 14 MPa (2000 PSI)
- Acero de refuerzo fy = 420 MPa para columnas y zapatas tanque

Ornella.
Residente de obra

Yuyulibe Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 20 de Junio de 2025

Institución educativa : Marceliano Polo
Municipio de Carolé

Estado del clima : lluvioso

No se realizaron actividades por festivo

Scanned with CamScanner

Lunes 30 de Junio de 2023

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Nuboso

No se realizaron actividades por festivo

Scanned with CamScanner

Lunes 30 de Junio de 2023

Institución educativa: Santa Teresita sede General santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: lluvioso

No se realizaron actividades pedagogicas

Martes 1 de Julio de 2025

Institución educativa: Marcelliano Polo
Municipio de Ceretá

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acero en concreto de 3000 PSI
- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e=0,10 MT, incluye malla electrosoldada
- Guarda escoba en cerámica H=0,10 MTS

Andy Gomez
Residente de obra

Yuyulila Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 1 de Julio de 2025

Institución educativa: Marco Tidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficiante
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI
- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantillas en concreto 3000 PSI, e = 0,10 MT, incluye malla electrosoldada
- Cuadro de recibo en cerámica H = 0,10 MTS

Yayulibe Eljach
Residente de interventoría

Residente de obra

Scanned with CamScanner

Martes 1 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI
- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e = 0,10 MTS, incluye mallas electrosoldadas
- Cuneta escuba en cerámica H = 0,10 MTS

Residente de obra

Mayelibe Eljuch
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 2 de Julio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretè

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI
- Pared impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI; e = 0,10 MTS, incluye malla electrosoldada
- Cuarda escoba en cerámica H = 0,10 MTS

Andy Agamez.
Residente de obra

Magalitee Eljuri
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 2 de Julio de 2025

Institución educativa : Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima : lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI
- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Placa piso en concreto 3000 PSI, e= 0,10 MT, incluye malla electrosoldada
- Guardaescoba en cerámica H = 0,10 MTS

Yaguleiber Egüez
Residente de obra

Yaguleiber Egüez
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 2 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto 3000 PSI
- Pared impermeabilizada para muro en mortero 1:4
- Plantilla en concreto 3000 PSI, e=0,10 MT, incluye malla electrosoldada
- Guardaescoba en cerámica H=0,10 MTS

Residente de obra

Yuyubibe Eljuch
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 4 de Julio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Zapata de 2.00 x 2.00 x 0.35 MTS en concreto de 21 MPa
- Columna de 0,40 x 0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placas en concreto de 2,00 x 2,00 x 0.A de 3000 PSI

Ordy Ospino
Residente de obra

Yuyulida Eljuri
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 11 de Julio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Renta computadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Zapata de 2.00 x 2.00 x 0.35 MTS en concreto de 21 MPa
- Columna de 0,40 x 0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0.17 de 3000 PSI

Residente de obra

Yaqueline Ujueta
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 11 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander, Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Zapata de 2.00 x 2.00 x 0.35 MTS en concreto de 21 MPa
- Columna de 0,40 x 0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0,17 de 3000 PSI

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 5 de Julio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretá

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Zapata de 2.00 x 2.00 x 0.35 MTS en concreto de 21 MPa
- Columna de 0,40 x 0,40 MTs en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0.17 de 3000 PSI

Andy Agamez
Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 5 de Julio de 2025

Institución educativa: Marco F. Del Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Zapata de 2.00 x 2.00 x 0.35 MTS en concreto de 21 MPa
- Columna de 0,40 x 0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placa en concreto de 2.00 x 2.00 x 0.17 de 3000 PSI

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 5 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Zapatas de 2,00 x 2,00 x 0.35 MTS en concreto de 21 MPa
- Columnas de 0,40 x 0,40 MTS en concreto de 21 MPa
- Placas en concreto de 2.00 x 2.00 x 0.17 de 3000 PSI.

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 7 de Julio de 2025

Institución educativa: Mario Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Salidas para ventiladores de techo
- salidas para luminarias de techo y exteriores
- Salidas para luminarias de emergencia y exigua salidas
- Suministro e instalación acometidas
- Salidas para TV

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 7 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilización para muros en madera lit
- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminarias en techo y exteriores
- Salida para luminarias de emergencia y aviso salida
- Suministro e instalación acometidas
- Salida para TV.

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 8 de Julio de 2025

Institución educativa : Marceliano Polo
Municipio de Cereté

Estado del Clima : Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Nivel de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminaria en techo y exteriores
- Salidas para luminarias de emergencia y avisa salidas
- Suministro e instalación acometida
- Salida para TV

Prof Agamez.
Residente de Obra

Yuyeidee G Lynch
Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 8 de Julio de 2025

Institución educativa: [illegible]
Municipio de Cúcuta

Estado del Clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de Obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Puñete impermeabilizado para muro en mortero 1:4
- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminaria en techo y exteriores
- Salida para luminaria de emergencia y aviso salida
- Suministro e instalación acometidas
- Salida para TV

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 8 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita Sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Salida para ventilador de techo
- Salidas para luminarias en techo y exteriores
- Salidas para luminarias de emergencia y doble salida
- Suministro e instalación acometidas
- Salidas para TV

Residente de obra

Nayalith Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 9 de Julio de 2025

Institución educativa : Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima : Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Salidas para ventiladores de techo
- Salidas para luminarias en techo y exteriores
- Salidas para luminarias de emergencia y aviso salidas
- Suministro e instalación acometida
- Salida para TV

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

Miércoles 4 de Junio de 2025

Institución educativa: Sede Terreritos sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Nuevo

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminaria en techo y exteriores
- Salida para luminaria de emergencia y aviso salida
- Suministro en instalación acometida
- Salidas para TV

Residente de obra

Nayelibe Eljach
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 10 de Julio de 2025

Institución educativa: Manelvano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: Lluvioso

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Soldadura para ventilador de techo
- Soldadura para luminaria en techo y exteriores
- Soldadura para luminaria de emergencia y aviso bafle
-

Reunión de comité, director de obra y representante legal de interventoría, para verificar instalaciones eléctricas

Andy Agamez.
Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 10 de Julio de 2025

Institución educativa: Manuel Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del Clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salida para ventilador de techo
- Salidal para luminaria en techo y exteriores
- Salida para luminaria de emergencia y cruce salida
-

Reunión de comité, director de obra y representante legal de Interventoria, para verificar instalaciones eléctricas

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Jueves 10 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Lluvioso

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salida para ventilador de techo
- Salidas para luminaria en techo y exteriores
- Salida para luminaria de emergencia y ovico salidas
-

Reunión de comité, director de obra y representante legal de interventoria para verificar instalaciones electricas.

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

330

Viernes 11 de Julio de 2025

Institución educativa: Marcelano Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: Nublado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminaria en techo y exteriores
- Salida para Luminaria de emergencia y aviso salida
-
-
-

Andy Ogoni.
Residente de obra

Nazalido Eljach
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 11 de julio de 2025

Institución educativa : Marco Fidel Suarez
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima : lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salidas para ventiladur de techo
- Salidas para luminarias en techo y exteriores
- Salidas para luminarias de emergencia y aviso salida
-
-
-

Residente de obra

Residente de interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 11 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander
Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminarias en techo y exteriores
- Salida para luminaria de emergencia y aviso salida
-
-
-

Residente de obras

Yaydelet Eljach
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

ANEXO 7. INFORME PGIO

Sábado 12 de Julio de 2025

Institución educativa: Marcelino Polo
Municipio de Cereté

Estado del clima: lluvioso

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminaria en techo y exteriores
- Salida para luminaria de emergencia y aviso salida
-

Jornada de limpieza
-

Andy Ogeer
Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Sábado 12 de julio de 2025

Institución educativa: Manuel José del Guarey
Municipio de Ciénaga de Oro

Estado del clima: Nuevo

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salida para ventilador de techo
- Salida para luminaria en techo y exteriores
- Salida para luminaria de emergencia y alarma salida
-

Formaleta de limpieza
-

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 12 de Julio de 2025

Institución educativa: Santa Teresita sede General Santander/ Municipio de San Pelayo

Estado del clima: Lluvioso

Personal de Obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Roza compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Salida para ventilador de techo
- Salidas para luminaria en techo y exteriores
- Salidas para luminaria de emergencia y aviso salida.
-

Jornada de limpieza

-

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Lunes 04 de julio de 2025

Institución educativa: San José de Candelaria
Municipio de Candelaria

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punto
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI
- Suministro, fabricación e instalación de cerchas con perfiles PHR C encartonadas según diseño estructural.
- S/I correas con perfiles PHR C según diseño estructural

JuCE
Residente de obra

Yuyulitee Echeverri
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 15 de julio de 2025

Institución educativa: San José de Conalete
Municipio de Conalete

Estado del clima: soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rama compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI
- Suministro, fabricación e instalación de cerchas con perfiles PHR-C encargonados según diseño estructural.
- S/E correas con perfiles PHR C según diseño estructural

JuCE
Residente de obra

Nayulita Eljuch
Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Miércoles, 16 de Julio de 2025

Institución educativa: San José de Canalete
Municipio de Canalete

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampas de acceso en concreto de 3000 PSI
- Suministro, fabricación e instalación de cerchas con perfiles PHR C encajonadas según diseño estructural
- S/L correas con perfiles PHR C según diseño estructural

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 17 de Mio de 2025

Institución educativa: San José de Corralete
Municipio de Corralete

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI
- Cubierta Tipo sandwich 18-mm en acero Galvanizado ASTM grado C Color blanco con aislante en poliestireno 19-20 mm.

Reunión de comité, director de obra y representante legal de interventoría para evaluar el avance de los diferentes frentes.

Residente de obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 18 de junio de 2025

Institución educativa: Marceliano Polo
Municipio de Ceretá

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo Sandwich 18 mm en acero laminado A500 grado color blanco con aislante en poliestireno 17-18-20 mm
- Suministro de piso cerámico antideslizante 0,50x0,50 MTS color blanco o beige

Andy Agamez
Residente de Obra

Nayulibe Eljuch
Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 18 de Junio de 2025

Institución educativa: Marco Fidel Suarez
Municipio de Cienaga de Oro

Estado del clima: Soleado

Personal de obra

- Residente de obra
- Maestro
- Oficial
- Ayudante

Maquinaria y equipo

- Rana compactadora
- Vibro de punta
- Herramienta menor

Actividades ejecutadas

- Pañete impermeabilizado para muros en mortero 1:4
- Cubierta tipo sandwich 18 mm en acero laminado A500 grado C color blanco con aislante en poliestireno 19-20 mm
- S/E de piso cerámica antideslizante 0,50 x 0,50 INTI color blanco beige

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

INFORME DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024

PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS 4

2.1. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
3. ALCANCE DEL INFORME 4

4. JUSTIFICACIÓN 5

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5

5.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 5
5.1.1. LOCALIZACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO 6
5.1.2. PLANTA DE PERSONAL 7
5.1.3. ORGANIGRAMA 7
5.2. ACTIVIDADES GENERALES CONSTRUCTIVAS PARA EL PROYECTO 8
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9

6.1. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SG-SST 9
6.2. AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9
6.3. PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9
6.4. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 9
6.5. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
6.6. NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS 10
6.7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN 10
6.8. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO 11
6.9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO 11
6.10. AUSENTISMO 12
6.11. CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13
6.12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 13
6.13. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 21
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 21

7.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA 21
7.2. MANEJO DE MATERIALES 22
7.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 22
7.3.1. ORDEN Y ASEO 24
7.4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 24
7.4.1. UNIDADES SANITARIAS 26
7.5. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 26
7.6. ESTABLECIMIENTO DE PUNTO DE HIDRATACIÓN 27
7.7. PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 27
8. CONCLUSIONES 28

9. ANEXOS 28

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) constituye una herramienta fundamental para la planificación y ejecución eficiente de proyectos de construcción. El presente informe tiene como propósito presentar los resultados del diseño e implementación del PGIO presentado por el contratista **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002**, en el marco del proyecto cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**.

La implementación del PGIO en este contrato de obra tiene como objetivos principales: asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto, mitigar los impactos ambientales, y garantizar la conformidad con la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se busca cumplir con los estándares de calidad necesarios para la supervisión y control efectivo de las actividades programadas.

El presente Informe Mensual **No. 4** describe los resultados alcanzados, las actividades ejecutadas y los controles aplicados durante el periodo comprendido entre el **17 de junio y el 16 de julio de 2025.**

En conclusión, este informe refleja un esfuerzo articulado orientado a lograr una gestión integral de la obra, cumplir con los objetivos establecidos y los más altos estándares de calidad y seguridad, y reducir al mínimo los impactos adversos sobre el ambiente.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las actividades planificadas o programadas en el Plan de Gestión Integral de Obra, para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y promover los impactos positivos asociados a la ejecución del proyecto cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Propender que durante la ejecución del proyecto se ejecuten las actividades planeadas del SG-SST.
- Presentar la ejecución de los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, en el desarrollo de las diferentes actividades ejecutas en el cumplimiento del proyecto.
- Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales que se pueden generar en el desarrollo de las diferentes actividades dentro del proyecto.
- Capacitar al personal vinculado al proyecto en materia ambiental y seguridad de acuerdo con el avance de obra.

3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe, en el marco del Sistema Integral de Gestión, dentro de su alcance tiene en cuenta la legislación aplicable al proyecto, los requisitos técnicos como especificaciones generales y específicas, las normas técnicas aplicables, así como las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe contempla todas las actividades ejecutadas en las diferentes etapas del proyecto e incluye todos los procedimientos, instructivos, registros, metodologías y controles necesarios para el correcto desarrollo de este, así como las medidas de manejo, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan generarse en las actividades de obra del proyecto.

4. JUSTIFICACIÓN

A partir de la suscripción del **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-002-2024** celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** y el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002**, se da inicio a la ejecución del proyecto cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** a través de la realización de las actividades programadas aplicables al proyecto, con el fin de proteger y garantizar el uso adecuado de los recursos que permitan minimizar los riesgos para la ocurrencia de accidentes de trabajo, impactos negativos al medio ambiente, y el incumplimiento de la programación de obra.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

5.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Se describe a continuación la información general del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** asociada con el proyecto **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
NIT	901915670-0
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No:	SI-LP-002-2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
INTERVENTOR:	ANTICA SAS BIC
PLAZO:	OCHO (8) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($4.135.134.915,00)

Tabla. Descripción contrato de obra

5.1.1. LOCALIZACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se ubica en diez diferentes municipios del departamento de Córdoba descritos a continuación:

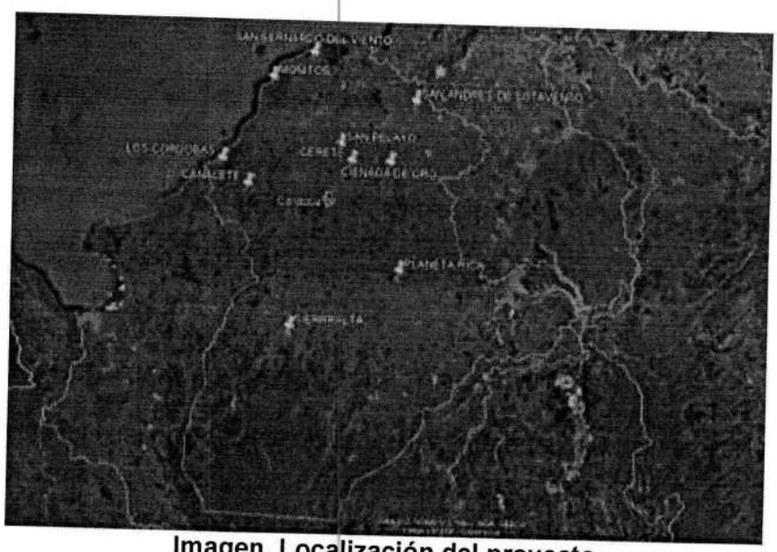


Imagen. Localización del proyecto

1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ**
2. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER - SAN PELAYO**
3. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ - CIÉNAGA DE ORO**
4. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL - MOÑITOS**
5. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN - TIERRALTA**
6. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA - PLANETA RICA**
7. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO - SAN BERNARDO DEL VIENTO**
8. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE - CANALETE**
9. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO**
10. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO - LOS CÓRDOBAS**


5.1.2. PLANTA DE PERSONAL

Planta de Personal que cumple con los pliegos:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
DIRECTOR DE OBRA	BEJARANO FERNANDEZ KAMAL AUGUSTO
RESIDENTE DE OBRA I	AGAMEZ GENEY ANDY MIGUEL
RESIDENTE DE OBRA II	ALVAREZ ORTEGA JOSE CARLOS
RESIDENTE DE OBRA III	CASTRO ESCOBAR RICARDO JAVIER
INGENIERO ELÉCTRICO	RAMIREZ LIBREROS HECTOR
INGENIERO SANITARIO Y AMBEINTAL	CORRALES MARTINEZ SHARON MELISA

5.1.3. ORGANIGRAMA

La estructura organizacional del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** se presenta a continuación:

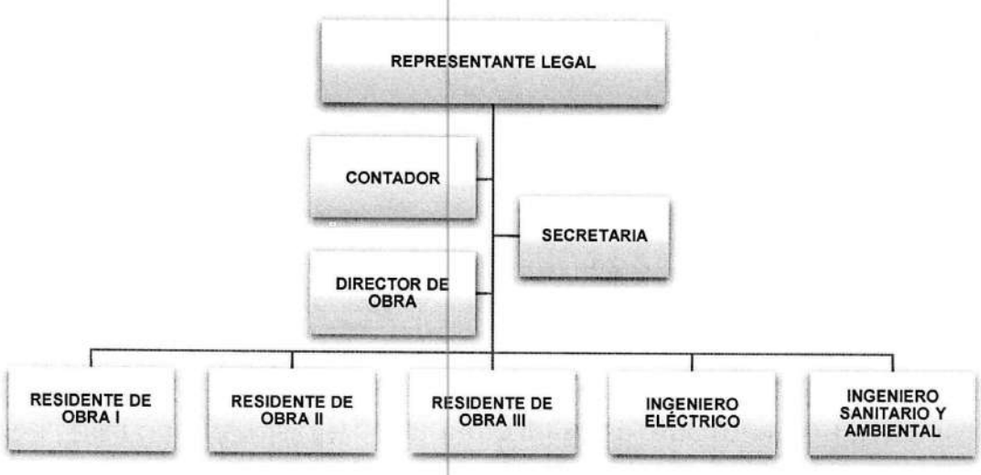

5.2. ACTIVIDADES GENERALES CONSTRUCTIVAS PARA EL PROYECTO

A continuación, se relacionan las actividades constructivas a ejecutar durante el desarrollo del proyecto:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UBICACIÓN	INTERVENCIONES A REALIZAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO	**CERETÉ**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER	**SAN PELAYO**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ	**CIÉNAGA DE ORO**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL	**MOÑITOS**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN	**TIERRALTA**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA	**PLANETA RICA**	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO	**SAN BERNARDO DEL VIENTO**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE	**CANALETE**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	**SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO	**LOS CÓRDOBAS**	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR (CUBIERTAS, PINTURAS Y RESANES, RESANES DE MUROS, PISOS, OTROS.

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se desarrollan las actividades del plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los riesgos, el plazo contractual, los recursos financieros, humanos y físicos.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas desde cada uno de los programas anexos al Plan SST.

6.1. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SG-SST

Se realizó la designación del responsable de diseñar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. **Anexo *ACTA DESIGNACIÓN RESPONSABLE SG-SST* presentado en PGIO.**

6.2. AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la afiliación de cada trabajador a ARL, EPS, fondo de pensiones (AFP), y caja de compensación. Durante el periodo no se presentó ingreso de nuevo personal.

6.3. PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realiza el pago de seguridad social de acuerdo con la fecha límite correspondiente al mes de presentación del presente informe.

ANEXO NO. 1 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Se realizan los exámenes médicos ocupacionales de ingreso a todo trabajador cada vez que se presenta inicio de relación laboral. Durante el periodo no se presentó ingreso de nuevo personal.

6.5. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realiza proceso de inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores de obra al momento de ingresar, en el que se socializa el programa de SST y, se establecen los compromisos y responsabilidades de estos al momento de ejecutar las distintas tareas asignadas. Durante el periodo no se presentó ingreso de nuevo personal.

6.6. NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS

Se realiza notificación de los riesgos a los que se encuentran expuestos a cada uno de los trabajadores nuevos vinculados al proyecto.

6.7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Se realiza la entrega y/o reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación a todo el personal, el cual se supervisa y capacita sobre el uso adecuado de estos y la obligación de portarlos durante toda la jornada laboral.

La entrega de EPP y dotación se realiza al momento de ingresar un trabajador y en los casos que se requiera reposición de estos por daños o desgaste.

La entrega de EPP y dotación se realiza de acuerdo con la exposición identificada en la Matriz de EPP.

ANEXO NO. 2 ACTA ENTREGA DE EPP Y/O DOTACIÓN

6.8. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo no se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo.


REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR PERIODO	
PERIODO	**No DE ACCIDENTES**
MAR-ABR	0
ABR-MAY	0
MAY-JUN	0
JUN-JUL	0
TOTAL	**0**

6.9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Se registran por periodo los indicadores de accidentalidad y ausentismo durante la etapa de ejecución del proyecto. La medición de estos se ilustra a continuación:


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO											
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	PERIODICIDAD	RESULTADOS								
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo.	MENSUAL	0	0	0	0					
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	$\frac{\text{No. de días de incapacidad por Accidente de Trabajo en el mes + número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo.	MENSUAL	0	0	0	0					
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica.	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{Número de días programados en el mes}} \times 100$	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	MENSUAL	0%	0%	0%	0%					
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo.	$\frac{\text{No. de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo Z}} \times 100.000$	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z.	ANUAL	0	0	0	0					
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo.	$\frac{\text{No. de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo Z}} \times 100.000$	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z.	ANUAL	0	0	0	0					
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año.	$\frac{\text{No. De Accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes del Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales.	ANUAL	0%	0%	0%	0%					

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE FRECUENCIA, SEVERIDAD Y AUSENTISMO POR PERIODO.

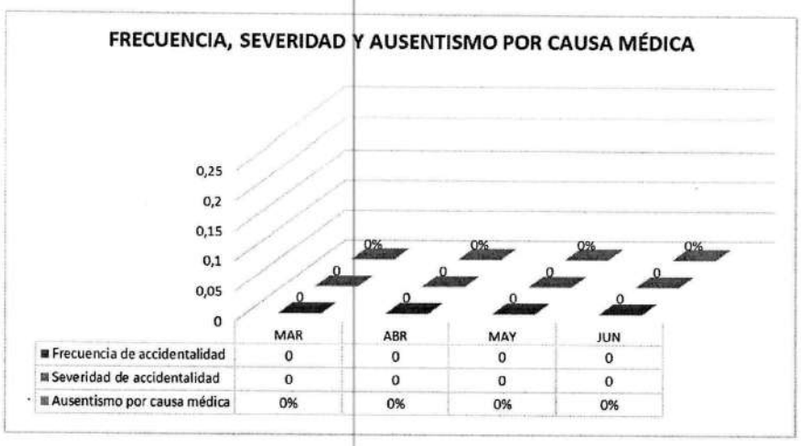

	MAR	ABR	MAY	JUN
Frecuencia de accidentalidad	0	0	0	0
Severidad de accidentalidad	0	0	0	0
Ausentismo por causa médica	0%	0%	0%	0%

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE PREVALENCIA, INCIDENCIA Y PORPORCIÓN DE AT MORTALES.

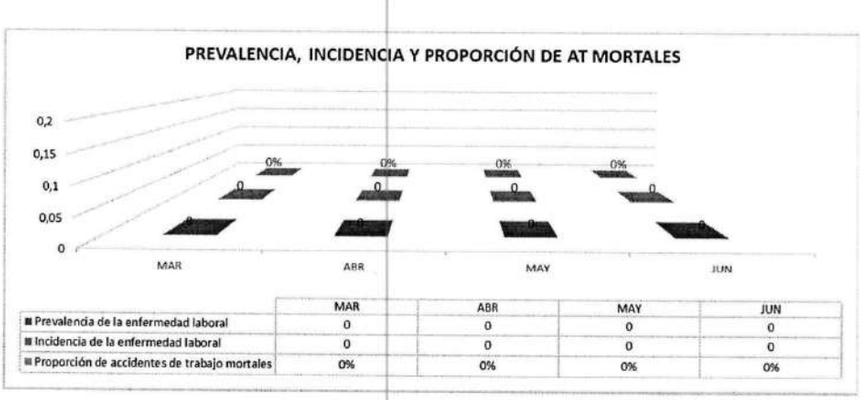


	MAR	ABR	MAY	JUN
Prevalencia de la enfermedad laboral	0	0	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	0	0	0	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	0%	0%	0%	0%

6.10. AUSENTISMO

Durante el periodo no se presentaron ausentismos del personal por enfermedad general o laboral, permisos, y/o sin justa causa.

6.11. CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo se realizó capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal vinculado al proyecto.

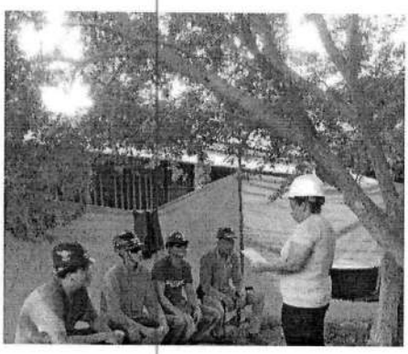

ANEXO NO. 3 CAPACITACIÓN SST

6.12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante el periodo se realizaron inspecciones de seguridad relacionadas a continuación:

- Elementos de Protección Personal
- Orden y Aseo
- Camilla
- Extintor
- Botiquín
- Herramientas y Equipos


ANEXO NO. 4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD


Registro fotográfico – Inspecciones de Seguridad





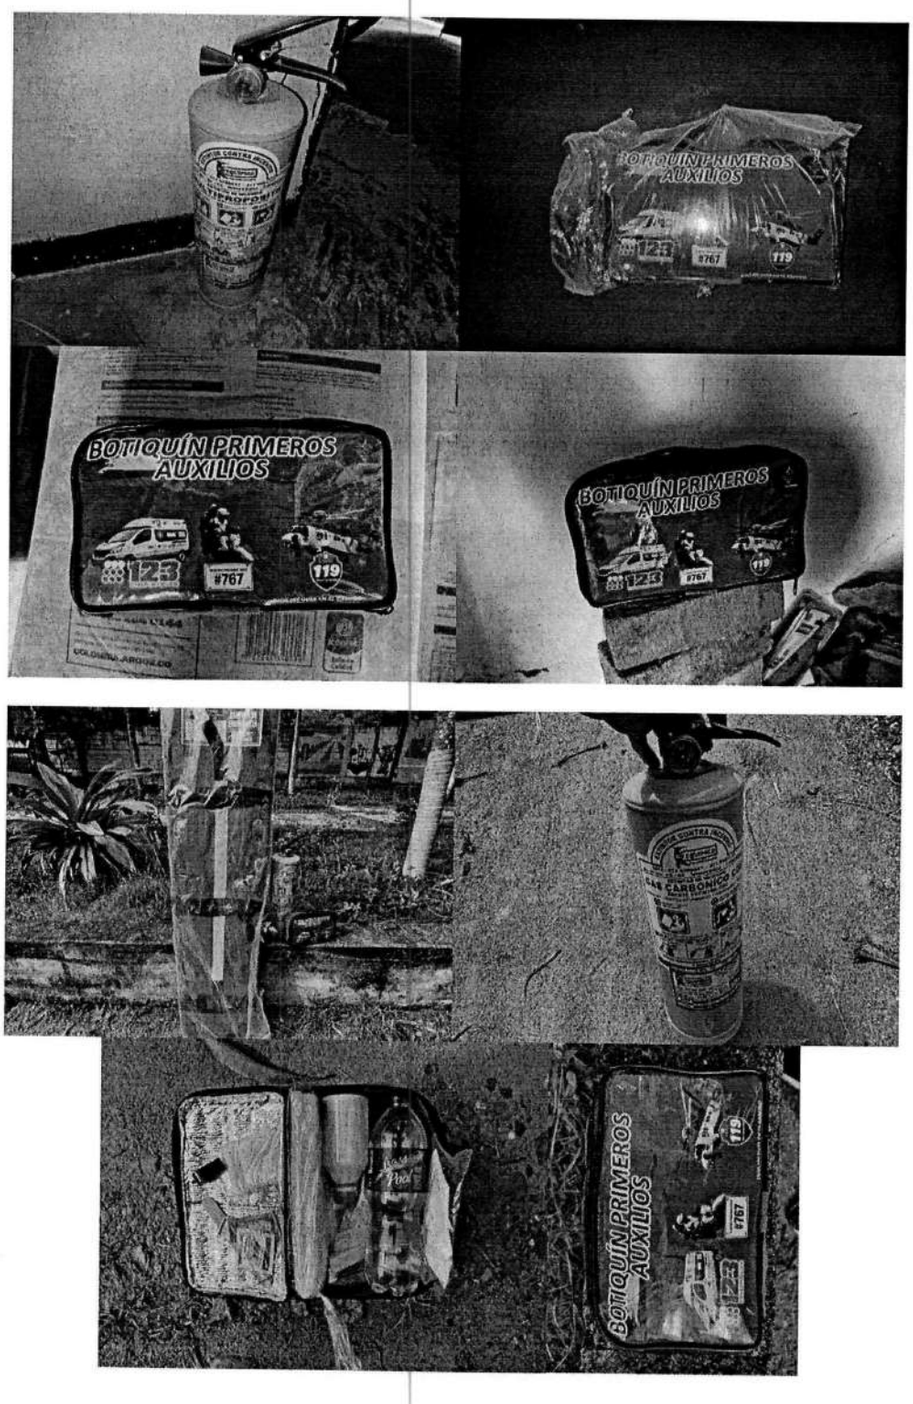



BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
123
#767
119

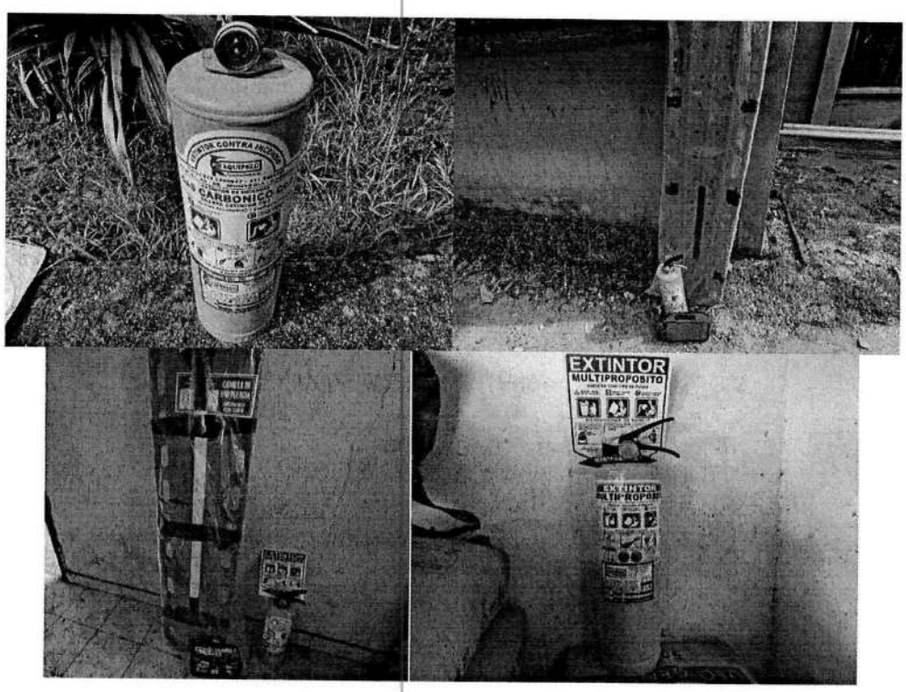


Se evidencia el cumplimiento por el buen estado de los elementos de emergencias. Los extintores multipropósito se encuentran con su mantenimiento al día; los botiquines cuentan con los elementos necesarios; y la camilla permanece instalada en un lugar visible con fácil acceso para su uso en caso de requerirse.

Registro fotográfico – Cerramiento Perimetral


CANALETE:

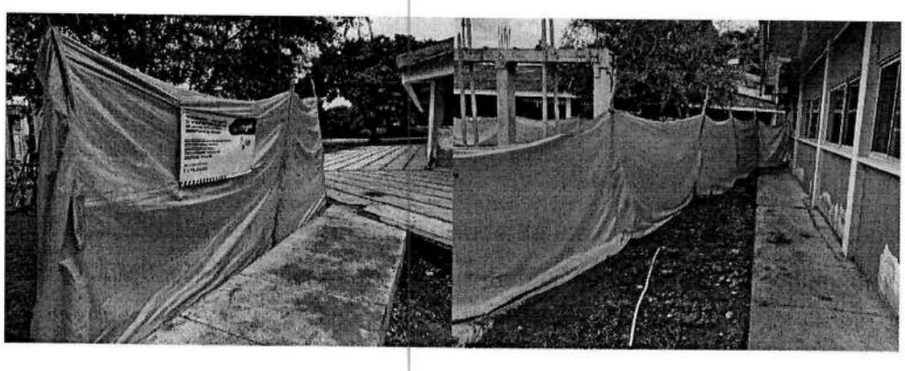


MOÑITOS:

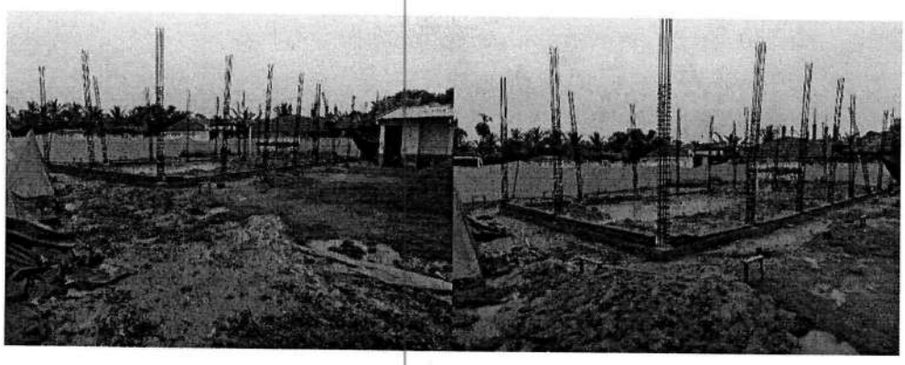

SAN PELAYO:

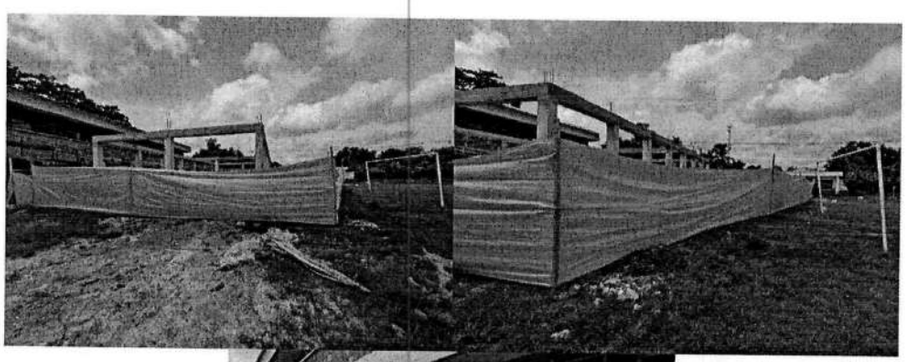


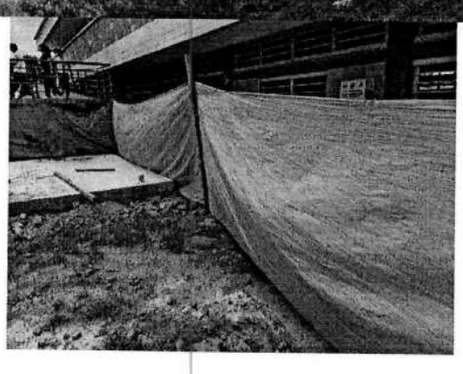

CERETÉ:



CIENAGA DE ORO:

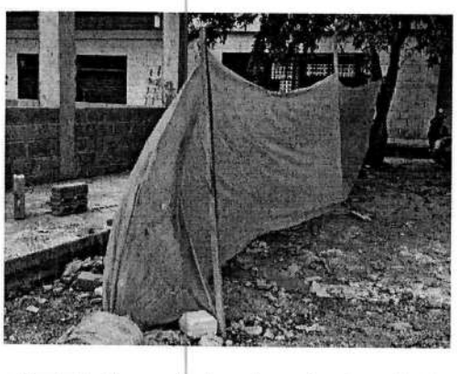

Se cuenta con lona verde instalada en todo el perímetro de las áreas de trabajo en los frentes activos, con el objetivo de delimitar la zona de intervención y restringir el acceso a personal no autorizado, garantizando así la seguridad durante la ejecución de las actividades.

6.13. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se realizó conformación de brigada de emergencia para la atención de posibles eventos que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, los bienes y recursos materiales, se dispone de un plan de emergencias, el cual establece la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Así mismo se cuenta con recursos básicos para prestar primeros auxilios (Botiquín, extintor tipo ABC multipropósito para control de conatos de incendios, camilla para inmovilización y traslado de heridos); elementos indispensables para manejo de emergencia y primera atención básica a víctimas de un accidente. **Anexo. ACTA CONFORMACIÓN BRIGADA PRESENTADA EN INFORME No. 1.**

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se definen y relacionan las medidas de manejo ambiental a implementar para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos negativos generados por la intervención del proyecto. Estas medidas están organizadas por programas ambientales, permitiendo una gestión integral, específica y coherente con los objetivos de sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas desde cada uno de los programas anexos al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

7.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo se realizó capacitación del Plan de Manejo Ambiental al personal vinculado al proyecto.

ANEXO NO. 5 CAPACITACIÓN AMBIENTAL

7.2. MANEJO DE MATERIALES

Los materiales de construcción como arena y piedra china se disponen en los sitios establecidos para acopio de material, los cuales se delimitan con cinta de seguridad para su posterior uso.

El acero y demás materiales se acopian en obra dentro de los cerramientos instalados.

7.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se implementó el programa de manejo y disposición final de residuos sólidos generados en las diferentes actividades del proyecto acorde a lo definido en el Plan de Manejo Ambiental.

Durante el periodo se disponen los puntos ecológicos para la clasificación y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Se realiza la disposición final en punto de acopio para que operador de servicios públicos domiciliarios haga la recolección y transporte.

Registro Fotográfico – Puntos Ecológicos


CERETÉ:




CIÉNAGA DE ORO:



SAN PELAYO:

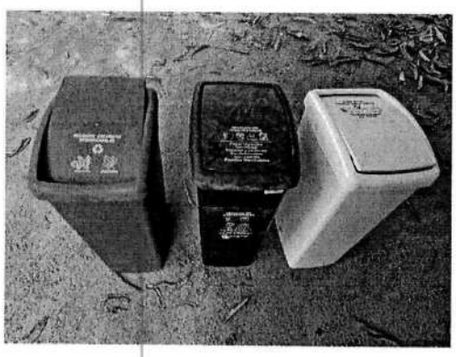

CANALETE:

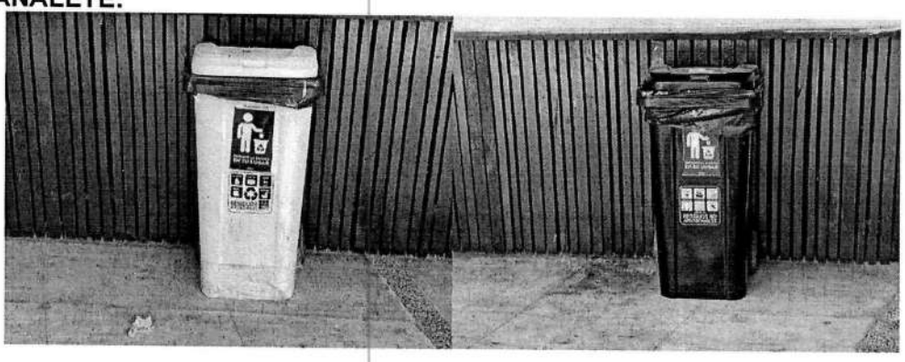



7.3.1. ORDEN Y ASEO

Con el fin de mantener las condiciones óptimas de orden y aseo dentro de las áreas de intervención del proyecto, se realizó la designación de un trabajador por frente encargado de las labores de orden y aseo, asegurando que todas las zonas de trabajo permanezcan libres de residuos, adecuadamente organizadas, y de mantener el cerramiento en correcto estado.


7.4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Se cuenta con campamento ubicado al frente del sitio de obra, en el cual se dispuso de espacios para bodega de almacenamiento de materiales.


El cemento en sacos se almacena sobre estibas de madera para aislar del suelo y son recubiertos con lona plástica para evitar la humedad.

Registro Fotográfico – Instalaciones de Campamentos de Obra


CERETÉ:

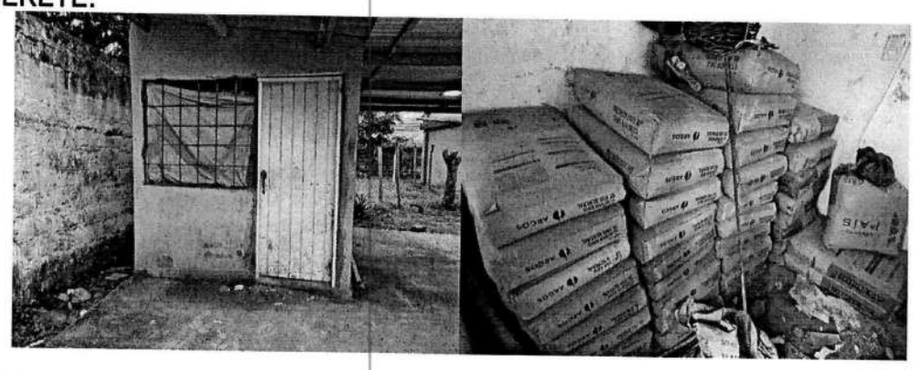


CIÉNAGA DE ORO:

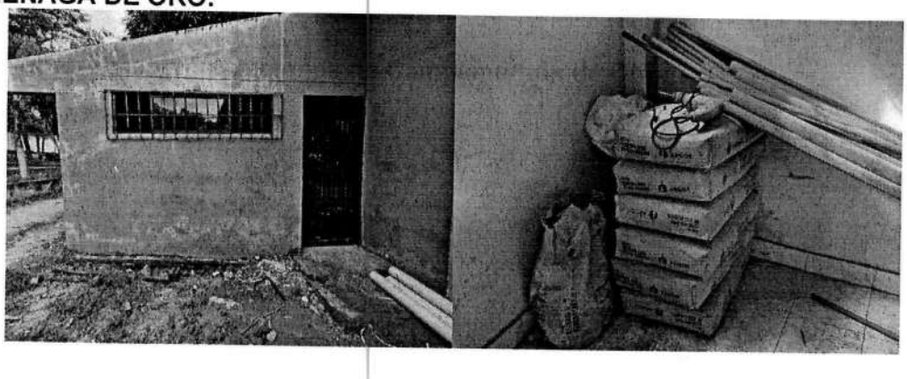

SAN PELAYO:

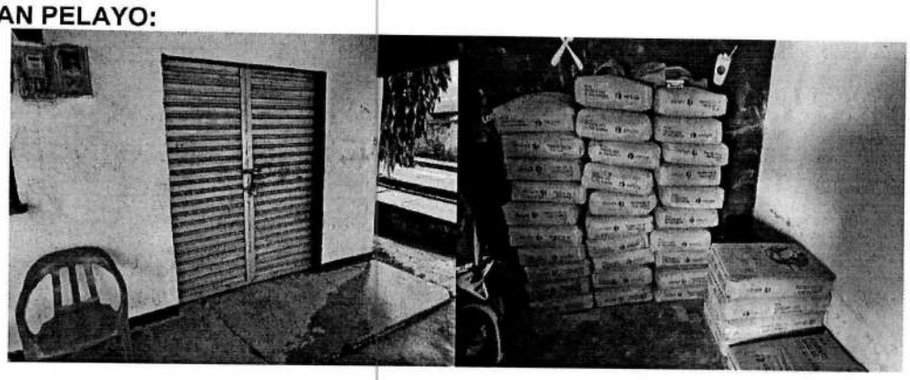

CANALETE:

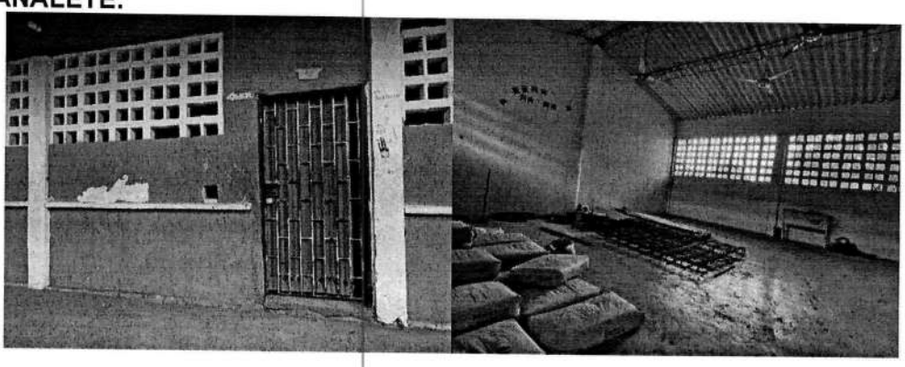

7.4.1. UNIDADES SANITARIAS


Se dispone de baños en el campamento de obra y en los diferentes frentes de obra se realizaron acuerdos con la comunidad aledaña, garantizando así, que el personal realice sus necesidades fisiológicas durante la jornada laboral.

7.5. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Para controlar las emisiones atmosféricas, material particulado y demás que pueden generarse con el desarrollo de algunas actividades contenidas en el proyecto, se implementan los siguientes controles:

- Las volquetas que transportan material operan en horarios adecuados 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Los materiales que generan material particulado son cubiertos con plásticos para el transporte a obra.
- La velocidad de las volquetas no supera los 30 km/h.
- No se realizan quemas a cielo abierto.

Registro Fotográfico – Manejo de Emisiones Atmosféricas

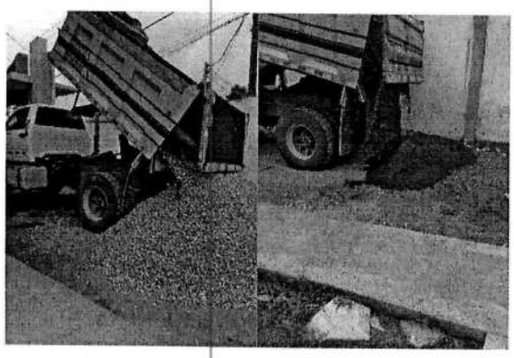

7.6. ESTABLECIMIENTO DE PUNTO DE HIDRATACIÓN

Durante el desarrollo de actividades y control del gasto energético del personal por la exposición a condiciones de temperaturas a cielo abierto y jornadas continuas de trabajo, se establecieron puntos de hidratación con la finalidad de mantener al personal hidratado dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en la Resolución 2400 de 1979.

Registro Fotográfico – Punto de Hidratación



7.7. PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Para el periodo evaluado, no se requirió la ejecución de acciones de rescate ni relocalización de especies silvestres, ya que no se evidenciaron situaciones que lo ameritaran. No obstante, el personal técnico mantiene vigilancia permanente en los frentes de trabajo, conforme a los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), para actuar

oportunamente en caso de que se identifiquen especies en riesgo o vulnerabilidad durante la ejecución del proyecto.

8. CONCLUSIONES

Del anterior informe presentado podemos concluir que:

- Se está cumpliendo con toda la normatividad legal vigente aplicable al proyecto en temas de seguridad y salud en el trabajo, y ambiental.
- Se desarrollan las actividades de los planes de seguridad y salud en trabajo, y gestión ambiental.
- Se garantiza la afiliación y pago de aportes de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Colombia.
- Se están implementando todos los formatos estipulados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y los controles del plan de manejo ambiental.
- Se promueve entre los trabajadores buenas prácticas de gestión ambiental con el fin de que sean aplicadas durante las jornadas de trabajo.
- Se realiza entrega y reposición de EPP acorde con las actividades ejecutadas en el proyecto.
- Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo.
- Se le da el cumplimiento al programa de inspecciones.
- Se desarrollan las actividades de los planes de seguridad y salud en trabajo, y gestión ambiental.

9. ANEXOS

Anexo No. 1 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 9
Anexo No. 2 ACTA ENTREGA DE EPP Y/O DOTACIÓN 10
Anexo No. 3 CAPACITACIÓN SST 13
Anexo No. 4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 13
Anexo No. 5 CAPACITACIÓN AMBIENTAL 21

Anexo No. 1 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9490018861	9490018861	E	2025/07/16	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	21	$10,126,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067940218	AGAMEZ ANDY																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	1066735527	ALEAN NEVER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1233340397	ALVAREZ JOSE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	1064976924	ARGUELLO CESAR																		231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1003100819	ARROYO LEYDER	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS042	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	SI	$117,700
6	CC	78025167	AYALA JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1020789957	BEJARANO KAMAL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC	78748099	CASTRO RICARDO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	1073813229	COGOLLO CARMELO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1126245995	CONTRERAS EDINSON	X																	230301	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
11	CC	1067942893	CORRALES SHARON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	1003457959	FRANCO OSCAR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	11165809	GUERRA RUBERCINDO	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	ESSC07	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	SI	$117,700
14	CC	15092179	MEDRANO MAXIMO	X																	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	1073825958	MENDOZA SAIBIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	8374898	MERCADO MANUEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	11171831	PEREZ JORGE	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	SI	$117,700
18	CC	7382988	PLAZA OLIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
19	CC	19191822	RAMIREZ HECTOR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
20	CC	15031979	ROJAS ALCIBIADES	X	X																231001	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	SI	$117,700
21	CC	1068656210	RUIZ JOSE																		230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	1063719364	RUIZ YEISON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
23	CC	1073155444	TORRES HERIBERTO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
24	CC	6888826	VERGARA HERNAN																			0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100
25	CC	72237694	VERGARA JHOJAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(25)																						$31,582,650	$5,054,100			$33,006,150	$1,321,300			$33,006,150	$1,321,300			$33,006,150	$2,298,000		$0	$0		$9,994,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9490018861	9490018861	E	2025/07/16	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	21	$10,126,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,054,100	$66,500	$0	$5,120,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$972,000	$12,800	$0	$984,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$6,000	$0	$461,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,623,100	$34,500	$0	$2,657,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,003,400	$13,200	$0	$1,016,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,298,000	$30,200	$0	$2,328,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$2,298,000	$30,200	$0	$2,328,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,321,300	$17,400	$0	$1,338,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$1,321,300	$17,400	$0	$1,338,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	$1,321,300	$17,600	$0	$1,338,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$142,500	$1,900	$0	$144,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$15,200	$200	$0	$15,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$144,400	$1,900	$0	$146,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$800	$0	$57,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$414,200	$5,500	$0	$419,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$137,000	$1,800	$0	$138,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,500	$0	$115,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$217,000	$2,900	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$1,100	$0	$81,100
TOTAL				25	$9,994,700	$131,700	$0	$10,126,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Anexo No. 2 ACTA ENTREGA DE EPP Y/O DOTACIÓN

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	ACTA ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CÓDIGO: PGIO-F16	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
COORDINADOR SST	

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	LISTA DE VERIFICACIÓN								FECHA	FIRMA
		CASCO	BOTAS	GUANTES	GAFAS	PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	CAMISA	PANTALÓN		
Never Manuel Aleans Anas.	1066735527			X	X					19-06-25	
Cesar Antonio Arguello G.	1064976924			X	X					19-06-25	Never Aleans Anas.
Jose Antonio Ayala Herrera.	78025167			X						24-06-25	Cesar Arguello G.
oscar David Freile.	1003457959			X						24-06-25	
Jose Gregorio Diaz Meza.	1068656210			X						24-06-25	Jose Gregorio Diaz.
SAIBIS F MENDOZA H.	1073825958			X	X					03-07-25	Saibis F Mendoza.
Jose Eduardo Meleudez Ramos.	1070815145			X						03-07-25	Jose Eduardo Meleudez.
camilo Andres Galindo Barrera	1073828923			X	X					11-07-25	CAMILO Andres Galindo
EDIWSON Manuel Cantreras M	1126245995			X						11-07-25	EDIWSON Manuel Cantreras
LUIS Miguel Pérez Romero.	1066732487	X	X	X	X			X	X	22-07-25	LUIS MIGUEL PÉREZ ROMERO
Hector Anaya Ruiz	1063721640	X	X	X	X			X	X	22-07-25	HECTOR Ariel Ruiz
Manuel David Cortes R.	1043641929	X	X	X	X			X	X	22-07-25	Manuel David Cortes R.
VICTOR conde Manjarres.	111717737	X	X	X	X			X	X	22-07-25	victor conde Manjarres.
Ariel ANAYA RUIZ	1117172007	X	X	X	X			X	X	22-07-25	Ariel Anaya Ruiz

ME COMPROMETO A
UTILIZAR ADECUADAMENTE DURANTE LA JORNADA LABORAL LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECIBIDOS Y MANTENERLOS EN BUEN ESTADO Y CONDICIÓN
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de estos y dotación recibida.

Anexo No. 3 CAPACITACIÓN SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: PGIO-F01	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	09-07-2025	DURACIÓN	30 min
CAPACITACIÓN ☑ CHARLA ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐	TEMA: Protección de partes del cuerpo, manos, pies, cabeza, ojos, etc.		
OBJETIVO	Capacitar al personal en los mecanismos de manejo y uso de EPP para la protección de las partes del cuerpo al ejecutar las actividades.		
FACILITADOR	Iván Castillo Solano		

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Franco Luis Oscar David.	1003457959	Ayudante	
Galindo Barrera Camilo	1073828923	Ayudante	Galindo Barrera.
Ruiz Romero Hector	1063721640	Ayudante	
Conde Mayorga Victor	11171737	Ayudante	
Ruiz Anaya Anel	11172007	Maestro	Ruiz Anel.
Mauricio Alexis Arias.	1067673527	Oficial	Mauricio Alexis A.
Yeison Ruiz Meza.	1063719364	Ayudante	Yeison Ruiz Meza
Luis Miguel Pérez Romero	1068732487	Oficial	Luis Miguel Perez
Gregorio Ruiz Meza	1068656210	Ayudante	Gregorio Ruiz Meza
Jose Antonio Ayala	78025167	Oficial	Jose Ayala
Camilo Andres Galindo Barrera	1073828923	Ayudante	Camilo Galindo B.
Soribis F. Heudora Herrera.	1073825958	Ayudante	Soribis Francisco Heudora.

Anexo No. 4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CÓDIGO: PGIO-F06	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	24-06-25
COORDINADOR SST	
UBICACIÓN	Frentes de Obra — SEÑALIZACIÓN SI__ NO__

NOMBRE COMPLETO	LISTA DE VERIFICACIÓN														OBSERVACIONES
	CASCO		BOTAS		GUANTES		GAFAS		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		DOTACIÓN (CAMISA PANTALÓN)		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
SAIBIS MENDOZA H.	X		X		X		X						X		
Javier Alean Ariza	X		X		X		X						X		
Camilo Andres Galindo.	X		X		X		X						X		
EDINSON. CONTRERAS M.	X		X		X		X						X		
Ariel Ruiz Anaya.	X		X		X		X						X		
Cesar Arguello Gonzales.	X		X		X		X						X		
Jose Ayala Herrera	X		X		X		X						X		
victor conde Mayorga	X		X		X		X						X		
Oscar Franco Ruiz	X		X		X		X						X		
Hector Ruiz Anaya.	X		X		X		X						X		
Yelson Ruiz Meza.	X		X		X		X						X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CÓDIGO: PGIO-F06	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	20-09/25
COORDINADOR SST	
UBICACIÓN	Frentes de obra — SEÑALIZACIÓN SI X NO__

NOMBRE COMPLETO	LISTA DE VERIFICACIÓN														OBSERVACIONES
	CASCO		BOTAS		GUANTES		GAFAS		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		DOTACIÓN (CAMISA PANTALÓN)		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Cesar Arguello Gonzales.	X		X		X		X						X		
Jose Ayala Herrera.	X		X		X		X						X		
oscar Franco Ruiz.	X		X		X		X						X		
Jose Ruiz Meza.	X		X		X		X						X		
Yeison Ruiz Meza	X		X		X		X						X		
SAIBIS Mendoza H.	X		X		X		X						X		
Never Lobos Anas.	X		X		X		X						X		
Camilo Andres Galindo.	X		X		X		X						X		
EDINSON CONTRERAS M.	X		X		X		X						X		
Hector Ruiz Anaya.	X		X		X		X						X		
VICTOR conde Manjarres.	X		X		X		X						X		
Ariel Ruiz Anaya.	X		X		X		X						X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CÓDIGO: PGIO-F06	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	04/03/25
COORDINADOR SST	
UBICACIÓN	frentes de obra — SEÑALIZACIÓN SI__ NO__

NOMBRE COMPLETO	LISTA DE VERIFICACIÓN														OBSERVACIONES
	CASCO		BOTAS		GUANTES		GAFAS		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		DOTACIÓN (CAMISA PANTALÓN)		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Jose Eduardo Meleudez	X		X		X		X						X		
Camilo Andres Galindo B.	X		X		X		X						X		
Luis Miguel Diaz Duro.	X		X		X		X						X		
VICTOR CONDE M.	X		X		X		X						X		
Saibis Francisco Mendoza H.	X		X		X		X						X		
Mendoza Herrera F.	X		X		X		X						X		
Anel Ruiz Anaya.	X		X		X		X						X		
Nuver abecani Anas.	X		X		X		X						X		
Cesar Arguello Bayabs.	X		X		X		X						X		
Oscar Franco Ruiz.	X		X		X		X						X		
Hector Ruiz Anaya.	X		X		X		X						X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 005	INSPECCIÓN A EXTINTORES		
	CÓDIGO: PGIO-F07	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	24-06-2025
COORDINADOR SST	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR											OBSERVACIONES
					Manometro	Pasador de seguridad	Sello de seguridad	Manguera	Boquilla	Manija	Cilindro	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	
1	Multipropósito	Cereté	10lb	04-2026	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipropósito	Cga de Oro	10lb	04-2026	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
3	Multipropósito	San Pelayo	10lb	04-2026	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
4	Multipropósito	Monitos	10lb	04-2026	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
5	Multipropósito	Canalete	10lb	04-2026	B	B	B		B	B	B	B	B	B	B	
6																
7																
8																
9																
10																

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	24-06-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	I.E. Marcelano Polo	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-2026	X		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-2026	X		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		X		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		X		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		X		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		X		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		X		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		X		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		X		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		X		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		X		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		X		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		X		
14	CURAS	10 UNIDADES		X		
15	TIJERAS	UNIDAD		X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	24-06-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	I.E. Santa Teresita	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-2026	X		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-2026	X		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		X		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		X		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		X		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		X		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		X		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		X		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		X		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		X		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		X		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		X		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		X		
14	CURAS	10 UNIDADES		X		
15	TIJERAS	UNIDAD		X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	24-06-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	I.E. Marco Fidel Suárez	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-2026	X		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-2026	X		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		X		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		X		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		X		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		X		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		X		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		X		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		X		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		X		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		X		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		X		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		X		
14	CURAS	10 UNIDADES		X		
15	TIJERAS	UNIDAD		X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	27-04-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	San José de Montitos	SEÑALIZACIÓN SI X NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-2026	X		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-2026	X		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		X		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		X		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		X		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		X		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		X		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		X		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		X		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		X		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		X		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		X		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		X		
14	CURAS	10 UNIDADES		X		
15	TIJERAS	UNIDAD		X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN		
	CÓDIGO: PGIO-F05	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	24-06-2025		
COORDINADOR SST			
UBICACIÓN	I.E. San José de Cavalete	SEÑALIZACIÓN SI__ NO__	

No	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	03-2026	X		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	06-2026	X		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		X		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD		X		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		X		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		X		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD		X		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD		X		
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD		X		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD		X		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		X		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD		X		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		X		
14	CURAS	10 UNIDADES		X		
15	TIJERAS	UNIDAD		X		

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	INSPECCIÓN A CAMILLA DE EMERGENCIA		
	CÓDIGO: PGIO-F21	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	24-06-2025
COORDINADOR SST	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	UBICACIÓN	ESTADO DE LA CAMILLA								OBSERVACIONES
		VISIBILIDAD	ACCESO	OBSTRUCCIÓN	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE	CORREAS	INMOVILIZADOR	ESTADO GENERAL	
1	Campamento Cereté	B	B		B	B	B	B	B	
2	Campamento Cga de Oro	B	B		B	B	B	B	B	
3	Campamento San Pelayo	B	B		B	B	B	B	B	
4	Campamento Montitos	B	B		B	B	B	B	B	
5	Campamento Canalete	B	B		B	B	B	B	B	
6										
7										

Anexo No. 5 CAPACITACIÓN AMBIENTAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: PGIO-F01	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
FECHA	25-06-2025	DURACIÓN	30 min
CAPACITACIÓN [X] CHARLA [ ] ENTRENAMIENTO [ ] REUNIÓN [ ]	TEMA: Fuentes de Contaminación ambiental.		
OBJETIVO	Fuentes y formas de contaminación durante la jornada laboral.		
FACILITADOR	Sharon Corrales Martínez		

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Never Alexis Anas.	1066735527.	oficial.	Never Alexis Anas.
Cesar Antonio Arguello Gonzales	1064976924	Ayudante	Cesar Antonio Arguello.
Jose Antonio Ayala Herrera	78025167	oficial.	Jose Antonio A.
Yeison David Ruiz Meza	1063719364	Ayudante.	~~Yeison D. R~~
Galindo Barrera Camilo A	1073828923	Ayudante	~~Camilo A. Barrera~~
Hector Anaya Ruiz	1063721640	oficial.	Hector Anaya R.
Victor Conde Manjarres.	1117171737	Ayudante	Victor Conde M.
Ariel Anaya Ruiz	11172007	Maestro	Ariel Ruiz
Luis Miguel Pérez Romero	1066732487	oficial	Luis Miguel Pérez Ro.
