INFORME FINAL DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
TRUJILLO
De La Fuente

INFORME FINAL DE OBRA

Contrato de Obra Pública No. SAMC-001-2025

"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"

Contratista

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.
NIT. 901.878.498-0
R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

Supervisión

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

AGOSTO DE 2025
CUBARA – BOYACA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE
Nit 901.878.498
ofitrujillodelafuentes@gmail.com
Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÒN 4
2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES 5
2.1 PROCESO DE SELECCIÓN 5
2.2 CELEBRACION DEL CONTRATO 5
3. DESCRIPCIÒN DEL CONTRATO 6
3.1 DESCRIPCION GENERAL 6
3.2 FINALIDAD DEL PROYECTO 6
3.3 LOCALIZACION 6
3.4 ALCANCE 7
4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 9
4.1 MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO 9
5. ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS 14
6. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 14
6.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 14
6.2 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO 15
6.3 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 PRORROGA No. 01 16
6.4 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL 16
7. ACTAS DE COMITÉ TECNICOS 17
8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 17
9. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 18
9.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 18
9.2 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA 19
9.3 VALLA INFORMATIVA 19
10. RELACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 19
10.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 19
10.2 PERSONAL OPERATIVO 20
10.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL 21

11. BITACORA DIARIA DE OBRA 22
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 22
12.1 DOTACIÓN DEL PERSONAL 22
12.2 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA 23
12.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 24
13. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES 24
14. PERMISOS Y LICENCIAS 24
14.1 LICENCIAS Y PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 24
14.2 OTROS PERMISOS REQUERIDOS 25
15. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 25
16. MANEJO DEL ANTICIPO 26
Apertura de cuenta bancaria 26
a. Estado de la cuenta bancaria 27
b. Control de la inversión del anticipo 27
17. ASPECTOS TECNICOS 27
17.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 27
18. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA PARA ACTA FINAL 30
19. AVANCE DE LA OBRA 34
19.1 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 34
19.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 34
20. PROGRAMACION DE LA OBRA 35
21. DESCRIPCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EJECUTADOS 35
22. CONCLUSIONES 78

1. INTRODUCCIÒN

En el siguiente informe de ejecución final de obra, se evidencia las actividades ejecutadas en cumplimiento a la minuta contractual por el contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.** Durante el periodo del 06 de marzo del 2025 al 04 de junio del 2025, un tiempo transcurrido de tres (03) meses de ejecución, teniendo en cuenta los ítems y cantidades referenciadas en el Contrato de Obra Pública No. SAMC-001-2025 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025".** Y las especificaciones técnicas, planos y diseños que hacen parte integral del mismo, con el fin de garantizar el buen desarrollo y ejecución del objeto contractual.

El informe contiene la ejecución técnica, administrativa, financiera del contrato de obra mencionado, en el marco del sistema de calidad y las exigencias de la Entidad Contratante contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:

- Trabajos ejecutados: descripción general de las obras ejecutadas evaluadas técnicamente de acuerdo a las especificaciones y diseños para el cumplimiento de los objetivos.

- Aspectos Administrativos: Manejo administrativo de todos los documentos y trámites legales correspondientes, legalización, pólizas, actas, personal y equipo empleado para la ejecución de las obras.

- Aspectos Técnicos: Control sobre la ejecución diaria de las actividades de obra dentro de los parámetros técnicos establecidos, utilizando el equipo y personal idóneo en la realización de los trabajos.

- Aspecto Financiero: Control sobre la ejecución financiera del Contrato de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo.

- Control de Calidad: control diario ejecución de obras, utilizando materiales de calidad y el personal idóneo en la ejecución de los trabajos.

2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

2.1 PROCESO DE SELECCIÓN

La alcaldía de Cubara adelantó el proceso de licitación pública SAMC-001-2025 de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, ley 1150 de 2007, y demás normas aplicables para suscribir contratos, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** representada legamente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** mediante Resolución No. 0081 de fecha 04 de marzo de 2025.

2.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación, ***No. 0081* de fecha 04 de marzo de 2025** se procedió a la suscripción del contrato de obra *(No. SAMC-001-2025 el día 04 de marzo de 2025)* entre el municipio de Cubara y la firma contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** representada legalmente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**, el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025.",** con un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES** y un valor de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($217,282,949.87).**

3. DESCRIPCIÒN DEL CONTRATO

3.1 DESCRIPCION GENERAL

El presente documento contiene las actividades ejecutadas de forma satisfactoria por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el seis (06) de marzo del 2025 al cuatro (04) de junio del 2025, del Contrato de Obra Pública SAMC-001-2025 denominado **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÀ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ 2025".**

Todas las actividades descritas se desarrollaron de manera integral teniendo como referencia las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente en la ejecución de los procesos constructivos. Durante la ejecución de las actividades se realizó el correcto cumplimiento de los estándares de calidad, procedimientos de ejecución, control, recibo para los trabajos, forma de pago y demás exigencias estipuladas en las especificaciones técnicas del proyecto.

3.2 FINALIDAD DEL PROYECTO

De acuerdo con el objeto del contrato de obra pública SAMC-001-2025, la finalidad de la obra en ejecución es realizar el "**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025**".

3.3 LOCALIZACION

El contrato de obra pública SAMC-001-2025 se realizará en el área rural en la vereda el silencio del municipio de Cubará.

El proyecto se encuentra ubicado en el sector El Silencio, a una distancia aproximada de 24,58 km del casco urbano del municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá. Su localización geográfica está definida por las coordenadas 6°53'56.71" de latitud norte y 72°0'45.17" de longitud oeste.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	SEDE SILENCIO (IE KERA SHIKARA)	(6°53'56.71"N- 72° 0'45.17"O)

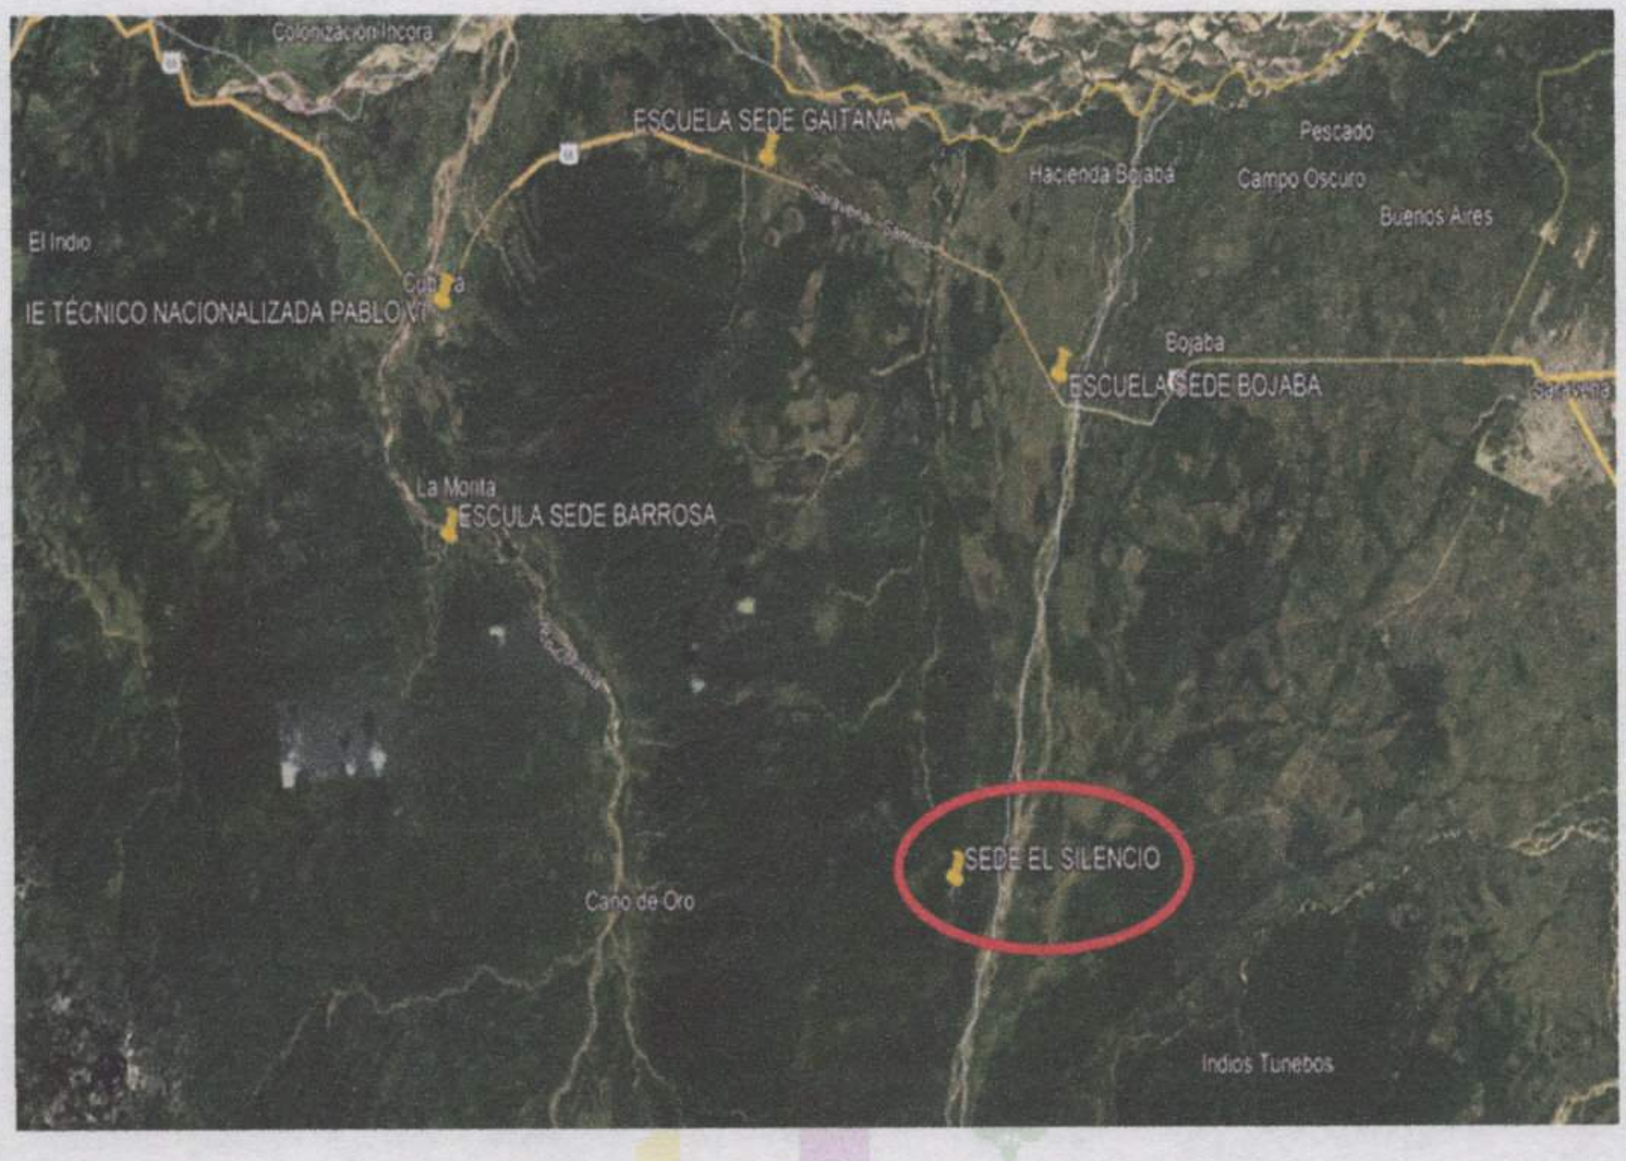


Ilustración 1. Localización del proyecto.
Fuente: Google Earth

3.4 ALCANCE

El Municipio de Cubará, a través de este proyecto, busca garantizar un entorno educativo seguro y funcional mediante la construcción de un aula escolar de 96,90 m2 aproximadamente en la sede El Silencio, perteneciente a la Institución Educativa Kerá Shikará. La intervención incluye las siguientes actividades:

1. Preliminares:

- **Localización y replanteo**: Abarcará un área de **96,90 m²** para definir la ubicación exacta del aula.
- **Cerramiento temporal**: Instalación de **193,80 ml** de cerramiento en vara rolliza y lona (altura 1,50 m) para seguridad del área de trabajo.
- **Preparación del terreno**: Incluye descapote manual (**96,90 m²**), excavación de **4,66 m³** en material común y relleno compactado de **31,88 m³**.

2. Estructuras en acero:

- **Refuerzo estructural**: Uso de **2.712,04 kg** de acero de refuerzo (60.000 PSI) para cimentación y columnas.
- **Malla electrosoldada**: Instalación de **252,69 kg** de malla (150x150 mm, Ø6x6 mm) en losas y pisos.

3. Estructuras en concreto:

- **Cimentación y soportes:**
  - Solado de limpieza (**9,47 m²** en concreto 2000 PSI).

- Construcción de vigas de amarre (**8,12 m³**), columnas (**2,01 m³**) y vigas aéreas (**3,41 m³**) en concreto 3000 PSI.

- **Placa base y elementos complementarios**:
  - Placa de piso de **82,02 m²** (concreto 3000 PSI).
  - Bancas y poyos en concreto (**13,20 m²**).

4. Mampostería:

- **Muros en bloque**: Construcción de **76,63 m²** de muros en bloque No. 5 (espesor 0,12 m) para división de espacios.

5. Cubierta:

- **Estructura metálica**: Instalación de **548,23 kg** de tubería rectangular para soporte.
- **Techado termoacústico**: Colocación de **112,00 m²** de teja termoacústica calibre 30, incluyendo caballete de **11,20 ml**.

6. Carpintería metálica:

- **Puertas y ventanas**:
  - Suministro e instalación de puerta en lámina calibre 18 (**3,45 m²**).
  - Ventanas corredizas en aluminio con vidrio de seguridad (**25,00 m²**) y mirillas (**1,05 m²**).
  - Rejillas de ventilación en tubería galvanizada (**25,00 m²**).

7. Instalaciones eléctricas:

- **Distribución interna**:
  - Conexión desde el medidor al tablero (**30,00 ml**).
  - Tuberías PVC Conduit de 3/4" (**24,00 ml**) y 1/2" (**5,00 ml**), y tubería IMC (**49,75 ml**).
  - Tablero monofásico con 8 circuitos y polo a tierra.
  - Iluminación con paneles LED suspendidos (**14 unidades**).

8. Acabados:

- **Revestimientos**:
  - Pañete liso (**169,11 m²**) y estuco (**188,11 m²**) en muros.
  - Enchape cerámico en piso (**93,72 m²**) y carpeta de nivelación (**82,02 m³**).

- **Pintura**: Aplicación de vinilo en **188,11 m²** para protección y estética.

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S, inicio labores el día 06 de marzo de 2025, una vez suministrada, revisada y aprobada la documentación requerida para suscribir acta de inicio. Al acto se presentó, la firma contratista de obra la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** representada legalmente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**.

Tabla 1. Actos Administrativos Contrato de Obra No. SAMC-001-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
06 de marzo de 2025	Suscripción De Contrato De Obra No. SAMC-001-2025.	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
06 de marzo de 2025	Suscripción De Acta De Inicio Del Contrato De Obra No. SAMC-001-2025.	**JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario Planeación y Obras Públicas Supervisor. **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
02 de mayo de 2025	Suscripción De Acta De Adicional De Plazo Del Contrato De Obra No. SAMC-001-2025. Por UN (01) Mes	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista

4.1 MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO

Afectación por precipitaciones

En el periodo transcurrido fueron presentadas constantes precipitaciones que provocaron un impacto considerable en el proyecto, esto debido a que las lluvias afectan directamente el desarrollo del mismo, ya que gran parte de las actividades se llevan a cabo a cielo abierto, lo que genera que el personal obrero no pueda ejecutar ninguna actividad, generando un atraso significativo en obra.

Cabe resaltar que las lluvias no solo afectan directamente al proyecto, sino que también tiene un impacto considerable en las vías de acceso que conducen al lugar de construcción, lo que dificulta el tránsito de los vehículos que transportan los materiales y el tránsito de los trabajadores para que puedan ingresar a desarrollar sus trabajos, por lo cual, se presentan atrasos debido a la ausencia de mano de obra para la ejecución de las actividades programadas.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE como ejecutor del contrato de obra SAMC-001-2025, implementa alternativas como la colocación de carpas para dar continuidad a los trabajos en la medida en que el tiempo lo permite.

Es de vital importancia tener en cuenta que la afectación que producen las lluvias va más allá de las horas en las que la precipitación se presenta, sino que, posterior a esta se deben efectuar trabajos no previstos (Limpiezas, adecuaciones de terreno, desagües, entre otros) que generan gastos en tiempo y costos adicionales, por lo tanto, al ser trabajos no previstos, presentan atrasos en las actividades que si están programadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que, debido a las fuertes precipitaciones presentadas en el transcurso de la ejecución del proyecto, el plazo de ejecución de este se ve afectado y para mitigar estas pérdidas será necesario realizar un adicional en tiempo que permita concluir la totalidad del proyecto y cumplir con su objeto principal.

A continuación, se evidencia la afectación en días de las precipitaciones presentadas en el periodo correspondiente.

Cuadro de Lluvias:

25 DE MARZO DEL 2025 AL 05 DE ABRIL DEL 2025						
FECHA	MAÑANA		TARDE		TOTAL HORAS	AFECTACIÓN EN DÍAS
	INICIA	FINALIZA	INICIA	FINALIZA		
25-mar-25			1:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	3	0,38
28-mar-25	7:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.			4	0,50
29-mar-25	7:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.			3	0,38
31-mar-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			5	0,63
1-abr-25	7:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.			3	0,38
2-abr-25			2:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	3	0,38
3-abr-25	11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	3:00:00 p. m.	3	0,38
4-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			5	0,63
5-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	8	1,00
8-abr-25	9:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			3	0,38
7-abr-25			1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	4	0,50
8-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			4	0,50
9-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	3:00:00 p. m.	6	0,75
10-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	2:00:00 p. m.	6	0,75
11-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	9	1,13
14-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	8	1,00
15-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	9	1,13
16-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			4	0,50
22-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			4	0,50
23-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			5	0,63
25-abr-25			1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.		
TOTAL					99	12,38

Teniendo en cuenta la tabla se evidencia una afectación de 12,38 días en el periodo, del cual, se contempla un porcentaje correspondiente al 33.45% que abarcan los tiempos de re ejecución de las

actividades y desagües de agua, por lo tanto, se tiene una afectación total de 15 días. A continuación, se presenta la afectación de las lluvias en las áreas del proyecto.

Ilustraciones: Afectación de las lluvias en obra

AFECTACIÓN DE LAS LLUVIAS




















Del reporte anterior se justifica en el reporte de bitácora anexa al presente comunicado. Se debe tener en cuenta el tiempo en el que se efectúan trabajos no previstos a causa de las lluvias como limpiezas, adecuaciones de terreno, drenado, que, al ser trabajos no previstos, generan costos y atrasos en las actividades programadas.

Considerando lo anterior, las precipitaciones presentadas no permiten el correcto desarrollo de las actividades programadas, de la misma forma, se producen atrasos y retrocesos en las actividades. Como ejecutores del contrato, se toman las medidas necesarias para continuar con lo programado en la medida en que el tiempo lo permita, sin embargo, se deben tener en cuenta las afectaciones mencionadas al momento de evaluar el avance general del proyecto.

De la misma manera es de vital importancia tener en cuenta lo manifestado por el contratista en cuanto a la pluviometría del área del proyecto. Según el "Boletín de predicción climática y recomendación sectorial" en su edición N° 360 de marzo y m de 2025, en la zona se proyectan precipitaciones con probabilidad muy por encima de lo normal.

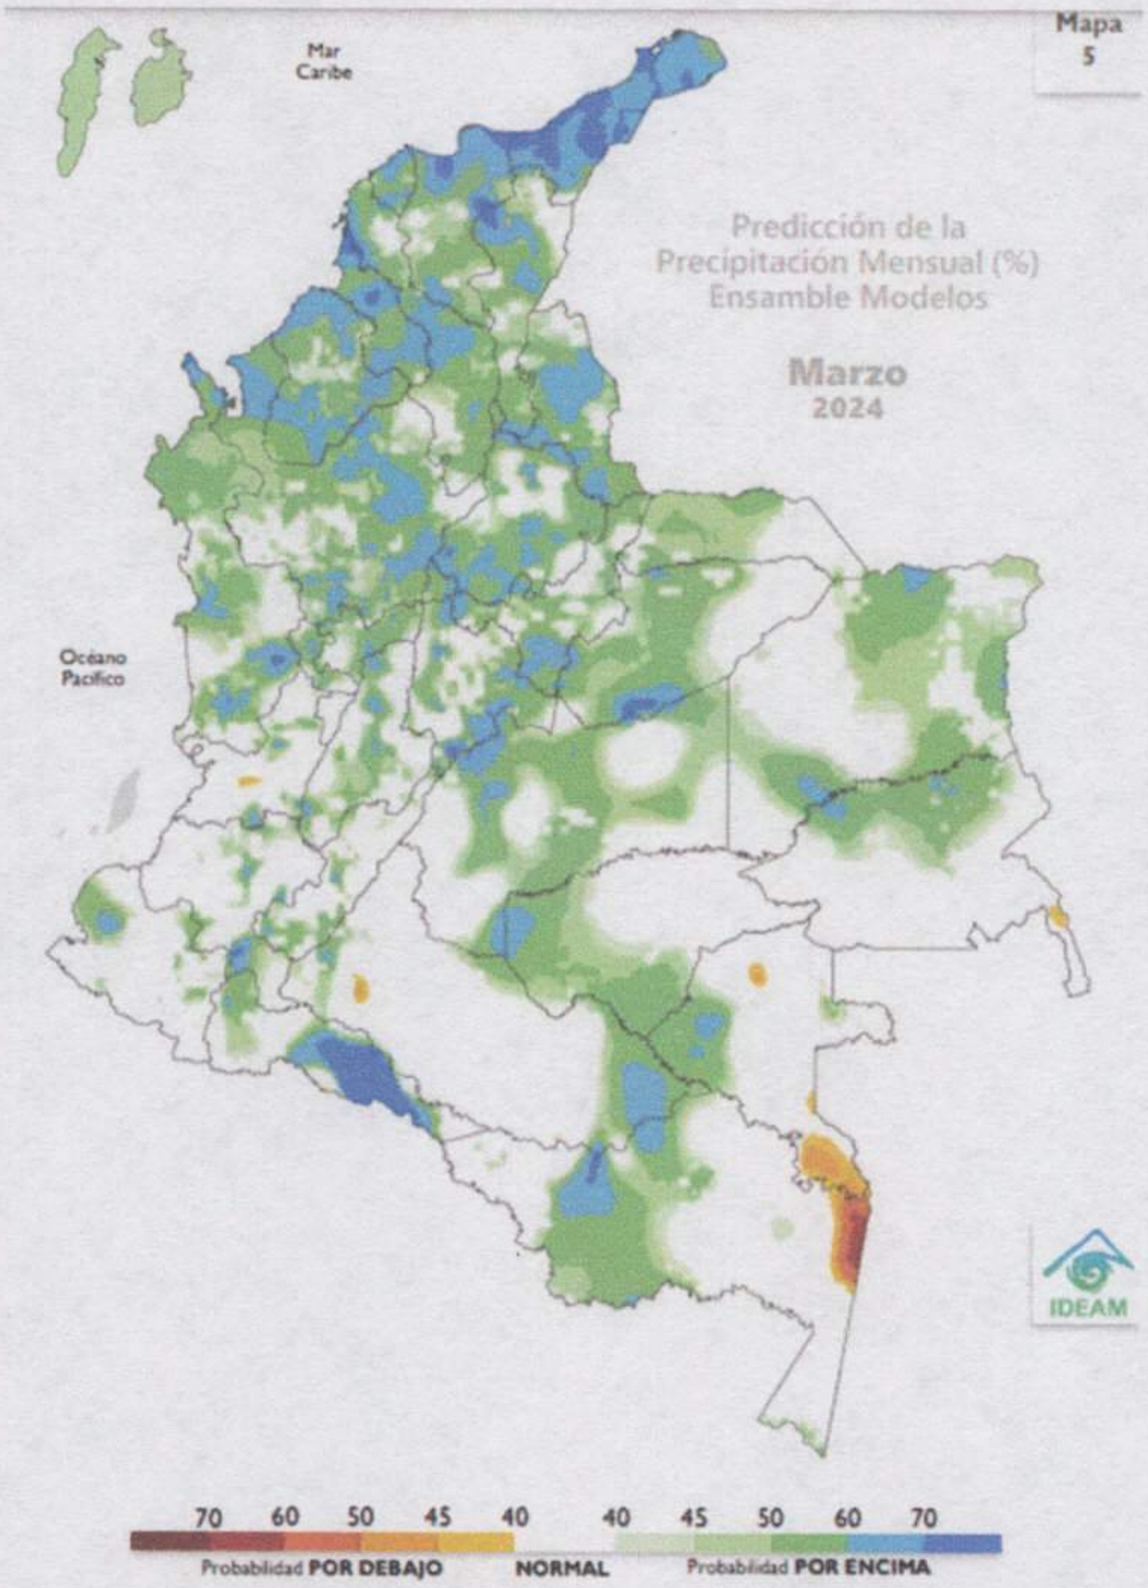

Por lo que se valida una afectación exponencial conforme a la ejecución de las tareas programadas, puesto que este inconveniente genera una afectación constante en el desarrollo de las tareas. Teniendo en cuenta lo anterior, se valida una afectación de 20 días puesto que, si bien es cierto, la afectación se presenta desde el inicio de las actividades, sin embargo, no es una afectación total debido a que si existe mano de obra calificada pero no la suficiente para el desarrollo de las actividades programadas.

Selección y contratación de mano de obra no calificada

Al ser un proyecto que se desarrolla dentro de comunidad indígena estos tienen participación de mano de obra perteneciente a la comunidad U'wa, si bien el acta de inicio es del 6 de marzo de 2025, las labores iniciaron el 25 de marzo debido a los retrasos de la comunidad del Silencio en la selección de estas personas, por temas de comunicación y entrega de documentos necesarios para el aseguramiento de riesgos profesionales.

5. ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARA
CONTRATO No:	SAMC-001-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
NIT. No:	901.878.498-0
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($217,282,949.87) M/CTE
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION:	06 DE MARZO DE 2025
FECHA INICIO:	06 DE MARZO DE 2025
VALOR ANTICIPO DEL (30%):	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 65,184,884.96) M/CTE
MODIFICACION No. 01 PRORROGA Nº 01:	UN (01) MES – 02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	04 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	04 DE JUNIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025000159 – DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025000220 – DEL 04 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR:	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Tabla 2. Ficha técnica del contrato

6. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de cubara en el Contrato de Obra No. SAMC-001-2025, se suscribe con la compañía a*seguradora* ***SOLIDARIA DE COLOMBIA*** *las* siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la **CLÁUSULA *DECIMOCTAVA*: *GARANTIAS*** del Contrato así:

6.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora ***SOLIDARIA DE COLOMBIA,*** tomada por la ***CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S,*** y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 3. Pólizas Anexo 0

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
05/03/2025	Cumplimiento General	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 99400007 0088	$ 21,9728,295.00	05/03/2025	05/09/2025
	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo			$ 65,184,885.00	05/03/2025	05/09/2025
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales			$ 10,864,148.00	05/03/2025	05/05/2028
	Estabilidad y calidad De las obras			$ 43,456,590.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	Garantía de calidad De los bienes			$ 21,728,295.00	05/03/2025	05/09/2025
	Predios, Labores Y Operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 74 99400001 2181	$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025
	Contratistas Y Subcontratistas			$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025
	RCE Patronal			$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025
	Vehículos Propios Y No Propios			$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025

6.2 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora ***SOLIDARIA DE COLOMBIA,*** tomada por la ***CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S,*** y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 4. Pólizas Anexo 1

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
11/06/2025	Cumplimiento General	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 99400007 0088	$ 21,728,295.00	06/03/2025	06/09/2025
	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo			$ 65,184,885.00	06/03/2025	06/09/2025
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales			$ 10,864,148.00	06/03/2025	06/05/2028
	Estabilidad y calidad De las obras			$ 43,456,590.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	Garantía de calidad De los bienes			$ 21,728,295.00	06/03/2025	06/09/2025
	Predios, Labores Y Operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 74 99400001 2181	$ 284.700.000,00	06/05/2025	07/05/2025
	Contratistas Y Subcontratistas			$ 284.700.000,00	06/05/2025	07/05/2025
	RCE Patronal			$ 284.700.000,00	06/05/2025	07/05/2025
	Vehículos Propios Y No Propios			$ 284.700.000,00	06/05/2025	07/05/2025

6.3 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 PRORROGA No. 01

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA,** tomada por la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S**, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 5. Pólizas Anexo 2

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
11/06/2025	Cumplimiento General	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 99400007 0088	$ 21,728,295.00	06/03/2025	07/10/2025
	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo			$ 65,184,885.00	06/03/2025	07/10/2025
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales			$ 10,864,148.00	06/03/2025	07/06/2028
	Estabilidad y calidad De las obras			$ 43,456,590.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	Garantía de calidad De los bienes			$ 21,728,295.00	06/03/2025	07/10/2025
	Predios, Labores Y Operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 74 99400001 2181	$ 284.700.000,00	07/05/2025	11/06/2025
	Contratistas Y Subcontratistas			$ 284.700.000,00	07/05/2025	11/06/2025
	RCE Patronal			$ 284.700.000,00	07/05/2025	11/06/2025
	Vehículos Propios Y No Propios			$ 284.700.000,00	07/05/2025	11/06/2025

6.4 PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA**, tomada por la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S**, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 6. Pólizas Anexo 3

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
15/08/2025	Cumplimiento General	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 99400007 0088	$ 21,728,295.00	06/03/2025	07/10/2025
	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo			$ 65,184,885.00	06/03/2025	07/10/2025
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales			$ 10,864,148.00	06/03/2025	07/06/2028
	Estabilidad y calidad De las obras			$ 43,456,590.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	Garantía de calidad De los bienes			$ 21,728,295.00	06/03/2025	07/10/2025

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752559734

PÓLIZA No: 475 - 47 - 994000070088 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	11	06	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	11	06	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.878.498-0

DIRECCIÓN: CALLE 22 NO. 16A- 31 BARRIO SIETE DE AGOSTO CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA TELÉFONO: 3115094460

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUBARA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	06/03/2025	06/09/2025	21,728,295.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/03/2025	06/09/2025	65,184,885.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/03/2025	06/05/2028	10,864,148.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	43,456,590.00
CALIDAD DEL BIEN	06/03/2025	06/09/2025	21,728,295.00

BENEFICIARIOS
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRTO DE OBRA NO. SAMC-001 DEL 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON " CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (03) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
****

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***162,962,213.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
EVA YOSENI MEDINA TORRES	5079	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000475255973

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADF257A090EFC7856

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000070088 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.878.498-0**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

TEXTO ITEM 1

VIGENCIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 04/05/2025 HASTA 04/05/2028
****
CON EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2025.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Sobre la Declaratoria Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. COLOMBIA 2024

Sobre la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. AMERICA LATINA 2025

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752559767

PÓLIZA No: 475 -74 - 994000012181 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGE: 475 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
11	06	2025	06	05	2025	23:59	07	05	2025	23:59	1	11	06	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
06	05	2025	23:59	07	05	2025	23:59	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.878.498-0

DIRECCIÓN: CALLE 22 NO. 16A- 31 BARRIO SIETE DE AGOSTO CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA TELÉFONO: 3115894460

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

DIRECCIÓN: CALLE 4 NO 4-43 CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ TELÉFONO: 3102574494

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA NIT : 800099196

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ CIUDAD: CUBARÁ

DIRECCION: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% IVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	$ 284,700,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
RCE PATRONAL	284,700,000.00		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
OBJETO DEL CONTRATO**
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO.SAMC-001 DEL 2025, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"
ASEGURADOS: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS NIT:901878498-0 /MUNICIPIO DE CUBARA - BOYACA NIT:800099196-2
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS/ CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS NIT:901878498-0 /MUNICIPIO DE CUBARA - BOYACA NIT:800099196-2
CON EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2025.
LA VIGENCIA RIGE A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO 06/03/2025 HASTA 07/05/2025

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
EVA YOSENI MEDINA TORRES	5079	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000475255976

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MARMEDINA 0

CADF257A090EFC795F

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000012181 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2

TOMADOR: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS IDENTIFICACION: 901.878.498-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE CUBARA	800099196-2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLA	CUBARÁ	284,700,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752559734

PÓLIZA No: 475-47-994000070088 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2025	11	06	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.878.498-0

DIRECCIÓN: CALLE 22 NO. 16A- 31 BARRIO SIETE DE AGOSTO CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA TELÉFONO: 3115804460

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUBARA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	06/03/2025	07/10/2025	21,728,295.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/03/2025	07/10/2025	65,184,885.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/03/2025	07/06/2028	10,864,148.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	43,456,590.00
CALIDAD DEL BIEN	06/03/2025	07/10/2025	21,728,295.00

BENEFICIARIOS
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRTO DE OBRA NO. SAMC-001 DEL 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON " CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ
2025"

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (03) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
****

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***162,962,213.00	$ **********26,669	$*****5,000.00	$ ********6,017	$ **********37,686

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
EVA YOSENI MEDINA TORRES	5079	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000475255973

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADF257A090EFC795C

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000070088 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.878.498-0**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

TEXTO ITEM 1

VIGENCIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 04/06/2025 HASTA 04/06/2028
****
CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN MODIFICACION NO. 01 PRORROGA NO. 01 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2025.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. COLOMBIA 2024

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. AMÉRICA LATINA 2025

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752559767

PÓLIZA No: 475 -74 - 994000012181 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGE: 475 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS		DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	11	06	2025		VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE / A LAS	07	05	2025	23:59		VIGENCIA HASTA / A LAS / DIAS	11	06	2025	FECHA DE IMPRESIÓN
										35					

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
PRORROGA	VIGENCIA DEL ANEXO DESDE / A LAS	07	05	2025	23:59	VIGENCIA HASTA / A LAS	11	06	2025	23:59	35

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.878.498-0

DIRECCIÓN: CALLE 22 NO. 16A- 31 BARRIO SIETE DE AGOSTO — CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA — TELÉFONO: 3115894460

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

DIRECCIÓN: CALLE 4 NO 4-43 — CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ — TELÉFONO: 3102574494

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA NIT : 800099196

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ CIUDAD: CUBARÁ

DIRECCION: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
OBJETO DEL CONTRATO**
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO.SAMC-001 DEL 2025, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"
ASEGURADOS: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS NIT:901878498-0 /MUNICIPIO DE CUBARA - BOYACA NIT:800099196-2
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS/ CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS NIT:901878498-0 /MUNICIPIO DE CUBARA - BOYACA NIT:800099196-2
CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA, SEGUN MODIFICACION NO. 01 PRORROGA NO. 01 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2025.
LA VIGENCIA RIGE A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO 06/03/2025 HASTA 11/06/2025

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********54,600	$*****5,000.00	$ *******11,324	$ **********70,924

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
EVA YOSENI MEDINA TORRES	5079	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000475255976

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MARMEDINA 0

CADF257A090EFC795B

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 29-39 oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000012181 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2

TOMADOR: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS IDENTIFICACION: 901.878.498-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE CUBARA	800099196-2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLA	CUBARÁ	284,700,000.00	54,600	65,924

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
54,600	65,924
