UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02
DEL: 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ". BPIN 20243218000007

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF

JUNIO DEL 2025

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 5
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 7
PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 7
PERSONAL DEL CONTRATISTA 8
INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 8
INFORMACIÓN LEGAL. 8
INFORMACIÓN FINANCIERA. 10
ACTIVIDADES EJECUTADAS 10
ACTIVIDADES FINANCIERAS 11
INFORMACIÓN TÉCNICA. 13
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental del proyecto denominado “construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de la guajira”.

La interventoría tiene como propósito verificar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurando que las obras se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas, normativas ambientales vigentes y condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se realiza seguimiento al manejo administrativo y financiero del proyecto, garantizando una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos institucionales.

Este informe presenta el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta 30 de junio de 2025, incluyendo los anexos pertenecientes al presente contrato; de igual forma presenta la información general del contrato y una descripción del avance de las obras adelantadas en los diferentes frentes de obra, actividades administrativas, como el estado financiero del contrato, así como las observaciones y recomendaciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVO GENERAL.

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con el fin de garantizar que su ejecución se realice conforme a los términos contractuales, especificaciones técnicas, normativas vigentes y principios de eficiencia, transparencia, calidad y sostenibilidad ambiental, velando por el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento de las diferentes actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato.
- Mostrar el avance que presenta la obra.
- Informar la gestión de la Interventoría.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO


El contrato de obra 0051 DE 2025 el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA la construcción de 1200 estufas ecoeficientes, ubicados en zonas rurales de 9 municipios, distribuidos de la siguiente manera:

1. 266 estufas ecoeficientes en Riohacha
2. 225 estufas ecoeficientes en el municipio de Barrancas
3. 252 estufas ecoeficientes en el municipio de Distracción
4. 223 estufas ecoeficientes en el municipio de la jagua del Pilar
5. 66 estufas ecoeficientes en el municipio de Hatonuevo
6. 61 estufas ecoeficientes en el municipio de Maicao
7. 51 estufas ecoeficientes en el municipio de Villa nueva
8. 29 estufas ecoeficientes en el municipio de Uribia
9. 27 estufas ecoeficientes en el municipio de Manaure

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la Zona rural de 9 municipios del departamento de la Guajira, A continuación, se relaciona la localización de los sitios donde se ejecutará el proyecto.

Uribia, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Manaure, Villanueva y La Jagua del Pilar

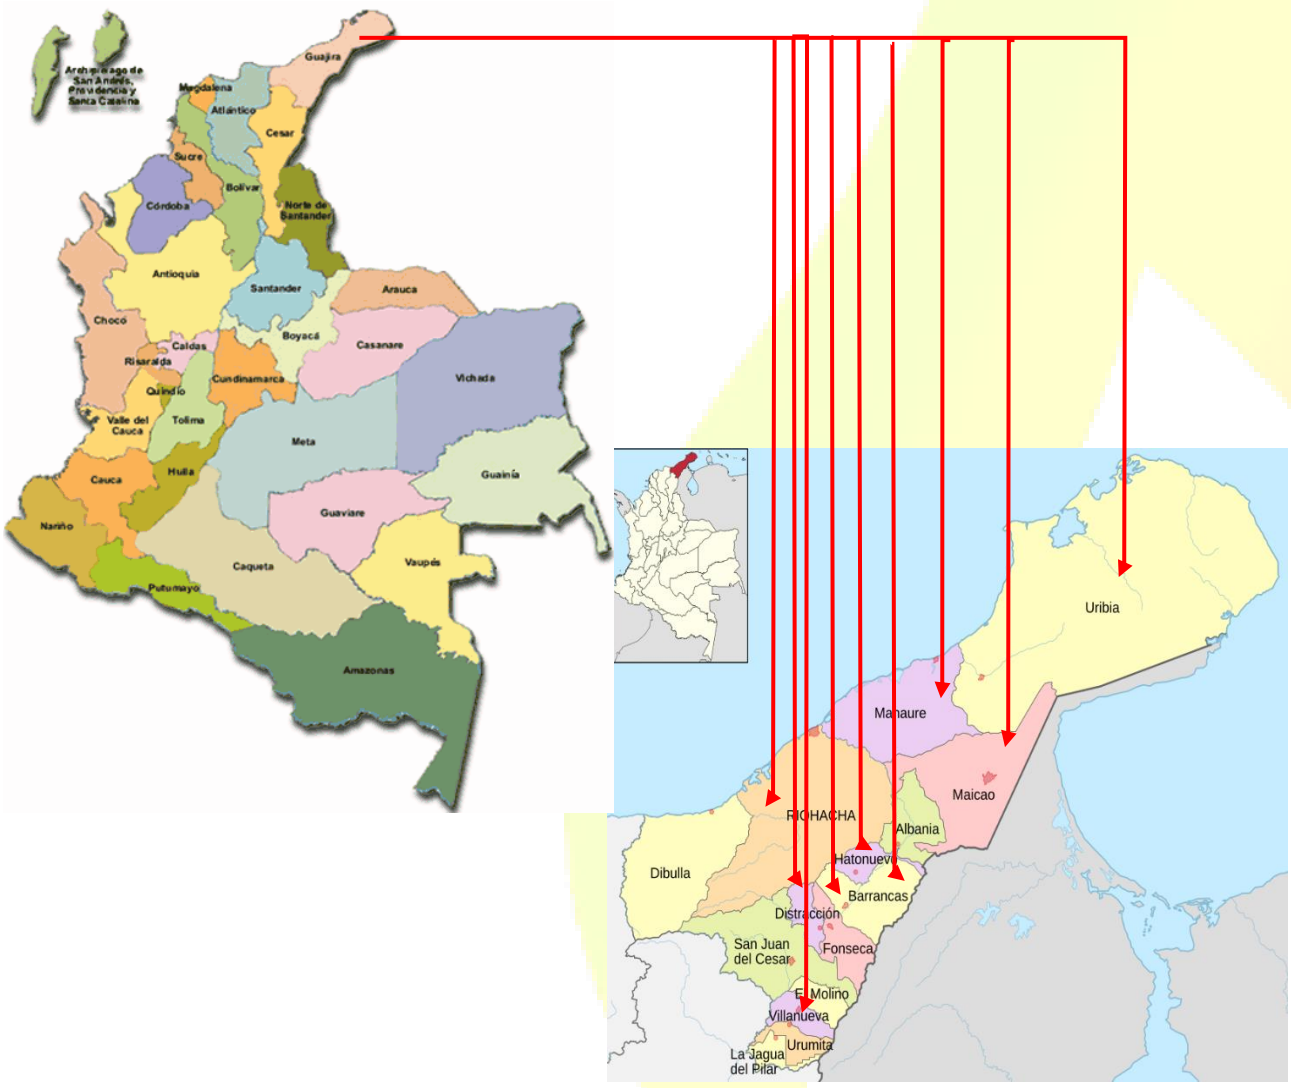

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 0051 DE 2025.	
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
SUPERVISOR:	KIANA VALBUENA MEJÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007
CONTRATO NO:	0051 - 2025
CONTRATISTA DE LA OBRA:	FUNDACIÓN AGUA LUNA Nit. 900345569-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERALD BRISSON MENDOZA CC. 19.486.085 de Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 5.656.614.670.00)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 MARZO DE 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-0060-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF NIT: 901941657-4
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($409.937.150,00) M/L
SUPERVISOR	KIANA VALBUENA MEJÍA
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13 MARZO DE 2026

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Samir Jose Cardozo Solano	1118806268	DIRECTOR
Bielca Silena Pimienta Padilla	40.928.933	RESIDENTE
Zunilda Amaya Uriana	40951297	PROFESIONAL SOCIAL
Carlos Antonio Brito Avila	84090164	CONTADOR
Loranis Maxiel Diaz Mercado	1118838660	TECNICO DE CAMPO
Yenifer Soto Vargas	1124409653	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Marianne Mejia Cardozo	1118800355	AUXILIAR DE OFICINA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Daniel Quintero Manotas	1122818210	ING. CIVIL
Luisa Fernanda Guerra	1062401355	ING. AMBIENTAL
María Fernanda Vargas	56078712	TRABAJADORA SOCIAL

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

INFORMACIÓN LEGAL.

Pólizas contrato de Obra.

Se aprueban las garantías únicas establecida en la póliza de cumplimiento No. 47-44-101030695 y responsabilidad civil extracontractual No. 47-40-101009486, expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, para garantizar las obligaciones adquiridas en virtud del contrato electrónico de obra pública Nº 0051 del 2025 14 de mayo del 2025, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA y FUNDACION AGUA LUNA, cuyas características se describen a continuación:

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$2,828,307,335
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/05/2025	22/03/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/03/2026	16/03/2031	$282,830,733.50
RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/05/2025	22/03/2026	$569,400,000

Pólizas contrato de Interventoría.

Se presenta en su orden: Aprobación de garantías de cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad del servicio de la obra del Contrato de interventoría No. CI-0060-2025, amparados según pólizas de garantía de cumplimiento No. 46-44-101013376 y responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Compañía de Seguros SEGUROS DEL ESTADO, como se detalla a continuación:

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$204,968,575
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	14/05/2025	14/03/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	14/03/2026	14/03/2031	$81,987,430.00
RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	14/05/2025	14/03/2026	$284,700,000

INFORMACIÓN FINANCIERA.

Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CONSTRUIR ESTUFAS FIJAS ECOEFICIENTES				
1,1	Construir estufa fija ecoeficiente (0.73 m x 1.05 m) h=0.83 m	Un	1.156,0	3.332.598,00	3.852.483.288,00
1,2	Construir estufa fija ecoeficiente (1.00 m x 3.00 m) h=0.40 m.	Un	44,0	3.171.628,00	139.551.632,00
	Subtotal costos directos				**3.992.034.920,00**
	Administración			24%	958.088.381,00
	Imprevistos			1%	39.920.349,00
	Utilidades			5%	199.601.746,00
	Iva sobre Utilidad			19%	37.924.332,00
	SUBBTOTAL 1				**5.227.569.728,00**
2	REALIZAR TALLERES Y CAPACITACIÓN PARA FAMILIAS BENEFICIADAS				
2,1	Realizar talleres de socializacion del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas.	Un	28,0	2.202.285,00	61.663.980,00
2,2	Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento del sistema de cocción eficiente.	Un	34,0	3.077.285,00	104.627.690,00
2,3	Realizar la divulgacion del proyecto	Un	1,0	13.350.000,00	13.350.000,00
	Subtotal costos directos				**179.641.670,00**
	Administración			24%	43.114.001,00
	SUBBTOTAL 2				**222.755.671,00**
3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
3,1	Realizar monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes	Und	1,0	166.362.315,00	166.362.315,00
	Subtotal costos directos				**166.362.315,00**
	Administración			24%	39.926.956,00
	SUBBTOTAL 3				**206.289.271,00**
	TOTAL COSTO DE OBRA				5.656.614.670,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el desarrollo general del contrato de obra 0051-2025, se presentan los siguientes avances: Programado: 5,80% - Ejecutado: 5,80%

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO	
% PROGRAMADO	5,80%
% EJECUTADO ESTE MES	5,80%
AVANCE TOTAL EJECUTADO	6,14%

Contrato de Interventoría:

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.								
N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (A*B*C*D*E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 5.775.000	10,0	$ 57.750.000
1.1.2	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	1	100%	210,00%	$ 8.400.000	10,0	$ 84.000.000
1.1.3	Tecnico de campo	$ 2.800.000,00	1	100%	210,00%	$ 5.880.000	10,0	$ 58.800.000
1.1.4	Profesional social	$ 3.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 3.675.000	10,0	$ 36.750.000
1.3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 4.500.000,00	1	15%	210,00%	$ 1.417.500	10,0	$ 14.175.000
1.3.2	Auxiliar administrativo	$ 2.700.000,00	2	15%	210,00%	$ 1.701.000	10,0	$ 17.010.000
	SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL							$268.485.000
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO		N° DE MESES	TOTAL PARCIAL
2.1	Papelería y copias	glb	1	100%	$ 100.000,00		10,0	$ 1.000.000
2.2	Transporte (Alquiler de vehiculo)	un	1	100%	$ 7.500.000,00		10,0	$ 75.000.000
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							$76.000.000
RESUMEN GENERAL								
	COSTO TOTAL (1 + 2)							$344.485.000
	IVA (19%)							$65.452.150
								$409.937.150

ACTIVIDADES FINANCIERAS


CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com

Riohacha – La Guajira.

La interventoría durante el periodo del presente informe realizó un avance físico del 10%. Por su parte, el contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 6,14%.

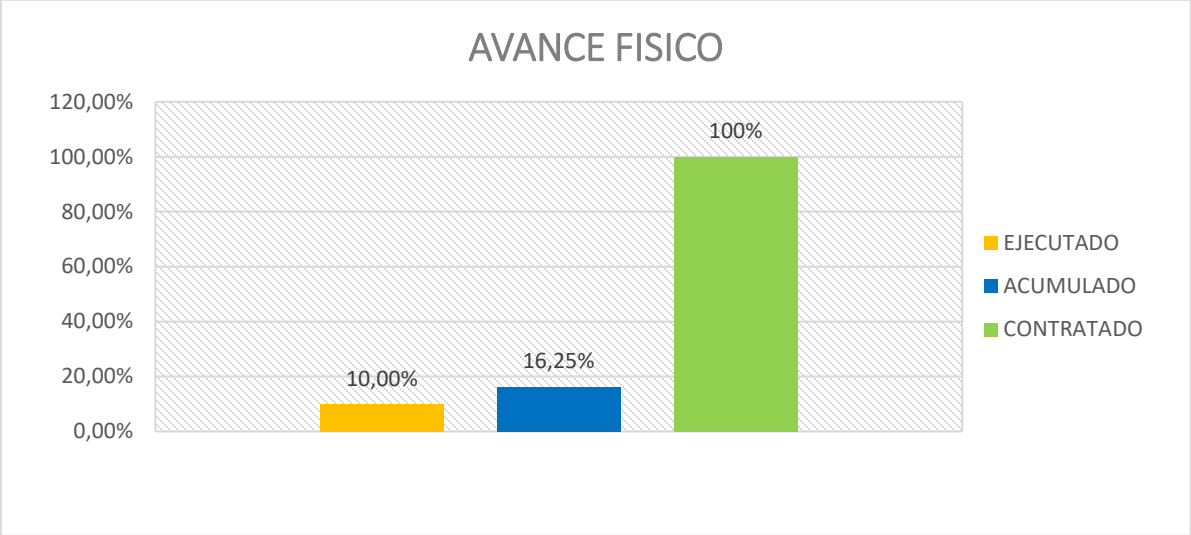

Control Financiero Inversión Anticipo de obra

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0051 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,656,614,670.00
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$ 2,828,307,335.00
CONTRATISTA:	FUNDACION AGUA LUNA
NIT:	900.345.569-5
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
NIT:	901.941.657-4

En la siguiente tabla lista de ítems en los cuales se programa invertir el anticipo de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	**MANO DE OBRA**				**$ 272,719,200**	**9.64%**
1.1	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	300	466,187	$ 139,856,100	*25.00%*
1.2	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	300	442,877	$ 132,863,100	*25.00%*
2	**TRANSPORTE**				**$ 270,078,900**	**9.55%**
2.1	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	300	558,018	$ 167,405,400	25.00%
2.2	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	300	342,245	$ 102,673,500	25.00%
3	**MATERIALES**				**$ 2,274,241,078**	**80.41%**
3.1	Ladrillo tipo bocadillo 5X10X20	UND	190,000	3,200	$ 304,000,000	41.67%
3.2	Ladrillo Macizo de 10*20*30 cm	UND	34,191	2,800	$ 47,867,854	46.20%
3.3	kit de herraje (0.73 m x 1.05 m)	UND	1,156	1,617,354	$ 1,869,661,224	100.00%
3.4	kit de herraje (1.00 m x 3.00 m)	UND	44	1,198,000	$ 52,712,000	100.00%
4	**GMF (4X1000)**				**$ 11,268,157**	
	TOTAL		-	-	**2,828,307,335.00**	**100%**

Control Financiero Inversión Anticipo interventoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO		
CONTRATO No	CI-0060-2025	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF	NIT. 901941657-4
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	
	$	409.937.150,00
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES	
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA	
SUPERVISOR	ING. KIANA RAFAELA VALBUENA MEJIA	
ANTICIPO (50%) :	$	204.968.575,00

PROGRAMACION INICIAL				
ITEM	DESCRIPCION / DETALLE	CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO	VALOR A EJECUJAR CON ANTICIPO	VALOR NETO A GIRAR
1	HONORARIOS PROFESIONALES	65%	$ 134.242.500,00	$ 134.242.500,00
2	TRANSPORTE	35%	$ 70.726.075,00	$ 70.726.075,00
TOTAL		100%	$ 204.968.575,00	$ 204.968.575,00

INFORMACIÓN TÉCNICA.

Se describen las actividades realizadas durante el periodo:

El equipo de trabajo basado en la programación de actividades proporcionado por el contratista, ha venido haciendo acompañamiento en la realización de talleres de socialización del proyecto, verificación de predios y construcción de estufas (anexo al final).

- **Socialización Del Proyecto**

Lugares: Municipios de Manaure, Riohacha (comunidades: Mongui y Mundo Nuevo), Maicao, Uribia (Nazareth) y La jagua del Pilar (2 socializaciones)

Participantes: Fundación Agua Luna, Unión Temporal Inter Ecoestuf, autoridades locales y comunidad.

Contenido: Presentación del objeto del contrato, alcance de las obras, programación y espacio para aclaraciones de los actores sociales

Observaciones: Se contó con la participación activa de la comunidad. Se resolvieron dudas generales y se establecieron canales de comunicación con los actores locales.

Manaure



Riohacha (Mongui)







Riohacha (Mundo Nuevo)





CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Maicao	
	
	

Uribia (Nazareth)	
	

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.



La Jagua del Pilar (socialización 1)	
	
	

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

La Jagua del Pilar (socialización 2)	
	
	

- **Construcción de estufas**

El proceso constructivo de las estufas ecoeficientes se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en el proyecto.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

- **Divulgación del proyecto**

Como parte de la estrategia de socialización y visibilizaciòn del proyecto de construcción de estufas ecoeficientes, se realizaron acciones de divulgación a través de medios de comunicación locales y redes sociales, con el fin de informar a la comunidad en general sobre el desarrollo y beneficios del proyecto.




Se beneficiarán familias de nueve municipios

Corpoguajira comenzará la entrega de 1.200 estufas ecológicas en el departamento de La Guajira

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, comprometida con el desarrollo sostenible del departamento, iniciará entrega de 1200 estufas ecológicas dirigidas a comunidades rurales de La Guajira.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover prácticas más sostenibles y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas en los municipios de Urbia, Manaure, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Villanueva y La Jagua del Pilar.

Las estufas ecológicas representan una solución innovadora que no solo contribuye a la conservación del medio ambiente, sino que también ofrece múltiples beneficios para las familias beneficiarias. En áreas rurales, estas estufas se presentan como una alternativa eficiente que reduce el consumo de leña y que disminuye la presión sobre los recursos naturales.

El director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, afirmó que uno de los principales beneficios de las estufas ecológicas es su capacidad para reducir la emisión de humo, mejorando la calidad del aire dentro de los hogares y por consiguiente la salud de sus moradores. Esto es especialmente crucial en regiones donde muchas familias cocinan con leña, lo que puede generar problemas de salud respiratoria. También permiten mejores condiciones de higiene y salud y, sobre todo, la disminución de la contaminación atmosférica, al reducir las emisiones del material particulado y gases que inciden directamente en el calentamiento global', agregó.

Igualmente dijo que se mejora la eficiencia en los procesos de cocción de alimentos empleados por las familias en las áreas rurales cuyas labores domésticas ahora son más fáciles, ya que antes cocinaban en fogones tradicionales sobre estructuras muy frágiles que requerían reparaciones diarias, además de tener que lidiar con el humo.

Advierte la Corporación que las estufas se presentan como una alternativa eficiente que reduce el consumo de leña

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

Durante el periodo de interventoría, se llevó a cabo el seguimiento técnico, administrativo y social al desarrollo del proyecto, cumpliendo con las actividades programadas tales como las jornadas de socialización con las comunidades beneficiarias, las visitas de verificación de predios, y la construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático.

Las socializaciones permitieron garantizar la apropiación del proyecto por parte de la comunidad, así como la resolución de inquietudes frente a los objetivos y alcances del mismo. Las visitas de campo permitieron verificar las condiciones físicas y técnicas de los predios seleccionados, asegurando la viabilidad para la instalación de las estufas. Finalmente, la construcción de las estufas se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas, verificando la calidad de los materiales utilizados y el cumplimiento de los diseños, asegurando así su funcionalidad y durabilidad.

En general, las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado evidencian un avance positivo en la ejecución del proyecto, con resultados favorables tanto desde el componente técnico como social, recomendando continuar con el seguimiento riguroso de las fases restantes para garantizar el cumplimiento total de los objetivos planteados.



LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY
Interventor
UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF	VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:			

DESARROLLO DE VISITA

Se realiza visita de verificación de la construcción de las estufas según las especificaciones técnicas, en Compañía de los contratistas fundación agua luna, en donde se evidencio la construcción de 70 estufas Distribuidas de la siguiente manera: en Distracción se construyeron 24 estufas, en Barrancas 2, en Villanueva 30, en Hatonuevo 8 y en Uribia 6.

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)	Observaciones
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI	
2	Tercera hilada con registros (cenizas y tiro 18 cm c/u), el registro del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI	
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI	
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI	
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI	
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI	
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI	
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI	
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI	
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI	
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI	
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI	

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)	Observaciones

2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI	
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI	
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI	
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI	
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI	
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI	
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI	
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI	
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI	
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI	
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI	
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI	
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI	
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI	
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI	
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI	

EVIDENCIA





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS













UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS






DISTRACCION








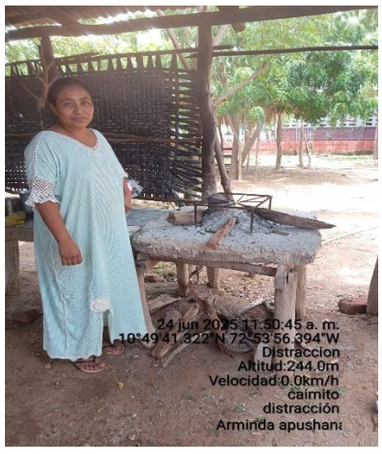




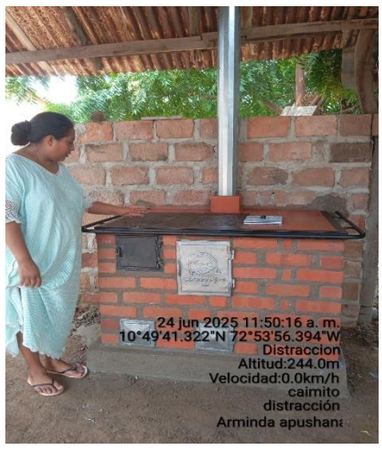


UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF


VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

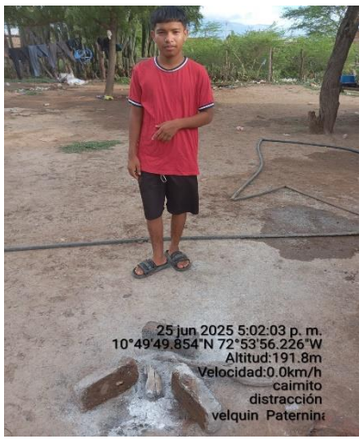






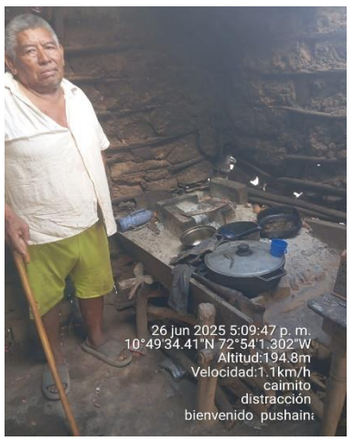

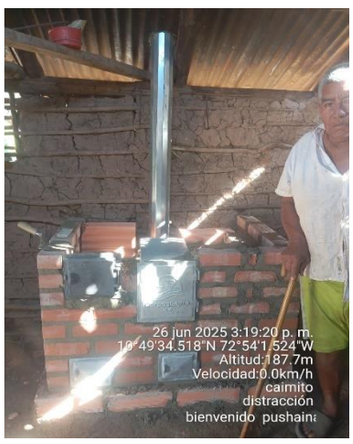

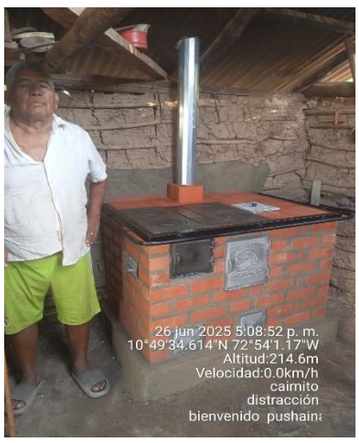













UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS
















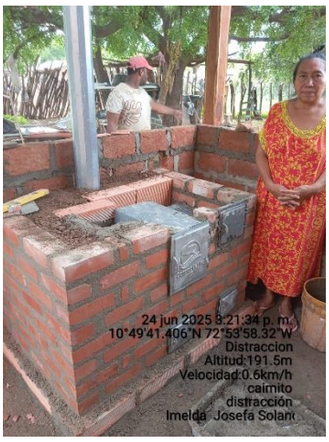









UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS
























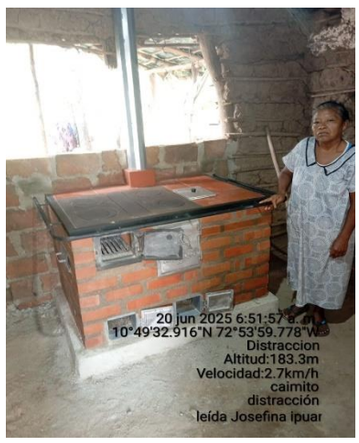

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS














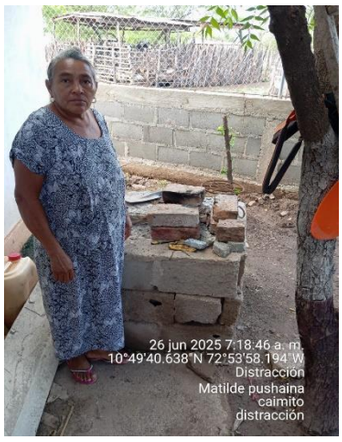











UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

























UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS













VILLA NUEVA














UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

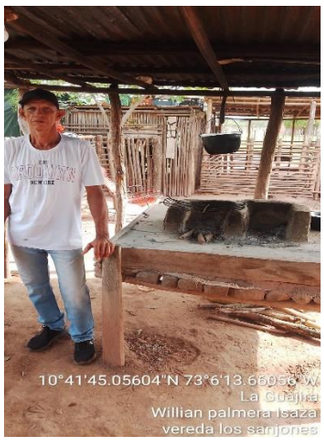























UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS






















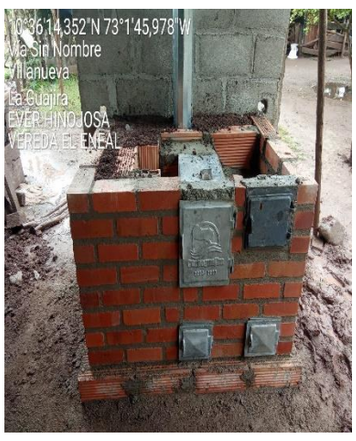



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

























UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS












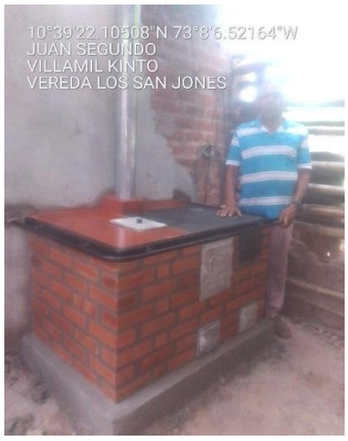














UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS



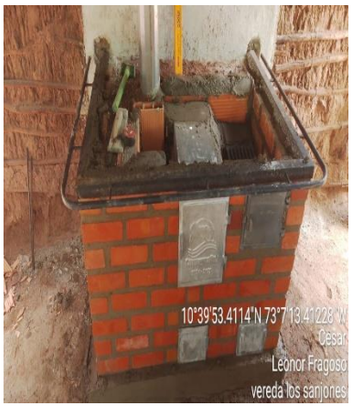





















UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

























UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

























UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF


VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

HATO NUEVO








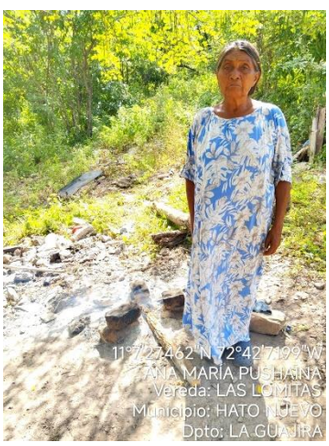



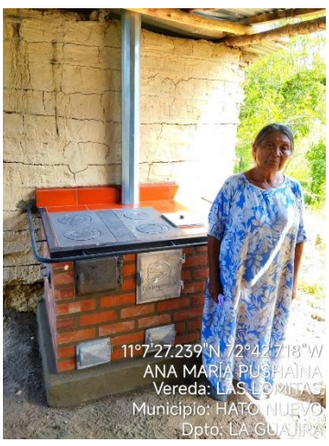









UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

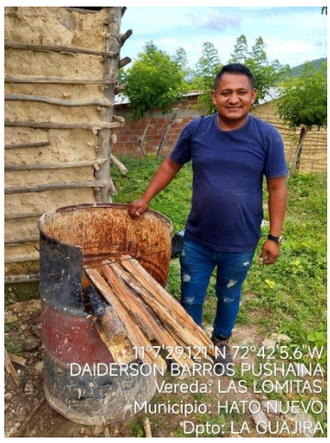






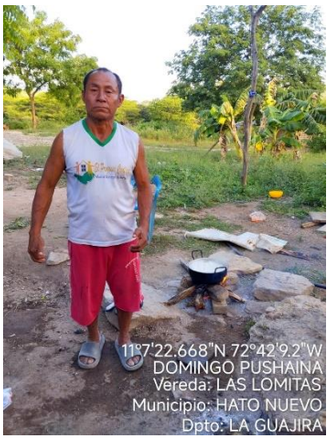



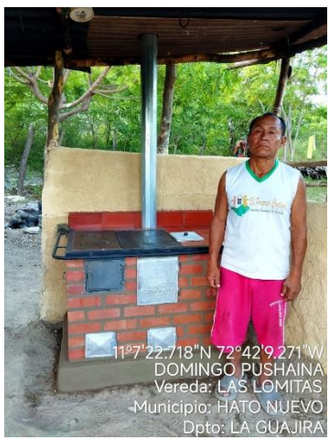













UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

URIBIA

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS


























UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

BARRANCAS



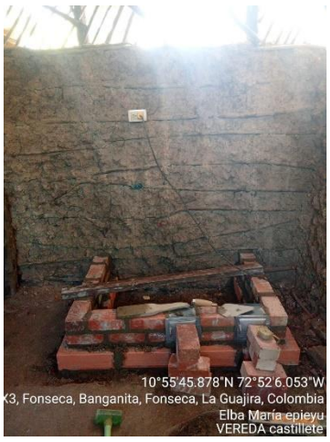









ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luisa Fernanda guerra	Ingeniera	
Yeimer Montier Guerra	Ingeniero	

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

ACTA DE VISITA DE OBRA Y SEGUIMIENTO DE CONTRATO

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
OBJETIVO:	HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA VERIFICACIÒN DE PREDIO DEL BENEFICIARIO		
LUGAR:	RIOHACHA (MONGUI)		

DESARROLLO DE VISITA

Se realiza visita de verificación de predio en el corregimiento de Mongui del distrito de Riohacha en compañía del técnico encargado el señor Aifer Argote, con el fin de constatar las condiciones físicas necesarias para la instalación de la estufa ecoeficiente. Se revisaron aspectos como:

- Que el predio este habitado.
- Que cuente con una pared de soporte para la construcción de la estufa
- Que cuente con techo de cubierta para la estufa
- Disponibilidad y aceptación del beneficiario para participar en el proceso constructivo

Donde se pudo constatar que estos beneficiarios cumplen con los requisitos para adquirir dicho beneficio.





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

ACTA DE VISITA DE OBRA Y SEGUIMIENTO DE CONTRATO









PLANILLA DE ASISTENCIA A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROYE

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 24-06-2025 **LUGAR:** Maicao

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Nelda Panza	26.993.904	predio El Edén	3014379813	
2	Ruth Ferreira	57403 949	Ruth Ferreira	3186988968	Ruth Ferreira
3	JAIME SOLANO	72176026	COMINGO	3107048070	Jaime S.
4	Flores Goya	92671023	Hungría	3135654989	Flores
5	Zenaida	40951681	Las esperanza	B14701519b	Zenaida
6	AGRIPINA GONZALEZ	27041664	La esperanza	3277554336	AGripina
7	Yenna del Carmen T	36058752	los Angeles	3135744332	Yenna T.
8	María Angela Epieyu	40.951 707	El Sabroson	3216713737	Maria Angela.
9	Eva Beltral	33000037		2792660040 14	Eva Beltral
10	Bambas Fernandez	~~310~~ 1124011245	La Salvación	3104343310	
11	Yesika epieyu	1134177183	La Salvación	3205132683	Yesika E.
12	Martin Herino	12395704	La Salvacion	3145639595	Martin M.
13	Carlos Cholen O	91.201.053	Villa Kayla	3008897445	

Carl

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 24-06-2025 **LUGAR:** Maicao

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	SUER SARRAOTH. S	84069916	maicao	3145892123	
2	Jhon ARGÜELLES	84071283	MAICAO	3145572756	
3	Hugo Dial Rivera	84070519	Maicao	3008477779	
4	Orlando Arteaga	8698906	Maicao	3017700753	
5	Renalda Pineda	40951680	La esperanza	3147015168 1	Renalda
6	AGripina Gonzalez	27041664	La esperanza	3217554386	AGripina-G
7	Octavio Ariza	1784145	Carraspera	3024647948	Octavio Ariza
8	Jael Ariño	77021108	Maicao	3157259930	Jael Ariño
9	Luis Montaño	1124008123	Morrocona	3244548089	
10	Rosa Juana Sapma	56.062.239	Morrocona	3244548089	No firma
11	Fredy Quintero	8699917		3015478401	
12	Eugenio SALAS O	84.005.164	MORROCONA	304 3626076	
13	Ismenia Pogarro	1124029790	La nueva Nicolas	3044284292	Ismenia

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	COMUNIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Elis Viviana Linero	1010009870 4	Monguí	3104191575	Elis Linero M.
2	Rosa Linero	36722663	Monguí	3122465540	Rosa Linero
3	Manuel Armenta Ortiz	40797268	Monguí	3114092279	Manuel Armenta
4	Rosa Atlas	26962691	Monguí	3167321137	
5	MARIA RIVERA	40.930.314	Monguí	3205125845	MARIA RIVERA
6	Yris M Acosta	40975138	Monguí	3108592498	Yris M Acosta
7	Yarelmis Avila R	40.920.062	Monguí	3126970368	Yarelmis Avila
8	Yaimy Avila Rodriguez	40.927.918	Monguí	3137287749	Yaimy Avila
9	Octavia Rodriguez Vega	26.975.224	Monguí	3134501154	Octavia Rodriguez
10	Clara lowdi Avila	40972340	Monguí	3145581662	
11	Marquesa Romero	26.967.535	Monguí	3126757440	
12	Mireya Avila	40922135	Monguí	3135411602	Mireya Avila
13	Yaqueline PERIÑO	33.214.455	Monguí	3128692354	
14	Carmen Labrador	39.490.216	Monguí	3102629191	Carmen Labrador
15	Osiris Davila	57.304.215	Monguí	3127688367	Osiris Davila
16	Isolda medina deluque	26.960 878	Monguí	3113634965	Isolda medina d.
17	Cindy lora Vargas	1123406975	Monguí	3129697693	Cindy lora v.

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL ECOESTUF INTER

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	COMUNIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Olga carolina Amaya		Mongui	3225989752	
2	Alba luz Uelora	1118822794	Mongui	3128847704	Alba u.lo a
3	Ada luz Deluque	40914726	Mongui	3128847704	Ada luz
4	Oneida Miranda	40917215	Mongui	3127873381	Oneida Miranda
5	Carmen Reynoso	1006573431	Mongui	3127873381	Carmen Reynoso
6	Enaluz Camargo	26.975144	Mongui	3104714165	Ena luz Camargo.
7	Elvira Medina	26965776	Mongui	3233407126	Elvira [redacted]
8	Maria Leonor Perez	25887468	Mongui	3137299216	[redacted]
9	Albis Maria Brito A	27004220	Mongui	3218215465	Albis M Brito Alvarez
10	Aliris del carmen	3122188060	Mongui	40929469	Aliris Deluque
11	Maria perez Bellon	3147672276	Mongui	40934288	Maria Perez
12	Rosaura DAZA	3135284769	Mongui	40918073	Rosaura Daza
13					
14					
15					
16					
17					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	COMUNIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Concepcion mendoza.	12445965	Mundo Nuevo	3138281176	Concepcion mendoza
2	Eloy Brito	321598545	Mundo Nuevo	3177225215	Junio 11 - 2025.
3	Yolanda Fonseca.	65792045.	Mundo Nuevo	3126572247	Junio 11 - 2025.
4	Jacito Barrios	X	Mundo Nuevo	3108493491	Jacito Barrios
5	Estefania [illegible]	X 1161289 on	Mundo nuevo		
6	[illegible]	12386416	Mundo Nuevo	3126907[illegible]	3014654337
7	Niseluis Narvaez	40937070	Mundo Nuevo	3148654806	Niseluis Narvaez
8	presentacion sidrack Cua	26765744	Mundo Nuevo	3116639952	[illegible]
9	Wilfredo Hugues	5742595?	Mundo Nuevo	3005391925	[illegible]
10	Edgardo Molina P.	77.030.084	Mundo Nuevo	3011699624	Edgardo Molina P.
11	Edilberto M Guevara.	19531815	Mundo Nuevo	3116869[illegible]	[illegible]
12	Jose Rodulfo	3158699	Mundo Nuevo	3132383362	[illegible]
13	Antonia Daza Carrillo	27014408	Mundo Nuevo	3116899320	[illegible]
14	[illegible]	89474203	Mundo Nuevo	3009548034	[illegible]
15	Gregorio Julio Diaz	10902928	Mundo Nuevo	3235099926	[illegible]
16	Oscar David Suarez V	84068396	Mundo Nuevo	3207599495	[illegible]
17	Ulices A Plata	84037057	Mundo Nuevo	3186067615	[illegible]

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	COMUNIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Edgar Mendoza	19588265	Mundo Nuevo	3114123188	Edgar Mendoza
2	Luis Barrios P	323426548	Mundo Nuevo		Luis Barrios P
3	Alberto P	77.227877	Mundo Nuevo	3233108	Alberto P
4			Mundo Nuevo		
5	Luzdelis.	40936444	Mundo Nuevo	3294894781	Luzdelis.
6	Andres Rojano	19505317	Mundo Nuevo	3135756924	Andres Rojano
7	Guzman P Cortes	84083.336	Mundo Nuevo	3235100862	Guzman Cortes
8	Vilma Dugomolaes	57423937	Mundo Nuevo.	3015720633	Vilma Dugo
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL ECOESTUF INTER

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 19 - Junio - 2025 LUGAR: la Jagua del pilar

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Ciro Raul Duron	77013507		3135190183	
2	ISidora Romero Bolcazar	27014794		3015164966	Isidora Romero B
3	ENedis Moron M	26870717	La Jagua del Pilar	3157266220	
4	Julio Amaran Soto	5173.331		3008875555	
5	Jose Javier Pinto Tobias	1194816996		3156997517	Jose J. Pinto T
6	Arnaldo Iayo Payo	5.173294	La Jagua	3107142209	
7	Wilston Iayo Iayo	5773296	La Palmito	3177496265	
8			La Jagua	37	
9	Jesus E Ruiz	5092474	La Jagua del K.17	3122240290	
10	Carlos Alberto Herrera	1065 202 934	la Jagua del Pilar	310 661 0462	Carlos Herrera
11	Enis Moron Mendoza	26871015	la Jagua del pilar	3152612177	Enis Moron M
12		5173756		3001038793	
13	Carlos Alfonso Estrada	12.723.124	la jagua pilar	3136973372	
14	Jose Antonio Rumbo	19356316	La Jagua	3207178324	Jose Antonio R.
15	Francia Yaneth R.	27017101	La Jagua	3135922154	Francia Yaneth R.
16	Dalia Nora C.	49.276.134	P. Jac. Berlin		Dalia Nora
17	Moises David Aponte	1067597049	P Jac Berlin	3235751925	Moises Aponte

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 19 - junio - 2025. LUGAR: la jagua del pilar

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Hairelis Lopez	5345428		3113667650	Hairelis Lopez
2	Hernando Pacheco M	6 794 437		3126833133	
3	LENIN SIERRA M	84.077.399		3014019792	
4	Eder R. Morón V.	84.101.309		3005197861	
5	Luis Ortiz	1.119.817.388		302 590 9195	
6	Rafael Ustariz	17976710	J.A.C	3135962574	Rafael Ustariz
7	Armando Luis Lagares	5174964		3226662774	Armando Lagares
8	Yelis Quintero Torres	1124050965		3008741732	Yelis Q.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucionesIvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 26-Junio - 2025 LUGAR: La Jagua del Pilar

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Esther Mariana Ustáriz	27015548	Pimienta la peña	3133490757	Esther Ustáriz
2	Jose J. Ustariz Peralta	15786301	Villa Horizonte	3007074982	
3	Luis Guillermo Rumbos	79970372	El Encanto	3008825040	Luis Rumbo
4	Julio A martinez SOTO	5173.331	villa Patri	3002875555	
5	Diares Zabala	1065663564	Villa Cienaguera	3126616885	
6	Erika Zabala	39142077	Villa Cienaguera	3126616885	Erika Zabala
7	Andres niño zabala	1004162945	villa cienaguera	3136680560	Andres
8	Atilia Fernandez	5087345	Finca la peña	3167613492	Atilia Fernandez
9	Wiston Lagolago	5773290	El Encanto	3774962665	
10	Ciro Raul Doron	77013507	La Brecha	3135190183	
11	Analedy Lugo Lugo	5173294	Eden	3107142209	
12	Manuel Alberto Lugo D	17972081	Vereda el pinto	3229237844	
13	Yedis Lugo Cantillo	42491575	San Benito	3186174628	
14	Yileth lopez lugo	49605480	San Benito	3162836986	
15	Victor medardo Sotelo	815893	la jagua	3135308673	
16	Leidys NIÑO	1122198 2352	Villa Cienaguera	3008885900	Leidy N.
17	Alvaro moises martinez	77026 868.	villa Gouí	3007439718	Alvaro Martinez

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 26 - Junio - 2025 **LUGAR:** La Jagua del Pilar

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Ottoniel Pinto Jago	17974459	Parcela el Juguete	3215606075.	
2	Francia Elena Suárez	27.017.701	La visita	3114121674.	
3	Luis Mario M	5.173.198	Villa Claudia	3226754894	
4	Rafaela Fca Duran	394[illegible]5023	Villa Franca	3157422446	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Juan Rufino Morales Uriana	5.183.422	Santa Rosa	3116042891.	
2	Casilda Montiel	40843089	Santa Cruz (colegio	3135816976.	
3	Estela Amaya Gonzalez	40977036	uuuliwou	3116685332.	
4	Cerafino Paz Palmar	40977929	Monte rey	3226027041	
5	Omaira Fernandez	40847630	Uganaipa	3233186885	
6	Nectario Gonzalez Pausaiyu	5.190201	kajashiwou	3128540408	
7	Rafael Antonio Gonzalez Bueno	17.869817.	Guanaipa.	3110375541.	
8	Clemente Iguaran	84.044051	Jasariru	3145584904	
9	Maira Angela Gonzalez	27.032851	Jalalou.		
10	Aido Iguaran Gonzalez	40833420	Jalalou	3116903797..	
11	Marciano Montiel	5.182822	Santa Rosa.		
12	Indira Yuraima Uriariyu Montiel.	1006916330	Jasariru. colegio	3233475150	
13	Maritza Gonzales Suarez	40843.606	Uchipa.	3103994637	

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Erercio libardo Gonzalez	1006915 319	Uchipa	3144049882	Erercio Glez.
2	Orlando Gonzalez Prieto	5184931	Nazareth.	312 629 9822.	Orlando Pro.
3	Nonis - Nonilis - Gonzalez	1006915. 513	Uchipa	3123356413	Nonis Gonzalez
4	Marta Iborra	27022965	Nazareth.	3205060694.	Marta Iborra
5	Cira Elena Ipuana	40833229	UCHIPA	3127801408	Cira Elena Ipuana
6	Alicia Neisy Gonzalez	40.841.698	Uchipa	3215968706	Alicia Gonzalez
7	Ana. Ligia Luna Perez	21.990192	Institución Educativa Nazareth	3202168274	Ana Ligia Luna Perez
8	Antonio Jose Iguaran Uria	84.042340	Guarapa	3114291506	
9	Jose María Uriariyu	5190121.	Jasarirú.	3146015952	
10	Joaquin palmar Javariyu	17875104.	Chamalú	3107138252.	Joaquin Palmar
11	Rafael Segundo Prieto.	1.124.479.359.	Colegio Monterrey.	3145041050.	
12	Isabel Afanador Prieto	20.196.082	Nazareth	323528 3699	Isabel Afanador P.
13	Carmita Palmar G.	40.833001	Colegio Santa Rosa	3208815767	Carmita P.

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 23-06-25 **LUGAR:** Menaure

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Danilo	1.124.402.542	Urina	3136522776	Danilo
2	Carmen Uriana Epinayu	40975079	Urina	3018310370	
3	Enrique Epinayu	17828732	Urina	3046787225	
4	Jonira Felicia Apushana	56691188	Urina	3046787225	Jonira
5	Ramon S Bernal	5490425	Urina	3052745770	
6	Vicente Uriana	5141871	Urina	3052745770	
7	Rosa pushaina	26960778	Urina	3052745770	
8	Neli Uriana Epinayu	40848924	Urina	3052745770	Nels
9	Marilz uriana pushaina	1124378363	Urina	324622749	
10	Carmelina Aguilar Epieyu	56704377	Urina	3235537712	
11	Rosaura uriana Gomez	56092265	Urina	3235537712	Rosaura Uriana
12	Cristobal uriana Aguilar	8.4041.413	Urina	3205974027	
13	Argenida Epieyu U.	1192906095.	Urina	3006013410	Argenida.

CLL 18 NO. 7-35 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 23-06-25 **LUGAR:** Menaje

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Comunidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Cladiz Arpushana	1095544668	Urina		
2	Maria Elena Uriana	56081796	Urina		
3	Rosendo Uriana	1794798 85	Urina		Rosendo Uri
4	Vicente Uriana Uriana	84107097	Urina	3006375410	
5	Sandra Milena Aguilar	56102415	Urina	3177466914	
6	Bernardo Aguilar Epieyu	84046225	Urina		Bernardo Epieyu
7	Yolibeth Aguilar Epieyu	192.737.687	Aguilar, Urina	3147970618	Yolibeth
8	Esther Arpushana Epieyu	56102307	Urina		
9					
10					
11					
12					
13					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 23-06-25 **LUGAR:** Murmure

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Francisco Alberto Uriana	1006743826	Urina	3006013410	Francisco Alb.
2	Yeyo uriana epinayu	84077751	Urina	3018717173	
3	Alfredo Epinayu	17828749	Urina		
4	Juan uriana epinayu	84077525	Urina	3243924655	Juan uriana
5	Javier Enrique puana uriana	1124036746	Urina		
6	Jhonatan Aguilar	84069413	Urina		
7	Benvenido Aguilar Uriana	84041414	Urina		Benvenido
8	Jose Uriana Pushaina	1124378366	Urina		
9	Claudina Gonzalez	1006894769	Urina	3023527291	Claudina Gonzalez
10	Hilda maria pana fernandez	56690249	Urina		
11	Gilberto Uriana pushaina	1124378167	Urina	3052129599	Gilberto
12	Carla Felix Uriana Epi	1124184449	Urina	3052104756	Carla
13	Maria Ines Aguilar Uriana	40979708	Urina		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941657	4	UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 18 7-85	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3014373959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	87236581	9487236581	E	2025/07/14	2025/06/10	BANCO AV VILLAS	0	$4,117,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$15,570,500	$2,491,400			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$379,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (7 Afiliados)						$15,570,500	$2,491,400			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$379,600		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (7 Afiliados)						$15,570,500	$2,491,400			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$379,600		$0	$0
1	CC	40951297	AMAYA ZUNILDA	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF30	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$42,700	30	$0	$0
2	CC	84090164	BRITO CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
3	CC	1118806268	CARDOZO SAMIR	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF30	30	$2,750,000	$110,000	14-23	30	$2,750,000	$67,000	30	$0	$0
4	CC	1118838660	DIAZ LORAINIS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS041	30	$2,800,000	$112,000	CCF30	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$68,300	30	$0	$0
5	CC	1118800355	MEJIA MARIANNE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
6	CC	40928933	PIMIENTA BIELCA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF30	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
7	CC	1124409653	SOTO YENIFER	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$15,570,500	$2,491,400			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$623,000			$15,570,500	$379,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941657	4	UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 18 7-85	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3014373959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	87236581	9487236581	E	2025/07/14	2025/06/10	BANCO AV VILLAS	0	$4,117,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,491,400	$0	$0	$2,491,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,623,600	$0	$0	$1,623,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$379,600	$0	$0	$379,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$379,600	$0	$0	$379,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$623,000	$0	$0	$623,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	7	$623,000	$0	$0	$623,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$623,000	$0	$0	$623,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$169,000	$0	$0	$169,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,000	$0	$0	$70,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$327,000	$0	$0	$327,000
TOTAL				7	$4,117,000	$0	$0	$4,117,000
