ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 11 Del: 12 de abril de 2025 Hasta: 18 de abril de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 71 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	13,22%	55,22%	Obra Física Ejecutada (%):	13,00%	53,00%
Valor básico Obra programada:	$ 43.827.117,98	$ 183.066.070,70	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 43.097.771,08	$ 175.706.297,48

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Informe de Actividades Semanales
Periodo: del 12 de abril al 18 de abril de 2025

Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”, Item 4 : “Suministro y vaciado de concreto clase d f´c =3000 psi (Bases) ”, Item 5 : “Suministro y vaciado de concreto Ciclopeo clase g f´c =2000 psi,40% rajon para bases ”; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi ”estas actividades abarcan una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 13% con respecto a lo programado correspondiente al 13,22%.

OBSERVACIONES

Descargue y acopio de cemento: Se realizó el ingreso a obra de cemento Portland tipo UG, marca HOLCIM, en presentaciones de 50 kg por unidad. Descargue y acopio de Material pétreo: se realizó el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA













ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Publicas
Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 12 Del: 19 de abril de 2025 Hasta: 25 de abril de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 78 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	12,00%	67,22%	Obra Física Ejecutada (%):	11,00%	64,00%
Valor básico Obra programada:	$ 39.782.557,92	$ 222.848.628,62	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 36.467.344,76	$ 212.173.642,24



CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Informe de Actividades Semanales
Periodo: del 19 de abril al 25 de abril de 2025
Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”, Item 4 : “Suministro y vaciado de concreto clase d f´c =3000 psi (Bases) ”, Item 5 : “Suministro y vaciado de concreto Ciclopeo clase g f´c =2000 psi,40% rajon para bases ” ; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi , estas actividades abarcan una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 11% con respecto a lo programado correspondiente al 12%.

OBSERVACIONES

Se realizó descargue y acopio de cemento de material pétreo.
Ensayo de asentamiento (slump) y toma de muestras de concreto: Se efectuó el ensayo de asentamiento (slump) del concreto fresco utilizando el cono de Abrams, con el fin de verificar que la mezcla cumpliera con las especificaciones de diseño. El resultado fue registrado en centímetros y pulgadas, y utilizado como criterio de aceptación previo al vaciado del concreto en los elementos estructurales. Asimismo, se realizó la toma de cinco cilindros de concreto fresco durante el vaciado. Las muestras fueron debidamente identificadas y almacenadas bajo condiciones controladas, con el fin de ser ensayadas a compresión a edades de 7, 14, 21 y 28 días, verificando así el cumplimiento de la resistencia especificada en el diseño estructural.

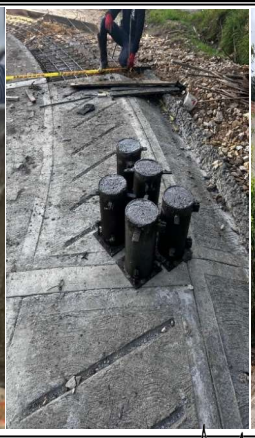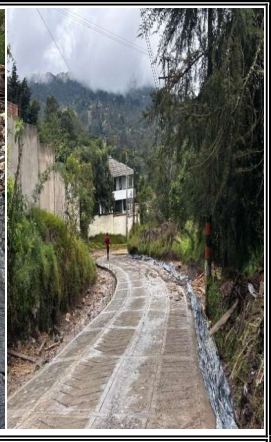


ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 13 Del: 26 de abril de 2025 Hasta: 2 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 85 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	10,00%	77,22%	Obra Física Ejecutada (%):	5,00%	69,00%
Valor básico Obra programada:	$ 33.152.131,60	$ 256.000.760,22	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 16.576.065,80	$ 228.749.708,04

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Informe de Actividades Semanales

Periodo: del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2025

Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”, Item 4 : “Suministro y vaciado de concreto clase d f´c =3000 psi (Bases) ”, Item 5 : “Suministro y vaciado de concreto Ciclopeo clase g f´c =2000 psi,40% rajon para bases ; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi, estas actividades abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 5% con respecto a lo programado correspondiente al 10%.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA









ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 14 Del: 3 de mayo de 2025 Hasta: 9 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 92 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	1,19%	78,41%	Obra Física Ejecutada (%):	1,00%	70,00%
Valor básico Obra programada:	$ 3.945.103,66	$ 259.945.863,88	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 3.315.213,16	$ 232.064.921,20

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Informe de Actividades Semanales
Periodo: del 03 de mayo al 09 de mayo de 2025
Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi, estas actividades abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 1% con respecto a lo programado correspondiente al 1,19%.

OBSERVACIONES

Se realizó una limpieza general en el área de intervención, procediendo con la recolección y retiro de sacos vacíos de cemento, plásticos, varillas sueltas, cintas de señalización en mal estado, material pétreo disperso y demás residuos generados durante la ejecución de la obra, con el fin de mantener el frente de trabajo en condiciones óptimas de orden y seguridad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA









ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 15 Del: 10 de mayo de 2025 Hasta: 16 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 99 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	1,00%	79,41%	Obra Física Ejecutada (%):	2,00%	74,00%
Valor básico Obra programada:	$ 3.315.213,16	$ 263.261.077,04	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 6.630.426,32	$ 245.325.773,84

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Informe de Actividades Semanales

Periodo: del 10 de mayo al 16 de mayo de 2025

Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”, Item 4 : “Suministro y vaciado de concreto clase d f´c =3000 psi (Bases) ”, Item 5 : “Suministro y vaciado de concreto Ciclopeo clase g f´c =2000 psi,40% rajon para bases ; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi, estas actividades abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 2% con respecto a lo programado correspondiente al 1%.

OBSERVACIONES

Descargue y acopio de cemento: Se realizó el ingreso a obra de cemento Portland tipo UG, marca HOLCIM, en presentaciones de 50 kg por unidad. **Descargue y acopio de Material pétreo:** se realizó el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA









ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 16 Del: 17 de mayo de 2025 Hasta: 23 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 106 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	2,00%	81,41%	Obra Física Ejecutada (%):	2,00%	76,00%
Valor básico Obra programada:	$ 6.630.426,32	$ 269.891.503,36	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 6.630.426,32	$ 251.956.200,16

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Informe de Actividades Semanales

Periodo: del 17 de mayo al 23 de mayo de 2025

Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”, Item 4 : “Suministro y vaciado de concreto clase d f´c =3000 psi (Bases) ”, ; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi, estas actividades abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 2% con respecto a lo programado correspondiente al 2%.



OBSERVACIONES

Descargue y acopio de Material pétreo: se realizó el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.

Ensayo de asentamiento (slump) y toma de muestras de concreto: Se efectuó el ensayo de asentamiento (slump) del concreto fresco utilizando el cono de Abrams, con el fin de verificar que la mezcla cumpliera con las especificaciones de diseño. El resultado fue registrado en centímetros y pulgadas, y utilizado como criterio de aceptación previo al vaciado del concreto en los elementos estructurales. Asimismo, se realizó la toma de cinco cilindros de concreto fresco durante el vaciado. Las muestras fueron debidamente identificadas y almacenadas bajo condiciones controladas, con el fin de ser ensayadas a compresión a edades de 7, 14, 21 y 28 días, verificando así el cumplimiento de la resistencia especificada en el diseño estructural.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

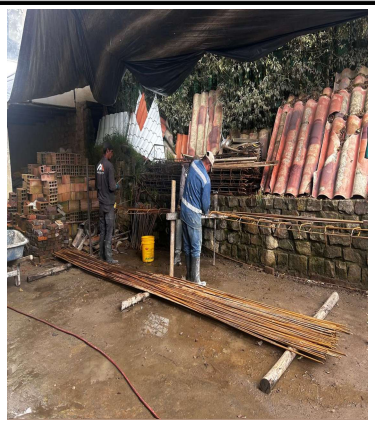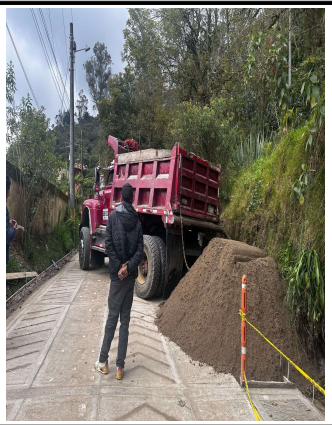

ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ALCALDÍA DE LA CALERA	**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA**	**Código**	**IOP-F-21**
		Versión	**1**
		Fecha	**8/04/2024**
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	**Página 1 de 1**	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	**S.G.C**	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 17 Del: 24 de mayo de 2025 Hasta: 30 de mayo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 113 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	2,00%	82,41%	Obra Física Ejecutada (%):	4,00%	80,00%
Valor básico Obra programada:	$ 6.630.426,32	$ 273.206.716,52	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 13.260.852,64	$ 265.217.052,80

		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

Informe de Actividades Semanales

Periodo: del 24 de mayo al 30 de mayo de 2025

Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”, Item 4 : “Suministro y vaciado de concreto clase d f´c =3000 psi (Bases) ”,item 5 “Construccion de ciclopeo de concreto clase G,2000 psi 40% rajon para bases,fundida en el lugar ”, item 6 “Construccion de cuneta de concreto clase e,2500 psi,fundida en el lugar ”,; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi, estas actividades abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 4% con respecto a lo programado correspondiente al 2%.

Demolición y escarificación de placa existente, para la construcción de un módulo de riel y ciclópeo para empalmar con placa huella existente. Descargue y acopio de cemento: Se realizó el ingreso a obra de cemento Portland tipo UG, marca HOLCIM, en presentaciones de 50 kg por unidad. El material fue descargado y almacenado en el área designada para materiales, sobre estibas de madera, protegidas de la humedad y con adecuada ventilación. Este procedimiento se ejecutó conforme a las recomendaciones del fabricante y a las normas técnicas vigentes para el almacenamiento de materiales cementantes.

Descargue y acopio de Material pétreo: se realizó el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.









ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 18 Del: 31 de mayo de 2025 Hasta: 6 de junio de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 120 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	3,00%	86,41%	Obra Física Ejecutada (%):	2,00%	81,60%
Valor básico Obra programada:	$ 9.945.639,48	$ 286.467.569,16	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 6.630.426,32	$ 270.521.393,86

		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	331.521.316,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	CIENTO TREINTA Y CINCO DIAS (135)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	viernes, 22 de agosto de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

Informe de Actividades Semanales

Periodo: del 31 de mayo al 06 de Junio de 2025

Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”,,item 5 “Construccion de ciclopeo de concreto clase G,2000 psi 40% rajon para bases,fundida en el lugar ”, item 6 “Construccion de cuneta de concreto clase e,2500 psi,fundida en el lugar ”,; Item 7 : “Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi, estas actividades abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 2% con respecto a lo programado correspondiente al 3%.









ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Director de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas
