
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CICHM412 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 4

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y ALGECIRAS - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

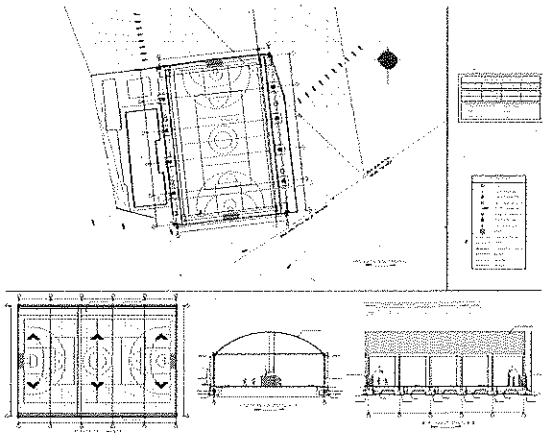

MUNICIPIO: GIGANTE – HUILA.

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CICHM412 de 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA


APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. JUAN FELIPE ALARCON	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CICHM412 de 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y ALGECIRAS - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**PERIODO DEL INFORME**	**Entre 01 al 30 de noviembre de 2024**
CONTRATISTA	WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	**NIT:**	80.926.744-7
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A	**C.C:**	80.926.744
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	14/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	05/12/2023		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A		
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES		
VALOR INICIAL:	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($78.095.342,00) M/CTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS (29/10/2024).		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.		
VALOR TOTAL:	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($78.095.342,00) M/CTE		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	418 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL MONTALVO, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO GIGANTE C&M	**NIT:**	901.774.181- 4.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO	**C.C:**	7.711.971
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	22/11/2023		

FECHA DE INICIO (D/M/A):	05/12/2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS (29/10/2024).
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($495.688.780,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($45.149.820,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($540.838.600,00) M/CTE


3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Gigante, departamento del Huila; Gigante es un municipio ubicado en el departamento de Huila. Esta localizado al centro oriente. Hace parte de la región andina, sobre la margen izquierda del rio Magdalena entre la cordillera occidental y el cerro Matambo. Su extensión territorial es de 626 km2, su altura es de 860 msnm y su temperatura promedio es de 24 °C.
El casco urbano del municipio está localizado en la parte noreste del departamento (Región Sub-centro). Su economía se basa principalmente en el sector agrícola (principalmente café y cacao), la ganadería, piscicultura, la extracción de petróleo y generación de energía eléctrica; ya que es parte del área de influencia de la represa del Quimbo con un 43,91 % (Porcentaje del embalse o cuenta en el área del municipio). Es conocida como «Capital Cacaotera del Huila».
El proyecto es en el Colegio Agrícola; Este colegio está ubicado dentro del casco urbano del municipio de Gigante, para acceder se debe tomar la calle 4 hacia el oriente, hasta llegar a la carrera 15, las vías son pavimentadas, y se considera de fácil acceso.

HUILA EN COLOMBIA

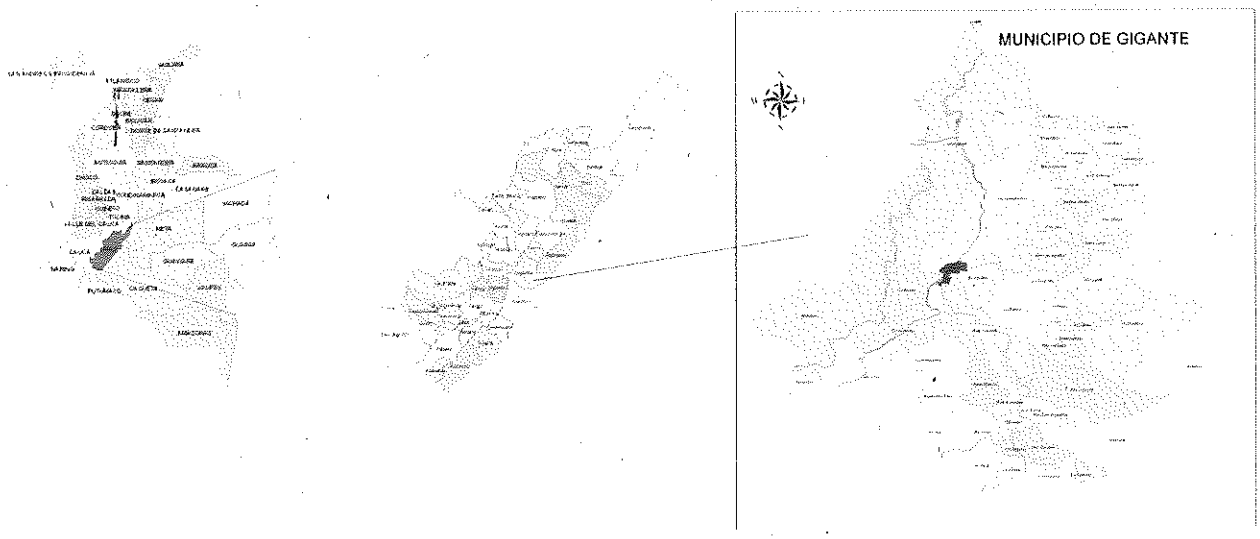

Fuente 1 Gobernación del Huila

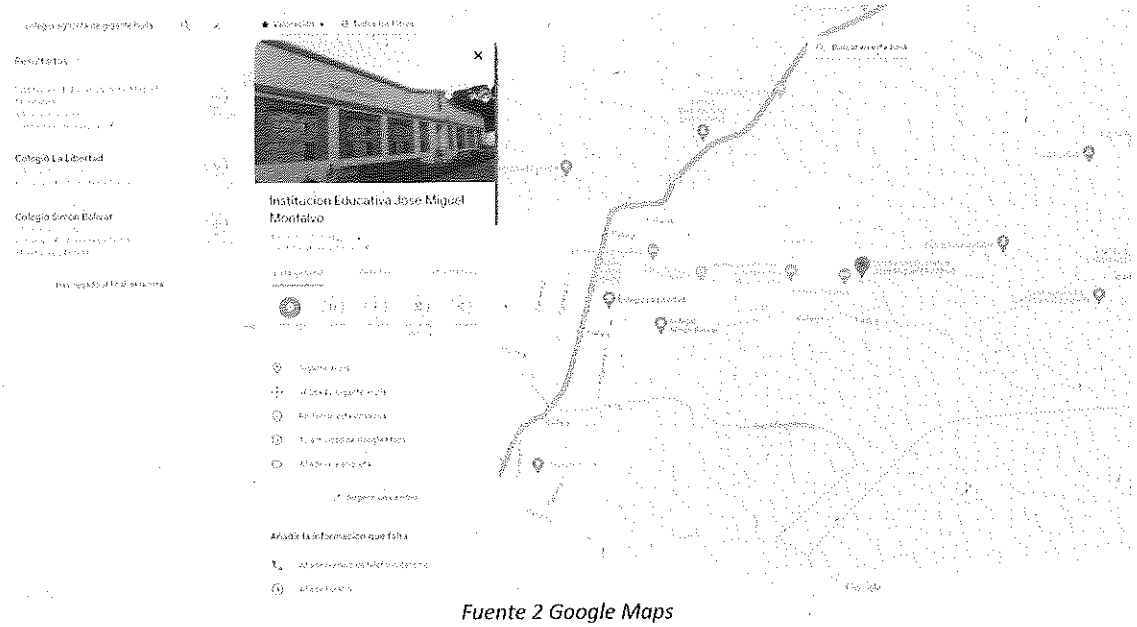

Fuente 2 Google Maps

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto al cual se le realizará la interventoría tiene como finalidad la construcción una cubierta para cancha multifuncional, según especificaciones descritas en el anexo técnico del contrato de obra, por el cual se tiene estipulado los siguientes capítulos:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
2. CONCRETOS
3. ESTRUCTURA METÁLICA - CUBIERTA
4. ACABADOS - PLACA EN CONCRETO
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6. INSTALACIONES ELECTRICAS
7. TRANSPORTE

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por el INDERHUILA.

Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024 se viene realizando la ejecución de la actividad de:

- Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	7.22 m2	1.54%

- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	151.33 m3	51.58%

- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	127.33 m3	68.58%

- Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts ejecutado en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts	6.02 m2	8.59%

- Construcción de zapatas en concreto 3000 PSI ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	0.63 m3	1.94%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.	29.22 kg	1.44%

- Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	1.13 m3	5.98%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	97.55 kg	7.24%

- Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI	10.37 m3	98.29%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal.	1,016.34 kg	50.00%

- Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	12.00 m	54.55%

- Caja de inspeccion de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Caja de inspeccion de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor	4.00 und	100.00%

- Transporte de materiales pétreos ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transporte de materiales pétreos.	689.42 m3-Km	8.59%

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	05/12/2023			04/03/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	23		
Reinicio No. 1	26/08/2024		242	02/11/2024
Informe no. 2	30/09/2024	35		02/11/2024
Adición de tiempo No. 1 (1 mes y 15 días)	29/10/2024	29		17/12/2024
Informe no. 3	30/10/2024	1		17/12/2024
Informe No. 4	30/11/2024	30		17/12/2024
TOTAL DIAS		118	242	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	01	05/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	01	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	01	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	02	28/12/2023
ACTA DE REUNIÓN	02	02/05/2024
ACTA DE REUNIÓN	03	28/05/2024
ACTA DE REUNIÓN	04	12/06/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE REINICIO	03	26/08/2024
ACTA DE REINICIO	01	26/08/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ MODIFICATORIO	04	26/08/2024
ACTA DE MODIFICACIÓN	01	11/10/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	05	29/10/2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

a). **Obligaciones de Carácter General.**	Durante el periodo se hace la socialización de ajuste de mayores y menores cantidades y se evidencio que se requieren ítems que nos están contemplados en las condiciones iniciales del contrato y que se deben ejecutar para cumplir con las obligaciones técnicas requeridas por el proyecto. Se garantizo que el contratista realizara los respectivos ajustes a las pólizas, una vez se suscriba el otrosí moderatorio del contrato.

b). **Actividades Administrativas.**	El contratista cumplió los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, el cual durante la ejecución del presente informe y de acuerdo con las hojas de vida aprobadas por la interventoria los perfiles son los siguientes: HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ – director de obra EDUARDO DUSSAN NAVARRO – residente de obra IGNACIO ANTONIO CASTRO CAMARGO – profesional siso CRISTHIAN ALEXANDER BAHAMON CUELLAR – inspector de obra Una vez aprobado por interventoría el personal mínimo requerido, el contratista realizo las respectivas afiliaciones afiliación a la EPS, AFP y ARL. Se realizaron reuniones con el contratista para exponer las creaciones de ítems o previstos para el suministro e instalación de la cancha multifuncional de acuerdo con las especificaciones técnicas plasmadas en los planos entregados por la Entidad Contratante, INDERHUILA. Se hizo control del personal en los frentes de obra donde se evidencio que el contratista cumplía con la permanencia y normas de seguridad industrial en obra del personal profesional calificado.
c). **Actividades Operativas.**	Se realizo Vigilancia por parte de la interventoría en el cual las obras se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas, las obras que se ejecutaron en el presente periodo son: ▪ Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	7.22 m2	1.54%

▪ Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	151.33 m3	51.58%

▪ Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	127.33 m3	68.58%

- Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts ejecutado en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts	6.02 m2	8.59%

- Construcción de zapatas en concreto 3000 PSI ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	0.63 m3	1.94%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.	29.22 kg	1.44%

- Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	1.13 m3	5.98%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	97.55 kg	7.24%

- Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI	10.37 m3	98.29%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal.	1,016.34 kg	50.00%

- Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	12.00 m	54.55%

- Caja de inspeccion de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor ejecutadas en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Caja de inspeccion de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor	4.00 und	100.00%

- Transporte de materiales pétreos ejecutada en el mes de noviembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transporte de materiales pétreos.	689.42 m3-Km	8.59%

Se hace visita de obra con el fin de garantizar el correcto vertido de concreto para las zapatas del cerramiento perimetral nuevo, utilizando la misma dosificación de mezcla empleada en las zapatas de la cubierta. Adicionalmente, se avanzó con el perfilado de las excavaciones para las cajas eléctricas, con el fin de iniciar el encofrado y la posterior ejecución del vaciado de concreto.

El viernes 15 de noviembre, se inició la jornada con una reunión de gestión HSEQ (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad). Posteriormente, se continuaron las actividades de preparación del terreno para la colocación de la capa de afirmado bajo la losa de concreto, realizando la compactación en estratos de no más de 15 cm utilizando un compactador de tipo canguro. Se recibió la visita del equipo de interventoría con el fin de evaluar el progreso de las diversas actividades ejecutadas en el proyecto.


Se hace visita de obras para verificar el proceso de vertido de concreto para las columnas del eje B. Para optimizar los tiempos de ejecución, se aplicó un aditivo acelerante en la mezcla, permitiendo un fraguado acelerado de 7 días, lo que posibilita iniciar en una semana con la instalación de las armaduras de la viga canal, la ejecución de su encofrado y posterior vaciado. En los días siguientes, se procedió al desencofrado y a la realización de ajustes en el acabado superficial de las columnas. Cada columna fue tratada con una capa de vinipel para garantizar un adecuado mantenimiento de la humedad durante el proceso de curado.

d). **Actividades Logísticos.**	Se hace entrega de bitácora de obra del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024. En el presente informe se presentan las memorias de cálculo de las actividades ejecutadas descritas en las obligaciones - actividades operativas. Se realiza comités semanales con fin de demostrar avances en la ejecución de obra. El día 30 de noviembre se hace entrega mensual de informe de interventoría. El día 08 de noviembre de 2024, el Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, continuo con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda. El día 15 de noviembre de 2024, el Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, continuo con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda. El día 19 de noviembre de 2024, el Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, presento el Acta de modificación no. 02 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos. El día 26 de noviembre de 2024, el Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda. El día 29 de noviembre de 2024, el Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, presento el Acta de modificación no. 02 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	Se aseguro la ubicación óptima y estratégica del área de acopio para los materiales excedentes susceptibles de reutilización, verificando que no se encuentren en proximidad de zonas de reserva ambiental, que no interfieran con cuerpos hídricos, ni generen filtraciones o impactos negativos sobre el medio ambiente. Además, el área debe estar situada fuera de las zonas de circulación del personal y maquinaria, garantizando un acceso fluido y seguro para la entrada y salida de los operarios y equipos. Para los residuos sólidos, como los plásticos, se deben implementar estrategias de gestión que promuevan una mayor concienciación y compromiso en cuanto a la generación de desechos. Estas estrategias deben incluir la divulgación de prácticas orientadas a la minimización de residuos en su origen, fomentando una cultura de uso responsable. Además, los plásticos deben ser almacenados en condiciones controladas, protegidos de factores climáticos adversos, con el fin de prevenir su deterioro, y posteriormente ser entregados a la empresa especializada en su valorización y reciclaje. Capacitación ambiental al personal de obra, tanto operativo como administrativo, fortaleciendo las competencias del personal en el cuidado del medio ambiente, la parte locativa y el cuidado de todas

	las personas que están presentes en la obra. En dicha capacitación se abordaron temas claves relacionados con el cuidado del medio ambiente y la importancia de reciclar materiales como papel, cartón, plástico y vidrio. Además, se destacará la relevancia de estas prácticas en la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Se realizo buen manejo de residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, de acuerdo con el plan de manejo ambiental. Se ubicó puntos limpios para depositar los residuos sólidos y realizar separación en la fuente. El buen porcentaje actual del cumplimiento del Plan de manejo ambiental es un referencial considerable, que permite establecer que los controles que se están estableciendo, están siendo efectivos, ya que se han ejecutado las actividades acordes a los lineamientos de la ley ambiental vigente. Para seguir con la mejora continua en todos los procesos y alcanzar el mayor porcentaje de cumplimiento se continuará con el cronograma de capacitaciones, reuniones y metodologías que permitan mantener al personal enfocado y calificado para el correcto desempeño de sus labores a favor del cuidado del medio ambiente. Se destaca el alto compromiso en la colaboración por parte de todo el talento humano para realizar las actividades, procurando el menor impacto ambiental negativo.
f). **Actividades Financieras.**	En el periodo de 01 al 30 de noviembre se analiza el avance financiero de obra, para prever futuras adiciones al contrato y disponibilidad presupuestal, en el presente informe en el numeral 19, se presenta el balance económico de ejecución del contrato presentando un avance por cada ítem y un avance general del periodo. Se hizo control de vinculación del personal por parte del contratista a sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades. Identificación y análisis de riesgos financieros que puedan afectar la ejecución de la obra, tales como la inflación de costos, fluctuaciones en los precios de los materiales o demoras en los pagos. Desarrollo de estrategias de mitigación de estos riesgos, como la contratación de seguros o la inclusión de cláusulas de ajuste en el contrato.
g). **Actividades Jurídicos.**	Durante el periodo se realizaron todas las actividades de revisión y acompañamiento en pólizas y garantías de reinicio de obra actualizadas y anexos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones con respecto al periodo. Se asegura que, si hay cambios durante la ejecución de la obra, como variaciones en el diseño, plazos adicionales o ajustes en los costos, estos deben formalizarse mediante la modificación del contrato, siguiendo los procedimientos legales y contractuales.


9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Probabilidad de Precipitación en noviembre en Gigante

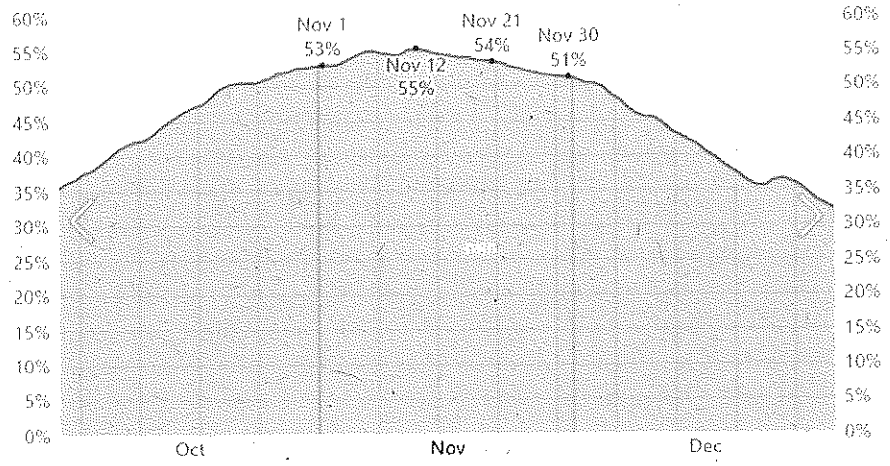

Fuente: *Web Weather Spark*

Un día lluvioso es aquel con al menos 0,04 pulgadas de precipitación líquida o equivalente a líquido. En Gigante, la probabilidad de un día lluvioso durante el transcurso de noviembre es prácticamente constante y se mantiene alrededor del 53 % durante todo el mes.

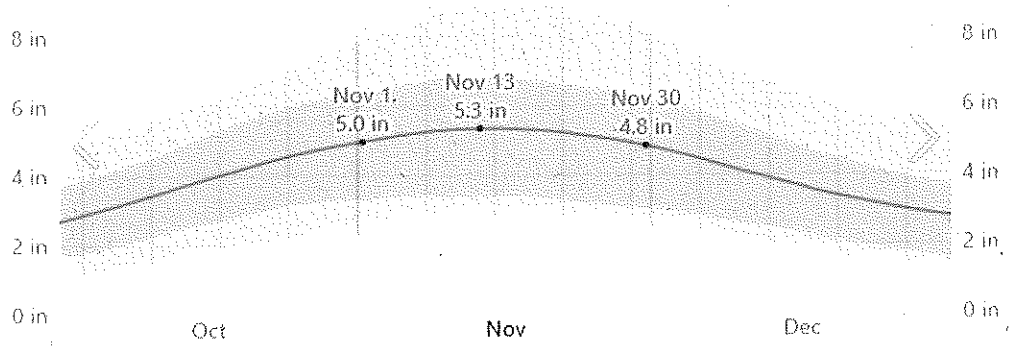

Fuente: *Web Weather Spark*

La precipitación promedio móvil de 31 días durante noviembre en Gigante es esencialmente constante, permaneciendo alrededor de 5,1 pulgadas durante todo el período y rara vez excede las 8,9 pulgadas o cae por debajo de las 2,2 pulgadas

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseño de mezcla concreto hidráulico	**3000 PSI**	**1.0:1.7:1.5**
Diseño de mezcla concreto hidráulico	**2500 PSI**	**1.0:2.0:1.6**
Diseño de mezcla concreto hidráulico	**2000 PSI**	**1.0:2.3:1.8**

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ROTURA	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
Elemento	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	7	14	28	PSI	PSI	
Zapatas de cerramiento	12/11/2024	19/11/2024	X			3000	2275	CUMPLE (76%)
		26/11/2024		X		3000	2812	CUMPLE (94%)
		10/12/2024			X	3000	Pendiente a rotura del cilindro	
Columnas eje B	21/11/2024	28/11/2024	X			3000	2201	CUMPLE (73%)
		05/12/2024		X		3000	Pendiente a rotura del cilindro	
		19/12/2024			X	3000	Pendiente a rotura del cilindro	
Columnas eje A	26/11/2024	03/12/2024	X			3000	Pendiente a rotura del cilindro	
		10/12/2024		X		3000	Pendiente a rotura del cilindro	

		24/12/2024			X	3000	Pendiente a rotura del cilindro	

Tipo Prueba de Laboratorio	Compactación del Terreno	Promedio de Compactación
Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno – Método cono de arena	1 -> 97.5% 2 -> 96.2%	96.85%

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ROTURA	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
Elemento	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	7	14	28	PSI	PSI	
Zapatas	03/10/2024	10/10/2024	X			3000	2259.33	CUMPLE (40%)
		17/10/2024		X		3000	2771.89	CUMPLE (65%)
		31/10/2024			X	3000	3295.70	CUMPLE (100%)
Viga de cimentación	07/10/2024	14/10/2024	X			3000	2275.07	CUMPLE (40%)
		21/10/2024		X		3000	2819.10	CUMPLE (65%)
		04/11/2024			X	3000	3408.10	CUMPLE (100%)
Viga de cimentación	15/10/2024	22/10/2024	X			3000	2214.37	CUMPLE (40%)
		29/10/2024		X		3000	2825.85	CUMPLE (65%)
		12/11/2024			X	3000	3369.89	CUMPLE (100%)
Cajas de inspección	31/10/2024	07/11/2024	X			2500	2434.68	CUMPLE (40%)
		14/11/2024		X		2500	2475.15	CUMPLE (65%)

		28/11/2024			X	2500	2796.62	CUMPLE (100%)

Tipo Prueba de Laboratorio	Compactación del Terreno	Promedio de Compactación
Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno – Método cono de arena	1 -> 98.8% 2 -> 98.4% 3 -> 97.9% 4 -> 99.3%	98.6%

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	N/A			
Acta Parcial No. 1	N/A			
Acta Recibo Final No.4	N/A			
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 78.095.342,00	$	$ 78.095.342,00	$	$ 78.095.342,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
03/10/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jimenez Marulanda.
08/10/2024	INDERHUILA	El Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, deberá presentar el Acta de modificación de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
11/10/2024	INDERHUILA	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá ejecutar el ítem 5.02 según diseño entregado en planos por la Entidad Contratante.
17/10/2024	INDERHUILA	El Contratista de Interventoría, el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda, radicará el Acta de modificación no. 01 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
23/10/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216))	21/11/2023	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056))	21/11/2023	N/A	Digital – Plataforma secop II
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (05/12/2023) al (28/12/2023)	28/12/2023	N/A	Digital
Actas de socialización e inicio de obra	05/12/2023	N/A	Físico
Actas de conformación de veeduría ciudadana	06/12/2023	N/A	Físico
Actas de comités (periodo del (05/12/2023) al (28/12/2023)	21/12/2023	N/A	Físico
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (05/12/2023) a (28/12/2023)	28/12/2023	N/A	Digital
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 2	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 2	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 3	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 3	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 4	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 4	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 5	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 5	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/11/2024) al (30/11/2024)	28/12/2023	N/A	Digital

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION

GILDARDO SERRATO SERRATO	1.075.598.217	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR LABOR
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	80.926.744	RESIDENTE DE INTERVENTOR	CONTRATO POR LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
GILDARDO SERRATO SERRATO	$ 299.200	$ 233.800	$ 130.200	$ 37.400	$ 0	9480142849
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	$ 208.000	$ 162.300	$ 95.500	$ 26.000	$ 0	9479414626
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	$ 360.000	$ 281.300	$ 156.600	$ 45.000	$ 0	9480144214

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0	CHU-100010216		10/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0	CHU-100002056		10/11/2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza Anulación certificado para actualización ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CHU-100010216		06/12/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CHU-100002056		06/12/2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza actualizada ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 2	CHU-100010216		06/12/2023	Cumplimiento del contrato	05/12/2023	04/09/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	05/12/2023	07/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/03/2024	07/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 2	CHU-100002056		06/12/2023	05/12/2023	06/03/2024

Póliza actualizada ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 3	CHU-100010216		07/09/2024	Cumplimiento del contrato	26/08/2024	04/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/08/2024	07/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/11/2024	06/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 3	CHU-100002056		07/09/2024	05/12/2023	06//2024

Póliza actualizada OTRO SI No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE

					(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4	CHU-100010216		07/09/2024	Cumplimiento del contrato	26/08/2024	04/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/08/2024	07/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/11/2024	06/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4	CHU-100002056		07/09/2024	05/12/2023	06/11/2024

Póliza actualizada OTRO SI No. 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5	CHU-100010216		07/09/2024	Cumplimiento del contrato	26/08/2024	04/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/08/2024	07/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/11/2024	06/11/2029


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5	CHU-100002056		07/09/2024	05/12/2023	06/11/2024


18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


(Describir el contenido del plano)


- **Plano general:** Contiene levantamiento topográfico que consta de replanteo de puntos en los ejes estructurales de columnas sobre el área de la cubierta autoportante, dentro de la institución educativa José Miguel Montalvo en el municipio de Gigante, departamento del Huila. También relaciona el área de adecuación para movimiento de tierra en la zona de terreno natural a nivel de placa de contrapiso de la cancha múltiple.

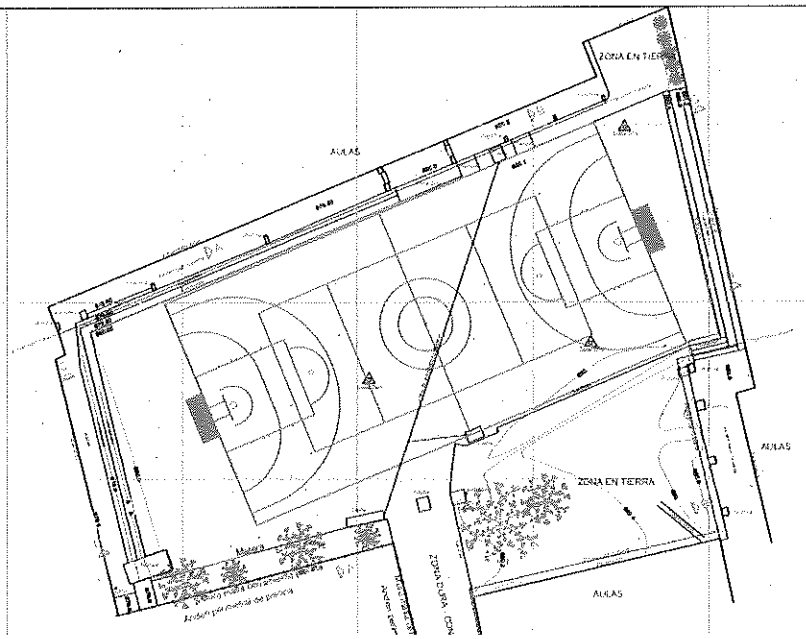


- **Plano estructural E-1:** Contiene la vista en planta de la cimentación (zapatas y viga de cimentación) y el despiece de la viga de cimentación.

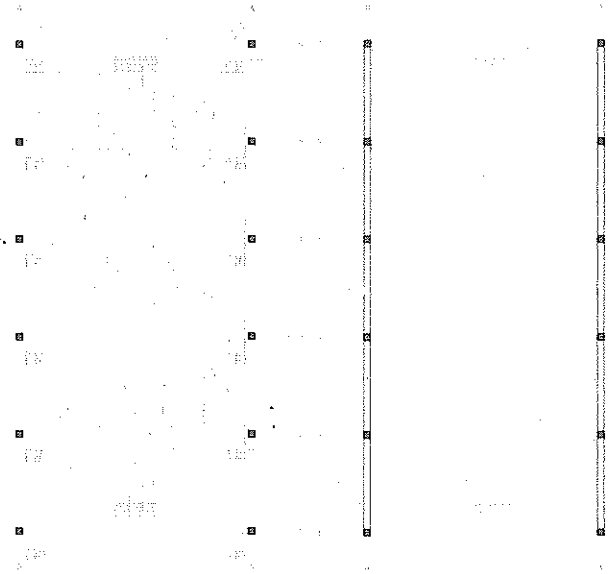


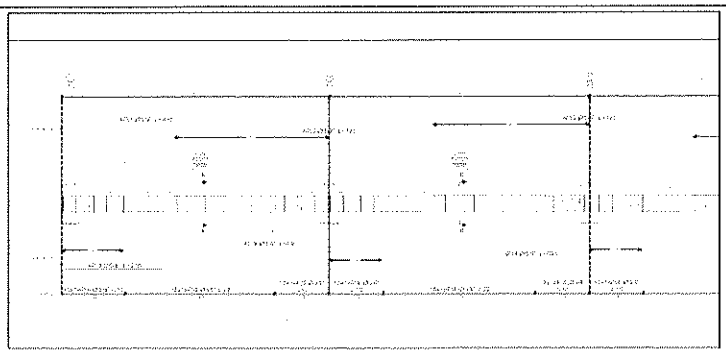

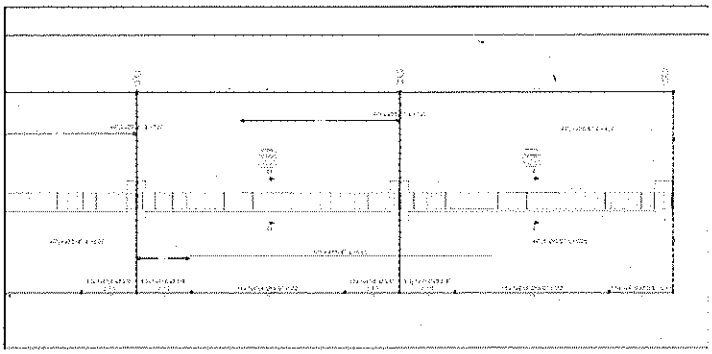


- **Plano estructural E-2:** contiene la vista en planta de la viga aérea, el despiece de las zapatas, columnas y viga aérea.

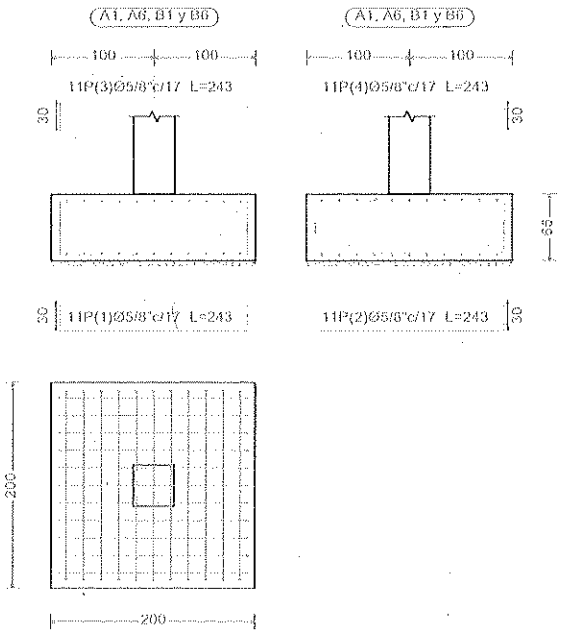

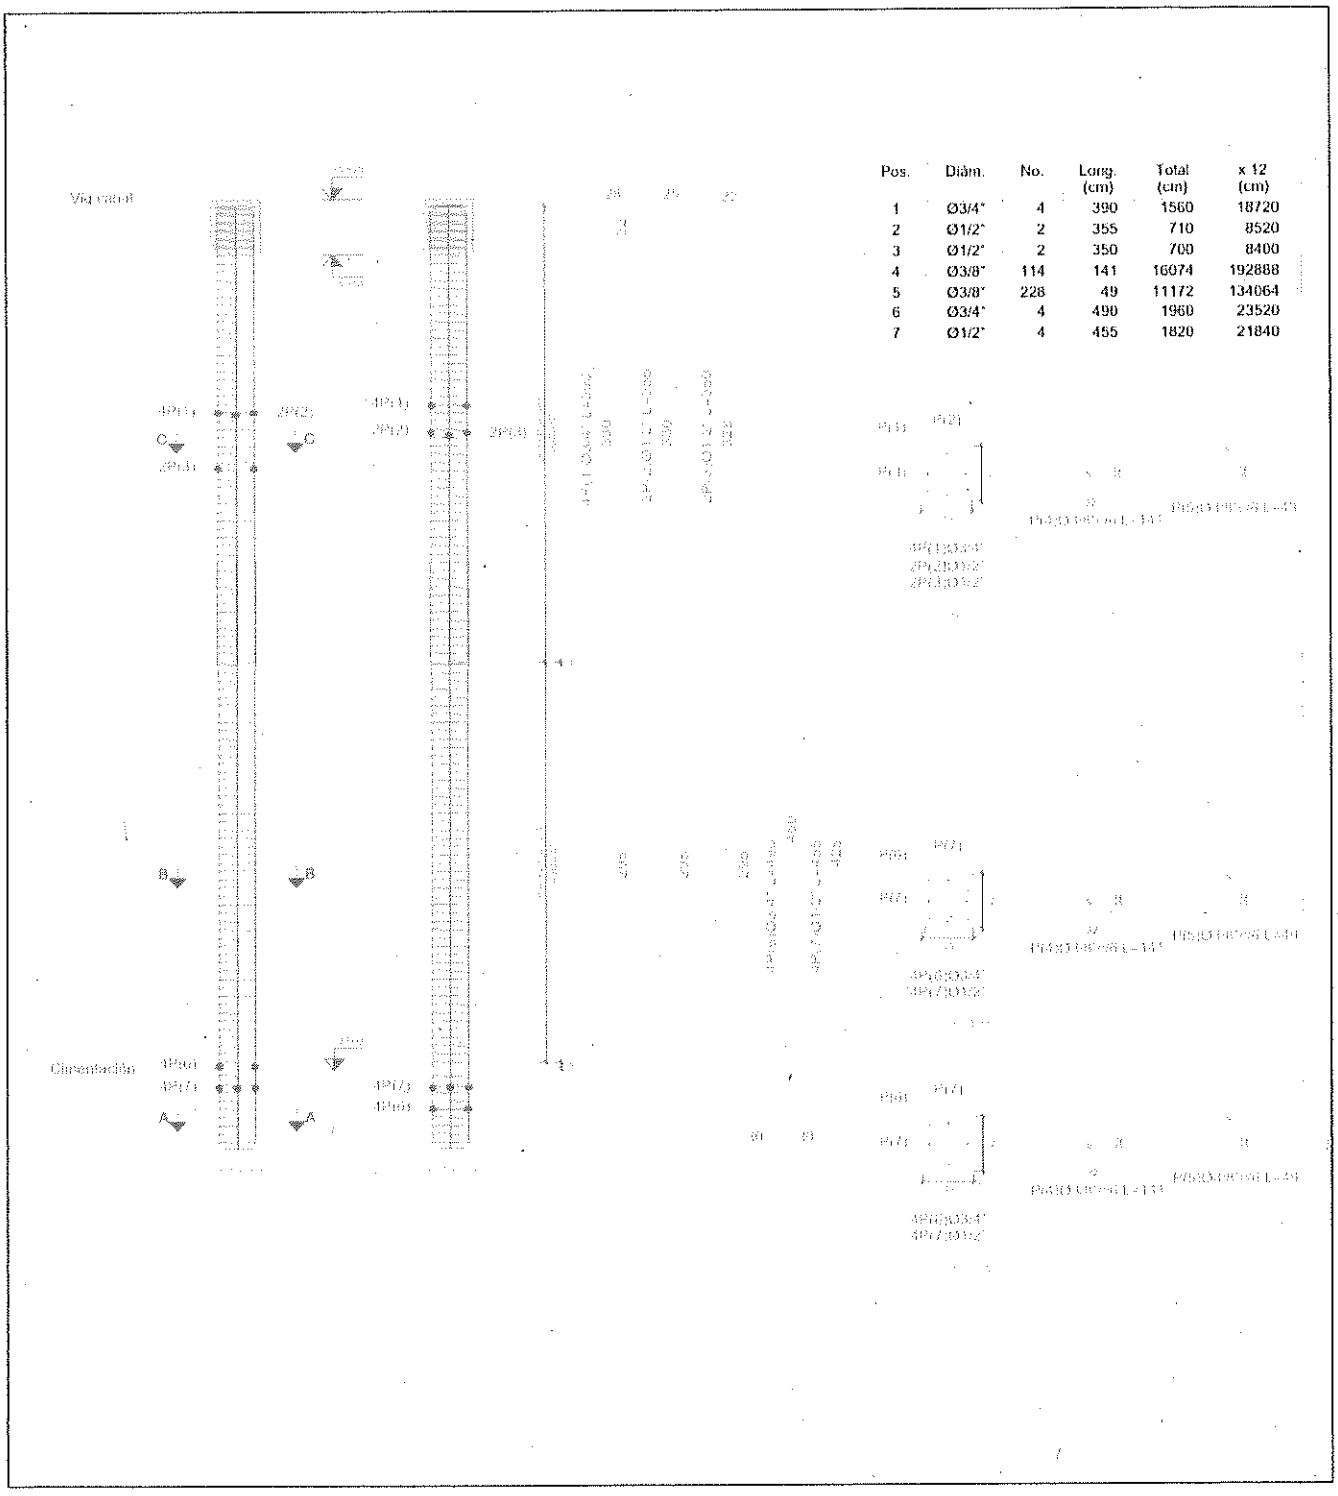


Pos.	Diám.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	x 12 (cm)
1	Ø3/4"	4	390	1560	18720
2	Ø1/2"	2	355	710	8520
3	Ø1/2"	2	350	700	8400
4	Ø3/8"	114	141	16074	192888
5	Ø3/8"	228	49	11172	134064
6	Ø3/4"	4	490	1960	23520
7	Ø1/2"	4	455	1820	21840


- **Plano eléctrico EL-1:** contiene la georreferenciación de las instalaciones eléctricas.

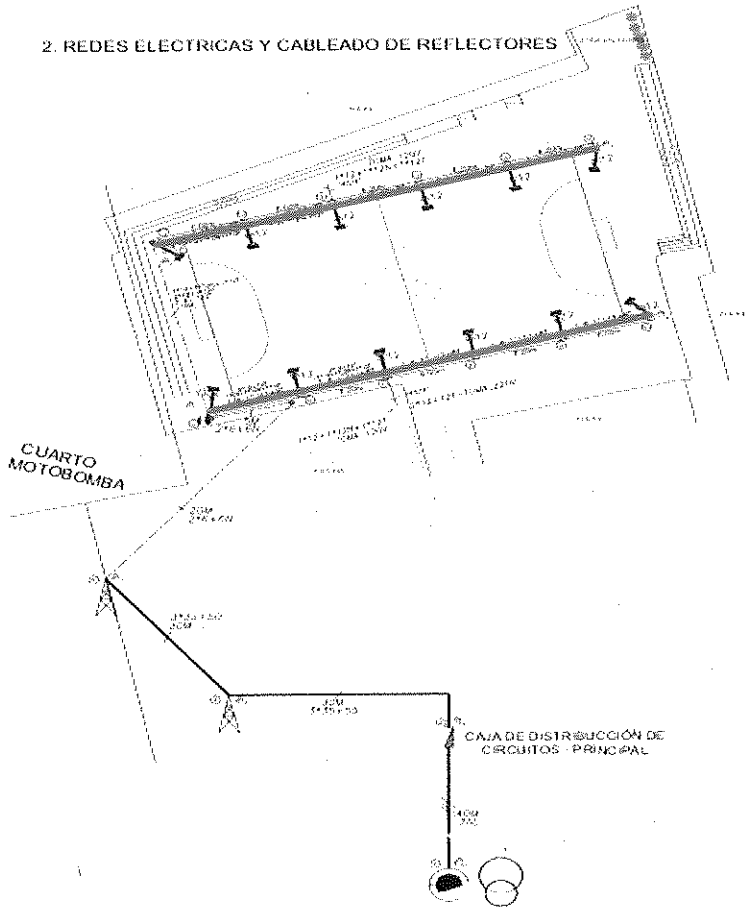


- **Esquema corte de placa en concreto:** contiene la delimitación que debe tener el corte de placa en concreto.

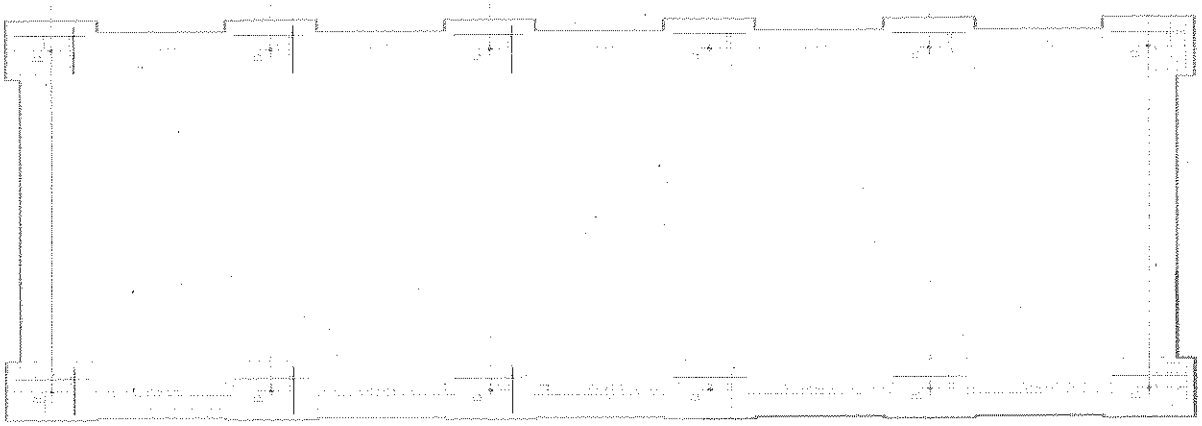

- **Esquema tuberías:** contiene el trazado de la tubería a redireccionar para que no atraviese la placa nueva de concreto.

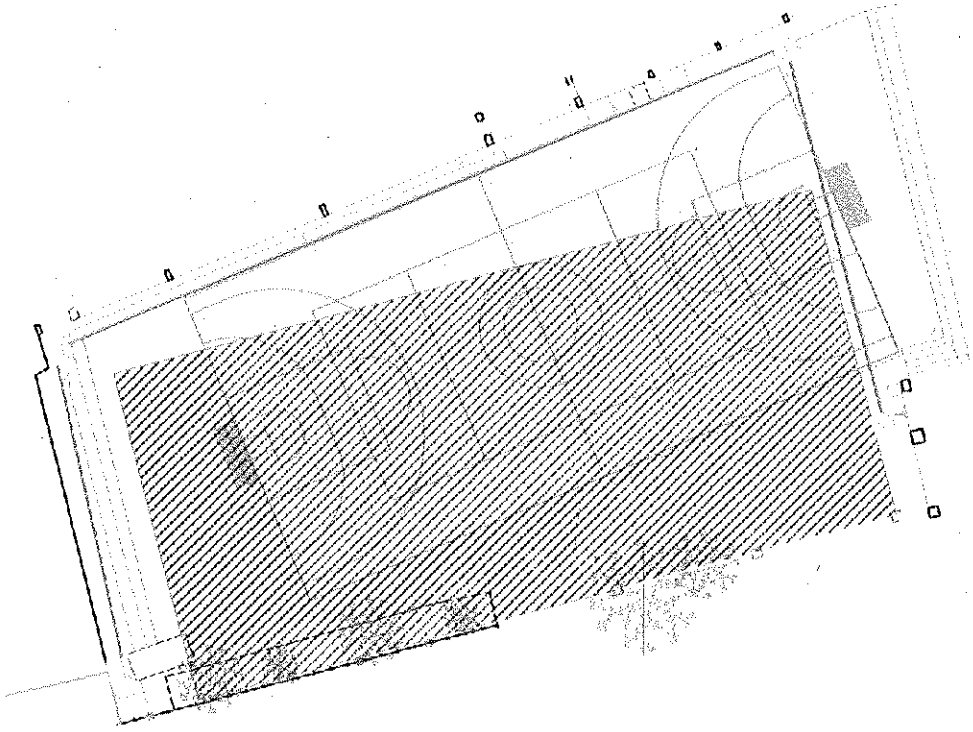

- **Esquema cerramiento perimetral:** contiene el detalle del cerramiento perimetral nuevo a construir.

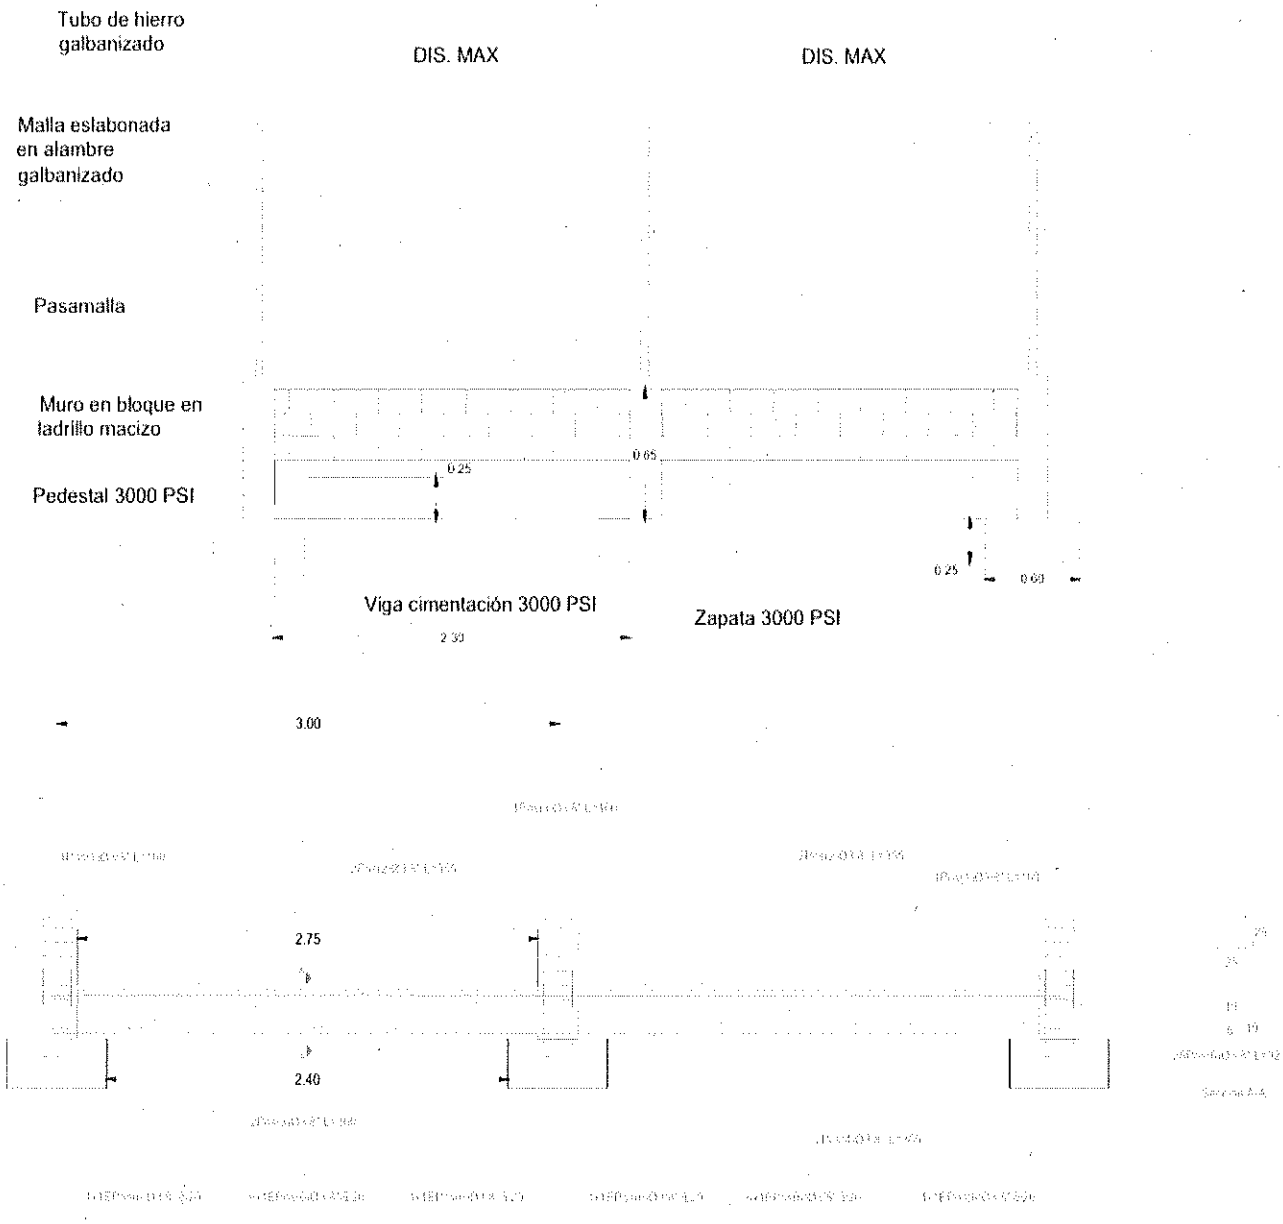

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN NO. 1 (29/10/2024)		EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	% EJECUCION
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**											
1.01	Localización y replanteo.	M2	536.56	$ 3,565.00	$ 1,912,836.00	612.61	$ 2,183,955.00	0.00	$ -	0.00%	612.61	100.00%
1.02	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	602.21	$ 26,329.00	$ 15,855,587.00	469.30	$ 12,356,200.00	7.22	$ 190,095.00	1.54%	436.31	92.97%
1.03	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	20.74	$ 20,899.00	$ 433,445.00	19.22	$ 401,679.00	0.00	$ -	0.00%	19.22	100.00%
1.04	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	$ 117,116.00	$ 234,232.00	2.00	$ 234,232.00	0.00	$ -	0.00%	2.00	100.00%
1.05	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	87.57	$ 46,090.00	$ 4,036,101.00	293.41	$ 13,523,267.00	151.33	$ 6,974,800.00	51.58%	278.45	94.90%
1.06	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	23.53	$ 84,008.00	$ 1,976,708.00	185.66	$ 15,596,925.00	127.33	$ 10,696,739.00	68.58%	171.56	92.41%
NP. 1.07	Cerramiento provisional en lona verde	ML	0.00	$ 38,304.00	$ -	57.24	$ 2,192,521.00	0.00	$ -	0.00%	57.24	100.00%
NP. 1.08	Retiro trampolín piscina	UND	0.00	$ 109,260.00	$ -	1.00	$ 109,260.00	0.00	$ -	0.00%	1.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 24,448,909.00**		**$ 46,598,039.00**		**$ 17,861,634.00**	**38.33%**		**94.11%**
2	**CIMENTACIÓN**											
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	68.52	$ 34,077.00	$ 2,334,956.00	70.12	$ 2,389,479.00	6.02	$ 205,144.00	8.59%	70.02	99.86%
2.02	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	44.24	$ 620,231.00	$ 27,439,019.00	32.45	$ 20,126,496.00	0.63	$ 390,746.00	1.94%	31.83	98.09%
2.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3,207.00	$ 7,130.00	$ 22,865,910.00	2030.40	$ 14,476,752.00	29.22	$ 208,339.00	1.44%	2,028.20	99.89%
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	6.61	$ 743,441.00	$ 4,914,145.00	18.91	$ 14,058,469.00	1.13	$ 840,088.00	5.98%	13.29	70.28%
2.05	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1,276.00	$ 7,130.00	$ 9,097,880.00	1347.38	$ 9,606,819.00	97.55	$ 695,532.00	7.24%	1,347.38	100.00%
NP. 2.06	Construcción de cerramiento perimetral existente (muro, malla) hasta, H= 2 mt.	ML	0.00	$ 377,008.00	$ -	18.00	$ 6,786,144.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 66,651,910.00**		**$ 67,444,159.00**		**$ 2,339,849.00**	**3.47%**		**83.14%**

3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**											
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	13.00	$ 922,566.00	$ 11,993,358.00	10.55	$ 9,733,071.00	10.37	$ 9,567,009.00	98.29%	10.37	98.29%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4,720.00	$ 7,130.00	$ 33,653,600.00	3375.03	$ 24,063,964.00	0.00	$ -	0.00%	3,319.68	98.36%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	18.00	$ 1,006,771.00	$ 18,121,878.00	16.09	$ 16,198,945.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,367.00	$ 7,130.00	$ 16,876,710.00	2032.70	$ 14,493,151.00	1,016.34	$ 7,246,504.00	50.00%	1,016.34	50.00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60.80	$ 40,424.00	$ 2,457,779.00	56.95	$ 2,302,147.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 83,103,325.00**		**$ 66,791,278.00**		**$ 16,813,513.00**	**25.17%**		**60.61%**
4	**CUBIERTA**											
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	548.11	$ 211,958.00	$ 116,176,299.00	469.68	$ 99,552,433.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 116,176,299.00**		**$ 99,552,433.00**		**$ -**	**0.00%**		**0.00%**
5	**ACABADOS – PLACA EN CONCRETO**											
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,826.00	$ 4,553,212.86	323.82	$ 4,800,955.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2.00	$ 3,717,773.00	$ 7,435,546.00	2.00	$ 7,435,546.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	420.00	$ 84,130.00	$ 35,334,600.00	543.44	$ 45,719,607.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60.80	$ 84,010.00	$ 5,107,808.00	30.40	$ 2,553,904.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
NP. 5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI con profundidad de 0,50m	ML	0.00	$ 98,383.00	$ -	45.19	$ 4,445,928.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
NP. 5.06	Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	ML	0.00	$ 28,142.00	$ -	216.00	$ 6,078,672.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
NP. 5.07	Corte de placa en concreto	ML	0.00	$ 7,591.00	$ -	276.42	$ 2,098,304.00	0.00	$ -	0.00%	269.04	97.33%
NP. 5.08	Rejillas prefabricadas para cunetas	ML	0.00	$ 166,020.00	$ -	75.20	$ 12,484,704.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 52,431,166.86**		**$ 85,617,620.00**		**$ -**	**0.00%**		**2.39%**

6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	65.00	$ 80,296.00	$ 5,219,240.00	63.00	$ 5,058,648.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	14.56	$ 107,293.00	$ 1,562,186.00	62.30	$ 6,684,354.00	0.00	$ -	0.00%	62.30	100.00%
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	20.00	$ 219,466.00	$ 4,389,320.00	22.00	$ 4,828,252.00	12.00	$ 2,633,592.00	54.55%	12.00	54.55%
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 350,649.00	$ 701,298.00	7.00	$ 2,454,543.00	0.00	$ -	0.00%	5.00	71.43%
NP. 6.05	Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión	ML	0.00	$ 26,226.00	$ -	62.30	$ 1,633,880.00	0.00	$ -	0.00%	62.30	100.00%
NP. 6.06	Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presión	ML	0.00	$ 42,005.00	$ -	18.00	$ 756,090.00	0.00	$ -	0.00%	18.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 11,872,044.00**		**$ 21,415,767.00**		**$ 2,633,592.00**	**12.30%**		**62.86%**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
7.01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	4.00	$ 640,108.00	$ 2,560,432.00	4.00	$ 2,560,432.00	4.00	$ 2,560,432.00	100.00%	4.00	100.00%
7.02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	6.40	$ 46,090.00	$ 294,976.00	8.94	$ 412,045.00	0.00	$ -	0.00%	2.05	22.93%
7.03	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	40.00	$ 49,435.00	$ 1,977,400.00	32.80	$ 1,621,468.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 305,078.00	$ 610,156.00	2.00	$ 610,156.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,809.00	$ 565,618.00	2.00	$ 565,618.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.06	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,018,745.00	$ 1,018,745.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,710,084.00	$ 4,710,084.00	1.00	$ 4,710,084.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.08	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	35.00	$ 88,702.00	$ 3,104,570.00	35.00	$ 3,104,570.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.09	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 369,665.00	$ 4,435,980.00	12.00	$ 4,435,980.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00	$ 58,262.00	$ 3,495,720.00	60.00	$ 3,495,720.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%

7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,020,712.00	$ 12,248,544.00	12.00	$ 12,248,544.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 976,854.00	$ 976,854.00	1.00	$ 976,854.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,037,321.00	$ 1,037,321.00	1.00	$ 1,037,321.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
NP. 7.14	Instalación acometida a tablero de circuitos	UND	0.00	$ 625,694.00	$ -	1.00	$ 625,694.00	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 37,036,400.00**		**$ 37,662,094.00**		**$ 2,560,432.00**	**7.03%**		**7.29%**
8	**TRANSPORTE**											
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4,383.82	$ 1,102.00	$ 4,830,970.00	8028.22	$ 8,847,098.00	689.42	$ 759,741.00	8.59%	3,471.06	43.24%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 4,830,970.00**		**$ 8,847,098.00**		**$ 759,741.00**	**8.59%**		**43.24%**
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 396,551,024.00**		**$ 432,670,880.00**		**$ 42,968,761.00**			
Administración		**20%**			**$ 79,310,205.00**		**$ 86,534,176.00**		**$ 8,593,752.00**			
Imprevistos		**1%**			**$ 3,965,510.00**		**$ 4,326,709.00**		**$ 429,688.00**			
Utilidad		**4%**			**$ 15,862,041.00**		**$ 17,306,835.00**		**$ 1,718,750.00**			
TOTAL COSTO					**$ 495,688,780.00**		**$ 540,838,600.00**		**$ 53,710,951.00**			
% AVANCE DE OBRA										**9.93%**		**37.53%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ARQ. **JUAN FELIPE ALARCON**
Vo.Bo APOYO SUPERVISION


ING. **GILDARDO SERRATO SERRATO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

20. REGISTRO FOTOGRAFICO

21.

ITEM 1.02. DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO E=0.10 MTS. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE:




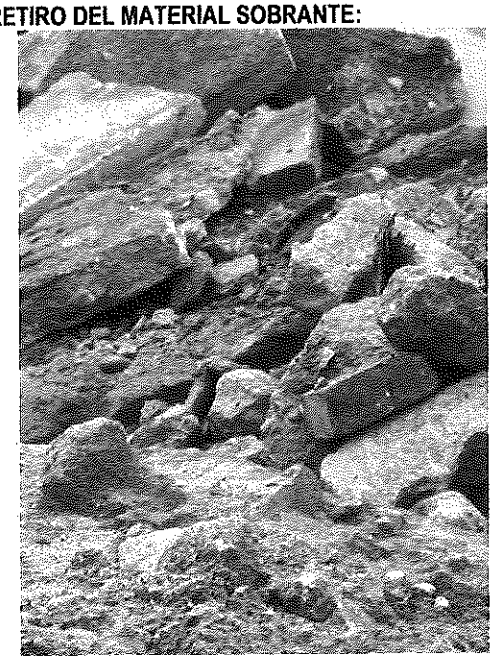

Demolición de placa en concreto - 01 al 07 de noviembre del 2024.

ITEM 1.05. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. INCLUYE: TODO FACTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA



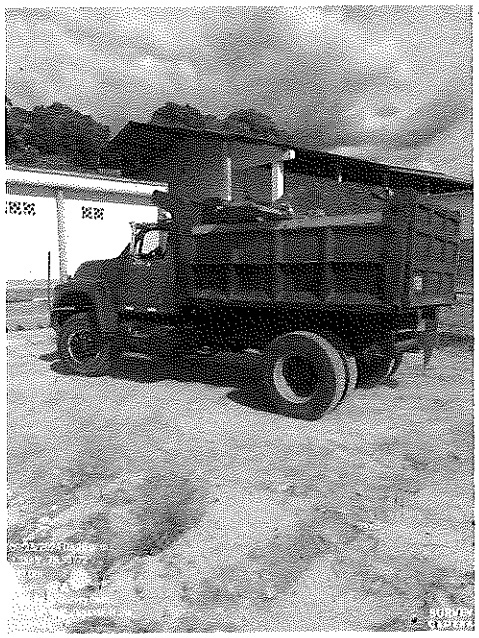

Excavación manual- 01 al 09 de noviembre del 2024.

ITEM 1.06. RELLENO EN RECEBO SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE.




Relleno en recebo seleccionado y compactado – 25 al 30 de noviembre del 2024.

ITEM 2.01. SOLADO EN CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E = 0.05 MTS.




Solado en concreto de limpieza 2000 PSIS – 20 al 21 de noviembre del 2024.

ITEM 2.02. CONSTRUCCIÓN ZAPATAS EN CONCRETO 210 KG/CM2-3000 PSI. VER DISEÑO.






Construcción zapatas en concreto 3000 PSI – 20 de noviembre del 2024.

ITEM 2.03. ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI ZAPATAS.




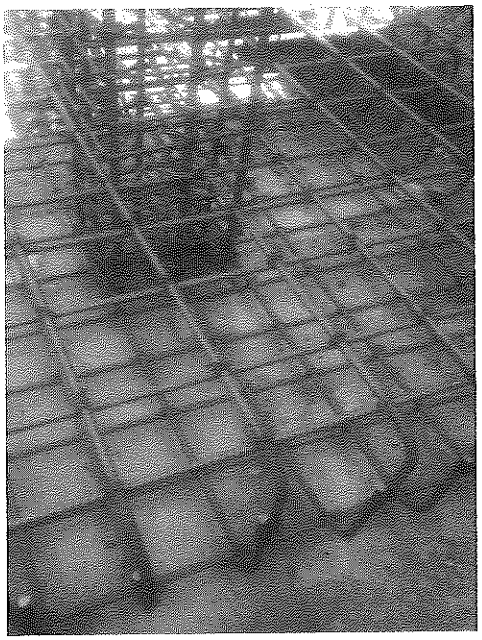

Acero de refuerzo zapatas – 18 de noviembre del 2024.


ITEM 2.04. CONSTRUCCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 210 KG/CM2-3000 PSI




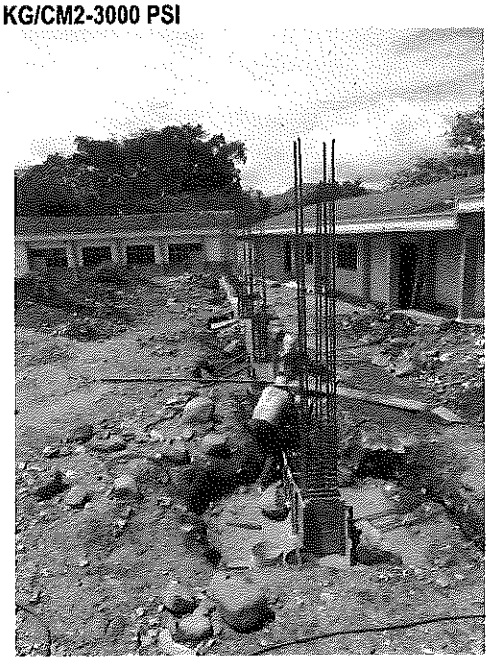

Construcción viga de cimentación - 23 al 25 de noviembre del 2024.


ITEM 2.05. ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI VIGA DE CIMENTACIÓN.

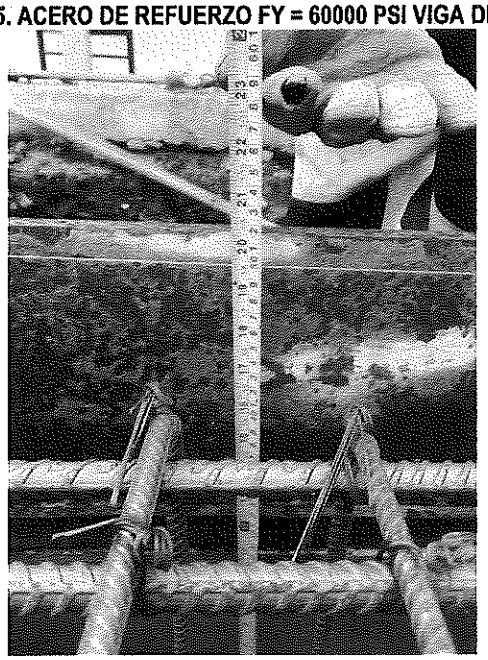


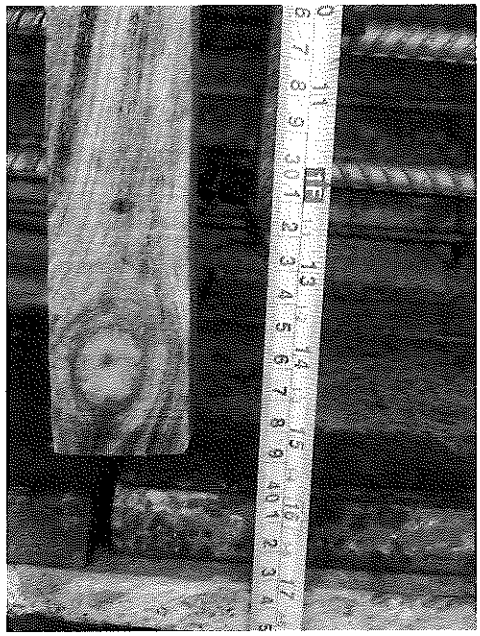

Acero de refuerzo viga de cimentación - 10 al 14 de noviembre del 2024.


ITEM 3.01. CONSTRUCCIÓN EN COLUMNAS DE CONCRETO DE 210 KG/CM2-3000 PSI.

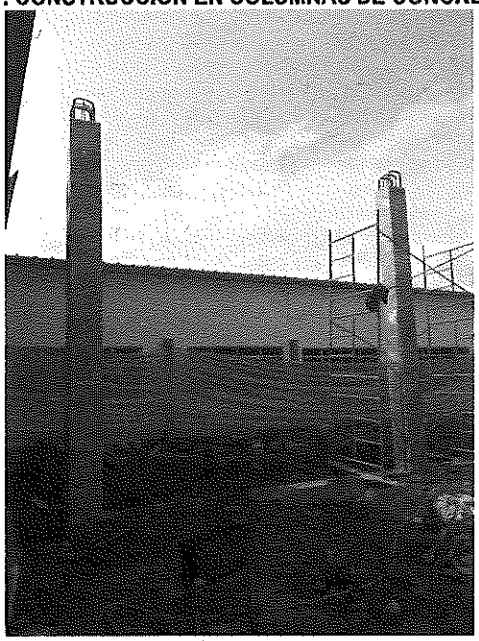


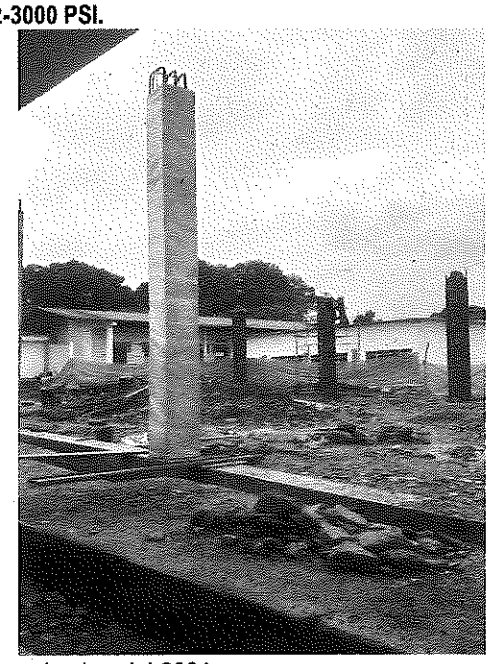

Construcción de columnas - 02 al 14 de noviembre del 2024.

ITEM 3.04. ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI VIGA CANAL.

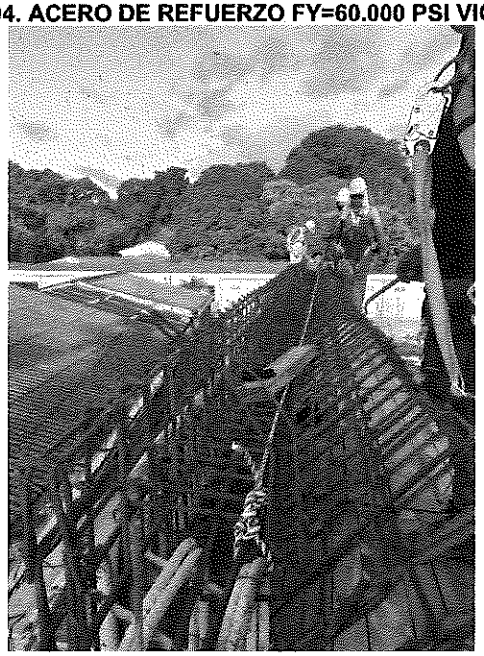

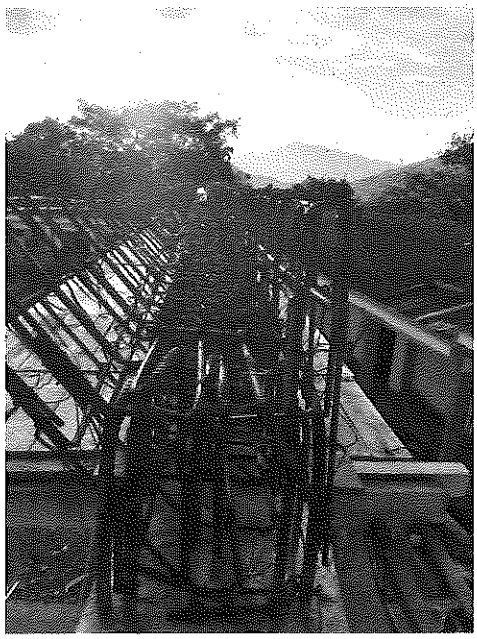

Armado de acero para viga canal – noviembre de 2024

ITEM 6.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DE 8", CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN; PARA SALIDA.





Suministro e instalación tubería PVC-S de 8" - 01 al 02 de noviembre del 2024.


ITEM 7.01. CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40X70 CM, FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN LAMINA ALFAJOR.




Cajas de inspección de alumbrado público - 27 al 30 de octubre del 2024.

ITEM 8.01. TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS.

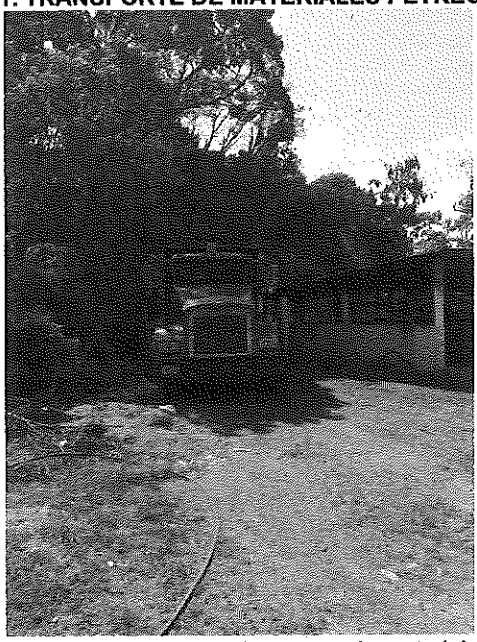

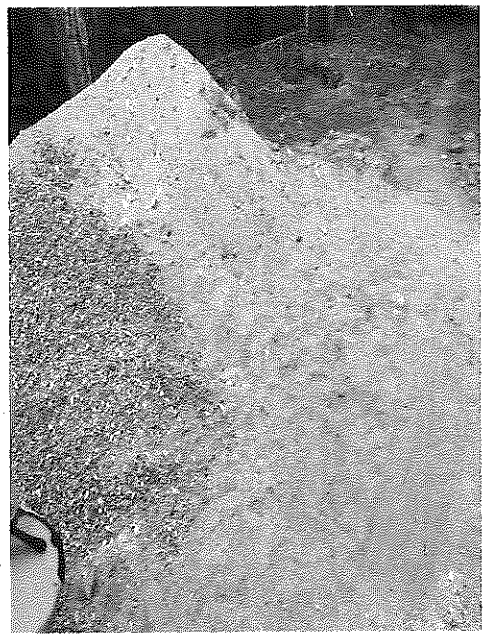

Transporte de materiales pétreos - 12 al 19 de noviembre del 2024.

22. ANEXOS

- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.
- INFORME No. 04 DEL CONTRATISTA.

ING. GILDARDO SERRATO SERRATO	(30/11/2024)	ARQ. JUAN FELIPE ALARCON
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	39154937	9479414626	I	2024/12/11	2024/12/24	BANCO DE OCCIDENTE	13	$491,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$208,000						$162,500	
																				$208,000						$162,500	
																				$208,000						$162,500	
						$1,300,000	No		PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	12.5%	$162,500	
																				$208,000						$162,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$162,500		COMFAMILIAR HUILA	30	$1,300,000	2%	$26,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1184262988	9480144214	N	2024/12/11	2025/01/10	BANCOLOMBIA	30	$363,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$152,000						$118,800	
																				$152,000						$118,800	
																				$152,000						$118,800	
						$1,300,000	No		PORVENIR	30	($1,300,000)	16%	SIN RIESGO	($208,000)	$0	$0	$0	$0	$0	($208,000)		NUEVA E.P.S.	30	($1,300,000)	12.5%	($162,500)	
						$2,250,000	No		PORVENIR	30	$2,250,000	16%	SIN RIESGO	$360,000	$0	$0	$0	$0	$0	$360,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,250,000	12.5%	$281,300	
																				$152,000						$118,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
$0	($162,500)		COMFAMILIAR HUILA	30	($1,300,000)	2%	($26,000)	ARL SURA	30	($1,300,000)	6.96%	5	($90,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$281,300		COMFAMILIAR HUILA	30	$2,250,000	2%	$45,000	ARL SURA	30	$2,250,000	6.96%	5	$156,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1184267310	9480142849	Y	2024/12/11	2025/01/10	BANCOLOMBIA	30	$1,453,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct							
Sucursal: GIGANTE (1 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: INTER GIGANTE(1 Afiliados)																																									
Ciudad: GIGANTE Depto: HUILA(1 Afiliados)																																									
1	CC	1075598217	SERRATO SERRATO GILDARDO	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																																			

EMPLEADO									NOVEDADES																																		
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct							
Sucursal: ALGECIRAS (2 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: INTER ALGECIRAS(2 Afiliados)																																									
Ciudad: ALGECIRAS Depto: HUILA(2 Afiliados)																																									
2	CC	1110540605	LOZADA IMBACHI FELIPE ADOLFO	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No		X	2024/11/15																																	
3	CC	1075291429	ORTIZ SUNCE FRANCISCO FERNANDO	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No		X	2024/11/15																																	

Total Afiliados(3)

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$299,200						$233,800	
																				$299,200						$233,800	
																				$299,200						$233,800	
						$1,870,000	No		PORVENIR	30	$1,870,000	16%	SIN RIESGO	$299,200	$0	$0	$0	$0	$0	$299,200		SANITAS	30	$1,870,000	12.5%	$233,800	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$309,400						$241,700	
																				$309,400						$241,700	
																				$309,400						$241,700	
						$1,375,000	No		PORVENIR	16	$733,334	16%	SIN RIESGO	$117,400	$0	$0	$0	$0	$0	$117,400		SANITAS	16	$733,334	12.5%	$91,700	
						$2,250,000	No		PROTECCION	16	$1,200,000	16%	SIN RIESGO	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0	$192,000		SANITAS	16	$1,200,000	12.5%	$150,000	
																				$608,600						$475,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$233,800						$37,400						$130,200				$0		$0		$0		$0	
	$233,800						$37,400						$130,200				$0		$0		$0		$0	
	$233,800						$37,400						$130,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$233,800		COMFAMILIAR HUILA	30	$1,870,000	2%	$37,400	ARL SURA	30	$1,870,000	6.96%	5	$130,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$241,700						$38,700						$134,700				$0		$0		$0		$0	
	$241,700						$38,700						$134,700				$0		$0		$0		$0	
	$241,700						$38,700						$134,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$91,700		COMFAMILIAR HUILA	16	$733,334	2%	$14,700	ARL SURA	16	$733,334	6.96%	5	$51,100	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$150,000		COMFAMILIAR HUILA	16	$1,200,000	2%	$24,000	ARL SURA	16	$1,200,000	6.96%	5	$83,600	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$475,500						$76,100						$264,900				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1184267310	9480142849	Y	2024/12/11	2025/01/10	BANCOLOMBIA	30	$1,453,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$608,600	$12,000	$0	$620,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,600	$8,200	$0	$424,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$3,800	$0	$195,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$264,900	$5,200	$0	$270,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$264,900	$5,200	$0	$270,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$76,100	$1,500	$0	$77,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$76,100	$1,500	$0	$77,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$475,500	$9,400	$0	$484,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$475,500	$9,400	$0	$484,900
TOTAL				3	$1,425,100	$28,100	$0	$1,453,200
