
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CICHM412 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 5

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y ALGECIRAS - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

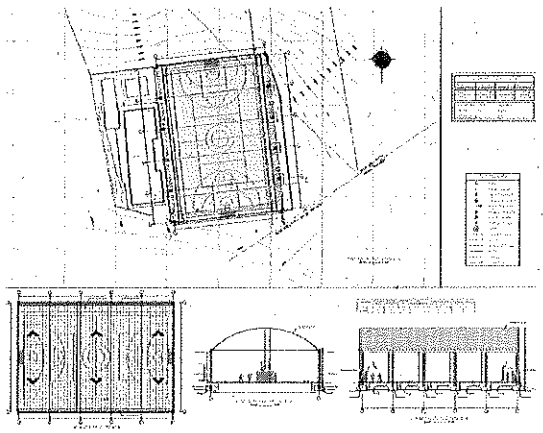

MUNICIPIO: GIGANTE – HUILA.

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CICHM412 de 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. JUAN FELIPE ALARCON	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CICHM412 de 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y ALGECIRAS - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	PERIODO DEL INFORME	Entre 01 al 30 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	NIT:	80.926.744-7
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A	C.C:	80.926.744


FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	14/11/2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	05/12/2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (29/10/2024):	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL (No.2) (16/12/2024):	UN (1) MES Y CINCO (05) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL (No.3) (16/12/2024):	DOS (2) MESES.
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES Y VIENTE (20) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
VALOR INICIAL:	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($78.095.342,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL (No.1):	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($16.567.202,00) M/CTE. IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($94.662.354,00) M/CTE.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH418 DE 2023.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL MONTALVO, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - DEPARTAMENTO DEL HUILA


CONTRATISTA	CONSORCIO GIGANTE C&M	NIT:	901.774.181- 4.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO	C.C:	7.711.971
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	22/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	05/12/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL No.1 (29/10/2024):	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.		
PLAZO ADICIONAL No.2 (13/12/2024):	TRECE (13) DÍAS.		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (28) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($495.688.780,00) M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($45.149.820,00) M/CTE		
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($540.838.600,00) M/CTE		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Gigante, departamento del Huila; Gigante es un municipio ubicado en el departamento de Huila. Esta localizado al centro oriente. Hace parte de la región andina, sobre la margen izquierda del rio Magdalena entre la cordillera occidental y el cerro Matambo. Su extensión territorial es de 626 km2, su altura es de 860 msnm y su temperatura promedio es de 24 °C.
El casco urbano del municipio está localizado en la parte noreste del departamento (Región Sub-centro). Su economía se basa principalmente en el sector agrícola (principalmente café y cacao), la ganadería, piscicultura, la extracción de petróleo y generación de energía eléctrica; ya que es parte del área de influencia de la represa del Quimbo con un 43,91 % (Porcentaje del embalse o cuenta en el área del municipio). Es conocida como «Capital Cacaotera del Huila».
El proyecto es en el Colegio Agrícola; Este colegio está ubicado dentro del casco urbano del municipio de Gigante, para acceder se debe tomar la calle 4 hacia el oriente, hasta llegar a la carrera 15, las vías son pavimentadas, y se considera de fácil acceso.

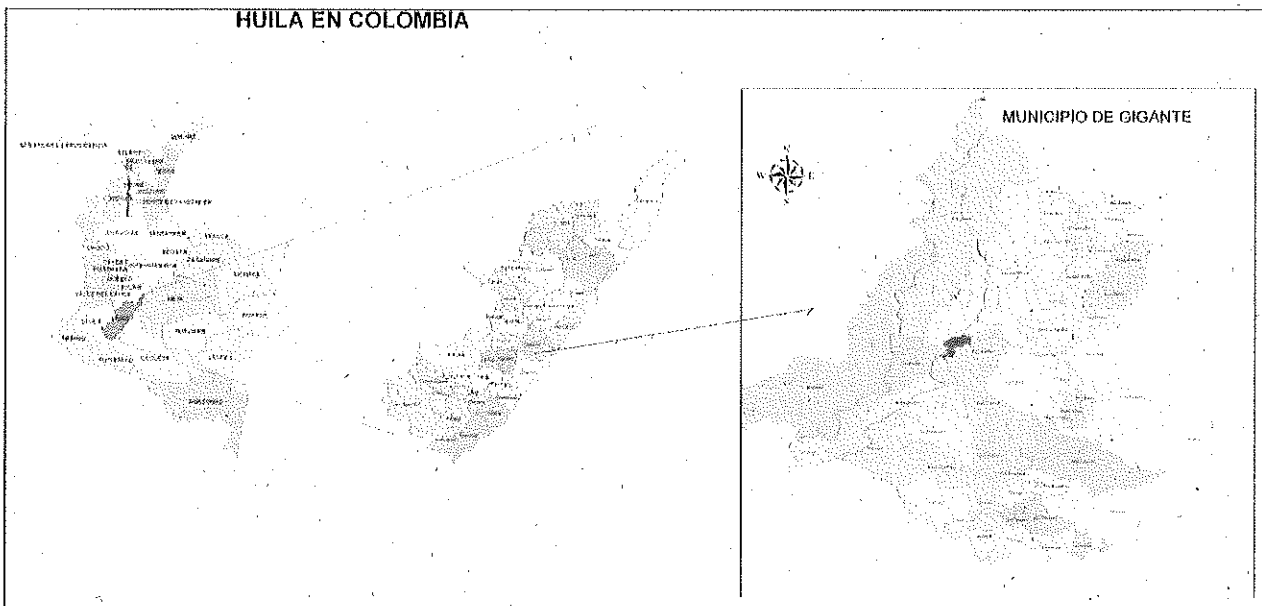

Fuente 1 Gobernación del Huila

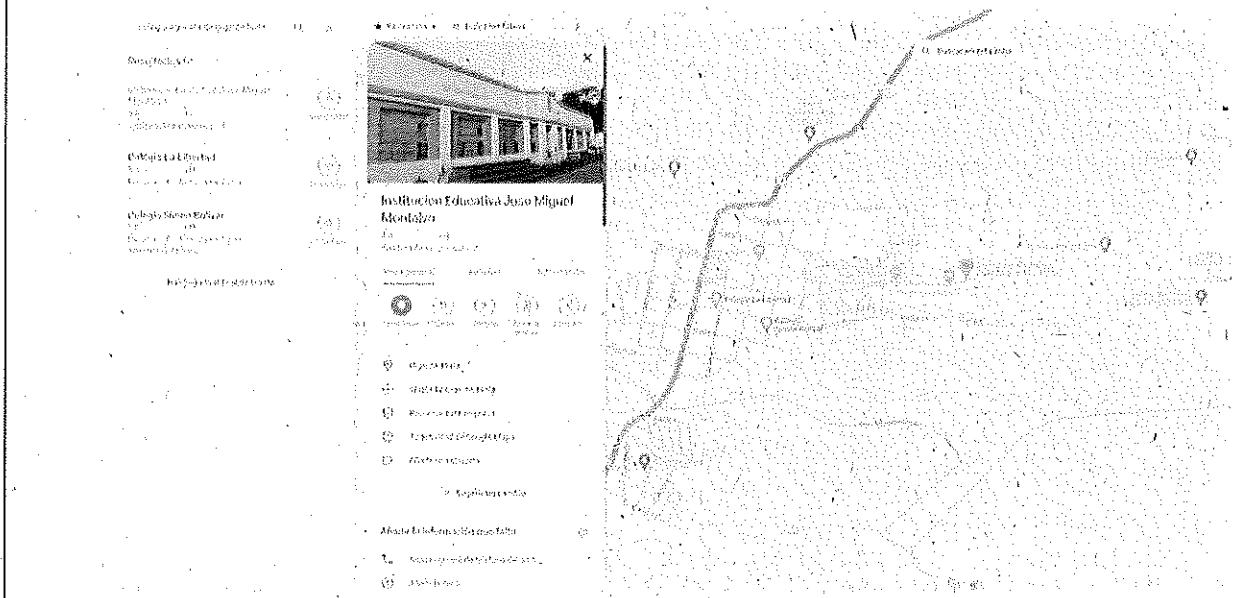

Fuente 2 Google Maps

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto al cual se le realizará la interventoría tiene como finalidad la construcción una cubierta para cancha multifuncional, según especificaciones descritas en el anexo técnico del contrato de obra, por el cual se tiene estipulado los siguientes capítulos:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
2. CONCRETOS
3. ESTRUCTURA METÁLICA - CUBIERTA
4. ACABADOS - PLACA EN CONCRETO
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6. INSTALACIONES ELECTRICAS
7. TRANSPORTE

En ejecución de las actividades se incluye la demolición de placa de concreto, construcción de cerramiento perimetral, excavación para zapatas y vigas de cimentación, y relleno compactado con recebo seleccionado para mejorar la calidad del suelo. Se ejecutan zapatas, vigas de cimentación, columnas y viga canal, con resistencia de 3000 PSI y refuerzo de acero con resistencia de 60,000 PSI.
La cubierta es autoportante, compuesta por láminas de acero calibre 22 en paneles engargolados. Se realiza la demarcación de la cancha con pintura para tráfico pesado y se instalan canchas multifuncionales en tubos de 3". Además, se construyen cunetas de concreto con resistencia de 3000 PSI.
Se suministran e instalan bajantes para aguas lluvias y tuberías de desagüe, junto con sus respectivas cajas de inspección. El sistema eléctrico incluye instalaciones de alumbrado público con cajas de inspección, reflectores LED y tomas corrientes.
Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por el INDERHUILA.
Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2024 se viene realizando la ejecución de la actividad de:

- Localización y replanteo ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Localización y replanteo	33.26 m2	5.15%

- Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	36.87 m2	7.79%

- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del	26.24 m3	8.61%

material en escombrera autorizada.		

- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	35.79 m3	17.26%

- Cerramiento provisional en lona verde ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Cerramiento provisional en lona verde	9.58 m	14.34%

- Construcción de zapatas en concreto 3000 PSI ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	0.62 m3	1.91%

- Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. zapatas ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.	2.20 kg	0.11%

- Construcción de cerramiento perimetral existente (muro, malla) H= 2 mt ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción de cerramiento perimetral existente (muro, malla) hasta, H= 2 mt.	18.00 ml	100.00%

- Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI	0.18 m3	1.71%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	55.35 kg	1.64%

- Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado, ejecutado en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	16.09 m3	100.00%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal.	1,016.34 kg	50.00%

- Suministro e instalación de manto zetal viga canal ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	56.95 m2	100.00%

- Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	469.68 m2	100.00%

- Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	323.82 ml	100.00%

- Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	559.34 m2	100.00%

- Cuneta en concreto de 3000 PSI con profundidad de 0,50m ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Cuneta en concreto de 3000 PSI con profundidad de 0,50m.	15.60 ml	100.00%

- Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación.	216.00 ml	100.00%

- Corte de placa en concreto ejecutada en el mes de diciembre

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Corte de placa en concreto.	84.80 ml	23.97%

- Rejillas prefabricadas para cunetas ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Rejillas prefabricadas para cunetas	15.60 ml	100.00%

- Suministro e instalación de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto. Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. Según diseño de planos ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto. Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. Según diseño de planos.	2.00 und	100.00%

- Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	63.00 ml	100.00%

- Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	2.00 ml	3.11%

- Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 8", con	72.40 ml	85.78%

accesorios de conexión; para salida.		

- Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. Según diseño ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño.	5.00 und	50.00%

- Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presión ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presión	3.00 ml	14.29%

- Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión	2.00 ml	3.11%

- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada, ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	6.89 m3	77.07%

- Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	32.80 ml	100.00%

- Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	2.00 und	100.00%

- Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	2.00 und	100.00%

- Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	1.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	35.00 ml	100.00%

- Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	12.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	60.00 ml	100.00%

- Suministro e instalación de reflector led de 150 w ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de reflector led de 150 w	12.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	1.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	1.00 und	100.00%

- Instalación acometida a tablero de circuitos ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Instalación acometida a tablero de circuitos	1.00 und	100.00%

- Transporte de materiales pétreos ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transporte de materiales petreos.	4,145.60 m3-Km	54.43%

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación.	05/12/2023			04/03/2024
Informe No. 1.	28/12/2023	23		
Suspensión No. 1.	28/12/2023			
Otrosí No. 1 – Apropiación presupuestal.	28/12/2023			
Reinicio No. 1.	26/08/2024		238	02/11/2024
Otrosí No. 2 -Cambio Vigencia fiscal.	26/08/2024			
Informe No. 2.	30/09/2024	35		
Otrosí No. 3 – Prorroga.	29/10/2024	29		16/12/2024
Informe No. 3.	30/10/2024	1		
Informe No. 4.	30/11/2024	30		
Otrosí No. 4 – adición y Prorroga.	16/12/2024	16		21/01/2025
Otrosí No. 5 - Prorroga	16/12/2024			21/03/2025
Informe No. 5.	30/12/2024	14		
TOTAL DIAS		148	238	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	01	05/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	01	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	01	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	02	28/12/2023
OTROSI MODIFICATORIO – APROPIACIÓN PRESUPUETAL	01	28/12/2023
ACTA DE REUNION	01	31/05/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN REINICIO	03	26/08/2024
ACTA DE REINICIO	01	26/08/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ MODIFICATORIO	04	26/08/2024
OTROSI MODIFICATORIO – CAMBIO DE VIGENCIA	02	26/08/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	05	29/10/2024
OTRO SI MODIFICATORIO - PRORROGA	03	29/10/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	06	16/12/2024
OTRO SI MODIFICATORIO – ADICION EN PRORROGA	04	16/12/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	07	16/12/2024
OTRO SI MODIFICATORIO – ADICION VALOR CONTRATO Y PRORROGA	05	16/12/2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

a). Obligaciones de Carácter General.	Durante el presente periodo se hizo control del personal en los frentes de obra donde se evidencio que el contratista cumplía con la permanencia y normas de seguridad industrial en obra del personal profesional calificado. Durante el periodo se hace la aprobación de **Otrosí modificatorio No.4** mediante el cual se hace prórroga de **un (1) mes y cinco (05) dias** más, al contrato **No. CICHM412 DE 2023**, teniendo en total de plazo **cinco (5) meses y veinte (20) dias.** Se aprueba **Otrosí modificatorio No. 5** el cual se analiza mayores y menores cantidades y se evidencia que se requieren items que no están contemplados en las condiciones iniciales del contrato y que se deben ejecutar para cumplir con las obligaciones técnicas requeridas por el proyecto, por lo tanto se adiciona al valor del contrato **DIECISEIS MILLONES QUIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS DOS PESOS ($ 16.567.202,00) M/CTE,** y se prorroga **dos (2) meses** más, quedando con un plazo total de **SIETE (7) MESES Y VEINTE (20) DIAS.** Se verifica antes y durante la jornada laboral que el equipo de trabajo este capacitado y cumpla con las normas de seguridad apropiadas, como botas, cascos, camisa, etc. Se prevé zonas aptas con todas las medidas de higiene para que los trabajadores conserven buena salud. Mediante oficios se tiene informado al supervisor del contrato por algún atraso o incumplimiento relacionado con la ejecución de la obra. Los informes mensuales con avances de obra y controles de calidad son presentados al supervisor para su respectiva observación. El contratista realiza las respectivas actualizaciones a las pólizas, y se suscribió otrosí modificatorio No. 4 y No. 5.

	Se garantizo que el contratista realizara los respectivos ajustes a las pólizas, una vez se suscriba el otrosí moderatorio del contrato. La oficina está ubicada en la Carrera 22 No. 57 – 11, Álamos norte en la ciudad de Neiva – Huila, que brinda apoyo al contratista por avanzar y socializar temas técnicos y administrativos.
b). **Actividades Administrativas.**	El contratista cumplió los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, el cual durante la ejecución del presente informe y de acuerdo con las hojas de vida aprobadas por la interventoría los perfiles son los siguientes: **HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ** – director de obra. **EDUARDO DUSSAN NAVARRO** – residente de obra. **IGNACIO ANTONIO CASTRO CAMARGO** – profesional siso. **CRISTHIAN ALEXANDER BAHAMON CUELLAR** – inspector de obra. El contratista de obra y la interventoría hicieron entrega soportes de seguridad social de los profesionales manifestados en las hojas de vida. Se suscribieron actas de justificación No. 6 y No. 7, otrosí modificatorio No. 4 Y No 5. Debido a Otrosí suscrito, el contratista y la interventoría actualizaron las pólizas del contrato. Se realizaron reuniones con el contratista para exponer las creaciones de ítems o previstos para el suministro e instalación de la cancha multifuncional de acuerdo con las especificaciones técnicas plasmadas en los planos entregados por la Entidad Contratante, INDERHUILA. Se hizo control del personal en los frentes de obra donde se evidencio que el contratista cumplía con la permanencia y normas de seguridad industrial en obra del personal profesional calificado.
c). **Actividades Operativas.**	Durante el periodo comprendido entre el **01 al 30 de diciembre de 2024** se realizó vigilancia por parte de la interventoría en el cual las obras se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas, de las cuales se ejecutaron las siguientes: ▪ Localización y replanteo ejecutada en el mes de diciembre: **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD** | **% EJECUCIÓN** Localización y replanteo | 33.26 m2 | 5.15% ▪ Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante ejecutada en el mes de diciembre: **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD** | **% EJECUCIÓN** Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante. | 36.87 m2 | 7.79% ▪ Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada ejecutada en el mes de diciembre: **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD** | **% EJECUCIÓN** Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del | 26.24 m3 | 8.61%

material en escombrera autorizada.		

- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	35.79 m3	17.26%

- Cerramiento provisional en lona verde ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Cerramiento provisional en lona verde	9.58 m	14.34%

- Construcción de zapatas en concreto 3000 PSI ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	0.62 m3	1.91%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.	2.20 kg	0.11%

- Construcción de cerramiento perimetral existente (muro, malla) H= 2 mt ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción de cerramiento perimetral existente (muro, malla) hasta, H= 2 mt.	18.00 ml	100.00%

- Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI	0.18 m3	1.71%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	55.35 kg	1.64%

- Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado, ejecutado en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN

Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	16.09 m3	100.00%

- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga canal.	1,016.34 kg	50.00%

- Suministro e instalación de manto zetal viga canal ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	56.95 m2	100.00%

- Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	469.68 m2	100.00%

- Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	323.82 ml	100.00%

- Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	559.34 m2	100.00%

- Cuneta en concreto de 3000 PSI con profundidad de 0,50m ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN

Cuneta en concreto de 3000 PSI con profundidad de 0,50m.	15.60 ml	100.00%

- Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación.	216.00 ml	100.00%

- Corte de placa en concreto ejecutada en el mes de diciembre

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Corte de placa en concreto.	84.80 ml	23.97%

- Rejillas prefabricadas para cunetas ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Rejillas prefabricadas para cunetas	15.60 ml	100.00%

- Suministro e instalación de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto. Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. Según diseño de planos ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Sumínistro e instalación de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto. Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. Según diseño de planos.	2.00 und	100.00%

- Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	63.00 ml	100.00%

- Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	2.00 ml	3.11%

- Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	72.40 ml	85.78%

- Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. Según diseño ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño.	5.00 und	50.00%

- Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presión ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presión	3.00 ml	14.29%

- Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión	2.00 ml	3.11%

- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	6.89 m3	77.07%

- Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	32.80 ml	100.00%

- Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	2.00 und	100.00%

- Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	2.00 und	100.00%

- Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	1.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	35.00 ml	100.00%

- Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	12.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores ejecutadas en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	60.00 ml	100.00%

- Suministro e instalación de reflector led de 150 w ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN

Suministro e instalación de reflector led de 150 w	12.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	1.00 und	100.00%

- Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	1.00 und	100.00%

- Instalación acometida a tablero de circuitos ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Instalación acometida a tablero de circuitos	1.00 und	100.00%

- Transporte de materiales pétreos ejecutada en el mes de diciembre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transporte de materiales pétreos.	4,145.60 m3-Km	54.43%

Se lleva control de la distancia correspondiente entre flejes, teniendo en cuenta un grado de inclinación de la aleta a 45°, así como las longitudes de traslapo. Se aprobó la fundición de la viga canal del eje B y del eje A, teniendo en cuenta la correcta instalacion de las formaletas, la viga canal del eje B y del eje A se fundieron con dosificación para concreto de 3000 PSI. Al igual que las columnas, la viga canal se fundió con mezcla acelerada, con el objetivo de que dé los tiempos de resistencia para la instalación de la cubierta.

Se realizaron las instalaciones de los bajantes de tubería de 4" para los desagües de la viga canal. También se impermeabilizó la viga canal del eje B con la instalación del manto asfáltico.

El lunes 09 de diciembre, se realiza la instalación de la cubierta del polideportivo, con ayuda de la grúa, las láminas van pernadas sobre la aleta de la viga canal que tiene una inclinación de 45°.

Se recalca que los ensayos de densidades realizados para el material a compactar carecen de uniformidad puesto que el material compactado presenta diversas características, de allí la salvedad en la nota del ensayo realizado, que indica lo siguiente "Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas".

La interventoría verifico que las medidas de la placa de concreto del polideportivo para proseguir con su respectiva fundición. A su vez, se iniciaron trabajos de las actividades eléctricas. Empezando por la canalización en ductos Conduit pvc tipo pesado, conectando las cajas de inspección.

El 13 de diciembre se firma el Otrosí modificatorio No.4 del contratista de obra para seguir con las actividades programadas.

	La interventoría autorizo la fundición del tramo de cuneta correspondiente a los ejes A6 – B6 y posteriormente se inició con el llenado y compactación del terreno donde se instaló la tubería de 8". Se instaló la tubería de 8" que conecta a la caja de inspección final y se realizó el posterior lleno y compactado del material de recebo. A su vez, se funden las cajas de inspección de aguas lluvias faltantes, luego se instalan las rejillas prefabricadas en la cuneta del tramo A6 – B6, y se realizó la fundición de la caja de inspección de aguas residuales que se adicionó en el balance aprobado mediante el Otrosí modificatorio no. 04. Se funden los dados de las canchas multifuncionales y postes de voleibol. Se inicia con los cortes a la placa de la cancha del polideportivo para generar las juntas de dilatación. Se realizó el cableado de las redes internas y se procede con la instalación de los brazos de anclaje y posteriormente se instalaron los reflectores LED de 150W. Se inició con el tratamiento de las dilataciones generadas en la cancha del polideportivo. Se dejan instalados los tomacorrientes 2 de 120V y 1 de 240V, para luego iniciar con la demarcación en pintura de la cancha del polideportivo para las 3 actividades básicas: microfútbol, baloncesto y voleibol. También se inicia con el aseo general de la obra y bodega. El sábado 28 de diciembre, se dio por finalizada la demarcación de la cancha, se instaló el tablero de baloncesto y posteriormente se pintó ambas canchas. Se continuó con el aseo general de obra y el lunes 30 de diciembre, se instalaron las mallas para los aros de baloncesto y se dio por finalizada el aseo general de obra.
d). **Actividades Logísticos.**	Se hace entrega de bitácora de obra del periodo comprendido entre el **01 al 30 de diciembre de 2024**. Para la aprobación de actividades, se efectúan mediciones de cada ítem ejecutado diariamente para dar viabilidad a las siguientes actividades. Se realiza comités semanales con fin de demostrar avances en la ejecución de obra, los cuales son:

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	**Lugar**	**Resultado del Comité** (Describir)
06/12/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila.	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.
09/12/2024	INDERHUILA.	El Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, deberá presentar el Acta de modificación no. 02 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
10/12/2024	INDERHUILA.	El Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, deberá presentar el Acta de modificación no. 02 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
20/12/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila.	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.

	27/12/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila.	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.	


Se hacen inspecciones de obra, para evaluar los trabajos ejecutados en las activades operativas ya mencionadas. A su vez se controlan que los materiales de construcción suministrados por el contratista sean los adecuados y cumplan con las especificaciones técnicas.

En el presente informe del periodo del **01 al 30 de diciembre de 2024** se presentan las memorias de cálculo de las actividades ejecutadas descritas en las obligaciones - actividades operativas.

El día **30 de diciembre de 2024** se hace entrega mensual de informe de interventoría.


e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	Se aseguro la ubicación óptima y estratégica del área de acopio para los materiales excedentes susceptibles de reutilización, verificando que no se encuentren en proximidad de zonas de reserva ambiental, que no interfieran con cuerpos hídricos, ni generen filtraciones o impactos negativos sobre el medio ambiente. Además, el área debe estar situada fuera de las zonas de circulación del personal y maquinaria, garantizando un acceso fluido y seguro para la entrada y salida de los operarios y equipos. Para los residuos sólidos, como los plásticos, se deben implementar estrategias de gestión que promuevan una mayor concienciación y compromiso en cuanto a la generación de desechos. Estas estrategias deben incluir la divulgación de prácticas orientadas a la minimización de residuos en su origen, fomentando una cultura de uso responsable. Además, los plásticos deben ser almacenados en condiciones controladas, protegidos de factores climáticos adversos, con el fin de prevenir su deterioro, y posteriormente ser entregados a la empresa especializada en su valorización y reciclaje. Capacitación ambiental al personal de obra, tanto operativo como administrativo, fortaleciendo las competencias del personal en el cuidado del medio ambiente, la parte locativa y el cuidado de todas las personas que están presentes en la obra. En dicha capacitación se abordaron temas claves relacionados con el cuidado del medio ambiente y la importancia de reciclar materiales como papel, cartón, plástico y vidrio. Además, se destacará la relevancia de estas prácticas en la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Se realizo buen manejo de residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, de acuerdo con el plan de manejo ambiental. Se ubicó puntos limpios para depositar los residuos sólidos y realizar separación en la fuente. El buen porcentaje actual del cumplimiento del Plan de manejo ambiental es un referencial considerable, que permite establecer que los controles que se están estableciendo, están siendo efectivos, ya que se han ejecutado las actividades acordes a los lineamientos de la ley ambiental vigente. Para seguir con la mejora continua en todos los procesos y alcanzar el mayor porcentaje de cumplimiento se continuará con el cronograma de capacitaciones, reuniones y metodologías que permitan mantener al personal enfocado y calificado para el correcto desempeño de sus labores a favor del cuidado del medio ambiente. Se destaca el alto compromiso en la colaboración por parte de todo el talento humano para realizar las actividades, procurando el menor impacto ambiental negativo.

f). **Actividades Financieras.**	En el periodo del **01 al 30 de diciembre de 2024** se analiza el avance financiero de obra, para prever futuras adiciones al contrato y disponibilidad presupuestal, en el presente informe en el numeral 19, se presenta el balance económico de ejecución del contrato presentando un avance por cada ítem y un avance general del periodo. Se hizo control de vinculación del personal por parte del contratista a sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades. Identificación y análisis de riesgos financieros que puedan afectar la ejecución de la obra, tales como la inflación de costos, fluctuaciones en los precios de los materiales o demoras en los pagos. Desarrollo de estrategias de mitigación de estos riesgos, como la contratación de seguros o la inclusión de cláusulas de ajuste en el contrato.
g). **Actividades Jurídicos.**	Durante el periodo del **01 al 30 de diciembre de 2024** se realizaron todas las actividades de revisión y acompañamiento en pólizas teniendo en cuenta anexos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones con respecto al periodo. Se realizaron todas las actividades de revisión y acompañamiento para un perfeccionamiento legal y jurídico del contrato de obra **CLPIH418 de 2023**. Se garantizo que el contratista de obra cumpla con la ejecución de la obra, respetando el objetivo del contrato. En el periodo del **01 al 30 de diciembre de 2024** se han entregado seguridad social de parte del contratista de los profesionales manifestados en las hojas de vida. A su vez la interventoría hace la entrega de la seguridad social de las hojas de vida manifestadas a la entidad, en el que se tuvo un control del personal para verificar que se encuentren a paz y salvo. La interventoría hace análisis de riesgos financieros que puedan afectar la ejecución de la obra, tales como la inflación de costos, fluctuaciones en los precios de los materiales o demoras en los pagos y se Desarrollan estrategias de mitigación de estos riesgos, como la contratación de seguros o la inclusión de cláusulas de ajuste en el contrato y es necesario. Mediante oficios se tiene informado al supervisor del contrato y a la entidad **INDERHUILA** por algún atraso o incumplimiento relacionado con la ejecución de la obra. Se asegura que, si hay cambios durante la ejecución de la obra, como variaciones en el diseño, plazos adicionales o ajustes en los costos, estos deben formalizarse mediante la modificación del contrato, siguiendo los procedimientos legales y contractuales.
9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO	
Probabilidad de Precipitación en diciembre en Gigante	

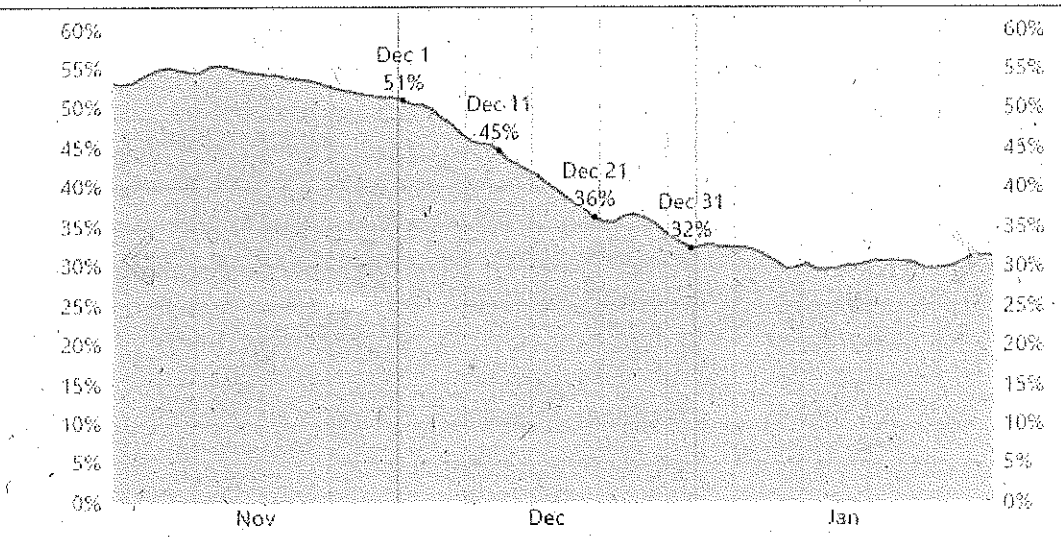

Fuente: *Web Weather Spark*

Un día lluvioso es aquel con al menos 0,04 pulgadas de precipitación líquida o equivalente a líquido. En Gigante, la probabilidad de un día lluvioso durante el transcurso de diciembre está disminuyendo muy rápidamente, comenzando el mes en 51% y terminándolo en 32%.

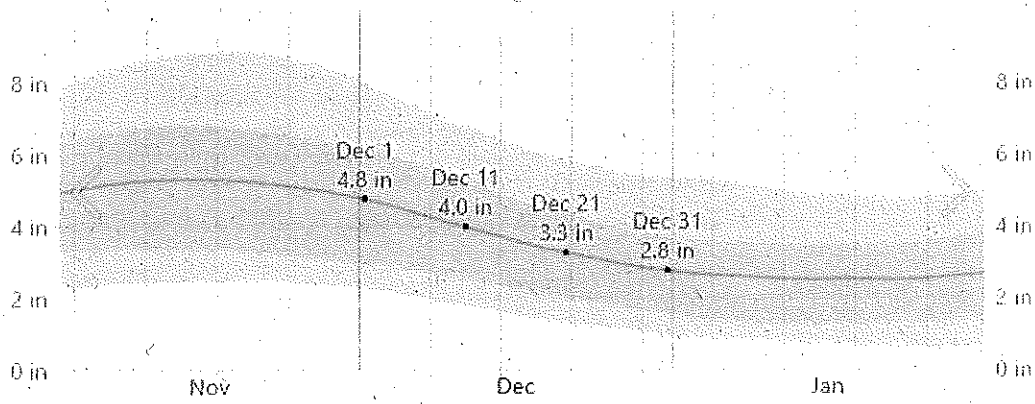

Fuente: *Web Weather Spark*

La precipitación promedio de 31 días durante diciembre en Gigante está disminuyendo rápidamente, comenzando el mes en 4.8 pulgadas, cuando rara vez excede las 8.0 pulgadas o cae por debajo de las 2.3 pulgadas, y terminando el mes en 2.8 pulgadas, cuando rara vez excede las 5.4 pulgadas o cae por debajo de las 0.9 pulgadas.

DÍA	ESTADO DEL TIEMPO
01/12/2024	LLUVIA TENUE
02/12/2024	LLUVIA TENUE
03/12/2024	SOLEADO
04/12/2024	LLUVIA FUERTE

05/12/2024	SOLEADO
06/12/2024	LLUVIA FUERTE
07/12/2024	SOLEADO
08/12/2024	LLUVIA TENUE
09/12/2024	SOLEADO
10/12/2024	SOLEADO
11/12/2024	SOLEADO
12/12/2024	LLUVIA MODERADA
13/12/2024	LLUVIA TENUE
14/12/2024	LLUVIA TENUE
15/12/2024	SOLEADO
16/12/2024	LLUVIA TENUE
17/12/2024	SOLEADO
18/12/2024	SOLEADO
19/12/2024	SOLEADO
20/12/2024	LLUVIA TENUE
21/12/2024	LLUVIA MODERADA
22/12/2024	SOLEADO
23/12/2024	SOLEADO
24/12/2024	SOLEADO
25/12/2024	SOLEADO
26/12/2024	SOLEADO
27/12/2024	SOLEADO
28/12/2024	SOLEADO
29/12/2024	SOLEADO
30/12/2024	LLUVIA FUERTE

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseño de mezcla concreto hidráulico	3000 PSI	1.0:1.7:1.5
Diseño de mezcla concreto hidráulico	2500 PSI	1.0:2.0:1.6
Diseño de mezcla concreto hidráulico	2000 PSI	1.0:2.3:1.8

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ROTURA	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
Elemento	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	7	14	28	PSI	PSI	
Viga canal eje B	03/12/2024	10/12/2024	X			3000	2222	CUMPLE (74%)

		17/12/2024		X		3000	2800	CUMPLE (93%)
		31/12/2024			X	3000	3224	CUMPLE (107%)
Viga canal eje A	06/12/2024	13/12/2024	X			3000	2220	CUMPLE (74%)
		20/12/2024		X		3000	2737	CUMPLE (91%)
		03/01/2025			X	3000	Pendiente a rotura del cilindro	
Placa de concreto	10/12/2024	12/12/2024	X			3000	2186	CUMPLE (73%)
		24/12/2024		X		3000	2868	CUMPLE (96%)
		07/01/2025			X	3000	Pendiente a rotura del cilindro	

Tipo Prueba de Laboratorio	Compactación del Terreno	Promedio de Compactación
Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno – Método cono de arena	**1 -> 97.5% 2 -> 96.2%**	**96.85%**

CONTROL RESULTADO DE ENSAYO Y PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ROTURA	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
Elemento	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	7	14	28	PSI	PSI	
Viga canal	03/12/2024	10/12/2024	X			3000	2713.44	CUMPLE (40%)
		17/12/2024		X		3000	3028.18	CUMPLE (65%)
		31/12/2024			X	3000	3058.55	CUMPLE (100%)
Viga canal	06/12/2024	13/12/2024	X			3000	2576.31	CUMPLE (40%)
		20/12/2024		X		3000	2902.28	CUMPLE (65%)

		03/01/2025			X	3000		CUMPLE (100%)
Placa	10/12/2024	17/12/2024	X			3000	2677.48	CUMPLE (40%)
		24/12/2024		X		3000	2882.05	CUMPLE (65%)
		07/01/2025			X	3000		CUMPLE (100%)
Placa	12/12/2024	19/12/2024	X			3000	2821.35	CUMPLE (40%)
		26/12/2024		X		3000	3086.63	CUMPLE (65%)
		09/01/2025			X	3000		CUMPLE (100%)
Cuneta	14/12/2024	21/12/2024	X			3000	3030.43	CUMPLE (40%)
		28/12/2024		X		3000	3098.11	CUMPLE (65%)
		11/01/2025			X	3000		CUMPLE (100%)

Tipo Prueba de Laboratorio	Compactación del Terreno	Promedio de Compactación
Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno – Método cono de arena	1 -> 98.8% 2 -> 98.4% 3 -> 97.9% 4 -> 99.3%	98.6%

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	N/A			
Acta Parcial No. 1	N/A			
Acta Recibo Final No.4	N/A			
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 78.095.342,00	$	$ 78.095.342,00	$	$ 78.095.342,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)

06/12/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.
09/12/2024	INDERHUILA	El Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, deberá presentar el Acta de modificación no. 02 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
10/12/2024	INDERHUILA	El Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, deberá presentar el Acta de modificación no. 02 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
20/12/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.
27/12/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 6	30/12/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 6	30/12/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 7	30/12/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 7	30/12/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Actas de comités (periodo del **(01/12/2024) al (30/12/2024)**).	30/12/2024	N/A	Físico
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo DEL **(01/12/2024) al (30/12/2024)**).	30/12/2024	N/A	Digital
Copias de Bitácora de Obra (periodo del **(01/12/2024) al (30/12/2024)**).	30/12/2024	N/A	Digital
Correspondencia (periodo del **(01/12/2023) al (30/12/2024)**).	30/12/2024	N/A	Digital

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION

GILDARDO SERRATO SERRATO	1.075.598.217	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR LABOR
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	80.926.744	RESIDENTE DE INTERVENTOR	CONTRATO POR LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
GILDARDO SERRATO SERRATO	$ 299.200	$ 233.800	$ 130.200	$ 37.400	$ 0	9480142849
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	$ 208.000	$ 162.300	$ 90.500	$ 26.000	$ 0	9479414638
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	$ 360.000	$ 281.300	$ 156.600	$ 45.000	$ 0	9480144342

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza actualizada OTRO SI No. 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA	ASEGURADORA	ASEGURADORA	ASEGURADORA	ASEGURADORA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6	CHU-100010216		12/12/2024	Cumplimiento del contrato	29/10/2024	21/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/10/2024	21/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	21/12/2024	21/12/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	ASEGURADORA	ASEGURADORA	ASEGURADORA	ASEGURADORA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6	CHU-100002056		12/12/2024	05/12/2023	21/12/2024

Póliza actualizada OTRO SI No. 4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7	CHU-100010216		30/12/2024	Cumplimiento del contrato	26/12/2024	26/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		


				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/12/2024	26/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	26/01/2025	26/01/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7	CHU-100002056		30/12/2024	05/12/2023	26/01/2025


18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)


- **Plano general:** Contiene levantamiento topográfico que consta de replanteo de puntos en los ejes estructurales de columnas sobre el área de la cubierta autoportante, dentro de la institución educativa José Miguel Montalvo en el municipio de Gigante, departamento del Huila. También relaciona el área de adecuación para movimiento de tierra en la zona de terreno natural a nivel de placa de contrapiso de la cancha múltiple.

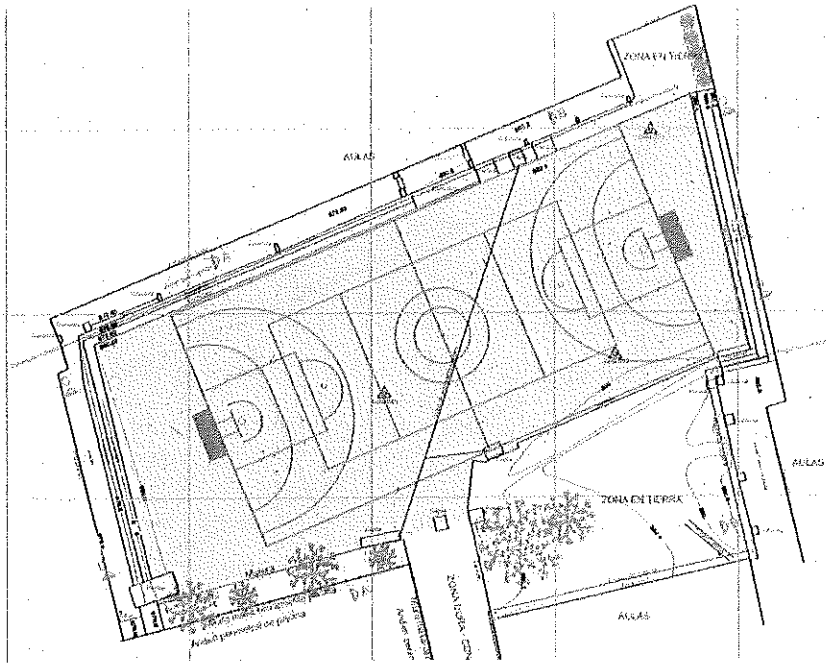


- **Plano estructural E-1:** Contiene la vista en planta de la cimentación (zapatas y viga de cimentación) y el despiece de la viga de cimentación.

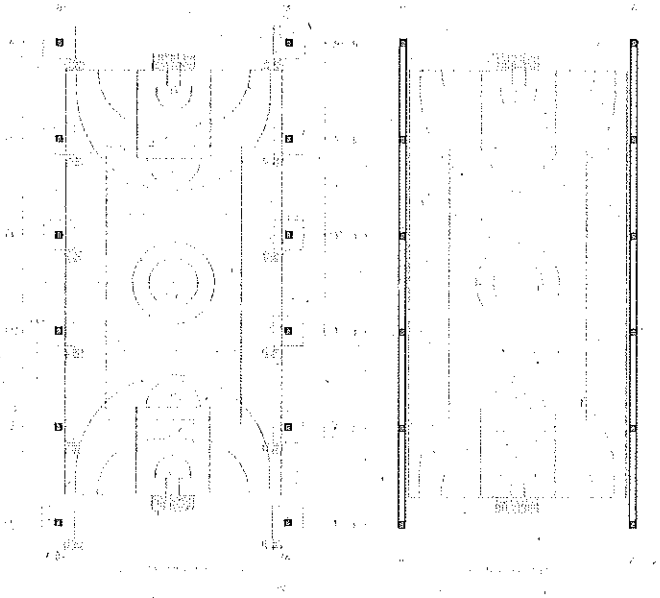


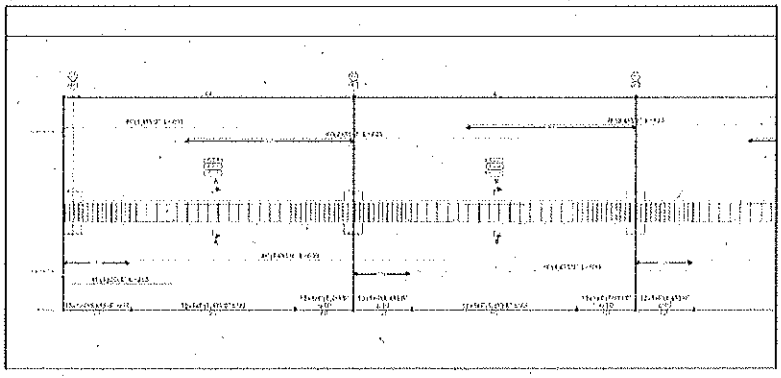

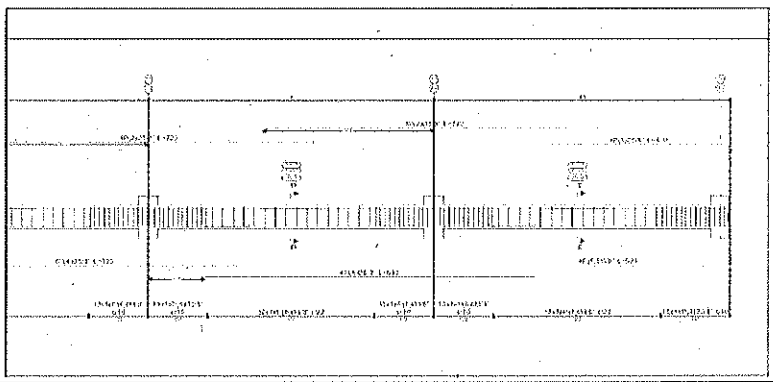


- **Plano estructural E-2:** contiene la vista en planta de la viga aérea, el despiece de las zapatas, columnas y viga aérea.

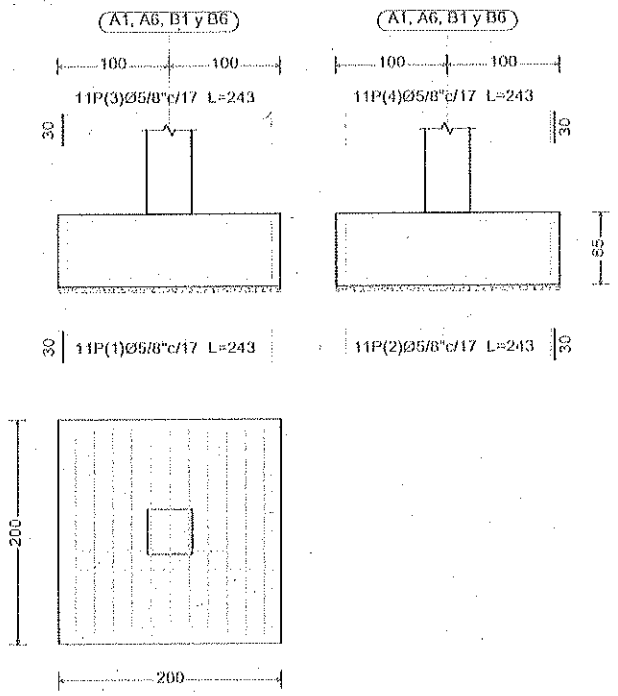

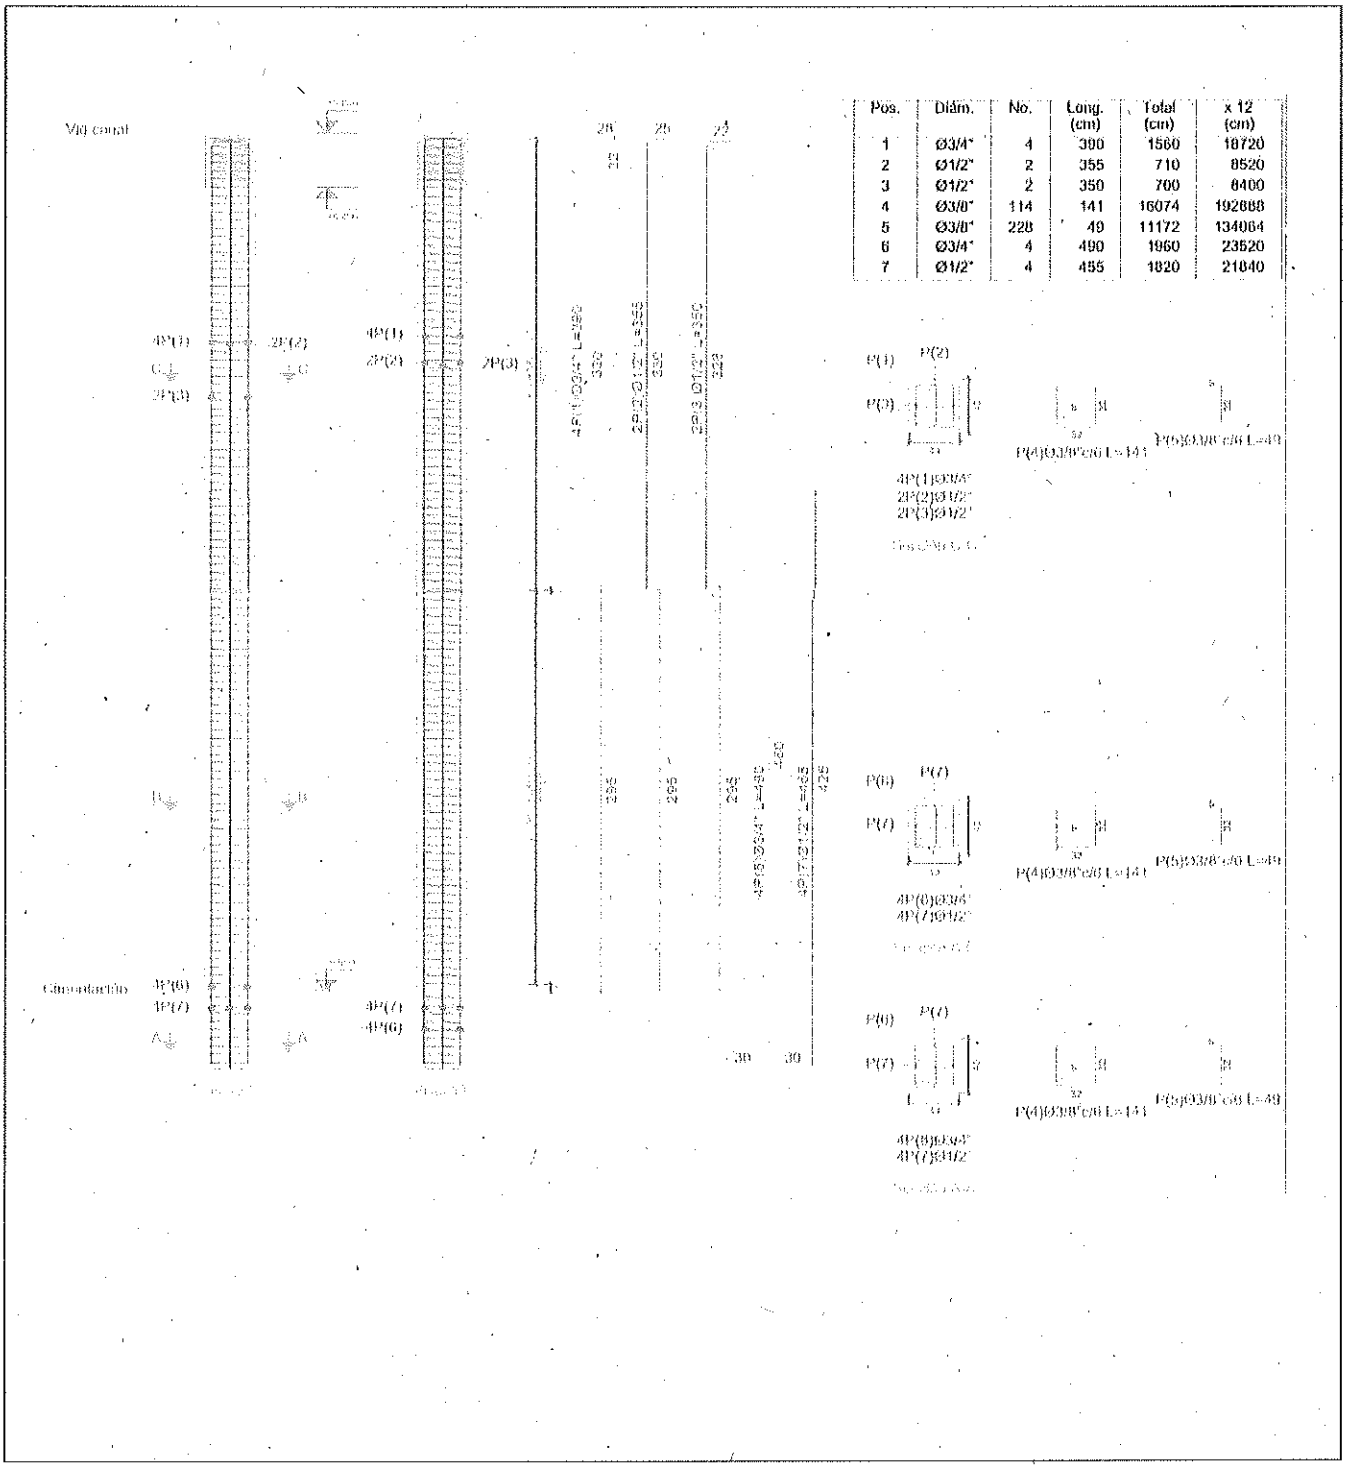


Pos.	Diám.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	x 12 (cm)
1	Ø3/4"	4	390	1560	18720
2	Ø1/2"	2	355	710	8520
3	Ø1/2"	2	350	700	8400
4	Ø3/8"	114	141	16074	192888
5	Ø3/8"	228	49	11172	134064
6	Ø3/4"	4	490	1960	23520
7	Ø1/2"	4	455	1820	21840


- **Plano eléctrico EL-1:** contiene la georreferenciación de las instalaciones eléctricas.

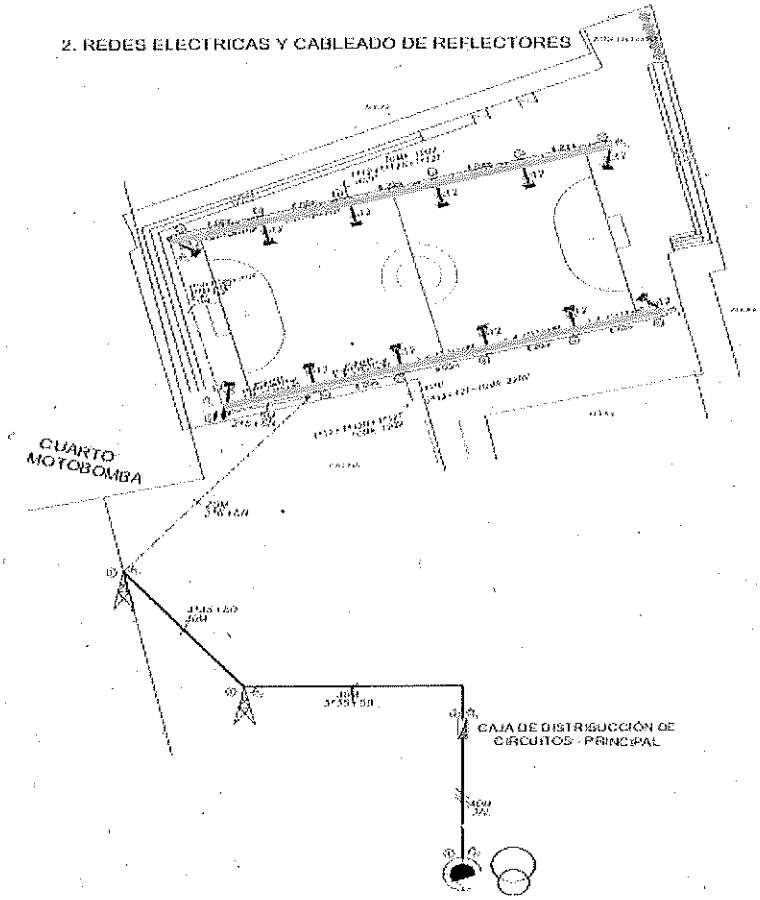


- **Esquema corte de placa en concreto:** contiene la delimitación que debe tener el corte de placa en concreto.

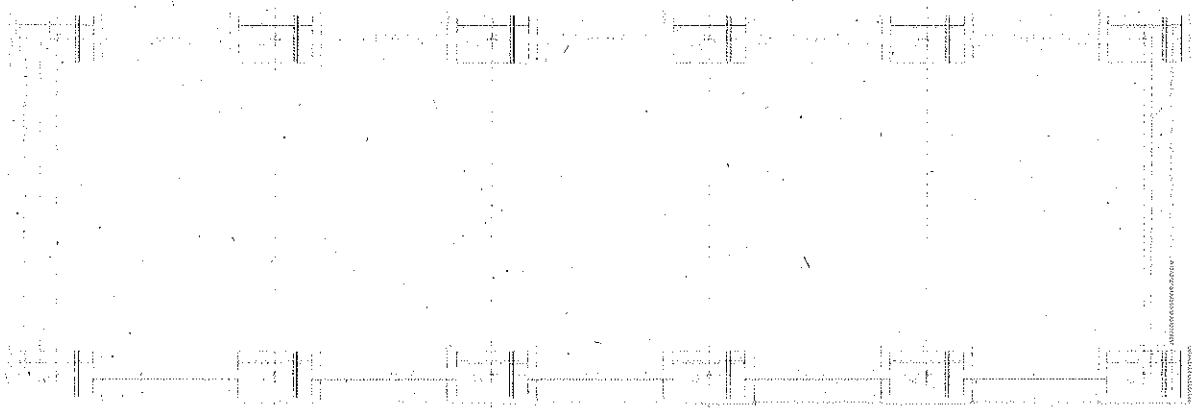

- **Esquema tuberías:** contiene el trazado de la tubería a redireccionar para que no atraviese la placa nueva de concreto.

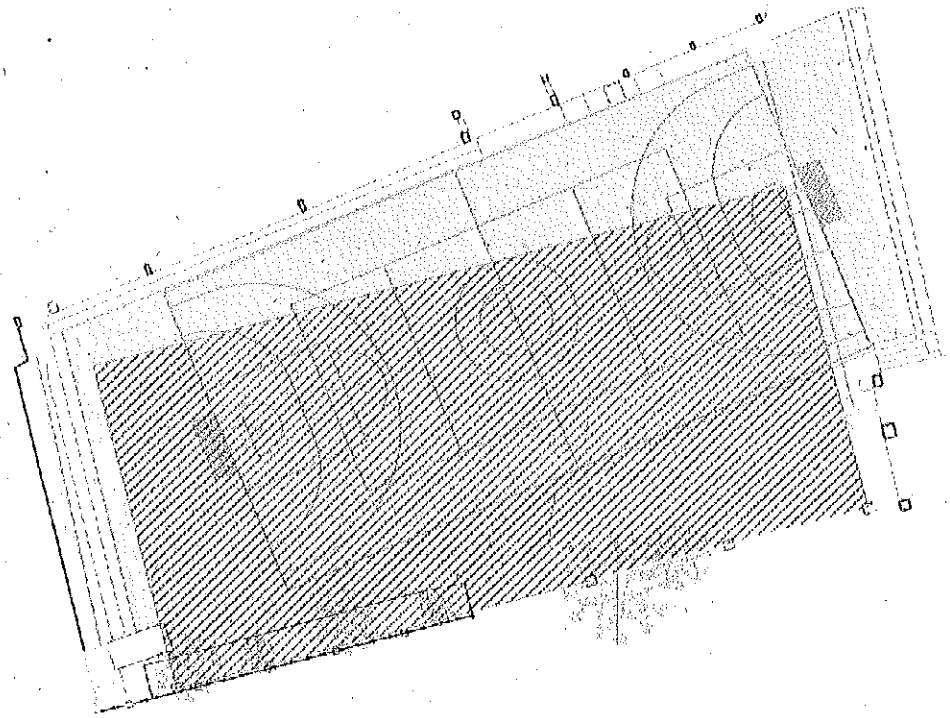

- **Esquema cerramiento perimetral:** contiene el detalle del cerramiento perimetral nuevo a construir.

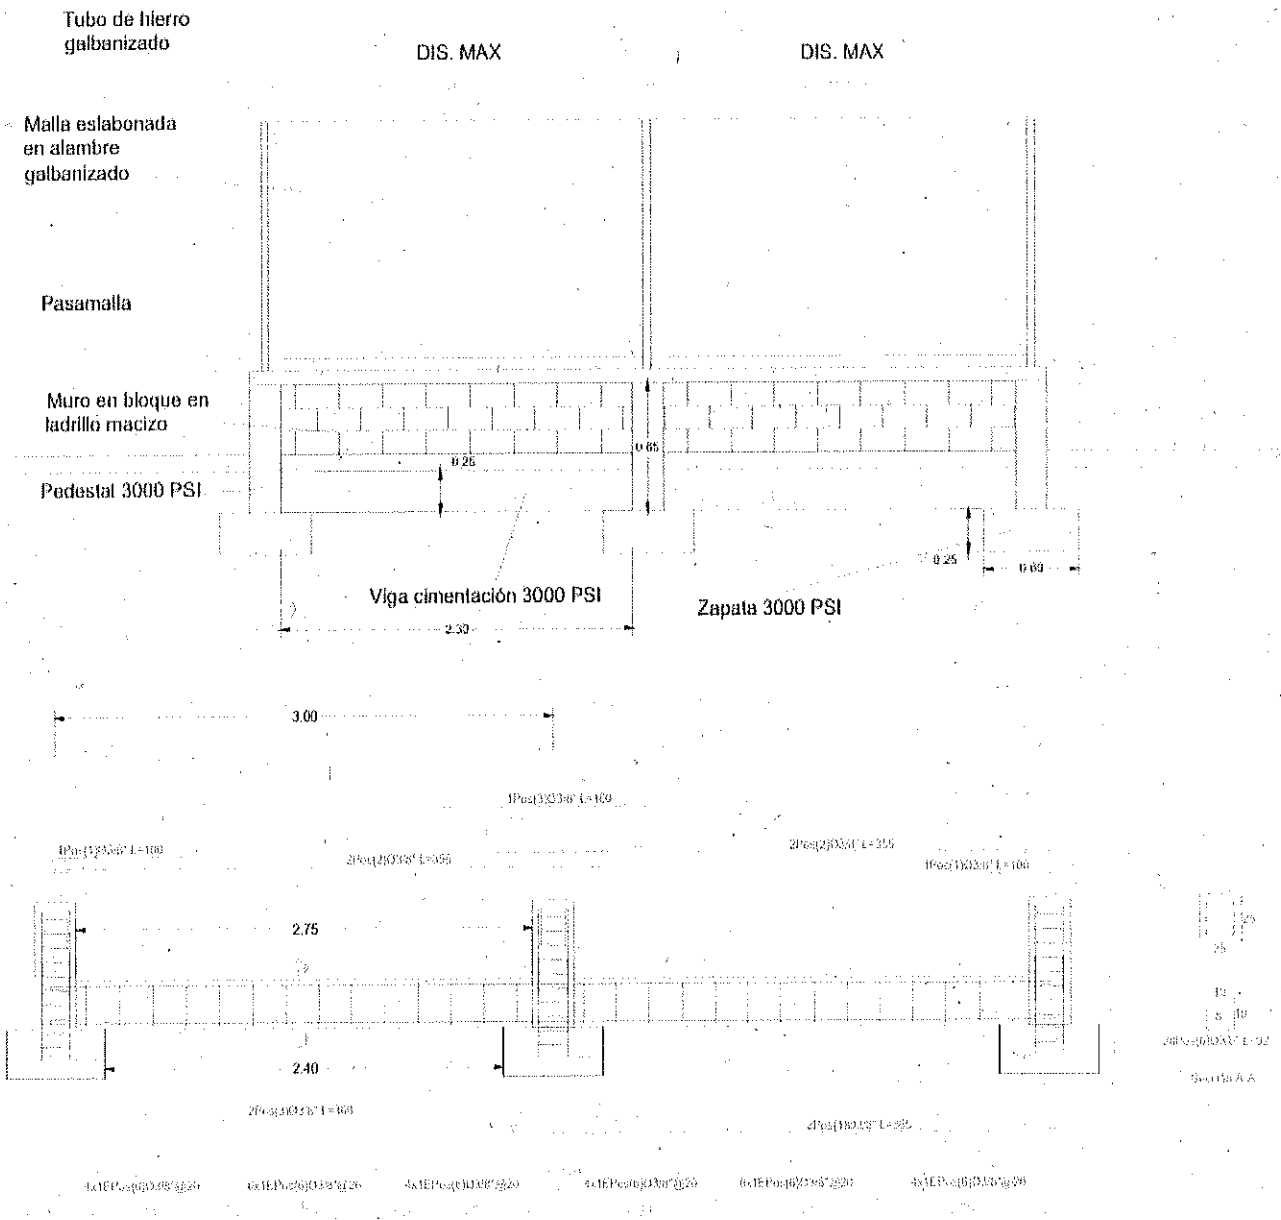

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN NO. 2 (13/12/2024)		EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	% EJECUCION
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	536.56	$ 3,565.00	$ 1,912,836.00	645.87	$ 2,302,527.00	33.26	$ 118,571.90	5.15%	645.87	100.00%
1.02	Demolición de placa de concreto e= 0.10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	602.21	$ 26,329.00	$ 15,855,587.00	473.18	$ 12,456,356.00	36.87	$ 970,750.23	7.79%	473.18	100.00%
1.03	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta. H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	20.74	$ 20,899.00	$ 433,445.00	19.22	$ 401,679.00	0.00	$ -	0.00%	19.22	100.00%
1.04	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	$ 117,116.00	$ 234,232.00	2.00	$ 234,232.00	0.00	$ -	0.00%	2.00	100.00%
1.05	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	87.57	$ 46,090.00	$ 4,036,101.00	304.69	$ 14,043,162.00	26.24	$ 1,209,401.60	8.61%	304.69	100.00%
1.06	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	23.53	$ 84,008.00	$ 1,976,708.00	207.35	$ 17,419,059.00	35.79	$ 3,006,646.32	17.26%	207.35	100.00%
NP. 1.07	Cerramiento provisional en lona verde	ML	0.00	$ 38,304.00	$ -	66.82	$ 2,559,657.00	9.58	$ 366,952.32	14.34%	66.82	100.00%
NP. 1.08	Retiro trampolin piscina	UND	0.00	$ 109,260.00	$ -	1.00	$ 109,260.00	0.00	$ -	0.00%	1.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 24,448,909.00		$ 49,527,932.00		$ 5,672,322.37	11.45%		100.00%
2	CIMENTACIÓN											
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	68.52	$ 34,077.00	$ 2,334,956.00	70.02	$ 2,386,072.00	0.00	$ -	0.00%	70.02	100.00%
2.02	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	44.24	$ 620,231.00	$ 27,439,019.00	32.45	$ 20,126,496.00	0.62	$ 384,543.22	1.91%	32.45	100.00%
2.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3,207.00	$ 7,130.00	$ 22,865,910.00	2,030.40	$ 14,476,752.00	2.20	$ 15,686.00	0.11%	2,030.40	100.00%
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	6.61	$ 743,441.00	$ 4,914,145.00	13.29	$ 9,880,331.00	0.00	$ -	0.00%	13.29	100.00%
2.05	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1,276.00	$ 7,130.00	$ 9,097,880.00	1,347.38	$ 9,606,819.00	0.00	$ -	0.00%	1,347.38	100.00%
NP. 2.06	Construcción de cerramiento perimetral existente (muro, malla) hasta. H= 2 mt.	ML	0.00	$ 377,008.00	$ -	18.00	$ 6,786,144.00	18.00	$ 6,786,144.00	100.00%	18.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 66,651,910.00		$ 63,262,614.00		$ 7,186,373.22	11.36%		100.00%

3	ESTRUCTURA EN CONCRETO											
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	13.00	$ 922,566.00	$ 11,993,358.00	10.55	$ 9,733,071.00	0.18	$ 166,061.86	1.71%	10.55	100.00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4,720.00	$ 7,130.00	$ 33,653,600.00	3,375.03	$ 24,063,964.00	55.35	$ 394,645.50	1.64%	3,375.03	100.00%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	18.00	$ 1,006,771.00	$ 18,121,878.00	16.09	$ 16,198,945.00	16.09	$ 16,198,945.39	100.00%	16.09	100.00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,367.00	$ 7,130.00	$ 16,876,710.00	2,032.70	$ 14,493,151.00	1016.36	$ 7,246,646.80	50.00%	2,032.70	100.00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60.80	$ 40,424.00	$ 2,457,779.00	56.95	$ 2,302,147.00	56.95	$ 2,302,146.80	100.00%	56.95	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 83,103,325.00		$ 66,791,278.00		$ 26,308,446.37	39.39%		60.61%
4	CUBIERTA											
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	548.11	$ 211,958.00	$ 116,176,299.00	469.68	$ 99,552,433.00	469.68	$ 99,552,433.00	100.00%	469.68	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 116,176,299.00		$ 99,552,433.00		$ 99,552,433.00	0.00%		0.00%
5	ACABADOS – PLACA EN CONCRETO											
5.01	Demarcación de cancha en pintura trafico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,826.00	$ 4,553,212.86	323.82	$ 4,800,955.00	323.82	$ 4,800,955.32	100.00%	323.82	100.00%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto. Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2.00	$ 3,717,773.00	$ 7,435,546.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00%	-	0.00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	420.00	$ 84,130.00	$ 35,334,600.00	559.34	$ 47,057,274.00	559.34	$ 47,057,274.20	100.00%	559.34	100.00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60.60	$ 84,010.00	$ 5,107,806.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00%	-	0.00%
NP. 5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI con profundidad de 0.50m	ML	0.00	$ 98,383.00	$ -	15.60	$ 1,534,775.00	15.60	$ 1,534,774.80	100.00%	15.60	100.00%
NP. 5.06	Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	ML	0.00	$ 28,142.00	$ -	216.00	$ 6,078,672.00	216.00	$ 6,078,672.00	100.00%	216.00	100.00%
NP. 5.07	Corte de placa en concreto	ML	0.00	$ 7,591.00	$ -	353.84	$ 2,685,999.00	84.80	$ 643,716.80	23.97%	353.84	100.00%
NP. 5.08	Rejillas prefabricadas para cunetas	ML	0.00	$ 166,020.00	$ -	15.60	$ 2,589,912.00	15.60	$ 2,589,912.00	100.00%	15.60	100.00%
NP. 5.09	Suministro e instalación de cancha multifuncional Futbol de Salón: Baloncesto. Incluye: aro, malla.	UND	0.00	$ 3,717,773.00	$ -	2.00	$ 7,435,546.00	2.00	$ 7,435,546.00	100.00%	2.00	100.00%

	demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. Según diseño de planos.											
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 52,431,166.86**		**$ 72,183,133.00**		**$ 62,705,305.12**	**96.85%**		**100.00%**
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión: para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	65.00	$ 80,296.00	$ 5,219,240.00	63.00	$ 5,058,648.00	63.00	$ 5,058,648.00	100.00%	63.00	100.00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión: para desagues.	ML	14.56	$ 107,293.00	$ 1,562,186.00	64.30	$ 6,898,940.00	2.00	$ 214,586.00	3.11%	64.30	100.00%
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión: para salida.	ML	20.00	$ 219,466.00	$ 4,389,320.00	84.40	$ 18,522,930.00	72.40	$ 15,889,338.40	85.78%	84.40	100.00%
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI. de seccion 0.70*0.70. H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 350,649.00	$ 701,298.00	10.00	$ 3,506,490.00	5.00	$ 1,753,245.00	50.00%	10.00	100.00%
NP. 6.05	Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión	ML	0.00	$ 26,226.00	$ -	64.30	$ 1,686,332.00	2.00	$ 52,452.00	3.11%	64.30	100.00%
NP. 6.06	Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presión	ML	0.00	$ 42,005.00	$ -	21.00	$ 882,105.00	3.00	$ 126,015.00	14.29%	21.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 11,872,044.00**		**$ 36,555,445.00**		**$ 23,094,284.40**	**63.18%**		**100.00%**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
7.01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	4.00	$ 640,108.00	$ 2,560,432.00	4.00	$ 2,560,432.00	0.00	$ -	0.00%	4.00	100.00%
7.02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	6.40	$ 46,090.00	$ 294,976.00	8.94	$ 412,045.00	6.89	$ 317,560.10	77.07%	8.94	100.00%
7.03	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0.40 mts.	ML	40.00	$ 49,435.00	$ 1,977,400.00	32.80	$ 1,621,468.00	32.80	$ 1,621,468.00	100.00%	32.80	100.00%
7.04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 305,078.00	$ 610,156.00	2.00	$ 610,156.00	2.00	$ 610,156.00	100.00%	2.00	100.00%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,809.00	$ 565,618.00	2.00	$ 565,618.00	2.00	$ 565,618.00	100.00%	2.00	100.00%
7.06	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,018,745.00	$ 1,018,745.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00	0.00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,710,084.00	$ 4,710,084.00	1.00	$ 4,710,084.00	1.00	$ 4,710,084.00	100.00%	1.00	100.00%
7.08	Suministro e instalación de cableado para red de distribucion principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	35.00	$ 88,702.00	$ 3,104,570.00	35.00	$ 3,104,570.00	35.00	$ 3,104,570.00	100.00%	35.00	100.00%

7.09	Instalación brazo sencillo según diseño de 3.5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliester, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 369,665.00	$ 4,435,980.00	12.00	$ 4,435,980.00	12.00	$ 4,435,980.00	100.00%	12.00	100.00%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00	$ 58,262.00	$ 3,495,720.00	60.00	$ 3,495,720.00	60.00	$ 3,495,720.00	100.00%	60.00	100.00%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,020,712.00	$ 12,248,544.00	12.00	$ 12,248,544.00	12.00	$ 12,248,544.00	100.00%	12.00	100.00%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 976,854.00	$ 976,854.00	1.00	$ 976,854.00	1.00	$ 976,854.00	100.00%	1.00	100.00%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,037,321.00	$ 1,037,321.00	1.00	$ 1,037,321.00	1.00	$ 1,037,321.00	100.00%	1.00	100.00%
NP. 7.14	Instalación acometida a tablero de circuitos	UND	0.00	$ 625,694.00	$ -	1.00	$ 625,694.00	1.00	$ 625,694.00	100.00%	1.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 37,036,400.00**		**$ 36,404,486.00**		**$ 36,404,486.00**	**92.71%**		**100.00%**
8	**TRANSPORTE**											
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4,383.82	$ 1,102.00	$ 4,830,970.00	7,616.66	$ 8,393,559.00	4145.60	$ 4,568,451.20	54.43%	7,616.66	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 4,830,970.00**		**$ 8,393,559.00**		**$ 4,568,451.20**	**54.43%**		**100.00%**
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 396,551,024.00**		**$ 432,670,880.00**		**$ 262,837,185.22**			
Administración		**20%**			**$ 79,310,205.00**		**$ 86,534,176.00**		**$ 52,567,437.00**			
Imprevistos		**1%**			**$ 3,965,510.00**		**$ 4,326,709.00**		**$ 2,628,372.00**			
Utilidad		**4%**			**$ 15,862,041.00**		**$ 17,306,835.00**		**$ 10,513,487.00**			
TOTAL COSTO					**$ 495,688,780.00**		**$ 540,838,600.00**		**$ 328,546,482.00**			
% AVANCE DE OBRA										**61.81%**		**100.00%**


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ARQ. JUAN FELIPE ALARCON
Vo.Bo APOYO SUPERVISION

ING. GILDARDO SERRATO SERRATO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


20. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM 1.02. DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO E=0.10 MTS. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE:

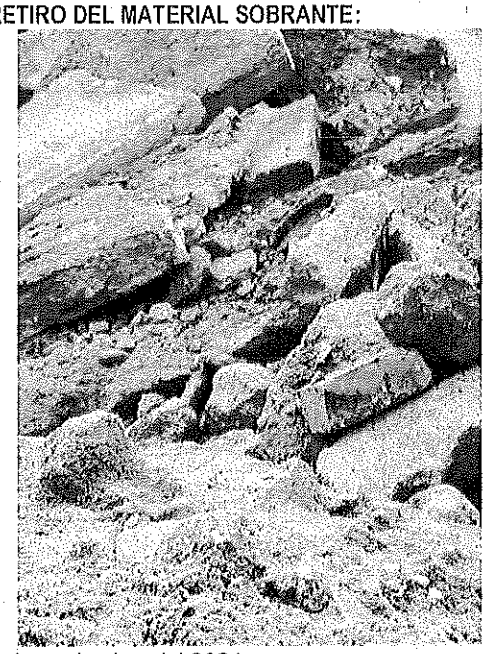
Demolición de placa en concreto - 01 al 07 de noviembre del 2024.

ITEM 1.05. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. INCLUYE: TODO FACTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA



Excavación manual- 01 al 09 de noviembre del 2024.

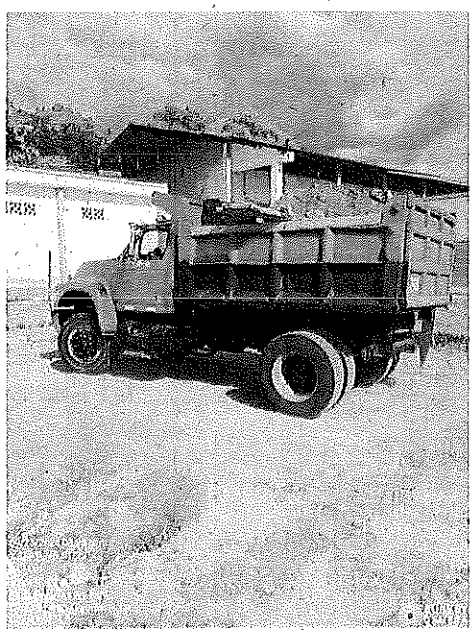ITEM 1.06. RELLENO EN RECEBO SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE.

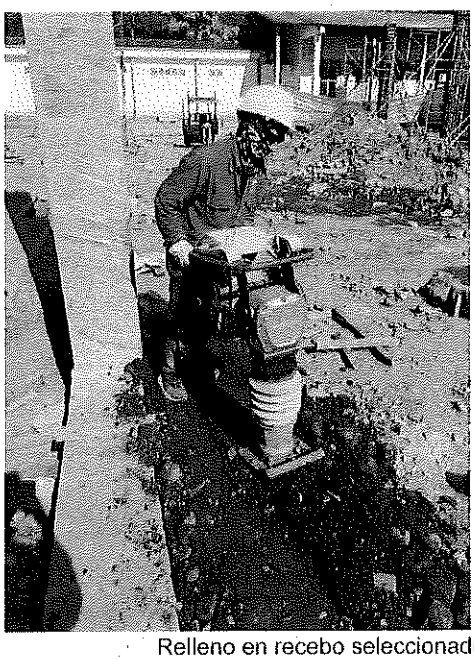




Relleno en recebo seleccionado y compactado – 25 al 30 de noviembre del 2024.

ITEM NP1.07. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE.

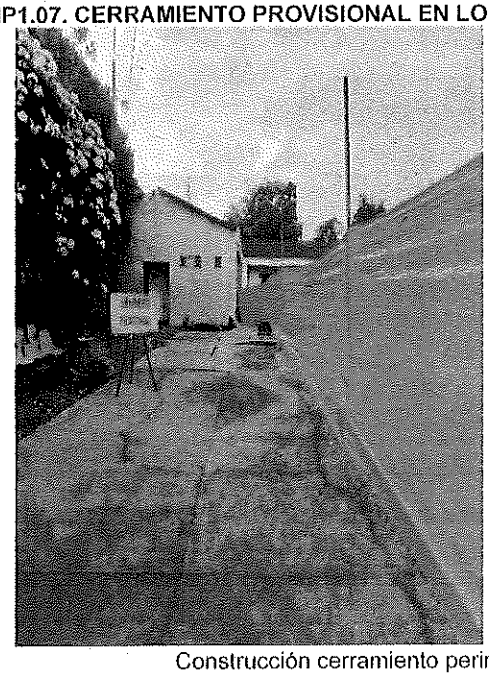
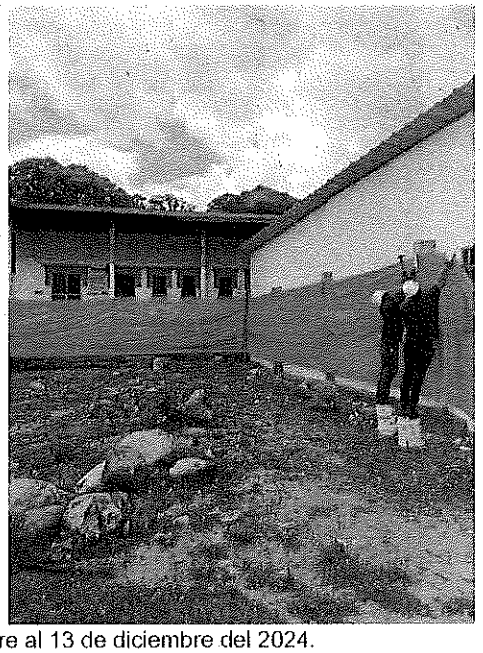
Construcción cerramiento perimetral - 29 de octubre al 13 de diciembre del 2024.

ITEM 2.02. CONSTRUCCIÓN ZAPATAS EN CONCRETO 210 KG/CM2-3000 PSI. VER DISEÑO.

Construcción zapatas en concreto 3000 PSI – 30 de septiembre al 20 de noviembre del 2024.

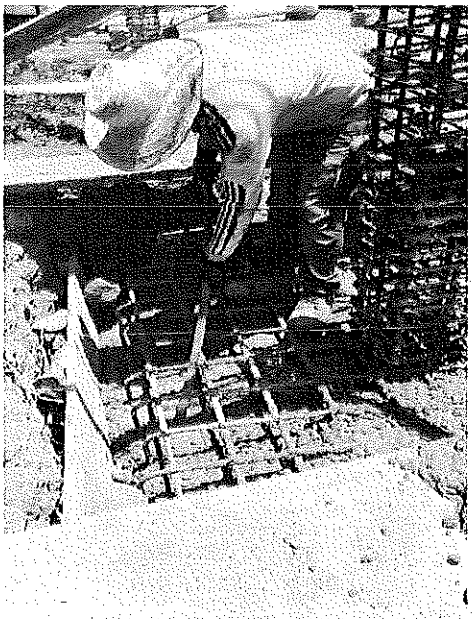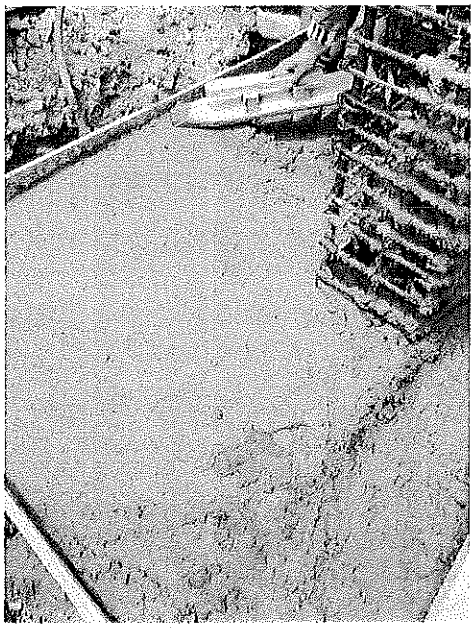ITEM 2.03. ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI ZAPATAS.



Acero de refuerzo zapatas – 23 de septiembre al 18 de noviembre del 2024.

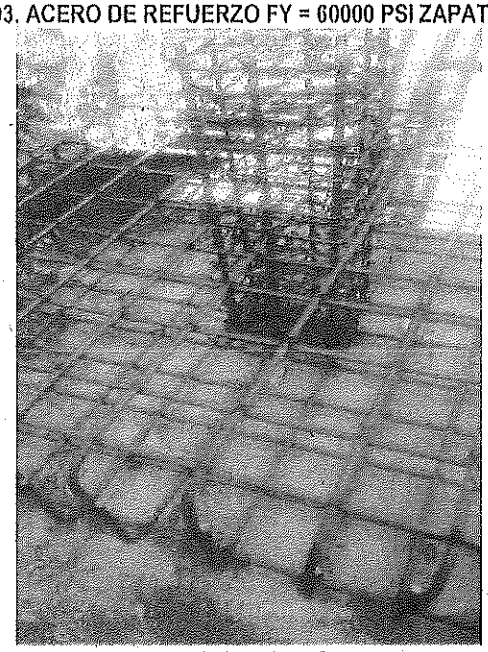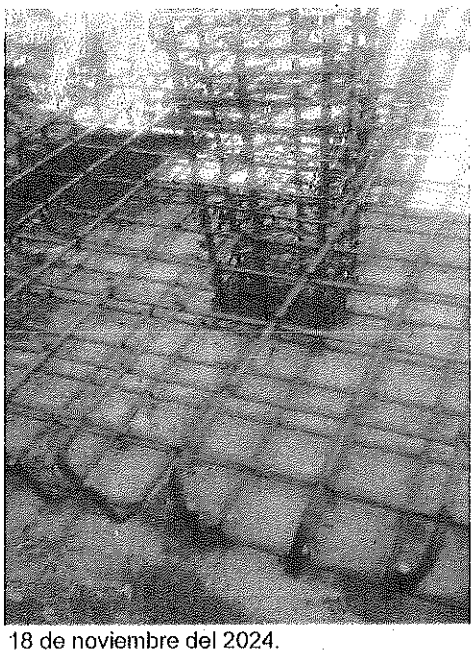ITEM NP 2.06. CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE (MURO, MALLA) HASTA H= 2 MT.





Construcción de cerramiento perimetral - 10 al 13 de diciembre del 2024.

ITEM 3.01. CONSTRUCCIÓN EN COLUMNAS DE CONCRETO DE 210 KG/CM2-3000 PSI.

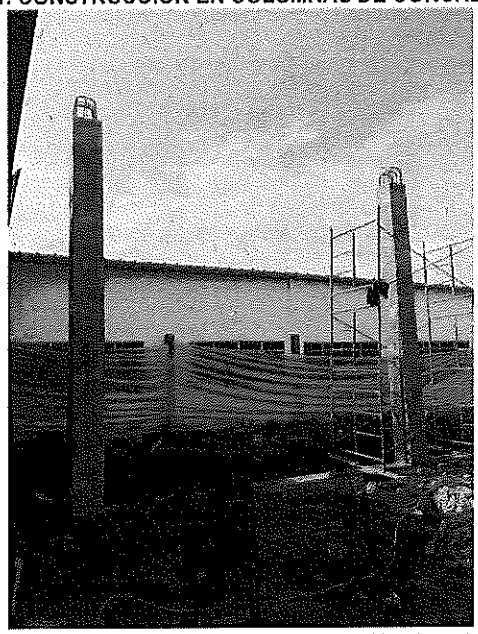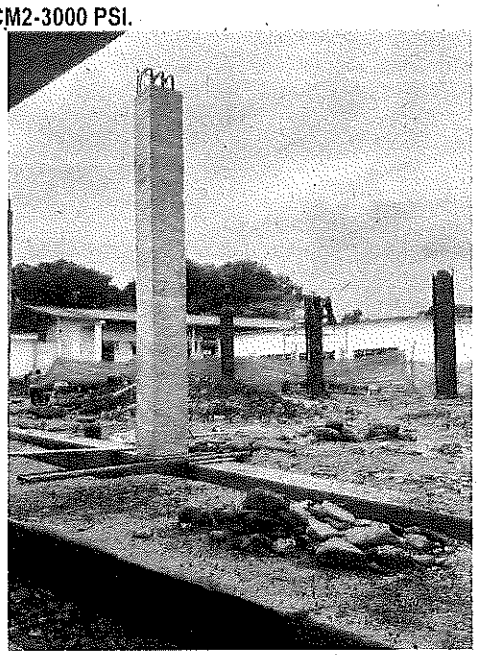
Construcción de columnas - 02 al 14 de noviembre del 2024.

ITEM 3.02. ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI COLUMNAS.



Acero de refuerzo de columnas – 27 de septiembre al 29 de octubre del 2024.

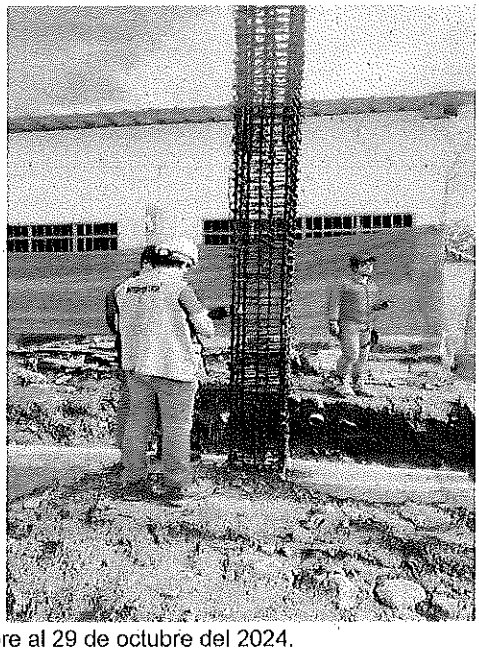ITEM 3.03. CONSTRUCCIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO DE 210 KG/CM2-3000 PSI IMPERMEABILIZADO.



Construcción viga canal – 03 al 04 de diciembre del 2024.

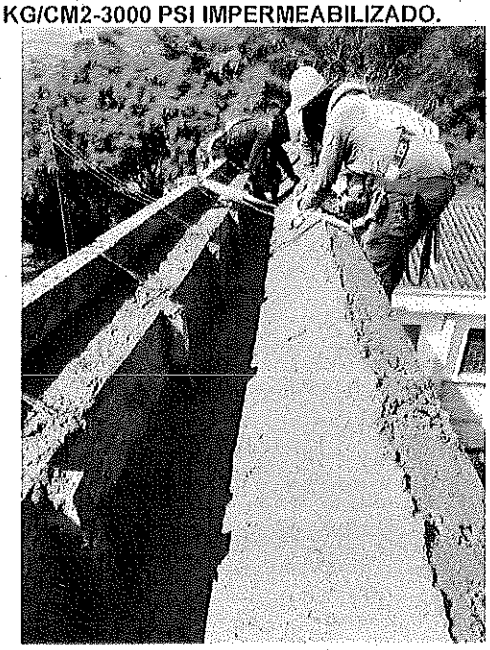ITEM 3.04. ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI VIGA CANAL.


Armado de acero para viga canal – noviembre de 2024

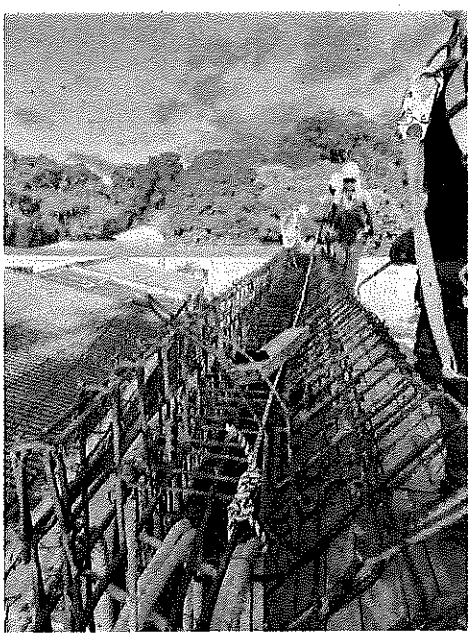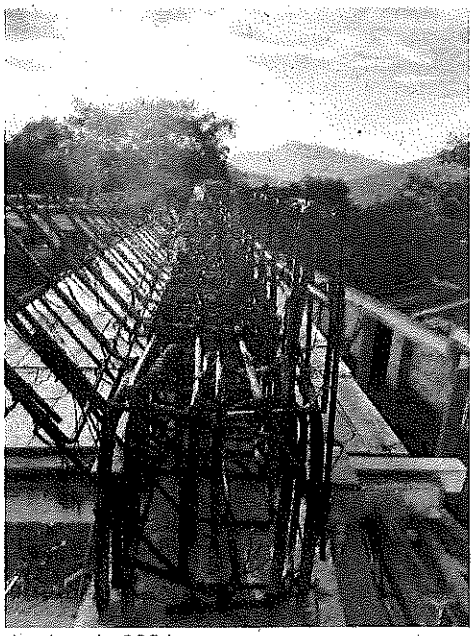ITEM 3.05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ZETAL VIGA CANAL.

Suministro e instalación de manto zetal – 05 al 06 de diciembre del 2024.

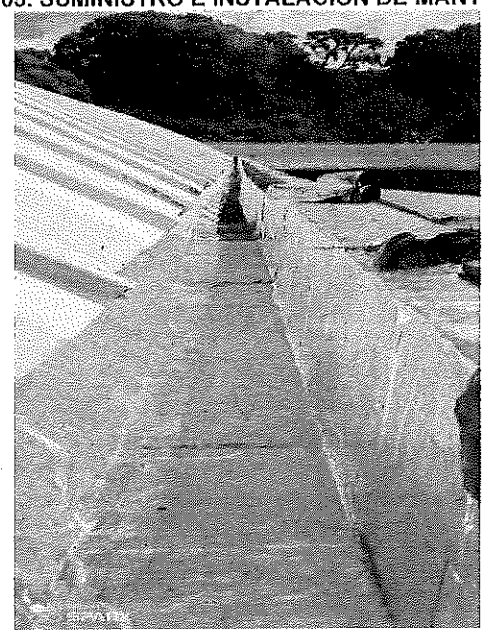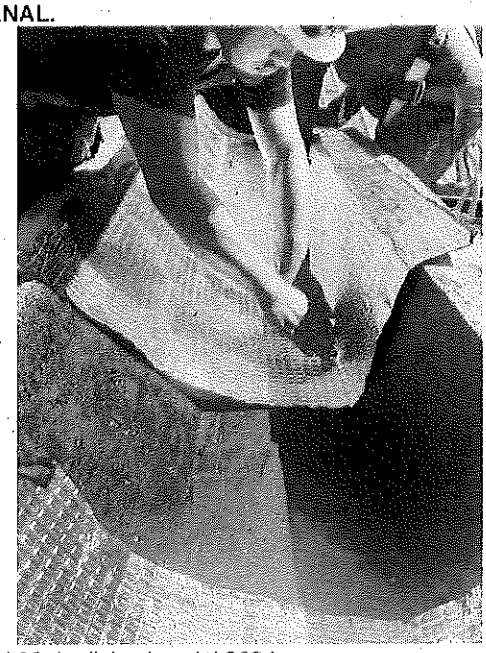
ITEM 4.01. SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22, EN PÁNELES ENGARGOLADOS LATERALMENTE DE UNA SOLA PIEZA EN ACABADO PINTRO POLIESTER ESTÁNDAR, FABRICADO A UN 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ.



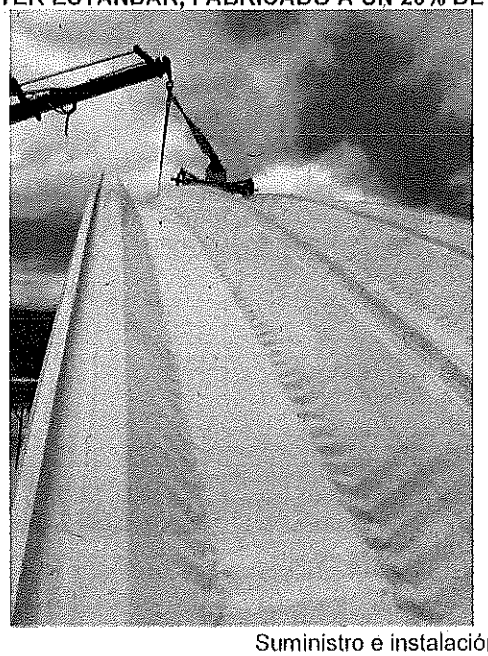

Suministro e instalación de cubierta – 09 de diciembre del 2024.

ITEM 5.01. DEMARCACIÓN DE CANCHA EN PINTURA TRÁFICO PESADO, PARA DEMARCACIÓN DE LAS TRES ACTIVIDADES BÁSICAS.

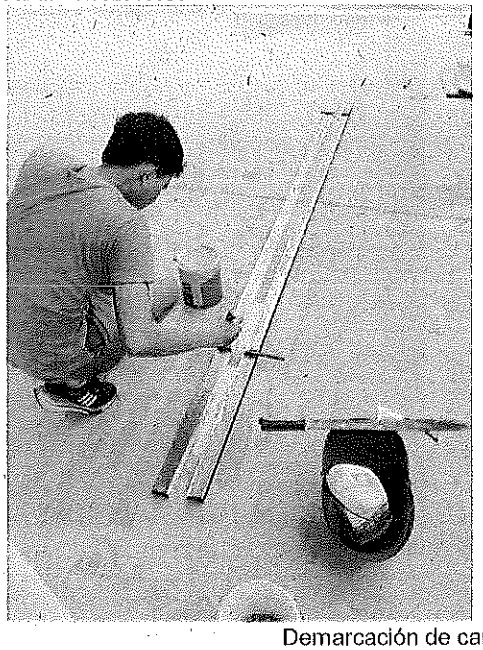




Demarcación de cancha – 26 al 28 de diciembre del 2024.

ITEM 5.03. PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0.10 M.




Placa en concreto – 10 al 13 de diciembre del 2024.

ITEM NP5.05. CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON PROFUNDIDAD DE 0.50M.

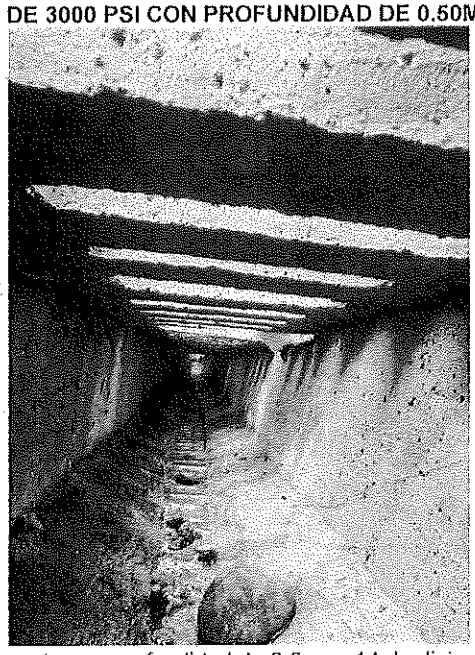


Cuneta en concreto con profundidad de 0.5 m – 14 de diciembre del 2024.

ITEM NP 5.06. CORTE DE PLACA EN CONCRETO PARA DILATACIONES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA JUNTA DE DILATACIÓN.

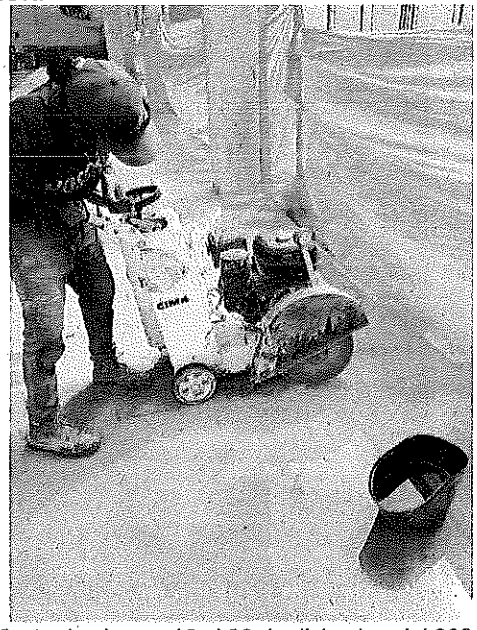

Corte de placa – 18 al 23 de diciembre del 2024

ITEM NP 5.07. CORTE DE PLACA EN CONCRETO.

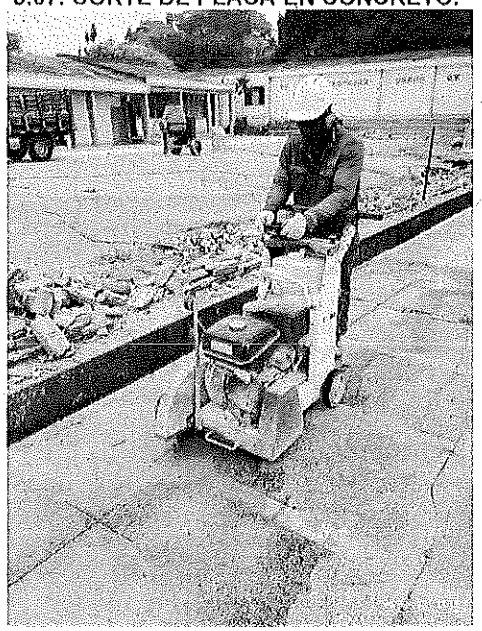



Corte de placa en concreto – 29 de octubre al 13 de diciembre del 2024.


ITEM NP 5.08. REJILLAS PREFABRICADAS PARA CUNETAS.






Rejillas prefabricadas – 17 de diciembre del 2024.

ITEM 5.09. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL FUTBOL DE SALÓN, BALONCESTO. INCLUYE: ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA. SEGÚN DISEÑO DE PLANOS.

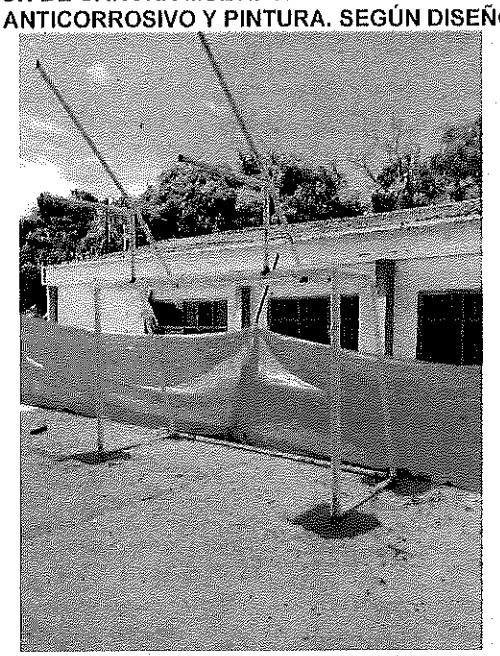

Instalacion cancha multifuncional – 17 - 28 de diciembre del 2024.

ITEM 6.01. BAJANTES EN TUBERIA PVC-S DE 4" CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN; PARA DESAGUES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.

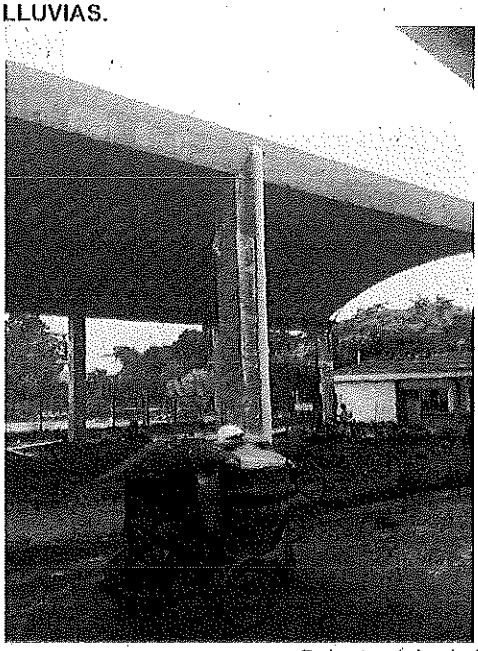




Bajantes tubería PVC-S 4" – 12 de diciembre del 2024.



ITEM 6.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DE 6", CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN; PARA DESAGÜES.



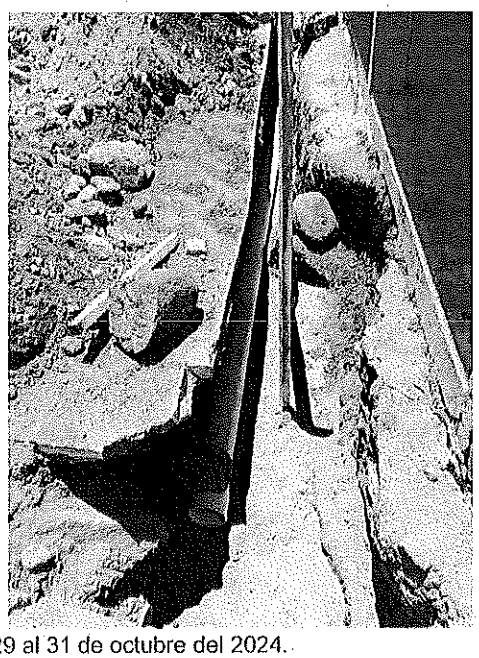



Suministro e instalación tubería PVC-S de 6" - 29 al 31 de octubre del 2024.

ITEM 6.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DE 8", CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN; PARA SALIDA.

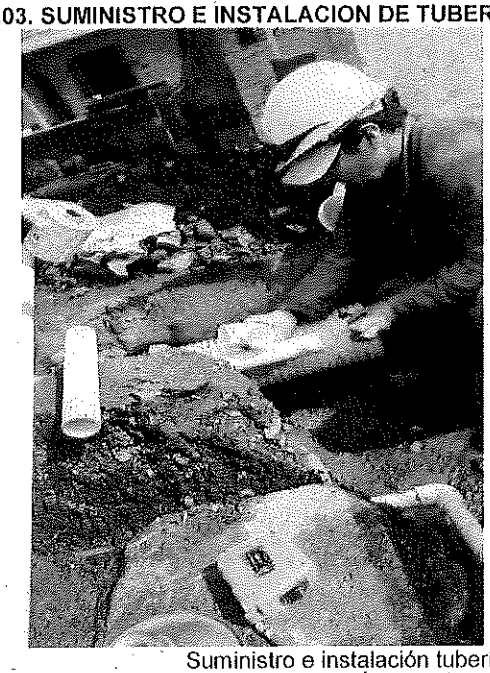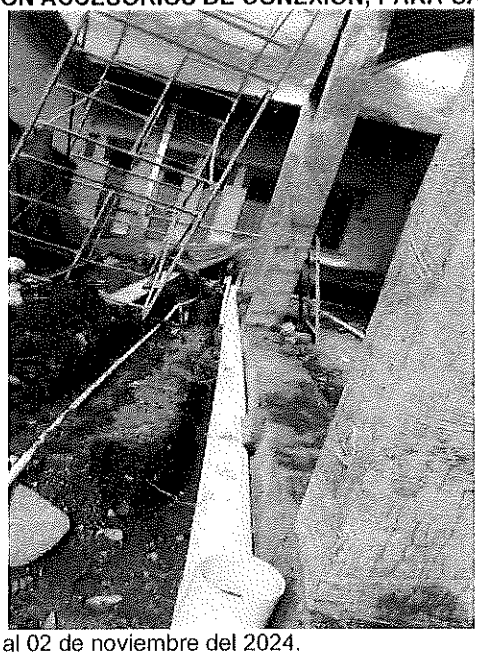
Suministro e instalación tubería PVC-S de 8" - 01 al 02 de noviembre del 2024.


ITEM 6.04. CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE F´C=2500 PSI, DE SECCION 0.70*0.70, H: 1M INCLUYE CAÑUELA, TAPA EN CONCRETO REFORZADO DE 8 CMS, CON ESPESORES DE PAREDES DE 0.10 MTS. SEGUN DISEÑO.

Cajas de inspección de aguas residuales - 29 de octubre al 13 de diciembre del 2024.

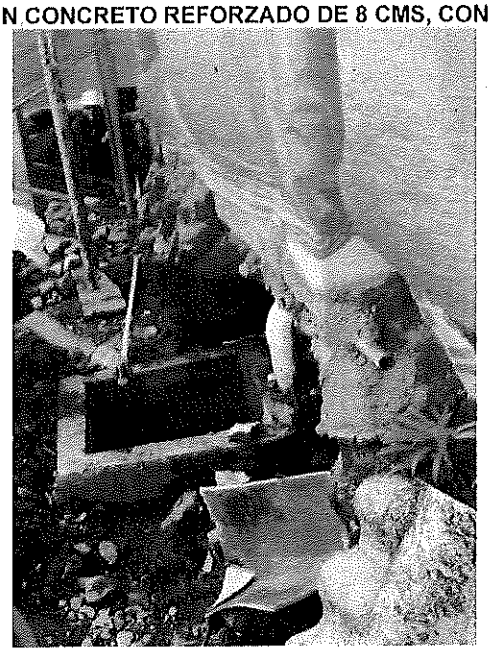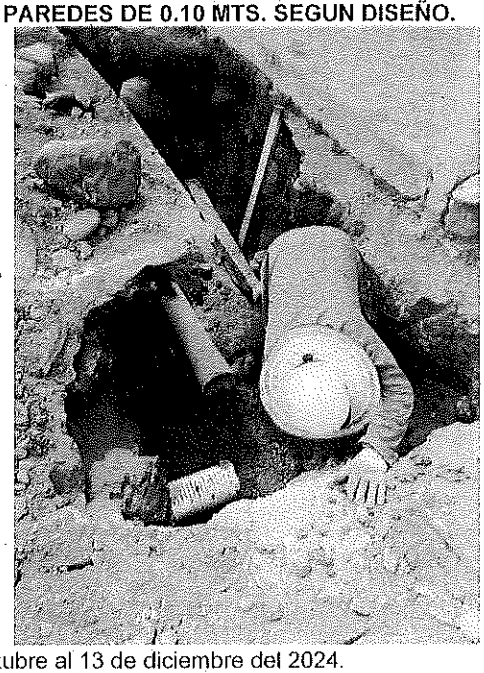
ITEM NP 6.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRÁULICA 1" PRESIÓN.




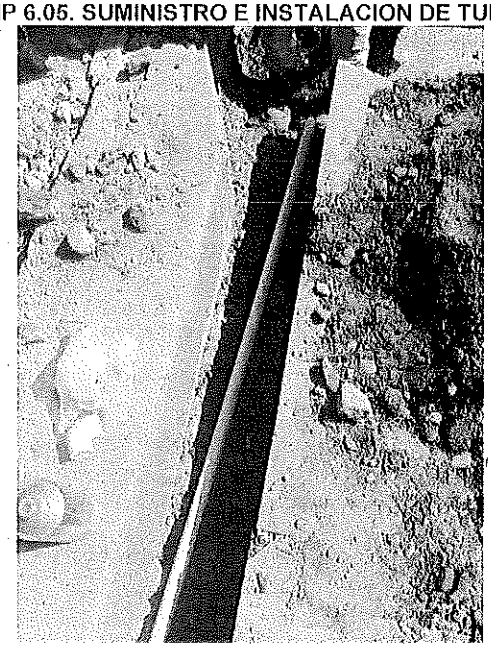

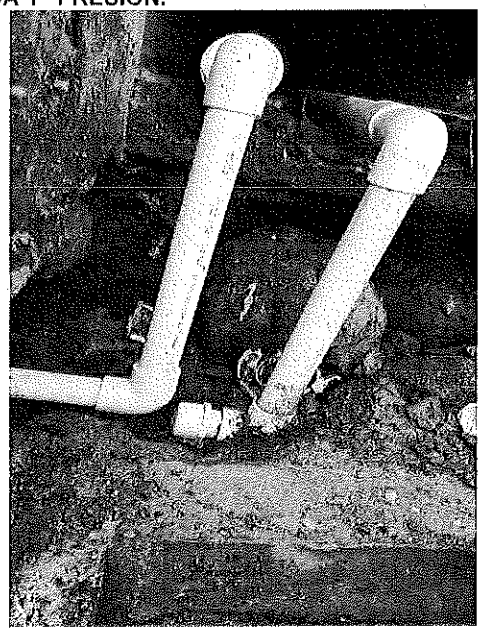Suministro e instalación tubería de 1" - 29 de octubre al 13 de diciembre del 2024.

ITEM NP 6.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRÁULICA 2" PRESIÓN.

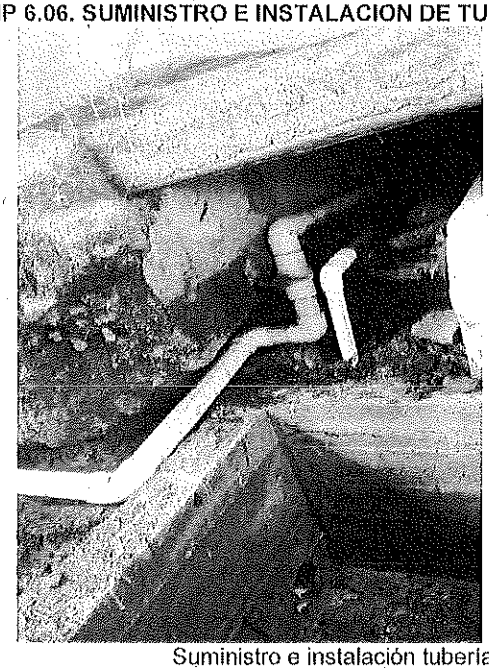

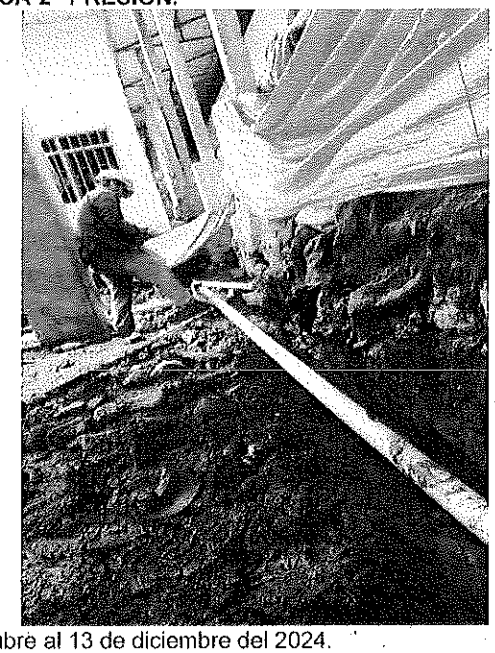



Suministro e instalación tubería de 2" - 29 de octubre al 13 de diciembre del 2024.

ÍTEM 7.02. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. INCLUYE: TODO FACTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA.





Excavación manual eléctrica – 23 de septiembre al 12 de diciembre del 2024.


ÍTEM 7.03. CANALIZACIÓN EN DUCTOS CONDUIT PVC TIPO PESADO, DOS DUCTOS DE 1 1/2" PARA BAJA TENSIÓN. INCLUYE COMPACTACIÓN Y TAPADA DE BRECHA. A=0,40 MTS.

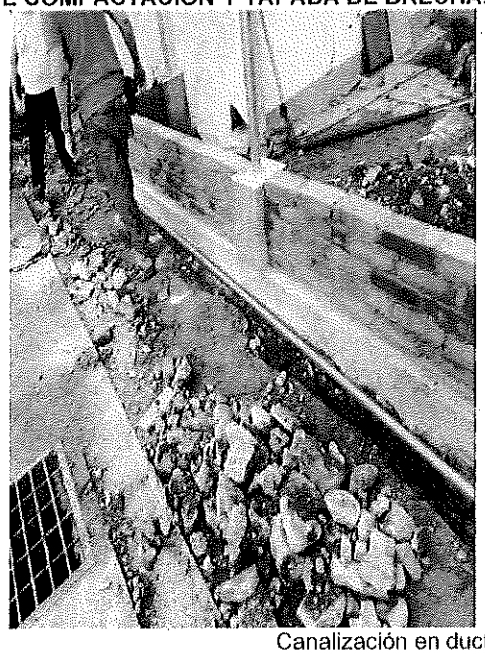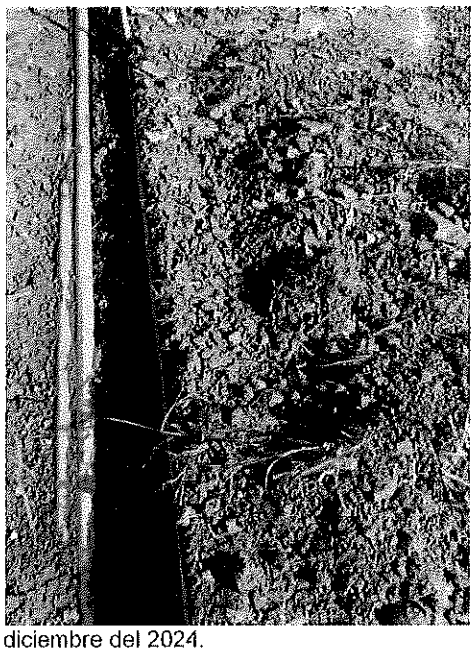Canalización en ductos Conduit – 10 de diciembre del 2024.


ÍTEM 7.04. TRANSICIÓN AÉREA – SUBTERRÁNEA TUBERÍA IMC 1 ½"



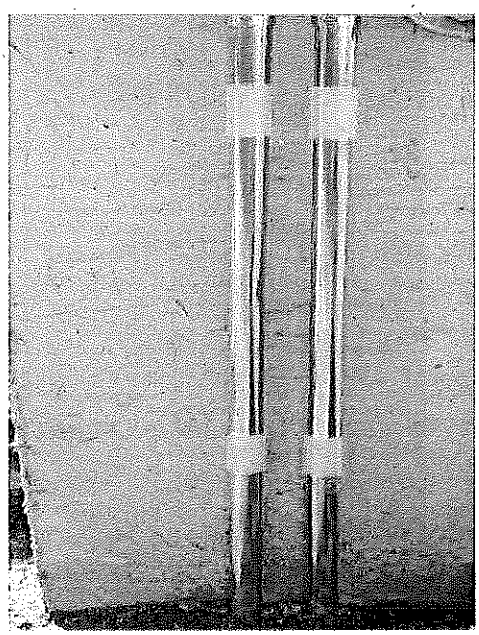

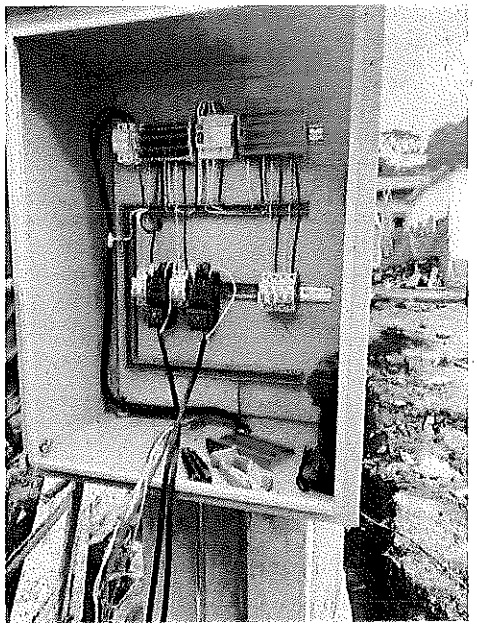
Transición aérea – subterránea IMC 1 ½" – 10 de diciembre del 2024.

ÍTEM 7.05. TRANSICIÓN AÉREA – SUBTERRÁNEA TUBERÍA IMC 1"

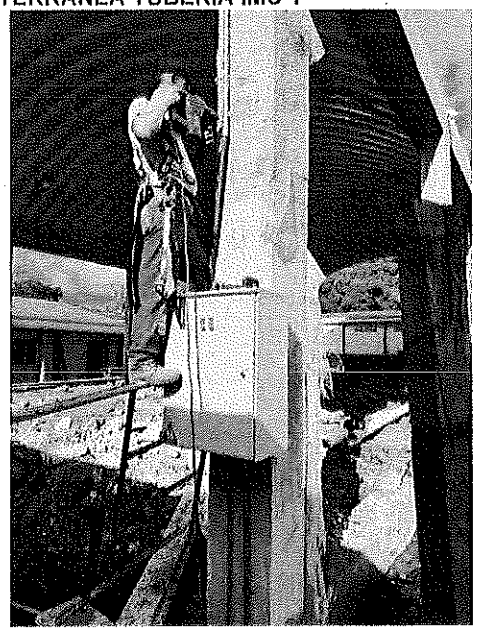


Transición aérea – subterránea IMC 1" – 11 de diciembre del 2024.


ÍTEM 7.07. SUMINISTRO – INSTALACIÓN Y CABLEADO DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN COLOCADA EN COLUMNA.

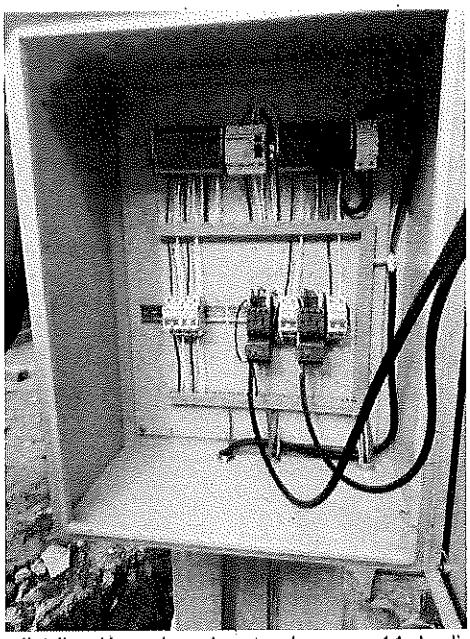

Cableado de caja distribución colocada en columna – 11 de diciembre del 2024.

ÍTEM 7.08. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EN DUCTO SUBTERRÁNEO EN CONDUCTOR 2X6 AL SER8000 + 6 AL SER8000 + 1X8 CU.

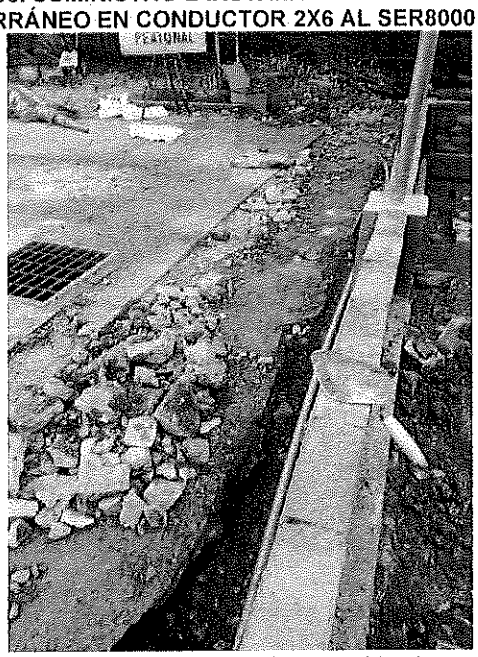


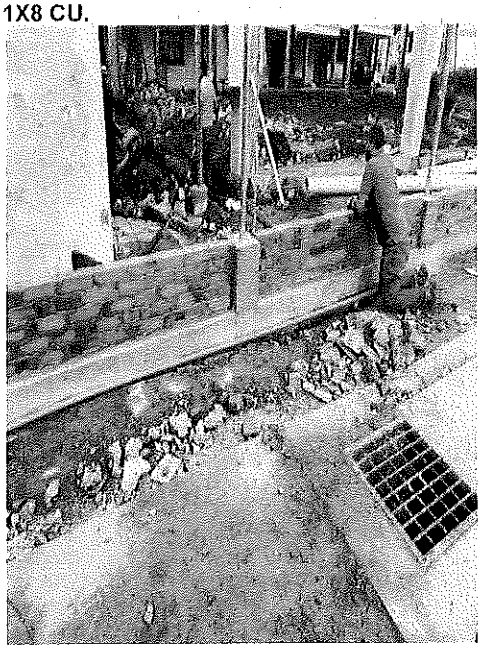

Instalacion de cableado para red de distribución – 18 de diciembre del 2024.


ÍTEM 7.09. INSTALACIÓN BRAZO SENCILLO SEGÚN DISEÑO DE 3,5 MTS. GALVANIZADO Y ACABADO EN PINTURA POLVO POLIÉSTER, PARA ANCLAR EL REFLECTOR.




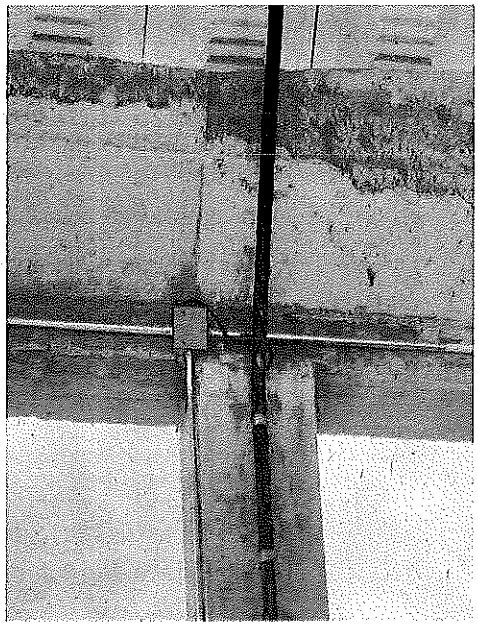

Instalacion brazo sencillo 3,50 mts – 20 de diciembre del 2024.


ÍTEM 7.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA REDES INTERNAS PARA MONTAJE DE REFLECTORES.

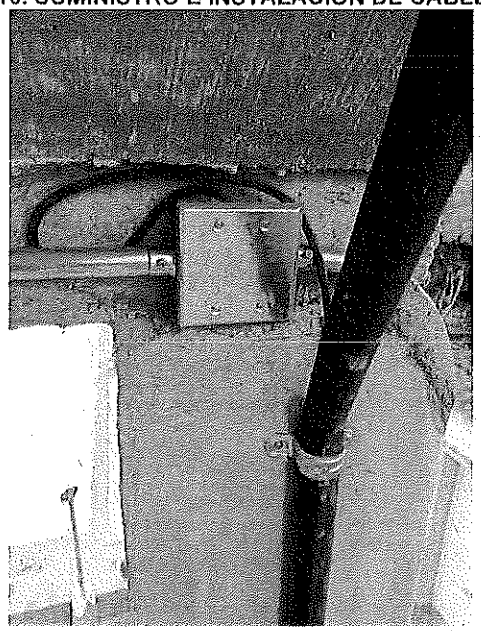


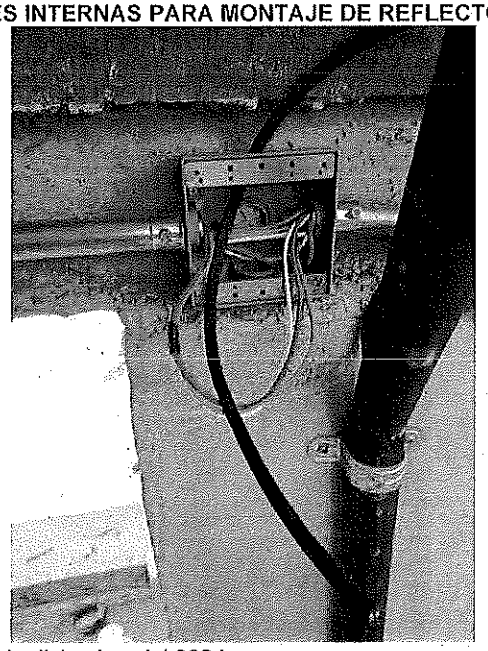

Instalacion cableado redes internas – 18 de diciembre del 2024


ÍTEM 7.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 150 W.

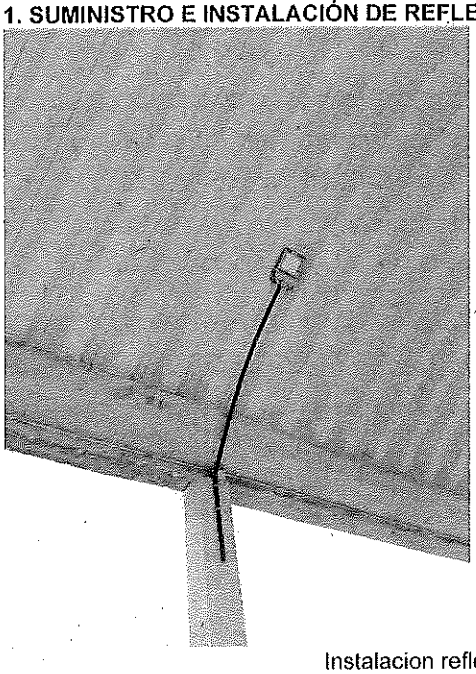

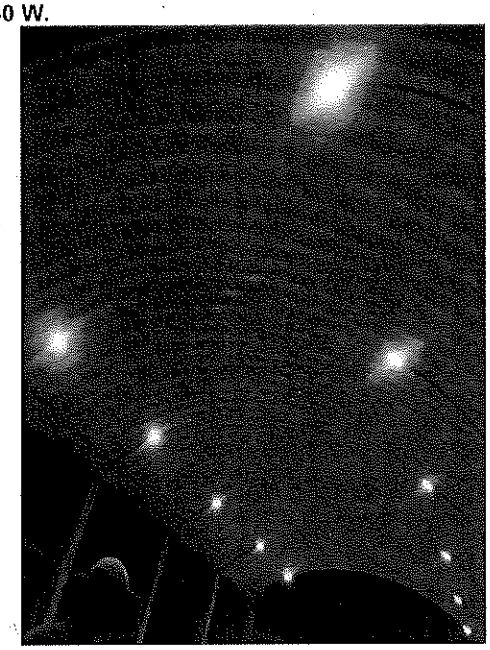


Instalacion reflectores – 20 de diciembre del 2024

ÍTEM 7.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE A 120 V.

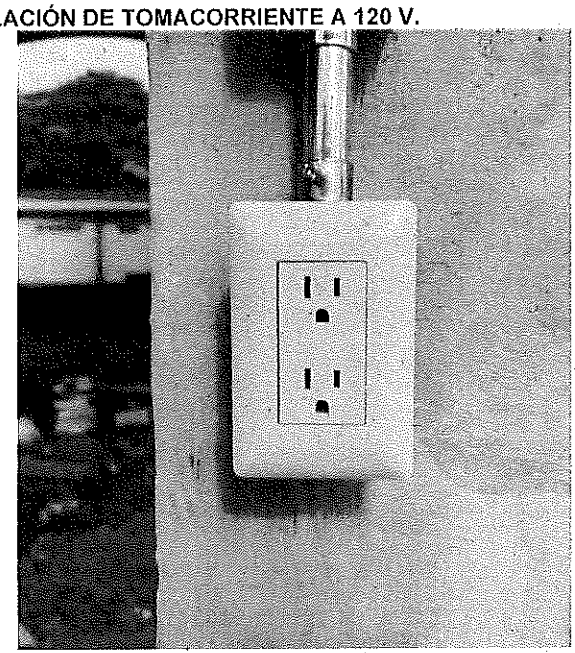


Instalacion tomacorriente 120v – 23 de diciembre del 2024

ÍTEM 7.13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE A 240 V Y TOMACORRIENTE A 120 V.

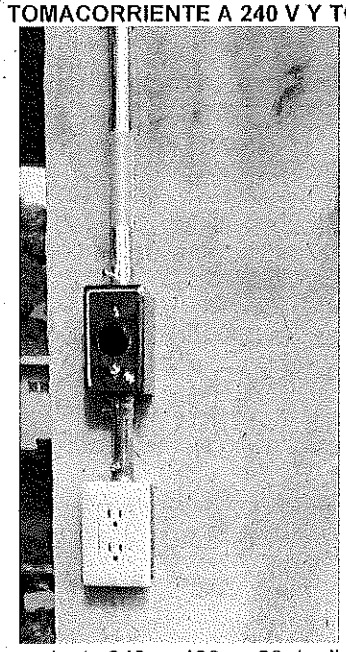


Instalacion tomacorriente 240v y 120v – 23 de diciembre del 2024


ÍTEM 7.14. INSTALACIÓN ACOMETIDA A TABLERO DE CIRCUITOS.

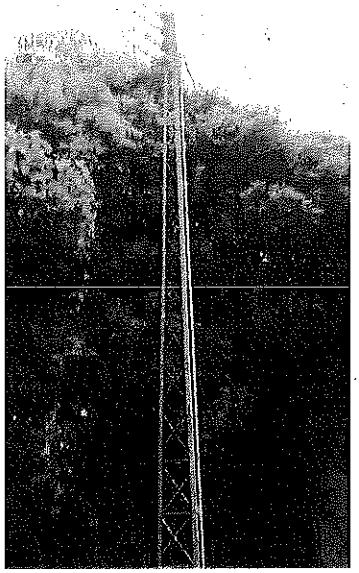

Acometida tablero de circuitos – 10 de diciembre del 2024

ITEM 8.01. TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS.

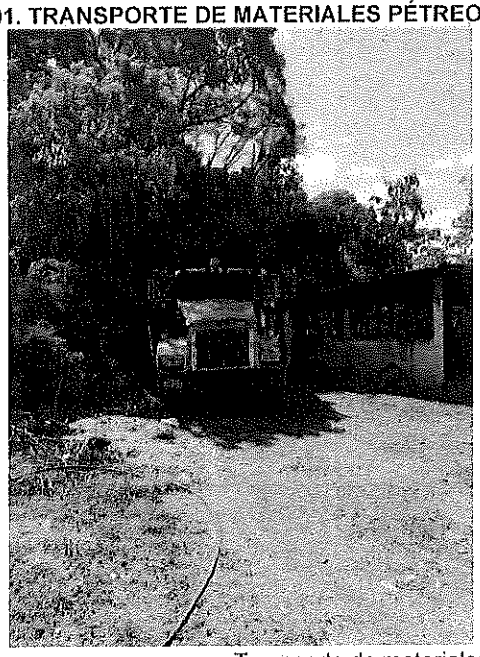

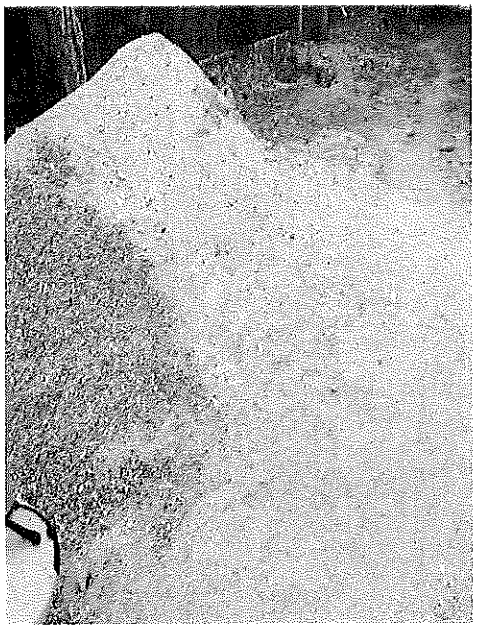

Transporte de materiales pétreos - 12 al 19 de noviembre del 2024.

21. ANEXOS

- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.

ING. GILDARDO SERRATO SERRATO	(30/12/2024)	ARQ. JUAN FELIPE ALARCON
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	41089829	9479414638	I	2025/01/14	2024/12/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$487.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$208,000						$162,500	
																				$208,000						$162,500	
																				$208,000						$162,500	
						$1,300,000	No		PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	12.5%	$162,500	
																				$208,000						$162,500	

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotizacion SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotizacion ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotizacion ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotizacion MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$162,500		COMFAMILIAR HUILA	30	$1,300,000	2%	$26,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$162,500						$26,000						$90,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1184273968	9480144342	N	2025/01/14	2025/01/10	BANCOLOMBIA	0	$355,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa -Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$152,000						$118,800	
																				$152,000						$118,800	
						$1,300,000	No		PORVENIR	30	($1,300,000)	16%	SIN RIESGO	($208,000)	$0	$0	$0	$0	$0	($208,000)		NUEVA E.P.S.	30	($1,300,000)	12.5%	($162,500)	
						$2,250,000	No		PORVENIR	30	$2,250,000	16%	SIN RIESGO	$360,000	$0	$0	$0	$0	$0	$360,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,250,000	12.5%	$281,300	
																				$152,000						$118,800	

2025/01/14 11:51 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	
$0	($162,500)		COMFAMILIAR HUILA	30	($1,300,000)	2%	($26,000)	ARL SURA	30	($1,300,000)	6.96%	5	($90,500)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$281,300		COMFAMILIAR HUILA	30	$2,250,000	2%	$45,000	ARL SURA	30	$2,250,000	6.96%	5	$156,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$118,800						$19,000						$66,100				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1184270505	9480144397	Y	2025/01/14	2025/01/10	BANCOLOMBIA	0	$2.058.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$299,200						$233,800
																				$299,200						$233,800
																				$299,200						$233,800
						$1,670,000	No		PORVENIR	30	$1,670,000	16%	SIN RIESGO	$299,200	$0	$0	$0	$0	$0	$299,200		SANITAS	30	$1,670,000	12.5%	$233,800	

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$580,000						$453,200
																				$580,000						$453,200
																				$580,000						$453,200
						$1,375,000	No		PORVENIR	30	$1,375,000	16%	SIN RIESGO	$220,000	$0	$0	$0	$0	$0	$220,000		SANITAS	30	$1,375,000	12.5%	$171,900	
						$2,250,000	No		PROTECCION	30	$2,250,000	16%	SIN RIESGO	$360,000	$0	$0	$0	$0	$0	$360,000		SANITAS	30	$2,250,000	12.5%	$281,300	
																				$879,200						$687,000

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotizacion SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotizacion ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotizacion ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotizacion MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$233,800						$37,400						$130,200				$0		$0		$0		$0	
	$233,800						$37,400						$130,200				$0		$0		$0		$0	
	$233,800						$37,400						$130,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$233,800		COMFAMILIAR HUILA	30	$1,870,000	2%	$37,400	ARL SURA	30	$1,870,000	6.96%	5	$130,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotizacion SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotizacion ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotizacion ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotizacion MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$453,200						$72,500						$252,200				$0		$0		$0		$0	
	$453,200						$72,500						$252,300				$0		$0		$0		$0	
	$453,200						$72,500						$252,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$171,900		COMFAMILIAR HUILA	30	$1,375,000	2%	$27,500	ARL SURA	30	$1,375,000	6.96%	5	$95,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$281,300		COMFAMILIAR HUILA	30	$2,250,000	2%	$45,000	ARL SURA	30	$2,250,000	6.96%	5	$156,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$567,000						$109,800						$362,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80926744		JIMENEZ MARULANDA WILMAR ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 No 11-75	CAMPOALEGRE-HUILA	4348790	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1184270505	94801443?7	Y	2025/01/14	2025/01/10	BANCOLOMBIA	0	$2,058,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$879,200	$0	$0	$879,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$519,200	$0	$0	$519,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$360,000	$0	$0	$360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$382,500	$0	$0	$382,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$382,500	$0	$0	$382,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,900	$0	$0	$109,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$109,900	$0	$0	$109,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$687,000	$0	$0	$687,000
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	3	$687,000	$0	$0	$687,000
TOTAL				3	$2,058,600	$0	$0	$2,058,600

2025/01/14 11:51 a.m.
