INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 6/06/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Dirección Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia **PERIODO MES:** may-25

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3468-2024

**OBJETO:** ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TOTAL-HV

**PLAZO INICIAL:** 3 MESES
**FECHA DE INICIO:** 6/09/2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 17/02/2025
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 18/04/2025
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/06/2025
**PLAZO ACUMULADO:** 6,8 MESES

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 859.478.100,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 40.521.900,00
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 900.000.000,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 2246-2024 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Intervención de sitios criticos | UND | 3 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | Intervención de sitios criticos | UND | | 1 |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 884.130.265 | 6.460.952 | 890.591.217 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | 9.340.525 | 68.258 | 9.408.783 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | 900.000.000 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | 132.680.817,00 | 969.591,00 | 133.650.408,00 | 622.115.036,00 |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | 132.680.817,00 | 969.591,00 | 133.650.408,00 | 622.115.036,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 805.268.430,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 617.601.793,00 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 77% |

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | 1 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 7 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

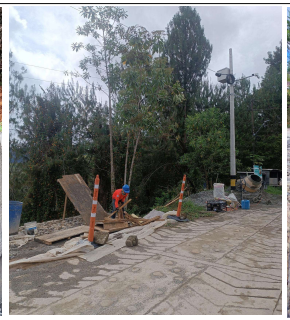
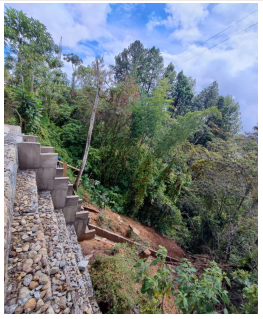
FECHA: 6/06/2025 (Día / Mes / Año)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

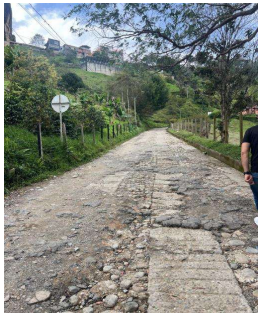




**Estado actual - Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894.**

**Estado actual - Municipio de Guatapé, vía Anillo - Guatapé, código 56153**



**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**N/A**

Firma
Alvaro Fernando Lara Zambrano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202 - 82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial
