
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 y Final		
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA COLORADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".		
No. DEL CONVENIO: 008-2025	**NOMBRE CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA COLORADAS	**NIT:** 890.907.569-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	05/02/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13/02/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/06/2025	
PERÍODO DEL INFORME:	Acta de obra Nº1 y final	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

UBICACIÓN Y GEOREFERENCICIÓN PROYECTO PLACA HUELLA – VEREDA COLORADAS



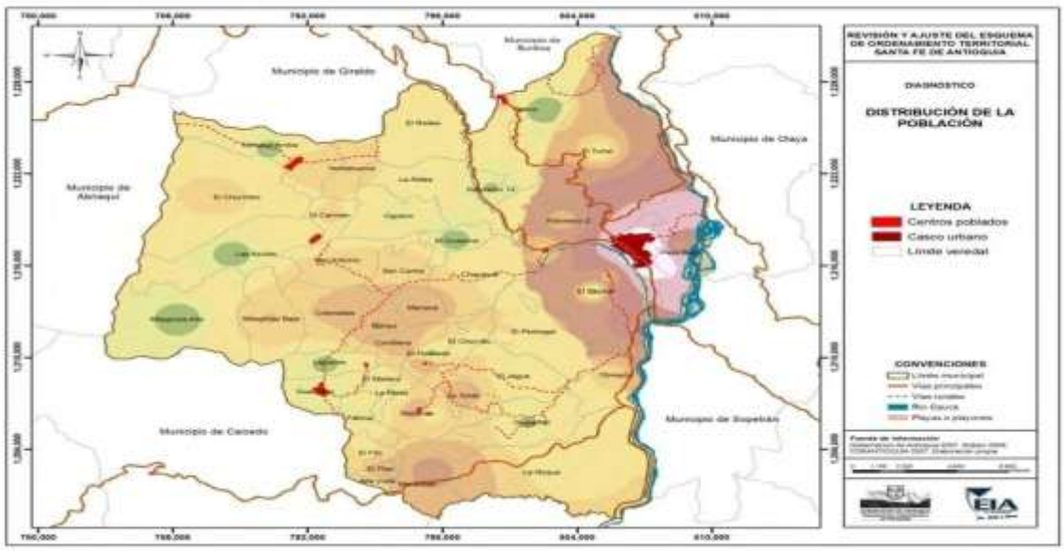

OBJETIVO:

Con el propósito de entregar informe número 001 y final, de la ejecución del contrato con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA COLORADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA." concordante con cada una de las cláusulas contractuales estipuladas para la ejecución del contrato, se procede a relacionar cada una de las actividades específicas del contrato, establecidas en el clausula 2 y como se dio cumplimiento a esta actividad.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Se presenta en este cobro las actividades ejecutadas para alcanzar el 100% de avance contractual a corte del 31 de julio de 2025 se cumplió con el 100% de actividades, con material que ingreso a la vereda en el mes de junio de 2025, estas actividades pueden ser evidenciadas en el sitio del proyecto:

CONVENIO SOLIDARIO 008 de 2025		CONTRATANTE				
FECHA : 12 de agosto de 2025		CONTRATISTA				
ACTIVIDADES Y CANTIDADES ACUMULADAS EN LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA 1 Y FINAL						
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Localización y replanteo	m	100,00	$ 616,87	61.686,90	CUMPLE
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	41,33	$23.227	960.040,14	CUMPLE
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	430,00	$2.819	1.212.162,05	CUMPLE
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3.525,30	$803	2.830.110,84	CUMPLE
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,00	$62.766	6.276.566,00	CUMPLE
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	18,00	$126.665	2.279.975,76	CUMPLE
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	195,00	$29.152	5.684.720,05	CUMPLE

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago Caja de compensación	Pago ARL	Para fiscal	Total, pagado en el periodo
MAYO	9489751470	$534.000	$683.400	$171.000	$131.500	$0	$1.794.200
JUNIO	9489751379	$273.600	$213.600	$68.400	$52.600	$0	$703.000
JULIO	9490082985	$205.200	$160.200	$51.300	$39.500	$0	$520.700

- Resumen de la ejecución de los recursos económicos:

Valor del Convenio (RECURSOS)	$19.929.000
Aporte en especie	$1.116.752
Valor ejecutado desembolsable ACTA No.1	$19.929.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Saldo a favor del conveniente	$19.929.000
Porcentaje de ejecución financiera (pagos efectuados)	0%

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas y su respectivo registro fotográfico, conforme se encuentran los ítems del presupuesto definitivo: las memorias se realizarán teniendo en cuenta el acumulado del acta de obra Nº2 y final

1	Localización y replanteo	m	100,00	$ 616,87	61.686,90

Se realizo la verificación en campo de la zona y de segmento a antevenir con el presente proyecto.





Recorrido para verificar la localización y determinar con claridad el segmento a intervenir

2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	41,33	$23.227	960.040,14


Realizo una excavación a la superficie de 0,1m de espesor en general para garantizar la continuidad de los hilos en la superficie mas 34 brechas adicionales para las viga-riostras.


100m x 4,6m x 0,1m = 46m3

34 x (0,15m x 0,1m x 3,2m) = 1,6m3

46m + 1,6m3= 47,7m3

Se autoriza para el desembolso la cantidad contractual de 43,8m3





Excavación para hacer la nivelación y establecer el ancho efectivo de la vía para la construcción de la placa huella

3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	430,00	$2.819	1.212.162,05

Segmento de vía debidamente conformado para iniciar la aplicación del material de concreto.

4,6m de ancho

100m de largo
4,6m x 100m = 460m2

Se autoriza para el desembolso la cantidad contractual de 430m2

4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3.525,30	$803	2.830.110,84

- Cada riel lleva en su interior 5 varillas de ½

  110m x 5 x 2 x1kg/ml = **1100km**

  NOTA: se trabaja con 110 para incluir los traslapos

- Cada riel lleva en su interior 9 segmentos de 0,8m de largo

  33 segmentos x 9 x 0.8m x 2 x 0,56kg/ml = **266kg**

- En el interior de las cunetas hay 4 varillas de ½"

  110m x 4 x 2 x1kg/ml = **880km**

- En el interior de las cunetas de manera transversal hay bastones cada 0,3m de 3/8" de 0,65m de largo

  (100m/0,3m) x 0,65 x 2 = **433km**

- En el interior de los cordones de manera transversal hay bastones cada 0,3m de 3/8" de 0,65m de largo

  (100m/0,3m) x 0,65 x 2 = **433km**

- Cada viga riostra tiene 3,2m de largo y tiene en su interior 4 varillas de ½" se ha construido 34 viga riostras

  3,2m x 4 x 34viga riostras x 1kg/ml = **422kg**

- Para cada viga riostra se usaron 21 estribos de 3/8" de un largo de 0,7m

  21 x 0,7m x 34viga riostras x 0,56kg/ml = **280kg**

  El acero instalado según las memorias calculadas y verificado en obra es de 3814km; se autoriza un desembolso correspondiente a **3683,08kg**




Parrilla de acero al interior de la placa huella

5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,00	$62.766	6.276.566,00

En campo se verifica y se midió; se constata una longitud de 100m de placa huellas debidamente terminadas, se adjuntan fotos






Segmento de placa huellas en concreto, en terreno se midieron 60m lineales terminados.

6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	18,00	$126.665	2.279.975,76

Se han construido 34 segmentos de 2,8m de largo por 0,9 de ancho se toma un valor medio de 0,5m para los sobre anchos

- 34 x 2,8m x 0,9m x 0,15m **= 12,9m3** **total :20m3**

- 34 x 2,8m x 0,5m x 0,15m **= 7,14m3**





Construcción de los segmentos en concreto ciclópeo

7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	195,00	$29.152	5.684.720,05

Se han construido 100ml de placa huellas, a ambos lados se han construido las cunetas

- 100ml x 2 = 200ml

Se autoriza desembolso correspondiente a 180ml





Este informe se efectúa en cumplimiento de la normatividad vigente y de las cláusulas contractuales, que determinan las actividades de ejecución contractual de la Junta de Acción Comunal.

Cualquier información adicional que se requiera, será entregada según observaciones.

Aida Amparo Ruiz Cardona

AIDA AMPARO RUIZ CARDONA
Cédula 21500695
Representante legal
Junta De Acción Comunal Vereda Coloradas
NIT 901075047-6
