CONSORCIO LURUACO

INFORME MENSUAL No. 5

07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 20205

CONTRATO No. 497 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

PERIODO. 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025

SUPERVISOR

WLADIMIR OROZCO LOZANO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

AGOSTO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 4
2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR 9

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 17

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 17
3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 20
3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA 23

..... 20

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 24

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 24

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33

5.1 INFORMACIÓN GENERAL 33
5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA 34
5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 35

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 36

6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 45
6.2 SEGUIMIENTO SST 48
6.3 SEGUIMIENTO SOCIAL 50
6.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 52
6.5 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA 59

7 CONCLUSIONES 60

8 ANEXOS 62

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Información General Contrato de Obra. ---------- 17
Tabla 3.2 Presupuesto de obra. ---------- 19
Tabla 5.1 Información General Contrato de Interventoría. ---------- 33
Tabla 5.2 Presupuesto Interventoría. ---------- 34
Tabla 5.3 Personal de la Interventoría. ---------- 34

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La protección y gestión sostenible del recurso hídrico es hoy una de las mayores prioridades a nivel mundial, debido a la creciente escasez del agua, su contaminación y los efectos adversos generados por el cambio climático. En Colombia, y particularmente en el Departamento del Atlántico, estas problemáticas se han intensificado en los últimos años, evidenciando la urgencia de tomar medidas concretas para garantizar la disponibilidad del agua y preservar los ecosistemas asociados. En este contexto, el cuidado, ordenamiento y recuperación de cuerpos de agua como lagunas, embalses, arroyos y caños, se ha convertido en una labor fundamental liderada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Dentro del marco del Plan de Acción 2024–2027 “Por un Ambiente Sin Fronteras”, la CRA ha priorizado un conjunto de intervenciones estratégicas orientadas a la recuperación hídrica del Embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco, dos ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades de municipios como Luruaco, Manatí y Repelón. Estas acciones buscan mejorar la conectividad y el flujo hidrodinámico entre los cuerpos de agua mediante la limpieza y recuperación ambiental de arroyos y caños afluentes, como los arroyos Limón y Negro, así como los canales que conectan las compuertas de El Porvenir y Villa Rosa con el embalse El Guájaro.

Estas obras no solo tienen el objetivo de garantizar el almacenamiento y circulación del recurso hídrico, sino también de reducir significativamente los riesgos de inundaciones durante la temporada invernal y mitigar los efectos de las sequías, protegiendo la flora, fauna y comunidades aledañas. En este sentido, se adelantó el proceso de selección por licitación pública No. LP-2024-0005, mediante el cual fue adjudicado al Consorcio Alianza Ambiental el contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado: “Realizar la limpieza y recuperación ambiental de los caños y/o arroyos afluentes a la Laguna de Luruaco y al Embalse El Guájaro en el Departamento del Atlántico”.

De manera paralela, a través del concurso de méritos abiertos No. CM-2024-008, se seleccionó al Consorcio Luruaco como interventor del proyecto, responsable de realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución de las obras, velando por el cumplimiento de los objetivos, plazos, estándares de calidad y normativas ambientales vigentes.

Este documento presenta el Informe de Interventoría No. 5, correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de julio y el 6 de agosto de 2025, en el cual se documentan los principales avances físicos y técnicos alcanzados, así como observaciones, hallazgos y demás aspectos relevantes relacionados con el desarrollo del contrato de obra.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Departamento del Atlántico, específicamente en los municipios de Luruaco, Manatí y Repelón, en donde se ejecutan intervenciones sobre cuerpos de agua que conforman la red hídrica que conducen tanto a la Laguna de Luruaco, como al Embalse El Guájaro. Estas intervenciones se orientan a mejorar la capacidad de conectividad y funcionalidad hidrodinámica de los caños y arroyos que confluyen en dichos cuerpos de agua.

De manera particular, se contempla la intervención del Arroyo Negro y el Arroyo Limón, ambos ubicados en el municipio de Luruaco, los cuales actúan como tributarios naturales de la Laguna de Luruaco durante los periodos de precipitación, siendo fundamentales para el equilibrio hídrico de dicho sistema lagunar.

Adicionalmente, se intervendrán los caños El Porvenir y Villa Rosa, localizados en jurisdicciones de los corregimientos de El Porvenir (Municipio de Manatí) y Villa Rosa (Municipio de Repelón), respectivamente. Estos canales cumplen una función clave en la regulación del flujo de aguas hacia el Embalse El Guájaro, por medio de estructuras hidráulicas como compuertas, cuya operación es esencial para el control de caudales, la prevención de inundaciones y la preservación ambiental del ecosistema hídrico regional.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

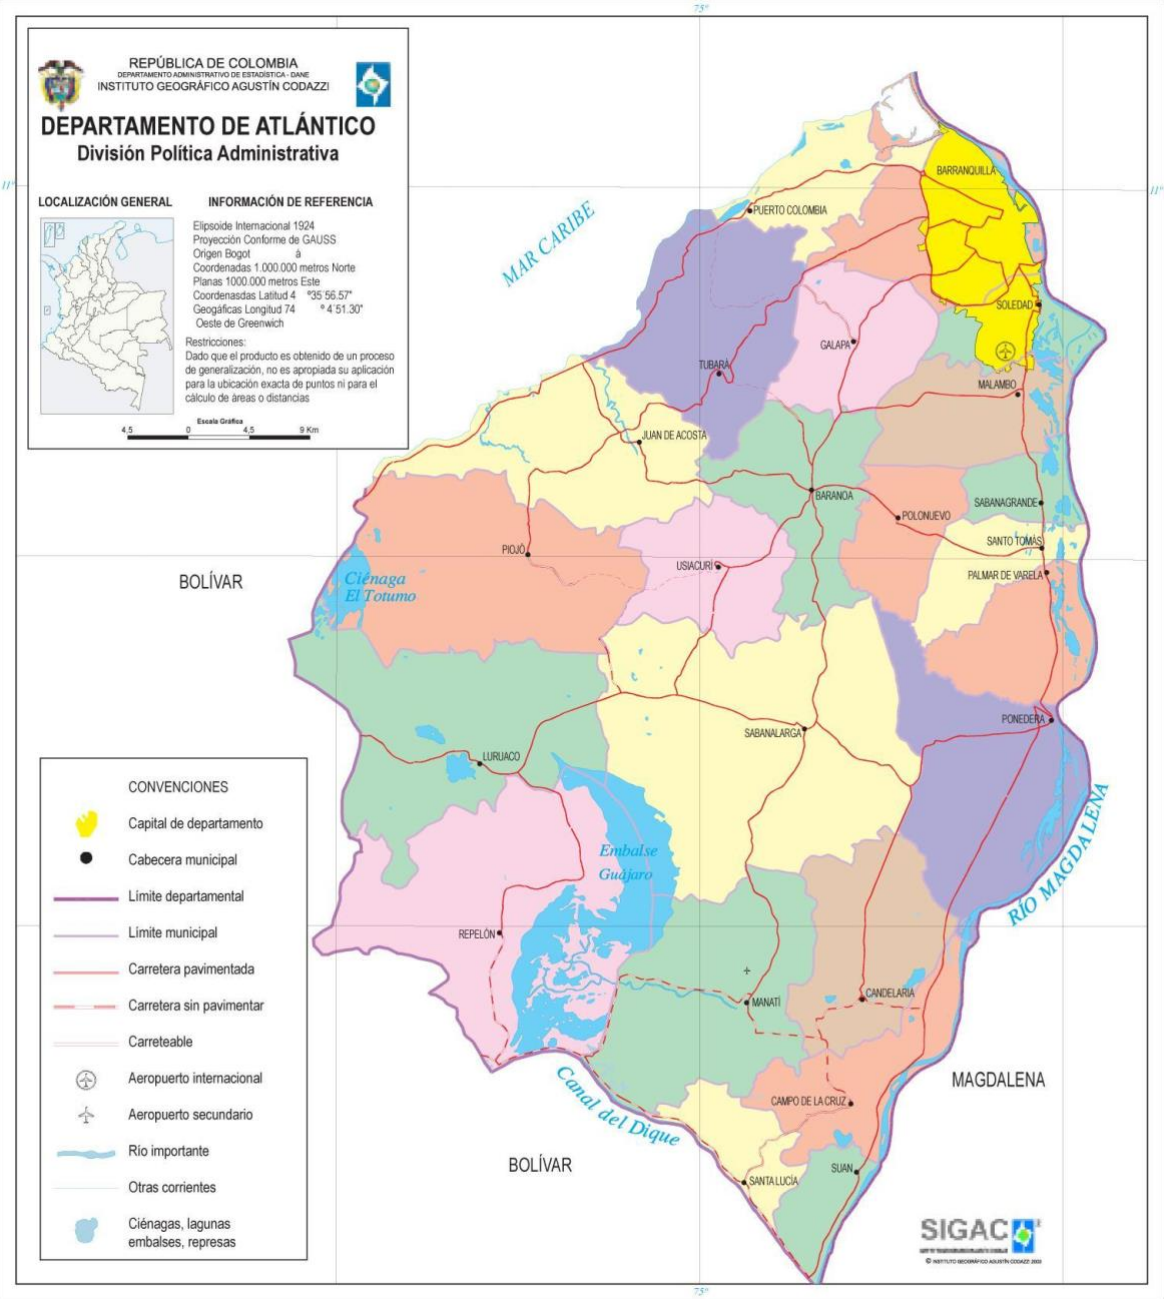


Figura 1. Localización del proyecto, Municipios de Luruaco, Manatí y Repelón, en el departamento del Atlántico.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Figura 2. Localización Laguna de Luruaco. Fuente Google Earth



Figura 3. Localización Arroyo Limón, Municipio de Luruaco. Fuente: Google Earth.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Figura 4. Localización Arroyo Negro, Municipio de Luruaco. Fuente: Google Earth.



Figura 5. Localización Embalse el Guájaro. Fuente: Google Earth.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Figura 6. Localización Caño de Villa Rosa, Embalse el Guájaro, Fuente: Google Earth.



Figura 7. Localización Caño de El Porvenir, Embalse el Guájaro, Fuente: Google Earth.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR

2.2.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO (INCLUYE: TOPÓGRAFO, CADENEROS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN)

Este ítem, consiste en localizar de manera exacta la ubicación de cada uno de los puntos del proyecto tanto en agua como en tierra, con el fin de que las obras queden en las coordenadas diseñadas y con las cotas establecidas en los planos. Para la localización, es importante que la topografía, se rija por las referencias de planimetría y altimetría suministradas en el proyecto, a través de puntos fijos y BM existentes en donde se realizó el levantamiento inicial. El trazado se deberá ejecutar siguiendo estrictamente los planos, en donde se encuentra todo lo relacionado a ejes, centros y paramentos de las obras. También se deberá tener en cuenta dentro de este ítem la demarcación de los puntos.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será metros cuadrados (m^2) de localización, trazado y replanteo de comisión topográfica, cumpliendo con lo establecido en el presente documento.

2.2.2. LIMPIEZA PARA RECUPERACION AMBIENTAL

La limpieza consiste en el conjunto de las actividades de excavar y reconformar los taludes de los caños y/o arroyos afluentes al Embalse El Guájaro (Caño de Villa Rosa y Caño de las Compuertas El Porvenir) y la Laguna de Luruaco (Arroyo Negro y Arroyo Limón). Las secciones de excavación deben realizarse según lo indicado en las secciones transversales tipo que se presentan a continuación:

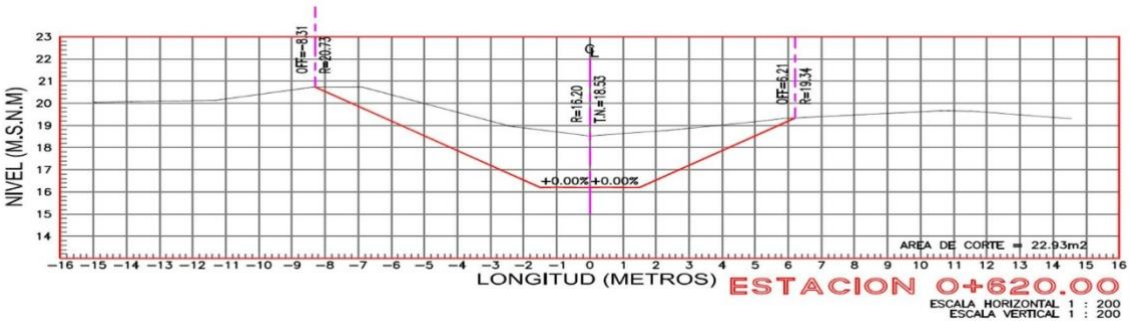


Figura 8. Sección transversal tipo

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación. Se deben garantizar los niveles y secciones de fondos de los arroyos y/o caños y anchos propuestos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico (m3), justificado en las carteras topográficas, de cálculo manual o digital con software. El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto.

2.2.3. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Esta actividad corresponde a la disposición final del material retirado por limpieza para recuperación ambiental del caño y/o arroyo. El caso del hidrosistema El Guájaro y la Laguna de Luruaco presenta particularidades que permitirán al contratista, disponer el material producto de la limpieza en zonas que han sido intervenidas por extracción de materiales a fin de realizar la recuperación geomorfológica del terreno (Canteras) previa autorización por parte de la entidad ambiental en jurisdicción, igualmente el contratista podrá disponer el material en rellenos sanitarios certificados o escombreras autorizadas por la entidad ambiental en jurisdicción. Dicha disposición se llevará a cabo al momento de cumplir con los requisitos ambientales y resultados de análisis de laboratorio acreditados por el IDEAM del material producto de la limpieza para la recuperación ambiental.

De igual forma, dentro del desarrollo del contrato, para optimizar las actividades de limpieza, retiro y disposición, y cumplir cabalmente con el objeto del contrato, el Contratista de Obra podrá analizar otras alternativas de disposición del material. Para este fin, a su cuenta y riego, deberá realizar los estudios técnicos y ambientales y trámites pertinentes a través de la Autoridad Ambiental, para lograr las modificaciones y/o ajustes de los permisos y/o Planes de Manejo correspondientes, cumpliendo con toda la normatividad vigente.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico por Kilometro (m3-Km), incluye todo lo necesario para el retiro y disposición final de los residuos producto de la limpieza para recuperación ambiental de los caños y/o arroyos sujetos de intervención en el proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2.2.4. ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Toma de muestras, almacenamiento, procesamiento, embalaje y cadena de custodia para los análisis de calidad de agua del embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco.

La toma de las muestras de agua se deberá realizar de la siguiente manera:

- Preparación del muestreo.
- Preparación de los envases para la toma de muestra.
- Preparación de las hojas de cadena de custodia.
- Coordinación para el transporte de las muestras.
- Preparación del equipo de muestreo (guantes, GPS, cámara fotográfica, coolers, etc.)
- Preparación del equipo de análisis In Situ.
- Preparación de los equipos de seguridad (flotadores, gafas).
- Organización de la logística para la campaña de muestreo (transporte terrestre y lancha).

El procedimiento para la toma de muestras se llevará a cabo con el llenado del recipiente de muestreo con una porción de agua del cuerpo hídrico muestreado de entre 250 y 500 centímetros cúbicos. La toma de muestras se realizará sumergiendo el envase de forma contraria al flujo, evitando la inclusión de aire por flujo turbulento. Se hará el registro de localización del punto de muestreo real con GPS y se caracterizará el sitio con fotografías. Se procederá a realizar la identificación de la muestra. Los recipientes para muestras microbiológicas se llenarán hasta ¾ (tres cuartas partes) de su capacidad para permitir la aireación y asegurar la supervivencia de los microorganismos a ser cuantificados.

Después de que las muestras han sido envasadas y preservadas (si lo requieren) se sellarán las botellas, secando la parte superior de la botella con papel absorbente o un trapo limpio y se pondrán varias vueltas de cinta de enmascarar (masking tape) alrededor de la tapa y la boca del recipiente, para asegurar que la tapa no se afloje.

Las muestras serán preservadas en colores a -4º C y con los químicos adecuados, si los análisis lo ameritan. Se procederá a tapar herméticamente cada recipiente y rotularlo con la identificación de la muestra, fecha de muestreo, persona responsable, parámetros a analizar. Se deberá evitar el uso de hielo seco o aditivos al hielo para evitar que las muestras se congelen, lo que puede provocar que los recipientes se abran o se rompan y en determinados casos se puedan alterar las características de la muestra.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Para el trasporte de las muestras se deberá verificar que el recipiente de almacenamiento contenga suficiente hielo para asegurar que la refrigeración se mantendrá hasta la llegada al laboratorio. Se deberá asegurar que las tapas de los recipientes estén bien cerradas, de tal manera que durante el viaje no se destapen. La persona responsable del muestreo debe mantener la custodia permanente de las muestras hasta que sean entregadas al laboratorio. En las instalaciones del laboratorio (el cual debe encontrarse debidamente certificado por el IDEAM) el responsable del muestreo debe entregarlas al responsable de recibirlas, junto con una copia de los registros de la cadena de custodia.

2.2.4.1. Análisis de Calidad del Agua

Para la toma de muestras de los parámetro fisicoquímicos y microbiológicos, para realizar el análisis de calidad del agua y determinar el estado del cuerpo de agua, se determinaron tres (3) puntos de muestreo dentro del embalse El Guájaro y tres (3) puntos de muestreo dentro la Laguna de Luruaco (Ver Figura 9 y 10 y precisados con coordenadas en la Tabla 2.2 y 2.3), donde se tomarán los parámetros fisicoquímicos por cada punto, se realizarán los muestreos en el embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada mes, una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

En cada muestreo se analizarán los parámetros fisicoquímicos descritos en la Tabla 1, que son necesarios para establecer los índices de calidad ICOMI, ICOMO, ICOSUS e ICOTRO:

Tabla 2.1. Parámetros Fisicoquímicos.

PARÁMETROS	
Temperatura	Sólidos totales
Salinidad	Sólidos suspendidos
Oxígeno disuelto	Demanda Biológica de Oxigeno (DBO)
pH	Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Turbidez	Nitratos
Clorofila	Nitrógeno Total
Grasas y aceites	Alcalinidad
Ortofosfatos	Tensoactivos (SAAM)
Fósforo	Coliformes termotolerantes
Dureza	Coliformes totales

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

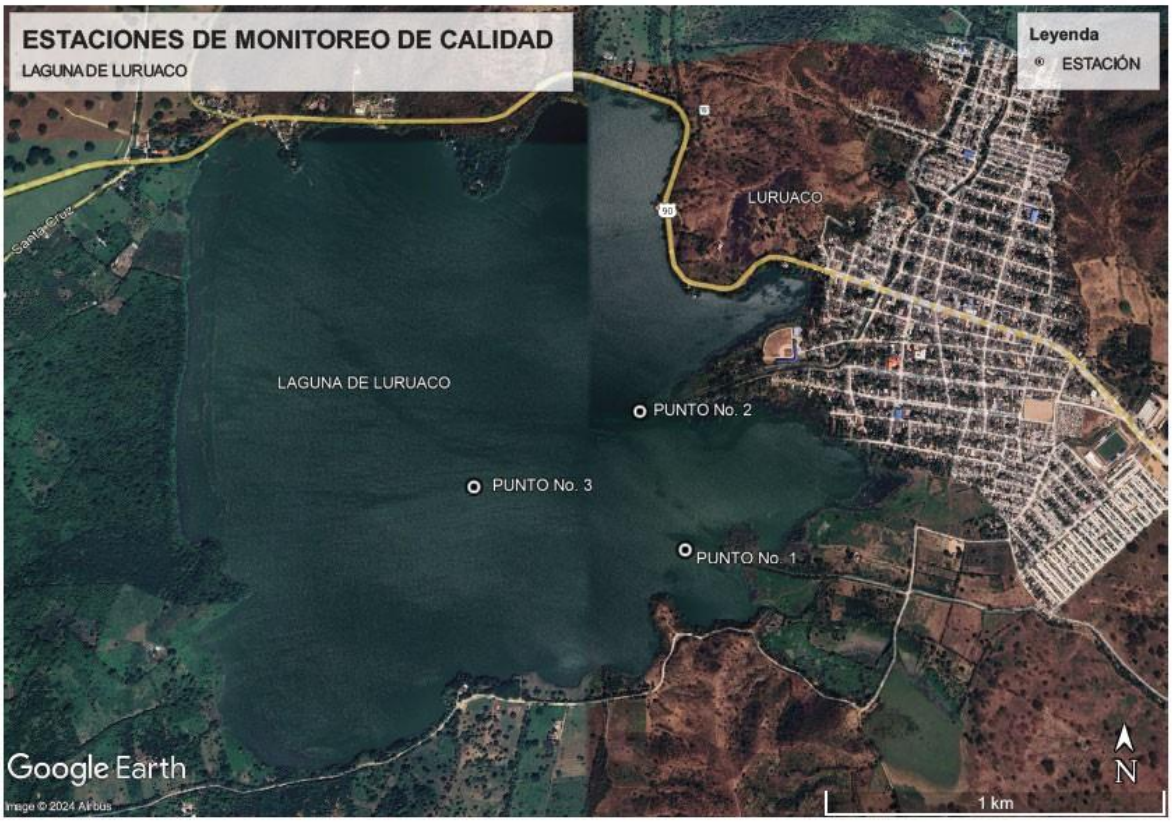


Figura 9. Ubicación Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

Tabla 2.2. Coordenadas Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO LAGUNA DE LURUACO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°36'11.40"N	75° 9'2.73"O
Punto No. 2	10°36'25.56"N	75° 9'7.28"O
Punto No. 3	10°36'17.69"N	75° 9'24.46"O

Tabla 2.3. Coordenadas Puntos de Muestreo Embalse El Guájaro.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO EMBALSE EL GUAJARO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°25'38.56"N	75° 4'43.81"O
Punto No. 2	10°24'48.32"N	75° 7'2.48"O
Punto No. 3	10°25'33.09"N	75° 6'6.16"O

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

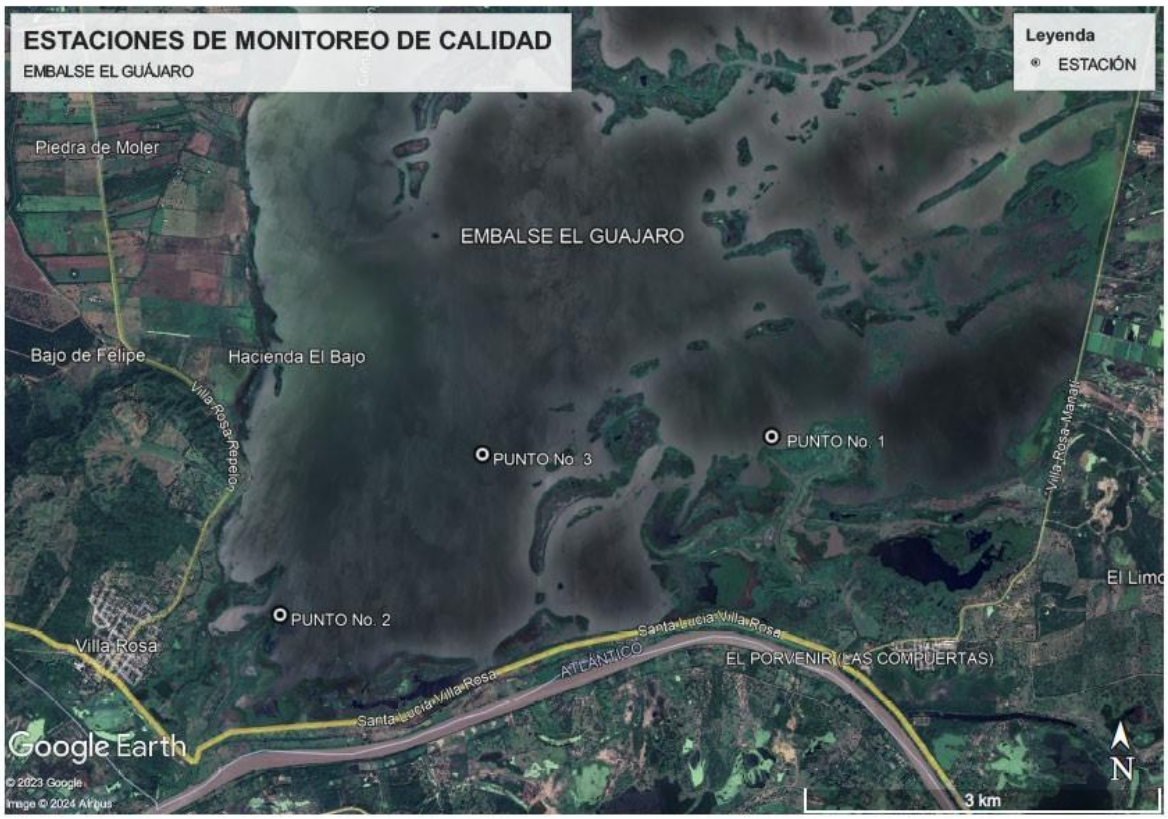


Figura 10. Ubicación Puntos de Muestreo Embalse El Guájaro.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2.2.5. ANÁLISIS DE PARÁMETROS HIDROBIOLÓGICOS (FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON, PERIFITON, MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS, MACROINVERTEBRADOS ASOCIADOS A MACRÓFITAS, ICTIOFAUNA (POR ADN METABARCODING).

2.2.5.1. Fitoplancton y Zooplancton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del fitoplancton y zooplancton en cada punto de muestreo se deberán tomar muestras de agua de la zona fótica utilizando una botella de Van Dorn de 2,2 Lt. Las muestras se deberán depositar en frascos plásticos de 250 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para el análisis cualitativo y cuantitativo (Rice et al., 2017). Si la muestra contiene una elevada densidad y/o materia orgánica es conveniente diluir la muestra con agua del sitio de muestreo. Las muestras conservadas con Lugol/Etanol se deberán conservar protegidas de la luz y en un lugar fresco (<15°C). Para determinaciones cuantitativas, se tomará un mililitro (1ml) de la muestra, el cual será depositado en una cámara de conteo Sedgwick-Rafter que limita el área y volumen, y permite calcular las densidades poblacionales mediante cuantificación en bandas, después de un periodo de asentamiento (Rice et al., 2017).

2.2.5.2. Perifiton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del Perifiton las muestras deberán ser tomadas dependiendo de la disponibilidad de los sustratos naturales (Roca, Tronco, Macrófitas, Lodo) que se puedan encontrar en los cuerpos de agua de estudio. Estas muestras serán tomadas mediante un raspado con un cuadrante de área determinada (9 x 9 cm) en las zonas litorales del cuerpo de agua. Se deberán tomar muestras de cada sustrato posible y se depositarán en frascos plásticos de 100 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para su posterior análisis cualitativo y cuantitativo.

2.2.5.3. Macroinvertebrados bentónicos

En los cuerpos lénticos es común tomar muestras de bentos, mediante la utilización de un equipo adecuado (tomador de muestras tipo draga) que permita llegar hasta el fondo del cuerpo de agua tomando la muestra de material béntico. El sedimento se podrá tamizar directamente en campo, con un tamiz de 300 µm para para disminuir la materia orgánica o sedimento dentro de la muestra o tamizar en el laboratorio certificado por el IDEAM al momento de procesar la muestra. El área para muestrear para que sea representativa deberá ser de

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

0.1m2. El material se deberá envasar en frascos plásticos de 500 ml o 1L de boca ancha o en bolsas plásticas de cierre hermético, se narcotizarán y se fijara con abundante alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante y se debe rotular cada una de las muestras colectadas (Rice et al., 2017).

2.2.5.4. Macroinvertebrados asociados a Macrófitas

De acuerdo con la presencia de macrófitas en el cuerpo de agua en estudio se deberá realizar un transecto sobre el parche de las macrófitas de dimensiones conocidas (de ser posible mínimo 10 metros) y se deberá llevar a cabo un barrido con la red tipo D por debajo de las macrófitas, colectando los macroinvertebrados que se encuentren presentes en las raíces de las mismas. De no ser posible pasar la red tipo D por debajo de las macrófitas se puede sacar la planta del agua y sacudirla sobre a red D o Surber y de esta manera recuperar los macroinvertebrados que se encuentren asociados. Si no es posible demarcar transectos por la distribución de las macrófitas, se podrán demarcar áreas definidas con ayuda de un cuadrante o teniendo en cuenta el área de la red. Para preservar las muestras se deberá agregar alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante (APHA, 2017).

2.2.5.5. Ictiofauna

La caracterización de la ictiofauna se realizará mediante la utilización del enfoque de metabarcodin que permite documentar y/o caracterizar la diversidad de especies en el ecosistema y puede tener una mejor cobertura para identificar taxones raros dentro del ecosistema (Pavan-Kumar et al., 2015).

Todos los análisis de parámetros hidrobiológicos descritos se realizarán en tres (3) puntos de muestreo dentro del embalse El Guájaro y tres (3) puntos de muestreo dentro la Laguna de Luruaco (correspondientes a los establecidos en las Figuras 1 y 2 y precisados con coordenadas en la Tabla 2 y 3), donde se realizarán los muestreos por cada punto (en el embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco) previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de los parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada dos meses (de manera bimensual), una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 3.1 *Información General Contrato de Obra.*

CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL
PARTICIPANTES DEL CONSORCIO:	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA D&D S.A.S. - 85%
	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. - 15 %
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MARIA VECINO VILLARREAL C.C. No. 72.162.008 de Barranquilla
CONTRATO No.	492 de 2024
OBJETO:	"REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÒN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".
VALOR TOTAL:	$ 6,198,582,045.25
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	7 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025

GARANTÍAS

El Contratista CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 16331056 con la aseguradora SURA., y la póliza de seguro de Responsabilidad Civil por lesiones, muerte y/o daños materiales a terceros derivada de cumplimiento No. 14071631 con la aseguradora SURA. A, continuación, se relacionan los valores asegurados del contrato No. 492 de 2024.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		Iniciación	Terminación
Cumplimiento del contrato	$619.858.204,53	06/12/2024	06/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$309.929.102,26	06/12/2024	06/08/2028
Estabilidad de la obra	$1.239.716.409,05	06/08/2025	06/08/2026
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	$520,000,000.00	06/12/2024	06/08/2025

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato de Obra No. 0492 de 2024, fue suscrita el día 07 de marzo de 2024 entre el Supervisor de la Entidad Contratante, el representante legal de la Interventoría, y el Representante Legal del Contratista para ejecutar las obras del proyecto de “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÒN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

El día 07 de julio de 2025 se suscribió el Otrosí No. 1 del Contrato de obra No. 492 de 2024, teniendo en cuenta la solicitud presentada por la Alcaldía de Luruaco, en la cual se relacionó la necesidad de intervenir el Arroyo de Piedras, el cual se encuentra sedimentado, y en épocas de lluvias se presentan inundaciones en el sector. Se incluyó este frente de obra toda vez que se realizó un balance de obra de mayores y menores cantidades y la inclusión de actividades no previstas, teniendo en cuenta que este arroyo es afluente del Embalse El Guájaro y el desarrollo de estas actividades apuntan al cumplimiento del objeto contractual.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el presupuesto general para el desarrollo de las actividades que comprende el proyecto:

Tabla 3.2 *Presupuesto de obra.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	Vr. TOTAL
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**				
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	$ 3,790.00	$ 58,820,800.00
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	7,069.95	$ 20,780.00	$ 146,913,561.00
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	110,291.22	$ 1,300.00	$ 143,378,586.00
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**				
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	$ 3,790.00	$ 72,768,000.00
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	17,672.26	$ 20,780.00	$ 367,229,562.80
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	$ 1,300.00	$ 388,259,552.20
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**				
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	$ 3,790.00	$ 81,257,600.00
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	14,070.64	$ 20,780.00	$ 292,387,899.20
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	$ 1,300.00	$ 546,925,776.80
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**				
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	$ 3,790.00	$ 166,153,600.00
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	29,940.73	$ 20,780.00	$ 622,168,369.40
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	1,140,442.41	$ 1,300.00	$ 1,482,575,127.41
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**				
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	$ 1,131,000.00	$ 61,074,000.00
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	$ 2,869,000.00	$ 86,070,000.00
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	$ 6,893,700.00	$ 55,149,600.00
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	$24,626,000.00	$ 197,008,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 4,768,140,034.81**
	Administración (22%)			0.22	$ 1,048,990,807.66
	Imprevistos (3%)			0.03	$ 143,044,201.04
	Utilidad (5%)			0.05	$ 238,407,001.74
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			0.30	**$ 1,430,442,010.44**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 6,198,582,045.25**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Tabla 3.3 *Presupuesto de obra según Otrosí No. 1 del 7 de julio de 2025*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. ACTUALIZADA	VR UNITARIO	Vr. TOTAL
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**				
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	$ 3,790.00	$ 58,820,800.00
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	1,437.95	$ 20,780.00	$ 146,913,561.00
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	22,432.07	$ 1,300.00	$ 143,378,586.00
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**				
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	$ 3,790.00	$ 72,768,000.00
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	17,672.26	$ 20,780.00	$ 367,229,562.80
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	$ 1,300.00	$ 388,259,552.20
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**				
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	$ 3,790.00	$ 81,257,600.00
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	14,070.64	$ 20,780.00	$ 292,387,899.20
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	$ 1,300.00	$ 546,925,776.80
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**				
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	$ 3,790.00	$ 166,153,600.00
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	29,940.73	$ 20,780.00	$ 622,168,369.40
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	1,140,442.41	$ 1,300.00	$ 1,482,575,127.41
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**				
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	$ 1,131,000.00	$ 61,074,000.00
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	$ 2,869,000.00	$ 86,070,000.00
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	$ 6,893,700.00	$ 55,149,600.00
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	$ 24,626,000.00	$ 197,008,000.00
6	**CAPÍTULO VI - RECUPERACIÓN ARROYO DE PIEDRA**				
6.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	4,950.00	$ 3,790.00	$ -
6.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	5,070.74	$ 20,780.00	$ -
6.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	82,399.53	$ 1,300.00	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 4,768,140,034.81**
	Administración (22%)			0.22	$ 1,048,990,807.66
	Imprevistos (3%)			0.03	$ 143,044,201.04
	Utilidad (5%)			0.05	$ 238,407,001.74
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**0.30**	**$ 1,430,442,010.44**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 6,198,582,045.25**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En la **Error! Reference source not found.**4 se presenta el cronograma del proyecto, indicando las actividades asociadas, así como la duración de cada una de estas.

Tabla 3.4 *Cronograma de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según acta de inicio 07 de marzo de 2025.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**	**115 días**	**22/03/2025**	**14/07/2025**
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	22/03/2025	5/04/2025
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	45 días	26/05/2025	9/07/2025
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	45 días	31/05/2025	14/07/2025
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**	**80 días**	**7/03/2025**	**25/05/2025**
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/03/2025	21/03/2025
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	60 días	22/03/2025	20/05/2025
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	60 días	27/03/2025	25/05/2025
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**	**118 días**	**7/03/2025**	**2/07/2025**
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/03/2025	21/03/2025
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	98 días	22/03/2025	27/06/2025
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	98 días	27/03/2025	2/07/2025
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**	**231 días**	**22/03/2025**	**7/11/2025**
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	22/03/2025	5/04/2025
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	123 días	3/07/2025	2/11/2025
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	123 días	8/07/2025	7/11/2025
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	**246 días**	**7/03/2025**	**7/11/2025**
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	246 días	**7/03/2025**	**7/11/2025**
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	246 días	**7/03/2025**	**7/11/2025**
	TOTAL CONTRATO No. 492 DE 2024	**246 días**	**7/03/2025**	**7/11/2025**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Tabla 3.5 *Cronograma de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según Otrosí No. 1 de inicio 07 de julio de 2025.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**	**218 días**	**3/22/2025**	**10/25/2025**
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/22/2025	4/5/2025
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	30 días	9/21/2025	10/20/2025
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30 días	9/26/2025	10/25/2025
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**	**80 días**	**3/7/2025**	**5/25/2025**
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/7/2025	3/21/2025
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	60 días	3/22/2025	5/20/2025
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	60 días	3/27/2025	5/25/2025
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**	**118 días**	**3/7/2025**	**7/2/2025**
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/7/2025	3/21/2025
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	98 días	3/22/2025	6/27/2025
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	98 días	3/27/2025	7/2/2025
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**	**231 días**	**3/22/2025**	**11/7/2025**
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/22/2025	4/5/2025
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	123 días	7/3/2025	11/2/2025
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	123 días	7/8/2025	11/7/2025
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	**246 días**	**3/7/2025**	**11/7/2025**
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	246 días	3/7/2025	11/7/2025
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	246 días	3/7/2025	11/7/2025
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	246 días	3/7/2025	11/7/2025
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	246 días	**3/7/2025**	**11/7/2025**
6	**CAPÍTULO VI - RECUPERACIÓN ARROYO DE PIEDRA**	**168 días**	**45753**	**45920**
6.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/9/2025	7/23/2025
6.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	50 días	7/28/2025	9/15/2025
6.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	50 días	8/2/2025	9/20/2025
	TOTAL CONTRATO No. 492 DE 2024	**246 días**	**3/7/2025**	**11/7/2025**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la relación del personal profesional del contratista actualizado:

Tabla 3.5 *Personal Profesional y operativo del Contratista*

No	Nombre Completo	Cedula	Cargo	Matricula
1	Roque Muñoz	91281627	Director de obra	68202087106STD
2	Javier Conrado	104235345	Residente de obra	08202-308050 ATL
3	Juan Miguel Hernandez	1118848009	Especialista Ambiental	08238349693 ATL
4	Sonia Gonzalez	1140885236	Residente ambiental	08238428833 ATL
5	Walter Barbosa	7226272	Biologo	2336 - 2007
6	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	021272-0515198 ATL
7	Kelly Florez	56067903	Supervior SISO	1604 de 26 de marzo 2015
8	Marianela Torregrosa	1043028148	Residente Social	Ley 53 de 1977.
9	Humberto Escocia	1234888624	Conductor Camioneta FVO666	N/A
10	Jose Rodrigo Avila Arenas	19360273	Topografo	00-0472
11	Domingo González	11075728	Cadenero	N/A
12	Oscar paredes	72144924	Operador Retroexcavadora VOLVO 210	N/A
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	N/A
14	Luis Eduardo Mizzar	72166813	Conductor Volqueta WEL 864	N/A
15	Jader Vital Acosta	92250208	Conductor Volqueta WEL 865	N/A
16	Ruben Moreno	72308083	Conductor Volqueta STS 224	N/A
17	Luis Ching	8742576	Conductor Volqueta STS 222	N/A
18	Rosa Castro	22598664	Servicio General	N/A
19	Luis Guillermo Trespalacios	1038097776	Operador Retroexcavadora VOLVO 240	N/A
20	WaldirMartinez	1140838364	Conducto de volqueta SON 779	N/A
21	David Gomez Arrieta	72193076	Operador Retroexcavadora CAT320C1	N/A

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 07 de julio de 2025 al 06 de agosto de 2025:

Semana del 07 al 10 de julio de 2025

Lunes 07 de Julio

- Se presenta daño mecánico en la retroexcavadora Volvo 210, lo que obliga a suspender las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir, mientras se realizan las reparaciones y correctivos necesarios para el funcionamiento adecuado del equipo.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 476 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 08 de Julio

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 09 de Julio

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Jueves 10 de julio

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 11 al 17 de julio de 2025

Viernes 11 de julio

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 12 de julio

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 406 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 13 de Julio

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 14 de Julio

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

volumen de 476 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 15 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 16 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 17 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 18 al 24 de julio de 2025

Viernes 18 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 19 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 20 de julio
- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 21 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 22 de julio
- Rretiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 23 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 24 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 25 de julio al 31 de julio de 2025

Viernes 25 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realiza la movilización de una retroexcavadora CAT 320C para atender el frente de obra de Arroyo de Piedras en el Municipio de Luruaco, Atlántico.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 26 de julio
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 27 de junio
- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 28 de julio

- Se dio inicio a la limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K1+100 hasta la K1+040, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 29 de julio

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K1+040 hasta la K0+980, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

.

Miércoles 30 de julio

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+980 hasta la K0+940, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- El día de hoy se lleva a cabo la tercera jornada del monitoreo hidrobiológico e ictiofauna en el Embalse el Guájaro y la Laguna de Luruaco, con el Laboratorio SOLRA Ingeniería, quien será el encargado de emitir los reportes exigidos para el proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Jueves 31 de julio

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+940 hasta la K0+900, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 01 al 06 de agosto de 2025

Viernes 01 de agosto

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+900 hasta la K0+860, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Sábado 02 de agosto

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+860 hasta la K0+820, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Domingo 03 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 04 de agosto

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+820 hasta la K0+780, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se realizó la sexta jornada de toma de muestras para el monitoreo de calidad de aguas parámetros físico químicos y microbiológicos. Se toman tres muestras puntuales en el Embalse el Guajáro, y tres muestras puntuales en la Laguna de Luruaco, por parte del Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S, quien será el responsable de la realización de los ensayos de laboratorio.

Martes 05 de agosto

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+780 hasta la K0+740, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Miércoles 06 de agosto

- Limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+740 hasta la K0+700, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Control topográfico conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+100 hasta la K0+700.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3 y una retroexcavadora Volvo 240 para el cargue, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 5.1 *Información General Contrato de Interventoría.*

CONTRATISTA:	COSORCIO LURUCACO ALFREDO JOSE MARTINEZ LEPESQUEUR 70% CONSULTORÍA TECNICA DE OBRAS S.A.S. 20% OBRAS E INTERVENTORÍAS COLOMBIA S.A.S. 10%
CONTRATO No.	0497 DE 2024
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".
VALOR:	$537.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025

GARANTÍAS
La interventoría CONSORCIO LURUACO Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 21-44-101461195 con la aseguradora SURA. A continuación, se relacionan los valores asegurados y las vigencias.

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**	
		Iniciación	**Terminación**
Cumplimiento del contrato	$53.700.000	30/12/2024	28/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$26.850.000	30/12/2024	31/08/2028
Calidad del servicio	$107.400.000	30/12/2024	31/08/2026

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato No. 0497 DE 2024, fue suscrita el día 07 de marzo de 2025 entre el representante legal de la Interventoría y supervisor del contrato para realizar la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 5.2. se presenta el presupuesto general de la interventoría:

Tabla 5.2 *Presupuesto Interventoría.*

DESCRIPCION	CANT.	MESES	DEDICACION	SUELDO	VALOR PARCIAL
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
A.1 PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoria	1	8	50%	$ 7.250.000	$ 29.000.000
Residente de Interventoria	1	8	100%	$ 4.150.000	$ 33.200.000
Profesional Ambiental	1	8	40%	$ 5.880.000	$ 18.816.000
A.2 PERSONAL TECNICO					
Profesional SISO	1	8	100%	$ 2.300.000	$ 18.400.000
SUBTOTAL PERSONAL					**$ 99.416.000**
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,40**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$ 238.598.400**
B. OTROS COSTOS DIRECTOS					
DESCRIPCION	**UNIDAD**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
Alquiler de Vehículo (Incluye conductor, combustible y mantenimiento)	MES		8	$ 7.000.000	$ 56.000.000
Comisión Topográfica. (Incluye: Un Topógrafo, Un Cadenero y Equipos de Medición: Sistema GNSS - RTK Base y Rover (Incluye bastón y trípode), Estación Total Topográfica (Incluye bastón y trípode), Nivel de precisión (Incluye: bastón y trípode))	MES		8	$ 10.083.663	$ 80.669.304
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Coliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar).	MUESTRA		30	$ 1.131.800	$ 33.954.000
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1.Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictofauna - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar).	MUESTRA		12	$ 2.869.900	$ 34.438.800
Informes, papelería, reproducción de documentos, planos y fotografías.	MES		8	$ 950.000	$ 7.600.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 212.662.104**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS					**$ 451.260.504**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA-19%)					**$ 85.739.496**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA					**$ 537.000.000**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la relación del personal profesional de interventoría:

Tabla 5.3 *Personal Profesional de la Interventoría*

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN	CEDULA	MATRICULA
ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	10.766.786	2220212654 5 COR
RICARDO ANTONIO PEREZ EGUIS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	85.458.051	08202-76946 ATL
IVAN DARIO ARELLANA OCHOA	PROFESIONAL AMBIENTAL	Ingeniero Civil – magister en ingeniería y gestión ambiental	72.008.065	08202-089216 ATL
MARIA CONTRERAS BARRANCO	PROFESIONAL SISO	Administrador integral de riesgos de seguridad y salud en el trabajo	1.143.443.933	Resolución No. 0384 de 05 de febrero de 20219
RICARDO BERRIO ARRIETA	TOPOGRAFO	Tecnólogo en Topografía	72.197.203	01-15827

Nota: se realizó la solicitud de cambio de personal del Director de Interventoría y del Residente de interventoría, la cual fue aprobada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, relacionándose en la tabla 5.3 los nuevos profesionales de la interventoría.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Interventor:

Semana del 07 al 10 de julio de 2025

Lunes 07 de Julio

- Debido a averío de la retroexcavadora Volvo 210 se suspenden las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir. El contratista notificó que realizará las actividades de revisión y mantenimiento para reintegrar el equipo nuevamente a las actividades de limpieza.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 476 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 08 de Julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

01Miércoles 09 de Julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Jueves 10 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Semana del 11 al 17 de julio de 2025

Viernes 11 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 12 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 406 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 13 de Julio

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 14 de Julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 476 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 15 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 16 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 17 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 18 al 24 de julio de 2025

Viernes 18 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 19 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 20 de julio

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 21 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 22 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 23 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 24 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 25 de julio al 31 de julio de 2025

Viernes 25 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizó la movilización de una retroexcavadora CAT 320C hacia el frente de obra de Arroyo de Piedras en el Municipio de Luruaco.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 26 de julio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 27 de junio

- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 28 de julio

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K1+100 hasta la K1+040 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 29 de julio

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K1+040 hasta la K0+980 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 30 de julio

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+980 hasta la K0+940 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Acompañamiento al contratista de obra en la toma de muestras para el tercer monitoreo hidrobiológico e ictiofauna en el Embalse el Guajaro y la Laguna de Luruaco, las cuales estuvieron a cargo del Laboratorio SOLRA Ingeniería, quien será el encargado de emitir los reportes exigidos para el proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Jueves 31 de julio

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+940 hasta la K0+900 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 01 al 06 de agosto de 2025

Viernes 01 de agosto

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+900 hasta la K0+860 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Sábado 02 de agosto

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+860 hasta la K0+820 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Domingo 03 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 04 de agosto

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+820 hasta la K0+780 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Acompañamiento al contratista de obra en la toma de muestras para la sexta campaña de monitoreo de calidad de aguas; se tomaron tres muestras puntuales en el Embalse el Guajáro, y tres muestras puntuales en la Laguna de Luruaco, las cuales fueron tomadas por el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S, quien será el responsable de la realización de los ensayos de laboratorio para la determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos para el proyecto. Así mismo, la interventoría realizó la toma de muestras en el Embalse El Guájaro y en la Laguna de Luruaco, las cuales serán analizadas por el laboratorio LABORMAR, quien se encuentra acreditado por el IDEAM.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 05 de agosto

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+780 hasta la K0+740 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 574 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Miércoles 06 de agosto

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+740 hasta la K0+700 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+100 hasta la K1+700.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 588 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Con base en los avances ejecutados por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2025, y considerando las cantidades de obra desarrolladas, se definieron los porcentajes de avance físico correspondientes al corte del periodo evaluado. El análisis técnico realizado permitió establecer un avance físico acumulado del 64,28%, superando en 14,92 puntos porcentuales el 49,36% programado para esta etapa del proyecto. Este resultado evidencia un ritmo de ejecución superior al inicialmente previsto, reflejando un desempeño favorable en la ejecución de las actividades y un adelanto significativo frente a la programación general.


A continuación, se presenta el cuadro que resume las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 7 de julio y el 6 de agosto de 2025, en el cual se especifican los avances alcanzados en cada una de las actividades desarrolladas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA INFORME 5: 07-07-25 AL 06-08-25	CANTIDADES ACUMULADAS	% AVANCE POR ACTIVIDAD
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**					
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	-	15,520.00	100%
1.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	7,069.95	-	-	-
1.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	110,291.22	-	-	-
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**					
2.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	-	19,200.00	100%
2.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	17,672.26	-	17,672.26	100%
2.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	-	298,661.19	100%
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**					
3.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	-	21,440.00	100%
3.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	14,070.64	-	14,070.64	100%
3.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	-	420,712.14	100%
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**					
4.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	-	43,840.00	100%
4.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	29,940.73	12,116.88	23,991.01	80.12%
4.03	Retiro y Disposición Final de	M3-KM	1,140,442.41	436,452.80	758,459.80	67%

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA INFORME 5: 07-07-25 AL 06-08-25	CANTIDADES ACUMULADAS	% AVANCE POR ACTIVIDAD
	Residuos					
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**					
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	6	18	33%
5.02	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	6	12	40%
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	1	5	63%
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	1	5	63%
6	**CAPITULO VI – RECUPERACION ARROYO DE PIEDRAS**					
6.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100%
6.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	5,070.74	1,801.92	1,801.92	36%
6.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	82,399.53	-	-	-

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

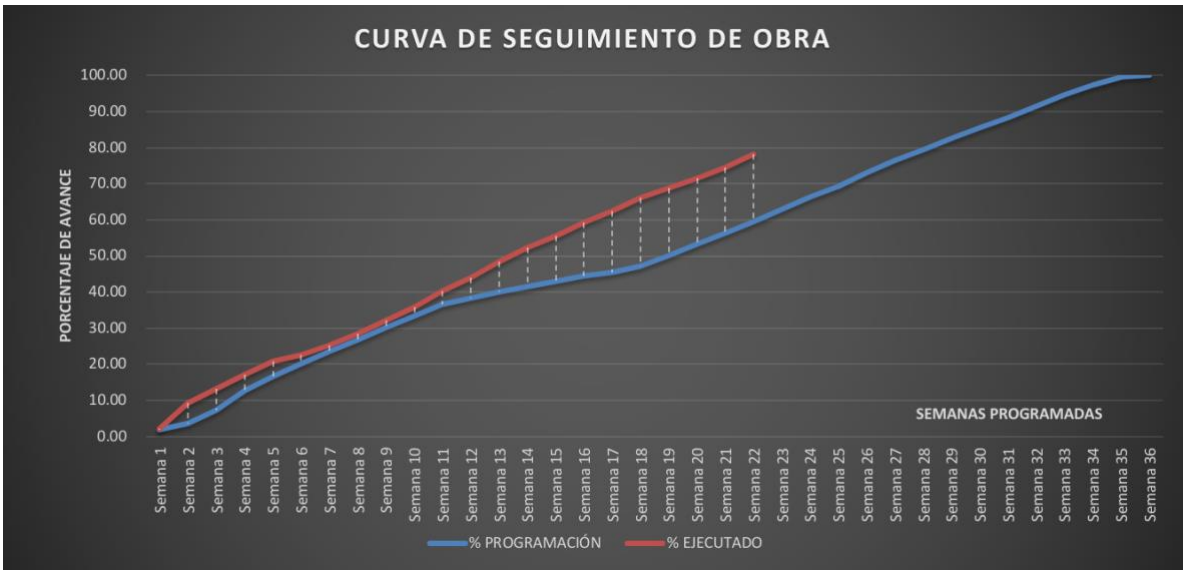

Curva S del proyecto, % Programado vs % Ejecutado

De la anterior gráfica, se puede verificar que el contratista se encuentra por encima de los rangos establecidos, acorde a la programación de obra, con un avance físico de obra del 78.16% de avance del proyecto, contra un 59.38% de lo programado. Se actualizan los porcentajes programados teniendo en cuenta la reprogramación de obra conforme al otrosí No. 1 del 07 de julio de 2025.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.2 SEGUIMIENTO SST

En el marco del desarrollo del contrato de obra No. 492 de 2024, el Consorcio Alianza Ambiental adoptó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa TICOM, uno de sus consorciados, como base para la implementación del programa correspondiente durante la ejecución de las actividades constructivas del proyecto. Dicho sistema fue ajustado a las condiciones específicas de la obra, con el propósito de garantizar la protección integral de la salud y la seguridad de los trabajadores en cada una de las fases del proceso constructivo.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de julio y el 6 de agosto de 2025, la interventoría realizó actividades de seguimiento y verificación en campo orientadas a la implementación del SG-SST, evidenciando el desarrollo de acciones encaminadas a la mitigación de riesgos laborales y al fortalecimiento de ambientes de trabajo seguros en los diferentes frentes de obra.

En este contexto, se constató la ejecución de jornadas de capacitación dirigidas al personal operativo, enfocadas en la prevención de riesgos laborales, la aplicación de procedimientos seguros de trabajo, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la adopción de protocolos de respuesta frente a situaciones de emergencia. Estas actividades de formación se llevaron a cabo mediante charlas informativas diarias, desarrolladas previo al inicio de las labores, como parte de las estrategias de sensibilización y promoción de una cultura de seguridad en el entorno laboral.

A continuación, se relacionan las charlas y capacitaciones realizadas durante el periodo evaluado:

CHARLAS SST		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
8/07/2025	Uso de la camilla	Kelly Florez
9/07/2025	Primeros auxilios	Kelly Florez
11/07/2025	Comité y sus funciones - COPASTT y CCL	Kelly Florez
15/07/2025	Autoreportes de actos y condiciones inseguras	Kelly Florez
17/07/2025	La importancia del ATS	Kelly Florez
18/07/2025	Importancia del uso de los protectores auditivos	Kelly Florez
19/07/2025	divulgación de señales de transito	Kelly Florez
22/07/2025	como cuidar mis 5 sentidos	Kelly Florez
25/07/2025	Agotamiento fisico por condiciones climáticas	Kelly Florez
26/07/2025	Prevención lesiones en la columna	Kelly Florez
28/07/2025	Riesgos ergonomicos	Kelly Florez
30/07/2025	Salud publica	Kelly Florez
31/07/2025	Como identificar un AT	Kelly Florez
2/08/2025	Autocuidado	Kelly Florez
4/08/2025	Políticas de seguridad	Kelly Florez
5/08/2025	Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra	Kelly Florez
6/08/2025	Manejo y prevención del estrés en el trabajo	Kelly Florez

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Se verificó que el contratista adelantara la instalación y adecuación de elementos de seguridad orientados a la prevención de accidentes laborales y a la garantía de condiciones seguras en las zonas operativas y áreas auxiliares. Dentro de las acciones destacadas se identificó la implementación de señalización en los frentes de trabajo y campamentos, así como la dotación de elementos básicos de atención primaria, entre ellos botiquines de primeros auxilios, camillas de emergencia y extintores portátiles, considerados insumos esenciales para una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante la ejecución de las actividades constructivas.

De igual manera, se llevaron a cabo inspecciones periódicas en los diferentes frentes de obra, con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial establecidas en el SG-SST y de asegurar el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal operativo. Dichas inspecciones permitieron identificar desviaciones, formular observaciones y aplicar medidas correctivas de manera inmediata, contribuyendo al fortalecimiento de la mejora continua del sistema de gestión en campo.

A continuación, se detallan las inspecciones realizadas y los aspectos evaluados en cada una de ellas:

- Inspecciones planeadas
- Inspección de extintores
- Inspección de botiquín
- Inspección de camillas
- Inspección al estado y uso de EPP
- Inspección punto ecológico
- Observación inspecciones planeadas
- Inspección detallada de equipos
- Inspección orden y aseo

En el Anexo No. 6 se presenta el seguimiento a la implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al período del 07 de julio de 2025 al 06 de agosto de 2025.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.3 SEGUIMIENTO SOCIAL

En cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del componente de gestión social del contrato de obra No. 492 de 2024, el Consorcio Alianza Ambiental ha dispuesto la habilitación de un punto de atención por cada frente de trabajo, ubicado dentro de los respectivos campamentos de obra, con el propósito de atender las quejas, sugerencias, peticiones y demás manifestaciones (PQRs) presentadas por los miembros de la comunidad pertenecientes al área de influencia directa del proyecto. Estos puntos permiten canalizar de manera eficiente la comunicación entre la comunidad y el equipo técnico-social del proyecto, garantizando trazabilidad y oportuna atención a los requerimientos ciudadanos.

6.3.1. Jornadas de Socialización del Proyecto

A la fecha, el Consorcio Alianza Ambiental, con el acompañamiento de la interventoría, realizó diversas jornadas de socialización del proyecto en los municipios y corregimientos que hacen parte del área de influencia directa del proyecto. Estas actividades tuvieron como finalidad principal brindar información clara y detallada a la comunidad sobre los aspectos técnicos, duración, cronograma y fases constructivas del proyecto.

Las jornadas se desarrollaron en las siguientes fechas y lugares:

- 13 de marzo de 2025: Socialización en el municipio de Luruaco, llevada a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal.

- 17 de marzo de 2025: Socialización en el corregimiento de Villa Rosa, desarrollada en las instalaciones de ASOPACOVIR.

- 18 de marzo de 2025: Socialización en el corregimiento de El Porvenir, realizada en el Estadero “Las Brisas del Guaro”.

Durante estas jornadas se resolvieron inquietudes de los asistentes y se fortaleció el vínculo institucional con la comunidad, en aras de garantizar la participación ciudadana y la transparencia en la ejecución del proyecto.

6.3.1. Levantamiento de Actas de Vecindad

Como parte de las actividades preliminares a la ejecución de las obras, y con el objetivo de establecer una línea base del estado físico de los inmuebles colindantes a las zonas de intervención, se desarrolló el proceso de levantamiento

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

de actas de vecindad. Este proceso fue liderado por el Consorcio Alianza Ambiental con el apoyo técnico de la interventoría, y consistió en la verificación y registro del estado actual de predios, viviendas, estructuras, locales comerciales y parcelas ubicadas en el perímetro del área de influencia directa del proyecto.

Cada visita fue documentada mediante actas suscritas por las partes, incluyendo registros fotográficos y observaciones técnicas, lo que permitirá, en caso de ser requerido, realizar comparaciones posteriores para la evaluación de posibles afectaciones. Esta actividad es de vital importancia para garantizar la protección de bienes privados, la transparencia en el proceso constructivo y la adecuada atención de eventuales reclamaciones por parte de terceros.

Fechas	Detalle	Cantidad
Del 10-03-2025 al 11-03-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Negro - Luruaco	28
11-03-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Negro - Luruaco	1
11-03-2025	Actas de lote Inicial Arroyo Negro - Luruaco	2
Del 19-03-2025 al 22-03-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Limón - Luruaco	58
21-03-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Limón - Luruaco	3
25-03-2025	Actas de vecindad Inicial Caño Villa Rosa - Repelón	1
25-03-2025	Actas de entorno Inicial Caño Villa Rosa - Repelón	1
Del 25-03-2025 al 26-03-2025	Actas de vecindad Inicial Caño El Porvenir - Manatí	28
25-03-2025	Actas de entorno Inicial Caño El Porvenir - Manatí	1
26-03-2025	Actas de lote Inicial Caño El Porvenir - Manatí	4
Total		**127**

En el Anexo No. 7 se presenta el seguimiento a la implementación del programa de Gestión Social, correspondiente al período del 07 de julio de 2025 al 06 de agosto de 2025.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

6.4.1. Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

En el marco de la ejecución del proyecto, el Consorcio Alianza Ambiental formuló el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el propósito de establecer las medidas de de manejo definidas para los componentes del medio biótico, abiótico y socioeconómico, orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos derivados de las actividades operativas.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de julio y el 6 de agosto de 2025, la interventoría efectuó el seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en los distintos programas que integran el PMA, constatando la ejecución de acciones orientadas a la protección y conservación del entorno. En relación con el manejo de residuos sólidos, se verificó la instalación y operación de puntos ecológicos en los frentes de obra, destinados a la clasificación, almacenamiento temporal y posterior disposición de los residuos generados tanto por las actividades constructivas como por el personal vinculado al proyecto.

En cuanto al control de emisiones y material particulado, se evidenció la utilización de carpas de cubrimiento en las volquetas empleadas para el transporte de materiales producto de las labores de limpieza y recuperación ambiental, con destino al sitio de disposición final autorizado. Esta medida tuvo como finalidad evitar la dispersión de partículas en las vías de tránsito. Adicionalmente, se implementaron rutinas periódicas de humectación en las vías de acceso al área de influencia directa del proyecto, como estrategia de mitigación para la reducción de emisiones de polvo y la preservación de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos del PMA.

De manera complementaria, se desarrollaron jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas al personal técnico y operativo, enfocadas en temáticas ambientales relevantes tales como el manejo adecuado de residuos sólidos, uso eficiente del recurso hídrico, conservación de la biodiversidad y manejo responsable de insumos y materiales, con el fin de fortalecer la cultura ambiental y promover prácticas sostenibles durante la ejecución del proyecto.

A continuación, se detallan las charlas ambientales desarrolladas por el contratista durante el periodo reportado:

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

CHARLAS AMBIENTALES		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
7/07/2025	Identificación de animales venenosos en campo	Sonia Gonzalez
10/07/2025	Control de material particulado	Sonia Gonzalez
12/07/2025	Porque es importante monitorear la calidad del agua	Sonia Gonzalez
14/07/2025	Beneficios de los suelos	Sonia Gonzalez
21/07/2025	Que es un vertimiento	Sonia Gonzalez
24/07/2025	Herramientas necesarias para la manipulación de fauna silvestre	Sonia Gonzalez
29/07/2025	Cuidados al momento de derrumbar un árbol	Sonia Gonzalez
1/08/2025	Como prevenir los daños en la vegetación	Sonia Gonzalez

CAPACITACIONES		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
16/07/2025	Fauna acuática y terrestre de la zona de influencia	Sonia Gonzalez
23/07/2025	Manejo seguro y responsable de los residuos	Sonia Gonzalez

6.4.2. Monitoreo de Calidad de Agua

Primera campaña de monitoreo:

El día 13 de marzo de 2025, tanto el Consorcio Alianza Ambiental como el Consorcio Luruaco realizaron actividades de tomas de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro. En cada uno de estos cuerpos hídricos se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Las muestras fueron tomadas por personal técnico capacitado, siguiendo los protocolos establecidos para la recolección, preservación y transporte de muestras de agua, conforme a la normatividad ambiental vigente. Cada punto de muestreo fue debidamente georreferenciad, y a continuación se presentan las coordenadas geográficas correspondientes para su trazabilidad y análisis comparativo en etapas futuras del proyecto:

Tabla 6.1. Coordenadas Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO LAGUNA DE LURUACO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°36'11.40"N	75° 9'2.73"O
Punto No. 2	10°36'25.56"N	75° 9'7.28"O
Punto No. 3	10°36'17.69"N	75° 9'24.46"O

Tabla 6.2. Coordenadas Puntos de Muestreo Embalse El Guájaro.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO EMBALSE EL GUAJARO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°25'38.56"N	75° 4'43.81"O
Punto No. 2	10°24'48.32"N	75° 7'2.48"O
Punto No. 3	10°25'33.09"N	75° 6'6.16"O

El propósito de esta actividad fue establecer una línea base de los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua previo al desarrollo de las actividades operativas, permitiendo identificar la condición inicial de los cuerpos de agua y evaluar, en etapas posteriores, cualquier variación atribuible a la ejecución del proyecto. En el Anexo 9.1 se presenta el informe y resultados de laboratorio del monitoreo No. 1 de calidad de aguas presentado por el contratista de obra.

El análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos fue realizado por el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., para el contratista de obra, y por el laboratorio LABORMAR para la interventoría, los cuales mediante distintos ensayos establecieron los siguientes parámetros:

Parámetros fisicoquímicos:

- Temperatura
- Salinidad
- Oxígeno Disuelto
- pH
- Turbidez
- Clorofila
- Sólidos Totales
- Sólidos Suspendidos
- Demanda Biológica de Oxígeno (DBO_5)
- Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Nitratos
- Nitrógeno Total
- Grasas y Aceites
- Ortofosfatos
- Fósforo
- Dureza
- Alcalinidad
- Tensoactivos Aniónicos (SAAM)

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Parámetros microbiológicos:

- Coliformes Termotolerantes
- Coliformes Totales

Segunda campaña de monitoreo:

El día 04 de abril de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del segundo monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S.

En el Anexo 9.2., se presenta el informe y resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, correspondientes al Monitoreo No. 2, de las tomas de muestras realizadas por la interventoría.

Tercera campaña de Monitoreo:

El día 28 de abril de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del tercer monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Cuarta campaña de monitoreo:

El día 28 de mayo de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del cuarto monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Así mismo, la interventoría realizó las tomas de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro (monitoreo de

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

interventoría No. 2). En cada uno de estos cuerpos hídricos se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Las muestras fueron tomadas por personal técnico del Laboratorio LABORMAR, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM y será el encargado de realizar los ensayos correspondientes para determinar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de dichas muestras y de este modo contar con insumos que permitan establecer las condiciones de calidad de agua durante la ejecución del proyecto.

Quinta campaña de monitoreo:

El día 27 de junio de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del quinto monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Sexta campaña de monitoreo:

El día 04 de agosto de 2025, el Consorcio Alianza Ambiental adelantó la toma de muestras correspondiente al sexto monitoreo de calidad de aguas, con el objetivo de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez iniciadas las actividades de limpieza para la recuperación ambiental. Actualmente, el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S. se encuentra en proceso de análisis y ejecución de ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudio mencionados, generando información técnica necesaria para el seguimiento del recurso hídrico.

Seguidamente, el día 04 de agosto de 2025, la interventoría realizó la toma de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro, correspondientes al Monitoreo de Interventoría No. 3. En cada uno de estos sistemas se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Dichas muestras fueron tomadas por personal técnico del Laboratorio LABORMAR, entidad acreditada por el IDEAM, la cual será responsable de la realización de los ensayos correspondientes para determinar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas, con el fin de contar con insumos que permitan establecer las condiciones de calidad del agua durante la ejecución del proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Resumen Campañas de monitoreo de calidad de Aguas:

Campañas de Monitoreo Calidad de Aguas		
Fecha	**No. Monitoreo Contratista**	**No. Monitoreo Interventoría**
13 - 03 - 2025	1	1
04 - 04 - 2025	2	
28 - 04 - 2025	3	
28 - 05 - 2025	4	2
27 - 06 - 2025	5	
04 - 08 - 2025	6	3

6.4.3. Monitoreo Hidrobiológico

Primer monitoreo Hidrobiológico:

El día 20 de marzo de 2025, el Contratista de obra (Consorcio Alianza Ambiental), y la interventoría (Consorcio Luruaco) en el marco de las actividades de monitoreo ambiental asociadas al proyecto, realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos.

La actividad se desarrolló conforme a los protocolos establecidos en la normatividad ambiental vigente y bajo los lineamientos metodológicos reconocidos para el muestreo en cuerpos de agua continentales. La recolección se efectuó en puntos previamente georreferenciados y representativos del ecosistema objeto de estudio, garantizando así la validez y representatividad de los datos obtenidos.

Los parámetros hidrobiológicos seleccionados para el análisis incluyen las siguientes comunidades biológicas, consideradas bioindicadores clave del estado ecológico del recurso hídrico:

- Fitoplancton: organismos fotosintéticos microscópicos suspendidos en la columna de agua, evaluados por su composición, densidad y biomasa.
- Zooplancton: pequeños organismos heterótrofos de vida libre, fundamentales en las cadenas tróficas acuáticas.
- Perifiton: comunidad biológica adherida a sustratos sumergidos, utilizada como indicador sensible de cambios en la calidad del agua.
- Macroinvertebrados bentónicos: organismos asociados al sedimento del fondo, utilizados como indicadores del estado trófico y de perturbaciones antrópicas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas: cuya presencia y diversidad permite inferencias sobre la estructura del hábitat y las condiciones físico-químicas locales.
- Ictiofauna: peces presentes en el ecosistema, evaluados por su diversidad, abundancia, biomasa y composición específica.

En el informe de actividades de Interventoría No. 2, en el Anexo 10, se presentaron los resultados, tanto del contratista de obra como de la interventoría, obtenidos para los componentes evaluados: fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos, macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas e ictiofauna. Dicho informe contiene información detallada sobre la composición, abundancia y distribución de estos grupos en los dos cuerpos de agua objeto de estudio: el embalse El Guájaro y la laguna de Luruaco. Estos resultados permiten analizar el estado ecológico actual de ambos ecosistemas acuáticos.

Segundo Monitoreo Hidrobiológico:

El día 16 de mayo de 2025, el Contratista de obra (Consorcio Alianza Ambiental), realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos. Las muestras se realizaron tanto en la Laguna de Luruaco, como en la Zona baja del Embalse El Guájaro. Actualmente, El laboratorio SOLRA Ingeniería se encuentra en proceso de análisis de las muestras tomadas para establecer y analizar los parámetros requeridos.

Tercer Monitoreo Hidrobiológico:

El día 30 de julio de 2025, el Contratista de obra (Consorcio Alianza Ambiental), realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos. Las muestras se realizaron tanto en la Laguna de Luruaco, como en la Zona baja del Embalse El Guájaro. Actualmente, El laboratorio SOLRA Ingeniería se encuentra en proceso de análisis de las muestras tomadas para establecer y analizar los parámetros requeridos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.4.4. Monitoreo Biológico-pesquero

Durante el periodo comprendido entre el 07 de julio y el 06 de agosto de 2025, en el marco de las actividades programadas dentro del componente de seguimiento ambiental, se ejecutó el Monitoreo Biológico – Pesquero en los cuerpos de agua del Embalse El Guájaro (zona baja) y la Laguna de Luruaco.

La actividad consistió en el registro y análisis de las especies ícticas presentes en estos ecosistemas, tomando como base las faenas de pesca realizadas por pescadores locales mediante métodos de pesca artesanal debidamente autorizados. Este enfoque participativo permitió obtener información representativa y actualizada sobre el recurso pesquero, complementada con la aplicación de encuestas estructuradas y la recolección directa de datos en campo.

Las capturas obtenidas fueron utilizadas como insumo para la identificación taxonómica de las especies y la determinación de parámetros biométricos tales como longitud, peso y talla. De manera adicional, se evaluó el estado reproductivo de los especímenes y se analizaron aspectos ecológicos relevantes, en concordancia con los objetivos establecidos para el monitoreo.
El propósito central de esta actividad fue generar información técnica sobre la composición íctica de los sistemas lénticos monitoreados, proporcionando datos fundamentales para la formulación de estrategias de manejo y conservación de los recursos pesqueros. Asimismo, los resultados obtenidos aportan insumos para el análisis de posibles impactos ambientales que pudieran estar incidiendo sobre estas comunidades biológicas.

La información detallada del seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de julio y el 06 de agosto de 2025, se encuentra consignada en el Anexo No. 10.

6.5. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA

A corte del 06 de julio de 2025, se realizaron los siguientes pagos al contratista de obra Consorcio Alianza Ambiental:

Acta	Periodo	Valor
Acta No. 1	07-03-2025 a 06-04-2025	$1.094.325.094,22
Acta No. 2	07-04-2025 a 06-05-2025	$903.189.127,00
Acta No. 3	07-05-2025 a 06-06-2025	$1.049.881.663,00

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

7 CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 7 de julio y el 6 de agosto de 2025, la interventoría, Consorcio Luruaco, llevó a cabo el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio Alianza Ambiental, en concordancia con la programación de obra aprobada. Como resultado de esta labor de supervisión, se evidenció un avance físico acumulado del 78,16%, correspondiente a la ejecución de actividades contempladas dentro del cronograma de obra, el cual fue actualizado conforme a lo establecido en el Otrosí No. 1 del 07 de julio de 2025.

En cuanto al desarrollo de las actividades constructivas, se continuó con el retiro y disposición final de residuos derivados de las labores de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo del Caño El Porvenir, los cuales fueron dispuestos en la Cantera Maná, sitio autorizado por la CRA. Así mismo, durante este periodo se dio inicio a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedras, incluido mediante el Otrosí No. 1, donde se realizó la intervención comprendida entre las abscisas K1+100 y K0+700. Estas labores fueron ejecutadas mediante la operación de una retroexcavadora CAT 320C, acopiando temporalmente el material removido en los laterales del cauce para su posterior disposición en sitio autorizado.

En el componente ambiental, el día 04 de agosto de 2025 se efectuaron muestreos puntuales de agua en la Laguna de Luruaco y el Embalse El Guájaro, recolectándose un total de tres muestras por cada cuerpo de agua. El objetivo de estas actividades fue monitorear los parámetros de calidad del recurso hídrico y verificar su cumplimiento conforme a la normatividad vigente. El análisis físico-químico y microbiológico de las muestras tomadas por el contratista será realizado por el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., mientras que las muestras recolectadas por la interventoría serán analizadas por el Laboratorio LABORMAR, acreditado por el IDEAM.

En lo relacionado con el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría adelantó visitas de campo con el fin de verificar la implementación efectiva de las medidas establecidas por el contratista. Durante estas inspecciones se constató la ejecución de charlas preventivas en riesgos laborales, el diligenciamiento de formatos de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y de controles preoperacionales para maquinaria y equipos, así como el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal operativo.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), constatándose la ejecución de acciones encaminadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

las actividades constructivas. Entre las medidas observadas se destacan: la señalización adecuada en las zonas intervenidas, el manejo y disposición correcta de residuos sólidos, y la ejecución de charlas ambientales orientadas a la protección de los cuerpos de agua y a la conservación de la cobertura vegetal no intervenida. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad ambiental, en coherencia con los lineamientos del PMA y el desarrollo sostenible del proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

8 ANEXOS

ANEXO 1: ACTAS DE COMITÉ SEMANALES
ANEXO 2: INFORMES SEMANALES
ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 4: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
ANEXO 5: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
ANEXO 6: SEGUIMIENTO SST
ANEXO 7: SEGUIMIENTO SOCIAL
ANEXO 8: SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ANEXO 9: INFORME CALIDAD DE AGUAS
ANEXO 10: INFORME MONITOREO BIOLÓGICO PESQUERO
ANEXO 11: BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 12: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA
ANEXO 13: PLANOS Y CARTERAS TOPOGRÁFICAS
ANEXO 14. CERTIFICADO Y REGISTROS DE DISPOSICIÓN FINAL

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ SEMANALES

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

CONSORCIO LURUACO

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	018
FECHA:	11/07/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Controles topográficos	Contratista - Interventoría	11-07-25

CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO <<COMITÉ DE OBRA>>	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que se presenta daño mecánico en la retroexcavadora Volvo 210, por lo que se suspenden las actividades de limpieza en el frente Caño El Porvenir mientras realizan los arreglos respectivos.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
Se realizó de forma conjunta controles topográficos de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+520 hasta la K0+440.
El contratista informa que continúa con retiro y disposición final en el frente Caño El Porvenir municipio de Repelón, realizado con cuatro (4) volquetas doble troques de 14m3 hacia la Cantera Maná autorizada por la CRA mediante retroexcavadora VOLVO 240.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 51,32%
Ejecutado 66,24%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos	Contratista	18-07-25

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 18/07/2025.

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

CONSORCIO LURUACO

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	019
FECHA:	18/07/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO

CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO <<COMITÉ DE OBRA>>	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que fue revisada la retroexcavadora Volvo 210 por los mecánicos, los cuales manifiestan que presenta daño en la bomba de inyección y que serán solicitados los repuestos.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4-5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 54,49%
Ejecutado 68,72%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Retiro y disposición de residuos Caño El Porvenir	Contratista	24-07-25

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 25/07/2025.

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

CONSORCIO LURUACO

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	020
FECHA:	25/07/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Retiro y disposición final de residuos Caño El Porvenir	Contratista	24-07-25

CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO <<COMITÉ DE OBRA>>	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que realizó el pedido de los repuestos para la retroexcavadora Volvo 210, estando a la espera de la llegada de los mismos.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 57,31%
Ejecutado 71,50%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Retiro y disposición final de residuos Caño El Porvenir	Contratista	31-07-25
Monitoreo hidrobiológico	Contratista	31-07-25

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 1/08/2025.

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

CONSORCIO LURUACO

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	021
FECHA:	1/08/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Retiro y disposición final de residuos Caño El Porvenir	Contratista	31-07-25
Monitoreo hidrobiológico	Contratista	30-07-25

CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO <<COMITÉ DE OBRA>>	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista realizó la movilización de una retroexcavadora CAT 320C hacia el frente de obra de Arroyo de Piedras en el Municipio de Luruaco.
El contratista informa que inicia con la limpieza en el frente de Arroyo de Piedra municipio de Luruaco del K1+040 al K0+900 mediante retroexcavadora CAT 320C.
El contratista realiza el 30 de julio la 3era jornada de monitoreo hidrobiológico en el Embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco en conjunto con el laboratorio SOLRA, encargado de emitir los reportes respectivos.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 60,06%
Ejecutado 74,56%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos	Contratista	8-08-25

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 8/08/2025.

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	11 DE JULIO DE 2025	PERIODO No.	18	DEL	4/07/2025	AL	10/07/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 51,02%	PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 51,02%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 142.475.279,94	VALOR PAGADO:	$ 1.997.424.221,20
VALOR POR PAGAR:	$ 394.524.720,06	VALOR POR PAGAR:	$ 4.201.157.824,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.181.193.489,01	51,32%	14,92%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 4.105.940.746,77	66,24%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	11 DE JULIO DE 2025	PERIODO No.	18	DEL	4/07/2025	AL	10/07/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión e inspección de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 4 de julio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+520 hasta la K0+480 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. Continua las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 5 de julio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+480 hasta la K0+440 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron controles topográficos de forma conjunta de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+520 hasta la K0+440.

Domingo 6 de julio. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 7 de julio. Se presenta daño de la retroexcavadora Volvo 210 se suspenden las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir. El contratista notificó que realizará las actividades de revisión y mantenimiento para reintegrar el equipo nuevamente a las actividades de limpieza. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 476m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 8 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 490m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 9 de julio.La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 490m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 10 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 66,24%, superando el avance programado en un 14,92% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CARGUE DE SEDIMENTOS


CARGUE DE SEDIMENTOS


CARGUE DE SEDIMENTOS


DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR


DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR


DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	18 DE JULIO DE 2025	PERIODO No.	18	DEL	11/07/2025	AL	17/07/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	132 EQUIVALE AL 53,88%	PLAZO TRANSCURRIDO:	132 EQUIVALE AL 53,88%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 142.475.279,94	VALOR PAGADO:	$ 1.997.424.221,20
VALOR POR PAGAR:	$ 394.524.720,06	VALOR POR PAGAR:	$ 4.201.157.824,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.377.738.548,83	54,49%	14,23%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 4.259.665.581,50	68,72%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	18 DE JULIO DE 2025	PERIODO No.	18	DEL	11/07/2025	AL	17/07/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión e inspección de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 11 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 12 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 406m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 13 de julio. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 14 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 476m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 15 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 16 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 17 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 68,72%, superando el avance programado en un 14,23% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CARGUE DE SEDIMENTOS



CARGUE DE SEDIMENTOS



CARGUE DE SEDIMENTOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR

DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	25 DE JULIO DE 2025	PERIODO No.	20	DEL	18/07/2025	AL	24/07/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	139 EQUIVALE AL 56,73%	PLAZO TRANSCURRIDO:	139 EQUIVALE AL 56,73%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 142.475.279,94	VALOR PAGADO:	$ 1.997.424.221,20
VALOR POR PAGAR:	$ 394.524.720,06	VALOR POR PAGAR:	$ 4.201.157.824,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.552.368.305,01	57,31%	14,19%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 4.431.986.162,35	71,50%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	25 DE JULIO DE 2025	PERIODO No.	20	DEL	18/07/2025	AL	24/07/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión e inspección de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 18 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 19 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 20 de julio. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 21 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 588m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 22 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 588m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 23 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 24 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 71,5%, superando el avance programado en un 14,19% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CARGUE DE SEDIMENTOS



CARGUE DE SEDIMENTOS



CARGUE DE SEDIMENTOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

CONSORCIO LURUACO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Versión 001	
Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	1 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	21	DEL	25/07/2025	AL	31/07/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	146 EQUIVALE AL 59,59%	PLAZO TRANSCURRIDO:	146 EQUIVALE AL 59,59%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 142.475.279,94	VALOR PAGADO:	$ 1.997.424.221,20
VALOR POR PAGAR:	$ 394.524.720,06	VALOR POR PAGAR:	$ 4.201.157.824,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.722.856.013,15	60,06%	14,50%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 4.621.662.772,94	74,56%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	1 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	21	DEL	25/07/2025	AL	31/07/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión e inspección de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 25 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. El contratista realizó la movilización de una retroexcavadora CAT 320C hacia el frente de obra de Arroyo de Piedras en el Municipio de Luruaco.

Sábado 26 de julio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos con retroexcavadora Volvo 240 en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 27 de julio. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 28 de julio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de trabajo del Arroyo de Piedra desde la abscisa

Martes 29 de julio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de trabajo del Arroyo de Piedra desde la abscisa K1+040 al K0+980 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 30 de julio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de trabajo del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+980 al K0+940 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 588m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 31 de julio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de trabajo del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+940 al K0+900 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 74,56%, superando el avance programado en un 14,50% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como el inicio de las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


MOVILIZACIÓN RETROEXCAVADORA CAT 320C FRENTE ARROYO PIEDRA


MOVILIZACIÓN RETROEXCAVADORA CAT 320C FRENTE ARROYO PIEDRA


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K1+100 A K0+900


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K1+100 A K0+900


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K1+100 A K0+900


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K1+100 A K0+900


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K1+100 A K0+900


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K1+100 A K0+900

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

ANEXO 3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA – FRENTE CAÑO EL PORVENIR





Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.





Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.





Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.

ESTADO INICIAL FRENTE ARROYO DE PIEDRAS, PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO




K0+000 a K0+480




K0+480 a K0+900




K0+900 a K1+100

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS FRENTE ARROYO DE PIEDRAS





Movilización retroexcavadora CAT 320C

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PARA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y, FRENTE ARROYO DE PIEDRAS, LURUACO





Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K1+100





Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K1+100 a K0+900




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K1+100 a K0+900




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs. K0+900




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K1+100 a K0+900




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K1+100 a K0+900




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+900 a K0+700




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+900 a K0+700




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs. K0+900 a K0+700




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs. K0+900 a K0+700




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+900 a K0+700

ACTIVIDADES DE CONTROLES TOPOGRÁFICOS





Controles topográficos frente Arroyo de Piedras.

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 08:36:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79124973

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 11/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL 01		
Documento	NI901893943	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	6	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1091662627	JASNEY MOTTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.714.284	$ 754.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.714.284	$ 188.600	6,960	$ 4.714.284	$ 328.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 4.714.284	$ 188.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.459.700
CC 1118848009	JUAN MIGUEL HERNANDEZ RANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 22598664	ROSA MARINA CASTRO AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 56067903	KELLYS YOHANA FLOREZ ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.000	$ 307.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.920.000	$ 76.800	6,960	$ 1.920.000	$ 133.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500
CC 72226272	WALTER ANTONIO BARBOSA ORTEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.657.142	$ 905.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 5.657.142	$ 226.300	6,960	$ 5.657.142	$ 393.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.657.142	$ 226.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.751.600
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.252.750	$ 1.573.100	(EPS010) EPS SURA	$ 9.252.750	$ 370.200	6,960	$ 9.252.750	$ 644.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 9.252.750	$ 370.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.957.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 24.391.176	$ 24.391.176	$ 24.391.176	$ 24.391.176	$ 3.995.400	$ 975.900	$ 1.697.900	$ 975.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.645.100	$ 5.500	$ 7.650.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 08:16:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79146857

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 14/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL02		
Documento	NI901896859	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	9	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002095293	YESICA PAOLA PINO CORONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1004353345	OSMAN DAVID ARAGON POLO	01	00				X													0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.582.858	$ 573.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.582.858	$ 143.400	6,960	$ 3.582.858	$ 249.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 3.582.858	$ 143.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.109.500
CC 1043871767	SANDRA MARCELAADARRAGA FONTALVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.250.000	$ 360.000	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 2.250.000	$ 90.000	6,960	$ 2.250.000	$ 156.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 1118848009	JUAN MIGUEL HERNANDEZ RANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1123997747	GILARI ODETTE ROMERO CELEDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1129524877	HUMBERTO CARLOS MALDONADO AREVALO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.500.000	$ 1.105.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 6.500.000	$ 260.000	6,960	$ 6.500.000	$ 452.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.077.400
CC 72302363	RAFAEL GUILLERMO RUBIO JIMENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 85476492	DARIO VEGA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.657.142	$ 905.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.657.142	$ 226.300	6,960	$ 5.657.142	$ 393.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.657.142	$ 226.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.751.600
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.252.750	$ 1.573.100	(EPS010) EPS SURA	$ 9.252.750	$ 370.200	6,960	$ 9.252.750	$ 644.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 9.252.750	$ 370.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.957.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 32.936.750	$ 32.936.750	$ 32.936.750	$ 32.936.750	$ 5.427.800	$ 1.317.900	$ 2.292.600	$ 1.317.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.356.200	$ 0	$ 10.356.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CUESTECITEROS PROFESIONALES**, identificada con **NI** número **901081028**, aportó por **JOSE RODRIGO AVILA ARENAS**, identificado(a) con **CC** número **19360273** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **87573843** para el periodo de salud **2025-07** y pensiones **2025-06** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF30	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	1	1															0		30	$1.423.500	Junio - 2025	87573843	10/07/2025	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	1															0		30	$1.423.500	Julio - 2025	87573843	10/07/2025	S
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	1															0		30	$1.423.500	Junio - 2025	87573843	10/07/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 08:38:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78935306

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 04/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MACROEQUIPOS LAND SAS	**Nombre Sucursal**	EQUIPOS	**Código Sucursal**	OP001
Documento	NI901301115	**Dirección**	CRV 22 #1 - 22 METROPARQUE BOD M1 - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008		
Total Afiliados	31	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1038097776	LUIS GUILLERMO TRESPALACIOS ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.010.000	$ 321.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.010.000	$ 80.400	6,960	$ 2.010.000	$ 139.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.010.000	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 1043004442	ANTONIO LUIS CABARCAS MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.740.000	$ 438.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.740.000	$ 109.600	6,960	$ 2.740.000	$ 190.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.740.000	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.400
CC 1043017263	CESAR ANTONIO CABARCAS MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.740.000	$ 438.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.740.000	$ 109.600	6,960	$ 2.740.000	$ 190.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.740.000	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.400
CC 1045235310	JESUS ALBERTO JULIO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.420.000	$ 387.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.420.000	$ 96.800	6,960	$ 2.420.000	$ 168.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.420.000	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.300
CC 11075728	DOMINGO EMIGDIO GONZALEZ ALEAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.110.000	$ 337.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.110.000	$ 84.400	6,960	$ 2.110.000	$ 146.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.110.000	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.300
CC 1129484952	LUIS CARLOS SAJONA ALVARADO	01	00	x																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 366.667	$ 58.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 1129571834	YANCARLOSCARMONA WALTERO	01	00	x																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 513.333	$ 82.200	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 513.333	$ 20.600	6,960	$ 513.333	$ 35.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 513.333	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.200
CC 1143381261	JEIDERALBERTOAYOLA ORTEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.010.000	$ 321.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.010.000	$ 80.400	6,960	$ 2.010.000	$ 139.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.010.000	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 1234888624	HUMBERTO JUNIOR ESCORCIA VELASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 17952061	JOSE LUIS VILORIA USTARIS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.560.000	$ 409.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.560.000	$ 102.400	6,960	$ 2.560.000	$ 178.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.560.000	$ 102.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.600
CC 3738929	ROBINSON FARITH GOENAGA GOENAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 3821255	JHON CARLOS TROCONIS GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72014572	ALVARO ENRIQUE SILVERA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.620.000	$ 419.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.620.000	$ 104.800	6,960	$ 2.620.000	$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.620.000	$ 104.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.200
CC 72144924	OSCAR DE JESUS PAREDES DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.640.000	$ 422.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.640.000	$ 105.600	6,960	$ 2.640.000	$ 183.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.640.000	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 817.400
CC 72154403	EDGAR JOSE GARCIA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.620.000	$ 419.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.620.000	$ 104.800	6,960	$ 2.620.000	$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.620.000	$ 104.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.200
CC 72157900	ROBERTO CARLOS ROMERO FELIZZOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.110.000	$ 337.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.110.000	$ 84.400	6,960	$ 2.110.000	$ 146.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.110.000	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.300
CC 72166813	LUIS EDUARDO MIZZAR MEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 72193076	DAVID GOMEZ ARRIETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/07/2025 **Empresa NI901301115 MACROEQUIPOS LAND SAS** **Planilla Nro: 78935306** **Periodo Cotización: junio de 2025** **Periodo Servicio: julio de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72238056	FREDDYS ARMANDO VALDEZ ESCORCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 72239235	VICTOR MANUEL DIAZ ZABALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 72241348	HICLES ABEL BALLESTEROS SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72244084	GASPAR ARAEL CALVO HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.620.000	$ 419.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.620.000	$ 104.800	6,960	$ 2.620.000	$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.620.000	$ 104.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.200
CC 72244085	JOSE DARIO MORENO QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.870.000	$ 459.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.870.000	$ 114.800	6,960	$ 2.870.000	$ 199.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.870.000	$ 114.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 888.600
CC 72308083	RUBEN LEONIDAS MORENO QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.440.000	$ 390.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.440.000	$ 97.600	6,960	$ 2.440.000	$ 169.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.440.000	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500
CC 8521048	DANIEL OLMOS LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 8568575	MARIO ALBERTO OROZCO BUSTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.635.200	$ 261.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.635.200	$ 65.500	6,960	$ 1.635.200	$ 113.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.635.200	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.600
CC 8729191	LUIS CARLOS MOLINA BROCHERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.050.000	$ 488.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.050.000	$ 122.000	6,960	$ 3.050.000	$ 212.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 3.050.000	$ 122.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944.300
CC 8742576	LUIS ALBERTO CHING CACERES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.110.000	$ 337.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.110.000	$ 84.400	6,960	$ 2.110.000	$ 146.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.110.000	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.300
CC 8801858	JANER ANTONIO VERGARA MEZA	01	00																	0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.876.000	$ 300.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.876.000	$ 75.100	6,960	$ 1.876.000	$ 130.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.876.000	$ 75.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.000
CC 8801858	JANER ANTONIO VERGARA MEZA	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 134.001	$ 21.500	(EPS010) EPS SURA	$ 134.001	$ 5.400	0,000	$ 134.001	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.900
CC 92250208	JADER JOSE VITAL ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 62.395.701	$ 62.395.701	$ 62.395.701	$ 62.261.700	$ 9.983.700	$ 2.496.300	$ 4.335.000	$ 2.490.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.305.900	$ 0	$ 19.305.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 08:37:20 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78554224

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 11/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL 01		
Documento	NI901893943	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1043028148	MARIANELA TORREGROZA CHARRIS	59	00																0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes IC BF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 500	$ 505.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 06 de agosto de 2025 10:02:18 AM

Período del informe: 202506

Pagada 18/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM	**Sucursal**	OP025 PATIO TALLER
Documento	NI830509276	**Dirección**	METROPARQUE BODM1-24
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3288603
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC72162008

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1140885236	GONZALEZ LOPEZ SONIA CAROLINA	79249531	18/07/2025	202506	202507																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-25	CCF07	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$336.000	$84.000	$146.200	$84.000	$0	$0	$0	$0	$650.200
CC 1042351345	CONRADO GOMEZ JAVIER ENRIQUE	79249079	18/07/2025	202506	202507																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-25	CCF07	$4.550.000	$4.550.000	$4.550.000	$4.550.000	$728.000	$182.000	$316.700	$182.000	$0	$0	$0	$0	$1.408.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 08:48:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79249327

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 18/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM	**Nombre Sucursal**	OFICINAS BQUILLA	**Código Sucursal**	AD001
Documento	NI830509276	**Dirección**	METROPARQUE BODM1-24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3288603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008		
Total Afiliados	19	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001916710	NICOLL VALENTINA HERNANDEZ ECHEVERRIA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.281.150	$ 51.300	0,522	$ 1.281.150	$ 6.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.300
CC 1001916710	NICOLL VALENTINA HERNANDEZ ECHEVERRIA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 5.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.700
CC 1001916710	NICOLL VALENTINA HERNANDEZ ECHEVERRIA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.901	$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 94.901	$ 3.800	0,000	$ 94.901	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1042416143	GUSELLA MARIA ACUÑA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1043876298	ANGELCA PATRICIA FONTALVO VIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(ESSC07) ASOCIAC ON MUTUAL SER	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1045169204	SANDRA MARCELA CERVANTES CERVANTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.650.000	$ 424.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.650.000	$ 106.000	0,522	$ 2.650.000	$ 13.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.650.000	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900
CC 1045671229	BELKYS HURTADO SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECC ON	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 9.000.000	$ 360.000	6,960	$ 9.000.000	$ 626.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.876.400
CC 1045739162	YURANS MARCELA PINO PATERNINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.250.000	$ 680.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.250.000	$ 170.000	0,522	$ 4.250.000	$ 22.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 4.250.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.042.200
CC 1140838364	WALDIR ALBERTO MARTINEZ CHARRIS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.700.000	$ 592.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.700.000	$ 148.000	6,960	$ 3.700.000	$ 257.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 3.700.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.145.600
CC 1143427829	CINDY PAOLA DOMINGUEZ SABALLETH	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.658.333	$ 425.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.658.333	$ 106.400	0,522	$ 2.658.333	$ 13.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.658.333	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.100
CC 1143427829	CINDY PAOLA DOMINGUEZ SABALLETH	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 91.667	$ 14.700	(EPS010) EPS SURA	$ 91.667	$ 3.700	0,000	$ 91.667	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 91.667	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.100
CC 22461193	DIANA LUZ NIEBLES ECHEVERRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.830.000	$ 991.200	(EPS010) EPS SURA	$ 5.830.000	$ 233.200	0,522	$ 5.830.000	$ 30.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.830.000	$ 233.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.488.100
CC 22550173	CANDELARIA RICARDO VIBANQUES	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.850.000	$ 296.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.850.000	$ 74.000	0,522	$ 1.850.000	$ 9.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.700
CC 22550173	CANDELARIA RICARDO VIBANQUES	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.850.000	$ 296.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.850.000	$ 74.000	0,000	$ 1.850.000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000
CC 32701676	LUCILA DEL CARMEN BROCHERO FIGUEROA	01	04																	0	0	27	27	27	(NIN-AF) NINGUNAAFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.440.000	$ 57.600	6,960	$ 1.440.000	$ 100.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.440.000	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 32701676	LUCILA DEL CARMEN BROCHERO FIGUEROA	01	04											X						0	0	1	1	1	(NIN-AF) NINGUNAAFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 53.334	$ 2.200	0,000	$ 53.334	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200
CC 32701676	LUCILA DEL CARMEN BROCHERO FIGUEROA	01	04											X						0	0	2	2	2	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 106.668	$ 4.300	0,000	$ 106.668	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300
CC 32701757	ASTRID DEL SOCORRO DONADO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.400
CC 32723098	ALBA LUCIA FANDIÑO RIVERA	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/07/2025 **Empresa NI830509276 TICOM** **Planilla Nro: 79249327** **Periodo Cotización: junio de 2025** **Periodo Servicio: julio de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32837060	ZULEIMA ROSA SOTO ORTEGA	01	00																	0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 420.000	$ 67.200	(EPS010) EPS SURA	$ 420.000	$ 16.800	0,522	$ 420.000	$ 2.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 420.000	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 32837060	ZULEIMA ROSA SOTO ORTEGA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 60.001	$ 9.700	(EPS010) EPS SURA	$ 60.001	$ 2.500	0,000	$ 60.001	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200
CC 32837060	ZULEIMA ROSA SOTO ORTEGA	01	00													X				0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.320.000	$ 211.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.320.000	$ 52.800	0,000	$ 1.320.000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.320.000	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800
CC 37745739	ESTHER YULIANA NIETO GONZALEZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 71531562	DIEGO LUIS POSADA BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.900.000	$ 1.343.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.900.000	$ 316.000	6,960	$ 7.900.000	$ 549.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 7.900.000	$ 316.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.524.900
CC 72162008	JOSE MARIA VECINO VILLARREAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.630.000	$ 1.297.200	(EPS010) EPS SURA	$ 7.630.000	$ 305.200	6,960	$ 7.630.000	$ 531.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 7.630.000	$ 305.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.438.700
CC 73114696	INGLEBERTO HERNANDEZ JARRIS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 7595737	PROSPERO GONZALEZ DE LA CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.520.205	$ 243.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.520.205	$ 60.900	6,960	$ 1.520.205	$ 105.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.520.205	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 65.453.707	$ 68.477.209	$ 68.477.209	$ 68.114.855	$ 10.774.800	$ 2.737.700	$ 2.856.000	$ 2.724.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.093.400	$ 12.500	$ 19.105.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO LURUACO

ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901819	1	CONSORCIO LURUACO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 65-24 OFICINA 330	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7819817	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	90428548	9490428548	E	2025/08/06	2025/08/20	BANCO AV VILLAS	14	$3,882,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600
Centro de Trabajo: REPELON (4 Afiliados)																							$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																							$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600
1	CC	72008065	ARELLANA IVAN																		23100 1	30	$2,352,000	$376,400	EPS005	30	$2,352,000	$94,100	CCF06	30	$2,352,000	$94,100	14-11	30	$2,352,000	6.960%	$163,700	30	$0	$0	Si	$728,300
2	CC	1143443933	CONTRERAS MARIA																		23100 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF06	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
3	CC	10766786	LEPESQUEUR ALFREDO																		23030 1	30	$3,625,000	$580,000	EPS002	30	$3,625,000	$145,000	CCF06	30	$3,625,000	$145,000	14-11	30	$3,625,000	6.960%	$252,300	30	$0	$0	Si	$1,122,300
4	CC	85458051	PEREZ RICARDO																		23030 1	30	$4,150,000	$664,000	EPS037	30	$4,150,000	$166,000	CCF06	30	$4,150,000	$166,000	14-11	30	$4,150,000	6.960%	$288,900	30	$0	$0	Si	$1,284,900
Total			**Afiliados(4)**																				$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901819	1	CONSORCIO LURUACO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 65-24 OFICINA 330	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7819817	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	90428548	9490428548	E	2025/08/06	2025/08/20	BANCO AV VILLAS	14	$3,882,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,988,400	$17,700	$0	$2,006,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$744,400	$6,600	$0	$751,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,244,000	$11,100	$0	$1,255,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$865,000	$7,700	$0	$872,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$865,000	$7,700	$0	$872,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$497,100	$4,500	$0	$501,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$497,100	$4,500	$0	$501,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$497,100	$4,600	$0	$501,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000	$900	$0	$92,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$166,000	$1,500	$0	$167,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$1,300	$0	$146,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$94,100	$900	$0	$95,000
TOTAL				**4**	**$3,847,600**	**$34,500**	**$0**	**$3,882,100**

CONSORCIO LURUACO

ANEXO 6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

CONSORCIO LURUACO	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST	CONSORCIO LURUACO	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 12/07/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 07 De JULIO AL 12 DEJULIO 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Flórez

CC:

Firma del Inspector HSE _____

Fecha: 12 /07 /2025

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Se evidencia seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte del Consorcio Alianza Ambiental, evidenciandose el compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores; se evidenció el uso adecuado de EPP, y entrega de epp, elaboración y diligenciamientos de formatos preoperacionales, AST, así como las actividades de formación y prevención a los trabajadores.

CONSORCIO LURUACO	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST	CONSORCIO LURUACO	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 19/07/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 14 De JULIO AL 19 DEJULIO 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Florez

CC:

Firma del Inspector HSE

Fecha: 19/07/2025

}

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental demuestra un compromiso sólido con la seguridad y salud de sus trabajadores mediante la implementación efectiva de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Algunas de las prácticas destacadas incluyen:
- Uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP)
- Elaboración y diligenciamiento de formatos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
- Actividades de formación y prevención para los trabajadores asi evitando accidentes e incidentes de trabajo
Estas acciones sugieren que el Consorcio prioriza la seguridad y bienestar de su personal, lo que puede tener un impacto positivo en la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

CONSORCIO LURUACO	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST	CONSORCIO LURUACO	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 26/07/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 21 De JULIO AL 26 DEJULIO 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Flores

CC:

Firma del Inspector HSE

Fecha: ***26 /07 /2025***

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental muestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud laboral al implementar un sistema de gestión integral. Entre las prácticas destacadas se encuentran:

- Uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP)
- Documentación precisa de procedimientos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
- Capacitación y concientización continua para los trabajadores

Estas acciones reflejan la prioridad que otorga el Consorcio a la protección de sus empleados, lo que puede contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable.

CONSORCIO LURUACO	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST	CONSORCIO LURUACO	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 2/08/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 28 De JULIO AL 2 DE AGOSTO 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Flores

CC:

Firma del Inspector HSE

Fecha: 2 /08 /2025

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental muestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud laboral al implementar un sistema de gestión integral. Entre las prácticas destacadas se encuentran:

Uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP)

Documentación precisa de procedimientos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

Capacitación y concientización continua para los trabajadores

Estas acciones reflejan la prioridad que otorga el Consorcio a la protección de sus empleados, lo que puede contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable.

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL	**INFORME MENSUAL No. 05**

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MENSUAL DE OBRA No. 5

DEL 07 JULIO DE 2025 AL 06 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 492 DE 2024:

“REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÒN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Contratista:

CONSORCIO ALINZA AMBIENTAL.

Interventoría:

CONSORCIO LURUACO

Contratante:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTTICO - C.R.A

Supervisor:

Arq. Wladimir Orozco

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 3
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 3
2.1. Localización General 3
2.2. Localización Especifica 4
3. ADECUACION DE AREAS 6
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 6
4.1. INDUCCION AL PERSONAL 6
4.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 12
5. PERMISOS DE TRABAJO GENERAL 13
5.1. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO 13
6. INSPECCIONES PLANEADAS 14
7. REPORTE Y ESTADISTICAS 21
8. CONCLUSIONES 24

1. OBJETIVOS

Establecer los requerimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como complemento para las actividades de mejoramiento del contrato de obra "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DEL LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". En procesos, permitiendo desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes, permitiendo incrementar la salud física, mental, social del trabajador y conservación del medio ambiente.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. Localización General

El proyecto se encuentra localizado en el departamento del Atlántico, en los municipios de Luruaco, Repelón y Manatí.



Ilustración 1. Localización general del proyecto

2.2. Localización Específica

El proyecto comprende de manera específica a los arroyos Negro y Limón en el municipio de Luruaco. El caño de Villa Rosa, corregimiento de Villa Rosa, municipio de Repelón y el caño El Porvenir, corregimiento de El Porvenir (Las Compuertas), municipio de Manatí.

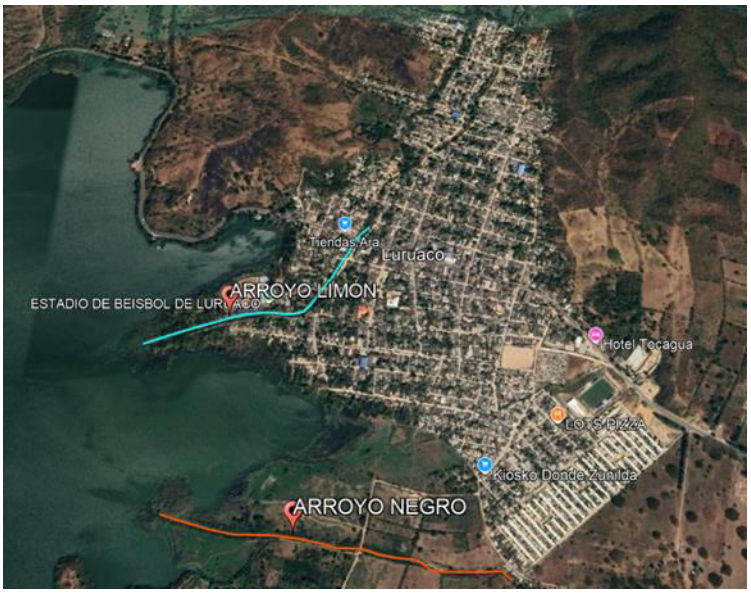


Ilustración 2. Localización arroyo Negro y arroyo Limón, municipio de Luruaco.



Ilustración 3. Localización caño de Villa Rosa, Corregimiento de Villa Rosa, Repelón y caño El Porvenir, Corregimiento de El Porvenir (Las Compuertas), Manatí

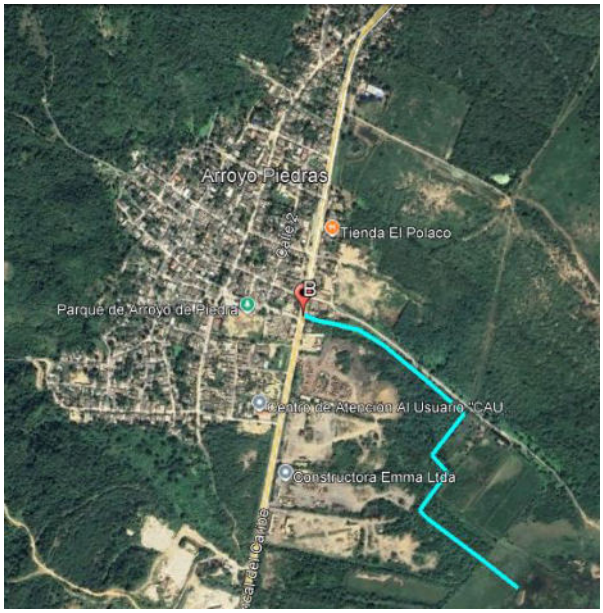


Ilustración 4. Localización arroyo de Piedras, Corregimiento de Arroyo de Piedra, Municipio de Luruaco.

3. ADECUACION DE AREAS

Se instalo el punto adecuación en el campamento temporal de la obra en el frente que se está interviniendo del caño porvenir, en el cual se instaló un kit de emergencia (botiquín, extintor y camilla), un kit antiderrame y un punto ecológico acorde a las necesidades de la obra.

Se cuenta con punto de hidratación para el personal



Ilustración 4. Campamento temporal

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo 07 julio del 2025 al 06 de agosto del 2025, se realizaron las siguientes actividades en pro del bienestar laboral y manteniendo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

4.1. INDUCCION AL PERSONAL

Durante el periodo del 07 julio del 2025 al 06 de agosto del 2025, se realizaron 2 inducciones de mano de obra calificada.

Tabla 1. Listado de inducciones

Nombre Completo	Cedula	Genero	Cargo	Ciudad	Tipo de mano de obra	Fecha de ingreso
WaldirMartinez	1140838364	M	Conducto de volqueta SON 779	Barranquilla	MOC	15/07/2025
Diego Posada	71531562	M	Operador Retroexcavadora CAT320C1	Barranquilla	MOC	28/07/2025

4.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo del 07 julio al 06 de agosto del 2025, se dictaron las charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental, con la participación de todos los trabajadores directos y subcontratista, generando la cultura de autocuidado y concienciación en la prevención ambiental.
Se da cumplimiento al cronograma de charlas y capacitación establecido dentro de las instalaciones del campamento a todo el personal, con el objetivo en la prevención de accidentes labores y enfermedades derivadas de sus actividades fortaleciendo las costumbres, hábitos y la cultura de seguridad en la ejecución de la obra. Donde recordamos el autocuidado y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, temas ambientales y sociales.

Se dictaron un total de 25 charlas y 2 capacitaciones a todo el personal.

Tabla 2. Listado de charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo

CHARLAS		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
7/07/2025	Identificación de animales venenosos en campo	Sonia Gonzalez
8/07/2025	Uso de la camilla	Kelly Florez
9/07/2025	Primeros auxilios	Kelly Florez
10/07/2025	Control de material particulado	Sonia Gonzalez
11/07/2025	Comité y sus funciones - COPASTT y CCL	Kelly Florez
12/07/2025	Porque es importante monitorear la calidad del agua	Sonia Gonzalez
14/07/2025	Beneficios de los suelos	Sonia Gonzalez
15/07/2025	Autoreportes de actos y condiciones inseguras	Kelly Florez
17/07/2025	La importancia del ATS	Kelly Florez
18/07/2025	Importancia del uso de los protectores auditivos	Kelly Florez
19/07/2025	divulgación de señales de transito	Kelly Florez
21/07/2025	Que es un vertimiento	Sonia Gonzalez
22/07/2025	como cuidar mis 5 sentidos	Kelly Florez
24/07/2025	Herramientas necesarias para la manipulación de fauna silvestre	Sonia Gonzalez
25/07/2025	Agotamiento físico por condiciones climáticas	Kelly Florez
26/07/2025	Prevención lesiones en la columna	Kelly Florez
28/07/2025	Riesgos ergonomicos	Kelly Florez
29/07/2025	Cuidados al momento de derrumbar un árbol	Sonia Gonzalez
30/07/2025	Salud publica	Kelly Florez
31/07/2025	Como identificar un AT	Kelly Florez
1/08/2025	Como prevenir los daños en la vegetación	Sonia Gonzalez
2/08/2025	Autocuidado	Kelly Florez
4/08/2025	PolÍticas de seguridad	Kelly Florez
5/08/2025	Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra	Kelly Florez
6/08/2025	Manejo y prevención del estrés en el trabajo	Kelly Florez

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL	**INFORME MENUAL No. 05**













CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL	**INFORME MENUAL No. 05**













CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL	**INFORME MENUAL No. 05**



















Ilustración 5. Charlas de seguridad y salud en el trabajo

Se adjuntan los registros de las charlas

Tabla 3. Listado de capacitaciones

CAPACITACIONES		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
16/07/2025	Fauna acuática y terrestre de la zona de influencia	Sonia Gonzalez
23/07/2025	Manejo seguro y responsable de los residuos	Sonia Gonzalez





Ilustración 6. Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo

Se adjuntan registros de actividad de formación.

4.3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante el periodo del 07 julio al 06 de agosto del 2025, el personal hace buen uso de los EPP que se les entrega para llevar a cabo las actividades diarias asignadas de manera segura cuidando siempre del bienestar de los trabajadores en cumplimiento con la normatividad legal vigente, esto con la finalidad de prevenir cualquier incidente o accidente de trabajo.

Los EPP utilizados en obra por el personal son:

- Casco de seguridad
- Guantes de nitrilo según lo amerite
- Gafas de seguridad
- Tapa bocas según lo amerite
- Protectores auditivos según lo amerite





Ilustración 7. Registro fotográfico de entrega de EPP

5. PERMISOS DE TRABAJO GENERAL

Se siguen durante el periodo a cabo las actividades de topografía, limpieza y adecuación de terreno, excavación con retro excavadoras en obra, cargue y descargue de material, actas de vecindad, atención a la comunidad entre muchas otras, se realiza la apertura de AST para todas las áreas.

5.1. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Durante el periodo del 07 julio al 5 de agosto del 2025, todo el personal tanto directo como subcontratista sigue realizando el diligenciamiento del análisis seguro de trabajo tomando así los controles pertinentes en las actividades diarias, esto se lleva a cabo todos los días antes de iniciar las actividades propios de cada trabajador, esto se realiza de manera preventiva y así cada miembro este consciente de cuáles son sus riegos de las tareas asignadas y sus controles operacionales.

Se adjuntan los registros de los AST





Ilustración 8. Diligenciamiento AST

6. INSPECCIONES PLANEADAS

Durante el periodo del 07 julio al 06 de agosto del 2025, se continúa llevando a cabo mensualmente las inspecciones que están programas en todas las áreas de la obra teniendo en cuenta el cambio continuo de las condiciones de trabajo debido a las actividades que se desarrollan en el avance de la obra, esto es ejecutado por el supervisor SST con la finalidad de identificar de acuerdo a los resultados obtenidos los controles operacionales a implementar para un ambiente seguro. En estas inspecciones se tienen en cuentan el estado de los equipos, kit de emergencia, estado de los EPP, punto ecológico, orden y aseo entre otros factores posibles de encontrar.

Dentro de las inspecciones mensuales tenemos:

- **Inspección kit de emergencia (botiquín, camilla y extintores)**

Durante el periodo se realizó las inspecciones planeadas del kit de emergencia de los centros de trabajo donde se estén llevando las actividades evidenciado así el buen estado de los insumos camilla, botiquín y extintor.

Se cuenta con unos puntos emergencia en los diferentes frentes de trabajo y señalizado, las inspecciones se llevan a cabo mensualmente y así revisar su estado actual con fin de mantener siempre el suministro eficiente y con la dotación requerida para dar respuesta inmediata en caso de un evento y/o emergencia Se adjunta registro inspección de camilla, botiquín y extintor.

- La inspección al botiquín tipo moral ubicado en la obra se encuentra dotado y con fechas vigentes para su uso.
- La inspección a la camilla se evidencia que se encuentra en buen estado en caso de presentarse una emergencia.
- La inspección del extintor evidencia que se esta en buen estado y su fecha esta vigente para su uso en caso de presentarse una emergencia.











Ilustración 9. Inspección kit de emergencia camilla, extintor y botiquín

Se adjuntan los registros de las inspecciones de botiquín, camilla y extintor

- **Inspección kit antiderrame**

En el periodo se cuenta con un kit antiderrame para atender las emergencias que se puedan presentar con derrames de sustancias peligrosas y así mitigar cualquier impacto ambiental, esta inspección se llevara a cabo de manera mensual por parte del supervisor SST de la obra.



Se adjuntan inspección de kit antiderrame.

- **Inspección punto ecológico**

Durante el periodo se sigue realizando las inspecciones de manera mensual a los puntos ecológicos que se encuentran en los diferentes frentes de la obra señalizados y distribuidos de la siguiente manera; 1 caneca blanca para la recolección de residuos aprovechables, 1 caneca negra para recolección de residuos no aprovechables y 1 caneca verdes para la recolección de los residuos ordinarios se encuentran en buen estado.

Se adjunta inspección de puntos ecológicos.



Ilustración 10. Inspección punto ecológico

- **Inspección al estado y uso de los EPP**

Durante el periodo se siguen llevando a cabo las inspecciones del estado y uso de los EPP a todo el personal propio como subcontratista para garantizar que todos los trabajadores cuenten con un elemento de protección personal en buen estado y apropiado por la labor, realizamos inspecciones donde identificamos el buen uso de estos elementos y la necesidad de una reposición/cambio de EPP a los trabajadores.

Se adjunta registro de inspección de EPP.

- **Inspección de orden y aseo**

Se siguen llevando a cabo jornadas de orden y aseo del periodo del 07 de mayo al 06 de junio del 2025, en las áreas intervenidas el cual es realizado por personal directo para prevenir incidentes y/o accidentes labores, y así garantizar que el personal realice sus actividades en un ambiente que genere seguridad, se cuenta con puntos ecológicos para la disposición de los residuos que se generen de las diferentes actividades, se cuenta con baños dentro las instalaciones con un buen aseo y orden para el uso del personal.

Se adjunta registro de inspección de orden y aseo.







Ilustración 11. Inspección orden y aseo

- **Inspección detallada vehículos y maquinaria**

Se lleva a cabo durante el periodo se siguió llevando a cabo las inspecciones a los equipos y maquinaria que ejecutan actividades en la obra de manera mensual, el personal de seguridad revisa los pre operacionales que se diligencian diariamente por parte del personal de los conductores y operadores antes de iniciar con sus labores y así verificar que se encuentran en buen estado para el desarrollo de las actividades, se revisa si los equipos cuentan con los insumos de botiquín y extintor.

Se adjuntan pre operacionales e inspeccione detalladas de vehículos y maquinarias







Ilustración 12. Inspección detallada de vehículos y maquinaria

Se ejecutaron una total de 8 inspecciones durante el periodo de la ejecución de la obra, esto con el objetivo de evidenciar que se están cumpliendo con normas de seguridad establecida en la obra.

Tabla 4. Cronograma de inspecciones

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	JUL			
	P	E	CE	CM
Inspeccion a extintores	1	1		
Inspeccion de Botiquin	1	1		
Inspeccion de Camilla	1	1		
Inspeccion al estado de uso y Epp	1	1		
Inspeccion orden y aseo	1	1		
Inspeccion detalladas de vehiculos	1	1		
Inspeccion punto ecologico	1	1		
Inspeccion kit antiderrame	1	1		
SUBTOTAL	8	8	0	0
TOTAL	100%			

7. REPORTE Y ESTADISTICAS

Durante el desarrollo del periodo no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, los trabadores conocen la importancia que tiene el reporte de incidentes, por cuanto nos permite tomar medidas correctivas y preventivas, y así mejorar los controles operacionales eliminando los peligros y riesgos sobre las actividades críticas.

Se formulan los siguientes indicadores:

Tabla 5. Indicadores de accidentabilidad

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT= (N° Días perdidos y cargados por A.T en el periodo / N| HHT) X K
Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	ILIAT= (IFIAT *ISAT) / 1000
Índice de Frecuencia de Incidentes de Trabajo	Es la relación entre el número total de I.T registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000).	IFIT = (N° Total de I.T. / N° HHT mensuales) X K

Caracterización de accidentabilidad

Tabla 6 Tabla de indicadores

TABLA DE INDICADORES 2025									
MES	AREA	# DE EMPLEADOS	# DE AT	HHT	# DIAS AUSENCIA	TASA	IF	IS	ILI
Marzo	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Abril	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Mayo	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Junio	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Julio	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**

Tabla 7. Indicador personal

COMPORTAMIENTO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL 2025	
	JUL
PERSONAL	8
HORAS EXTRAS	0.0
TOTAL PERSONAL	8

Tabla 8. Horas hombre

COMPORTAMIENTO DIAS Y HORAS HOMBRES TRABAJADAS DURANTE EL 2025	
	JUL
DÍAS HÁBILES MES	25
HORAS ORDINARIAS DÍA	8
DIAS HOMBRES TRABAJADAS	200
HORAS HOMBRES TRABAJADAS	1,600

Tabla 9. Ausentismo

COMPORTAMIENTO DE INCAPACIDADES Y DÍAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL DURANTE EL 2025	
	JUL
No. INCAPACIDADES POR EG	0
DÍAS DE AUSENTISMO POR EG	0
HORAS DE AUSENTIMOS	0
AUSENTISMO POR EG	0.00%
TASA DE AUSENTISMO POR EG	0.00%

Se sigue manteniendo la meta del indicador establecida.

Indicador programa de capacitación

Tabla 10. Indicador programa de capacitación

Nombre del indicador	Formula	Periocidad	Meta
Indicador Cumplimiento	# de Cap Porgramadas/ # de Cap EjecutadasX100	Trimestral	80%
Indicador Cobertura	# de asistentes a capacitación/ # total de trabajadores programadosX100	Trimestral	100%
Indicador Eficacia (las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones puedes ser: actividades, examen, supervision, talleres)	# trabajadores evaluados/ # de evaluaciones eficacesX100	Trimestral	70%

8. CONCLUSIONES

A la fecha el proyecto ha venido cumpliendo con el sistema de seguridad y salud en el trabajo manteniendo un buen desarrollo laboral y la prevención de accidentabilidad, cumpliendo así con lo programado por cada programa.

ANEXOS

ANEXO

CHARLAS Y CAPACITACIONES

CHARLAS

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 7/07/2025 Ciudad: Dabeiba Hora Inicio: 7:00 a.m Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Identificación de animales venenosos en campo
Lugar: las compuertas
Expositc Sonia Gonzalez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa-costro. Avila.	22598664	oficio. varios.	Rosa
2	Javier Conrado	1042351345	Residente	JConrado
3	Yeraldin Fonseca Cleves	1042028148	Aux Sisso	Yeraldin F.
4	Yesica Pino C.	1002095293	Aux siso	Yesica P.
5	Oscar Parejo	72144924	OP	Oscar
6	Juan Miguel Hernandez	1112878009	especialista ambiental	Juan
7	Domingo Gomez	1107575728	Cadenero	Domingo
8	Jose Rodrigo Avila	4936273	Topografo	Jose A.
9	Roque muñoz	9128627	Director de obra	Roque M.
10	Yoney Motta.	1091662627	Ingeniera Pesquera.	Yoney M.
11	Humberto Escorcia	1234880624	Conductor	Humberto
12	Wuilver Gutiérrez	7226272	Biologo	W
13	Luis Eduardo Mi22	7266813	Conductor Volqueta	Luis
14	JAIR LIMAL ACOSTA	92250208	CONDUCTOR VOLQUETA	JAIR LIMA
15	Ruben Moreno	72308083	Conductor volqueta	Ruben Moreno
16	Luis Ching	87127576	conductor volqueta	Luis ching
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	· Concientización en el Autocuidado.	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 8/07/2025 Ciudad: Neiva Hora Inicio: 7:00 a.m Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Uso de camilla

Lugar: Las empresas

Expositor: Kellys Flores Entidad: CAH

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa-castro-Avila	22598664	oficio. Varios.	Rosa
2	Alexandra Tonguino Cleris	1043028148.	Aux Social	
3	Javier Conrado	1092351345	Residente	JConrado
4	Yesica Pino	1002095293	Aux siso	Yesica Pino
5	Oscar Paredes	72144424	OP	
6	Juan miguel Hernandez	1128948009	Especialista ambiental	Juan
7	JOSE Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose A.
8	Domingo Gonzalez	91075728	Cadenero	
9	Roque muñoz	91281627	Director de obra	roque M.
10	JABER VIHA	92250208	CONDUCTOR VOLQUETA	
11	Luis China	8742576	conductor de volqueta	
12	Luis Eduardo Mizar	721166813	Conductor volqueta	
13	Ruben Moreno	72308083	CONDUCTOR VOLQUETA	Ruben Moreno
14	Humberto Escarcia	1234888624	Conductor camioneta	
15	Jonny Motta	1091666264.	Ingeniero Residente	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Contientizacion en el autocuidado	

Kellys Flores
Responsable del evento

Kellys Flores
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 9/07/2025 Ciudad: Relación Hora Inicio: 2:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Primeros Auxilios
Lugar: Los Compleyos
Expositc Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Oscar Parodes	7214424	OP	
2	Manuela Tonegrou Cuervo	1043028148	Stenf.	
3	Rosa. Castro-Avila	22598664	oficio-Varios.	Rosa
4	Javier Conrado	1042351345	Residente	JConrado
5	Oscar Parodes	7214424	OP	
6	Yesica Pino C.	1022095293	Aux Siso	yesica pino
7	Juan Manuel Hernandez	1122848007	especialista ambiental	Juan
8	Jose Rodrigo Avila A.	1936027 3	Topografo	Jrodrigo
9	Domingo Gonzalez	1107572 8	Cadenero	Domingo
10	Walter Barbosa	72 16122	Biologo	
11	Roque muñoz	91281627	Director de obra	roque. M.
12	Jasney Motta	1091662627	Ingeniera pesquera	Jasney M
13	Luis eduardo Mi	72168B	conductor bol	
14	Humberto escorcia	1234888624	conductor	Humberto
15	JADER VITAL ACOSTA	22250208	CONDUCTOR MOLQUERA	JADER VITAL
16	RUBEN MORENO	72 30 8083	CONDUCTOR VOLQUETA	Ruben Moreno
17	Luis ching	8742576	conductor volqueta	luis ching
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización en el autocuidado	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 10/07/2025 Ciudad: Penonomé Hora Inicio: 7:00 a.m Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Control de materia particulado

Lugar: ~~Las~~ comunidad

Expositor: Sonia Gonzalez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Pananeco Tonegroy Chans	10430280148	Aux Social	
2	Rosa-castro-Avila-	225978664	oficios Varios-	Rosa
3	Javier Conrado	1042351345	Residente	
4	Oscar Perez	72144924	OP	
5	Yesica Pino	1002095293	Aux Piso	Yesica P.
6	Ivan Miguel Hernandez	7188848009	especialista ambiental	
7	Domingo Gonzales	7107728	Carpintero	
8	Jose Rodrigo Avila	193602 73	Topografo	Jose A.
9	Roque muñoz	91281627	Director de obra	
10	Jorney Mojta	2091662677	Ingeniero Residente	
11	Walter barbosa	7226227	Biologo	
12	Luis Eduardo Muzo	72166813	Operador Retroexcavadora	
13	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor	
14	Jadir Vital Acosta	92250208	Ingeniero Civil	
15	Ruben moreno	7230883	Conductor volqueta	Ruben moreno
16	Luis chang	8749576	conductor Vorqueta	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion en autocuidado	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 11/07/2025 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 7:00 A.M. Duración: 12:00 P.M

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Comité y sus funciones - COPASST y CCL

Lugar: Las gaviotas

Expositor: Kellys Florez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Oscar Parodi	72144424	OP	
2	Rosa Castro-Avila	22579664	Oficios Varios	Rosa
3	Javier Conrado	1042351345	Residente	
4	Yesica Pino Corpodo	1002095293	AUX SISO	Yesica P.
5	Juan Manuel Hernandez	1128894809	Especialista ambiental	
6	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose R.
7	Domingo Gonzalez	1107575788	Celador	Domingo G
8	Walter Barboza	7216777	Biologo	
9	Roque muñoz	91281627	Director de obra	roque M.
10	Jasney Motta	1091667627	Ingeniera Residente	Jasney M.
11	Luis Eduardo Millan	72166813	Conductor Volqueta	
12	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor	
13	Jaider Vital Acosta	92250208	Conductor Volqueta	Jaider Vital
14	Ruben Moreno	7230 8083	Conductor volqueta	Ruben Moreno
15	Luis Ching	8749576	Conductor Volqueta	Luis Ching
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autocuidado	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 12/07/2025 Ciudad: Arraijan Hora Inicio: 2:00 A. Duración: 5:00 Pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Porque es importante monitorear la calidad del agua
Lugar: Las compuertas
Expositc Sonia Gonzalez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Oscar Paredes	9214424	OP	
2	Rosa Castro - Avila	2259864	oficio - Varios	
3	Yoncarla Tonegroy Chanis	1043028148	Social	
4	Javier Conrado	1042351345	Residente	
5	Yesica Pino	1002095293	AUX SISO	
6	Juan Miguel Hernandez	1178898009	especialista ambiental	
7	Domingo Gonzalez	4107528	Cadenero	
8	José Rodrigo Avila	193602 73	Topografo	
9	Walter Barboza	7-726-772	Biologo	
10	Roque muñoz	9928 1627	Director de obra	
11	Jasney Motta	1091662627	Ingeniera Residente	
12	Luis Eduardo Hisoz	7-166-813	Coordinador Topografia	
13	Humberto Escorcia	1234088624	Conductor	
14	Jader Uribe Acosta	9225 0208	Conductor Ulo y grua	
15	Ruben Moreno	7-308-083	Conductor volqueta	
16	Luis Ching	8-742-576	Conductor volqueta	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion en el autocuidado	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 14/07/2025 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Beneficios de los suelos

Lugar: las comunales

Expositc: Sonia Gonzalez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa castro avila	2259664	oficio varios.	Rosa
2	Juan manuel Hernandez	1123842001	especialista ambiental	
3	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo G
4	Jose Rodrigo Avila	1936027.3	Topografo	Jose A.
5	Roque muñoz	912816.27	director de obra	roque M
6	Javier Conrado	1042351345	Residente	JConrado
7	Yesica Pino	1002095293	Aux. SISO	Yesica P.
8	Yasney Motta	7091662627	Ingeniera Residente	Yasney M
9	Humberto Escarcia	1234988624.	conductor	Humberto
10	Walter Barboza	72269.2	Profesor	
11	Juis Eduardo Mitta	72166813	Conductor Volquet	
12	Jader Vital Acosta	92250208	Conductor C10/Qukita	Jader Vital
13	Ruben moreno	72308083	Conductor volqueta	Ruben moreno
14	Luis ching	8742576	Conductor volqueta	Luis ching
15	Manuela Paraguza Cleves	1073028648.	Jefe Social.	Manuela P.
16	Oscar Pinedes	9214492P	OP	
17	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concentracion en el autocuidado	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 15/07/2025 Ciudad: Rafaela Hora Inicio: 7:00 a.m Duración: 5:00 P.M

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla X Otros

Tema de la Actividad: Autocuidado de Actos y condiciones inseguras

Lugar: las compuertas

Expositor: Kellys Florez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Manuela Toregrosa de	1043028448	Socorf	
2	Javier Conrado	1042351345	Residente	
3	Yesica Pino	1002095293	Aux siso	
4	Rosa. castro-Avila	2298664	oficio-varios-	
5	Oscar Pineda	72144424	OP	
6	Juan Miguel Hernandez	1118848009	especialista ambiental	
7	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	
8	Jose Rodrigo Arba	19360273	Topografo	
9	Roque muñoz	91281627	Director de obra	
10	Jasney Motta	1091662627	Ingeniera residente	
11	Walter Jaramillo	72 26772	Biologo	
12	Luis Eduardo Mizar	72166813	Conductor volquete	
13	Humberto Escorcia	1234888629	Conductor	
14	JADER VITAL ACOSTA	92250208	conductor volqueta	
15	Ruber moreno	72308083	conductor volqueta	
16	Luis Chirg	87492576	conductor volqueta	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autocuidado.	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 17/07/2025 Ciudad: Bello Hora Inicio: 7:00 Am Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad la importancia del AST
Lugar: Los compuertas
Expositc Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Yesica Pino	1002095293	AUX SISO	Yesica P.
2	Rosa Castro Avila	22598604	oficio varios.	Rosa
3	Jose Rodrigo A.	1036807273	Topografo	Jose A.
4	Aiden Vidal	92250208	CONDUCTOR VOLQUETA	
5	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo G
6	Javier Conrado	1092351345	Residente	Conrado
7	Ruben Moreno	72308083	conductor volqueta	Ruben Moreno
8	Luis ching	8742576	conductor de Bonqueta	Luis ching
9	Walter Bot 2656	7276272	Biologo	
10	Luis Eduardo Mora	7276813	conductor volqueta	
11	Manuela Tonegroge Charris	1043028648.	Social.	
12	Lombeno Escorcia	1234888624	Conductor	
13	Jaiver Motta	1091662627.	Ingeniero Residente	
14	Oscar Perez	72144924	OP	
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M.
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autocuidado	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 18/07/2023 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 2:00 AM Duración: 5:00 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla X Otros

Tema de la Actividad Importancia de los protectores auditivos

Lugar: Los campeones

Expositc Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Manuel de Jesus Tobon Cuarto	1043028148	Soldador	
2	Rosa. castro-Avila	22598764	oficio-varios.	Rosa
3	Domingo Gonzalez	1107728	Cadenero	
4	Jose Avila	1936027 3	Topografo	Jose A.
5	JADIEL VITAL	9225028	conduccion vehiculo	JADIEL VITAL
6	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor camion	Humberto
7	Oscar Perez	72144924	OD	
8	Jasney Motta	1091666264.	Ingeniero Residente	Jasney M
9	Javier Conrado	1042351345	Residente	
10	RUBEN MORENO	72308083	CONDUCTOR VOLQUETE	RUBEN MORENO
11	Luis Ching	8742576	conductor volqueta	Luis Ching
12	Luis Eduardo Muñoz	72166813	conductor Volqueta	
13	WALTER BOLAÑO	7226272	Biologo	
14	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autoridad.	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 19/07/25, sabado Ciudad: Relacion Hora Inicio: 7:00 AM Duración: 12:00 Pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Divulgacion de señales de transito

Lugar: las compuertas

Expositc Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Humberto Escarcia	1234888624	Conductor camioneta	Humberto
2	Ruben moreno	7230 8083	Conductor volqueta	Ruben Moreno
3	Domingo Gonsalez	1107728	Cadenero	Domingo G
4	Jonny Motta	1091666 264	Ingeniero Residente	Jonny M.
5	Yesica Pino	1002093293	Aux. SISO	Yesica Pino
6	Rosa. castro. Avila	22598664	oficio varios.	Rosa
7	Luis Chinq	8742576	conductor volqueta	Luis chinq
8	Oscar Pardo	92144926	OP	
9	Jose Avila	19360273	Topografo	Jose A.
10	JADIR VITAL	92250208	Conductor volqueta	JADIR Vital
11	Javier Conrado	1092351395	Residente	Conrado
12	Ruben Moreno	7230 8083	conductor volqueta	Ruben Moreno
13	Luis Eduardo Mitre	7716683	conductor volqueta	
14	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de actividad	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 21/07/2015 Ciudad: Reforma Hora Inicio: 7:00 Pm Duración: 5:00 Am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla X Otros

Tema de la Actividad Que es un vertimiento

Lugar: Los campamentos

Expositc Sonia Gonzalez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Oscar Barros	72144424	OP	
2	Luis Eduardo Mitta	72168B	conductor Volqueta	
3	Luis Ching	87 42576	conductor Volqueta	
4	Javier Conrado	1042351345	Residente	
5	Rosa-castro-Avila-	2298664	oficio-Varios	Rosa
6	Domingo Gonzales	1107728	Cadenero	
7	Humberto Escarcia	1234888624	Conductor Camioneta	
8	Alexander Tonegroy de.	1043028148	Socorr.	
9	RADER Y/TA	92 250208	Coordinador Calidad	
10	Jose Avila	19360273	topografo	Jose A.
11	Jasrey Motta	7091662624	Ingeniero pesquera	
12	Yesica Paola Pino	1002095293	AUX SISO	Yesica Pino
13	Ruber Moreno	7230 8083	conductor volqueta	Ruber Moreno
14	Walter. barboza	7.2 2697	Biologo	
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M.
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización en el autocuidado	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: martes, 22/07/25 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:00 Am Duración: 5:06 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad como cuidar mis 5 sentidos

Lugar: Las comfort

Expositc Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo Gonzalez	1107577 28	Cadenero	Domingo G
2	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor camionero	Humberto E.
3	Rosa. castro. Avila	22398664	oficio. varios.	Rosa
4	Jose Avila	19360773	Topografo	Jose A.
5	TADIR VITA	92250208	VOLQUETA CONDUCTOR	TADIR VITA
6	Jasnel Hotta.	1091666 264.	Ingeniera pesquera	Jasnel H
7	Manuela Tobegroza Cuanio	1043028148	Social	Manuela T
8	Oscar Pardes	72144929	OP	Oscar
9	Javier Conrado	1042351345	Resid.	Conrado
10	Ruben Moreno	7230 8083	conductor volqueta	Ruben moreno
11	Luis ching	8742576	Conductor Volqueta	Luis Ching
12	Luis Eduardo Mizrak	72166813	conductor volq	Luis
13	WALTER BARBOSA	7226272	Biologo	W
14	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autocuidado.	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 24/07/2023 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Herramientas necesarias para la manipulación de fauna silvestre

Lugar: Las comparticas

Expositc: Sonia Gonzalez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Luis Guillermo	1038097776	Operador	
2	Oscar Pareja	7214424	OP	
3	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	
4	Manuela Tamayo Cleves	1043028148	Social	
5	Javier Conrado	1042351345	Resid.	
6	Rosa. Castro. Avila.	22598664	oficios. varios.	
7	Luis ehing	8742576	Conductor	
8	Ruben moreno	72 30 8093	conductor volqueta	
9	JOSE VITAL	9225020	Conductor Volqueta	
10	Cristian Barbosa	7226272	Bolero	
11	Jose Eduardo Arzuaga	72166813	Conductor Bolero	
12	Domingo Cantillo	77073728	Conductor	
13	Yasmi Motta	1041666264	Ingeniera Proyectos	
14	Humberto escorcia	1234888624	Conductor de camioneta	
15	Jose Avila	19360273	topografo	
16	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización en el autocuidado.	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: viernes, 25/07/25 Ciudad: Reficul Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.M

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5' Otros

Tema de la Actividad Agotamiento físico por condiciones climaticas

Lugar: Los compañeros

Expositc Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa - castro - Avila	22598664	oficio varios	Rosa
2	Luis chino	8742576	conductor volqueta	Luis Chino
3	Manuela Tonegrop Cerin	1043028148	Social	Manuela T.
4	Domingo Gonzalez	91075728	Cadenero	Domingo G.
5	Jose Avila	19060273	Topografo	Jose A.
6	Humberto escorcia	1234888624	Conductor Camioneta	Humberto
7	Jasney Motta	1091668627	Ingeniera Residente	Jasney M.
8	Claudia Conrado	1047351745	Residente	Claudia
9	Luis Eduardo Arizo	72166813	Conductor volquet	Luis
10	WALTER MARBO SA	7226272	B. OPS	Walter
11	JADIR VITAL	92290298	CONDUCTOR VOLQUETA	Jadir
12	Yesica Pino	1002095293	AUX SISO	Yesica
13	Ruben Moreno	72308083	CONDUCTOR volqueta	Ruben Moreno
14	Oscar Parodes	72144929	OP	Oscar
15	Waldir Martinez	1140839364	Conductor	Waldir M.
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización de actividad	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Sabado, 26/07/25 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 7:00 A.M Duración: 12:00 P.M

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Prevención lesiones en la columna

Lugar: Las Parcelas

Expositor Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Humberto Escarcia	1234888624	Conductor Camioneta	Humberto
2	Domingo Corrales	1107558728	Cordelero	Domingo
3	Yesica Pino	1002095293	AUX SISO	Yesica Pino
4	Yoneys Matos	1091662627	Maquera Pegadora	Yoneys M
5	JAIDER VITAL	1225020208	CONDUCTOR FOLGUETA	Jaider V
6	WALTER BARBOSA	7226272	Biologo	W Barbosa
7	JOSE AVILA	1140602773	Topografo	Jose A.
8	Rosa Castro-Avila	22598664	OFICIO VARIOS	Rosa
9	Luis Chinas	8247576	conductor volqueta	Luis Chinas
10	Ruben Moreno	72308083	CONDUCTOR VOLQUETA	Ruben Moreno
11	Javier Conrado	1042351745	Residente	Conrado
12	Luis Eduardo Mizzar	72166813	conductor de volqueta	Luis Mizzar
13	Oseas Parodi	72144424	OP	Oseas
14	Waldir Martinez	1140838369	Conductor	Waldir M
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concentracion de autocuidado	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 28/07/2023 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 2:00 p.m Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Riesgo ergonomicos

Lugar: Las instalaciones

Expositc Kelly Florez Entidad SAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa-castro-avila.	22598664	oficio-varios.	Rosa
2	Ruben Moreno	72308083	operador volquete	Ruben Moreno
3	Jader Vital	92250208	conductor ambulancia	Jader Vital
4	Walther Barboza	7226772	Biologo	
5	Luis chiny	8742576	conductor volqueta	Luis chiny
6	Jose Avila	19060273	topografo	Jose A
7	Domingo Gonzalez	17075728	cosechero	
8	Luis Eduardo Mejia	7716813	conductor Volquete	
9	Javier Conrado	1047231345	Red	Conrado
10	Yesica Pino	1002095093	Aux SISO Social	Yesica Pino
11	Manuela Tonegroz Clavis	1043028148		
12	Humberto Garcia	1234888629	Conductor Camioneta	Humberto
13	Jonel Potter	1094662628	Izquierda Pesquera	Jonel P
14	Oscar Parejo	7218892X	OP	
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

echa	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización del autocuidado	

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 29/07/2015 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Cuidado al momento de derrumbar un árbol

Lugar: las compuertas

Expositc Sonia Gonzalez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Javier Conrado	1042351345	Residente	Conrado
2	Rosa - castro. Avila	22598664	oficios varios.	Rosa
3	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica
4	Domingo Gonzalez	1107537728	Cadenero	
5	Walter Barbosa	72267.2	Biologo	
6	TADEO VITAR	92502208	CONDUCTOR Utilitario	TADEO VITAR
7	Jasney Mesa	1091666262	Ingeniero Proyecto	Jasney M.
8	Jose Avila	19860273	Topografo	Jose A.
9	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor Camioneta	
10	Ruben Moreno	7230083	Conductor volqueta	Ruben Moreno
11	Luis Ching	8742576	conductor volqueta	Luis Ching
12	Jesus Bonilla	72440924	Oll	
13	Luis Eduardo Mizzar	72166813	Conductor volqueta	
14	Waldir Martinez	1140838369	Conductor	Waldir M
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concentracion en el autocuidado	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Miercoles, 30/07/25 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Salud Publica

Lugar: Las comunidades

Expositc: Kellys Florez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Daniel Flores	77193076	OPI	
2	Luis Guillermo	1038097776	oper	
3	Oscar Barros	72144424	OPO	
4	Yesica Pino	1002095293	AUX SISO	Yesica Pino
5	Rosa. castro. Avila	22598664	oficio. varios	Rosa
6	Ruben Moreno	72308083	operador volquete	Ruben Moreno
7	Jader Vitol	72250208	conductor volqueta	Jader Vitol
8	Walther Bolaño	7276272	Biologo	
9	Luis chicg	8742576	conductor volqueta	Luis chicg
10	Jose Avila	19060273	Topografo	Jose A
11	Domingo Gonzalez	77.075728	Cabinero	
12	Luis Eduardo Mitra	72.668.B	Conductor Volqueta	
13	Javier Correa	1042351345	Resid	
14	Humberto Garcia	1234888824	Conducto Camionetu	Humberto
15	Jonery Motta	1098626271	Ingeniero Residente	Jonery M.
16	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir H
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autocuidado	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 31/07/2025 Ciudad: Relación Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Como identificar un AT

Lugar: Las compañías

Expositc: Kellys Florez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	JADIZ VITAL	92550208	conductor Volqueta	MJOSA
2	Domingo Gonzalez	1107528	Cadenero	Domingo
3	Rosa. Castro. Avila	22598664	oficio-varios.	Rosa
4	Walter Urbina	7226272	biologo	Walter
5	Luis Eduardo Mejia	72164613	conductor Volqueta	Luis
6	JOSE Aular	1936073	Topografo	Jose A.
7	Luis chino	92425776	conductor volqueta	Luis chino
8	Ruben moreno	72308083	Conductor de volqueta	Ruben moreno
9	Clemencia Torregroza Clemis	1043028148	Social	
10	Oscar Arrieta	92144424	OP	
11	Humberto escorcia	1284888624	Conductor camioneta	Humberto
12	Jasney Motta	1091662627	Ingeniera Pesquera	Jasney M
13	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
14	Javier Conrado	1042351345	Residente	JConrado
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización de autocuidado	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 1/08/2025 Ciudad: Bello Hora Inicio: 2:00 P.M Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla X Otros

Tema de la Actividad Como prevenir los baños en la vegetación

Lugar: Las compuertas

Expositc Sonia Gonzalez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	David Soto	72193076	Operador	
2	Luis Gallego	1038097776	Operador	
3	Oscar Parodi	72144924	Op	
4	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
5	Ruben Moreno	72308083	Conductor volqueta	Ruben Moreno
6	Jairo Vital	92756204	Conductor volqueta	
7	Walter Barboso	7276272	Biologo	
8	Luis chima	8742576	conductor Volqueta	Luis chima
9	Jose Avila	14060273	Topografo	Jose A.
10	Domingo Gonzalez	77.075728	Cadenero	Domingo
11	Luis Eduardo Mizza	72166813	Conductor Volqueta	
12	Javier Conrado	1047351345	Resid	
13	Jonnel Ruiz	1091667677	Tercero Pesado	
14	Humberto Escorcia	1154888624	Conductor Camioneta	
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concentración en el autocuidado.	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM S.A. NIT 830 509 2783	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 21/08/2025 Ciudad: Depsión Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Autocuidado

Lugar: Las compuertas

Expositc Kellys Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	RUBEN MORENO	72308083	CONDUCTOR VOLQUETA	Ruben Moreno
2	JADER VIVAS	72250208	CONDUCTOR VOLQUETA	Jader Vivas
3	WALTER RAEBORA	7226272	BIOLOGO	
4	LUIS CHING	8742576	CONDUCTOR VOLQUETA	Luis Ching
5	ROSA-CASTRO-AVILA	9.259866	OFICIOS-VARIOS	Rosa
6	JAVIER CONRADO	1042351345	RESIDENTE	Conrado
7	DOMINGO GONZALEZ	1107578	CADENERO	Domingo G
8	JOSE AVILA	19060273	TOPOGRAFO	
9	YESICA PINO	1002095293	AUX SISO	Yesica P.
10	HUMBERTO ESCORCIA	1234888624	CONDUCTOR CAMIONETA	Humberto
11	JHONNY MOTTA	1091662627	INGENIERO RESIDENTE	Jhonny M.
12	OSCAR PARODI	72144424	TOP	
13	JAIRO EDUARDO MEZA	72166813	CONDUCTOR VOLQUETA	
14	WALDIR MARTINEZ	1140838364	CONDUCTOR	Waldir M
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización de autocuidado	

Kellys Florez
Responsable del evento

Kellys Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM...	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Lunes, 04/08/25 **Ciudad:** Pelaya **Hora Inicio:** 7:00 A.m **Duración:** 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ☑ Otros

Tema de la Actividad Política de Seguridad

Lugar: Los campamentos

Expositc Kellys Flórez **Entidad** CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Oscar Pyrosis	72144424	OP	
2	Luis Guillermo	1038097770	Operador	
3	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
4	Maranela Tonegrozo Cuarís	1043028148	Socaf	
5	Javier Conrado	1042751345	Perio	Conrado
6	Rosa-castro-Avila-	22595664	oficio-varios	Rosa
7	Luis ching	87427575	conductor	Luis ching
8	Ruber moreno	72308083	conductor volqueta	Ruber moreno
9	Wilver Bazbila	72 26272	Biólogo	
10	Jadira Vital	42250208	conductora Vigilancia	Jadira Vital
11	Luis Eduardo Mizzo	72166813	Conductor Bomba	
12	Domingo Bencely	7407572R	Electricista	
13	Humberto Escorcia	1234888624	conductor camioneta	Humberto
14	Jasney Hotta	1091666264	Ingeniera Petrolera	Jasney M
15	Jose Avila	19360273	Topografo	Jose A.
16	Waldir Martinez	1190838364	Conductor	Waldir M
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autocuidado	

Kellys Flórez
Responsable del evento

Kellys Flórez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 5/08/2025 Ciudad: Reteren Hora Inicio: 7:00 A.M Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5' ✓ Otros

Tema de la Actividad Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra

Lugar: las comparas

Expositc Kelly Florez Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Yaranedu Tonegroa Llamis	1043028148	Bowl	
2	Cesar Parente	72144424	Op	
3	Rosa Castro. Avila.	22598664	oficios varios	Rosa
4	Luis Chino	8742576	conductor volqueta	Luis Chino
5	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor Camioneta	Humberto
6	Jose Avila	1901608173	Topografo	Jose A.
7	Domingo Gonzalez	41075728	Cabinero	
8	Jonell Totta	1091662627	Ingeniera pesquera	Jonell
9	YADER VITAL	92250208	CONDUCTOR VOLQUETA	YADER
10	CLATIE BALBOSO	7226272	BIOLOGO	
11	Yesica Pino	1002095203	AUX SISO	Yesica Pino
12	Ruben Moreno	72308085	conductor volqueta	Ruben Moreno
13	Javier Conrado	1042351345	Residente	Conrado
14	Luis Eduardo, Misor	72166018	conductor de volqueta	Luis
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion de autocuidado	

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Miercoles 06-08-25 Ciudad: Reforma Hora Inicio: 7:00 AM Duración: 5:00 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5' Otros

Tema de la Actividad Manejo y Prevención del estrés en el trabajo
Lugar: las Camionetas
Expositor Kelly Flores Entidad CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Luis Chung	8742575	Conductor	Luis Chung
2	Ruben Moreno	7230883	Conductor voluntario	Ruben Moreno
3	Walter Barbosa	7226772	Oficios	Walter
4	Jaime Vila	92250207	Conductor Voluntario	Jaime Vila
5	Luis Eduardo Mizar	72166813	Conductor Voluntario	Luis
6	Domingo Quiroga	7707578	Conductor	Domingo
7	Rosa Castro Avila	22398664	Oficios Varios	Rosa
8	Jenny Motta	1041666264	Ingeniera Residente	Jenny
9	Humberto Escorcia	R348886624	Conductor Camioneta	Humberto
10	Luis Guillermo	1038097776	Operador	Luis
11	Cristian Calvo	7224084	Conductor	
12	Mario Ospino B	8568575	Conductor	Mario
13	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
14	Javier Conrado	1042351345	Residente	Conrado
15	Manuela Arregoces M.	1041302818	Frial	Manuela
16	Waldis Martinez	1140838364	Conductor	Waldis M.
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientización de autocuidado	

Kelly Flores
Responsable del evento

Kelly Flores
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

CAPACITACIONES

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 16/07/2025 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 2:00 p.m Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación ✓ Entrenamiento Charla Otros

Tema de la Actividad: fauna acuatica y terrestre de la zona de influencia

Lugar: (en el campamento)

Expositor: Sonia Gonzalez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Ruben Moreno	7230 8083	conductor volquete	Ruben Moreno
2	Domingo Gonzalez	1107575728	Cadenero	Domingo G.
3	Javier Conrado	1042351345	Resid.	JConrado
4	Jose Avila	1140607273	Topografo	Jose A.
5	Rosa-castro-Avila	8E5986G4	oficios varios	Rosa
6	Luis Chinea	8742576	conductor volqueta	Luis Chinea
7	Yesica Pino coronado	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
8	SADIR CLIYAT	92250207	conductor Volquita	SADIR CLIYAT
9	WALTER BARBOSA	7276272	Biologo	W Barbosa
10	Humberto Escorcia	1234888624	conductor camioneta	Humberto
11	Jasney Hotta	1091662627	Ingeniera pesquera	Jasney H.
12	Oscar Pareja	72144924	OP	
13	Luis Eduardo Mitra	7216813	conductor volquete	Luis
14	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	Waldir M
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concientizacion en el autocuidado	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: 23/07/2021 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 12:00 P.m

Tipo: Capacitación ✓ Entrenamiento Charla Otros

Tema de la Actividad: Manejo Seguro y responsable de los residuos

Lugar: Las Compuertas

Expositc: Sonia Gonzalez Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa. castro. avila.	22599664	oficio - varios	Rosa
2	Yesica Pino Coronado	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
3	JADER VITAL	92280208	CONDUCTOR	
4	Luis Guillermo	1038097796	Operador	
5	Juan Chinchilla	8742576	Conductor	
6	Oscar Barrera	72144429	OP	
7	Jaime Orozco	1042351345	Residente	
8	Ruben Moreno	72308083	Conductor volquete	Ruben moreno
9	Wilmer Robles	7226272	Biologo	
10	Luis Eduardo Mizar	72166813	Conductor blindaje	
11	Domingo Bermudez	7707528	Cadenero	
12	Jasney Yorta	1091666264	Ingeniera Residente	Jasney M.
13	Humberto Escorcia	1234888624	Conducto camioneta	
14	Jose Avila	49360273	topografo	Jose A.
15	Waldir Martinez	1140838364	Conductor	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable
	Concentracion en el autocuidado	

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Scanned with CamScanner

ANEXO

PRE OPERACIONALES

TICOM...

PRE OPERACIONAL
EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión: Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Curaco

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de Personal PLACAS: IVD 666

OPERADOR: Humberto escoreña SEMANA DEL: 7/07/2025 AL: 12/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**	✓													
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de líquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto Escorcia **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Lurvaco

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de Personal PLACAS: FVO 666

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 14/07/2025 AL: 19/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**	✓													
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de líquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto escorcia **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Juruaco

TRABAJO A EJECUTAR: transporte del personal PLACAS: TVO 666

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 21/07/2025 AL: 26/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**	✓													
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto Escorcia **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Juvaco PLACAS: FVO 666

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de material

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 28/07/2025 AL: 2/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**	✓													
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto Escorcia **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Turbaco PLACAS: FVO 666

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de personal

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 4/08/2025 AL: 6/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1.2	Llantas.	✓		✓		✓									
1.3	Puertas	✓		✓		✓									
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓									
1.5	Extintor.	✓		✓		✓									
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓									
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓									
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓									
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓									
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓									
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓									
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓									
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓									
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓									
2.3	Stop.	✓		✓		✓									
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓									
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓									
2.6	Pito.	✓		✓		✓									
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓									
2.8	Tablero.	✓		✓		✓									
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓									
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓									
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									
3	**MOTOR**														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓									
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓									
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓									
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓									
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto escorcia **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Yelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas **PLACAS:** Volvo 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de Cano

OPERADOR: Luis Trespalacios **SEMANA DEL:** 7/07/2025 **AL:** 12/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Trespalacios **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** Volvo 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de Cano

OPERADOR: Luis Trespalacios **SEMANA DEL:** 14/07/2025 **AL:** 19/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis trespalacios **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** VO/VO 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de canto

OPERADOR: Wis Trespalacios **SEMANA DEL:** 21/07/2025 **AL:** 26/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Trespalacios **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas **PLACAS:** VOIVO 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de cano

OPERADOR: Luis Trespalacios **SEMANA DEL:** 28/07/2025 **AL:** 02/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Trespalacios Cargo: Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** VOLVO 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de cono

OPERADOR: Luis Fresposalacio **SEMANA DEL:** 4/8/2025 **AL:** 6/8/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓									
1,3	Puertas laterales del motor.	✓		✓		✓									
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓									
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓									
1,6	Estado de orugas.	✓		✓		✓									
1,7	Extintor.	✓		✓		✓									
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓									
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓									
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓									
1,11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓									
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓									
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓									
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓									
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓									
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓									
2,2	Plumillas	✓		✓		✓									
2,3	Pito.	✓		✓		✓									
2,4	Tablero.	✓		✓		✓									
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓									
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3,3	Nivel de liquido refrigerante del motor	✓		✓		✓									
3,4	Estado de motor de giro	✓		✓		✓									
3,5	Estado de aceite motor de giro	✓		✓		✓									
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓									
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓									
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Cristian Rozo **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas PLACAS: CAT 320CL

TRABAJO A EJECUTAR: limpieza de caño

OPERADOR: Diego Posada SEMANA DEL: 28-07-25 AL: 02-08-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Horómetro.	M		M		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	M		M		✓		✓		✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.	M		M		✓		✓		✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.	M		M		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	M		M		✓		✓		✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.	M		M		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**					✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Plumillas	M		M		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	M		M		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**					✓		✓		✓		✓			
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

//

Domingo Observaciones

//

Revisado por: Diego posada **Cargo:** operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas PLACAS: CAT 320CL

TRABAJO A EJECUTAR: limpieza de caño

OPERADOR: Diego Posada SEMANA DEL: 04-08-25 AL: 06-08-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓									
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓									
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓									
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓									
1,6	Orugas.	✓		✓		✓									
1,7	Extintor.	✓		✓		✓									
1,8	Horómetro.	M		M		✓									
1,9	Avisos laterales y aéreos.	M		M		✓									
1,10	Cinta reflectiva.	M		M		✓									
1,11	Tuercas y espárragos.	M		M		✓									
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓									
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓									
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓									
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	M		M		✓									
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1,17	Tapicería y cojinería.	M		M		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**					✓									
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓									
2,2	Plumillas	M		M		✓									
2,3	Pito.	M		M		✓									
2,4	Tablero.	✓		✓		✓									
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓									
3	**MOTOR**					✓									
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓									
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓									
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓									
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓									
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓									
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

" "

Miércoles Observaciones

" "

Jueves Observaciones

" "

Viernes Observaciones

" "

Sábado Observaciones

" "

Domingo Observaciones

" "

Revisado por: Diego posada Cargo: operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** Volvo 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de Caño

OPERADOR: Oscar Paredes **SEMANA DEL:** 07/07/25 **AL:** 12/07/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**	✓													
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).					✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Oscar Paredes **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas **PLACAS:** Volvo 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño

OPERADOR: OSCAR Paredes **SEMANA DEL:** 14-07/25 **AL:** 19-07-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		-		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Oscar Bravo **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas **PLACAS:** volvo 210

TRABAJO A EJECUTAR: limpieza de caños

OPERADOR: oscar Paredes **SEMANA DEL:** 21/07/25 **AL:** 26/07/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1;14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** Volvo 210

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de canto

OPERADOR: Oscar Paredes **SEMANA DEL:** 28/07/2025 **AL:** 02/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Oscar paredes **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Delly Flores

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas **PLACAS:** Volvo 210

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño

OPERADOR: Oscar paredes **SEMANA DEL:** 4/08/2025 **AL:** 06/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓									
1,3	Puertas laterales del motor.	✓		✓		✓									
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓									
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓									
1,6	Estado de orugas.	✓		✓		✓									
1,7	Extintor.	✓		✓		✓									
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓									
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓									
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓									
1,11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓									
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓									
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓									
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓									
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓									
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓									
2,2	Plumillas	✓		✓		✓									
2,3	Pito.	✓		✓		✓									
2,4	Tablero.	✓		✓		✓									
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓									
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3,3	Nivel de liquido refrigerante del motor	✓		✓		✓									
3,4	Estado de motor de giro	✓		✓		✓									
3,5	Estado de aceite motor de giro	✓		✓		✓									
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓									
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓									
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Oscar paredes **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Lobo

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas **PLACAS:** SDO779

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Walter martinez **SEMANA DEL:** 15-07-25 **AL:** 19-07-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.														
1,9	Cinta reflectiva.														
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.														
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.		X		X		X		X		X		X		
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓													
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Sin novedades

Martes Observaciones

||

Miércoles Observaciones

||

Jueves Observaciones

||

Viernes Observaciones

||

Sábado Observaciones

Sin novedades

Domingo Observaciones

Revisado por: Walter Martinez **Cargo:** Volquetero

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas **PLACAS:** SNO779

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Walter martinez **SEMANA DEL:** 21-07-25 **AL:** 26-07-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.														
1,9	Cinta reflectiva.														
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.														
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.		X		X		X		X		X		Y		
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓													
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de líquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Sin novedades

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

Sin novedades

Domingo Observaciones

Revisado por: Walter Martinez **Cargo:** Voluntario

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas PLACAS: SDO779

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Walter martinez SEMANA DEL: 28-07-25 AL: 02-08-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.														
1,9	Cinta reflectiva.														
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.														
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.		X		X		X		X		X		Y		
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui														
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Sin novedades

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

Sin novedades

Domingo Observaciones

Revisado por: Walter Martinez **Cargo:** Volquetero

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelli Flores

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas **PLACAS:** SDO779

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Walter martinez **SEMANA DEL:** 04-08-25 **AL:** 06 08 25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.														
1,9	Cinta reflectiva.														
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.														
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.		X		X		X		X		X		Y		
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓													
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Sin novedades

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

Sin novedades

Domingo Observaciones

Revisado por: Walter Martinez **Cargo:** Volquetero

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Los Compuertos **PLACAS:** STS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Chino **SEMANA DEL:** 07/07/2025 **AL:** 12/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Alvis ching **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: los compuertas **PLACAS:** STS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargar y descargue de material

OPERADOR: LIRY ching **SEMANA DEL:** 14/07/2025 **AL:** 19/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Chinga **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: los cumbres **PLACAS:** STS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: LUIS Ching **SEMANA DEL:** 21/07/2025 **AL:** 26/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: luis chino **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Los Compuertas **PLACAS:** LST 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargo de material

OPERADOR: Luis Chiang **SEMANA DEL:** 28/07/2025 **AL:** 02/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis ching **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas **PLACAS:** STS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Ching **SEMANA DEL:** 04/8/2025 **AL:** 06/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1,2	Llantas.	✓		✓		✓									
1,3	Puertas	✓		✓		✓									
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓									
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓									
1,6	Extintor.	✓		✓		✓									
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓									
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓									
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓									
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓									
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓									
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓									
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓									
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓									
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓									
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓									
2,3	Stop.	✓		✓		✓									
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓									
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓									
2,6	Pito.	✓		✓		✓									
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓									
2,8	Tablero.	✓		✓		✓									
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓									
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓									
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓									
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓									
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓									
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓									
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									

Lunes Observaciones

Sin novedad


Martes Observaciones

Sin novedad


Miércoles Observaciones

Sin novedad


Jueves Observaciones




Viernes Observaciones



Sábado Observaciones



Domingo Observaciones



Revisado por: Luis Ching **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas **PLACAS:** SIS 224

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Ruben moreno **SEMANA DEL:** 07/07/25 **AL:** 12/07/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Ruben Moreno **Cargo:** conductor de volqueta

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas **PLACAS:** SIS 224

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Ruben moreno **SEMANA DEL:** 14/07/2025 **AL:** 19/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Ruben Molano **Cargo:** conductor de volqueta

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas **PLACAS:** SIS 224

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Ruben moreno **SEMANA DEL:** 21/07/2025 **AL:** 26/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Ruben Moreno **Cargo:** conductor volquete

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** SJS 224

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descarge de material

OPERADOR: Ruben moreno **SEMANA DEL:** 28/07/2025 **AL:** 02/02/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Ruben moreno **Cargo:** conductor de volqueta

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las Conversas PLACAS: STS 224

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Ruben moreno SEMANA DEL: 04/08/2025 AL: 06/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1,2	Llantas.	✓		✓		✓									
1,3	Puertas	✓		✓		✓									
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓									
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓									
1,6	Extintor.	✓		✓		✓									
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓									
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓									
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓									
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓									
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓									
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓									
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓									
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓									
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓									
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓									
2,3	Stop.	✓		✓		✓									
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓									
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓									
2,6	Pito.	✓		✓		✓									
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓									
2,8	Tablero.	✓		✓		✓									
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓									
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓									
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓									
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓									
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓									
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓									
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Adrian alvarado **Cargo:** conductor de volqueta

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** wel 864

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Mizar **SEMANA DEL:** 07/07/2025 **AL:** 12/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad.

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Hizzar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** Wel 864

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Mizzal **SEMANA DEL:** 14/07/2025 **AL:** 19/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.														
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui														
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mizzor **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Delly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Los Compuertos **PLACAS:** WEI 864

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Mizzar **SEMANA DEL:** 21/07/2025 **AL:** 26/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Minar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** WEN 864

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Mieza **SEMANA DEL:** 28/07/2025 **AL:** 02/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓							
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad.

Jueves Observaciones

Sin novedad.

Viernes Observaciones

Sin novedad.

Sábado Observaciones

Sin novedad.

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mizzar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las Compuertas **PLACAS:** wgi 864

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Mazza **SEMANA DEL:** 24/08/2025 **AL:** 06/09/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1,2	Llantas.	✓		✓		✓									
1,3	Puertas	✓		✓		✓									
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓									
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓									
1,6	Extintor.	✓		✓		✓									
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓									
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓									
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓									
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓									
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓									
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓									
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓									
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓									
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓									
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓									
2,3	Stop.	✓		✓		✓									
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓									
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓									
2,6	Pito.	✓		✓		✓									
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓									
2,8	Tablero.	✓		✓		✓									
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓									
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓									
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓									
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓									
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓									
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓									
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mazzar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: las compuertas **PLACAS:** WEI 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Jader vitola **SEMANA DEL:** 07/07/2025 **AL:** 12/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

//

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

//

Domingo Observaciones

//

Revisado por: JAIME VITAL **Cargo:** CONDUCTOR Y ORDENANZA

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: los compuertas **PLACAS:** WEN 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Jaber Vitar **SEMANA DEL:** 14/07/2025 **AL:** 19/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

//

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

//

Domingo Observaciones

Revisado por: JADER PITAL **Cargo:** CONDUCTOR VOLQUETA

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: los comuneros **PLACAS:** WCN 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Jaser Vitola **SEMANA DEL:** 28/07/2025 **AL:** 02/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

//

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

//

Domingo Observaciones

//

Revisado por: [illegible] **Cargo:** COMPUTADOR VOBO VISITA

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compuertas **PLACAS:** WCI 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Jader Ruiz **SEMANA DEL:** 21/07/2015 **AL:** 26/07/2015

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

//

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

//

Domingo Observaciones

Revisado por: JADER VITAL **Cargo:** COMPLETO - VOLQUETA

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Las compartas **PLACAS:** vej 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Javier vila **SEMANA DEL:** 04/08/2025 **AL:** 06/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓									
1,2	Llantas.	✓		✓		✓									
1,3	Puertas	✓		✓		✓									
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓									
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓									
1,6	Extintor.	✓		✓		✓									
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓									
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓									
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓									
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓									
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓									
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓									
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓									
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓									
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓									
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓									
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓									
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓									
2,3	Stop.	✓		✓		✓									
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓									
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓									
2,6	Pito.	✓		✓		✓									
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓									
2,8	Tablero.	✓		✓		✓									
2,9	Baliza y buggui														
3	**MOTOR**	✓		✓		✓									
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓									
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓									
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓									
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓									
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓									
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓									
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓									
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓									
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓									
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓									

Lunes Observaciones

//

Martes Observaciones

//

Miércoles Observaciones

//

Jueves Observaciones

//

Viernes Observaciones

//

Sábado Observaciones

//

Domingo Observaciones

//

Revisado por: Jodin Vital **Cargo:** Conductor Vehiculo Liviano

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

ANEXO

AST

TICOM S.A.
SOLUCIONES CONFIABLES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nit 830.509.2783

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4
Fecha de Version: Julio 23/2022
Pagina 1 de 2

INICIO : Dia: 04 Mes: 08 Año: 25

FINAL: Dia: 06 Mes: 08 Año: 25

Aislamiento de energias peligrosas:
- ☐ Termica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinetica/Mecanica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Quimica
- ☐ Electrica
- ☐ Hidraulica/Neumatica

EPP Requeridos
- ☑ Casco
- ☑ Ropa de seguridad
- ☑ Proteccion facial/ojos
- ☐ Proteccion Auditiva
- ☐ Proteccion Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Proteccion Contra Caidas

Tareas de Alto Riesgo
- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavacion
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripcion de la Actividad:
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION

Proyecto:
LIMPIEZA DE CAÑO

Lugar:
los compuertas

AST Preparado por: Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
Mariaca Torregroza	AUX SOCIAL	Firma:	Firma:	Firma: Supervisor SST

Pasos detallados de la tarea (use hojas adicionales si es necesario)	Peligros existentes y potenciales (use hojas adicionales si es necesario)	Riesgo Inicial	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos Despues
INSPECCON DE L AREA	. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	. TEMPERATURA EXTREMA .AGRESION VERBAL Y FISICA	M	HIDRATACION EPP	B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGUERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS	B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA	B
.VISITAS CON LIDERES COMUNALES .VISITAS INTITUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES	B
VOLANTEO CON IBFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS	B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE	B
	RIESGO FISICO, QUIEMICO, BIOLOGICO. BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO		PAUSAS	

PELIGRO: Fuente,situacion o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores,en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinacion de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

TICOM S.A. SOLUCIONES COMPARTIDAS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Nit 830.509.2763	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)	Version No: 4 Fecha de Version: Julio 23/2022 Pagina 2 de 2

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Mañanela Tomegroza	Mañanela Tomegroza	04/08/25
Mañanela Tomegroza	Mañanela Tomegroza	05/08/25
Mañanela Tomegroza	Mañanela Tomegroza	06/08/25

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:

CONSECUENCIA: Es el resultado de una accion llamese negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos,normas y actos que se realizan para mitigar,reducir o eliminar el peligro.

TICOM B.A.
SOLUCIONES CONFIABLES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nit 830.509.2763

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4
Fecha de Version: Julio 23/2022
Pagina 1 de 2

INICIO : Dia: 28 **Mes:** 07 **Año:** 25

FINAL: Dia: 28 **Mes:** 08 **Año:** 25

Aislamiento de energias peligrosas:
- ☐ Termica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinetica/Mecanica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Quimica
- ☐ Electrica
- ☐ Hidraulica/Neumatica

EPP Requeridos
- ☑ Casco
- ☑ Ropa de seguridad
- ☑ Proteccion facial/ojos
- ☐ Proteccion Auditiva
- ☐ Proteccion Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Proteccion Contra Caidas

Tareas de Alto Riesgo
- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavacion
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripcion de la Actividad:
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION

Proyecto:
LIMPIEZA DE CAÑO

Lugar: las Compuertas

AST Preparado por: Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre also a Cargo:
Mariapaula Tomegroza	Aux social	Firma:	Firma:	Firma: Supervisor SST

Pasos detallados de la tarea (use hojas adicionales si es necesario)	Peligros existentes y potenciales (use hojas adicionales si es necesario)	Riesgo Inicial	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos Despues
INSPECCON DE L AREA	. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	. TEMPERATURA EXTREMA .AGRESION VERBAL Y FISICA	M	HIDRATACION EPP	B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGUERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS	B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA	B
.VISITAS CON LIDERES COMUNALES .VISITAS INTITUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES	B
VOLANTEO CON IBFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SÓLAR PARTICIPACION EN CHARLAS	B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE	B
	RIESGO FISICO, QUIEMICO, BIOLOGICO. BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO		PAUSAS	

PELIGRO: Fuente,situacion o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores,en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinacion de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

TICOM S.A.S. SOLUCIONES CONFIABLES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA NIT 830.509.2783	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)	Version No: 4 Fecha de Version: : Julio 23/2022 Pagina 2 de 2

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA: :	FECHA:		NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Marianela Torregrosa	Marianela Torregrosa	28/07/25				
marianela torregrosa	Marianela Torregrosa	29/07/2025				
marianela torregrosa	Marianela Torregrosa	30/07/2025				
marianela torregrosa	Marianela Torregrosa	31/07/2025				
marianela torregrosa	Marianela Torregrosa	1/08/2025				
marianela torregrosa	Marianela Torregrosa	2/08/2025				

CONSECUENCIA: Es el resultado de una accion llamese negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos,normas y actos que se realizan para mitigar,reducir o eliminar el peligro.

TICOM S.A.
SOLUCIONES CONFIABLES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nit 830.509.2763

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4
Fecha de Version: Julio 23/2022

INICIO : Dia: 14 Mes: 07 Año: 25 **FINAL:** Dia: 17 Mes: 07 Año: 25

Aislamiento de energias peligrosas:
- ☐ Termica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinetica/Mecanica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Electrica
- ☐ Hidraulica/Neumatica

EPP Requeridos
- ☑ Casco
- ☑ Ropa de seguridad
- ☑ Proteccion facial/ojos
- ☐ Proteccion Auditiva
- ☐ Proteccion Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Proteccion Contra Caidas

Tareas de Alto Riesgo
- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavacion
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripcion de la Actividad:
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION

Proyecto:
LIMPIEZA DE CAÑO

Lugar:
Los Cuervitos

AST Preparado por: Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre also a Cargo:
Mariaela Torregroza	AUX Social	Firma:	Firma:	Firma: Yelly Florez Supervisor SST

Pasos detallados de la tarea (use hojas adicionales si es necesario)	Peligros existentes y potenciales (use hojas adicionales si es necesario)	Riesgo Inicial	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos Despues
INSPECCON DE L AREA	. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	. TEMPERATURA EXTREMA .AGRESION VERBAL Y FISICA	M	HIDRATACION EPP	B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGUERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS	B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA	B
.VISITAS CON LIDERES COMUNALES .VISITAS INTITUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES	B
VOLANTEO CON IBFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS	B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE	B
	RIESGO FISICO, QUIEMICO, BIOLOGICO. BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO		PAUSAS	

PELIGRO: Fuente,situacion o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores,en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinacion de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

TICOM S.A. SOLUCIONES COMPARTIDAS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA Nit 830.509.2763	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)	Version No: 4 Fecha de Version: Julio 23/2022 Pagina 2 de 2

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Mariaela torregroza	Manuela Torregroza	14/07/25
Mariaela torregroza	Manuela Torregroza	15/07/25
Mariaela torregroza	Manuela Torregroza	16/07/25
Mariaela torregroza	Manuela Torregroza	17/07/25
		18/07/25

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:

CONSECUENCIA: Es el resultado de una accion llamese negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos,normas y actos que se realizan para mitigar,reducir o eliminar el peligro.

TICOM S.A.
SOLUCIONES CONFIABLES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nit 830.509.2783

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4
Fecha de Version: Julio 23/2022
Pagina 1 de 2

INICIO : Dia: 21 Mes: 07 Año: 25 **FINAL:** Dia: 25 Mes: 07 Año: 25

Aislamiento de energias peligrosas:
- ☐ Termica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinetica/Mecanica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Quimica
- ☐ Electrica
- ☐ Hidraulica/Neumatica

EPP Requeridos
- ☑ Casco
- ☑ Ropa de seguridad
- ☑ Proteccion facial/ojos
- ☐ Proteccion Auditiva
- ☐ Proteccion Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Proteccion Contra Caidas

Tareas de Alto Riesgo
- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavacion
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripcion de la Actividad:
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION

Proyecto:
LIMPIEZA DE CAÑO

Lugar:
los compuertas

AST Preparado por: Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
Marianela Tomagroza	Aux social	Firma:	Firma:	Firma: Supervisor SST

Pasos detallados de la tarea (use hojas adicionales si es necesario)	Peligros existentes y potenciales (use hojas adicionales si es necesario)	Riesgo Inicial	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos Despues
INSPECCON DE L AREA	. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	. TEMPERATURA EXTREMA .AGRESION VERBAL Y FISICA	M	HIDRATACION EPP	B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGUERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS	B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA	B
.VISITAS CON LIDERES COMUNALES .VISITAS INTITUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES	B
VOLANTEO CON IBFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS	B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE	B
	RIESGO FISICO, QUIEMICO, BIOLOGICO. BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO		PAUSAS	

PELIGRO: Fuente,situacion o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores,en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinacion de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

TICOM S.A. SOLUCIONES CONFIABLES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA Nit 830.509.2783	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)	Version No: 4 Fecha de Version: Julio 23/2022 Pagina 2 de 2

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:	NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Mariaresa torregroza	Mariaresa Torregroza	21/07/2025			
Mariaresa torregroza	Mariaresa Torregroza	22/07/2025			
Mariaresa torregroza	Mariaresa Torregroza	23/07/2025			
Mariaresa torregroza	Mariaresa Torregroza	24/07/2025			
Mariaresa torregroza	Mariaresa Torregroza	25/07/2025			

CONSECUENCIA: Es el resultado de una accion llamese negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos,normas y actos que se realizan para mitigar,reducir o eliminar el peligro.
