FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	28/07/2025
Semana No	**12**	**Del :**	21/07/2025	AL:	27/07/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		82	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		34,17%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,50%**	**13,9477%**	**(%) Ejecutado**	**4,56%**	**18,55%**
Valor programado ($)	**$ 19.496.252,65**	**$ 181.160.021,22**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 59.173.532,77**	**$ 240.903.018,77**
			Evaluación	**Porcentaje positivo**	**4,60%**
				Valor positivo	**$ 59.742.997,55**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-26	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

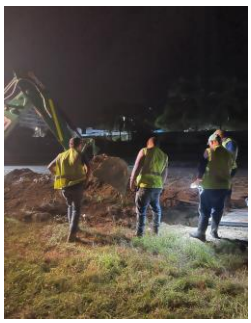
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

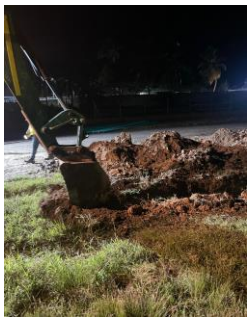
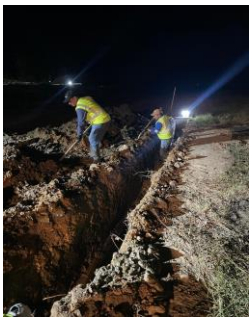
* se realizo reunion electrica el dia marte 23 de julio de 2025 ,para revisar las subsancion de acuerdo a las observaciones presentadas por la entidad sin embargo el ing Didier solicita ajustar la longitudes de las balizas .
* El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 11
* el dia 23 de julio 2025 se envia oficio a la entidad con la recomendación del Cambio de especificación de Lavado de pintura
* se Realiza comite No. 12 el dia jueves 24 de julio 2025
* se le giro el anticipo a la fiducia el dia 22 de julio 2025
* se realiza recorrdio de obra con el inge Andres Felipe Sanchez apoyo a la supervision
* se radican acta parcial de obra No.1 y No.2 de obra e interventoria

OBRAS LADO AIRE

Actividades de la semana No. 12 comprendida entre el 21 de julio de 2025 y el 27 de juLio de 2025:

* Se realizó excavación mecánica para canalizacion eléctrica de la caja 7 a la 2
* tramo de banco de ductos de 4-4"
* Se rellena con el material provniente de excavación
* Se instala cinta de señalización, capa de arena y se compacta material para nivelación de canalización.




FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Canalizaciones y Ductos

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

AMBIENTAL :

* Durante el periodo entre el 21 al 27 julio no se realizaron inducciones ni capacitaciones puesto que no hubo ingreso de personal.
* Se sigue contando con Canecas para la separación de residuos :

✓Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
✓Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
✓Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

* Del 21 al 27 de julio se realizaron las siguientes actividades:

* Se instaló tubería entre las cajas 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2






SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

Durante el periodo comprendido entre el 21 al 27 de julio, el contratista sigue cumpliendo con toda la documentacion requerida , tanto del personal, maquinaria y vehiculo. los cuales se les realiza seguimiento de actualizacion si se requiere.

Se realizó la entrega de los documentos preoperacionales para su diligenciamiento semanal

CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante este periodo del 21 al 27 El contratista realiza charlas diarias de seguridad , con el fin de concientizar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y promover practicas seguras en el lugar de trabajo y a si minimizar el riesgo de accidentes.

* **EMERGENCIA:**

Durante el periodo comprendido entre el 21 al 27 de julio el contratsita sigue contando con los siguientes elementos en caso de emergencias.

1 Botiquín de primero auxilios
1 Camilla rígida para traslado de heridos
1 Extintor de 10 L, tipo C

Durante el periodo comprendido entre el 21 al 27 de julio no se realizaron afiliaciones, no ingreso personal al proyecto

*

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Durante el periodo comprendido entre el 21 al 27 de julio se realizó reposición de gafas y guantes

*

SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 21 al 27 de julio no se realizaron afiliaciones, no ingreso personal al proyecto





FORMATO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	16



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	En Sitio de obra, pendiente aprobacion de OINAC para ingreso
Total Maquinaria		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/25 al 05/6/25	$ 17.633.000,00
2	6/06/2025 al 05/07/2025	$ 82.581.646,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 100.214.646,00	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 100.214.646,00
% Avance facturado Acumulado
7,72%

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.					
1	6/5/25 al 05/6/25	$ 21.323.772,00		Valor Total Contrato interventoria	
2	6/06/2025 al 05/07/2025	$ 30.165.598,00		$ 319.683.453,00	
3				Valor facturado Contrato Interventoria	
4				$ 51.489.370,00	
5				% Avance facturado Acumulado	
6				16,11%	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Total Acumulado	$ 51.489.370,00				

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga
