REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

INFORME TOPOGRAFICO DE INTERVENTORÍA
VEREDA ALTO JORDAN

PERIODO
1 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS
GRUCOING

TOPOGRAFA
MARYORI COLONIA VARGAS
MP. 01-15496 CPNT

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS. 4
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 4
3 LOCALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO. 5
4 INFORMACION GENERAL 6
Información general del contrato de interventoría. 6
5 DELTAS Y REFERENCIAS 7
6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 7
7 RECURSOS UTILIZADOS: 8
7.1 RECURSOS HUMANOS: 8
7.2 RECURSOS TÉCNICOS: 8
7.2.1 HERRAMIENTAS: 9
7.2.3 INSUMOS: 9
7.3 EQUIPOS DE OFICINA: 9
7.4 SOFTWARE UTILIZADOS: 9
8 REGISTRO FOTOGRAFICO 10
9 CONCLUSIONES 11
10 ANEXOS 12
10.1 PLANOS 12
10.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 12
10.3 CERTIFICADO DE CALIBRACION ESTACION TOTAL 12
10.4 LICENCIA PROFESIONAL 12
10.5 CERTIFICADO DE VIGENCIA 12
10.6 CARTERA TOPOGRAFICA 12

1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del proyecto **"INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTARTIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"- LOTE 4**., la topografía juega un papel fundamental, ya que permite establecer las condiciones geométricas y físicas del terreno donde se ejecutará la obra. El levantamiento topográfico es esencial para la correcta planificación, diseño y ejecución de las actividades constructivas, asegurando que las estructuras se adapten adecuadamente a las características geográficas y cumplan con los requisitos técnicos necesarios.

Desde el rol de la interventoría, es fundamental garantizar que todas las actividades topográficas se realicen con precisión, cumpliendo con los estándares técnicos establecidos y asegurando la correcta interpretación y aplicación de los datos levantados en campo. La labor de la interventoría en esta etapa del proyecto consiste en verificar que los procedimientos topográficos sigan las especificaciones del diseño, manteniendo un control riguroso sobre los puntos de referencia, coordenadas y altimetría para asegurar la calidad y exactitud de la información recolectada.

Este informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 27 de diciembre de 2024 y tiene como objetivo documentar las actividades topográficas desarrolladas, las metodologías empleadas, los equipos utilizados y los resultados obtenidos, con el fin de avalar la precisión de las mediciones realizadas. Asimismo, se incluyen observaciones y recomendaciones surgidas durante el proceso de supervisión topográfica, con el fin de optimizar el desarrollo de la obra y prevenir posibles desviaciones en la ejecución del proyecto.


2. OBJETIVOS.

Garantizar que las actividades topográficas realizadas dentro del Marco del programa caminos comunitarios de la paz total" lote 4. de la vereda ALTO JORDAN, en el municipio del Retorno, Guaviare, se ajusten a las especificaciones técnicas, normativas vigentes, asegurando la precisión y calidad de los datos levantados, contribuyendo al adecuado desarrollo del proyecto bajo la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Reconocer el alcance del levantamiento topográfico en la zona nombrada en el convenio.
- Identificar la metodología empleada en campo y en oficina para la obtención de los productos.
- Localizar geográficamente el sector ha intervenir desde el contexto técnico

3 LOCALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO.

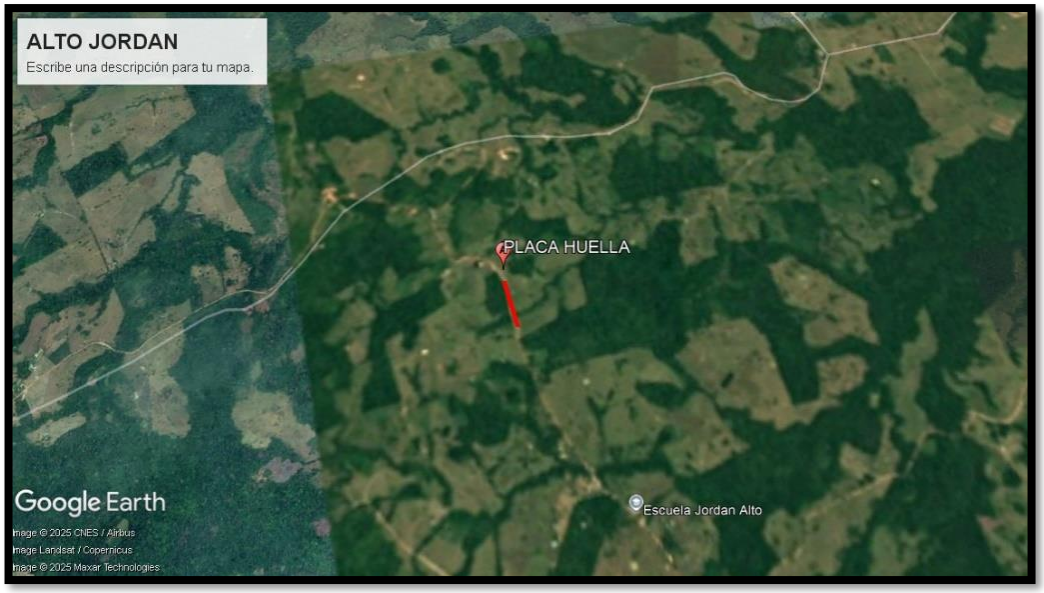

La vereda **Alto Jordán** se encuentra en el municipio de **El Retorno**, en el **departamento del Guaviare**, Colombia. El Retorno está situado en la region amazónica del país, y la vereda Alto Jordán forma parte de las áreas rurales de este municipio.
Al igual que con otras veredas de esta región, está situada al norte o noreste del río Guaviare, en la zona rural que rodea el casco urbano del municipio de El Retorno.

4 INFORMACION GENERAL

Información general del contrato de interventoría.

No CONVENIO:	2966-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO JORDAN DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA DE OBRA:	JAC VEREDA ALTO JORDAN
NIT:	900.988.937-0
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VENTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($199.421.877,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
FECHA DE INICIACIÓN:	20/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024
SUSPENSION 1:	18/12/2024
FECHA DE REANUDACION:	19/02/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	03/03/2025
PÓLIZA CUMPLIMIENTO:	CV-100043383
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL:	CV-100011566
PROCESO DE LICITACION INTERVENTORIA:	CMA-DEO-SVR-CCPT047-2024,
CONTRATO No:	3565 DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A. S
NIT:	NIT. 830.509.427-9.
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.014.395.039.00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIACIÓN:	17/10/2024
SUSPENSION 1:	27/12/2024
FECHA DE REANUDACION:	27/02/2025
DIRECCION:	CALLE 32 NO 8-41 gerencia.grucoingsas@gmail.com FLORIDABLANCA, SANTANDER

5 DELTAS Y REFERENCIAS

El Levantamiento topográfico se realizó con mojones georeferenciadas con equipos de Alta precisión (RTK) según la norma técnica colombiana NTC 6271 de 2018 referida a la Georreferenciación de proyecto y levantamiento topográficos es la establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Para este caso el IGAC establece que toda la cartografía del país debe estar referida bajo el sistema de referencia Origen Único Nacional MAGNA SIRGAS.

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS1	1815824.21	5031800.44	201.383
BASE	1815742.86	5031794.97	210.8082

BASE **GPS1**





6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades que se desarrollaron en el siguiente levantamiento fueron:

- Se hace solicitud de acompañamiento a presidente de la junta de acción comunal del presente convenio.
- Localizacion de tramos donde se van ha ejecutar las obras.
- Ubicación de puntos de amarre georreferenciados suministrados por invias.
- Se inicia levantamiento con estación total topcon GTS 255 con toma de detalles por método nube de puntos para generar un modelo digital de lo existente en campo.
- Descarga de datos del levantamiento.
- Procesamiento de información obtenida.
- Generación de planos y carteras topográficas.
  Como resultado elaboración de informe y modelo digital de la información.

7 RECURSOS UTILIZADOS:

7.1 RECURSOS HUMANOS:

La comisión topográfica que desarrollo el levantamiento está compuesta por:

- 1.Topógrafo con su respectiva dotación de seguridad
- 1. Auxiliar de topografía con su respectiva dotación de seguridad.

7.2 RECURSOS TÉCNICOS:

Los equipos utilizados para el levantamiento fueron los siguientes:

- 1.Camioneta fotón 4x4 de platón
- 1.Estación total Marca Topcon modelo GTS-255.
- 1.Trípode
- 1.Bastón de 2.6 m
- 1.Prisma
- 2.Radios de comunicación





7.2.1 HERRAMIENTAS:

- 1. Almádana de 4 lb.
- 1. Flexómetro 5 m.

7.2.3 INSUMOS:

- Pintura roja (aerosol)
- Puntilla 1" en acero
- Estacas madera 3x4 de 25 cm

7.3 EQUIPOS DE OFICINA:

Los equipos de oficina utilizados en la ejecución del Proyecto son:

- 2 computadores utilizados en campo y oficina para el procesamiento diario de la información.

7.4 SOFTWARE UTILIZADOS:

- Programas de descarga de archivos y procesamiento de información. AutoCAD, topconlink, Excel, Word, Google earth.

8 REGISTRO FOTOGRAFICO













9 CONCLUSIONES

El levantamiento topográfico realizado en la vereda ALTO JORDAN donde se van a construir 78 ml de placa huella ha permitido obtener una representación precisa y detallada determinado la topografía del área, incluyendo pendientes, cotas de nivel, A través de la medición de los diferentes puntos y la elaboración de los planos correspondientes.

- No se observan obstáculos evidentes que dificulten la construcción, cuenta con el ancho adecuado de la via y se evidencia que es una zona que en temporada de invierno dificulta y limita el transporte y Desplazamiento debido a que por su tipo de suelo se vuelve muy liso provocando difícil acceso a la comunidad.



MARYORI COLONIA VARGAS MP. 01-15496
TGO. TOPOGRAFIA

10 ANEXOS

10.1 PLANOS


10.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS

10.3 CERTIFICADO DE CALIBRACION ESTACION TOTAL

10.4 LICENCIA PROFESIONAL

10.5 CERTIFICADO DE VIGENCIA


10.6 CARTERA TOPOGRAFICA

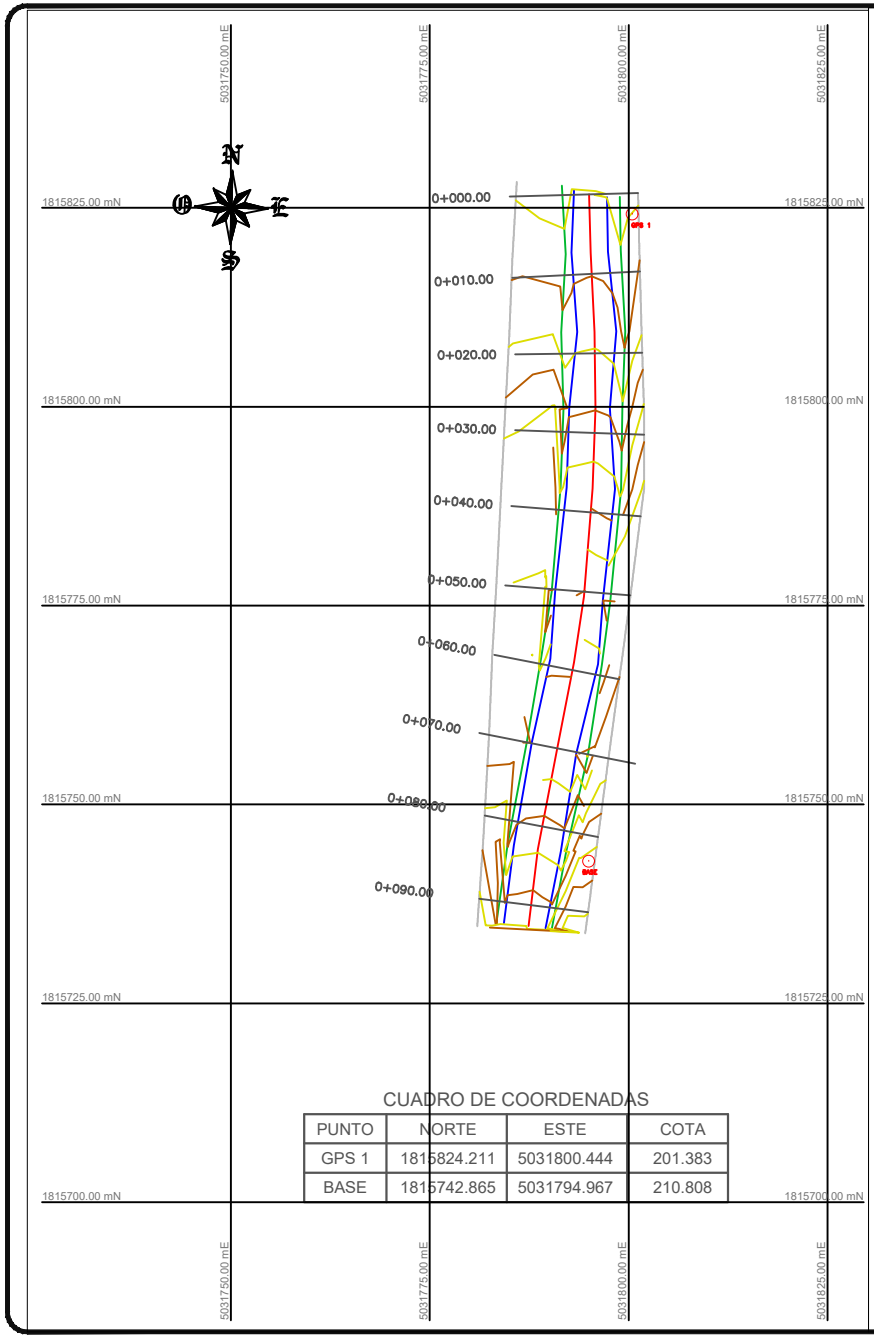

CUADRO DE COORDENADAS

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS 1	1815824.211	5031800.444	201.383
BASE	1815742.865	5031794.967	210.808

PERFIL LONGITUDINAL

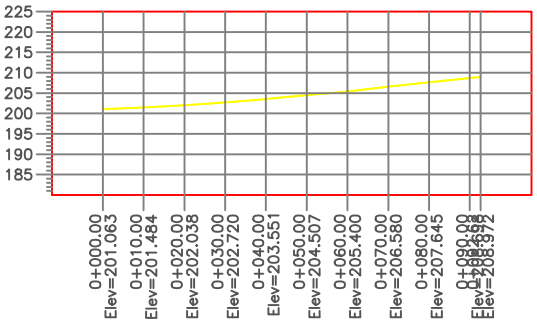


PERFIL 1

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100

ESCALA VERTICAL 1 : 100

SECCIONES TRANSVERSALES

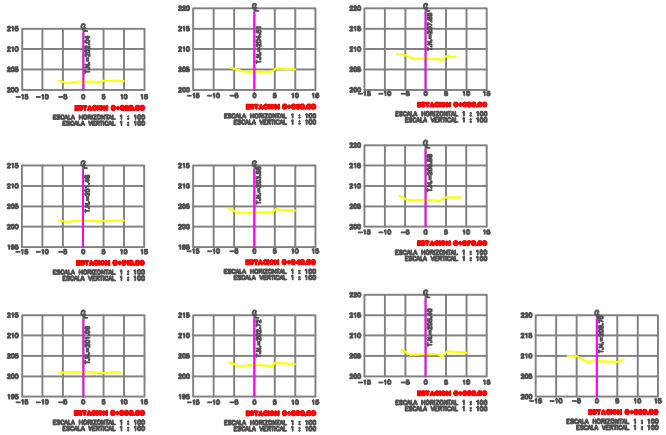

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

INTERVENTORIA: GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

CONTRATISTA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – INVIAS

PROYECTO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"- LOTE 4

CONVENSIONES:

- EJE
- BV
- CUNETA
- CERCA
- CURVA DEL
- CURVA GRU
- ALCANTARILLA
- DELTA

CUADRO DE COORDENADAS

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS 1	1815824.211	5031800.444	201.383
BASE	1815742.865	5031794.967	210.808

SISTEMA DE COORDENADAS GEOCENTRICAS:

El sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) es un sistema de proyección cartográfico basado en cuadrículas con el cual se pueden referenciar puntos sobre la superficie terrestre. El elipsoide asociado corresponde con el GRS-80 (Global Reference System 1980), equivalente al WGS84

DATUM: MAGNA SIRGAS

- COORDENADAS PLANAS: GAUSS-KRÖGER – ORIGEN UNICO NACIONAL.
- PROYECCIÓN: TRANSVERSA DE MERCATOR.
- FALSO ESTE: 5'000.000 m.
- FALSO NORTE: 2'000.000 m.
- LONGITUD ORIGEN: 73° W.
- LATITUD ORIGEN: 04° N.
- UNIDADES: METRO (m).
- FACTOR ESCALAR: 1
- MODELO GEOIDAL: EGM2008

CONTIENE:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PERFIL LONGITUDINAL– SECCIONES TRANSVERSALES

PLACA HUELLA VEREDA ALTO JORDAN

DIBUJO: MARYORI COLONIA VARGAS

TOPOGRAFO

TP. 01-15496 CNTP

REALIZÓ / DIGITALIZÓ:

ESCALA:	PLANO:	FECHA:
1:25	1 DE 1	DICIEMBRE 2024

Serie GTS-250
ESTACIÓN TOTAL





Alto rendimiento y alta calidad

- Resistente al agua y al polvo superior
- Alta precisión y largo rango de medición
- Codificador absoluto mejorado
- Funciones de aplicación versátiles
- Sensor de inclinación de doble eje


Estación total de la serie GTS-250

Alto rendimiento y alta calidad



Alta precisión y largo rango de medición

- Alta precisión: ± (2 mm + 2 ppm x D) m.s.e.
- Larga distancia: 2.000 m con un solo prisma.

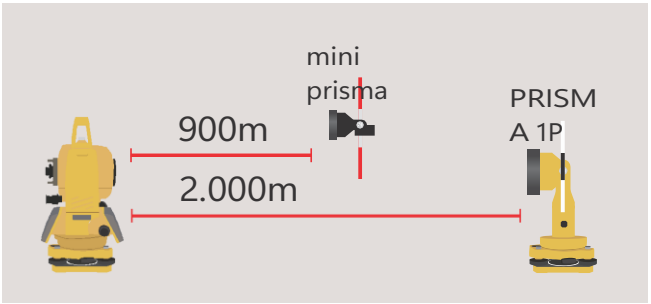



Superior a prueba de agua y polvo

La serie GTS-250 cumple con la norma IEC IP54. No te preocupes por el mal tiempo repentino.

Sensor de inclinación de doble eje

El sensor de inclinación de doble eje monitorea la inclinación de los ejes X e Y, y las lecturas correctas de ángulo horizontal y vertical se alian automáticamente.

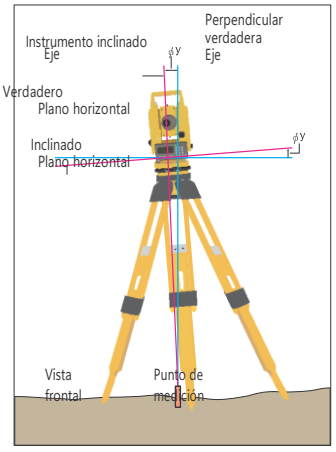

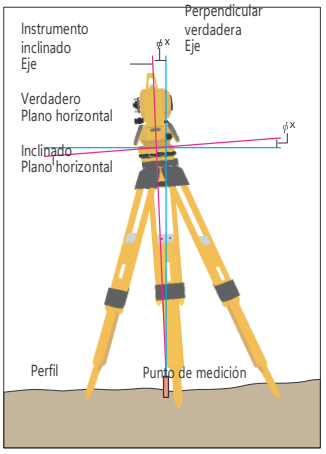

Codificador absoluto mejorado

La serie GTS-250 adoptó un sistema de codificador absoluto, que no requiere un ajuste 0 y realiza una medición estable con menos error de lectura .

Capacidad de memoria extragrande para 24.000 puntos


La serie GTS-250 almacena los datos medidos hasta 24.000 puntos.

Funciones de aplicación versátiles

Recopilación de datos a bordo, topografía, diseño, cálculo de carreteras y muchas más funciones.


Medición remota de elevación (R.E.M.)


Para determinar fácilmente la altura de un punto donde no se puede colocar un Prisma. Tome una distancia a un prisma colocado directamente encima o directamente debajo del punto objetivo, luego mire hacia el punto objetivo.



Medición de línea faltante (M.L.M.)

Para medir la distancia horizontal, la distancia de pendiente y la diferencia de altura entre dos prismas.

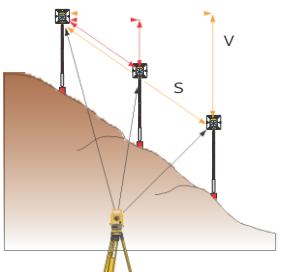

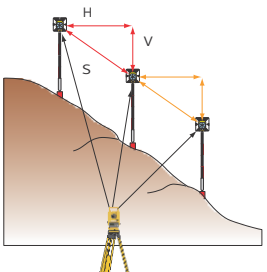

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mango desmontable diseñado ergonómicamente para facilitar el agarre

Telescopio claro y brillante Ampliación: 30x Enfoque mínimo: 1,3 m

Marca central del instrumento

Captura aproximada pero rápida del prisma mediante colimador de avistamiento



Batería recargable BT-G1W

Plomada óptica Ampliación: 3x





Tornillo tangente de bloqueo y ajuste fino.

Empuñadura telescópica que permite un ajuste sutil

Nivel circular para facilitar el control

Intercambio de datos con PC a través del puerto RS-232C

Basebase nivelante integrada con función de bloqueo/liberación rápida




Pantallas de fácil visualización con 4 líneas 20 caracteres, con retroiluminación y calefactor en ambas caras

Teclados de 10 teclas fáciles de usar con entrada del alfabeto en ambas caras

Nivelación precisa mediante un nivel de placa altamente sensible


DISTRIBUCIÓN

Función de diseño para la medición de coordenadas y las mediciones de replanteo y resección de control.



Carretera

La Función Road calcula automáticamente los parámetros de una curva en espiral complicada y una ruta de larga distancia simplemente definiendo el punto de inicio, el punto final y los elementos de la curva.



CARACTERÍSTICA

Modelo		GTS-252	GTS-255
Telescopio			
Magnificación		30 veces	
Poder de resolución		3.0"	
Longitud: 150 mm, Apertura del objetivo: 45 mm (50 mm para EDM), Imagen: Erecto, Campo de visión: 1°30' (26 m/1.000 m), Enfoque mínimo: 1,3 m			
Angle measurement			
Display resolutions (selectable)		1" / 5" (0.0002 / 0.001gon)	
Accuracy (ISO 17123-3:2001)		2"	5"
Method		Absolute rotary encoder scanning	
Detecting system	Horizontal	2 sides	
	Vertical	1 side	
Compensator		Dual-axis liquid tilt sensor, working range: ±3', Correction unit: 1"	
Distance measurement (en condiciones medias *1)			
	One prism	2,000m (6,600ft.) / Under good conditions*2: 2,300m (7,500ft.)	
	Three prisms	2,700m (8,900ft.) / Under good conditions*2: 3,100m (10,200ft.)	
Accuracy (D=measuring distance in mm)		±(2mm + 2ppm x D) m.s.e.	
Least count in measurement		Fine: 1mm (0.005ft.) / 0.2mm (0.001ft.), Coarse: 10mm (0.02ft.) / 1mm (0.005ft.), Tracking: 10mm (0.02ft.)	
Measurement time*3		Fine: 1mm: 1.2s (Initial 4s) / 0.2mm: 2.8s (Initial 5s), Coarse: 0.7s (Initial 3s), Tracking: 0.4s (Initial 3s)	
Interface and Data management			
Display		Graphics LCD, 160 × 64dots	
Keyboard		Alphanumeric 24keys	
Control panel location		On both faces	
Data storage	Internal memory	24,000pts.	
Interface		RS-232C	
General			
Levels	Circular level	10' / 2mm	
	Plate level	30" / 2mm	
Optical plummet telescope		Magnification: 3x, Focusing range: 0.5m to infinity, Image: Erect	
Dust and water protection (With BT-G1W)		IP54 (IEC 60529)	
Operating temperature		-20 to +50°C (-4 to 122°F)	
Size / Instrument height		W184 x D172 x H336mm (W7.2 x D6.8 x H13.2in.) /176mm (6.93in.) from the tribrach dish	
Weight	Instrument with battery	4.9kg (10.8lbs)	
	Plastic carrying case	3.4kg (7.5lbs), Weight of the carrying case may be slightly different due to specific market.	
Power supply			
Battery (BT-G1W)	Operating time (Fine mode)	Approx. 27 hours (Single distance measurement every 30 seconds at +20°C / +68°F*4)	
		Approx. 9 hours (Continuous distance measurement at +20°C / +68°F)	
Battery charger	Recharging time	1.8 hours (+10 to +40°C)	

*1 Condiciones promedio: Neblina leve con visibilidad de unos 20 km (12,5 millas), luz solar moderada con un ligero brillo de calor. *2 Buenas condiciones: Sin neblina con visibilidad de unos 40 km (25 millas), nublado sin brillo de calor .
*3 El tiempo inicial será diferente según una condición y la configuración del tiempo de apagado de EDM. *4 Con la condición de que el tiempo de apagado de EDM se establezca en 0 minutos.



Accesorios estándar

- Unidad principal x 1
- Batería (BT-G1W) x 1
- Cargador de batería x 1
- Tapa de lente x 1
- Kit de herramientas con estuche x 1
- Cubierta de lluvia de plástico x 1
- Tela de silicona x 1
- Estuche de transporte x 1

CORPORACIÓN TOPCON
75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokio 174-8580, Japón
Teléfono: (+81)3-3558-2993 Fax: (+81)3-3960-4214 www.topcon.co.jp

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las demás marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Su concesionario local autorizado de Topcon es:

©2013 Topcon Corporation Todos los derechos reservados. P-171-1 GE

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5495

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN**:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN**:	27 DE MARZO DE 2025
REFERENCIA:	GTS 255W	**CLIENTE**:	GRUCOING S.A.S.
PRECISIÓN ANGULAR R:	1"	**CC**:	830509427-9
PRECISIÓN A DISTANCIA:	2mm + 2ppm	**DIRECCIÓN**:	
SERIAL:	LA0084	**CIUDAD**:	BUCARAMANGA, Santander
		CELULAR:	3176446297

DATOS DE TRAZABILIDAD EQUIPO PATRON UTILAZADO PARA REALIZAR EL AJUSTE

SURVEY RENTAL & SALES SAC EXPIDE CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 25583-23 PARA ESTACION TOTAL MARCA GEOMAX REFERENCIA ZOOM 25 1" SERIAL: 2839480.

METODO DE AJUSTE UTILIZADO

SUSTITUCION O (TRANSFERENCIA) MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE CON PATRON DE TRABAJO LAS MEDIDAS MATERIALIZADAS DE REFERENCIA, LAS CUALES SERAN COMPARADAS CON LOS VALORES DEL EQUIPO A REALIZAR EL AJUSTE PARA POSTERIORMENTE APLICAR LA CORRECCION DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE
NIVELES TABULARES Y ESFERICOS
VERTICALIDAD
OPTICA GENERAL
EJE VERTICAL Y HORIZONTAL
FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES
PLOMADA OPTICA Y/O LASER

AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES

ACEPTABLE

INSPECCIÓN Y AJUSTE SISTEMA ANGULAR

INSPECCIÓN DE ENTRADA

POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	89°	59'	06"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	269°	59'	26"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	179°	59'	53"

INSPECCIÓN DE SALIDA

POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	89°	59'	51"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	270°	00'	09"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	00"

ERROR OBSERVADO V	1°	00'	28"	ERROR OBSERVADO V	00°	00'	0"
ERROR OBSERVADO H	00°	00'	53"	ERROR OBSERVADO H	00°	00'	0"

MENSURADO
N°1 PRISMA; N°2 LASERA; N°3 DIANA

MENSURANDO	PATRON	EQUIPO AJUSTADO	DIFERENCIA
N°1	11.591		
N°2	11.620		
N°3	11.605		

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.com

JM EQUIPOS	**F- CERTIFICADO DE AJUSTE**	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 2 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5495

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN**:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN**:	27 DE MARZO DE 2025
REFERENCIA:	GTS 255W	**CLIENTE**:	GRUCOING S.A.S.
SERIAL:	LA0084	**CC**:	830509427-9

CONDICIONES PRESENTES EN EL LABORATORIO EN EL PROCESO DE AJUSTE

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA: 22°C
HUMEDAD RELATIVA MINIMA: 63%
PRESION ATMOSFERICA: 760 mmHg

TEMPERATURA MAXIMA: 25°C
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA 69%

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR, COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO S/N:12-0663

COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
COMPENSADOR ELECTRÓNICO	
AJUSTE Y VERIFICACIÓN	**ACEPTABLE**

INSPECCIÓN EDM SOBRE LÍNEA BASE 17.006 m (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 25°C, PRESIÓN ATMOSFERICA 760mmhg, CONSTANTE DEL PRISMA -30

PRISMAS	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
MEDIDA DISTANCIA	
CONSTANTE DEL PRISMA	**ACEPTABLE**
CONSTANTE PPM	

CONTROLES Y VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA

TECLADO	AJUSTE Y VERIFICACIÓN
DISPLAY	GENERAL DE FUNCIONES
ACCESO MEMORIA	
BATERÍA	**ACEPTABLE**
COMUNICACIÓN DISPOSITIVO EXTERNO	

JM EQUIPOS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REALIZANDO EL AJUSTE Y/O REPARACION (SEGÚN PROTOCOLO DE NORMA ISO 9001:2015 Y BASADOS EN PROCEDIMIENTOS DE NORMA ISO 17123-3) Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

TÉCNICO JM EQUIPOS

CERTIFICADO POR:

SUPERVISOR DE LABORATORIO FIRMA:_____

Este certificado no es válido sin el simbolo de aceptación, no puede ser reproducido parcialmente, excepto en su totalidad, con autorización previa por escrito del servicio técnico de JM EQUIPOS.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:

GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon

Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.com

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: W.BYORI COLONIA VARGAS

Cédula: 1.114.2.08.522

licel1cie Profesional No: **01-15496**

Resolución: 02-6497 - 27/02/20 15

i"EC!IOIOGO EN TOPOGRAFIA

SENA



MUJAIA APARICIO !.

Vicepresidente

. . Profes ional

Junto

Esta tarjeta es docum

ac:reclita al litular

Repúbica de Col

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia

con la Resolución aprobatoria.

ento público y junto con el Certificado de Vigencia

para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la

ombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el

Decreto Reglamentario No. 690 de 1984

Si esta tarjeta es encontrada por favor enviarla a la dtreeión

de la ofi,;lna del Consejo Profesional Naci011al de Topografía

Calle 33 No. 7-27 Ofc..:502 Tel.: 2881490

http:/fepnt.org Bogotá - Cokm!bia

Par.a cualquier informac:ion comunicarse con el Col!Sejo PrafesiOnal Nacional de Topogralla. Ermltil!foe,:pnt.org.

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 515793/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **MARYORI COLONIA VARGAS** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1114208522** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-15496** con fecha de expedición del **27 de Febrero de 2015.**

Que el(la) Señor(a) **MARYORI COLONIA VARGAS**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-15496** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **15 días del mes de Enero de 2025.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCION
GPS1	1815824.21	5031800.44	201.383	GPS1
BASE	1815742.86	5031794.97	210.8082	BASE
1	1815733.8	5031794.54	210.29	CERCA
2	1815734.46	5031792.05	210.211	TN
3	1815734.23	5031790.33	208.685	CUNETA
4	1815734.43	5031789.53	208.854	BV
5	1815734.74	5031787.42	208.972	EJE
6	1815735.1	5031784.3	208.856	BV
7	1815734.96	5031783.36	208.464	CUNETA
8	1815734.55	5031782.37	209.489	TN
9	1815734.66	5031780.96	209.42	CERCA
10	1815745.4	5031781.72	208.391	CERCA
11	1815745.26	5031783.77	208.536	TN
12	1815745.09	5031784.82	207.439	CUNETA
13	1815744.87	5031785.57	207.854	BV
14	1815744.37	5031788.6	207.955	EJE
15	1815744.14	5031791.49	207.81	BV
16	1815743.98	5031792.11	207.729	CUNETA
17	1815744.17	5031793.93	208.877	TN
18	1815756.24	5031797.52	207.62	CERCA
19	1815756.15	5031795.67	206.65	TN
20	1815756.13	5031794.85	205.968	CUNETA
21	1815756.41	5031793.4	206.471	BV
22	1815756.95	5031791	206.593	EJE
23	1815757.78	5031787.81	206.413	BV
24	1815757.72	5031787.19	206.071	CUNETA
25	1815757.86	5031786	207.243	TN
26	1815758.69	5031782.45	207.134	CERCA
27	1815768.69	5031782.85	205.8	CERCA
28	1815768.67	5031787.87	206.015	TN
29	1815768.37	5031789	204.763	CUNETA
30	1815768.32	5031790.15	205.245	BV
31	1815767.87	5031793.13	205.28	EJE
32	1815767.65	5031796.13	205.159	BV
33	1815767.56	5031796.65	204.976	CUNETA
34	1815767.44	5031799.04	206.336	CERCA
35	1815775.73	5031800.16	205.493	CERCA
36	1815775.47	5031797.68	204.218	CUNETA
37	1815775.65	5031796.76	204.504	BV
38	1815776.12	5031794.38	204.568	EJE

39	1815776.76	5031790.77	204.299	BV
40	1815776.68	5031790.3	204.102	CUNETA
41	1815777.51	5031789.35	205.195	TN
42	1815778.14	5031783.4	204.892	CERCA
43	1815789.67	5031783.98	203.655	CERCA
44	1815789.84	5031790.32	203.963	TN
45	1815789.9	5031791.45	202.852	CUNETA
46	1815789.83	5031792.21	203.197	BV
47	1815789.73	5031795.47	203.262	EJE
48	1815789.64	5031798.29	203.105	BV
49	1815789.57	5031799.03	202.902	CUNETA
50	1815789.65	5031801.93	204.105	CERCA
51	1815799.86	5031801.92	203.056	CERCA
52	1815799.78	5031799.22	202.067	CUNETA
53	1815799.8	5031797.64	202.424	BV
54	1815799.79	5031795.81	202.481	EJE
55	1815799.86	5031792.53	202.41	BV
56	1815799.65	5031791.81	202.035	CUNETA
57	1815799.69	5031790.69	203.057	TN
58	1815799.68	5031784.5	202.617	CERCA
59	1815808.68	5031784.98	201.908	CERCA
60	1815809.23	5031790.46	201.987	TN
61	1815809.37	5031791.5	201.633	CUNETA
62	1815809.38	5031793.54	201.838	BV
63	1815809.41	5031795.7	201.865	EJE
64	1815809.49	5031798.45	201.694	BV
65	1815809.48	5031799.56	201.344	CUNETA
66	1815809.42	5031801.62	201.95	CERCA
67	1815819.75	5031801.34	201.433	CERCA
68	1815819.61	5031798.99	201.035	CUNETA
69	1815819.52	5031797.41	201.287	BV
70	1815819.33	5031795.21	201.346	EJE
71	1815819.39	5031792.79	201.278	BV
72	1815819.2	5031792.08	201.162	CUNETA
73	1815818.76	5031785.39	201.34	CERCA
74	1815828.26	5031785.94	200.889	CERCA
75	1815827.78	5031791.62	200.719	CUNETA
76	1815827.24	5031793.11	201.062	BV
77	1815826.69	5031795.02	201.063	EJE
78	1815826.33	5031797.28	200.995	BV
79	1815826.4	5031798.89	200.706	CUNETA
80	1815826.84	5031801.18	200.881	CERCA
