AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030030069 Id: 2282722
Folios: 2 Fecha: 2025-07-18 16:19:18
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO MANTENIMIENTO Y OPERACION A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO ESTAN EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

Bogotá, D.C., julio 18 de 2025

PARA: **DOCTORA: DOREIDYS LIMA LOPEZ**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA CONTRATO DE OBRA**

NIT-901.827.374-, CONSORCIO GP FLANDES, FACTURA NO. FE-6, CONTRATO DE OBRA *NO. 23001258 H4* DE 2023, FLANDES, ACTA NO. 5, ($5.546.780.395), PERIODO 26 FEBRERO A 25 ABRIL DE 2025.

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **FE-6 de** 18/07/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 5 (6) folios
- Certificación Cumplido Para Pago De Contratos Diferentes A Prestación De Servicios (1) folio
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (4) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio

- Certificación de la fiducia devolución rendimientos financieros (4) folios
- Informe mensual (71) folios
- Oficio Remisorio No. *15.2288.04-187 de julio 17 de 2025* (1) folio

Cordialmente,

JUANITA VILLAMIZAR DURAN
Supervisora Contrato Interventoria 23001322 H3 2023
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 12 Folios (278)
Copias a: Dirección Administrativa, folios (185) informe memorias

Elaboró: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Juanita Villamizar Duran, Supervisora de Interventoría, DIAA

CIAF-1322H32023-370

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025

Señores:
AERONÁUTICA CIVIL
Atención: **Ingeniera Juanita Villamizar Durán**
Supervisora Contrato 23001322 H3 2023
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria
Bogotá

Referencia: **Contrato No. 23001322 H3 DE 2023 Realizar Interventoría Integral para realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).**

Asunto: **Acta de cobro No. 5 - Contrato de obra 23001258 H4 2023**

Estimados Señores:

Se hace envío de la documentación correspondiente al cobro No. 05 del contrato de obra 23001258 H4 2023, la cual se encuentra revisada y avalada por esta Interventoría, con el fin de solicitar el tramité respectivo para el mencionado pago. A continuación, se presenta la lista de documentos para actas parciales de cobro, que se envían en un solo PDF y en su mismo orden:


LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACIÓN CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			
Acta resumen parcial	X			
Liquidación Iva	X			
Acta Excel presupuesto de Costos	X			
Certificación cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	X			
Certificación de la factura por supervisor en Interventoría			X	No aplica para obra
Certificación del uso del anticipo por el supervisor a la Interventoría	X			
Certificación de los aportes a parafiscales por el supervisor en Interventoría	X			

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Nota aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			X	No aplica para obra
Certificación de aportes parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con fotocopias de cedula, tarjeta profesional, certificación de junta de contadores de revisor fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	X			
Certificación de aportes parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de Interventoría con fotocopias de cédula, tarjeta profesional, certificación de junta de contadores de revisor fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	X			
Fotocopias de las planillas de pagos parafiscales del periodo facturado	X			
Certificación Bancaria	X			
Certificación Rut DIAN	X			
Certificación de la consignación de los rendimientos financieros a la entidad cuando hay anticipo	X			
Oficio remisorio del acta a cobrar	X			
Pantallazo del SECOP evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de pagos a partir de la segunda cuenta		X		
Para la primera cuenta de Interventoría la designación del supervisor firmada			X	
Documentos de acuerdo a lo que dice el contrato	X			
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION	X			
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Sin otro particular,

Atentamente,



ALFREDO PEREZ SANTOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES

Anexo: Acta de cobro No. 5 Contrato 23001258 H4 2023
Copia: JCSR, Apoyo Supervisión Aerocivil
Proyectó: CEAF
Revisó: APF

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f7b507b6926164438b043049d7f9405ec9b9d236ddaa9d1a9b6054df04def737e8c37c550e402159b80d112f92a03796

Número de Factura: FE-6
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 17/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO GP FLANDES
Nombre Comercial: CONSORCIO GP FLANDES
Nit del Emisor: 901827374
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 43 A 19 17 P 5 BLOCK CENTRO EMPRESARIAL
Teléfono / Móvil: 6044441188
Correo: mariae.santana@procopal.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 26 103 15
Teléfono / Móvil: 6012962233 EXT 000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	C01	ACTA No 5 OBRA	NIU	1,00	$ 5.713.665.714,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.713.665.714,00
2	C03	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 1.199.869.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.199.869.800,00
3	C04	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 114.273.314,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.273.314,00
4	C02	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 171.409.972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.567.894,68	19.00			$ 171.409.972,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	23,41	$ 1.685.006.300,00

Notas Finales

SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES. POR FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUA R DICHA RETENCIÓN
PERIODO QUE SE FACTURA: CORTE AL 25 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE OBRA NÚMERO 5
CORREO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS AUDIOVISUALES AEROPUERTO DE FLANDES (VF)
#$24-12-00-000;23001258 H4 DE 2023;juanita.villamizar@aerocivil.gov.co#$
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR VALOR DE $ 1.685.006.300
CONTACTO EN LA EMPRESA DEL CLIENTE: JUANITA VILLAMIZAR
Linea de negocio: CONTRATO DE OBRA 23001258H4 DE 2023

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 14:44:15
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 14:44:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7199218800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7199218800
IVA	32567894.68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	32567894.68
Total neto factura (=)	7231786694.68
Descuento Global (-)	1685006300
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $5546780394.68

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.199.218.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.199.218.800,00
IVA	32.567.894,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	32.567.894,68
Total neto factura (=)	7.231.786.694,68
Descuento Global (-)	1.685.006.300,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $ **$** 5.546.780.394,68

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073256933 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-06-19

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: No. 23001258 H4 DE 2023** **OBJETO: Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF)** **AEROPUERTO: SANTIAGO VILA DE FLANDES** **PLAZO INICIAL: 19 MESES** **FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE MAYO DE 2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025** **PLAZO FINAL:**	**VALOR INICIAL:** **$ 48.620.604.781,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 48.620.604.781,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05** **CONTRATISTA:** CONSORCIO GP FLANDES **INTERVENTOR:** CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES **SUPERVISOR:** ING. JUANITA VILLAMIZAR

El día 25 de abril de 2025 en Flandes - Tolima, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Santiago Vila de Flandes de la Ciudad de Flandes, se reunieron: El Ingeniero Ricardo Alberto Muñoz en representación del contratista consorcio GP Flandes y el Ingeniero Alfredo Perez en representación de la Interventoría consorcio Aerovías de Flandes, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendida entre del 26 de febrero y el 25 de abril de 2025, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		VALORES
1. Valor inicial contrato		$ 48.620.604.781
2. Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 48.620.604.781
4. Valor pagado del anticipo %	23,3%	$ 11.302.256.916
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 37.318.347.865
6. Valor presente acta		$ 7.231.786.695
7. Valor amortizado en la presente acta	23,3%	$ 1.685.006.300
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 5.546.780.395
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 10.027.764.811
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 3.046.244.069
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 26.876.802.122
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 21.743.802.659
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ 6.571.006.547
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**41,76%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	Mantenimiento	$ -
2- C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	Obra	$ 5.546.780.395
3-	Adquisición equipos	$ -
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	$ -
TOTAL		$ 5.546.780.395

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	Obra	1.685.006.300

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA GUTIERREZ
CONSORCIO GP FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH
CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5**		
Principio de Procedencia: **6200,**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE OBRA No 5.**	
CONTRATO No.	**23001258 H4 DEL 2023**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GP FLANDES**	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES**	
SUPERVISOR:	**JUANITA VILLAMIZAR**	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 7.199.218.800
Porcentaje estimado para el A.I.U.		26,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.		$ 5.713.665.714
UTILIDAD (Costo Directo x 3% estimado Utilidad)		$ 171.409.971
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 32.567.894
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -
TOTAL IVA		**$ 32.567.894**

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ
CONSORCIO GP FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 5

				PERIODO	**FECHA DE RADICACIÓN**
				Corte Marzo - Abril del 2025	**17 de julio de 2025**
CONTRATO:	No. 23001258 H4 DE 2023	**OBJETO:**	Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	**R/L:**	JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	**R/L:**	ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH	28 DE MAYO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2025
	VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No 5**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
	$ 48.620.604.781,00	**$ 48.620.605.495,00**	**$ 13.074.008.880,00**	**$ 7.231.786.695,00**	**$ 20.305.795.575,00**	**$ 28.314.809.207,00**	**58%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1- GENERALES																
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	M2	432.352,0	$ 2.200	$ 951.174.400	432.352,0	$ 951.174.400	254.458,1	$ 559.807.820		$ -	254458,1	$ 559.807.820	177.893,9	$ 391.366.580	41%
2- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA																
2.1	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	12.342,4	$ 65.700	$ 810.893.709	12.342,4	$ 810.893.709	1.444,8	$ 94.923.360,00		$ -	1444,8	$ 94.923.360	10.897,6	$ 715.970.349	88%
2.2	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	6.272,0	$ 51.127	$ 320.668.544	6.272,0	$ 320.668.544	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	6.272,0	$ 320.668.544	100%
2.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	7.110,5	$ 164.000	$ 1.166.118.720	7.110,5	$ 1.166.118.720	855,8	$ 140.351.200,00		$ -	855,8	$ 140.351.200	6.254,7	$ 1.025.767.520	88%
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	4.278,1	$ 195.000	$ 834.233.400	4.278,1	$ 834.233.400	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4.278,1	$ 834.233.400	100%
2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)	M3	11.917,9	$ 210.070	$ 2.503.601.656	11.917,9	$ 2.503.601.656	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	11.917,9	$ 2.503.601.656	100%
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10	M3	6.403,4	$ 1.100.000	$ 7.043.707.000	6.403,4	$ 7.043.707.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	6.403,4	$ 7.043.707.000	100%
2.7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	60.645,2	$ 2.397	$ 145.366.640	60.645,2	$ 145.366.640	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	60.645,2	$ 145.366.640	100%
2.8	SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.	M2	60.645,2	$ 3.081	$ 186.847.984	60.645,2	$ 186.847.984	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	60.645,2	$ 186.847.984	100%
NP-02	SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA	M3	0,0	$ 107.000	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	-	$ -	0%
3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA											$ -		$ -			
3.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	M2	220.843,3	$ 37.905	$ 8.371.063.770	220.843,3	$ 8.371.063.770	215.768,4	$ 8.178.701.202,50		$ -	215768,4	$ 8.178.701.202	5.074,9	$ 192.362.568	2%
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	66.253,0	$ 65.700	$ 4.352.820.655	66.253,0	$ 4.352.820.655	5.377,1	$ 353.275.470,00	20.924,0	$ 1.374.706.800	26301,1	$ 1.727.982.270	39.951,9	$ 2.624.838.385	60%
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	M3	66.253,0	$ 144.000	$ 9.540.428.832	66.253,0	$ 9.540.428.832	9.692,1	$ 1.395.662.400,00	40.448,0	$ 5.824.512.000	50140,1	$ 7.220.174.400	16.112,9	$ 2.320.254.432	24%
3.4	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	110.421,6	$ 15.119	$ 1.669.464.624	110.421,6	$ 1.669.464.624	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	110.421,6	$ 1.669.464.624	100%
NP-03	COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD	M2	0,0	$ 3.600	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	-	$ -	0%
4- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA											$ -		$ -			
4.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	473,1	$ 51.127	$ 24.186.397	473,1	$ 24.186.397	284,2	$ 14.530.293,40		$ -	284,2	$ 14.530.294	188,9	$ 9.656.103	40%
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	683,6	$ 210.070	$ 143.599.651	683,6	$ 143.599.651	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	683,6	$ 143.599.651	100%
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10	M3	323,7	$ 1.100.000	$ 356.037.000	323,7	$ 356.037.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	323,7	$ 356.037.000	100%
4.4	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.153,8	$ 2.397	$ 7.559.579	3.153,8	$ 7.559.579	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.153,8	$ 7.559.579	100%
4.5	SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.153,8	$ 3.081	$ 9.716.756	3.153,8	$ 9.716.756	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.153,8	$ 9.716.756	100%
5- REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO											$ -		$ -			
5.1	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	315,2	$ 51.127	$ 16.113.753	315,2	$ 16.113.753	240,2	$ 12.280.705,40		$ -	240,2	$ 12.280.705	75,0	$ 3.833.047	24%
5.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	2.946,8	$ 65.700	$ 193.605.417	2.946,8	$ 193.605.417	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2.946,8	$ 193.605.417	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	1.294,0	$ 164.000	$ 212.212.720	1.294,0	$ 212.212.720	355,0	$ 58.220.000,00		$ -	355,0	$ 58.220.000	939,0	$ 153.992.720	73%
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	582,5	$ 195.000	$ 113.593.350	582,5	$ 113.593.350	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	582,5	$ 113.593.350	100%
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	485,2	$ 210.070	$ 101.932.266	485,2	$ 101.932.266	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	485,2	$ 101.932.266	100%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10	M3	323,5	$ 1.100.000	$ 355.872.000	323,5	$ 355.872.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	323,5	$ 355.872.000	100%
5.7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.151,7	$ 2.397	$ 7.554.651	3.151,7	$ 7.554.651	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.151,7	$ 7.554.651	100%
5.8	SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.151,7	$ 3.081	$ 9.710.422	3.151,7	$ 9.710.422	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3.151,7	$ 9.710.422	100%
6- SENALIZACION HORIZONTAL											$ -		$ -			
6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y PISTA.	M2	6.386,3	$ 52.286	$ 333.915.049	6.386,3	$ 333.915.049	1.554,8	$ 81.294.273,00		$ -	1554,8	$ 81.294.273	4.831,5	$ 252.620.776	76%
6.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO. INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INLCUYE MICROESFERAS.	M	7.240,9	$ 38.833	$ 281.184.076	7.240,9	$ 281.184.076	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	7.240,9	$ 281.184.076	100%
7- SISTEMA DE DRENAJE											$ -		$ -			
7.1	DEMOLICIÓN DE TRAMO EXISTENTE DE CANAL (DEMOLICIÓN DE SECCION DE 3 METROS DE CANAL PARA LA EXCAVACIÓN DE LA OBRA DE DESCARGA). INCLUYE RETIRO	UND	1,0	$ 333.239,0	$ 333.239	1,0	$ 333.239	1,0	$ 333.239,00		$ -	1,0	$ 333.239		$ -	0%
7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.408,2	$ 65.700,0	$ 92.521.348	1.408,2	$ 92.521.348	16.282,2	$ 1.069.740.540,00		$ -	16282,2	$ 1.069.740.540	- 14.874,0	$ (977.219.192)	-1056%
7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	M3	215,7	$ 1.001.929,0	$ 216.157.926	215,7	$ 216.157.926	308,4	$ 308.994.903,60		$ -	308,4	$ 308.994.904	- 92,7	$ (92.836.978)	-43%
7.4	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 2.00, H =1.00, Z = 0.75	M3	64,8	$ 1.031.630,0	$ 66.862.004	64,8	$ 66.862.004	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	64,8	$ 66.862.004	100%
7.5	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.50, H =1.50, Z = 0.60	M3	337,6	$ 1.001.554,0	$ 338.103.798	337,6	$ 338.103.798	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	337,6	$ 338.103.798	100%
7.6	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL B TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.50, H =1.00, Z = 0.55	M3	393,2	$ 976.388,0	$ 383.954.036	393,2	$ 383.954.036	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	393,2	$ 383.954.036	100%
7.7	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL C TRAPEZOIDAL SECCION B = 0.70, H =0.30, Z = 3.00	M3	42,5	$ 921.000,0	$ 39.116.102	42,5	$ 39.116.102	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	42,5	$ 39.116.102	100%
7.8	TUBERIA 12" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN).SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321	M	35,7	$ 543.500,0	$ 19.424.690	35,7	$ 19.424.690	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	35,7	$ 19.424.690	100%
7.9	TUBERIA 16" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN).SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321	M	65,6	$ 872.000,0	$ 57.238.080	65,6	$ 57.238.080	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	65,6	$ 57.238.080	100%
7.10	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA 8,8X2,00X1,00 M - INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y RELLENO.	UND	1,0	$ 10.719.048,0	$ 10.719.048	1,0	$ 10.719.048	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 10.719.048	100%
7.11	SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA 1.40X1.40X0.60 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y RELLENO.	UND	1,0	$ 2.575.455,0	$ 2.575.455	1,0	$ 2.575.455	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 2.575.455	100%
7.12	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO D=1200 MM	M	142,5	$ 614.000,0	$ 87.507.280	142,5	$ 87.507.280	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	142,5	$ 87.507.280	100%
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy 60000 psi)	KG	13.700,0	$ 10.055,0	$ 137.753.153	13.700,0	$ 137.753.153	3.309,0	$ 33.271.995,00		$ -	3309,0	$ 33.271.995	10.391,0	$ 104.481.158	76%
NP-01	REVESTIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO F'C=21 MPA, E=10 CM Y PIEDRA PEGADA ESPESOR PROMEDIO 30 CM, PARA MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA EN EL CANAL DE DESCOLE	M2	0,0	$ 178.038,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -		$ -	0%
NP-04	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERIA 4")	M	0,0	$ 81.829,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -		$ -	0%
NP-05	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERIA 6")	M	0,0	$ 109.149,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -		$ -	0%
NP-06	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERIA 8")	M	0,0	$ 125.192,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -		$ -	0%
8- BOX COULVERT											$ -		$ -			
8.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	39,3	$ 65.700	$ 2.581.353	39,3	$ 2.581.353	2.792,6	$ 183.473.820,00		$ -	2792,6	$ 183.473.820	- 2.753,3	$ (180.892.467)	-7008%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy 60000 psi)	KG	4.203,3	$ 10.055	$ 42.264.584	4.203,3	$ 42.264.584	14.343,1	$ 144.219.870,50		$ -	14343,1	$ 144.219.871	- 10.139,8	$ (101.955.287)	-241%
8.3	RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT	M3	11,5	$ 123.500	$ 1.420.250	11,5	$ 1.420.250	110,1	$ 13.597.350,00		$ -	110,1	$ 13.597.350	- 98,6	$ (12.177.100)	-857%
8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	M3	41,5	$ 1.658.684	$ 68.752.452	41,5	$ 68.752.452	88,8	$ 147.291.139,20		$ -	88,8	$ 147.291.139	- 47,4	$ (78.538.687)	-114%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9- AYUDAS VISUALES (SISTEMA DE ILUMINACION)											$ -		$ -			
9.1- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ILUMINACION DE BORDE DE											$ -		$ -			
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862 , CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6A, COLOR BLANCO/AMARILLO.	UND	38,0	$ 4.796.159	$ 182.254.042	38,0	$ 182.254.042	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	38,0	$ 182.254.042	100%
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA (12"/8") ESPECIFICACIÓN FAA L-850C(L), CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/AMARILLO	UND	2,0	$ 13.774.863	$ 27.549.726	2,0	$ 27.549.726	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 27.549.726	100%
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO ELEVADO ESPECIFICACIÓN FAAL-862 , CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/BLANCO	UND	11,0	$ 4.796.159	$ 52.757.749	11,0	$ 52.757.749	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	11,0	$ 52.757.749	100%
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA 12"/8" ESPECIFICACIÓN FAA L-850C(L), CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6.6 A, COLOR BLANCO/BLANCO	UND	1,0	$ 13.774.863	$ 13.774.863	1,0	$ 13.774.863	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 13.774.863	100%
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS POCO PROFUNDAS DE 12"/8" CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA NORMA FAA L 824, MANUFACTURADO POR EL FABRICANTE DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	3,0	$ 2.566.915	$ 7.700.745	3,0	$ 7.700.745	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	3,0	$ 7.700.745	100%
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FAAL-830, 6,6/6,6 AMPERIOS, DE PARA LAMPARA DE BORDE DE PISTA, CON POTENCIA MÍNIMA DE 25/35W Y CONFORME A LA POTENCIA DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	58,0	$ 1.612.888	$ 93.547.504	58,0	$ 93.547.504	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	58,0	$ 93.547.504	100%
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (HEMBRA - MACHO) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	58,0	$ 345.981	$ 20.066.898	58,0	$ 20.066.898	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	58,0	$ 20.066.898	100%
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (HEMBRA - MACHO) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	58,0	$ 326.089	$ 18.913.162	58,0	$ 18.913.162	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	58,0	$ 18.913.162	100%
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA. 6.6 AMPERIOS. CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TIRISTOR).	UND	2,0	$ 117.502.620	$ 235.005.240	2,0	$ 235.005.240	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 235.005.240	100%
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE EN CONCRETO CILINDRICA 2500 PSI, PARA INSTALACION LAMPARA ELEVADA DE PISTA, DE 28 CM DE DIAMETRO, 40 CM DE PROUNDIDAD, INCLUYE CURVA DE 2" Y CONECTOR ROSCADO EN ALUMINIO DE ACUERDO A PLANO.	UND	51,0	$ 262.016	$ 13.362.816	51,0	$ 13.362.816	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	51,0	$ 13.362.816	100%
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, PARA ZONA DE CLEARWAY CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6,6 A, COLOR ROJO/AZUL	UND	2,0	$ 4.796.159	$ 9.592.318	2,0	$ 9.592.318	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 9.592.318	100%
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, DE TIPO ELEVADA ESPECIFICACIÓN FAAL-862, PARA ZONA DE CLEARWAY CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 30 W, 6,6 A, COLOR ROJO/BLANCO	UND	4,0	$ 4.692.990	$ 18.771.960	4,0	$ 18.771.960	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4,0	$ 18.771.960	100%
9.2- SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLE DE RODAJE CON BALIZAS TIPO LED											$ -		$ -			
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARAS DEL TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, ELEVADA CUMPLIMIENTO NORMATIVO: ESPECIFICACIÓN FAAL-861 T , CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED 10/20W COLOR AZUL.	UND	47,0	$ 2.794.443	$ 131.338.821	47,0	$ 131.338.821	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 131.338.821	100%
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FAAL-830, 6,6/6,6 AMPERIOS, DE PARA LAMPARA DE BORDE DE PISTA, CON POTENCIA MÍNIMA DE 25/35W Y CONFORME A LA POTENCIA DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	47,0	$ 1.612.888	$ 75.805.736	47,0	$ 75.805.736	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 75.805.736	100%
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	47,0	$ 345.981	$ 16.261.107	47,0	$ 16.261.107	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 16.261.107	100%
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	47,0	$ 326.089	$ 15.326.183	47,0	$ 15.326.183	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 15.326.183	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA. 6.6 AMPERIOS. CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TIRISTOR).	UND	1,0	$ 117.502.620	$ 117.502.620	1,0	$ 117.502.620	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 117.502.620	100%
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE EN CONCRETO CILINDRICA 2500 PSI, PARA INSTALACION LAMPARA ELEVADA DE PISTA, DE 28 CM DE DIAMETRO, 40 CM DE PROUNDIDAD, INCLUYE CURVA DE 2" Y CONECTOR ROSCADO EN ALUMINIO DE ACUERDO A PLANO.	UND	47,0	$ 262.016	$ 12.314.752	47,0	$ 12.314.752	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	47,0	$ 12.314.752	100%
9.3- SISTEMA DE ILUMINACION DE UMBRAL DE PISTA											$ -		$ -			
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, EMPOTRADA CUMPLIMIENTO NORMATIVO: ESPECIFICACIÓN FAA L-850 D (L), DE POTENCIA 30/40 W, 6,6 AMPERIOS, CON FUENTE LUMINOSA TIPO LED COLOR ROJO - VERDE . - DIVERGENCIA DERECHA Y DIVERGENCIA IZQUIERDA.	UND	16,0	$ 13.771.064	$ 220.337.024	16,0	$ 220.337.024	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 220.337.024	100%
9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO FAAL-830, 6,6/6,6 AMPERIOS, PARA LAMPARA DE UMBRAL DE PISTA, POTENCIA MÍNIMO DE 45 W O CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA..	UND	16,0	$ 1.609.089	$ 25.745.424	16,0	$ 25.745.424	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 25.745.424	100%
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASES METÁLICAS POCO PROFUNDAS DE 12"/8" CONFORME A LA LÁMPARA OFRECIDA NORMA FAA L 824, MANUFACTURADO POR EL FABRICANTE DE LA LÁMPARA OFRECIDA.	UND	16,0	$ 2.566.915	$ 41.070.640	16,0	$ 41.070.640	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 41.070.640	100%
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO, FAA L-823, 5 KV, 25 A. (JUEGO(HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 23 Y 33	UND	16,0	$ 345.981	$ 5.535.696	16,0	$ 5.535.696	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 5.535.696	100%
9.3.5	SUMISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR SECUNDARIO, FAA L-823, 600 V, 20 A. (JUEGO (HEMBRA - MACHO)) INCLUYE ENCINTADO CON CINTA 33	UND	16,0	$ 326.089	$ 5.217.424	16,0	$ 5.217.424	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16,0	$ 5.217.424	100%
9.4 SISTEMA DE LUCES DE PENDIENTE DE APROXIMACION (PAPI)											$ -		$ -			
9.4.1	TRASLADO DEL SISTEMA PAPI FAA L-880, EXISTENTE,INCUYE TRASLADO DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y SUMINISTRO DE NUEVOS CONECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND	1,0	$ 19.680.473	$ 19.680.473	1,0	$ 19.680.473	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 19.680.473	100%
9.4.2	INTERCONEXÍON SISTEMA DE TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIÓN - PARA EL SISTEMA PAPI, CONECTADO DESDE EL SISTEMA EXISTENTE DE PISTA.	UND	2,0	$ 2.470.958	$ 4.941.916	2,0	$ 4.941.916	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 4.941.916	100%
9.4.3	CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI PARA SISTEMA PAPI DE ACUERDO AL PLANO DE ESPECIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓN (5 X 30 X 0.25 M). INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,0	$ 25.976.915	$ 51.953.830	2,0	$ 51.953.830	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 51.953.830	100%
9.4.4	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO DE ACUERDO AL PLANO PARA INSTALACIÓN DE LAS BALIZAS PARA REUBICACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE. EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONFORME AL PLANO DE CONSTRUCCIÓN.	UND	8,0	$ 1.825.929	$ 14.607.432	8,0	$ 14.607.432	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	8,0	$ 14.607.432	100%
9.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE FAA L 828 5 KVA, DE 5 KVA. 6.6 AMPERIOS. CINCO (5) ETAPAS DE BRILLO, CON CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN CUT OUT. INCLUYE INSTALACIÓN AL ACTUAL TABLERO DE CONTROL. (TIPO FERRORESONANTE, IGBT O TIRISTOR).	UND	2,0	$ 117.502.620	$ 235.005.240	2,0	$ 235.005.240	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 235.005.240	100%
9.4.6	SUMINISTRO E INTSALACION SISTEMA PAPI FAA L-880, AC NO. 150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED. INCLUYE CLINÓMETRO ENTREGADO POR EL FABRICANTE, TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. CABECERA 20).	UND	1,0	$ 274.408.667	$ 274.408.667	1,0	$ 274.408.667	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 274.408.667	100%
9.5- EQUIPOS COMPLEMENTARIOS											$ -		$ -			
9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO NO. 8 AWG AISLAMIENTO XLP, DE 5000 VOLTIOS, CIRCUITO PRIMARIO. 1 CONDUCTOR.	M	16.000,0	$ 29.412	$ 470.592.000	16.000,0	$ 470.592.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	16.000,0	$ 470.592.000	100%
9.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO.6 AWG, PARA EL COMTRAPESO A LO LARGO DE LA CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE PISTA Y TAXEO INTERVENIDOS.	M	6.000,0	$ 19.710	$ 118.260.000	6.000,0	$ 118.260.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	6.000,0	$ 118.260.000	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9.5.3	CONTRAPESOS SPT CONSISITENTE EN VARILLAS COBRE-COBRE DE 2,40M* 5/8" INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA O CONECTOR DE COMPRESIÓN, BARRENO PARA INSTALACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUELO.	UND	54,0	$ 807.912	$ 43.627.248	54,0	$ 43.627.248	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	54,0	$ 43.627.248	100%
9.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN DE BALIZAS, LADO SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 2 X 12 AWG AISLAMIENTO THHN/THWN.	M	700,0	$ 16.931	$ 11.851.700	700,0	$ 11.851.700	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	700,0	$ 11.851.700	100%
9.5.5	TABLERO GENERAL DE DISTIBUCION UPS PARA LOS REGULADORES INSTALADOS.	UND	1,0	$ 22.679.907	$ 22.679.907	1,0	$ 22.679.907	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 22.679.907	100%
9.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA UPS CON CAPACIDAD PARA 30 kVA. INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 20 MINUTOS A FULL CARGA Y TABLERO DE BYPASS DE MANTENIMIENTO.	UND	1,0	$ 67.165.554	$ 67.165.554	1,0	$ 67.165.554	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	1,0	$ 67.165.554	100%
10- OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS											$ -		$ -			
10.1	CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 60 X 60 X 120 CM INTERIORES CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 274 CODENSA	UND	100,0	$ 1.775.994	$ 177.599.400	100,0	$ 177.599.400	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	100,0	$ 177.599.400	100%
10.2	CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 70 X 120 X 170 CM INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 275 CODENSA	UND	12,0	$ 3.410.930	$ 40.931.160	12,0	$ 40.931.160	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	12,0	$ 40.931.160	100%
10.3	CANALIZACIÓN DE DOS (2) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP . INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	5.000,0	$ 262.178	$ 1.310.890.000	5.000,0	$ 1.310.890.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	5.000,0	$ 1.310.890.000	100%
10.4	CANALIZACIÓN DE UN (1) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	700,0	$ 170.193	$ 119.135.100	700,0	$ 119.135.100	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	700,0	$ 119.135.100	100%
10.5	CANALIZACIÓN DE UN (4) DUCTOS DE 4" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA	M	2.500,0	$ 395.406	$ 988.515.000	2.500,0	$ 988.515.000	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2.500,0	$ 988.515.000	100%
10.6	CANALIZACION DIRIGIDA POR DEBAJO DE CALLE DE RODAJE EN CUATRO DUCTOS DE CUATRO PULGADAS, TIPO POLIETILENO INCLUYE GUIA LASER Y TOPO Y DEMAS ACCESORIOS PARA INSTALACION, EN UNA DISTANCIA DE 30 METROS LINEALES	M	60,0	$ 3.018.634	$ 181.118.040	60,0	$ 181.118.040	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	60,0	$ 181.118.040	100%
10.7	LETRERO OACI DE INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	4,0	$ 54.213.553	$ 216.854.212	4,0	$ 216.854.212	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4,0	$ 216.854.212	100%
10.8	LETRERO OACI DE INFORMACION RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS	UND	4,0	$ 54.213.553	$ 216.854.212	4,0	$ 216.854.212	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	4,0	$ 216.854.212	100%
10.9	LETRERO OACI DE INFORMACION RAC PARTE DECIMO CUARTA (RAC 14) PARÁGRAFO 5.4 Y APENDICE 4, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO DE LA LETRA 400 MM. INCLUYE TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXIÓN AL SPT Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	2,0	$ 54.213.553	$ 108.427.106	2,0	$ 108.427.106	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 108.427.106	100%
10.10	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO DE ACUERDO AL PLANO PARA INSTALACIÓN DE LAS BALIZAS PARA REUBICACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE. EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONFORME AL PLANO DE CONSTRUCCIÓN.	UND	10,0	$ 1.825.929	$ 18.259.290	10,0	$ 18.259.290	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	10,0	$ 18.259.290	100%
10.11	CONSTRUCCIÓN DE CORONA DISTINTIVA DE LA UBICACIÓN DEL INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO Y BASE ESTABILIDAD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CABECERA 02 Y 20.	UND	2,0	$ 12.094.705	$ 24.189.410	2,0	$ 24.189.410	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 24.189.410	100%
10.12	INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO, ILUMINACIÓN TIPO LED FAA L-806 AC 150/5345-27, FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO (SOLAR).INCLUYE DEMARCACIÓN DE BASE, DE ACUERDO AL RAC PARTE DÉCIMO CUARTA Y LO CONSIGNADO EN EL ANEXO NO. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	2,0	$ 50.860.180	$ 101.720.360	2,0	$ 101.720.360	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	2,0	$ 101.720.360	100%
10.13	RANURADO DE PISTA, SOBRE PAVIMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNO A CUATRO SECUNDARIOS	M	100,0	$ 322.128	$ 32.212.800	100,0	$ 32.212.800	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	100,0	$ 32.212.800	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-07	ADECUACION CUARTO ELECTRICO PARA INSTALACION DE REGULADORES Y UPS	UND	0,0	$ 28.141.912	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	-	$ -	0%
NP-08	TRASLADO DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONEXIÓN DE REGULADORES	UND	0,0	$ 65.952.905	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	-	$ -	0%
11- GESTION FORESTAL													$ -			
11.1	TALA DE ARBOLES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	155,0	$ 176.705	$ 27.389.275	155,0	$ 27.389.275	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -	155,0	$ 27.389.275	100%
SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU					$ 47.889.089.600,6134		$ 47.889.090.312		$ 12.789.969.582		$ 7.199.218.800		$ 19.989.188.382		$ 27.899.901.220	
ADMINISTRACIÓN				21%	$ 7.981.514.933		$ 7.981.515.052		$ 2.131.661.598		$ 1.199.869.800		$ 3.331.531.397		$ 4.649.983.537	
IMPREVISTOS				2%	$ 760.144.279		$ 760.144.291		$ 203.015.391		$ 114.273.314		$ 317.288.704		$ 442.855.575	
UTILIDAD				3%	$ 1.140.216.419		$ 1.140.216.436		$ 304.523.085		$ 171.409.971		$ 475.933.057		$ 664.283.362	
VALOR TOTAL AIU				26%	$ 9.881.875.632		$ 9.881.875.779		$ 2.639.200.073		$ 1.485.553.086		$ 4.124.753.158		$ 5.757.122.474	
IVA					$ 216.641.120		$ 216.641.123		$ 57.859.387		$ 32.567.895		$ 90.427.281		$ 126.213.839	
A. TOTAL OBRAS					$ 48.105.730.721		$ 48.105.731.435		$ 12.847.828.969		$ 7.231.786.695		$ 20.079.615.663		$ 28.026.115.059	58,26%
12- APROPIACION	BOLSA DE MONTO AGOTABLE															
12.1	APROPIACION DE DISEÑOS	GLB	1,00	$ 190.067.152	$ 190.067.152	1,0	$ 190.067.152	1,0	$ 190.067.152		$ -	1,0	$ 190.067.152	-	$ -	0%
12.2	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	155,00	$ 16.775	$ 2.600.125	155,0	$ 2.600.125		$ -		$ -	0,0	$ -	155,00	$ 2.600.125	100,0%
12.3	BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR	GLB	1,00	$ 240.000.000	$ 240.000.000	1,0	$ 240.000.000		$ -		$ -	0,0	$ -	1,00	$ 240.000.000	100,0%
SUBTOTAL APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR					$ 432.667.277		$ 432.667.277		$ 190.067.152		$ -		$ 190.067.152		$ 242.600.125	
IVA				19%	$ 82.206.783	19%	$ 82.206.783	19%	$ 36.112.759	19%	$ -	19%	$ 36.112.759	19%	$ 46.094.024	56,1%
B. TOTAL APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR					$ 514.874.060		$ 514.874.060		$ 226.179.911		$ -		$ 226.179.911		$ 288.694.149	
TOTAL PRESENTE ACTA					$ 48.620.604.781		$ 48.620.605.495		$ 13.074.008.880		$ 7.231.786.695		$ 20.305.795.574		$ 28.314.809.207	58,24%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 48.620.604.781
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 48.620.605.495
VALOR DE ANTICIPO		$ 11.302.256.916
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		$ 13.074.008.880
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 3.046.244.069
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 7.231.786.695
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		$ 1.685.006.300
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 5.546.780.395
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 20.305.795.574
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 4.731.250.369
SALDO POR EJECUTAR		$ 28.314.809.207
SALDO POR AMORTIZAR		$ 6.571.006.547

VALOR TOTAL EN LETRAS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RICARDO ALBERTO MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

ALFREDO PÉREZ SANTOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL






UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO GP FLANDES

FECHA	DD	25	MM	4	A	2025	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	ITEM	3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.



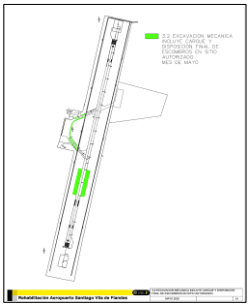Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
EXCAVACION ZONAS SEGURIDAD PISTA	K0+101	K1+120	DERECHO	1	5.890,61
EXCAVACION ZONAS SEGURIDAD PISTA	K0+000	K1+180	IZQUIERDO	1	12.411,70
EXCAVACION ZONA RESA	-K0+060	K0+000	SUR	1	529,49
EXCAVACION ZONAS SEGURIDAD CALLE DE RODAJE ALPHA	K0+075	K0+200	DERECHO	1	506,31
EXCAVACION ZONAS SEGURIDAD CALLE DE RODAJE ALPHA	K0+037	K0+200	IZQUIERDO	1	700,90
EXCAVACION ZONAS SEGURIDAD CALLE DE RODAJE BRAVO	K0+036	K0+180	DERECHO	1	519,83
EXCAVACION ZONAS SEGURIDAD CALLE DE RODAJE BRAVO	K0+063	K0+180	IZQUIERDO	1	365,17
				SUMATORIA =	20.924,01

REGISTRO FOTOGRAFICO











Sub-Total	20.924,01
TOTAL	20.924,0

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . José Daniel Villegas Buitrago	Director de Obra: Ing . Ricardo Alberto Muñoz
Residente de interventoria: Ing . Germán Alonso Rivera Reyes	Ing. Alfredo Pérez Santos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO GP FLANDES


FECHA	DD	25	MM	4	A	2025	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	2	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO GP FLANDES	NIT O C.C.	901.827.374-8	CONTRATO N°	23001258 H4 DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES	NIT O C.C.	901.828.793-5	CONTRATO N°	23001322 H3 DE 2023
ESPACIO					

CAPÍTULO	3- NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	ITEM	3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	UNID.	m3	UBICACIÓN	AEROPUERTO SANTIAGO VILA FLANDES, TOLIMA.

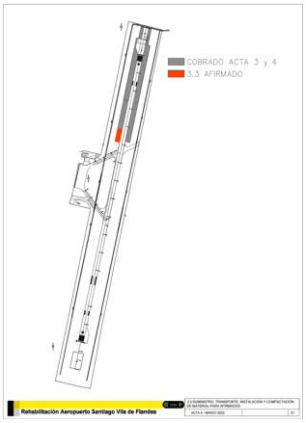



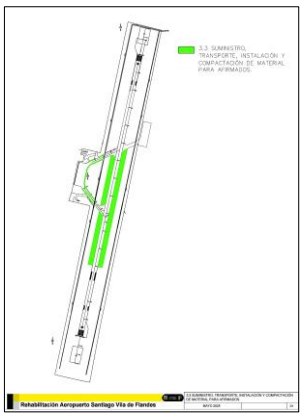

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD PISTA	K0+101,00	K1+684,89	DERECHO	1	23.950,34
AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD PISTA	K0+000,00	K1+684,89	IZQUIERDO	1	24.677,89
AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD CALLE DE RODAJE ALPHA	K0+075,30	K0+200,00	DERECHO	1	342,92
AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD CALLE DE RODAJE ALPHA	K0+036,52	K0+200,00	IZQUIERDO	1	449,56
AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD CALLE DE RODAJE BRAVO	K0+035,61	K0+180,00	DERECHO	1	397,08
AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD CALLE DE RODAJE BRAVO	K0+062,81	K0+180,00	IZQUIERDO	1	322,26
DESCUENTO COBRO ACUMULADO ACTA 4	N/A	N/A	N/A	N/A	- 9.692,10
				SUMATORIA =	40.447,95

REGISTRO FOTOGRAFICO







Sub-Total	40.447,95
TOTAL	40.448,0

ELABORO	APROBO

Residente de Obra:
Ing . José Daniel Villegas Beltrago

Director de Obra:
Ing . Ricardo Alberto Muñoz

Residente de interventoria:
Ing . Germán Alonso Rivera Reyes

Director de interventoria:
Ing. Alfredo Pérez Santos

CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES

LA INTERVENORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258 H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato cuyo objeto es “Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)”, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, certifico que el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 correspondiente a los meses de marzo y abril por un valor de $7.231.786.695 IVA incluido (Siete mil doscientos treinta y un millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y cinco pesos M/Cte.) y amortización del anticipo de $1.685.006.300 (Mil seiscientos ochenta y cinco millones seis mil trecientos pesos M/Cte.) para un total a pagar de $5.546.780.395 (Cinco mil quinientos cuarenta y seis millones setecientos ochenta mil trecientos noventa y cinco pesos M/Cte.), está de conformidad con lo establecido en la Forma de Pago del Contrato.

Para constancia de lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

ALFREDO PEREZ SANTOS
Director de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes

LA INTERVENORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258 H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato cuyo objeto es "Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto Santiago Vila De Flandes (VF)", suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, identificado con NIT 901827374-8, acorde con la documentación presentada y verificada, certifica que el CONSORCIO GP FLANDES ha hecho uso adecuado del anticipo otorgado para la ejecución del contrato, correspondiente al proyecto de mejoramiento de pista y plataformas en el Aeropuerto Santiago Vila De Flandes.


Tabla 1 Valores del anticipo para el presente corte

VALOR DEL ANTICIPO	$ 11.302.256.916
VALOR AMORTIZADO	$ 4.731.250.369
VALOR UTILIZADO	$ 5.930.547.433
SALDO RESTANTE	$ 6.571.006.547

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025

Para constancia de lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,



ALFREDO PEREZ SANTOS
Representante Legal de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **17** / MM **Julio** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **Consorcio GP Flandes**
NIT/CC No.: **901.827.374**

Información Contractual

Contrato No.: 23001258 H4 DE 2023

Objeto del contrato: Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)

Fecha de suscripción: 28 / may / 2024 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 31 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 48.620.604.781,00	$ -	$ 13.074.008.880,00	$ 35.546.595.901,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura electrónica		

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 11.302.256.916,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 3.046.244.069,00
Amortización presente pago	$ 1.685.006.300,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 6.571.006.547,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 24500017192
Nombre entidad bancaria: Bancolombia S.A.

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	133724
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-46-52104E-2403002-02	$ 5.546.780.395,00
Total a pagar:	**$ 5.546.780.395,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma: Roselly Pájaro Fortich
Nombre: ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH
Cargo: Representante Legal - Interventoría
Dependencia: No Aplica

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

LA INTERVENORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23001258 H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

En calidad de Interventoría del Contrato cuyo objeto es “Realizar el Mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye Suministro e Instalación de Ayudas Visuales Aeropuerto de Flandes (VF)”, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el Contratista de Obra el CONSORCIO GP FLANDES, acorde con la documentación presentada y certificada por sus representantes legales, contador y revisor fiscal respectivamente, certifica que el CONSORCIO GP FLANDES, cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscales, correspondientes al Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05.

Para constancia de lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

ALFREDO PEREZ SANTOS
Director de Interventoría
Consorcio Aerovías de Flandes

CONSORCIO GP FLANDES

Medellín, 9 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES
Tolima

Asunto: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Contrato número 23001258 H4 de 2023, "Realizar mejoramiento de pista, plataforma, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales Aeropuerto Santiago Vila de Flandes".

Respetados Señores:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y ley 828 de 2003, bajo la gravedad del juramento:

Nosotros JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ Y MARIA EUGENIA SANTANA TORRES, identificados como aparecen al pie de nuestras firmas, actuando en nuestras calidades de Representante Legal y Contadora, respectivamente de la firma GP Flandes.

CERTIFICAMOS

Que, durante el mes de abril de 2025, la firma GP Flandes, identificada con Nit 901827374-8; ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados y trabajadores del contrato de la referencia, en cuanto a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Debe tenerse en cuenta que el pago por los conceptos precitados se realiza mes vencido.

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA G.
CC Nro.3.353.097
Representante Legal

MariaESantana T.
MARÍA EUGENIA SANTANA TORRES
CC Nro.32.240.099
Contadora
T.P. 126022-T

Medellín, abril 22 de 2025

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Respetados Señores

El suscrito Revisor Fiscal de **GISAICO S.A.S**, identificado con **NIT 890.917.464-1**, certifica que la empresa, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales **ARL** (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), a las Cajas de Compensación Familiar y **FIC**.

De conformidad con lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURIDICA**	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje **SENA** de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (X)	No ( )

La empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 13222-T

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

Medellín, 16 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES
Tolima

Asunto: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Contrato número 23001258 H4 de 2023, "Realizar mejoramiento de pista, plataforma, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales Aeropuerto Santiago Vila de Flandes".

Respetados Señores:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y ley 828 de 2003, bajo la gravedad del juramento:

Nosotros JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABORDA VALENCIA, identificados como aparecen al pie de nuestras firmas, actuando en nuestras calidades de Representante Legal y Revisor Fiscal, respectivamente de la firma PROCOPAL S.A.

CERTIFICAMOS

Que, durante el mes de abril 2025, la firma PROCOPAL S.A, identificada con Nit 890.906.388-0; ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados y trabajadores del contrato de la referencia, en cuanto a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Debe tenerse en cuenta que el pago por los conceptos precitados se realiza mes vencido.

JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA G.
CC Nro.3.353.097
Representante Legal

SANTIAGO TABORDA VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 317446-T
En Representación de AIGR
Contadores S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A2880CF75F5BE821

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA SANTANA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32240099 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 126022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

695BB642551CA04F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70091459 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 13222-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9591FE2390D75F69

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANTIAGO TABORDA VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037628103 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 317446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1982**

ANZA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

17-NOV-2000 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0112100-18110311-F-0032240099-20030523 **04608** 03142B 01 135219873

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

32240099
NUMERO

SANTANA TORRES
APELLIDOS

MARIA EUGENIA
NOMBRES



Maria E Santana T
FIRMA

FIRMA DEL TITULAR 47465

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126022-T

MARIA EUGENIA
SANTANA TORRES
C.C. 32240099
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136140

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



13222-T

JORGE HUMBERTO
AGUILAR OSPINA
C.C. 70.091.459
RESOLUCION INSCRIPCION 1793-T FECHA 19-IX-85
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

00020648

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.091.459**

AGUILAR OSPINA
APELLIDOS

JORGE HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1956**

YOLOMBO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-SEP-1976 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0115100-00120102-M-0070091459-20081102 0005175603A 1 2240019646



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

317446-T

SANTIAGO
TABORDA VALENCIA
C.C. 1037628103
RES. INSCRIPCION 456 DEL 25/10/2023
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

367289 372072



230303/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Registradora de Libros de Comercio Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Valido únicamente para realizar procesos asociados al Consorcio GP Flandes de la compañía PROCOPAL S.A. identificada con NIT: 890.906.388-0



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.628.103
TABORDA VALENCIA

APELLIDOS
SANTIAGO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1993
MEDELLIN
ANTIOQUIA
LUGAR DE NACIMIENTO

1.8 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-AGO-2011 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0112100-00332937-M-1037628103-20110910 0028007630A 1 37474918

Valido únicamente para realizar procesos asociados al Consorcio GP Flandes de la compañía PROCOPAL S.A. identificada con NIT: 890.906.388-0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1478616592	9485981131	E	2025/05/19	2025/05/13	BANCOLOMBIA	0	$70,406,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO GP FLANCES (100 Afiliados)																							$229,266,428	$36,646,900			$229,266,428	$9,134,400			$230,835,449	$9,029,300			$229,266,428		$15,595,600		$0	$0		$70,406,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (99 Afiliados)																							$229,188,032	$36,634,300			$229,188,032	$9,131,200			$230,743,293	$9,025,600			$229,188,032		$15,590,100		$0	$0		$70,381,200
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (98 Afiliados)																							$224,688,032	$35,914,300			$224,688,032	$8,951,200			$226,243,293	$8,845,600			$224,688,032		$15,276,900		$0	$0		$68,988,000
1	CC	1108455611	AGUILAR JOSE									X									23030 1	24	$1,746,883	$279,600	EPS002	24	$1,746,883	$69,900	CCF50	24	$1,746,883	$69,900	14-7	24	$1,746,883	6.960%	$121,600	24	$0	$0	Si	$541,000
2	CC	1108455611	AGUILAR JOSE											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
3	CC	1108455611	AGUILAR JOSE											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
4	CC	1108455611	AGUILAR JOSE											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
5	CC	1038813805	AMARILES MARCELIANO									X									23030 1	30	$3,283,967	$525,500	EPS037	30	$3,283,967	$131,400	CCF50	30	$3,283,967	$131,400	14-7	30	$3,283,967	6.960%	$228,600	30	$0	$0	Si	$1,016,900
6	CC	11223340	ARIAS ARIEL									X									23020 1	30	$3,586,957	$574,000	EPS017	30	$3,586,957	$143,500	CCF50	30	$3,586,957	$143,500	14-7	30	$3,586,957	6.960%	$249,700	30	$0	$0	Si	$1,110,700
7	CC	1108453993	ARROYO HOLMAN									X									23030 1	26	$1,829,405	$292,800	EPS002	26	$1,829,405	$73,200	CCF50	26	$1,829,405	$73,200	14-7	26	$1,829,405	6.960%	$127,400	26	$0	$0	Si	$566,600
8	CC	1108453993	ARROYO HOLMAN											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
9	CC	1108453993	ARROYO HOLMAN											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
10	CC	1108453993	ARROYO HOLMAN										X								23030 1	1	$65,863	$8,000	EPS002	1	$65,863	$0	CCF50	1	$65,863	$0	14-7	1	$65,863	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,000
11	CC	1110569967	AVILA JORGE									X									23030 1	30	$3,629,348	$580,700	EPS005	30	$3,629,348	$145,200	CCF50	30	$3,629,348	$145,200	14-7	30	$3,629,348	6.960%	$252,700	30	$0	$0	Si	$1,123,800
12	CC	1108456287	AZA WALTHER									X									23030 1	30	$2,194,048	$351,100	EPS037	30	$2,194,048	$87,800	CCF50	30	$2,194,048	$87,800	14-7	30	$2,194,048	6.960%	$152,800	30	$0	$0	Si	$679,500
13	CC	11320592	BAEZ OMAR							X		X									23030 1	30	$2,718,540	$435,000	EPS005	30	$2,718,540	$108,800	CCF50	30	$2,718,540	$108,800	14-7	30	$2,718,540	6.960%	$189,300	30	$0	$0	Si	$841,900
14	CC	1193132611	BALLESTEROS JUAN									X									23030 1	27	$1,442,068	$230,800	EPS017	27	$1,442,068	$57,700	CCF50	27	$1,442,068	$57,700	14-7	27	$1,442,068	6.960%	$100,400	27	$0	$0	Si	$446,600
15	CC	1193132611	BALLESTEROS JUAN										X								23030 1	3	$196,970	$23,700	EPS017	3	$196,970	$0	CCF50	3	$196,970	$0	14-7	3	$196,970	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$23,700
16	CC	11228206	BARRETO EDWIN		X							X									23030 1	22	$1,422,983	$227,700	EPS002	22	$1,422,983	$57,000	CCF50	22	$1,589,058	$63,600	14-7	22	$1,422,983	6.960%	$99,100	22	$0	$0	Si	$447,400
17	CC	6181552	BARRIOS BENJAMIN									X									23030 1	30	$1,975,881	$316,200	EPS002	30	$1,975,881	$79,100	CCF50	30	$1,975,881	$79,100	14-7	30	$1,975,881	6.960%	$137,600	30	$0	$0	Si	$612,000
18	CC	1070615596	BERMUDEZ DIEGO									X									23030 1	30	$2,721,957	$435,600	EPS002	30	$2,721,957	$108,900	CCF50	30	$2,721,957	$108,900	14-7	30	$2,721,957	6.960%	$189,500	30	$0	$0	Si	$842,900
19	CC	1070616631	BERMUDEZ INGRID									X									23030 1	30	$1,860,608	$297,700	EPS002	30	$1,860,608	$74,500	CCF50	30	$1,860,608	$74,500	14-7	30	$1,860,608	6.960%	$129,500	30	$0	$0	Si	$576,200
20	CC	1070622247	BETANCOURT JUAN									X									23020 1	30	$2,436,847	$389,900	EPS002	30	$2,436,847	$97,500	CCF50	30	$2,436,847	$97,500	14-7	30	$2,436,847	6.960%	$169,700	30	$0	$0	Si	$754,600
21	CC	11322439	BETANCOURT RAUL									X									23020 1	30	$2,935,326	$469,700	EPS002	30	$2,935,326	$117,500	CCF50	30	$2,935,326	$117,500	14-7	30	$2,935,326	6.960%	$204,300	30	$0	$0	Si	$909,000
22	CC	1010066033	BOCANEGRA BRAYAN									X									23030 1	30	$1,570,492	$251,300	EPS002	30	$1,570,492	$62,900	CCF50	30	$1,570,492	$62,900	14-7	30	$1,570,492	6.960%	$109,400	30	$0	$0	Si	$486,500
23	CC	1005774470	BOCANEGRA JHONATHAN											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
24	CC	1005774470	BOCANEGRA JHONATHAN									X									23030 1	29	$2,061,497	$329,900	EPS002	29	$2,061,497	$82,500	CCF50	29	$2,061,497	$82,500	14-7	29	$2,061,497	6.960%	$143,500	29	$0	$0	Si	$638,400
25	CC	1096243395	BRAVO AGUSTIN	X								X									23030 1	24	$1,154,273	$184,700	EPS037	24	$1,154,273	$46,200	CCF50	24	$1,154,273	$46,200	14-7	24	$1,154,273	6.960%	$80,400	24	$0	$0	Si	$357,500
26	CC	1110472809	CABEZAS DIEGO									X									23030 1	30	$3,745,001	$599,300	EPS005	30	$3,745,001	$149,900	CCF50	30	$3,745,001	$149,900	14-7	30	$3,745,001	6.960%	$260,700	30	$0	$0	Si	$1,159,800
27	CC	1070614423	CANDIA JHONATAN									X									23030 1	30	$2,805,436	$448,900	EPS002	30	$2,805,436	$112,300	CCF50	30	$2,805,436	$112,300	14-7	30	$2,805,436	6.960%	$195,300	30	$0	$0	Si	$868,800
28	CC	93133082	CARDOSO JOHN									X									23030 1	30	$2,144,536	$343,200	EPS037	30	$2,144,536	$85,800	CCF50	30	$2,144,536	$85,800	14-7	30	$2,144,536	6.960%	$149,300	30	$0	$0	Si	$664,100

29	CC	88261192	CARDOZO LUIS							X		X									25-14	30	$5,322,282	$851,600	EPS037	30	$5,322,282	$212,900	CCF50	30	$5,322,282	$212,900	14-7	30	$5,322,282	6.960%	$370,500	30	$0	$0	Si	$1,647,900
30	CC	1151970545	CASTAÑEDA KEVIN									X									230301	30	$1,748,430	$279,800	EPS002	30	$1,748,430	$70,000	CCF50	30	$1,748,430	$70,000	14-7	30	$1,748,430	6.960%	$121,700	30	$0	$0	Si	$541,500
31	CC	1000809491	CASTRO HEINER									X									230301	30	$2,293,478	$367,000	EPS002	30	$2,293,478	$91,800	CCF50	30	$2,293,478	$91,800	14-7	30	$2,293,478	6.960%	$159,700	30	$0	$0	Si	$710,300
32	CC	11309460	CASTRO HELI									X									230201	30	$3,939,784	$630,400	EPS017	30	$3,939,784	$157,600	CCF50	30	$3,939,784	$157,600	14-7	30	$3,939,784	6.960%	$274,300	30	$0	$0	Si	$1,219,900
33	CC	14250879	CASTRO JULIO									X									25-14	30	$2,261,413	$361,900	EPS002	30	$2,261,413	$90,500	CCF50	30	$2,261,413	$90,500	14-7	30	$2,261,413	6.960%	$157,400	30	$0	$0	Si	$700,300
34	CC	11224360	CHICA HERNANDO									X									230201	30	$1,864,476	$298,400	EPS002	30	$1,864,476	$74,600	CCF50	30	$1,864,476	$74,600	14-7	30	$1,864,476	6.960%	$129,800	30	$0	$0	Si	$577,400
35	CC	1108455979	CIFUENTES LUIS									X									230301	30	$1,628,515	$260,600	EPS002	30	$1,628,515	$65,200	CCF50	30	$1,628,515	$65,200	14-7	30	$1,628,515	6.960%	$113,400	30	$0	$0	Si	$504,400
36	PT	6645631	DAVILA JOSE	X								X									25-14	30	$1,731,409	$277,100	EPS041	30	$1,731,409	$69,300	CCF50	30	$1,731,409	$69,300	14-7	30	$1,731,409	6.960%	$120,600	30	$0	$0	Si	$536,300
37	CC	38362441	DAZA KELLY									X									25-14	27	$1,825,794	$292,200	EPS005	27	$1,825,794	$73,100	CCF50	27	$1,825,794	$73,100	14-7	27	$1,825,794	6.960%	$127,100	27	$0	$0	Si	$565,500
38	CC	38362441	DAZA KELLY											X							25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
39	CC	11323275	DIAZ FRANCISCO									X									25-14	30	$2,315,109	$370,500	EPS002	30	$2,315,109	$92,700	CCF50	30	$2,315,109	$92,700	14-7	30	$2,315,109	6.960%	$161,200	30	$0	$0	Si	$717,100
40	CC	1006121785	DUARTE DIEGO	X								X									230301	30	$1,446,709	$231,500	EPS017	30	$1,446,709	$57,900	CCF50	30	$1,446,709	$57,900	14-7	30	$1,446,709	6.960%	$100,700	30	$0	$0	Si	$448,000
41	CC	1070626831	DUCUARA KENEED									X									25-14	30	$3,014,239	$482,300	EPS017	30	$3,014,239	$120,600	CCF50	30	$3,014,239	$120,600	14-7	30	$3,014,239	6.960%	$209,800	30	$0	$0	Si	$933,300
42	CC	1000216889	FORERO JUAN									X									230301	30	$1,965,049	$314,500	EPS002	30	$1,965,049	$78,700	CCF50	30	$1,965,049	$78,700	14-7	30	$1,965,049	6.960%	$136,800	30	$0	$0	Si	$608,700
43	CC	1108455294	GAÑAN CRISTIAN									X									230301	30	$2,554,673	$408,800	EPS002	30	$2,554,673	$102,200	CCF50	30	$2,554,673	$102,200	14-7	30	$2,554,673	6.960%	$177,900	30	$0	$0	Si	$791,100
44	CC	1108453530	GARCIA WALTER									X									230301	29	$1,741,725	$278,700	EPS017	29	$1,741,725	$69,700	CCF50	29	$1,741,725	$69,700	14-7	29	$1,741,725	6.960%	$121,300	29	$0	$0	Si	$539,400
45	CC	1108453530	GARCIA WALTER													L					230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
46	CC	1070623975	GARZON LUIS									X									230301	29	$1,929,978	$308,800	EPS002	29	$1,929,978	$77,200	CCF50	29	$1,929,978	$77,200	14-7	29	$1,929,978	6.960%	$134,400	29	$0	$0	Si	$597,600
47	CC	1070623975	GARZON LUIS										X								230301	1	$57,353	$6,900	EPS002	1	$57,353	$0	CCF50	1	$57,353	$0	14-7	1	$57,353	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,900
48	CC	11206673	GONZALEZ VICTOR									X									230301	27	$1,410,349	$225,700	EPS002	27	$1,410,349	$56,500	CCF50	27	$1,410,349	$56,500	14-7	27	$1,410,349	6.960%	$98,200	27	$0	$0	Si	$436,900
49	CC	11206673	GONZALEZ VICTOR											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
50	CC	11206673	GONZALEZ VICTOR											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
51	CC	1105615451	GONZALEZ YEISON									X									230301	30	$3,735,053	$597,700	EPS037	30	$3,735,053	$149,500	CCF50	30	$3,735,053	$149,500	14-7	30	$3,735,053	6.960%	$260,000	30	$0	$0	Si	$1,156,700
52	CC	11323504	GUTIERREZ JOSE									X									230301	30	$1,859,834	$297,600	EPS017	30	$1,859,834	$74,400	CCF50	30	$1,859,834	$74,400	14-7	30	$1,859,834	6.960%	$129,500	30	$0	$0	Si	$575,900
53	CC	1108452238	GUZMAN SANDRA									X									230301	30	$2,046,282	$327,500	EPS002	30	$2,046,282	$81,900	CCF50	30	$2,046,282	$81,900	14-7	30	$2,046,282	6.960%	$142,500	30	$0	$0	Si	$633,800
54	CC	2969716	HERNANDEZ GREGORIO									X									230301	30	$2,704,347	$432,700	MIN002	30	$2,704,347	$108,200	CCF50	30	$2,704,347	$108,200	14-7	30	$2,704,347	6.960%	$188,300	30	$0	$0	Si	$837,400
55	CC	1108455661	HERNANDEZ JHON											X							230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$0	14-7	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$38,000
56	CC	1108455661	HERNANDEZ JHON									X									230301	26	$1,851,067	$296,200	EPS002	26	$1,851,067	$74,100	CCF50	26	$1,851,067	$74,100	14-7	26	$1,851,067	6.960%	$128,900	26	$0	$0	Si	$573,300
57	CC	1111122297	HERNANDEZ JOSE									X									230301	30	$1,916,310	$306,700	EPS002	30	$1,916,310	$76,700	CCF50	30	$1,916,310	$76,700	14-7	30	$1,916,310	6.960%	$133,400	30	$0	$0	Si	$593,500
58	CC	1006812908	HOLDA LUIS									X									25-14	30	$4,085,219	$653,700	EPS037	30	$4,085,219	$163,500	CCF50	30	$4,085,219	$163,500	14-7	30	$4,085,219	6.960%	$284,400	30	$0	$0	Si	$1,265,100
59	CC	1015474454	HURTADO JORGE									X									230301	22	$1,569,203	$251,100	EPS005	22	$1,569,203	$62,800	CCF50	22	$1,569,203	$62,800	14-7	22	$1,569,203	6.960%	$109,300	22	$0	$0	Si	$486,000
60	CC	1015474454	HURTADO JORGE											X							230301	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF50	8	$379,600	$0	14-7	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$76,000
61	CC	80493203	JARA ALIRIO									X									230201	28	$2,199,801	$352,000	EPS002	28	$2,199,801	$88,000	CCF50	28	$2,199,801	$88,000	14-7	28	$2,199,801	6.960%	$153,200	28	$0	$0	Si	$681,200
62	CC	80493203	JARA ALIRIO											X							230201	2	$126,667	$20,300	EPS002	2	$126,667	$5,100	CCF50	2	$126,667	$0	14-7	2	$126,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,400
63	CC	93434622	JUYAR JOSE									X									230201	29	$1,968,660	$315,000	EPS002	29	$1,968,660	$78,800	CCF50	29	$1,968,660	$78,800	14-7	29	$1,968,660	6.960%	$137,100	29	$0	$0	Si	$609,700
64	CC	93434622	JUYAR JOSE										X								230201	1	$66,534	$8,000	EPS002	1	$66,534	$0	CCF50	1	$66,534	$0	14-7	1	$66,534	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,000
65	CC	1069178394	LAGUNA RAUL									X									230301	27	$2,319,240	$371,100	EPS002	27	$2,319,240	$92,800	CCF50	27	$2,319,240	$92,800	14-7	27	$2,319,240	6.960%	$161,500	27	$0	$0	Si	$718,200
66	CC	1069178394	LAGUNA RAUL										X								230301	3	$259,805	$31,200	EPS002	3	$259,805	$0	CCF50	3	$259,805	$0	14-7	3	$259,805	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$31,200
67	CC	1007430910	LARA FERNANDO										X								230301	3	$142,350	$17,100	EPS002	3	$142,350	$0	CCF50	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$17,100
68	CC	1007430910	LARA FERNANDO									X									230301	27	$1,654,046	$264,700	EPS002	27	$1,654,046	$66,200	CCF50	27	$1,654,046	$66,200	14-7	27	$1,654,046	6.960%	$115,200	27	$0	$0	Si	$512,300
69	CC	93434803	LEYTON MILTON											X							230201	1	$63,334	$10,200	EPS002	1	$63,334	$2,600	CCF50	1	$63,334	$0	14-7	1	$63,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,800

PLANILLA PAGADA

70	CC	93434803	LEYTON MILTON	X								X									230201	29	$2,243,515	$359,000	EPS002	29	$2,243,515	$89,800	CCF50	29	$2,243,515	$89,800	14-7	29	$2,243,515	6.960%	$156,200	29	$0	$0	Si	$694,800
71	CC	11229685	LEZAMA CARLOS									X									230201	30	$1,859,834	$297,600	EPS005	30	$1,859,834	$74,400	CCF50	30	$1,859,834	$74,400	14-7	30	$1,859,834	6.960%	$129,500	30	$0	$0	Si	$575,900
72	CC	1193044089	MARTINEZ CRISTIAN									X									25-14	30	$1,927,915	$308,500	EPS002	30	$1,927,915	$77,200	CCF50	30	$1,927,915	$77,200	14-7	30	$1,927,915	6.960%	$134,200	30	$0	$0	Si	$597,100
73	CC	1007356146	MENDOZA JHON									X									230201	29	$1,476,623	$236,300	EPS041	29	$1,476,623	$59,100	CCF50	29	$1,476,623	$59,100	14-7	29	$1,476,623	6.960%	$102,800	29	$0	$0	Si	$457,300
74	CC	1007356146	MENDOZA JHON										X								230201	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
75	CC	1110262488	MENDOZA MANUEL									X									230201	30	$2,726,088	$436,200	EPS037	30	$2,726,088	$109,100	CCF50	30	$2,726,088	$109,100	14-7	30	$2,726,088	6.960%	$189,800	30	$0	$0	Si	$844,200
76	CC	1108457158	MONROY EDWIN									X									230301	26	$1,423,242	$227,800	EPS002	26	$1,423,242	$57,000	CCF50	26	$1,423,242	$57,000	14-7	26	$1,423,242	6.960%	$99,100	26	$0	$0	Si	$440,900
77	CC	1108457158	MONROY EDWIN											X							230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$0	14-7	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$38,000
78	CC	1006122610	MONROY JUAN									X									230301	30	$3,148,152	$503,800	EPS002	30	$3,148,152	$126,000	CCF50	30	$3,148,152	$126,000	14-7	30	$3,148,152	6.960%	$219,200	30	$0	$0	Si	$975,000
79	CC	11223327	MORALES JHON											X							231001	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
80	CC	11223327	MORALES JHON									X									231001	28	$1,520,463	$243,300	EPS002	28	$1,520,463	$60,900	CCF50	28	$1,520,463	$60,900	14-7	28	$1,520,463	6.960%	$105,900	28	$0	$0	Si	$471,000
81	CC	80101636	MORENO MARCO		X							X									230301	24	$2,428,260	$388,600	EPS002	24	$2,428,260	$97,200	CCF50	24	$2,844,927	$113,800	14-7	24	$2,428,260	6.960%	$169,100	24	$0	$0	Si	$768,700
82	CC	11309485	NEIRA AVELINO									X									231001	30	$1,942,614	$310,900	EPS002	30	$1,942,614	$77,800	CCF50	30	$1,942,614	$77,800	14-7	30	$1,942,614	6.960%	$135,300	30	$0	$0	Si	$601,800
83	CC	1018402983	ORTIZ DIANA																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF50	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
84	CC	65820845	ORTIZ MARIANA									X									230301	30	$2,054,018	$328,700	EPS002	30	$2,054,018	$82,200	CCF50	30	$2,054,018	$82,200	14-7	30	$2,054,018	6.960%	$143,000	30	$0	$0	Si	$636,100
85	CC	1070618263	OSPINA JIMMY							X		X									230301	30	$2,336,757	$373,900	EPS017	30	$2,336,757	$93,500	CCF50	30	$2,336,757	$93,500	14-7	30	$2,336,757	6.960%	$162,700	30	$0	$0	Si	$723,600
86	CC	11227555	PACHON ALEX									X									230301	30	$3,876,630	$620,300	EPS005	30	$3,876,630	$155,100	CCF50	30	$3,876,630	$155,100	14-7	30	$3,876,630	6.960%	$269,900	30	$0	$0	Si	$1,200,400
87	CC	1007658151	PELAEZ JAVIER									X									230301	30	$2,622,717	$419,700	EPS002	30	$2,622,717	$105,000	CCF50	30	$2,622,717	$105,000	14-7	30	$2,622,717	6.960%	$182,600	30	$0	$0	Si	$812,300
88	CC	1007846773	PERDOMO LUISA									X									230301	30	$3,193,479	$511,000	EPS005	30	$3,193,479	$127,800	CCF50	30	$3,193,479	$127,800	14-7	30	$3,193,479	6.960%	$222,300	30	$0	$0	Si	$988,900
89	CC	1108455288	PINILLA JONATHAN											X							230301	2	$126,667	$20,300	EPS002	2	$126,667	$5,100	CCF50	2	$126,667	$0	14-7	2	$126,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,400
90	CC	1108455288	PINILLA JONATHAN											X							230301	1	$63,334	$10,200	EPS002	1	$63,334	$2,600	CCF50	1	$63,334	$0	14-7	1	$63,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,800
91	CC	1108455288	PINILLA JONATHAN											X							230301	1	$63,334	$10,200	EPS002	1	$63,334	$2,600	CCF50	1	$63,334	$0	14-7	1	$63,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,800
92	CC	1108455288	PINILLA JONATHAN									X									230301	26	$2,078,298	$332,600	EPS002	26	$2,078,298	$83,200	CCF50	26	$2,078,298	$83,200	14-7	26	$2,078,298	6.960%	$144,700	26	$0	$0	Si	$643,700
93	CC	1007557382	PINILLA JUAN									X									25-14	30	$1,786,338	$285,900	EPS041	30	$1,786,338	$71,500	CCF50	30	$1,786,338	$71,500	14-7	30	$1,786,338	6.960%	$124,400	30	$0	$0	Si	$553,300
94	CC	1106308395	PRADA JEISON									X									230301	30	$3,021,739	$483,500	EPS002	30	$3,021,739	$120,900	CCF50	30	$3,021,739	$120,900	14-7	30	$3,021,739	6.960%	$210,400	30	$0	$0	Si	$935,700
95	CC	39567277	PULIDO NANCY									X									230301	30	$2,065,623	$330,500	EPS002	30	$2,065,623	$82,700	CCF50	30	$2,065,623	$82,700	14-7	30	$2,065,623	6.960%	$143,800	30	$0	$0	Si	$639,700
96	CC	1070621180	QUINTERO LUIS									X									230301	26	$1,352,841	$216,500	EPS002	26	$1,352,841	$54,200	CCF50	26	$1,352,841	$54,200	14-7	26	$1,352,841	6.960%	$94,200	26	$0	$0	Si	$419,100
97	CC	1070621180	QUINTERO LUIS										X								230301	3	$142,350	$17,100	EPS002	3	$142,350	$0	CCF50	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$17,100
98	CC	1070621180	QUINTERO LUIS											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
99	CC	1003555018	RAMIREZ CRISTIAN									X									230301	30	$1,951,125	$312,200	EPS002	30	$1,951,125	$78,100	CCF50	30	$1,951,125	$78,100	14-7	30	$1,951,125	6.960%	$135,800	30	$0	$0	Si	$604,200
100	CC	79728979	RAMIREZ JORGE									X									230301	30	$2,795,652	$447,400	EPS002	30	$2,795,652	$111,900	CCF50	30	$2,795,652	$111,900	14-7	30	$2,795,652	6.960%	$194,600	30	$0	$0	Si	$865,800
101	CC	1108453928	REYES JUAN											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
102	CC	1108453928	REYES JUAN									X									230201	28	$1,631,868	$261,100	EPS005	28	$1,631,868	$65,300	CCF50	28	$1,631,868	$65,300	14-7	28	$1,631,868	6.960%	$113,600	28	$0	$0	Si	$505,300
103	CC	1070587336	RIAÑOS CARLOS									X									230301	17	$936,622	$149,900	EPS002	17	$936,622	$37,500	CCF50	17	$936,622	$37,500	14-7	17	$936,622	6.960%	$65,200	17	$0	$0	Si	$290,100
104	CC	1070587336	RIAÑOS CARLOS												X						230301	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF50	13	$616,850	$0	14-7	13	$616,850	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$123,400
105	CC	1070621211	RODRIGUEZ WILLIAN											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
106	CC	1070621211	RODRIGUEZ WILLIAN									X									230301	29	$1,631,351	$261,100	EPS017	29	$1,631,351	$65,300	CCF50	29	$1,631,351	$65,300	14-7	29	$1,631,351	6.960%	$113,600	29	$0	$0	Si	$505,300
107	CC	1069721398	ROMERO ELBER	X								X									230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF50	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
108	CC	1069179411	RUBIANO GUSTAVO									X									230301	30	$4,232,610	$677,300	EPS002	30	$4,232,610	$169,400	CCF50	30	$4,232,610	$169,400	14-7	30	$4,232,610	6.960%	$294,600	30	$0	$0	Si	$1,310,700

Planilla Resumen

109	CC	1069176972	RUIZ CRISTHIAN		X							X									23030 1	1	$63,334	$10,200	EPS037	1	$63,334	$2,600	CCF50	1	$115,901	$4,700	14-7	1	$63,334	6.960%	$4,500	1	$0	$0	Si	$22,000
110	CC	1108454554	SAENZ DEIVIS	X								X									23030 1	27	$1,395,649	$223,400	EPS002	27	$1,395,649	$55,900	CCF50	27	$1,395,649	$55,900	14-7	27	$1,395,649	6.960%	$97,200	27	$0	$0	Si	$432,400
111	CC	1108454554	SAENZ DEIVIS											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
112	CC	1108452279	SAENZ LUIS		X							X									23030 1	24	$1,739,146	$278,300	EPS041	24	$1,739,146	$69,600	CCF50	24	$2,027,642	$81,200	14-7	24	$1,739,146	6.960%	$121,100	24	$0	$0	Si	$550,200
113	CC	1083924311	SALINAS JOHAN									X									23030 1	30	$1,923,274	$307,800	EPS037	30	$1,923,274	$77,000	CCF50	30	$1,923,274	$77,000	14-7	30	$1,923,274	6.960%	$133,900	30	$0	$0	Si	$595,700
114	CC	1070602996	SANCHEZ CAMILO									X									23020 1	30	$2,889,239	$462,300	EPS002	30	$2,889,239	$115,600	CCF50	30	$2,889,239	$115,600	14-7	30	$2,889,239	6.960%	$201,100	30	$0	$0	Si	$894,600
115	CC	11314713	SANCHEZ JOSE									X									23030 1	25	$2,281,378	$365,100	EPS002	25	$2,281,378	$91,300	CCF50	25	$2,281,378	$91,300	14-7	25	$2,281,378	6.960%	$158,800	25	$0	$0	Si	$706,500
116	CC	11314713	SANCHEZ JOSE											X							23030 1	2	$126,667	$20,300	EPS002	2	$126,667	$5,100	CCF50	2	$126,667	$0	14-7	2	$126,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,400
117	CC	11314713	SANCHEZ JOSE											X							23030 1	3	$174,117	$27,900	EPS002	3	$174,117	$7,000	CCF50	3	$174,117	$0	14-7	3	$174,117	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,900
118	CC	1072098350	SANCHEZ KEVIN		X																23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
119	CC	11220613	SERRANO JAIME											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
120	CC	11220613	SERRANO JAIME											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
121	CC	11220613	SERRANO JAIME		X							X									23030 1	18	$1,455,993	$233,000	EPS002	18	$1,455,993	$58,300	CCF50	18	$1,752,555	$70,200	14-7	18	$1,455,993	6.960%	$101,400	18	$0	$0	Si	$462,900
122	CC	18415747	SILVA JOHON									X									23030 1	30	$1,730,636	$277,000	EPS002	30	$1,730,636	$69,300	CCF50	30	$1,730,636	$69,300	14-7	30	$1,730,636	6.960%	$120,500	30	$0	$0	Si	$536,100
123	CC	1110262931	SUAREZ JUAN									X									23030 1	30	$2,201,086	$352,200	EPS041	30	$2,201,086	$88,100	CCF50	30	$2,201,086	$88,100	14-7	30	$2,201,086	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,600
124	CC	79650237	SUAREZ WALTER									X									25-14	30	$2,172,386	$347,600	EPS017	30	$2,172,386	$86,900	CCF50	30	$2,172,386	$86,900	14-7	30	$2,172,386	6.960%	$151,200	30	$0	$0	Si	$672,600
125	CC	1010083749	TAFUR STEPHANIE									X									23030 1	30	$3,070,000	$491,200	EPS002	30	$3,070,000	$122,800	CCF50	30	$3,070,000	$122,800	14-7	30	$3,070,000	6.960%	$213,700	30	$0	$0	Si	$950,500
126	CC	1070622815	TAPIERO JHON									X									23030 1	30	$1,944,935	$311,200	EPS005	30	$1,944,935	$77,800	CCF50	30	$1,944,935	$77,800	14-7	30	$1,944,935	6.960%	$135,400	30	$0	$0	Si	$602,200
127	CC	1092358453	TORRES PABLO																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF50	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
128	CC	93435108	TORRES ROSSI									X									23030 1	28	$1,933,588	$309,400	EPS041	28	$1,933,588	$77,400	CCF50	28	$1,933,588	$77,400	14-7	28	$1,933,588	6.960%	$134,600	28	$0	$0	Si	$598,800
129	CC	93435108	TORRES ROSSI											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
130	CC	1070588147	TRIANA LUIS		X							X									23030 1	15	$1,367,173	$218,800	EPS002	15	$1,367,173	$54,700	CCF50	15	$1,419,740	$56,800	14-7	15	$1,367,173	6.960%	$95,200	15	$0	$0	Si	$425,500
131	CC	1108454543	VELEZ MARY											X							25-14	1	$83,334	$13,400	EPS002	1	$83,334	$3,400	CCF50	1	$83,334	$0	14-7	1	$83,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,800
132	CC	1108454543	VELEZ MARY									X									25-14	29	$2,416,667	$386,700	EPS002	29	$2,416,667	$96,700	CCF50	29	$2,416,667	$96,700	14-7	29	$2,416,667	6.960%	$168,300	29	$0	$0	Si	$748,400
133	CC	1110552227	VERA JUAN									X									23020 1	25	$1,455,477	$232,900	EPS002	25	$1,455,477	$58,300	CCF50	25	$1,455,477	$58,300	14-7	25	$1,455,477	6.960%	$101,400	25	$0	$0	Si	$450,900
134	CC	1110552227	VERA JUAN											X							23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
135	CC	1110552227	VERA JUAN											X							23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
136	CC	1110552227	VERA JUAN										X								23020 1	1	$59,139	$7,100	EPS002	1	$59,139	$0	CCF50	1	$59,139	$0	14-7	1	$59,139	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,100
137	CC	11223283	VERA RONAL		X							X									23030 1	22	$1,310,806	$209,800	EPS002	22	$1,310,806	$52,500	CCF50	22	$1,593,133	$63,800	14-7	22	$1,310,806	6.960%	$91,300	22	$0	$0	Si	$417,400
138	CC	11223283	VERA RONAL											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
139	CC	1003555511	VERA SANTIAGO									X									23030 1	29	$1,495,964	$239,400	EPS037	29	$1,495,964	$59,900	CCF50	29	$1,495,964	$59,900	14-7	29	$1,495,964	6.960%	$104,200	29	$0	$0	Si	$463,400
140	CC	1003555511	VERA SANTIAGO											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
141	CC	1070617535	YUSTES JASON									X									23030 1	28	$2,394,965	$383,200	EPS002	28	$2,394,965	$95,800	CCF50	28	$2,394,965	$95,800	14-7	28	$2,394,965	6.960%	$166,700	28	$0	$0	Si	$741,500
142	CC	1070617535	YUSTES JASON											X							23030 1	2	$126,667	$20,300	EPS002	2	$126,667	$5,100	CCF50	2	$126,667	$0	14-7	2	$126,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000		$313,200		$0	$0		$1,393,200
143	CC	7562641	ALZATE ALVARO																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																							$78,396	$12,600			$78,396	$3,200			$92,156	$3,700			$78,396		$5,500		$0	$0		$25,000
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$78,396	$12,600			$78,396	$3,200			$92,156	$3,700			$78,396		$5,500		$0	$0		$25,000
144	CC	1007782397	PULIDO EXTERBI		X							X									23030 1	1	$78,396	$12,600	EPS002	1	$78,396	$3,200	CCF50	1	$92,156	$3,700	14-7	1	$78,396	6.960%	$5,500	1	$0	$0	Si	$25,000
Total	**Afiliados(100)**																						$229,266,428	$36,646,900			$229,266,428	$9,134,400			$230,835,449	$9,029,300			$229,266,428		$15,595,600		$0	$0		$70,406,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1478616592	9485981131	E	2025/05/19	2025/05/13	BANCOLOMBIA	0	$70,406,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				100	$36,646,900	$0	$0	$36,646,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$569,400	$0	$0	$569,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$6,174,200	$0	$0	$6,174,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	$24,491,600	$0	$0	$24,491,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$5,411,700	$0	$0	$5,411,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	$15,595,600	$0	$0	$15,595,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	100	$15,595,600	$0	$0	$15,595,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				100	$9,029,300	$0	$0	$9,029,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$180,000	$0	$0	$180,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	99	$8,849,300	$0	$0	$8,849,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				100	$9,134,400	$0	$0	$9,134,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$180,000	$0	$0	$180,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$930,900	$0	$0	$930,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$108,200	$0	$0	$108,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,127,600	$0	$0	$1,127,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$438,800	$0	$0	$438,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	58	$4,816,000	$0	$0	$4,816,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,532,900	$0	$0	$1,532,900
TOTAL				100	$70,406,200	$0	$0	$70,406,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890906388	0	PROCOPAL S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43A 19 17 PISO 5	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1499249989	9486238328	E	2025/05/22	2025/05/22	BANCOLOMBIA	0	$371,040,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (320 Afiliados)																							**$1,152,857,566**	**$188,063,200**			**$1,200,847,698**	**$66,148,500**			**$1,201,419,069**	**$47,719,100**			**$1,200,847,698**		**$58,543,100**		**$211,288,895**	**$10,566,800**		**$371,040,700**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (231 Afiliados)																							**$748,906,332**	**$121,237,300**			**$767,022,284**	**$38,017,600**			**$766,177,763**	**$30,396,700**			**$767,022,284**		**$51,010,800**		**$84,589,625**	**$4,230,600**		**$244,893,000**
Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							**$11,392,616**	**$1,823,200**			**$13,852,197**	**$554,600**			**$13,852,197**	**$554,600**			**$13,852,197**		**$932,800**		**$0**	**$0**		**$3,865,200**
1	CC	98643200	CORDOBA GONZALO													L					25-14	1	$78,894	$12,700	EPS010	1	$78,894	$3,200	CCF04	1	$78,894	$3,200	14-7	1	$78,894	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,100
2	CC	98643200	CORDOBA GONZALO									X									25-14	29	$2,240,489	$358,500	EPS010	29	$2,240,489	$89,700	CCF04	29	$2,240,489	$89,700	14-7	29	$2,240,489	6.960%	$156,000	29	$0	$0	Si	$693,900
3	CC	15513087	GOMEZ JAIME									X									25-14	29	$2,996,952	$479,600	EPS010	29	$2,996,952	$119,900	CCF04	29	$2,996,952	$119,900	14-7	29	$2,996,952	6.960%	$208,600	29	$0	$0	Si	$928,000
4	CC	15513087	GOMEZ JAIME													L					25-14	1	$84,467	$13,600	EPS010	1	$84,467	$3,400	CCF04	1	$84,467	$3,400	14-7	1	$84,467	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,400
5	CC	8429813	MURILLO JUSTO									X									230301	29	$2,815,841	$450,600	EPS010	29	$2,815,841	$112,700	CCF04	29	$2,815,841	$112,700	14-7	29	$2,815,841	6.960%	$196,000	29	$0	$0	Si	$872,000
6	CC	8429813	MURILLO JUSTO													L					230301	1	$109,280	$17,500	EPS010	1	$109,280	$4,400	CCF04	1	$109,280	$4,400	14-7	1	$109,280	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,300
7	CC	98577310	SANCHEZ WILSON													L					25-14	1	$105,447	$16,900	EPS037	1	$105,447	$4,300	CCF04	1	$105,447	$4,300	14-7	1	$105,447	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,500
8	CC	98577310	SANCHEZ WILSON									X									25-14	29	$2,961,246	$473,800	EPS037	29	$2,961,246	$118,500	CCF04	29	$2,961,246	$118,500	14-7	29	$2,961,246	6.960%	$206,200	29	$0	$0	Si	$917,000
9	CC	71648279	ZAPATA JAIME									X										0	$0	$0	EPS002	29	$2,383,867	$95,400	CCF04	29	$2,383,867	$95,400	14-7	29	$2,383,867	6.960%	$166,000	29	$0	$0	Si	$356,800
10	CC	71648279	ZAPATA JAIME													L						0	$0	$0	EPS002	1	$75,714	$3,100	CCF04	1	$75,714	$3,100	14-7	1	$75,714	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$17,704,428**	**$3,010,000**			**$17,704,428**	**$2,213,100**			**$17,704,428**	**$708,300**			**$17,704,428**		**$1,191,200**		**$17,704,428**	**$885,500**		**$8,008,100**
11	CC	79263159	VALLEJO RICARDO									X									25-14	29	$17,114,278	$2,909,500	EPS002	29	$17,114,278	$2,139,300	CCF24	29	$17,114,278	$684,600	14-7	29	$17,114,278	6.960%	$1,191,200	29	$17,114,278	$855,800	No	$7,780,400
12	CC	79263159	VALLEJO RICARDO													L					25-14	1	$590,150	$100,500	EPS002	1	$590,150	$73,800	CCF24	1	$590,150	$23,700	14-7	1	$590,150	0.000%	$0	1	$590,150	$29,700	No	$227,700
Ciudad: CALDAS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$2,977,675**	**$476,500**			**$2,977,675**	**$119,200**			**$2,977,675**	**$119,200**			**$2,977,675**		**$202,200**		**$0**	**$0**		**$917,100**
13	CC	98632895	ECHEVERRI JORGE									X									25-14	29	$2,904,711	$464,800	EPS010	29	$2,904,711	$116,200	CCF04	29	$2,904,711	$116,200	14-7	29	$2,904,711	6.960%	$202,200	29	$0	$0	Si	$899,400
14	CC	98632895	ECHEVERRI JORGE													L					25-14	1	$72,964	$11,700	EPS010	1	$72,964	$3,000	CCF04	1	$72,964	$3,000	14-7	1	$72,964	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,700
Ciudad: CAUCASIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$2,841,348**	**$454,700**			**$2,841,348**	**$113,700**			**$2,841,348**	**$113,700**			**$2,841,348**		**$191,800**		**$0**	**$0**		**$873,900**
15	CC	8046640	SOTO JULIO									X									25-14	29	$2,754,571	$440,800	EPS010	29	$2,754,571	$110,200	CCF04	29	$2,754,571	$110,200	14-7	29	$2,754,571	6.960%	$191,800	29	$0	$0	Si	$853,000
16	CC	8046640	SOTO JULIO													L					25-14	1	$86,777	$13,900	EPS010	1	$86,777	$3,500	CCF04	1	$86,777	$3,500	14-7	1	$86,777	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,900

Planilla Resumen

Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)									$42,488,506	$6,918,000			$42,488,506	$1,700,800			$42,488,505	$1,700,800			$42,488,506		$2,886,200		$0	$0		$13,205,800
17	CC	7838148	ACOSTA JOSE	X	X		231001	22	$2,057,564	$329,300	EPS002	22	$2,057,564	$82,400	CCF04	22	$2,057,564	$82,400	14-7	22	$2,057,564	6.960%	$143,300	22	$0	$0	Si	$637,400
18	CC	71774195	CASTAÑEDA DIDER		X		25-14	30	$3,160,208	$505,700	EPS010	30	$3,160,208	$126,500	CCF04	30	$3,160,208	$126,500	14-7	30	$3,160,208	6.960%	$220,000	30	$0	$0	Si	$978,700
19	CC	15506681	CATAÑO JORGE		X		25-14	29	$1,707,764	$273,300	EPS010	29	$1,707,764	$68,400	CCF04	29	$1,707,764	$68,400	14-7	29	$1,707,764	6.960%	$118,900	29	$0	$0	Si	$529,000
20	CC	15506681	CATAÑO JORGE			L	25-14	1	$57,914	$9,300	EPS010	1	$57,914	$2,400	CCF04	1	$57,914	$2,400	14-7	1	$57,914	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,100
21	CC	1193155584	DE LA HOZ JAVIER	X			230301	23	$1,897,910	$303,700	EPS010	23	$1,897,910	$76,000	CCF04	23	$1,897,909	$76,000	14-7	23	$1,897,910	6.960%	$132,100	23	$0	$0	Si	$587,800
22	CC	1193155584	DE LA HOZ JAVIER			L	230301	1	$82,520	$13,300	EPS010	1	$82,520	$3,400	CCF04	1	$82,520	$3,400	14-7	1	$82,520	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,100
23	CC	1128478406	ECHEVERRI ANDRES		X		25-14	29	$2,741,461	$438,700	EPS010	29	$2,741,461	$109,700	CCF04	29	$2,741,461	$109,700	14-7	29	$2,741,461	6.960%	$190,900	29	$0	$0	Si	$849,000
24	CC	1128478406	ECHEVERRI ANDRES			L	25-14	1	$93,974	$15,100	EPS010	1	$93,974	$3,800	CCF04	1	$93,974	$3,800	14-7	1	$93,974	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,700
25	CC	15511882	FLOREZ ELKIN			L	25-14	1	$64,297	$10,300	EPS010	1	$64,297	$2,600	CCF04	1	$64,297	$2,600	14-7	1	$64,297	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,500
26	CC	15511882	FLOREZ ELKIN		X		25-14	29	$2,176,074	$348,200	EPS010	29	$2,176,074	$87,100	CCF04	29	$2,176,074	$87,100	14-7	29	$2,176,074	6.960%	$151,500	29	$0	$0	Si	$673,900
27	CC	16161367	GOMEZ JOHN			L	25-14	1	$93,384	$15,000	EPS010	1	$93,384	$3,800	CCF04	1	$93,384	$3,800	14-7	1	$93,384	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,600
28	CC	16161367	GOMEZ JOHN		X		25-14	29	$3,713,192	$594,200	EPS010	29	$3,713,192	$148,600	CCF04	29	$3,713,192	$148,600	14-7	29	$3,713,192	6.960%	$258,500	29	$0	$0	Si	$1,149,900
29	CC	15505019	LOPERA CARLOS		X		25-14	29	$11,471,983	$1,950,400	EPS010	29	$11,471,983	$458,900	CCF04	29	$11,471,983	$458,900	14-7	29	$11,471,983	6.960%	$798,500	29	$0	$0	Si	$3,666,700
30	CC	15505019	LOPERA CARLOS			L	25-14	1	$361,547	$61,700	EPS010	1	$361,547	$14,500	CCF04	1	$361,547	$14,500	14-7	1	$361,547	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$90,700
31	CC	5294596	MINAYO FABIAN		X		25-14	30	$4,073,201	$651,800	EPS010	30	$4,073,201	$163,000	CCF04	30	$4,073,201	$163,000	14-7	30	$4,073,201	6.960%	$283,500	30	$0	$0	Si	$1,261,300
32	CC	15515935	RAMIREZ DIEGO			L	230301	1	$89,787	$14,400	EPS010	1	$89,787	$3,600	CCF04	1	$89,787	$3,600	14-7	1	$89,787	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,600
33	CC	15515935	RAMIREZ DIEGO		X		230301	29	$2,441,163	$390,600	EPS010	29	$2,441,163	$97,700	CCF04	29	$2,441,163	$97,700	14-7	29	$2,441,163	6.960%	$170,000	29	$0	$0	Si	$756,000
34	CC	98570084	RAMIREZ JUAN			L	231001	1	$68,564	$11,000	EPS002	1	$68,564	$2,800	CCF04	1	$68,564	$2,800	14-7	1	$68,564	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,600
35	CC	98570084	RAMIREZ JUAN		X		231001	29	$2,289,384	$366,400	EPS002	29	$2,289,384	$91,600	CCF04	29	$2,289,384	$91,600	14-7	29	$2,289,384	6.960%	$159,400	29	$0	$0	Si	$709,000
36	CC	15509829	VASQUEZ ADOLFO		X		25-14	29	$3,728,465	$596,600	EPS010	29	$3,728,465	$149,200	CCF04	29	$3,728,465	$149,200	14-7	29	$3,728,465	6.960%	$259,600	29	$0	$0	Si	$1,154,600
37	CC	15509829	VASQUEZ ADOLFO			L	25-14	1	$118,150	$19,000	EPS010	1	$118,150	$4,800	CCF04	1	$118,150	$4,800	14-7	1	$118,150	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,600
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)									$14,367,096	$2,299,300			$14,367,096	$575,300			$14,367,096	$575,300			$14,367,096		$966,400		$0	$0		$4,416,300
38	CC	98550721	BLANDON WILFER			L	25-14	1	$122,277	$19,600	EPS010	1	$122,277	$4,900	CCF04	1	$122,277	$4,900	14-7	1	$122,277	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$29,400
39	CC	98550721	BLANDON WILFER		X		25-14	29	$3,784,604	$605,600	EPS010	29	$3,784,604	$151,400	CCF04	29	$3,784,604	$151,400	14-7	29	$3,784,604	6.960%	$263,500	29	$0	$0	Si	$1,171,900
40	CC	70561634	CORREA JUAN			L	25-14	1	$120,010	$19,300	EPS010	1	$120,010	$4,900	CCF04	1	$120,010	$4,900	14-7	1	$120,010	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$29,100
41	CC	70561634	CORREA JUAN		X		25-14	29	$3,095,725	$495,400	EPS010	29	$3,095,725	$123,900	CCF04	29	$3,095,725	$123,900	14-7	29	$3,095,725	6.960%	$215,500	29	$0	$0	Si	$958,700
42	CC	71312050	HIGUITA ADRIAN			L	25-14	1	$73,094	$11,700	EPS010	1	$73,094	$3,000	CCF04	1	$73,094	$3,000	14-7	1	$73,094	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,700
43	CC	71312050	HIGUITA ADRIAN		X		25-14	29	$2,120,486	$339,300	EPS010	29	$2,120,486	$84,900	CCF04	29	$2,120,486	$84,900	14-7	29	$2,120,486	6.960%	$147,600	29	$0	$0	Si	$656,700
44	CC	6695982	RODRIGUEZ GILBERTO		X		25-14	29	$2,700,237	$432,100	EPS010	29	$2,700,237	$108,100	CCF04	29	$2,700,237	$108,100	14-7	29	$2,700,237	6.960%	$188,000	29	$0	$0	Si	$836,300
45	CC	6695982	RODRIGUEZ GILBERTO			L	25-14	1	$97,560	$15,700	EPS010	1	$97,560	$4,000	CCF04	1	$97,560	$4,000	14-7	1	$97,560	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,700
46	CC	70322696	RODRIGUEZ LEONEL			L	25-14	1	$73,134	$11,800	EPS037	1	$73,134	$3,000	CCF04	1	$73,134	$3,000	14-7	1	$73,134	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,800
47	CC	70322696	RODRIGUEZ LEONEL		X		25-14	29	$2,179,969	$348,800	EPS037	29	$2,179,969	$87,200	CCF04	29	$2,179,969	$87,200	14-7	29	$2,179,969	6.960%	$151,800	29	$0	$0	Si	$675,000
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)									$20,223,864	$3,236,600			$20,223,864	$809,600			$20,223,864	$809,600			$20,223,864		$1,367,700		$0	$0		$6,223,500

PLANILLA PAGADA

48	CC	70327714	CADAVID ELKIN													L					230301	1	$93,390	$15,000	EPS010	1	$93,390	$3,800	CCF04	1	$93,390	$3,800	14-7	1	$93,390	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,600
49	CC	70327714	CADAVID ELKIN									X									230301	29	$2,994,636	$479,200	EPS010	29	$2,994,636	$119,800	CCF04	29	$2,994,636	$119,800	14-7	29	$2,994,636	6.960%	$208,500	29	$0	$0	Si	$927,300
50	CC	70322738	CASTRILLON JOSE									X									25-14	30	$1,808,483	$289,400	EPS037	30	$1,808,483	$72,400	CCF04	30	$1,808,483	$72,400	14-7	30	$1,808,483	6.960%	$125,900	30	$0	$0	Si	$560,100
51	CC	70323439	GIL PEDRO									X									25-14	29	$1,727,424	$276,400	EPS037	29	$1,727,424	$69,100	CCF04	29	$1,727,424	$69,100	14-7	29	$1,727,424	6.960%	$120,300	29	$0	$0	Si	$534,900
52	CC	70323439	GIL PEDRO													L					25-14	1	$58,580	$9,400	EPS037	1	$58,580	$2,400	CCF04	1	$58,580	$2,400	14-7	1	$58,580	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
53	CC	98488507	GONZALEZ HECTOR													L					25-14	1	$70,104	$11,300	EPS010	1	$70,104	$2,900	CCF04	1	$70,104	$2,900	14-7	1	$70,104	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,100
54	CC	98488507	GONZALEZ HECTOR									X									25-14	29	$2,194,523	$351,200	EPS010	29	$2,194,523	$87,800	CCF04	29	$2,194,523	$87,800	14-7	29	$2,194,523	6.960%	$152,800	29	$0	$0	Si	$679,600
55	CC	98483065	MORALES JOHN													L					25-14	1	$69,770	$11,200	EPS010	1	$69,770	$2,800	CCF04	1	$69,770	$2,800	14-7	1	$69,770	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,800
56	CC	98483065	MORALES JOHN									X									25-14	29	$2,189,361	$350,300	EPS010	29	$2,189,361	$87,600	CCF04	29	$2,189,361	$87,600	14-7	29	$2,189,361	6.960%	$152,400	29	$0	$0	Si	$677,900
57	CC	70324759	PINZON JOSE									X									25-14	29	$3,557,138	$569,200	EPS010	29	$3,557,138	$142,300	CCF04	29	$3,557,138	$142,300	14-7	29	$3,557,138	6.960%	$247,600	29	$0	$0	Si	$1,101,400
58	CC	70324759	PINZON JOSE													L					25-14	1	$103,354	$16,600	EPS010	1	$103,354	$4,200	CCF04	1	$103,354	$4,200	14-7	1	$103,354	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,000
59	CC	70325014	SALAS LUIS									X									230201	29	$1,405,648	$225,000	EPS010	29	$1,405,648	$56,300	CCF04	29	$1,405,648	$56,300	14-7	29	$1,405,648	6.960%	$97,900	29	$0	$0	Si	$435,500
60	CC	70325014	SALAS LUIS													L					230201	1	$49,740	$8,000	EPS010	1	$49,740	$2,000	CCF04	1	$49,740	$2,000	14-7	1	$49,740	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
61	CC	8049017	SUAREZ ONOFRE													L					25-14	1	$133,247	$21,400	EPS010	1	$133,247	$5,400	CCF04	1	$133,247	$5,400	14-7	1	$133,247	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,200
62	CC	8049017	SUAREZ ONOFRE									X									25-14	29	$3,768,466	$603,000	EPS010	29	$3,768,466	$150,800	CCF04	29	$3,768,466	$150,800	14-7	29	$3,768,466	6.960%	$262,300	29	$0	$0	Si	$1,166,900
Ciudad: GUARNE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$2,934,502**	**$469,700**			**$2,934,502**	**$117,500**			**$2,864,743**	**$114,700**			**$2,934,502**		**$179,000**		**$0**	**$0**		**$880,900**
63	CC	3481863	ARANGO JHON									X									230201	27	$2,571,426	$411,500	EPS010	27	$2,571,426	$102,900	CCF04	27	$2,571,426	$102,900	14-7	27	$2,571,426	6.960%	$179,000	27	$0	$0	Si	$796,300
64	CC	3481863	ARANGO JHON													L					230201	1	$121,027	$19,400	EPS010	1	$121,027	$4,900	CCF04	1	$121,027	$4,900	14-7	1	$121,027	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$29,200
65	CC	3481863	ARANGO JHON													X					230201	2	$242,049	$38,800	EPS010	2	$242,049	$9,700	CCF04	2	$172,290	$6,900	14-7	2	$242,049	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$55,400
Ciudad: GUATAPE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$3,508,247**	**$561,400**			**$3,508,247**	**$140,400**			**$3,508,247**	**$140,400**			**$3,508,247**		**$244,200**		**$0**	**$0**		**$1,086,400**
66	CC	3497347	QUINTERO EDGAR									X									25-14	30	$3,508,247	$561,400	EPS037	30	$3,508,247	$140,400	CCF04	30	$3,508,247	$140,400	14-7	30	$3,508,247	6.960%	$244,200	30	$0	$0	Si	$1,086,400
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							**$12,732,021**	**$2,127,300**			**$12,732,021**	**$509,500**			**$12,732,021**	**$509,500**			**$12,732,021**		**$857,400**		**$0**	**$0**		**$4,003,700**
67	CC	1036629241	BEDOYA CARLOS									X									230201	29	$8,688,156	$1,477,200	EPS010	29	$8,688,156	$347,600	CCF04	29	$8,688,156	$347,600	14-7	29	$8,688,156	6.960%	$604,700	29	$0	$0	Si	$2,777,100
68	CC	1036629241	BEDOYA CARLOS													L					230201	1	$299,594	$51,000	EPS010	1	$299,594	$12,000	CCF04	1	$299,594	$12,000	14-7	1	$299,594	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$75,000
69	CC	10195262	MARIN UBER		P							X									25-14	29	$3,630,597	$580,900	EPS010	29	$3,630,597	$145,300	CCF04	29	$3,630,597	$145,300	14-7	29	$3,630,597	6.960%	$252,700	29	$0	$0	Si	$1,124,200
70	CC	10195262	MARIN UBER		P											L					25-14	1	$113,674	$18,200	EPS010	1	$113,674	$4,600	CCF04	1	$113,674	$4,600	14-7	1	$113,674	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$27,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$1,430,001**	**$228,900**			**$1,430,001**	**$57,300**			**$1,430,000**	**$57,300**			**$1,430,001**		**$96,300**		**$0**	**$0**		**$439,800**
71	CC	70909457	GOMEZ MANUEL																		230301	29	$1,382,334	$221,200	EPS037	29	$1,382,334	$55,300	CCF04	29	$1,382,333	$55,300	14-7	29	$1,382,334	6.960%	$96,300	29	$0	$0	Si	$428,100
72	CC	70909457	GOMEZ MANUEL													L					230301	1	$47,667	$7,700	EPS037	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (192 Afiliados)																							**$616,306,028**	**$99,631,700**			**$627,341,241**	**$30,921,700**			**$626,566,481**	**$24,808,400**			**$627,341,241**		**$41,573,900**		**$66,885,197**	**$3,345,100**		**$200,280,800**
73	CC	15373782	ACEVEDO CAMILO													L					230201	1	$113,697	$18,200	EPS010	1	$113,697	$4,600	CCF04	1	$113,697	$4,600	14-7	1	$113,697	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$27,400
74	CC	15373782	ACEVEDO CAMILO									X									230201	29	$3,740,000	$598,400	EPS010	29	$3,740,000	$149,600	CCF04	29	$3,740,000	$149,600	14-7	29	$3,740,000	6.960%	$260,400	29	$0	$0	Si	$1,158,000
75	CC	71217978	ACEVEDO JUAN													L					25-14	1	$144,460	$23,200	EPS010	1	$144,460	$5,800	CCF04	1	$144,460	$5,800	14-7	1	$144,460	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$34,800
76	CC	71217978	ACEVEDO JUAN									X									25-14	29	$3,893,882	$623,100	EPS010	29	$3,893,882	$155,800	CCF04	29	$3,893,882	$155,800	14-7	29	$3,893,882	6.960%	$271,100	29	$0	$0	Si	$1,205,800
77	CC	71141264	AGUDELO ALBEIRO													L					25-14	1	$77,404	$12,400	EPS010	1	$77,404	$3,100	CCF04	1	$77,404	$3,100	14-7	1	$77,404	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,600
78	CC	71141264	AGUDELO ALBEIRO									X									25-14	29	$2,389,863	$382,400	EPS010	29	$2,389,863	$95,600	CCF04	29	$2,389,863	$95,600	14-7	29	$2,389,863	6.960%	$166,400	29	$0	$0	Si	$740,000
79	CC	71673847	AGUDELO JAIR									X									25-14	29	$3,212,294	$514,000	EPS010	29	$3,212,294	$128,500	CCF04	29	$3,212,294	$128,500	14-7	29	$3,212,294	6.960%	$223,600	29	$0	$0	Si	$994,600
80	CC	71673847	AGUDELO JAIR													L					25-14	1	$97,090	$15,600	EPS010	1	$97,090	$3,900	CCF04	1	$97,090	$3,900	14-7	1	$97,090	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,400
81	CC	98712131	AGUDELO JOHN													L					230201	1	$467,897	$79,700	EPS037	1	$467,897	$18,800	CCF04	1	$467,897	$18,800	14-7	1	$467,897	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$117,300
82	CC	98712131	AGUDELO JOHN									X									230201	29	$13,568,930	$2,306,900	EPS037	29	$13,568,930	$542,800	CCF04	29	$13,568,930	$542,800	14-7	29	$13,568,930	6.960%	$944,400	29	$0	$0	Si	$4,336,900
83	CC	71053330	AGUIRRE HERNANDO									X									25-14	29	$2,927,588	$468,500	EPS010	29	$2,927,588	$117,200	CCF04	29	$2,927,588	$117,200	14-7	29	$2,927,588	6.960%	$203,800	29	$0	$0	Si	$906,700
84	CC	71053330	AGUIRRE HERNANDO													L					25-14	1	$98,674	$15,800	EPS010	1	$98,674	$4,000	CCF04	1	$98,674	$4,000	14-7	1	$98,674	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,800
85	CC	85443499	ALVARADO ALEXANDER													L					230201	1	$75,264	$12,100	EPS002	1	$75,264	$3,100	CCF04	1	$75,264	$3,100	14-7	1	$75,264	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,300
86	CC	85443499	ALVARADO ALEXANDER									X									230201	29	$2,588,742	$414,200	EPS002	29	$2,588,742	$103,600	CCF04	29	$2,588,742	$103,600	14-7	29	$2,588,742	6.960%	$180,200	29	$0	$0	Si	$801,600
87	CC	1128471190	ALVAREZ ANDRES		X							X									230301	1	$446,179	$71,400	EPS002	1	$446,179	$17,900	CCF04	1	$725,023	$29,100	14-7	1	$446,179	6.960%	$31,100	1	$0	$0	Si	$149,500

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

88	CC	71364005	ALZATE LUIS									X									230201	29	$2,631,119	$421,000	EPS010	29	$2,631,119	$105,300	CCF04	29	$2,631,119	$105,300	14-7	29	$2,631,119	6.960%	$183,200	29	$0	$0	Si	$814,800
89	CC	71364005	ALZATE LUIS													L					230201	1	$73,074	$11,700	EPS010	1	$73,074	$3,000	CCF04	1	$73,074	$3,000	14-7	1	$73,074	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,700
90	CC	71330851	AMAYA WILSON									X									230301	29	$1,500,463	$240,100	EPS010	29	$1,500,463	$60,100	CCF04	29	$1,500,463	$60,100	14-7	29	$1,500,463	6.960%	$104,500	29	$0	$0	Si	$464,800
91	CC	71330851	AMAYA WILSON													L					230301	1	$47,667	$7,700	EPS010	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
92	CC	16596905	ANGULO LUIS		P							X									25-14	29	$7,591,808	$1,290,700	EPS010	29	$7,591,808	$303,700	CCF04	29	$7,591,808	$303,700	14-7	29	$7,591,808	6.960%	$528,400	29	$0	$0	Si	$2,426,500
93	CC	16596905	ANGULO LUIS		P											L					25-14	1	$261,787	$44,700	EPS010	1	$261,787	$10,500	CCF04	1	$261,787	$10,500	14-7	1	$261,787	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$65,700
94	CC	70662571	ARANGO ELKIN													L					25-14	1	$107,670	$17,300	EPS037	1	$107,670	$4,400	CCF04	1	$107,670	$4,400	14-7	1	$107,670	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,100
95	CC	70662571	ARANGO ELKIN									X									25-14	29	$3,445,186	$551,300	EPS037	29	$3,445,186	$137,900	CCF04	29	$3,445,186	$137,900	14-7	29	$3,445,186	6.960%	$239,800	29	$0	$0	Si	$1,066,900
96	CC	71020317	ARIAS ANGEL													L					231001	1	$94,314	$15,100	EPS002	1	$94,314	$3,800	CCF04	1	$94,314	$3,800	14-7	1	$94,314	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,700
97	CC	71020317	ARIAS ANGEL											X							231001	1	$75,123	$12,100	EPS002	1	$75,123	$3,100	CCF04	1	$75,123	$0	14-7	1	$75,123	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,200
98	CC	71020317	ARIAS ANGEL									X									231001	28	$2,791,791	$446,700	EPS002	28	$2,791,791	$111,700	CCF04	28	$2,791,791	$111,700	14-7	28	$2,791,791	6.960%	$194,400	28	$0	$0	Si	$864,500
99	CC	70725497	ARIAS JOHN									X									25-14	28	$2,654,047	$424,700	EPS010	28	$2,654,047	$106,200	CCF04	28	$2,654,047	$106,200	14-7	28	$2,654,047	6.960%	$184,800	28	$0	$0	Si	$821,900
100	CC	70725497	ARIAS JOHN													L					25-14	1	$83,316	$13,400	EPS010	1	$83,316	$3,400	CCF04	1	$83,316	$3,400	14-7	1	$83,316	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,200
101	CC	70725497	ARIAS JOHN										X								25-14	1	$83,316	$10,000	EPS010	1	$83,316	$0	CCF04	1	$83,316	$0	14-7	1	$83,316	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,000
102	CC	98516921	ARIAS URIEL									X									25-14	30	$2,445,565	$391,300	EPS010	30	$2,445,565	$97,900	CCF04	30	$2,445,565	$97,900	14-7	30	$2,445,565	6.960%	$170,300	30	$0	$0	Si	$757,400
103	CC	71749036	ARROYAVE CARLOS									X									25-14	29	$2,192,427	$350,800	EPS010	29	$2,192,427	$87,700	CCF04	29	$2,192,427	$87,700	14-7	29	$2,192,427	6.960%	$152,600	29	$0	$0	Si	$678,800
104	CC	71749036	ARROYAVE CARLOS													L					25-14	1	$82,640	$13,300	EPS010	1	$82,640	$3,400	CCF04	1	$82,640	$3,400	14-7	1	$82,640	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,100
105	CC	1018351827	ATEHORTUA SANTIAGO		X							X									230301	14	$1,113,275	$178,200	EPS037	14	$1,113,275	$44,600	CCF04	14	$1,266,067	$50,700	14-7	14	$1,113,275	6.960%	$77,500	14	$0	$0	Si	$351,000
106	CC	79816114	AVELLANEDA SALOMON													L					25-14	1	$88,492	$14,200	EPS010	1	$88,492	$3,600	CCF04	1	$88,492	$3,600	14-7	1	$88,492	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,400
107	CC	79816114	AVELLANEDA SALOMON									X									25-14	29	$4,000,689	$640,200	EPS010	29	$4,000,689	$160,100	CCF04	29	$4,000,689	$160,100	14-7	29	$4,000,689	6.960%	$278,500	29	$0	$0	Si	$1,238,900
108	CC	1193298224	AVENDAÑO JHON	X																	230301	16	$762,667	$122,100	EPS002	16	$762,667	$30,600	CCF04	16	$762,666	$30,600	14-7	16	$762,667	6.960%	$53,100	16	$0	$0	Si	$236,400
109	CC	1193298224	AVENDAÑO JHON													L					230301	1	$47,667	$7,700	EPS002	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
110	CC	8686253	AVILA CARMELO									X									25-14	29	$2,480,191	$396,900	EPS010	29	$2,480,191	$99,300	CCF04	29	$2,480,190	$99,300	14-7	29	$2,480,191	6.960%	$172,700	29	$0	$0	Si	$768,200
111	CC	8686253	AVILA CARMELO													L					25-14	1	$85,527	$13,700	EPS010	1	$85,527	$3,500	CCF04	1	$85,527	$3,500	14-7	1	$85,527	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,700
112	CC	98467315	AYALA EVELIO													L					230301	1	$72,310	$11,600	EPS037	1	$72,310	$2,900	CCF04	1	$72,310	$2,900	14-7	1	$72,310	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,400
113	CC	98467315	AYALA EVELIO									X									230301	29	$2,319,162	$371,100	EPS037	29	$2,319,162	$92,800	CCF04	29	$2,319,162	$92,800	14-7	29	$2,319,162	6.960%	$161,500	29	$0	$0	Si	$718,200
114	CC	1101460881	BELLO ROMAN									X									230201	29	$2,706,482	$433,100	EPS037	29	$2,706,482	$108,300	CCF04	29	$2,706,482	$108,300	14-7	29	$2,706,482	6.960%	$188,400	29	$0	$0	Si	$838,100
115	CC	1101460881	BELLO ROMAN													L					230201	1	$75,444	$12,100	EPS037	1	$75,444	$3,100	CCF04	1	$75,444	$3,100	14-7	1	$75,444	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,300
116	CC	1193156390	BENITEZ CRISTIAN									X									230201	30	$2,630,984	$421,000	EPS010	30	$2,630,984	$105,300	CCF04	30	$2,630,984	$105,300	14-7	30	$2,630,984	6.960%	$183,200	30	$0	$0	Si	$814,800
117	CC	44006112	BERRIO MAIDA													X					231001	7	$883,440	$141,400	EPS037	7	$883,440	$35,400	CCF04	7	$883,440	$35,400	14-7	7	$883,440	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$212,200
118	CC	44006112	BERRIO MAIDA												X						231001	23	$2,902,730	$464,500	EPS037	23	$2,902,730	$116,200	CCF04	23	$2,902,730	$116,200	14-7	23	$2,902,730	0.000%	$0	23	$0	$0	Si	$696,900
119	CC	71384581	BOTERO EDWIN									X									230301	28	$1,897,512	$303,700	EPS010	28	$1,897,512	$76,000	CCF04	28	$1,897,512	$76,000	14-7	28	$1,897,512	6.960%	$132,100	28	$0	$0	Si	$587,800
120	CC	71384581	BOTERO EDWIN													L					230301	1	$69,097	$11,100	EPS010	1	$69,097	$2,800	CCF04	1	$69,097	$2,800	14-7	1	$69,097	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,700
121	CC	71384581	BOTERO EDWIN											X							230301	1	$58,858	$9,500	EPS010	1	$58,858	$2,400	CCF04	1	$58,858	$0	14-7	1	$58,858	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,900
122	CC	1075209761	BUSTAMANTE NELSON									X									230301	30	$3,662,177	$586,000	EPS017	30	$3,662,177	$146,500	CCF04	30	$3,662,177	$146,500	14-7	30	$3,662,177	6.960%	$254,900	30	$0	$0	Si	$1,133,900
123	CC	71988959	CACERES HARLEY													L					230301	1	$66,890	$10,800	EPS002	1	$66,890	$2,700	CCF04	1	$66,890	$2,700	14-7	1	$66,890	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,200
124	CC	71988959	CACERES HARLEY									X									230301	29	$2,216,268	$354,700	EPS002	29	$2,216,268	$88,700	CCF04	29	$2,216,268	$88,700	14-7	29	$2,216,268	6.960%	$154,300	29	$0	$0	Si	$686,400
125	CC	1002126984	CAICEDO FERNEY		X							X									230201	27	$2,677,052	$428,400	EPS037	27	$2,677,052	$107,100	CCF04	27	$3,742,162	$149,700	14-7	27	$2,677,052	6.960%	$186,400	27	$0	$0	Si	$871,600
126	CC	1002126984	CAICEDO FERNEY													L					230201	1	$85,537	$13,700	EPS037	1	$85,537	$3,500	CCF04	1	$85,537	$3,500	14-7	1	$85,537	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,700
127	CC	98495973	CALLEJAS ARNOLDO									X									25-14	29	$4,157,301	$665,200	EPS010	29	$4,157,301	$166,300	CCF04	29	$4,157,301	$166,300	14-7	29	$4,157,301	6.960%	$289,400	29	$0	$0	Si	$1,287,200
128	CC	98495973	CALLEJAS ARNOLDO													L					25-14	1	$128,997	$20,700	EPS010	1	$128,997	$5,200	CCF04	1	$128,997	$5,200	14-7	1	$128,997	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,100
129	CC	1047996571	CANO JUAN									X									230201	29	$2,762,622	$442,100	EPS010	29	$2,762,622	$110,600	CCF04	29	$2,762,622	$110,600	14-7	29	$2,762,622	6.960%	$192,300	29	$0	$0	Si	$855,600

Planilla Resumen

130	CC	1047996571	CANO JUAN												L						230201	1	$85,370	$13,700	EPS010	1	$85,370	$3,500	CCF04	1	$85,370	$3,500	14-7	1	$85,370	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,700
131	CC	98654257	CARDONA CARLOS												L						230201	1	$73,230	$11,800	EPS010	1	$73,230	$3,000	CCF04	1	$73,230	$3,000	14-7	1	$73,230	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,800
132	CC	98654257	CARDONA CARLOS								X										230201	29	$2,486,088	$397,800	EPS010	29	$2,486,088	$99,500	CCF04	29	$2,486,088	$99,500	14-7	29	$2,486,088	6.960%	$173,100	29	$0	$0	Si	$769,900
133	CC	8038715	CARO ORLEY												L						25-14	1	$130,047	$20,900	EPS010	1	$130,047	$5,300	CCF04	1	$130,047	$5,300	14-7	1	$130,047	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,500
134	CC	8038715	CARO ORLEY								X										25-14	27	$4,577,209	$732,400	EPS010	27	$4,577,209	$183,100	CCF04	27	$4,577,209	$183,100	14-7	27	$4,577,209	6.960%	$318,600	27	$0	$0	Si	$1,417,200
135	CC	8038715	CARO ORLEY												X						25-14	2	$260,087	$41,700	EPS010	2	$260,087	$10,500	CCF04	2	$236,349	$9,500	14-7	2	$260,087	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$61,700
136	CC	1033646518	CARVAJAL CARLOS												L						230201	1	$91,270	$14,700	EPS010	1	$91,270	$3,700	CCF04	1	$91,270	$3,700	14-7	1	$91,270	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,100
137	CC	1033646518	CARVAJAL CARLOS								X										230201	29	$2,779,492	$444,800	EPS010	29	$2,779,492	$111,200	CCF04	29	$2,779,492	$111,200	14-7	29	$2,779,492	6.960%	$193,500	29	$0	$0	Si	$860,700
138	CC	3420862	CASTAÑO LUIS												L						25-14	1	$64,297	$10,300	EPS005	1	$64,297	$2,600	CCF04	1	$64,297	$2,600	14-7	1	$64,297	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,500
139	CC	3420862	CASTAÑO LUIS								X										25-14	29	$1,990,320	$318,500	EPS005	29	$1,990,320	$79,700	CCF04	29	$1,990,320	$79,700	14-7	29	$1,990,320	6.960%	$138,600	29	$0	$0	Si	$616,500
140	CC	71631851	CHANCI GABRIEL								X										25-14	30	$5,558,710	$889,400	EPS010	30	$5,558,710	$222,400	CCF04	30	$5,558,710	$222,400	14-7	30	$5,558,710	6.960%	$386,900	30	$0	$0	Si	$1,721,100
141	CC	1035859628	CIRO YEISON												L						230301	1	$110,294	$17,700	EPS010	1	$110,294	$4,500	CCF04	1	$110,294	$4,500	14-7	1	$110,294	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,700
142	CC	1035859628	CIRO YEISON								X										230301	29	$2,512,779	$402,100	EPS010	29	$2,512,779	$100,600	CCF04	29	$2,512,779	$100,600	14-7	29	$2,512,779	6.960%	$174,900	29	$0	$0	Si	$778,200
143	CC	70322701	CORDOBA EDGAR												L						25-14	1	$95,227	$15,300	EPS010	1	$95,227	$3,900	CCF04	1	$95,227	$3,900	14-7	1	$95,227	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,100
144	CC	70322701	CORDOBA EDGAR								X										25-14	29	$2,802,523	$448,500	EPS010	29	$2,802,523	$112,200	CCF04	29	$2,802,523	$112,200	14-7	29	$2,802,523	6.960%	$195,100	29	$0	$0	Si	$868,000
145	CC	15510276	CORREA EDGAR												L						25-14	1	$79,067	$12,700	EPS010	1	$79,067	$3,200	CCF04	1	$79,067	$3,200	14-7	1	$79,067	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,100
146	CC	15510276	CORREA EDGAR								X										25-14	29	$3,006,205	$481,000	EPS010	29	$3,006,205	$120,300	CCF04	29	$3,006,205	$120,300	14-7	29	$3,006,205	6.960%	$209,300	29	$0	$0	Si	$930,900
147	CC	1037264998	CORREA HENRY												L						231001	1	$93,870	$15,100	EPS037	1	$93,870	$3,800	CCF04	1	$93,870	$3,800	14-7	1	$93,870	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,700
148	CC	1037264998	CORREA HENRY								X										231001	29	$2,684,149	$429,500	EPS037	29	$2,684,149	$107,400	CCF04	29	$2,684,149	$107,400	14-7	29	$2,684,149	6.960%	$186,900	29	$0	$0	Si	$831,200
149	CC	1002147650	CORREA OMAR								X										230201	29	$1,816,773	$290,700	EPS042	29	$1,816,773	$72,700	CCF04	29	$1,816,773	$72,700	14-7	29	$1,816,773	6.960%	$126,500	29	$0	$0	Si	$562,600
150	CC	1002147650	CORREA OMAR												L						230201	1	$48,040	$7,700	EPS042	1	$48,040	$2,000	CCF04	1	$48,040	$2,000	14-7	1	$48,040	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
151	CC	1037776242	CORREA YEISON												L						230301	1	$59,637	$9,600	EPS040	1	$59,637	$2,400	CCF04	1	$59,637	$2,400	14-7	1	$59,637	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,400
152	CC	1037776242	CORREA YEISON								X										230301	29	$1,900,708	$304,200	EPS040	29	$1,900,708	$76,100	CCF04	29	$1,900,708	$76,100	14-7	29	$1,900,708	6.960%	$132,300	29	$0	$0	Si	$588,700
153	CC	15286180	DAVID JESUS								X										25-14	29	$2,476,110	$396,200	EPS010	29	$2,476,110	$99,100	CCF04	29	$2,476,110	$99,100	14-7	29	$2,476,110	6.960%	$172,400	29	$0	$0	Si	$766,800
154	CC	15286180	DAVID JESUS												L						25-14	1	$79,280	$12,700	EPS010	1	$79,280	$3,200	CCF04	1	$79,280	$3,200	14-7	1	$79,280	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,100
155	CC	1001508526	DAVID WILLIAM												L						230301	1	$59,844	$9,600	EPS002	1	$59,844	$2,400	CCF04	1	$59,844	$2,400	14-7	1	$59,844	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,400
156	CC	1001508526	DAVID WILLIAM								X										230301	29	$1,826,876	$292,400	EPS002	29	$1,826,876	$73,100	CCF04	29	$1,826,876	$73,100	14-7	29	$1,826,876	6.960%	$127,200	29	$0	$0	Si	$565,800
157	CC	15814933	DELGADO DAMIR								X										25-14	29	$2,741,461	$438,700	EPS002	29	$2,741,461	$109,700	CCF04	29	$2,741,461	$109,700	14-7	29	$2,741,461	6.960%	$190,900	29	$0	$0	Si	$849,000
158	CC	15814933	DELGADO DAMIR												L						25-14	1	$86,707	$13,900	EPS002	1	$86,707	$3,500	CCF04	1	$86,707	$3,500	14-7	1	$86,707	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,900
159	CC	1100548247	DIAZ BREYNER												L						230201	1	$59,060	$9,500	EPS010	1	$59,060	$2,400	CCF04	1	$59,060	$2,400	14-7	1	$59,060	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,300
160	CC	1100548247	DIAZ BREYNER								X										230201	29	$1,783,410	$285,400	EPS010	29	$1,783,410	$71,400	CCF04	29	$1,783,410	$71,400	14-7	29	$1,783,410	6.960%	$124,200	29	$0	$0	Si	$552,400
161	CC	1042213637	DIAZ JOSE												L						230301	1	$56,944	$9,200	EPS040	1	$56,944	$2,300	CCF04	1	$56,944	$2,300	14-7	1	$56,944	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,800
162	CC	1042213637	DIAZ JOSE								X										230301	29	$1,806,669	$289,100	EPS040	29	$1,806,669	$72,300	CCF04	29	$1,806,669	$72,300	14-7	29	$1,806,669	6.960%	$125,800	29	$0	$0	Si	$559,500
163	CC	1038338392	DUARTE CRISTIAN								X										230301	29	$3,892,247	$622,800	EPS010	29	$3,892,247	$155,700	CCF04	29	$3,892,247	$155,700	14-7	29	$3,892,247	6.960%	$271,000	29	$0	$0	Si	$1,205,200
164	CC	1038338392	DUARTE CRISTIAN												L						230301	1	$127,510	$20,500	EPS010	1	$127,510	$5,200	CCF04	1	$127,510	$5,200	14-7	1	$127,510	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,900
165	CC	3551580	DUQUE NORLEY								X										230301	29	$2,167,643	$346,900	EPS010	29	$2,167,643	$86,800	CCF04	29	$2,167,643	$86,800	14-7	29	$2,167,643	6.960%	$150,900	29	$0	$0	Si	$671,400
166	CC	3551580	DUQUE NORLEY												L						230301	1	$79,777	$12,800	EPS010	1	$79,777	$3,200	CCF04	1	$79,777	$3,200	14-7	1	$79,777	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,200
167	CC	71363586	DURANGO NEVARDO												L						25-14	1	$88,244	$14,200	EPS010	1	$88,244	$3,600	CCF04	1	$88,244	$3,600	14-7	1	$88,244	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,400
168	CC	71363586	DURANGO NEVARDO								X										25-14	29	$2,391,351	$382,700	EPS010	29	$2,391,351	$95,700	CCF04	29	$2,391,351	$95,700	14-7	29	$2,391,351	6.960%	$166,500	29	$0	$0	Si	$740,600
169	CC	98575077	ECHAVARRIA LUIS								X										25-14	29	$2,411,987	$386,000	EPS010	29	$2,411,987	$96,500	CCF04	29	$2,411,987	$96,500	14-7	29	$2,411,987	6.960%	$167,900	29	$0	$0	Si	$746,900
170	CC	98575077	ECHAVARRIA LUIS												L						25-14	1	$88,014	$14,100	EPS010	1	$88,014	$3,600	CCF04	1	$88,014	$3,600	14-7	1	$88,014	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,300
171	CC	71225651	ECHEVERRI RUBEN												L						230201	1	$82,877	$13,300	EPS010	1	$82,877	$3,400	CCF04	1	$82,877	$3,400	14-7	1	$82,877	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,100
172	CC	71225651	ECHEVERRI RUBEN								X										230201	29	$2,876,109	$460,200	EPS010	29	$2,876,109	$115,100	CCF04	29	$2,876,109	$115,100	14-7	29	$2,876,109	6.960%	$200,200	29	$0	$0	Si	$890,600

173	CC	8064546	ESTRADA DIEGO									X									230201	29	$1,929,463	$308,800	EPS037	29	$1,929,463	$77,200	CCF04	29	$1,929,463	$77,200	14-7	29	$1,929,463	6.960%	$134,300	29	$0	$0	Si	$597,500
174	CC	8064546	ESTRADA DIEGO													L					230201	1	$74,897	$12,000	EPS037	1	$74,897	$3,000	CCF04	1	$74,897	$3,000	14-7	1	$74,897	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,000
175	CC	1046932863	FLOREZ JUAN													L					25-14	1	$85,800	$13,800	EPS037	1	$85,800	$3,500	CCF04	1	$85,800	$3,500	14-7	1	$85,800	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,800
176	CC	1046932863	FLOREZ JUAN									X									25-14	29	$2,387,374	$382,000	EPS037	29	$2,387,374	$95,500	CCF04	29	$2,387,374	$95,500	14-7	29	$2,387,374	6.960%	$166,200	29	$0	$0	Si	$739,200
177	CC	1039597978	FLOREZ WILLFRED									X									230201	29	$3,179,061	$508,700	EPS040	29	$3,179,061	$127,200	CCF04	29	$3,179,061	$127,200	14-7	29	$3,179,061	6.960%	$221,300	29	$0	$0	Si	$984,400
178	CC	1039597978	FLOREZ WILLFRED													L					230201	1	$72,534	$11,700	EPS040	1	$72,534	$3,000	CCF04	1	$72,534	$3,000	14-7	1	$72,534	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,700
179	CC	1036948674	FORONDA SEBASTIAN									X									230201	29	$2,489,507	$398,400	EPS037	29	$2,489,507	$99,600	CCF04	29	$2,489,507	$99,600	14-7	29	$2,489,507	6.960%	$173,300	29	$0	$0	Si	$770,900
180	CC	1036948674	FORONDA SEBASTIAN													L					230201	1	$80,097	$12,900	EPS037	1	$80,097	$3,300	CCF04	1	$80,097	$3,300	14-7	1	$80,097	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,500
181	CC	71221980	FRANCO CESAR									X									230201	29	$5,201,622	$832,300	EPS010	29	$5,201,622	$208,100	CCF04	29	$5,201,622	$208,100	14-7	29	$5,201,622	6.960%	$362,100	29	$0	$0	Si	$1,610,600
182	CC	71221980	FRANCO CESAR													L					230201	1	$156,407	$25,100	EPS010	1	$156,407	$6,300	CCF04	1	$156,407	$6,300	14-7	1	$156,407	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$37,700
183	CC	1036668275	FRANCO WILSON													L					230301	1	$79,537	$12,800	EPS010	1	$79,537	$3,200	CCF04	1	$79,537	$3,200	14-7	1	$79,537	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,200
184	CC	1036668275	FRANCO WILSON									X									230301	29	$2,687,841	$430,100	EPS010	29	$2,687,841	$107,600	CCF04	29	$2,687,841	$107,600	14-7	29	$2,687,841	6.960%	$187,100	29	$0	$0	Si	$832,400
185	CC	9923360	GAÑAN JOSE									X									231001	29	$1,806,669	$289,100	EPS002	29	$1,806,669	$72,300	CCF04	29	$1,806,669	$72,300	14-7	29	$1,806,669	6.960%	$125,800	29	$0	$0	Si	$559,500
186	CC	9923360	GAÑAN JOSE													L					231001	1	$53,237	$8,600	EPS002	1	$53,237	$2,200	CCF04	1	$53,237	$2,200	14-7	1	$53,237	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,000
187	CC	98481409	GARCIA ARMANDO									X									25-14	29	$2,710,139	$433,700	EPS010	29	$2,710,139	$108,500	CCF04	29	$2,710,139	$108,500	14-7	29	$2,710,139	6.960%	$188,700	29	$0	$0	Si	$839,400
188	CC	98481409	GARCIA ARMANDO													L					25-14	1	$87,334	$14,000	EPS010	1	$87,334	$3,500	CCF04	1	$87,334	$3,500	14-7	1	$87,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,000
189	CC	32295460	GARZON MERLLY													L					230201	1	$490,247	$83,500	EPS010	1	$490,247	$61,300	CCF04	1	$490,247	$19,700	14-7	1	$490,247	0.000%	$0	1	$490,247	$24,700	No	$189,200
190	CC	32295460	GARZON MERLLY									X									230201	29	$14,217,143	$2,417,000	EPS010	29	$14,217,143	$1,777,200	CCF04	29	$14,217,143	$568,700	14-7	29	$14,217,143	6.960%	$989,600	29	$14,217,143	$711,000	No	$6,463,500
191	CC	1007311472	GIRALDO ALEJANDRA									X									25-14	29	$4,460,540	$713,700	EPS037	29	$4,460,540	$178,500	CCF04	29	$4,460,540	$178,500	14-7	29	$4,460,540	6.960%	$310,500	29	$0	$0	Si	$1,381,200
192	CC	1007311472	GIRALDO ALEJANDRA													L					25-14	1	$137,820	$22,100	EPS037	1	$137,820	$5,600	CCF04	1	$137,820	$5,600	14-7	1	$137,820	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,300
193	CC	15513485	GIRALDO EDWIN									X									25-14	29	$3,075,026	$492,100	EPS010	29	$3,075,026	$123,100	CCF04	29	$3,075,026	$123,100	14-7	29	$3,075,026	6.960%	$214,100	29	$0	$0	Si	$952,400
194	CC	15513485	GIRALDO EDWIN													L					25-14	1	$97,664	$15,700	EPS010	1	$97,664	$4,000	CCF04	1	$97,664	$4,000	14-7	1	$97,664	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,700
195	CC	1035880204	GOMEZ CARLOS													L					230201	1	$101,764	$16,300	EPS010	1	$101,764	$4,100	CCF04	1	$101,764	$4,100	14-7	1	$101,764	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,500
196	CC	1035880204	GOMEZ CARLOS									X									230201	29	$2,769,344	$443,100	EPS010	29	$2,769,344	$110,800	CCF04	29	$2,769,344	$110,800	14-7	29	$2,769,344	6.960%	$192,800	29	$0	$0	Si	$857,500
197	CC	1042764225	GOMEZ CARLOS																		230301	27	$2,700,000	$432,000	EPS010	27	$2,700,000	$108,000	CCF04	27	$2,700,000	$108,000	14-7	27	$2,700,000	6.960%	$188,000	27	$0	$0	Si	$836,000
198	CC	1042764225	GOMEZ CARLOS													L					230301	1	$100,000	$16,000	EPS010	1	$100,000	$4,000	CCF04	1	$100,000	$4,000	14-7	1	$100,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,000
199	CC	1042764225	GOMEZ CARLOS											X							230301	2	$200,001	$32,100	EPS010	2	$200,001	$8,100	CCF04	2	$200,001	$0	14-7	2	$200,001	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$40,200
200	CC	71644328	GOMEZ CONRADO									X										0	$0	$0	EPS010	29	$3,667,410	$146,700	CCF04	29	$3,667,410	$146,700	14-7	29	$3,667,410	6.960%	$255,300	29	$0	$0	Si	$548,700
201	CC	71644328	GOMEZ CONRADO													L						0	$0	$0	EPS010	1	$139,070	$5,600	CCF04	1	$139,070	$5,600	14-7	1	$139,070	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,200
202	CC	15508993	GOMEZ JOSE																X		25-14	13	$745,759	$119,400	EPS037	13	$745,759	$29,900	CCF04	13	$745,759	$0	14-7	13	$745,759	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$149,300
203	CC	15508993	GOMEZ JOSE																X		25-14	17	$975,223	$156,100	EPS037	17	$975,223	$39,100	CCF04	17	$975,223	$0	14-7	17	$975,223	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$195,200
204	CC	71781256	GUERRA ANDERSON																		25-14	29	$4,062,309	$650,000	EPS010	29	$4,062,309	$162,500	CCF04	29	$4,062,308	$162,500	14-7	29	$4,062,309	6.960%	$282,800	29	$0	$0	Si	$1,257,800
205	CC	71781256	GUERRA ANDERSON													L					25-14	1	$140,080	$22,500	EPS010	1	$140,080	$5,700	CCF04	1	$140,080	$5,700	14-7	1	$140,080	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,900
206	CC	1039760739	GUERRA DUVAN									X									230201	29	$2,741,930	$438,800	EPS037	29	$2,741,930	$109,700	CCF04	29	$2,741,930	$109,700	14-7	29	$2,741,930	6.960%	$190,900	29	$0	$0	Si	$849,100
207	CC	1039760739	GUERRA DUVAN													L					230201	1	$74,530	$12,000	EPS037	1	$74,530	$3,000	CCF04	1	$74,530	$3,000	14-7	1	$74,530	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,000
208	CC	73102718	GUERRERO MARIO									X									230301	29	$2,927,588	$468,500	EPS010	29	$2,927,588	$117,200	CCF04	29	$2,927,588	$117,200	14-7	29	$2,927,588	6.960%	$203,800	29	$0	$0	Si	$906,700
209	CC	73102718	GUERRERO MARIO													L					230301	1	$94,817	$15,200	EPS010	1	$94,817	$3,800	CCF04	1	$94,817	$3,800	14-7	1	$94,817	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,800
210	CC	1036638725	HERNANDEZ FREDY									X									25-14	29	$3,993,507	$639,000	EPS005	29	$3,993,507	$159,800	CCF04	29	$3,993,507	$159,800	14-7	29	$3,993,507	6.960%	$278,000	29	$0	$0	Si	$1,236,600
211	CC	1036638725	HERNANDEZ FREDY													L					25-14	1	$137,710	$22,100	EPS005	1	$137,710	$5,600	CCF04	1	$137,710	$5,600	14-7	1	$137,710	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,300
212	CC	71391269	HERNANDEZ JUAN									X									25-14	30	$2,488,171	$398,200	EPS010	30	$2,488,171	$99,600	CCF04	30	$2,488,171	$99,600	14-7	30	$2,488,171	6.960%	$173,200	30	$0	$0	Si	$770,600
213	CC	1033367768	HERRERA ANDRES													L					25-14	1	$61,667	$9,900	EPS010	1	$61,667	$2,500	CCF04	1	$61,667	$2,500	14-7	1	$61,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,900
214	CC	1033367768	HERRERA ANDRES							X		X									25-14	29	$1,848,659	$295,800	EPS010	29	$1,848,659	$74,000	CCF04	29	$1,848,659	$74,000	14-7	29	$1,848,659	6.960%	$128,700	29	$0	$0	Si	$572,500
215	CC	70301388	HINCAPIE JOSE													L					231001	6	$402,920	$64,500	EPS010	6	$402,920	$16,200	CCF04	6	$402,920	$16,200	14-7	6	$402,920	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$96,900

PLANILLA PAGADA

216	CC	70301388	HINCAPIE JOSE													L					231001	1	$67,154	$10,800	EPS010	1	$67,154	$2,700	CCF04	1	$67,154	$2,700	14-7	1	$67,154	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,200
217	CC	70301388	HINCAPIE JOSE									X									231001	23	$1,816,705	$290,700	EPS010	23	$1,816,705	$72,700	CCF04	23	$1,816,705	$72,700	14-7	23	$1,816,705	6.960%	$126,500	23	$0	$0	Si	$562,600
218	CC	1032098333	HOYOS CRISTIAN									X									230301	29	$1,967,079	$314,800	EPS037	29	$1,967,079	$78,700	CCF04	29	$1,967,079	$78,700	14-7	29	$1,967,079	6.960%	$137,000	29	$0	$0	Si	$609,200
219	CC	1032098333	HOYOS CRISTIAN													L					230301	1	$63,710	$10,200	EPS037	1	$63,710	$2,600	CCF04	1	$63,710	$2,600	14-7	1	$63,710	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
220	CC	1148191777	HURTADO DARWIN									X									230201	29	$1,487,717	$238,100	EPS010	29	$1,487,717	$59,600	CCF04	29	$1,487,717	$59,600	14-7	29	$1,487,717	6.960%	$103,600	29	$0	$0	Si	$460,900
221	CC	1148191777	HURTADO DARWIN													L					230201	1	$49,224	$7,900	EPS010	1	$49,224	$2,000	CCF04	1	$49,224	$2,000	14-7	1	$49,224	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,900
222	CC	71173106	ISAZA ERIEN									X									25-14	29	$3,334,615	$533,600	EPS010	29	$3,334,615	$133,400	CCF04	29	$3,334,615	$133,400	14-7	29	$3,334,615	6.960%	$232,100	29	$0	$0	Si	$1,032,500
223	CC	71173106	ISAZA ERIEN													L					25-14	1	$98,230	$15,800	EPS010	1	$98,230	$4,000	CCF04	1	$98,230	$4,000	14-7	1	$98,230	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,800
224	CC	71212769	ISAZA MANUEL									X									25-14	29	$2,308,048	$369,300	EPS010	29	$2,308,048	$92,400	CCF04	29	$2,308,048	$92,400	14-7	29	$2,308,048	6.960%	$160,700	29	$0	$0	Si	$714,800
225	CC	71212769	ISAZA MANUEL													L					25-14	1	$87,807	$14,100	EPS010	1	$87,807	$3,600	CCF04	1	$87,807	$3,600	14-7	1	$87,807	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,300
226	CC	70570092	JARAMILLO ARTURO													L						0	$0	$0	EPS010	1	$109,487	$4,400	CCF04	1	$109,487	$4,400	14-7	1	$109,487	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
227	CC	70570092	JARAMILLO ARTURO		X							X										0	$0	$0	EPS010	29	$3,028,425	$121,200	CCF04	29	$3,409,523	$136,400	14-7	29	$3,028,425	6.960%	$210,800	29	$0	$0	Si	$468,400
228	CC	98714304	JARAMILLO JHONATANN											X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
229	CC	98714304	JARAMILLO JHONATANN													L					230201	1	$63,710	$10,200	EPS002	1	$63,710	$2,600	CCF04	1	$63,710	$2,600	14-7	1	$63,710	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
230	CC	98714304	JARAMILLO JHONATANN									X									230201	27	$1,709,471	$273,600	EPS002	27	$1,709,471	$68,400	CCF04	27	$1,709,471	$68,400	14-7	27	$1,709,471	6.960%	$119,000	27	$0	$0	Si	$529,400
231	CC	98714304	JARAMILLO JHONATANN											X							230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
232	CC	1017168947	JIMENEZ JUAN													L					25-14	1	$95,094	$15,300	EPS002	1	$95,094	$3,900	CCF04	1	$95,094	$3,900	14-7	1	$95,094	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,100
233	CC	1017168947	JIMENEZ JUAN									X									25-14	29	$2,588,742	$414,200	EPS002	29	$2,588,742	$103,600	CCF04	29	$2,588,742	$103,600	14-7	29	$2,588,742	6.960%	$180,200	29	$0	$0	Si	$801,600
234	CC	1025642112	LARA JAIDER									X									230301	29	$2,283,856	$365,500	EPS040	29	$2,283,856	$91,400	CCF04	29	$2,283,856	$91,400	14-7	29	$2,283,856	6.960%	$159,000	29	$0	$0	Si	$707,300
235	CC	1025642112	LARA JAIDER													L					230301	1	$47,667	$7,700	EPS040	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
236	CC	1028037342	LEAL OSCAR	X	X							X									230301	1	$47,667	$7,700	EPS037	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$49,574	$2,000	14-7	1	$47,667	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$15,100
237	CC	70322706	LONDOÑO GUILLERMO									X									25-14	29	$3,476,340	$556,300	EPS010	29	$3,476,340	$139,100	CCF04	29	$3,476,340	$139,100	14-7	29	$3,476,340	6.960%	$242,000	29	$0	$0	Si	$1,076,500
238	CC	70322706	LONDOÑO GUILLERMO													L					25-14	1	$103,954	$16,700	EPS010	1	$103,954	$4,200	CCF04	1	$103,954	$4,200	14-7	1	$103,954	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,100
239	CC	98467856	LONDOÑO JAVIER													L					25-14	1	$152,164	$24,400	EPS010	1	$152,164	$6,100	CCF04	1	$152,164	$6,100	14-7	1	$152,164	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$36,600
240	CC	98467856	LONDOÑO JAVIER									X									25-14	29	$4,603,105	$736,500	EPS010	29	$4,603,105	$184,200	CCF04	29	$4,603,105	$184,200	14-7	29	$4,603,105	6.960%	$320,400	29	$0	$0	Si	$1,425,300
241	CC	3483416	LONDOÑO JUAN									X									25-14	29	$3,701,392	$592,300	EPS010	29	$3,701,392	$148,100	CCF04	29	$3,701,392	$148,100	14-7	29	$3,701,392	6.960%	$257,700	29	$0	$0	Si	$1,146,200
242	CC	3483416	LONDOÑO JUAN													L					25-14	1	$132,997	$21,300	EPS010	1	$132,997	$5,400	CCF04	1	$132,997	$5,400	14-7	1	$132,997	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,100
243	CC	8166021	LOPEZ EDILBERTO									X									230301	29	$2,609,419	$417,600	EPS010	29	$2,609,419	$104,400	CCF04	29	$2,609,419	$104,400	14-7	29	$2,609,419	6.960%	$181,700	29	$0	$0	Si	$808,100
244	CC	8166021	LOPEZ EDILBERTO													L					230301	1	$80,220	$12,900	EPS010	1	$80,220	$3,300	CCF04	1	$80,220	$3,300	14-7	1	$80,220	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,500
245	CC	17973409	LOPEZ JAVIER													L					25-14	1	$136,577	$21,900	EPS010	1	$136,577	$5,500	CCF04	1	$136,577	$5,500	14-7	1	$136,577	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,900
246	CC	17973409	LOPEZ JAVIER													X					25-14	8	$1,148,173	$183,800	EPS010	8	$1,148,173	$46,000	CCF04	8	$1,092,588	$43,800	14-7	8	$1,148,173	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$273,600
247	CC	17973409	LOPEZ JAVIER									X									25-14	21	$3,491,532	$558,700	EPS010	21	$3,491,532	$139,700	CCF04	21	$3,491,532	$139,700	14-7	21	$3,491,532	6.960%	$243,100	21	$0	$0	Si	$1,081,200
248	CC	1022093729	LOPEZ JHON													L					230201	1	$85,670	$13,800	ESSC24	1	$85,670	$3,500	CCF04	1	$85,670	$3,500	14-7	1	$85,670	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,800
249	CC	1022093729	LOPEZ JHON									X									230201	29	$2,608,934	$417,500	ESSC24	29	$2,608,934	$104,400	CCF04	29	$2,608,934	$104,400	14-7	29	$2,608,934	6.960%	$181,600	29	$0	$0	Si	$807,900
250	CC	1037655247	LOPEZ DE MESA CAROLINA									X									25-14	29	$3,476,896	$556,400	EPS010	29	$3,476,896	$139,100	CCF04	29	$3,476,895	$139,100	14-7	29	$3,476,896	6.960%	$242,000	29	$0	$0	Si	$1,076,600
251	CC	1037655247	LOPEZ DE MESA CAROLINA													L					25-14	1	$119,894	$19,200	EPS010	1	$119,894	$4,800	CCF04	1	$119,894	$4,800	14-7	1	$119,894	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,800
252	CC	15443732	LUCAS SILFREDO									X									25-14	29	$2,005,938	$321,000	EPS037	29	$2,005,938	$80,300	CCF04	29	$2,005,938	$80,300	14-7	29	$2,005,938	6.960%	$139,700	29	$0	$0	Si	$621,300
253	CC	15443732	LUCAS SILFREDO													L					25-14	1	$63,710	$10,200	EPS037	1	$63,710	$2,600	CCF04	1	$63,710	$2,600	14-7	1	$63,710	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
254	CC	71388046	LUJAN ANDRES									X									230201	29	$1,939,411	$310,400	EPS010	29	$1,939,411	$77,600	CCF04	29	$1,939,411	$77,600	14-7	29	$1,939,411	6.960%	$135,000	29	$0	$0	Si	$600,600
255	CC	71388046	LUJAN ANDRES													L					230201	1	$58,290	$9,400	EPS010	1	$58,290	$2,400	CCF04	1	$58,290	$2,400	14-7	1	$58,290	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
256	CC	2711218	MACHADO BLADIMIR													L					230201	1	$87,017	$14,000	EPS002	1	$87,017	$3,500	CCF04	1	$87,017	$3,500	14-7	1	$87,017	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,000
257	CC	2711218	MACHADO BLADIMIR									X									230201	29	$2,608,934	$417,500	EPS002	29	$2,608,934	$104,400	CCF04	29	$2,608,934	$104,400	14-7	29	$2,608,934	6.960%	$181,600	29	$0	$0	Si	$807,900
258	CC	70325823	MADRID GABRIEL									X									25-14	30	$1,750,195	$280,100	EPS010	30	$1,750,195	$70,100	CCF04	30	$1,750,195	$70,100	14-7	30	$1,750,195	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,200

259	CC	3551837	MADRID LUIS		X							X									230301	12	$669,146	$107,100	EPS037	12	$669,146	$26,800	CCF04	12	$766,386	$30,700	14-7	12	$669,146	6.960%	$46,600	12	$0	$0	Si	$211,200
260	CC	71226406	MARIN GONZALO									X									230201	29	$2,450,748	$392,200	EPS010	29	$2,450,748	$98,100	CCF04	29	$2,450,748	$98,100	14-7	29	$2,450,748	6.960%	$170,600	29	$0	$0	Si	$759,000
261	CC	71226406	MARIN GONZALO													L					230201	1	$81,274	$13,100	EPS010	1	$81,274	$3,300	CCF04	1	$81,274	$3,300	14-7	1	$81,274	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,700
262	CC	15505038	MARIN LUIS									X									25-14	30	$4,932,393	$789,200	EPS037	30	$4,932,393	$197,300	CCF04	30	$4,932,393	$197,300	14-7	30	$4,932,393	6.960%	$343,300	30	$0	$0	Si	$1,527,100
263	CC	1193552848	MARTINEZ ARMANDO									X									230301	29	$1,882,522	$301,300	EPS010	29	$1,882,522	$75,400	CCF04	29	$1,882,522	$75,400	14-7	29	$1,882,522	6.960%	$131,100	29	$0	$0	Si	$583,200
264	CC	1193552848	MARTINEZ ARMANDO													L					230301	1	$66,860	$10,700	EPS010	1	$66,860	$2,700	CCF04	1	$66,860	$2,700	14-7	1	$66,860	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
265	CC	1037671058	MARTINEZ CAMILA									X									230201	29	$3,312,131	$530,000	EPS010	29	$3,312,131	$132,500	CCF04	29	$3,312,131	$132,500	14-7	29	$3,312,131	6.960%	$230,600	29	$0	$0	Si	$1,025,600
266	CC	1037671058	MARTINEZ CAMILA													L					230201	1	$114,214	$18,300	EPS010	1	$114,214	$4,600	CCF04	1	$114,214	$4,600	14-7	1	$114,214	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$27,500
267	CC	1002298022	MARTINEZ JORGE									X									25-14	29	$5,306,018	$849,000	EPS010	29	$5,306,018	$212,300	CCF04	29	$5,306,018	$212,300	14-7	29	$5,306,018	6.960%	$369,300	29	$0	$0	Si	$1,642,900
268	CC	1002298022	MARTINEZ JORGE													L					25-14	1	$143,350	$23,000	EPS010	1	$143,350	$5,800	CCF04	1	$143,350	$5,800	14-7	1	$143,350	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$34,600
269	CC	1039596895	MARTINEZ JUAN													L					25-14	1	$126,060	$20,200	EPS037	1	$126,060	$5,100	CCF04	1	$126,060	$5,100	14-7	1	$126,060	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,400
270	CC	1039596895	MARTINEZ JUAN									X									25-14	29	$3,571,309	$571,500	EPS037	29	$3,571,309	$142,900	CCF04	29	$3,571,309	$142,900	14-7	29	$3,571,309	6.960%	$248,600	29	$0	$0	Si	$1,105,900
271	CC	1038417204	MEDINA LUISA																		230301	29	$5,268,575	$843,000	EPS010	29	$5,268,575	$210,800	CCF04	29	$5,268,575	$210,800	14-7	29	$5,268,575	6.960%	$366,700	29	$0	$0	Si	$1,631,300
272	CC	1038417204	MEDINA LUISA													L					230301	1	$181,677	$29,100	EPS010	1	$181,677	$7,300	CCF04	1	$181,677	$7,300	14-7	1	$181,677	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$43,700
273	CC	98669418	MEDINA RUBEN																		230201	29	$18,686,150	$3,176,800	EPS010	29	$18,686,150	$2,335,800	CCF04	29	$18,686,150	$747,500	14-7	29	$18,686,150	6.960%	$1,300,600	29	$18,686,150	$934,400	No	$8,495,100
274	CC	98669418	MEDINA RUBEN													L					230201	1	$644,350	$109,700	EPS010	1	$644,350	$80,600	CCF04	1	$644,350	$25,800	14-7	1	$644,350	0.000%	$0	1	$644,350	$32,300	No	$248,400
275	CC	15683929	MEJIA JAIRO													L					230301	1	$88,320	$14,200	EPS002	1	$88,320	$3,600	CCF04	1	$88,320	$3,600	14-7	1	$88,320	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,400
276	CC	15683929	MEJIA JAIRO									X									230301	29	$2,888,785	$462,300	EPS002	29	$2,888,785	$115,600	CCF04	29	$2,888,785	$115,600	14-7	29	$2,888,785	6.960%	$201,100	29	$0	$0	Si	$894,600
277	CC	1096206386	MEJIA LUIS									X									230301	29	$1,826,876	$292,400	EPS037	29	$1,826,876	$73,100	CCF04	29	$1,826,876	$73,100	14-7	29	$1,826,876	6.960%	$127,200	29	$0	$0	Si	$565,800
278	CC	1096206386	MEJIA LUIS													L					230301	1	$61,270	$9,900	EPS037	1	$61,270	$2,500	CCF04	1	$61,270	$2,500	14-7	1	$61,270	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,900
279	CC	71684248	MEJIA NELSON									X									25-14	29	$1,642,772	$262,900	EPS010	29	$1,642,772	$65,800	CCF04	29	$1,642,772	$65,800	14-7	29	$1,642,772	6.960%	$114,400	29	$0	$0	Si	$508,900
280	CC	71684248	MEJIA NELSON													L					25-14	1	$56,650	$9,100	EPS010	1	$56,650	$2,300	CCF04	1	$56,650	$2,300	14-7	1	$56,650	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,700
281	CC	15507260	MESA BAYRON									X									25-14	29	$2,729,143	$436,700	EPS037	29	$2,729,143	$109,200	CCF04	29	$2,729,143	$109,200	14-7	29	$2,729,143	6.960%	$190,000	29	$0	$0	Si	$845,100
282	CC	15507260	MESA BAYRON													L					25-14	1	$92,207	$14,800	EPS037	1	$92,207	$3,700	CCF04	1	$92,207	$3,700	14-7	1	$92,207	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
283	CC	1020415994	MESA EDUARD													L					230201	1	$132,160	$21,200	EPS010	1	$132,160	$5,300	CCF04	1	$132,160	$5,300	14-7	1	$132,160	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,800
284	CC	1020415994	MESA EDUARD									X									230201	29	$3,830,828	$613,000	EPS010	29	$3,830,828	$153,300	CCF04	29	$3,830,828	$153,300	14-7	29	$3,830,828	6.960%	$266,700	29	$0	$0	Si	$1,186,300
285	CC	98715720	MESA JONATHAN													L					230201	1	$86,560	$13,900	EPS010	1	$86,560	$3,500	CCF04	1	$86,560	$3,500	14-7	1	$86,560	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,900
286	CC	98715720	MESA JONATHAN									X									230201	29	$2,745,076	$439,300	EPS010	29	$2,745,076	$109,900	CCF04	29	$2,745,076	$109,900	14-7	29	$2,745,076	6.960%	$191,100	29	$0	$0	Si	$850,200
287	CC	71536325	MESA JUAN									X									230301	30	$2,410,176	$385,700	EPS037	30	$2,410,176	$96,500	CCF04	30	$2,399,077	$96,000	14-7	30	$2,410,176	6.960%	$167,800	30	$0	$0	Si	$746,000
288	CC	72347599	MESSINO ENEXIMO									X									231001	30	$2,330,853	$373,000	EPS002	30	$2,330,853	$93,300	CCF04	30	$2,330,853	$93,300	14-7	30	$2,330,853	6.960%	$162,300	30	$0	$0	Si	$721,900
289	CC	1045523675	MESTRA DUVAN									X									230301	30	$3,383,976	$541,500	EPS010	30	$3,383,976	$135,400	CCF04	30	$3,383,976	$135,400	14-7	30	$3,383,976	6.960%	$235,600	30	$0	$0	Si	$1,047,900
290	CC	71397397	MOLINA JORGE													L					230201	1	$76,197	$12,200	EPS010	1	$76,197	$3,100	CCF04	1	$76,197	$3,100	14-7	1	$76,197	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,400
291	CC	71397397	MOLINA JORGE									X									230201	29	$2,162,888	$346,100	EPS010	29	$2,162,888	$86,600	CCF04	29	$2,162,888	$86,600	14-7	29	$2,162,888	6.960%	$150,600	29	$0	$0	Si	$669,900
292	CC	70421026	MONSALVE LUIS									X									231001	29	$2,184,066	$349,500	EPS010	29	$2,184,066	$87,400	CCF04	29	$2,184,066	$87,400	14-7	29	$2,184,066	6.960%	$152,100	29	$0	$0	Si	$676,400
293	CC	70421026	MONSALVE LUIS													L					231001	1	$66,910	$10,800	EPS010	1	$66,910	$2,700	CCF04	1	$66,910	$2,700	14-7	1	$66,910	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,200
294	CC	1214718905	MONSALVE NORALDO													L					230301	1	$51,554	$8,300	EPS002	1	$51,554	$2,100	CCF04	1	$51,554	$2,100	14-7	1	$51,554	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,500
295	CC	1214718905	MONSALVE NORALDO											X							230301	3	$142,784	$22,900	EPS002	3	$142,784	$5,800	CCF04	3	$142,784	$0	14-7	3	$142,784	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,700
296	CC	1214718905	MONSALVE NORALDO									X									230301	26	$1,363,681	$218,200	EPS002	26	$1,363,681	$54,600	CCF04	26	$1,363,681	$54,600	14-7	26	$1,363,681	6.960%	$95,000	26	$0	$0	Si	$422,400
297	CC	15483978	MONTOYA ALBEIRO													L					25-14	1	$100,017	$16,100	EPS010	1	$100,017	$4,100	CCF04	1	$100,017	$4,100	14-7	1	$100,017	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,300
298	CC	15483978	MONTOYA ALBEIRO									X									25-14	29	$3,444,983	$551,200	EPS010	29	$3,444,983	$137,800	CCF04	29	$3,444,983	$137,800	14-7	29	$3,444,983	6.960%	$239,800	29	$0	$0	Si	$1,066,600
299	CC	11686122	MOSQUERA WILTON													L					230301	1	$83,810	$13,500	EPS002	1	$83,810	$3,400	CCF04	1	$83,810	$3,400	14-7	1	$83,810	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,300
300	CC	11686122	MOSQUERA WILTON									X									230301	29	$2,534,516	$405,600	EPS002	29	$2,534,516	$101,400	CCF04	29	$2,534,516	$101,400	14-7	29	$2,534,516	6.960%	$176,500	29	$0	$0	Si	$784,900

301	CC	1110577454	MURILLO JOSE									L									230301	1	$146,670	$23,500	EPS041	1	$146,670	$5,900	CCF04	1	$146,670	$5,900	14-7	1	$146,670	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$35,300
302	CC	1110577454	MURILLO JOSE																		230301	29	$4,253,334	$680,600	EPS041	29	$4,253,334	$170,200	CCF04	29	$4,253,333	$170,200	14-7	29	$4,253,334	6.960%	$296,100	29	$0	$0	Si	$1,317,100
303	CC	70164488	NARANJO EUCARIO					X													25-14	29	$2,500,669	$400,200	EPS037	29	$2,500,669	$100,100	CCF04	29	$2,500,669	$100,100	14-7	29	$2,500,669	6.960%	$174,100	29	$0	$0	Si	$774,500
304	CC	70164488	NARANJO EUCARIO									L									25-14	1	$77,614	$12,500	EPS037	1	$77,614	$3,200	CCF04	1	$77,614	$3,200	14-7	1	$77,614	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,900
305	CC	1040490102	NOVOA YULIS									L									230201	1	$129,497	$20,800	EPS010	1	$129,497	$5,200	CCF04	1	$129,497	$5,200	14-7	1	$129,497	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,200
306	CC	1040490102	NOVOA YULIS					X													230201	29	$3,824,927	$612,000	EPS010	29	$3,824,927	$153,000	CCF04	29	$3,824,927	$153,000	14-7	29	$3,824,927	6.960%	$266,300	29	$0	$0	Si	$1,184,300
307	CC	78760318	ORTEGA MARIO					X													25-14	29	$3,306,825	$529,100	EPS010	29	$3,306,825	$132,300	CCF04	29	$3,306,825	$132,300	14-7	29	$3,306,825	6.960%	$230,200	29	$0	$0	Si	$1,023,900
308	CC	78760318	ORTEGA MARIO									L									25-14	1	$87,960	$14,100	EPS010	1	$87,960	$3,600	CCF04	1	$87,960	$3,600	14-7	1	$87,960	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,300
309	CC	11319917	ORTIZ DIEGO									L									25-14	1	$139,234	$22,300	EPS005	1	$139,234	$5,600	CCF04	1	$139,234	$5,600	14-7	1	$139,234	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,500
310	CC	11319917	ORTIZ DIEGO					X													25-14	29	$4,856,123	$777,000	EPS005	29	$4,856,123	$194,300	CCF04	29	$4,856,123	$194,300	14-7	29	$4,856,123	6.960%	$338,000	29	$0	$0	Si	$1,503,600
311	CC	71450801	OSORIO GUILLERMO					X													25-14	29	$2,622,938	$419,700	EPS010	29	$2,622,938	$105,000	CCF04	29	$2,622,938	$105,000	14-7	29	$2,622,938	6.960%	$182,600	29	$0	$0	Si	$812,300
312	CC	71450801	OSORIO GUILLERMO									L									25-14	1	$104,724	$16,800	EPS010	1	$104,724	$4,200	CCF04	1	$104,724	$4,200	14-7	1	$104,724	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,200
313	CC	71384086	OSORIO JHON									L									231001	1	$147,280	$23,600	EPS010	1	$147,280	$5,900	CCF04	1	$147,280	$5,900	14-7	1	$147,280	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$35,400
314	CC	71384086	OSORIO JHON					X													231001	29	$4,271,120	$683,400	EPS010	29	$4,271,120	$170,900	CCF04	29	$4,271,120	$170,900	14-7	29	$4,271,120	6.960%	$297,300	29	$0	$0	Si	$1,322,500
315	CC	1039400261	OSPINA SEBASTIAN					X													230201	29	$2,609,755	$417,600	EPS010	29	$2,609,755	$104,400	CCF04	29	$2,609,755	$104,400	14-7	29	$2,609,755	6.960%	$181,700	29	$0	$0	Si	$808,100
316	CC	1039400261	OSPINA SEBASTIAN									L									230201	1	$71,520	$11,500	EPS010	1	$71,520	$2,900	CCF04	1	$71,520	$2,900	14-7	1	$71,520	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,300
317	CC	1104420553	OVIEDO FERNEY					X													230301	29	$2,588,742	$414,200	EPS002	29	$2,588,742	$103,600	CCF04	29	$2,588,742	$103,600	14-7	29	$2,588,742	6.960%	$180,200	29	$0	$0	Si	$801,600
318	CC	1104420553	OVIEDO FERNEY									L									230301	1	$91,594	$14,700	EPS002	1	$91,594	$3,700	CCF04	1	$91,594	$3,700	14-7	1	$91,594	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,100
319	CC	98589763	PALACIO JUAN					X													25-14	29	$3,026,070	$484,200	EPS010	29	$3,026,070	$121,100	CCF04	29	$3,026,070	$121,100	14-7	29	$3,026,070	6.960%	$210,700	29	$0	$0	Si	$937,100
320	CC	98589763	PALACIO JUAN									L									25-14	1	$88,794	$14,300	EPS010	1	$88,794	$3,600	CCF04	1	$88,794	$3,600	14-7	1	$88,794	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,500
321	CC	82385070	PALACIOS GUSTAVO									L									230301	1	$74,424	$12,000	EPS037	1	$74,424	$3,000	CCF04	1	$74,424	$3,000	14-7	1	$74,424	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,000
322	CC	82385070	PALACIOS GUSTAVO					X													230301	29	$2,124,801	$340,000	EPS037	29	$2,124,801	$85,000	CCF04	29	$2,124,801	$85,000	14-7	29	$2,124,801	6.960%	$147,900	29	$0	$0	Si	$657,900
323	CC	15459630	PAREJA JUAN					X													25-14	29	$2,822,269	$451,600	EPS037	29	$2,822,269	$112,900	CCF04	29	$2,822,269	$112,900	14-7	29	$2,822,269	6.960%	$196,500	29	$0	$0	Si	$873,900
324	CC	15459630	PAREJA JUAN									L									25-14	1	$92,917	$14,900	EPS037	1	$92,917	$3,800	CCF04	1	$92,917	$3,800	14-7	1	$92,917	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,500
325	CC	1037524090	PARRA DEYSY									L									25-14	1	$68,724	$11,000	EPS010	1	$68,724	$2,800	CCF04	1	$68,724	$2,800	14-7	1	$68,724	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,600
326	CC	1037524090	PARRA DEYSY					X													25-14	29	$1,880,345	$300,900	EPS010	29	$1,880,345	$75,300	CCF04	29	$1,880,345	$75,300	14-7	29	$1,880,345	6.960%	$130,900	29	$0	$0	Si	$582,400
327	CC	1073982372	PAYARES OVIER					X													230301	29	$2,615,959	$418,600	EPS010	29	$2,615,959	$104,700	CCF04	29	$2,615,959	$104,700	14-7	29	$2,615,959	6.960%	$182,100	29	$0	$0	Si	$810,100
328	CC	1073982372	PAYARES OVIER									L									230301	1	$92,607	$14,900	EPS010	1	$92,607	$3,800	CCF04	1	$92,607	$3,800	14-7	1	$92,607	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,500
329	CC	98451056	PEREZ CARLOS					X													25-14	30	$3,061,550	$489,900	EPS010	30	$3,061,550	$122,500	CCF04	30	$3,061,550	$122,500	14-7	30	$3,061,550	6.960%	$213,100	30	$0	$0	Si	$948,000
330	CC	70631588	PEREZ DUBAN												X						230301	7	$466,667	$74,700	EPS010	7	$466,667	$18,700	CCF04	7	$466,667	$0	14-7	7	$466,667	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$93,400
331	CC	70631588	PEREZ DUBAN									L									230301	1	$80,944	$13,000	EPS010	1	$80,944	$3,300	CCF04	1	$80,944	$3,300	14-7	1	$80,944	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,600
332	CC	70631588	PEREZ DUBAN					X													230301	22	$2,142,752	$342,900	EPS010	22	$2,142,752	$85,800	CCF04	22	$2,142,752	$85,800	14-7	22	$2,142,752	6.960%	$149,200	22	$0	$0	Si	$663,700
333	CC	15530323	PEREZ OSCAR					X													25-14	29	$3,491,977	$558,800	EPS010	29	$3,491,977	$139,700	CCF04	29	$3,491,977	$139,700	14-7	29	$3,491,977	6.960%	$243,100	29	$0	$0	Si	$1,081,300
334	CC	15530323	PEREZ OSCAR									L									25-14	1	$111,604	$17,900	EPS010	1	$111,604	$4,500	CCF04	1	$111,604	$4,500	14-7	1	$111,604	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,900
335	CC	1017200239	PEREZ YOVANNI																		231001	29	$1,382,334	$221,200	EPS002	29	$1,382,334	$55,300	CCF04	29	$1,382,333	$55,300	14-7	29	$1,382,334	6.960%	$96,300	29	$0	$0	Si	$428,100
336	CC	1017200239	PEREZ YOVANNI									L									231001	1	$47,667	$7,700	EPS002	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
337	CC	1046666518	PINO JOSE					X													230201	29	$2,102,773	$336,500	EPS037	29	$2,102,773	$84,200	CCF04	29	$2,102,773	$84,200	14-7	29	$2,102,773	6.960%	$146,400	29	$0	$0	Si	$651,300
338	CC	1046666518	PINO JOSE									L									230201	1	$75,467	$12,100	EPS037	1	$75,467	$3,100	CCF04	1	$75,467	$3,100	14-7	1	$75,467	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,300
339	CC	15286146	POSSO LUIS									L									230301	1	$70,944	$11,400	EPS010	1	$70,944	$2,900	CCF04	1	$70,944	$2,900	14-7	1	$70,944	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,200
340	CC	15286146	POSSO LUIS					X													230301	29	$2,057,316	$329,200	EPS010	29	$2,057,316	$82,300	CCF04	29	$2,057,316	$82,300	14-7	29	$2,057,316	6.960%	$143,200	29	$0	$0	Si	$637,000
341	CC	15308624	PRECIADO EGIDIO					X													25-14	10	$1,766,681	$282,700	EPS010	10	$1,766,681	$70,700	CCF04	10	$1,766,681	$70,700	14-7	10	$1,766,681	6.960%	$123,000	10	$0	$0	Si	$547,100
342	CC	15308624	PRECIADO EGIDIO						X												25-14	15	$2,155,558	$258,700	EPS010	15	$2,155,558	$0	CCF04	15	$2,155,558	$0	14-7	15	$2,155,558	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$258,700
343	CC	15308624	PRECIADO EGIDIO						X												25-14	5	$718,520	$86,300	EPS010	5	$718,520	$0	CCF04	5	$718,520	$0	14-7	5	$718,520	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$86,300
344	CC	1152217051	QUIÑONES BRAYAN					X													230301	29	$1,806,669	$289,100	EPS002	29	$1,806,669	$72,300	CCF04	29	$1,806,669	$72,300	14-7	29	$1,806,669	6.960%	$125,800	29	$0	$0	Si	$559,500

aportes en línea

Planilla Resumen

345	CC	1152217051	QUIÑONES BRAYAN													L					230301	1	$60,517	$9,700	EPS002	1	$60,517	$2,500	CCF04	1	$60,517	$2,500	14-7	1	$60,517	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,700
346	CC	1007578868	QUIROZ EZEQUIEL									X									230301	29	$2,428,143	$388,600	EPS002	29	$2,428,143	$97,200	CCF04	29	$2,428,143	$97,200	14-7	29	$2,428,143	6.960%	$169,000	29	$0	$0	Si	$752,000
347	CC	1007578868	QUIROZ EZEQUIEL													L					230301	1	$80,560	$12,900	EPS002	1	$80,560	$3,300	CCF04	1	$80,560	$3,300	14-7	1	$80,560	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,500
348	CC	1085953793	QUITIAQUEZ JESUS																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$277,100
349	CC	8335458	RAMIREZ ROSEMBERG		X							X										0	$0	$0	EPS010	21	$1,186,694	$47,500	CCF04	21	$1,186,694	$47,500	14-7	21	$1,186,694	6.960%	$82,600	21	$0	$0	Si	$177,600
350	CC	8335458	RAMIREZ ROSEMBERG													L						0	$0	$0	EPS010	1	$57,127	$2,300	CCF04	1	$57,127	$2,300	14-7	1	$57,127	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,600
351	CC	71395534	RESTREPO ANDRES									X									25-14	29	$2,568,619	$411,000	EPS037	29	$2,568,619	$102,800	CCF04	29	$2,568,619	$102,800	14-7	29	$2,568,619	6.960%	$178,800	29	$0	$0	Si	$795,400
352	CC	71395534	RESTREPO ANDRES													L					25-14	1	$92,427	$14,800	EPS037	1	$92,427	$3,700	CCF04	1	$92,427	$3,700	14-7	1	$92,427	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,200
353	CC	1028021404	RESTREPO JHON									X									230301	29	$4,407,926	$705,300	EPS010	29	$4,407,926	$176,400	CCF04	29	$4,407,926	$176,400	14-7	29	$4,407,926	6.960%	$306,800	29	$0	$0	Si	$1,364,900
354	CC	1028021404	RESTREPO JHON													L					230301	1	$132,964	$21,300	EPS010	1	$132,964	$5,400	CCF04	1	$132,964	$5,400	14-7	1	$132,964	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,100
355	CC	71793321	RESTREPO JUAN													L					230301	1	$66,654	$10,700	EPS002	1	$66,654	$2,700	CCF04	1	$66,654	$2,700	14-7	1	$66,654	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
356	CC	71793321	RESTREPO JUAN											X							230301	1	$47,667	$7,700	EPS002	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$0	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,700
357	CC	71793321	RESTREPO JUAN									X									230301	27	$2,088,733	$334,200	EPS002	27	$2,088,733	$83,600	CCF04	27	$2,088,733	$83,600	14-7	27	$2,088,733	6.960%	$145,400	27	$0	$0	Si	$646,800
358	CC	71793321	RESTREPO JUAN											X							230301	1	$47,667	$7,700	EPS002	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$0	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,700
359	CC	71391918	RESTREPO RAUL									X									25-14	29	$1,967,079	$314,800	EPS010	29	$1,967,079	$78,700	CCF04	29	$1,967,079	$78,700	14-7	29	$1,967,079	6.960%	$137,000	29	$0	$0	Si	$609,200
360	CC	71391918	RESTREPO RAUL													L					25-14	1	$63,710	$10,200	EPS010	1	$63,710	$2,600	CCF04	1	$63,710	$2,600	14-7	1	$63,710	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
361	CC	1046666535	RODAS ELKIN									X									231001	29	$3,786,341	$605,900	EPS037	29	$3,786,341	$151,500	CCF04	29	$3,786,341	$151,500	14-7	29	$3,786,341	6.960%	$263,600	29	$0	$0	Si	$1,172,500
362	CC	1046666535	RODAS ELKIN													L					231001	1	$103,254	$16,600	EPS037	1	$103,254	$4,200	CCF04	1	$103,254	$4,200	14-7	1	$103,254	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,000
363	CC	1001814741	RODRIGUEZ BRAYAN													L					230301	1	$55,777	$9,000	EPS037	1	$55,777	$2,300	CCF04	1	$55,777	$2,300	14-7	1	$55,777	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,600
364	CC	1001814741	RODRIGUEZ BRAYAN									X									230301	29	$1,826,876	$292,400	EPS037	29	$1,826,876	$73,100	CCF04	29	$1,826,876	$73,100	14-7	29	$1,826,876	6.960%	$127,200	29	$0	$0	Si	$565,800
365	CC	70663629	ROJAS FREDY													L					25-14	1	$53,497	$8,600	EPS010	1	$53,497	$2,200	CCF04	1	$53,497	$2,200	14-7	1	$53,497	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,000
366	CC	70663629	ROJAS FREDY									X									25-14	29	$1,742,941	$278,900	EPS010	29	$1,742,941	$69,800	CCF04	29	$1,742,941	$69,800	14-7	29	$1,742,941	6.960%	$121,400	29	$0	$0	Si	$539,900
367	CC	8063331	ROJAS MAURICIO													L					230201	1	$285,837	$48,800	EPS010	1	$285,837	$11,500	CCF04	1	$285,837	$11,500	14-7	1	$285,837	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$71,800
368	CC	8063331	ROJAS MAURICIO																		230201	29	$8,289,210	$1,409,300	EPS010	29	$8,289,210	$331,600	CCF04	29	$8,289,209	$331,600	14-7	29	$8,289,210	6.960%	$577,000	29	$0	$0	Si	$2,649,500
369	CC	1017160818	ROLDAN JONATAN									X									230301	30	$2,833,416	$453,400	EPS010	30	$2,833,416	$113,400	CCF04	30	$2,833,416	$113,400	14-7	30	$2,833,416	6.960%	$197,300	30	$0	$0	Si	$877,500
370	CC	8101765	ROMAÑA YEFFERSON													L					230301	1	$86,080	$13,800	EPS037	1	$86,080	$3,500	CCF04	1	$86,080	$3,500	14-7	1	$86,080	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,800
371	CC	8101765	ROMAÑA YEFFERSON									X									230301	29	$2,589,229	$414,300	EPS037	29	$2,589,229	$103,600	CCF04	29	$2,589,229	$103,600	14-7	29	$2,589,229	6.960%	$180,300	29	$0	$0	Si	$801,800
372	CC	1036963539	SALAZAR ALEJANDRO									X									25-14	29	$3,034,367	$485,500	EPS010	29	$3,034,367	$121,400	CCF04	29	$3,034,367	$121,400	14-7	29	$3,034,367	6.960%	$211,200	29	$0	$0	Si	$939,500
373	CC	1036963539	SALAZAR ALEJANDRO													L					25-14	1	$104,634	$16,800	EPS010	1	$104,634	$4,200	CCF04	1	$104,634	$4,200	14-7	1	$104,634	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,200
374	CC	1120354871	SALAZAR HAROL													L					230201	1	$56,944	$9,200	EPS037	1	$56,944	$2,300	CCF04	1	$56,944	$2,300	14-7	1	$56,944	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,800
375	CC	1120354871	SALAZAR HAROL													X					230201	1	$56,941	$9,200	EPS037	1	$56,941	$2,300	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$56,941	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,500
376	CC	1120354871	SALAZAR HAROL		X							X									230201	26	$1,495,022	$239,300	EPS037	26	$1,495,022	$59,900	CCF04	26	$1,574,625	$63,000	14-7	26	$1,495,022	6.960%	$104,100	26	$0	$0	Si	$466,300
377	CC	1020448032	SALDARRIAGA ANA									X									230201	28	$5,677,610	$965,300	EPS002	28	$5,677,610	$227,200	CCF04	28	$5,677,610	$227,200	14-7	28	$5,677,610	6.960%	$395,200	28	$0	$0	Si	$1,814,900
378	CC	1020448032	SALDARRIAGA ANA													L					230201	1	$202,774	$34,700	EPS002	1	$202,774	$8,200	CCF04	1	$202,774	$8,200	14-7	1	$202,774	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$51,100
379	CC	1020448032	SALDARRIAGA ANA													X					230201	1	$202,772	$34,700	EPS002	1	$202,772	$8,200	CCF04	1	$202,772	$8,200	14-7	1	$202,772	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$51,100
380	CC	1214738152	SALDARRIAGA OSCAR		X							X									230301	10	$778,904	$124,700	EPS005	10	$778,904	$31,200	CCF04	10	$778,904	$31,200	14-7	10	$778,904	6.960%	$54,300	10	$0	$0	Si	$241,400
381	CC	1066511325	SAMPAYO JESUS											X							230301	2	$95,334	$15,300	EPS041	2	$95,334	$3,900	CCF04	2	$95,334	$0	14-7	2	$95,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,200
382	CC	1066511325	SAMPAYO JESUS													L					230301	1	$51,297	$8,300	EPS041	1	$51,297	$2,100	CCF04	1	$51,297	$2,100	14-7	1	$51,297	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,500
383	CC	1066511325	SAMPAYO JESUS									X									230301	27	$1,333,630	$213,400	EPS041	27	$1,333,630	$53,400	CCF04	27	$1,333,630	$53,400	14-7	27	$1,333,630	6.960%	$92,900	27	$0	$0	Si	$413,100
384	CC	1037670479	SANCHEZ ESTEBAN									X									230201	30	$3,593,190	$575,000	EPS002	30	$3,593,190	$143,800	CCF04	30	$3,593,190	$143,800	14-7	30	$3,593,190	6.960%	$250,100	30	$0	$0	Si	$1,112,700

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

385	CC	12797821	SANCHEZ HUMBERTO																		231001	29	$14,438,250	$2,454,600	EPS010	29	$14,438,250	$1,804,800	CCF04	29	$14,438,249	$577,600	14-7	29	$14,438,250	6.960%	$1,005,000	29	$14,438,249	$722,000	No	$6,564,000
386	CC	12797821	SANCHEZ HUMBERTO													L					231001	1	$497,874	$84,700	EPS010	1	$497,874	$62,300	CCF04	1	$497,874	$20,000	14-7	1	$497,874	0.000%	$0	1	$497,874	$25,000	No	$192,000
387	CC	1017235158	SANTAMARIA JESSICA													L					25-14	1	$119,880	$19,200	EPS010	1	$119,880	$4,800	CCF04	1	$119,880	$4,800	14-7	1	$119,880	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,800
388	CC	1017235158	SANTAMARIA JESSICA																		25-14	29	$3,476,507	$556,300	EPS010	29	$3,476,507	$139,100	CCF04	29	$3,476,506	$139,100	14-7	29	$3,476,507	6.960%	$242,000	29	$0	$0	Si	$1,076,500
389	CC	98619503	SEPULVEDA JOSE													L					25-14	1	$50,777	$8,200	EPS002	1	$50,777	$2,100	CCF04	1	$50,777	$2,100	14-7	1	$50,777	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,400
390	CC	98619503	SEPULVEDA JOSE									X									25-14	29	$1,491,137	$238,600	EPS002	29	$1,491,137	$59,700	CCF04	29	$1,491,137	$59,700	14-7	29	$1,491,137	6.960%	$103,800	29	$0	$0	Si	$461,800
391	CC	70435514	SEPULVEDA RUBEN													L					230301	1	$120,000	$19,200	EPS010	1	$120,000	$4,800	CCF04	1	$120,000	$4,800	14-7	1	$120,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,800
392	CC	70435514	SEPULVEDA RUBEN																		230301	29	$3,480,000	$556,800	EPS010	29	$3,480,000	$139,200	CCF04	29	$3,480,000	$139,200	14-7	29	$3,480,000	6.960%	$242,300	29	$0	$0	Si	$1,077,500
393	CC	80410128	SOTO JORGE									X									25-14	30	$17,911,184	$3,045,000	EPS005	30	$17,911,184	$2,238,900	CCF04	30	$17,911,184	$716,500	14-7	30	$17,911,184	6.960%	$1,246,700	30	$17,911,184	$895,700	No	$8,142,800
394	CC	70663544	TABORDA HERNAN									X									25-14	29	$2,784,209	$445,500	EPS037	29	$2,784,209	$111,400	CCF04	29	$2,784,209	$111,400	14-7	29	$2,784,209	6.960%	$193,800	29	$0	$0	Si	$862,100
395	CC	70663544	TABORDA HERNAN													L					25-14	1	$91,790	$14,700	EPS037	1	$91,790	$3,700	CCF04	1	$91,790	$3,700	14-7	1	$91,790	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,100
396	CC	1039597455	TABORDA LUZ													L					230301	1	$67,617	$10,900	EPS040	1	$67,617	$2,800	CCF04	1	$67,617	$2,800	14-7	1	$67,617	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,500
397	CC	1039597455	TABORDA LUZ									X									230301	29	$2,004,072	$320,700	EPS040	29	$2,004,072	$80,200	CCF04	29	$2,004,072	$80,200	14-7	29	$2,004,072	6.960%	$139,500	29	$0	$0	Si	$620,600
398	CC	1020489896	TAMAYO JUAN																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$277,100
399	CC	42884423	TIRADO ELIZABETH													X					25-14	2	$443,565	$75,600	EPS010	2	$443,565	$17,800	CCF04	2	$443,565	$17,800	14-7	2	$443,565	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$111,200
400	CC	42884423	TIRADO ELIZABETH									X									25-14	22	$7,059,134	$1,200,100	EPS010	22	$7,059,134	$282,400	CCF04	22	$7,059,134	$282,400	14-7	22	$7,059,134	6.960%	$491,400	22	$0	$0	Si	$2,256,300
401	CC	42884423	TIRADO ELIZABETH											X							25-14	5	$902,789	$153,700	EPS010	5	$902,789	$36,200	CCF04	5	$902,789	$0	14-7	5	$902,789	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$189,900
402	CC	42884423	TIRADO ELIZABETH													L					25-14	1	$192,340	$32,800	EPS010	1	$192,340	$7,700	CCF04	1	$192,340	$7,700	14-7	1	$192,340	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$48,200
403	CC	1100247056	UPARELA KEINER													L					230301	1	$47,667	$7,700	EPS037	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
404	CC	1100247056	UPARELA KEINER	X																	230301	16	$762,667	$122,100	EPS037	16	$762,667	$30,600	CCF04	16	$762,666	$30,600	14-7	16	$762,667	6.960%	$53,100	16	$0	$0	Si	$236,400
405	CC	1020495243	URIBE BRANDON									X									230301	29	$2,482,248	$397,200	EPS010	29	$2,482,248	$99,300	CCF04	29	$2,482,248	$99,300	14-7	29	$2,482,248	6.960%	$172,800	29	$0	$0	Si	$768,600
406	CC	1020495243	URIBE BRANDON													L					230301	1	$75,320	$12,100	EPS010	1	$75,320	$3,100	CCF04	1	$75,320	$3,100	14-7	1	$75,320	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,300
407	CC	70326851	URIBE CARLOS													L					25-14	1	$141,527	$22,700	EPS010	1	$141,527	$5,700	CCF04	1	$141,527	$5,700	14-7	1	$141,527	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$34,100
408	CC	70326851	URIBE CARLOS									X									25-14	29	$3,767,877	$602,900	EPS010	29	$3,767,877	$150,800	CCF04	29	$3,767,877	$150,800	14-7	29	$3,767,877	6.960%	$262,300	29	$0	$0	Si	$1,166,800
409	CC	1001358992	USMA YEISON									X									230201	29	$3,058,718	$489,400	EPS037	29	$3,058,718	$122,400	CCF04	29	$3,058,718	$122,400	14-7	29	$3,058,718	6.960%	$212,900	29	$0	$0	Si	$947,100
410	CC	1001358992	USMA YEISON													L					230201	1	$99,220	$15,900	EPS037	1	$99,220	$4,000	CCF04	1	$99,220	$4,000	14-7	1	$99,220	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,900
411	CC	1001385924	USUGA CARLOS									X									230301	29	$1,814,441	$290,400	ESSC24	29	$1,814,441	$72,600	CCF04	29	$1,814,441	$72,600	14-7	29	$1,814,441	6.960%	$126,300	29	$0	$0	Si	$561,900
412	CC	1001385924	USUGA CARLOS													L					230301	1	$60,387	$9,700	ESSC24	1	$60,387	$2,500	CCF04	1	$60,387	$2,500	14-7	1	$60,387	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,700
413	CC	70329634	VALDERRAMA ROBERTO													L					230201	1	$88,134	$14,200	EPS010	1	$88,134	$3,600	CCF04	1	$88,134	$3,600	14-7	1	$88,134	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,400
414	CC	70329634	VALDERRAMA ROBERTO									X									230201	29	$2,965,215	$474,500	EPS010	29	$2,965,215	$118,700	CCF04	29	$2,965,215	$118,700	14-7	29	$2,965,215	6.960%	$206,400	29	$0	$0	Si	$918,300
415	CC	75075422	VALENCIA JUAN													L					25-14	1	$102,777	$16,500	EPS010	1	$102,777	$4,200	CCF04	1	$102,777	$4,200	14-7	1	$102,777	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,900
416	CC	75075422	VALENCIA JUAN									X									25-14	29	$3,762,622	$602,100	EPS010	29	$3,762,622	$150,600	CCF04	29	$3,762,622	$150,600	14-7	29	$3,762,622	6.960%	$261,900	29	$0	$0	Si	$1,165,200
417	CC	98763887	VANEGAS EDWIN									X									230201	29	$3,953,014	$632,500	EPS010	29	$3,953,014	$158,200	CCF04	29	$3,953,013	$158,200	14-7	29	$3,953,014	6.960%	$275,200	29	$0	$0	Si	$1,224,100
418	CC	98763887	VANEGAS EDWIN													L					230201	1	$136,314	$21,900	EPS010	1	$136,314	$5,500	CCF04	1	$136,314	$5,500	14-7	1	$136,314	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,900
419	CC	1047995487	VANEGAS HECTOR									X									230301	29	$2,854,096	$456,700	EPS010	29	$2,854,096	$114,200	CCF04	29	$2,854,096	$114,200	14-7	29	$2,854,096	6.960%	$198,700	29	$0	$0	Si	$883,800
420	CC	1047995487	VANEGAS HECTOR													L					230301	1	$64,344	$10,300	EPS010	1	$64,344	$2,600	CCF04	1	$64,344	$2,600	14-7	1	$64,344	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,500
421	CC	70631665	VANEGAS OBED									X									25-14	29	$3,625,203	$580,100	EPS010	29	$3,625,203	$145,100	CCF04	29	$3,625,203	$145,100	14-7	29	$3,625,203	6.960%	$252,400	29	$0	$0	Si	$1,122,700
422	CC	70631665	VANEGAS OBED													L					25-14	1	$114,434	$18,400	EPS010	1	$114,434	$4,600	CCF04	1	$114,434	$4,600	14-7	1	$114,434	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$27,600
423	CC	1035422151	VANEGAS ROBINSON									X									230201	29	$2,921,828	$467,500	EPS010	29	$2,921,828	$116,900	CCF04	29	$2,921,828	$116,900	14-7	29	$2,921,828	6.960%	$203,400	29	$0	$0	Si	$904,700
424	CC	1035422151	VANEGAS ROBINSON													L					230201	1	$97,420	$15,600	EPS010	1	$97,420	$3,900	CCF04	1	$97,420	$3,900	14-7	1	$97,420	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,400
425	CC	71330063	VARGAS FREDY													L					25-14	1	$70,587	$11,300	EPS010	1	$70,587	$2,900	CCF04	1	$70,587	$2,900	14-7	1	$70,587	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,100
426	CC	71330063	VARGAS FREDY									X									25-14	29	$2,175,025	$348,100	EPS010	29	$2,175,025	$87,100	CCF04	29	$2,175,025	$87,100	14-7	29	$2,175,025	6.960%	$151,400	29	$0	$0	Si	$673,700
427	CC	36065978	VARGAS NEIRA	X																	231001	10	$1,000,000	$160,000	EPS037	10	$1,000,000	$40,000	CCF04	10	$1,000,000	$40,000	14-7	10	$1,000,000	6.960%	$69,600	10	$0	$0	Si	$309,600
428	CC	8057571	VELASQUEZ JADER		X							X									230301	20	$1,199,696	$192,000	EPS037	20	$1,199,696	$48,000	CCF04	20	$1,315,049	$52,700	14-7	20	$1,199,696	6.960%	$83,500	20	$0	$0	Si	$376,200

429	CC	8057571	VELASQUEZ JADER		L	230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CCF04	1	$50,000	$2,000	14-7	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
430	CC	70325409	VELEZ GUSTAVO		L	25-14	1	$94,700	$15,200	EPS010	1	$94,700	$3,800	CCF04	1	$94,700	$3,800	14-7	1	$94,700	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,800
431	CC	70325409	VELEZ GUSTAVO	X		25-14	29	$3,092,814	$494,900	EPS010	29	$3,092,814	$123,800	CCF04	29	$3,092,814	$123,800	14-7	29	$3,092,814	6.960%	$215,300	29	$0	$0	Si	$957,800
432	CC	1088345085	VELEZ JHON			230301	30	$3,596,788	$575,500	EPS010	30	$3,596,788	$143,900	CCF04	30	$3,596,788	$143,900	14-7	30	$3,596,788	6.960%	$250,400	30	$0	$0	Si	$1,113,700
433	CC	1036684826	VELEZ YONIER		L	230301	1	$135,847	$21,800	EPS010	1	$135,847	$5,500	CCF04	1	$135,847	$5,500	14-7	1	$135,847	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,800
434	CC	1036684826	VELEZ YONIER	X		230301	29	$3,749,354	$599,900	EPS010	29	$3,749,354	$150,000	CCF04	29	$3,749,354	$150,000	14-7	29	$3,749,354	6.960%	$261,000	29	$0	$0	Si	$1,160,900
435	CC	98643720	VILLA JOHN	X		231001	29	$2,608,934	$417,500	EPS037	29	$2,608,934	$104,400	CCF04	29	$2,608,934	$104,400	14-7	29	$2,608,934	6.960%	$181,600	29	$0	$0	Si	$807,900
436	CC	98643720	VILLA JOHN		L	231001	1	$85,670	$13,800	EPS037	1	$85,670	$3,500	CCF04	1	$85,670	$3,500	14-7	1	$85,670	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,800
437	CC	1152717494	VILLA LENNY	X		230201	29	$2,925,174	$468,100	EPS010	29	$2,925,174	$117,100	CCF04	29	$2,925,174	$117,100	14-7	29	$2,925,174	6.960%	$203,600	29	$0	$0	Si	$905,900
438	CC	1152717494	VILLA LENNY		L	230201	1	$100,870	$16,200	EPS010	1	$100,870	$4,100	CCF04	1	$100,870	$4,100	14-7	1	$100,870	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,400
439	CC	1038414425	VILLEGAS JOSE			230201	30	$4,701,754	$752,300	EPS010	30	$4,701,754	$188,100	CCF04	30	$4,701,754	$188,100	14-7	30	$4,701,754	6.960%	$327,300	30	$0	$0	Si	$1,455,800
440	CC	1035916722	YEPES LUIS		L	25-14	1	$64,560	$10,400	EPS010	1	$64,560	$2,600	CCF04	1	$64,560	$2,600	14-7	1	$64,560	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,600
441	CC	1035916722	YEPES LUIS	X		25-14	29	$2,118,782	$339,100	EPS010	29	$2,118,782	$84,800	CCF04	29	$2,118,782	$84,800	14-7	29	$2,118,782	6.960%	$147,500	29	$0	$0	Si	$656,200
442	CC	8852636	YESMO SIXTO		L	230301	1	$95,340	$15,300	EPS010	1	$95,340	$3,900	CCF04	1	$95,340	$3,900	14-7	1	$95,340	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,100
443	CC	8852636	YESMO SIXTO	X		230301	29	$3,112,361	$498,000	EPS010	29	$3,112,361	$124,500	CCF04	29	$3,112,361	$124,500	14-7	29	$3,112,361	6.960%	$216,700	29	$0	$0	Si	$963,700
444	CC	71644113	ZAPATA CARLOS	X		25-14	30	$3,878,923	$620,700	EPS010	30	$3,878,923	$155,200	CCF04	30	$3,878,923	$155,200	14-7	30	$3,878,923	6.960%	$270,000	30	$0	$0	Si	$1,201,100
445	CC	15406765	ZAPATA FARID		L	230301	1	$138,977	$22,300	EPS037	1	$138,977	$5,600	CCF04	1	$138,977	$5,600	14-7	1	$138,977	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,500
446	CC	15406765	ZAPATA FARID	X		230301	29	$4,242,294	$678,800	EPS037	29	$4,242,294	$169,700	CCF04	29	$4,242,294	$169,700	14-7	29	$4,242,294	6.960%	$295,300	29	$0	$0	Si	$1,313,500
447	CC	71785000	ZAPATA FERMIN	X		25-14	29	$1,819,104	$291,100	EPS010	29	$1,819,104	$72,800	CCF04	29	$1,819,104	$72,800	14-7	29	$1,819,104	6.960%	$126,700	29	$0	$0	Si	$563,400
448	CC	71785000	ZAPATA FERMIN		L	25-14	1	$53,497	$8,600	EPS010	1	$53,497	$2,200	CCF04	1	$53,497	$2,200	14-7	1	$53,497	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,000
449	CC	8338529	ZAPATA GUILLERMO		L	25-14	1	$118,650	$19,000	EPS010	1	$118,650	$4,800	CCF04	1	$118,650	$4,800	14-7	1	$118,650	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,600
450	CC	8338529	ZAPATA GUILLERMO	X		25-14	29	$3,130,236	$500,900	EPS010	29	$3,130,236	$125,300	CCF04	29	$3,130,236	$125,300	14-7	29	$3,130,236	6.960%	$217,900	29	$0	$0	Si	$969,400
Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)								$0	$0			$4,621,158	$184,900			$4,621,158	$184,900			$4,621,158		$321,700		$0	$0		$691,500
451	CC	71629907	RICO JAIME	X			0	$0	$0	EPS037	30	$4,621,158	$184,900	CCF04	30	$4,621,158	$184,900	14-7	30	$4,621,158	6.960%	$321,700	30	$0	$0	Si	$691,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (40 Afiliados)								**$261,557,612**	**$43,971,800**			**$288,576,378**	**$22,316,300**			**$288,576,362**	**$11,520,200**			**$288,576,378**		**$1,434,300**		**$126,699,270**	**$6,336,200**		**$85,578,800**
Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)								$3,385,244	$541,700			$3,385,244	$135,500			$3,385,244	$135,500			$3,385,244		$17,100		$0	$0		$829,800
452	CC	43102490	ORTIZ OLGA		L	25-14	1	$112,844	$18,100	EPS010	1	$112,844	$4,600	CCF04	1	$112,844	$4,600	14-7	1	$112,844	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$27,300
453	CC	43102490	ORTIZ OLGA	X		25-14	29	$3,272,400	$523,600	EPS010	29	$3,272,400	$130,900	CCF04	29	$3,272,400	$130,900	14-7	29	$3,272,400	0.522%	$17,100	29	$0	$0	Si	$802,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)								$5,580,534	$893,000			$5,580,534	$223,300			$5,580,534	$223,300			$5,580,534		$28,200		$0	$0		$1,367,800
454	CC	1053787418	CASTAÑEDA JOSE		L	230201	1	$186,020	$29,800	EPS017	1	$186,020	$7,500	CCF24	1	$186,020	$7,500	14-7	1	$186,020	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$44,800
455	CC	1053787418	CASTAÑEDA JOSE	X		230201	29	$5,394,514	$863,200	EPS017	29	$5,394,514	$215,800	CCF24	29	$5,394,514	$215,800	14-7	29	$5,394,514	0.522%	$28,200	29	$0	$0	Si	$1,323,000
Ciudad: CALDAS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)								$2,444,641	$391,300			$2,444,641	$97,900			$2,444,640	$97,900			$2,444,641		$12,400		$0	$0		$599,500
456	CC	43280437	ECHEVERRY MARTA		L	230201	1	$81,490	$13,100	EPS010	1	$81,490	$3,300	CCF04	1	$81,490	$3,300	14-7	1	$81,490	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,700
457	CC	43280437	ECHEVERRY MARTA			230201	29	$2,363,151	$378,200	EPS010	29	$2,363,151	$94,600	CCF04	29	$2,363,150	$94,600	14-7	29	$2,363,151	0.522%	$12,400	29	$0	$0	Si	$579,800
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)								$6,190,825	$1,052,600			$6,190,825	$247,700			$6,190,825	$247,700			$6,190,825		$32,400		$0	$0		$1,580,400
458	CC	15431959	ARENAS LEONARDO	X		25-14	30	$6,190,825	$1,052,600	EPS037	30	$6,190,825	$247,700	CCF04	30	$6,190,825	$247,700	14-7	30	$6,190,825	0.522%	$32,400	30	$0	$0	Si	$1,580,400
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)								$23,321,448	$3,923,700			$23,321,448	$2,563,800			$23,321,447	$933,100			$23,321,448		$111,300		$19,184,034	$959,300		$8,491,200
459	CC	70561752	MAYA JORGE			25-14	20	$2,758,274	$441,400	EPS010	20	$2,758,274	$110,400	CCF04	20	$2,758,273	$110,400	14-7	20	$2,758,274	0.522%	$14,400	20	$0	$0	Si	$676,600
460	CC	70561752	MAYA JORGE		X	25-14	9	$1,241,223	$198,600	EPS010	9	$1,241,223	$49,700	CCF04	9	$1,241,223	$49,700	14-7	9	$1,241,223	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$298,000
461	CC	70561752	MAYA JORGE		L	25-14	1	$137,917	$22,100	EPS010	1	$137,917	$5,600	CCF04	1	$137,917	$5,600	14-7	1	$137,917	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,300
462	CC	70560202	PARIS CARLOS	X		25-14	29	$18,544,564	$3,152,800	EPS010	29	$18,544,564	$2,318,100	CCF04	29	$18,544,564	$741,800	14-7	29	$18,544,564	0.522%	$96,900	29	$18,544,564	$927,300	No	$7,236,900
463	CC	70560202	PARIS CARLOS		L	25-14	1	$639,470	$108,800	EPS010	1	$639,470	$80,000	CCF04	1	$639,470	$25,600	14-7	1	$639,470	0.000%	$0	1	$639,470	$32,000	No	$246,400

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)								$7,045,318	$1,127,300			$7,045,318	$281,900			$7,045,318	$281,900			$7,045,318		$35,700		$0	$0		$1,726,800
464	CC	39354425	SALDARRIAGA LEDY	X		25-14	29	$3,113,043	$498,100	EPS037	29	$3,113,043	$124,600	CCF04	29	$3,113,043	$124,600	14-7	29	$3,113,043	0.522%	$16,300	29	$0	$0	Si	$763,600
465	CC	39354425	SALDARRIAGA LEDY		L	25-14	1	$107,347	$17,200	EPS037	1	$107,347	$4,300	CCF04	1	$107,347	$4,300	14-7	1	$107,347	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,800
466	CC	1128390757	VASQUEZ MARTA	X		230201	29	$3,697,428	$591,600	EPS010	29	$3,697,428	$147,900	CCF04	29	$3,697,428	$147,900	14-7	29	$3,697,428	0.522%	$19,400	29	$0	$0	Si	$906,800
467	CC	1128390757	VASQUEZ MARTA		L	230201	1	$127,500	$20,400	EPS010	1	$127,500	$5,100	CCF04	1	$127,500	$5,100	14-7	1	$127,500	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (32 Afiliados)								$213,589,602	$36,042,200			$240,608,368	$18,766,200			$240,608,354	$9,600,800			$240,608,368		$1,197,200		$107,515,236	$5,376,900		$70,983,300
468	CC	98588934	ACEVEDO ALEXANDER		L	25-14	1	$234,630	$40,000	MIN002	1	$234,630	$9,400	CCF04	1	$234,630	$9,400	14-7	1	$234,630	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$58,800
469	CC	98588934	ACEVEDO ALEXANDER			25-14	29	$6,804,201	$1,156,900	MIN002	29	$6,804,201	$272,200	CCF04	29	$6,804,200	$272,200	14-7	29	$6,804,201	0.522%	$35,600	29	$0	$0	Si	$1,736,900
470	CC	1035417379	ALVAREZ NASLY	X		25-14	29	$2,049,469	$328,000	EPS010	29	$2,049,469	$82,000	CCF04	29	$2,049,469	$82,000	14-7	29	$2,049,469	0.522%	$10,700	29	$0	$0	Si	$502,700
471	CC	1035417379	ALVAREZ NASLY		L	25-14	1	$70,674	$11,400	EPS010	1	$70,674	$2,900	CCF04	1	$70,674	$2,900	14-7	1	$70,674	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,200
472	CC	43836787	BEDOYA ALEXANDRA	X		25-14	29	$6,867,906	$1,167,700	EPS010	29	$6,867,906	$274,800	CCF04	29	$6,867,906	$274,800	14-7	29	$6,867,906	0.522%	$35,900	29	$0	$0	Si	$1,753,200
473	CC	43836787	BEDOYA ALEXANDRA		L	25-14	1	$236,827	$40,300	EPS010	1	$236,827	$9,500	CCF04	1	$236,827	$9,500	14-7	1	$236,827	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$59,300
474	CC	1035859763	CHAVEZ YURANY	X		230201	29	$1,740,375	$278,500	EPS010	29	$1,740,375	$69,700	CCF04	29	$1,740,375	$69,700	14-7	29	$1,740,375	0.522%	$9,100	29	$0	$0	Si	$427,000
475	CC	1035859763	CHAVEZ YURANY		L	230201	1	$60,014	$9,700	EPS010	1	$60,014	$2,500	CCF04	1	$60,014	$2,500	14-7	1	$60,014	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,700
476	CC	43609505	DELGADO MARIELA	X		230201	29	$1,632,494	$261,200	EPS010	29	$1,632,494	$65,300	CCF04	29	$1,632,494	$65,300	14-7	29	$1,632,494	0.522%	$8,600	29	$0	$0	Si	$400,400
477	CC	43609505	DELGADO MARIELA		L	230201	1	$54,757	$8,800	EPS010	1	$54,757	$2,200	CCF04	1	$54,757	$2,200	14-7	1	$54,757	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,200
478	CC	1017255094	DIAZ ANGHI			230301	30	$3,511,040	$561,800	EPS010	30	$3,511,040	$140,500	CCF04	30	$3,511,040	$140,500	14-7	30	$3,511,040	0.522%	$18,400	30	$0	$0	Si	$861,200
479	CC	1035438373	ECHEVERRI KELLY		L	230201	1	$100,110	$16,100	EPS010	1	$100,110	$4,100	CCF04	1	$100,110	$4,100	14-7	1	$100,110	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,300
480	CC	1035438373	ECHEVERRI KELLY		X	230201	1	$100,110	$16,100	EPS010	1	$100,110	$4,100	CCF04	1	$100,109	$4,100	14-7	1	$100,110	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,300
481	CC	1035438373	ECHEVERRI KELLY	X		230201	28	$2,803,065	$448,500	EPS010	28	$2,803,065	$112,200	CCF04	28	$2,803,065	$112,200	14-7	28	$2,803,065	0.522%	$14,700	28	$0	$0	Si	$687,600
482	CC	7169205	GARCIA JAVIER			230301	29	$23,491,160	$4,087,600	EPS010	29	$23,491,160	$2,936,400	CCF04	29	$23,491,160	$939,700	14-7	29	$23,491,160	0.522%	$122,700	29	$23,491,160	$1,174,700	No	$9,261,100
483	CC	7169205	GARCIA JAVIER		L	230301	1	$810,040	$141,100	EPS010	1	$810,040	$101,300	CCF04	1	$810,040	$32,500	14-7	1	$810,040	0.000%	$0	1	$810,040	$40,700	No	$315,600
484	CC	43274953	GAVIRIA ALEJANDRA			25-14	29	$2,093,445	$335,000	EPS010	29	$2,093,445	$83,800	CCF04	29	$2,093,444	$83,800	14-7	29	$2,093,445	0.522%	$11,000	29	$0	$0	Si	$513,600
485	CC	43274953	GAVIRIA ALEJANDRA		L	25-14	1	$72,190	$11,600	EPS010	1	$72,190	$2,900	CCF04	1	$72,190	$2,900	14-7	1	$72,190	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,400
486	CC	98464374	GIRALDO FERNANDO			25-14	29	$6,996,504	$1,189,500	EPS002	29	$6,996,504	$279,900	CCF04	29	$6,996,503	$279,900	14-7	29	$6,996,504	0.522%	$36,600	29	$0	$0	Si	$1,785,900
487	CC	98464374	GIRALDO FERNANDO		L	25-14	1	$241,260	$41,300	EPS002	1	$241,260	$9,700	CCF04	1	$241,260	$9,700	14-7	1	$241,260	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$60,700
488	CC	1152470914	GOMEZ LAURA		L	25-14	1	$103,334	$16,600	EPS005	1	$103,334	$4,200	CCF04	1	$103,334	$4,200	14-7	1	$103,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,000
489	CC	1152470914	GOMEZ LAURA	X		25-14	29	$2,996,667	$479,500	EPS005	29	$2,996,667	$119,900	CCF04	29	$2,996,667	$119,900	14-7	29	$2,996,667	0.522%	$15,700	29	$0	$0	Si	$735,000
490	CC	1030552024	GONZALEZ ELIANA	X		230301	29	$1,529,938	$244,800	EPS010	29	$1,529,938	$61,200	CCF04	29	$1,529,938	$61,200	14-7	29	$1,529,938	0.522%	$8,000	29	$0	$0	Si	$375,200
491	CC	1030552024	GONZALEZ ELIANA		L	230301	1	$52,624	$8,500	EPS010	1	$52,624	$2,200	CCF04	1	$52,624	$2,200	14-7	1	$52,624	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,900
492	CC	1066175249	HERAZO NAYHARA		L	230201	1	$285,837	$48,800	EPS010	1	$285,837	$11,500	CCF04	1	$285,837	$11,500	14-7	1	$285,837	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$71,800
493	CC	1066175249	HERAZO NAYHARA		X	230201	2	$571,670	$97,300	EPS010	2	$571,670	$22,900	CCF04	2	$571,670	$22,900	14-7	2	$571,670	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$143,100
494	CC	1066175249	HERAZO NAYHARA			230201	27	$7,717,540	$1,312,100	EPS010	27	$7,717,540	$308,800	CCF04	27	$7,717,539	$308,800	14-7	27	$7,717,540	0.522%	$40,300	27	$0	$0	Si	$1,970,000
495	CC	71315227	LARA HERMEN	X		230201	29	$3,101,366	$496,300	MIN002	29	$3,101,366	$124,100	CCF04	29	$3,101,366	$124,100	14-7	29	$3,101,366	0.522%	$16,200	29	$0	$0	Si	$760,700
496	CC	71315227	LARA HERMEN		L	230201	1	$106,947	$17,200	MIN002	1	$106,947	$4,300	CCF04	1	$106,947	$4,300	14-7	1	$106,947	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,800
497	CC	1017166091	LONDOÑO WBEIMAR	X		230201	29	$11,297,917	$1,920,700	EPS010	29	$11,297,917	$452,000	CCF04	29	$11,297,917	$452,000	14-7	29	$11,297,917	0.522%	$59,000	29	$0	$0	Si	$2,883,700
498	CC	1017166091	LONDOÑO WBEIMAR		L	230201	1	$389,584	$66,400	EPS010	1	$389,584	$15,600	CCF04	1	$389,584	$15,600	14-7	1	$389,584	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$97,600
499	CC	3353097	LOPEZ JUAN				0	$0	$0	EPS010	29	$26,089,310	$3,261,200	CCF04	29	$26,089,310	$1,043,600	14-7	29	$26,089,310	0.522%	$136,200	29	$26,089,310	$1,304,500	No	$5,745,500
500	CC	3353097	LOPEZ JUAN		L		0	$0	$0	EPS010	1	$929,456	$116,200	CCF04	1	$929,456	$37,200	14-7	1	$929,456	0.000%	$0	1	$929,456	$46,500	No	$199,900
501	CC	7544534	LOPEZ SILVIO			25-14	29	$7,484,021	$1,272,500	EPS010	29	$7,484,021	$299,400	CCF04	29	$7,484,020	$299,400	14-7	29	$7,484,021	0.522%	$39,100	29	$0	$0	Si	$1,910,400
502	CC	7544534	LOPEZ SILVIO		L	25-14	1	$258,070	$43,900	EPS010	1	$258,070	$10,400	CCF04	1	$258,070	$10,400	14-7	1	$258,070	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$64,700

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

503	CC	98512773	MARIN FRANK													L					230201	1	$297,437	$50,600	EPS010	1	$297,437	$11,900	CCF04	1	$297,437	$11,900	14-7	1	$297,437	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$74,400
504	CC	98512773	MARIN FRANK																		230201	27	$8,030,744	$1,365,400	EPS010	27	$8,030,744	$321,300	CCF04	27	$8,030,743	$321,300	14-7	27	$8,030,744	0.522%	$42,000	27	$0	$0	Si	$2,050,000
505	CC	98512773	MARIN FRANK													X					230201	2	$594,870	$101,200	EPS010	2	$594,870	$23,800	CCF04	2	$594,870	$23,800	14-7	2	$594,870	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$148,800
506	CC	43597102	MOSQUERA DORA																		230201	28	$1,741,735	$278,700	EPS010	28	$1,741,735	$69,700	CCF04	28	$1,741,734	$69,700	14-7	28	$1,741,735	0.522%	$9,100	28	$0	$0	Si	$427,200
507	CC	43597102	MOSQUERA DORA													L					230201	1	$62,207	$10,000	EPS010	1	$62,207	$2,500	CCF04	1	$62,207	$2,500	14-7	1	$62,207	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,000
508	CC	43597102	MOSQUERA DORA													X					230201	1	$62,205	$10,000	EPS010	1	$62,205	$2,500	CCF04	1	$62,205	$2,500	14-7	1	$62,205	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,000
509	CC	98464251	MUNERA DAVID									X									25-14	29	$19,753,626	$3,358,200	EPS010	29	$19,753,626	$2,469,300	CCF04	29	$19,753,626	$790,200	14-7	29	$19,753,626	0.522%	$103,200	29	$19,753,626	$987,800	No	$7,708,700
510	CC	98464251	MUNERA DAVID													L					25-14	1	$681,160	$116,000	EPS010	1	$681,160	$85,200	CCF04	1	$681,160	$27,300	14-7	1	$681,160	0.000%	$0	1	$681,160	$34,200	No	$262,700
511	CC	71640224	OCHOA JUAN																		230201	29	$19,753,577	$3,358,200	EPS010	29	$19,753,577	$2,469,200	CCF04	29	$19,753,576	$790,200	14-7	29	$19,753,577	0.522%	$103,200	29	$19,753,576	$987,800	No	$7,708,600
512	CC	71640224	OCHOA JUAN													L					230201	1	$681,160	$116,000	EPS010	1	$681,160	$85,200	CCF04	1	$681,160	$27,300	14-7	1	$681,160	0.000%	$0	1	$681,160	$34,200	No	$262,700
513	CC	1003005732	PACHECO NATALIA													L					230201	1	$100,870	$16,200	EPS010	1	$100,870	$4,100	CCF04	1	$100,870	$4,100	14-7	1	$100,870	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,400
514	CC	1003005732	PACHECO NATALIA									X									230201	29	$2,925,173	$468,100	EPS010	29	$2,925,173	$117,100	CCF04	29	$2,925,173	$117,100	14-7	29	$2,925,173	0.522%	$15,300	29	$0	$0	Si	$717,600
515	CC	1152194520	PELAEZ DANIELA													L					230301	1	$233,567	$39,800	EPS010	1	$233,567	$9,400	CCF04	1	$233,567	$9,400	14-7	1	$233,567	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$58,600
516	CC	1152194520	PELAEZ DANIELA																		230301	22	$5,138,463	$873,600	EPS010	22	$5,138,463	$205,600	CCF04	22	$5,138,462	$205,600	14-7	22	$5,138,463	0.522%	$26,900	22	$0	$0	Si	$1,311,700
517	CC	1152194520	PELAEZ DANIELA													X					230301	7	$1,634,966	$278,000	EPS010	7	$1,634,966	$65,400	CCF04	7	$1,634,965	$65,400	14-7	7	$1,634,966	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$408,800
518	CC	1094886438	PUERTA ANA																		230201	29	$5,678,767	$965,500	EPS010	29	$5,678,767	$227,200	CCF04	29	$5,678,766	$227,200	14-7	29	$5,678,767	0.522%	$29,700	29	$0	$0	Si	$1,449,600
519	CC	1094886438	PUERTA ANA													L					230201	1	$195,820	$33,400	EPS010	1	$195,820	$7,900	CCF04	1	$195,820	$7,900	14-7	1	$195,820	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$49,200
520	CC	1026155891	RAIGOSA JUAN													L					230301	1	$62,184	$10,000	EPS010	1	$62,184	$2,500	CCF04	1	$62,184	$2,500	14-7	1	$62,184	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,000
521	CC	1026155891	RAIGOSA JUAN									X									230301	29	$1,803,279	$288,600	EPS010	29	$1,803,279	$72,200	CCF04	29	$1,803,279	$72,200	14-7	29	$1,803,279	0.522%	$9,500	29	$0	$0	Si	$442,500
522	CC	1017269938	SALAZAR MARIA																		25-14	29	$1,643,334	$263,000	EPS010	29	$1,643,334	$65,800	CCF04	29	$1,643,333	$65,800	14-7	29	$1,643,334	0.522%	$8,600	29	$0	$0	Si	$403,200
523	CC	1017269938	SALAZAR MARIA													L					25-14	1	$57,514	$9,300	EPS010	1	$57,514	$2,400	CCF04	1	$57,514	$2,400	14-7	1	$57,514	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,100
524	CC	32240099	SANTANA MARIA																		25-14	29	$7,914,640	$1,345,600	EPS010	29	$7,914,640	$316,600	CCF04	29	$7,914,639	$316,600	14-7	29	$7,914,640	0.522%	$41,400	29	$0	$0	Si	$2,020,200
525	CC	32240099	SANTANA MARIA													L					25-14	1	$272,920	$46,500	EPS010	1	$272,920	$11,000	CCF04	1	$272,920	$11,000	14-7	1	$272,920	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$68,500
526	CC	6662925	TARAZONA RUBEN																		231001	27	$9,000,000	$1,530,000	EPS010	27	$9,000,000	$360,000	CCF04	27	$9,000,000	$360,000	14-7	27	$9,000,000	0.522%	$47,000	27	$0	$0	Si	$2,297,000
527	CC	6662925	TARAZONA RUBEN											X							231001	2	$666,667	$113,500	EPS010	2	$666,667	$26,700	CCF04	2	$666,667	$0	14-7	2	$666,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$140,200
528	CC	6662925	TARAZONA RUBEN													L					231001	1	$333,334	$56,800	EPS010	1	$333,334	$13,400	CCF04	1	$333,334	$13,400	14-7	1	$333,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$83,600
529	CC	71694246	VARGAS VICTOR													L					230201	1	$220,000	$37,400	EPS010	1	$220,000	$8,800	CCF04	1	$220,000	$8,800	14-7	1	$220,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$55,000
530	CC	71694246	VARGAS VICTOR																		230201	29	$6,380,000	$1,084,600	EPS010	29	$6,380,000	$255,200	CCF04	29	$6,380,000	$255,200	14-7	29	$6,380,000	0.522%	$33,400	29	$0	$0	Si	$1,628,400
531	CC	1152199824	VELASQUEZ DAVID													L					230301	1	$108,954	$17,500	EPS010	1	$108,954	$4,400	CCF04	1	$108,954	$4,400	14-7	1	$108,954	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,300
532	CC	1152199824	VELASQUEZ DAVID									X									230301	29	$3,159,557	$505,600	EPS010	29	$3,159,557	$126,400	CCF04	29	$3,159,557	$126,400	14-7	29	$3,159,557	0.522%	$16,500	29	$0	$0	Si	$774,900
533	CC	43722843	VELEZ LUZ													L					25-14	1	$510,860	$87,000	EPS010	1	$510,860	$63,900	CCF04	1	$510,860	$20,500	14-7	1	$510,860	0.000%	$0	1	$510,860	$25,700	No	$197,100
534	CC	43722843	VELEZ LUZ									X									25-14	29	$14,814,888	$2,518,600	EPS010	29	$14,814,888	$1,851,900	CCF04	29	$14,814,888	$592,600	14-7	29	$14,814,888	0.522%	$77,400	29	$14,814,888	$740,800	No	$5,781,300
535	CC	71699208	YEPES JESUS									X									25-14	29	$3,102,358	$496,400	EPS010	29	$3,102,358	$124,100	CCF04	29	$3,102,358	$124,100	14-7	29	$3,102,358	0.522%	$16,200	29	$0	$0	Si	$760,800
536	CC	71699208	YEPES JESUS													L					25-14	1	$106,980	$17,200	EPS010	1	$106,980	$4,300	CCF04	1	$106,980	$4,300	14-7	1	$106,980	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (46 Afiliados)																							$133,279,260	$21,395,600			$136,134,674	$5,449,800			$137,550,582	$5,437,400			$136,134,674		$5,708,000		$0	$0		$37,990,800
Ciudad: BARBOSA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$2,753,695	$440,600			$2,753,695	$110,200			$2,753,695	$110,200			$2,753,695		$119,800		$0	$0		$780,800
537	CC	70134003	GUTIERREZ JOSUE									X									25-14	30	$2,753,695	$440,600	EPS010	30	$2,753,695	$110,200	CCF04	30	$2,753,695	$110,200	14-7	30	$2,753,695	4.350%	$119,800	30	$0	$0	Si	$780,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

 2025/05/22 09:13 AM

Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							**$16,388,350**	**$2,622,800**			**$16,388,350**	**$656,200**			**$16,388,349**	**$644,100**			**$16,388,350**		**$682,700**		**$0**	**$0**		**$4,605,800**
538	CC	15506429	ALZATE JOSE										X								25-14	2	$177,147	$28,400	EPS010	2	$177,147	$7,100	CCF04	2	$177,147	$0	14-7	2	$177,147	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$35,500
539	CC	15506429	ALZATE JOSE								X										25-14	28	$3,501,043	$560,200	EPS010	28	$3,501,043	$140,100	CCF04	28	$3,501,043	$140,100	14-7	28	$3,501,043	4.350%	$152,300	28	$0	$0	Si	$992,700
540	CC	71182563	DUQUE JHOANY												L						25-14	1	$94,450	$15,200	EPS010	1	$94,450	$3,800	CCF04	1	$94,450	$3,800	14-7	1	$94,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,800
541	CC	71182563	DUQUE JHOANY								X										25-14	29	$3,226,341	$516,300	EPS010	29	$3,226,341	$129,100	CCF04	29	$3,226,341	$129,100	14-7	29	$3,226,341	4.350%	$140,400	29	$0	$0	Si	$914,900
542	CC	15308219	GARCIA EIDER												L						25-14	1	$85,304	$13,700	EPS010	1	$85,304	$3,500	CCF04	1	$85,304	$3,500	14-7	1	$85,304	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,700
543	CC	15308219	GARCIA EIDER								X										25-14	29	$2,440,433	$390,500	EPS010	29	$2,440,433	$97,700	CCF04	29	$2,440,433	$97,700	14-7	29	$2,440,433	4.350%	$106,200	29	$0	$0	Si	$692,100
544	CC	98479851	MUÑOZ JORGE								X										230301	29	$1,592,512	$254,900	EPS010	29	$1,592,512	$63,800	CCF04	29	$1,592,512	$63,800	14-7	29	$1,592,512	4.350%	$69,300	29	$0	$0	Si	$451,800
545	CC	98479851	MUÑOZ JORGE												L						230301	1	$54,917	$8,800	EPS010	1	$54,917	$2,200	CCF04	1	$54,917	$2,200	14-7	1	$54,917	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,200
546	CC	98493223	ROLDAN LUIS								X										231001	27	$2,628,533	$420,600	EPS010	27	$2,628,533	$105,200	CCF04	27	$2,628,533	$105,200	14-7	27	$2,628,533	4.350%	$114,400	27	$0	$0	Si	$745,400
547	CC	98493223	ROLDAN LUIS										X								231001	2	$123,709	$19,800	EPS010	2	$123,709	$5,000	CCF04	2	$123,709	$0	14-7	2	$123,709	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,800
548	CC	98493223	ROLDAN LUIS												L						231001	1	$84,460	$13,600	EPS010	1	$84,460	$3,400	CCF04	1	$84,460	$3,400	14-7	1	$84,460	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,400
549	CC	98567302	SEPULVEDA FREDY								X										25-14	29	$2,300,184	$368,100	EPS010	29	$2,300,184	$92,100	CCF04	29	$2,300,183	$92,100	14-7	29	$2,300,184	4.350%	$100,100	29	$0	$0	Si	$652,400
550	CC	98567302	SEPULVEDA FREDY												L						25-14	1	$79,317	$12,700	EPS010	1	$79,317	$3,200	CCF04	1	$79,317	$3,200	14-7	1	$79,317	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,100
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																							**$22,522,870**	**$3,604,500**			**$23,730,855**	**$950,000**			**$25,304,642**	**$956,000**			**$23,730,855**		**$936,400**		**$0**	**$0**		**$6,446,900**
551	CC	15321948	BETANCUR LUIS		X						X											0	$0	$0	EPS010	13	$1,052,076	$42,100	CCF04	13	$2,651,116	$106,100	14-7	13	$1,052,076	4.350%	$45,800	13	$0	$0	Si	$194,000
552	CC	15321948	BETANCUR LUIS												X							0	$0	$0	EPS010	2	$155,909	$6,300	CCF04	2	$130,657	$5,300	14-7	2	$155,909	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$11,600
553	CC	15505766	CADAVID ANIBAL										X								25-14	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF04	7	$332,150	$0	14-7	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$66,500
554	CC	15505766	CADAVID ANIBAL										X								25-14	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF04	7	$332,150	$0	14-7	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$66,500
555	CC	15505766	CADAVID ANIBAL										X								25-14	4	$189,800	$30,400	EPS010	4	$189,800	$7,600	CCF04	4	$189,800	$0	14-7	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$38,000
556	CC	15505766	CADAVID ANIBAL										X								25-14	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
557	CC	15505766	CADAVID ANIBAL										X								25-14	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF04	7	$332,150	$0	14-7	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$66,500
558	CC	15505766	CADAVID ANIBAL										X								25-14	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF04	3	$142,350	$0	14-7	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
559	CC	1128279855	CASTAÑO EDISON												L						230201	1	$85,430	$13,700	EPS010	1	$85,430	$3,500	CCF04	1	$85,430	$3,500	14-7	1	$85,430	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,700
560	CC	1128279855	CASTAÑO EDISON								X										230201	29	$2,530,026	$404,900	EPS010	29	$2,530,026	$101,300	CCF04	29	$2,530,026	$101,300	14-7	29	$2,530,026	4.350%	$110,100	29	$0	$0	Si	$717,600
561	CC	1035867681	GOMEZ DAYRON	X							X										230201	29	$1,765,737	$282,600	EPS010	29	$1,765,737	$70,700	CCF04	29	$1,765,737	$70,700	14-7	29	$1,765,737	4.350%	$76,900	29	$0	$0	Si	$500,900
562	CC	1035867681	GOMEZ DAYRON												L						230201	1	$54,137	$8,700	EPS010	1	$54,137	$2,200	CCF04	1	$54,137	$2,200	14-7	1	$54,137	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,100
563	CC	15508014	MONTOYA FRANCISCO												L						25-14	1	$168,984	$27,100	EPS010	1	$168,984	$6,800	CCF04	1	$168,984	$6,800	14-7	1	$168,984	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$40,700
564	CC	15508014	MONTOYA FRANCISCO								X										25-14	29	$4,882,980	$781,300	EPS010	29	$4,882,980	$195,400	CCF04	29	$4,882,980	$195,400	14-7	29	$4,882,980	4.350%	$212,500	29	$0	$0	Si	$1,384,600
565	CC	15505253	RAMIREZ LUIS								X										25-14	29	$5,037,336	$806,000	EPS010	29	$5,037,336	$201,500	CCF04	29	$5,037,336	$201,500	14-7	29	$5,037,336	4.350%	$219,200	29	$0	$0	Si	$1,428,200
566	CC	15505253	RAMIREZ LUIS												L						25-14	1	$136,280	$21,900	EPS010	1	$136,280	$5,500	CCF04	1	$136,280	$5,500	14-7	1	$136,280	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,900
567	CC	70330492	SERNA JUAN								X										230301	29	$2,077,441	$332,400	EPS010	29	$2,077,441	$83,100	CCF04	29	$2,077,440	$83,100	14-7	29	$2,077,441	4.350%	$90,400	29	$0	$0	Si	$589,000
568	CC	70330492	SERNA JUAN												L						230301	1	$71,637	$11,500	EPS010	1	$71,637	$2,900	CCF04	1	$71,637	$2,900	14-7	1	$71,637	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,300
569	CC	15504376	VARELA MARCO								X										25-14	29	$4,170,198	$667,300	EPS010	29	$4,170,198	$166,900	CCF04	29	$4,170,198	$166,900	14-7	29	$4,170,198	4.350%	$181,500	29	$0	$0	Si	$1,182,600
570	CC	15504376	VARELA MARCO												L						25-14	1	$119,184	$19,100	EPS010	1	$119,184	$4,800	CCF04	1	$119,184	$4,800	14-7	1	$119,184	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,700
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$3,664,395**	**$586,400**			**$3,664,395**	**$146,700**			**$3,664,395**	**$146,700**			**$3,664,395**		**$154,000**		**$0**	**$0**		**$1,033,800**
571	CC	15509889	ECHEVERRI URIEL								X										25-14	29	$3,539,368	$566,300	EPS010	29	$3,539,368	$141,600	CCF04	29	$3,539,368	$141,600	14-7	29	$3,539,368	4.350%	$154,000	29	$0	$0	Si	$1,003,500
572	CC	15509889	ECHEVERRI URIEL												L						25-14	1	$125,027	$20,100	EPS010	1	$125,027	$5,100	CCF04	1	$125,027	$5,100	14-7	1	$125,027	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,300
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							**$17,046,251**	**$2,728,100**			**$18,693,680**	**$748,500**			**$18,535,804**	**$742,200**			**$18,693,680**		**$762,500**		**$0**	**$0**		**$4,981,300**

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

573	CC	70322056	BEDOYA LUIS	P																	25-14	23	$1,502,560	$240,500	EPS037	23	$1,502,560	$60,200	CCF04	23	$1,502,559	$60,200	14-7	23	$1,502,560	4.350%	$65,400	23	$0	$0	Si	$426,300
574	CC	70322056	BEDOYA LUIS	P												X					25-14	6	$549,847	$88,000	EPS037	6	$549,847	$22,000	CCF04	6	$391,972	$15,700	14-7	6	$549,847	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$125,700
575	CC	70322056	BEDOYA LUIS	P												L					25-14	1	$86,540	$13,900	EPS037	1	$86,540	$3,500	CCF04	1	$86,540	$3,500	14-7	1	$86,540	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,900
576	CC	71490859	CANO JUVEN													L					25-14	1	$114,930	$18,400	EPS010	1	$114,930	$4,600	CCF04	1	$114,930	$4,600	14-7	1	$114,930	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$27,600
577	CC	71490859	CANO JUVEN									X									25-14	29	$3,552,297	$568,400	EPS010	29	$3,552,297	$142,100	CCF04	29	$3,552,297	$142,100	14-7	29	$3,552,297	4.350%	$154,600	29	$0	$0	Si	$1,007,200
578	CC	70321283	CATAÑO FIDEL													L						0	$0	$0	EPS010	1	$54,917	$2,200	CCF04	1	$54,917	$2,200	14-7	1	$54,917	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,400
579	CC	70321283	CATAÑO FIDEL									X										0	$0	$0	EPS010	29	$1,592,512	$63,800	CCF04	29	$1,592,512	$63,800	14-7	29	$1,592,512	4.350%	$69,300	29	$0	$0	Si	$196,900
580	CC	9956357	CORTES BERNARDO													L					25-14	1	$74,127	$11,900	EPS010	1	$74,127	$3,000	CCF04	1	$74,127	$3,000	14-7	1	$74,127	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,900
581	CC	9956357	CORTES BERNARDO									X									25-14	29	$2,176,516	$348,300	EPS010	29	$2,176,516	$87,100	CCF04	29	$2,176,516	$87,100	14-7	29	$2,176,516	4.350%	$94,700	29	$0	$0	Si	$617,200
582	CC	70329015	MESA GUILLERMO									X									230301	29	$3,850,039	$616,100	EPS010	29	$3,850,039	$154,100	CCF04	29	$3,850,039	$154,100	14-7	29	$3,850,039	4.350%	$167,500	29	$0	$0	Si	$1,091,800
583	CC	70329015	MESA GUILLERMO													L					230301	1	$138,007	$22,100	EPS010	1	$138,007	$5,600	CCF04	1	$138,007	$5,600	14-7	1	$138,007	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$33,300
584	CC	70323852	RIOS LUIS													L					25-14	1	$54,914	$8,800	EPS010	1	$54,914	$2,200	CCF04	1	$54,914	$2,200	14-7	1	$54,914	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,200
585	CC	70323852	RIOS LUIS									X									25-14	29	$1,592,512	$254,900	EPS010	29	$1,592,512	$63,800	CCF04	29	$1,592,512	$63,800	14-7	29	$1,592,512	4.350%	$69,300	29	$0	$0	Si	$451,800
586	CC	70323887	VALENCIA JOSE									X									25-14	29	$3,255,832	$521,000	EPS010	29	$3,255,832	$130,300	CCF04	29	$3,255,832	$130,300	14-7	29	$3,255,832	4.350%	$141,700	29	$0	$0	Si	$923,300
587	CC	70323887	VALENCIA JOSE													L					25-14	1	$98,130	$15,800	EPS010	1	$98,130	$4,000	CCF04	1	$98,130	$4,000	14-7	1	$98,130	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,800
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$3,737,654	$598,100			$3,737,654	$149,600			$3,737,654	$149,600			$3,737,654		$157,200		$0	$0		$1,054,500
588	CC	98518775	GOMEZ FABIO									X									25-14	29	$3,613,064	$578,100	EPS010	29	$3,613,064	$144,600	CCF04	29	$3,613,064	$144,600	14-7	29	$3,613,064	4.350%	$157,200	29	$0	$0	Si	$1,024,500
589	CC	98518775	GOMEZ FABIO													L					25-14	1	$124,590	$20,000	EPS010	1	$124,590	$5,000	CCF04	1	$124,590	$5,000	14-7	1	$124,590	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (22 Afiliados)																							$67,166,045	$10,815,100			$67,166,045	$2,688,600			$67,166,043	$2,688,600			$67,166,045		$2,895,400		$0	$0		$19,087,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

590	CC	98578626	AGUDELO JUAN									X									230301	29	$2,200,227	$352,100	EPS010	29	$2,200,227	$88,100	CCF04	29	$2,200,227	$88,100	14-7	29	$2,200,227	4.350%	$95,800	29	$0	$0	Si	$624,100
591	CC	98578626	AGUDELO JUAN													L					230301	1	$74,810	$12,000	EPS010	1	$74,810	$3,000	CCF04	1	$74,810	$3,000	14-7	1	$74,810	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,000
592	CC	70351011	ARIAS WALTER													L					25-14	1	$158,300	$25,400	EPS010	1	$158,300	$6,400	CCF04	1	$158,300	$6,400	14-7	1	$158,300	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$38,200
593	CC	70351011	ARIAS WALTER									X									25-14	29	$5,045,050	$807,300	EPS010	29	$5,045,050	$201,900	CCF04	29	$5,045,050	$201,900	14-7	29	$5,045,050	4.350%	$219,500	29	$0	$0	Si	$1,430,600
594	CC	71674762	BUSTAMANTE DAIRO													L					231001	1	$69,770	$11,200	EPS037	1	$69,770	$2,800	CCF04	1	$69,770	$2,800	14-7	1	$69,770	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,800
595	CC	71674762	BUSTAMANTE DAIRO									X									231001	29	$2,248,585	$359,800	EPS037	29	$2,248,585	$90,000	CCF04	29	$2,248,585	$90,000	14-7	29	$2,248,585	4.350%	$97,900	29	$0	$0	Si	$637,700
596	CC	15509543	CADAVID WILMAR													L					25-14	1	$169,447	$27,200	EPS010	1	$169,447	$6,800	CCF04	1	$169,447	$6,800	14-7	1	$169,447	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$40,800
597	CC	15509543	CADAVID WILMAR									X									25-14	29	$4,872,000	$779,600	EPS010	29	$4,872,000	$194,900	CCF04	29	$4,872,000	$194,900	14-7	29	$4,872,000	4.350%	$212,000	29	$0	$0	Si	$1,381,400
598	CC	70327620	CANO CESAR									X									25-14	29	$2,817,008	$450,800	EPS010	29	$2,817,008	$112,700	CCF04	29	$2,817,008	$112,700	14-7	29	$2,817,008	4.350%	$122,600	29	$0	$0	Si	$798,800
599	CC	70327620	CANO CESAR													L					25-14	1	$100,937	$16,200	EPS010	1	$100,937	$4,100	CCF04	1	$100,937	$4,100	14-7	1	$100,937	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,400
600	CC	71665678	CARDONA FRANCISCO													L					25-14	1	$65,330	$10,500	EPS010	1	$65,330	$2,700	CCF04	1	$65,330	$2,700	14-7	1	$65,330	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,900
601	CC	71665678	CARDONA FRANCISCO																		25-14	29	$1,894,532	$303,200	EPS010	29	$1,894,532	$75,800	CCF04	29	$1,894,531	$75,800	14-7	29	$1,894,532	4.350%	$82,500	29	$0	$0	Si	$537,300
602	CC	3592244	CASTAÑEDA VICTOR									X									230201	30	$4,188,993	$670,300	EPS010	30	$4,188,993	$167,600	CCF04	30	$4,188,993	$167,600	14-7	30	$4,188,993	4.350%	$182,300	30	$0	$0	Si	$1,187,800
603	CC	70323972	CORDOBA GERMAN									X									25-14	30	$2,445,387	$391,300	EPS037	30	$2,445,387	$97,900	CCF04	30	$2,445,387	$97,900	14-7	30	$2,445,387	4.350%	$106,400	30	$0	$0	Si	$693,500
604	CC	19601883	DIAZ EZEQUIEL									X									231001	29	$5,091,548	$814,700	EPS005	29	$5,091,548	$203,700	CCF04	29	$5,091,548	$203,700	14-7	29	$5,091,548	4.350%	$221,500	29	$0	$0	Si	$1,443,600
605	CC	19601883	DIAZ EZEQUIEL													L					231001	1	$197,564	$31,700	EPS005	1	$197,564	$8,000	CCF04	1	$197,564	$8,000	14-7	1	$197,564	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$47,700
606	CC	15513408	GARCIA MARCO									X									230301	30	$2,504,147	$400,700	EPS002	30	$2,504,147	$100,200	CCF04	30	$2,504,147	$100,200	14-7	30	$2,504,147	4.350%	$109,000	30	$0	$0	Si	$710,100
607	CC	1047475075	GOMEZ JOSE													L					230301	1	$47,667	$7,700	EPS010	1	$47,667	$2,000	CCF04	1	$47,667	$2,000	14-7	1	$47,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
608	CC	1047475075	GOMEZ JOSE																		230301	29	$1,382,334	$221,200	EPS010	29	$1,382,334	$55,300	CCF04	29	$1,382,333	$55,300	14-7	29	$1,382,334	4.350%	$60,200	29	$0	$0	Si	$392,000
609	CC	1000409372	MADRID PABLO													L					230301	1	$63,334	$10,200	EPS010	1	$63,334	$2,600	CCF04	1	$63,334	$2,600	14-7	1	$63,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
610	CC	1000409372	MADRID PABLO									X									230301	29	$1,836,667	$293,900	EPS010	29	$1,836,667	$73,500	CCF04	29	$1,836,667	$73,500	14-7	29	$1,836,667	4.350%	$79,900	29	$0	$0	Si	$520,800
611	CC	15403901	MENA ARIEL									X									25-14	29	$6,414,050	$1,090,500	EPS010	29	$6,414,050	$256,600	CCF04	29	$6,414,050	$256,600	14-7	29	$6,414,050	4.350%	$279,100	29	$0	$0	Si	$1,882,800
612	CC	15403901	MENA ARIEL													L					25-14	1	$231,737	$39,500	EPS010	1	$231,737	$9,300	CCF04	1	$231,737	$9,300	14-7	1	$231,737	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$58,100
613	CC	71748915	MONROY WILSON													L					25-14	1	$65,584	$10,500	EPS010	1	$65,584	$2,700	CCF04	1	$65,584	$2,700	14-7	1	$65,584	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,900
614	CC	71748915	MONROY WILSON									X									25-14	29	$1,901,849	$304,300	EPS010	29	$1,901,849	$76,100	CCF04	29	$1,901,849	$76,100	14-7	29	$1,901,849	4.350%	$82,800	29	$0	$0	Si	$539,300
615	CC	71685854	OROZCO JUAN													L					25-14	1	$80,567	$12,900	EPS010	1	$80,567	$3,300	CCF04	1	$80,567	$3,300	14-7	1	$80,567	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,500
616	CC	71685854	OROZCO JUAN									X									25-14	29	$2,316,700	$370,700	EPS010	29	$2,316,700	$92,700	CCF04	29	$2,316,700	$92,700	14-7	29	$2,316,700	4.350%	$100,800	29	$0	$0	Si	$656,900
617	CC	71733364	OROZCO MAURICIO									X									25-14	29	$2,447,770	$391,700	EPS010	29	$2,447,770	$98,000	CCF04	29	$2,447,770	$98,000	14-7	29	$2,447,770	4.350%	$106,500	29	$0	$0	Si	$694,200
618	CC	71733364	OROZCO MAURICIO													L					25-14	1	$75,467	$12,100	EPS010	1	$75,467	$3,100	CCF04	1	$75,467	$3,100	14-7	1	$75,467	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,300
619	CC	70322418	ORTEGA FRANCISCO									X									25-14	29	$3,131,064	$501,000	EPS010	29	$3,131,064	$125,300	CCF04	29	$3,131,064	$125,300	14-7	29	$3,131,064	4.350%	$136,300	29	$0	$0	Si	$887,900
620	CC	70322418	ORTEGA FRANCISCO													L					25-14	1	$104,744	$16,800	EPS010	1	$104,744	$4,200	CCF04	1	$104,744	$4,200	14-7	1	$104,744	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,200
621	CC	1045426698	RAMOS CRISTIAN									X									25-14	30	$3,504,074	$560,700	EPS010	30	$3,504,074	$140,200	CCF04	30	$3,504,074	$140,200	14-7	30	$3,504,074	4.350%	$152,500	30	$0	$0	Si	$993,600
622	CC	98765349	TEJADA LUIS													L					230201	1	$64,297	$10,300	EPS002	1	$64,297	$2,600	CCF04	1	$64,297	$2,600	14-7	1	$64,297	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,500
623	CC	98765349	TEJADA LUIS									X									230201	29	$1,974,595	$316,000	EPS002	29	$1,974,595	$79,000	CCF04	29	$1,974,595	$79,000	14-7	29	$1,974,595	6.960%	$137,500	29	$0	$0	Si	$611,500
624	CC	71702955	VELASQUEZ JOHN													L					25-14	1	$100,404	$16,100	EPS010	1	$100,404	$4,100	CCF04	1	$100,404	$4,100	14-7	1	$100,404	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,300
625	CC	71702955	VELASQUEZ JOHN									X									25-14	29	$2,911,623	$465,900	EPS010	29	$2,911,623	$116,500	CCF04	29	$2,911,623	$116,500	14-7	29	$2,911,623	4.350%	$126,700	29	$0	$0	Si	$825,600
626	CC	71647960	VELEZ ANTONIO													L					25-14	1	$81,614	$13,100	EPS010	1	$81,614	$3,300	CCF04	1	$81,614	$3,300	14-7	1	$81,614	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,700
627	CC	71647960	VELEZ ANTONIO									X									25-14	29	$2,366,717	$378,700	EPS010	29	$2,366,717	$94,700	CCF04	29	$2,366,717	$94,700	14-7	29	$2,366,717	4.350%	$103,000	29	$0	$0	Si	$671,100
628	CC	70253264	ZAPATA DARIO													L					25-14	1	$67,620	$10,900	EPS010	1	$67,620	$2,800	CCF04	1	$67,620	$2,800	14-7	1	$67,620	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,500
629	CC	70253264	ZAPATA DARIO									X									25-14	29	$1,851,932	$296,400	EPS010	29	$1,851,932	$74,100	CCF04	29	$1,851,932	$74,100	14-7	29	$1,851,932	4.350%	$80,600	29	$0	$0	Si	$525,200

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)																							**$9,114,362**	**$1,458,500**			**$9,114,362**	**$364,800**			**$9,114,362**	**$364,800**			**$9,114,362**		**$390,000**		**$0**	**$0**		**$2,578,100**
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							**$3,357,074**	**$537,200**			**$3,357,074**	**$134,300**			**$3,357,074**	**$134,300**			**$3,357,074**		**$146,100**		**$0**	**$0**		**$951,900**
630	CC	71394583	CANO FREDY									X									25-14	30	$3,357,074	$537,200	EPS005	30	$3,357,074	$134,300	CCF04	30	$3,357,074	$134,300	14-7	30	$3,357,074	4.350%	$146,100	30	$0	$0	Si	$951,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							**$5,757,288**	**$921,300**			**$5,757,288**	**$230,500**			**$5,757,288**	**$230,500**			**$5,757,288**		**$243,900**		**$0**	**$0**		**$1,626,200**
631	CC	1007242278	ARANGO CRISTIAN												L						230201	1	$58,017	$9,300	EPS037	1	$58,017	$2,400	CCF04	1	$58,017	$2,400	14-7	1	$58,017	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,100
632	CC	1007242278	ARANGO CRISTIAN									X									230201	29	$2,701,430	$432,300	EPS037	29	$2,701,430	$108,100	CCF04	29	$2,701,430	$108,100	14-7	29	$2,701,430	4.350%	$117,600	29	$0	$0	Si	$766,100
633	CC	70326644	LONDOÑO MIGUEL									X									25-14	29	$2,902,984	$464,500	EPS010	29	$2,902,984	$116,200	CCF04	29	$2,902,984	$116,200	14-7	29	$2,902,984	4.350%	$126,300	29	$0	$0	Si	$823,200
634	CC	70326644	LONDOÑO MIGUEL												L						25-14	1	$94,857	$15,200	EPS010	1	$94,857	$3,800	CCF04	1	$94,857	$3,800	14-7	1	$94,857	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,800
Total **Afiliados(320)**																							$1,152,857,566	$188,063,200			$1,200,847,698	$66,148,500			$1,201,419,069	$47,719,100			$1,200,847,698		$58,543,100		$211,288,895	$10,566,800		$371,040,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890906388	0	PROCOPAL S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43A 19 17 PISO 5	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1499249989	9486238328	E	2025/05/22	2025/05/22	BANCOLOMBIA	0	$371,040,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				310	$188,063,200	$0	$0	$188,063,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$11,688,800	$0	$0	$11,688,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	150	$95,413,800	$0	$0	$95,413,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	74	$33,192,000	$0	$0	$33,192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	67	$47,768,600	$0	$0	$47,768,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				320	$58,543,100	$0	$0	$58,543,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	320	$58,543,100	$0	$0	$58,543,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				318	$47,719,100	$0	$0	$47,719,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	316	$46,787,500	$0	$0	$46,787,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$931,600	$0	$0	$931,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				320	$66,148,500	$0	$0	$66,148,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$74,700	$0	$0	$74,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$183,000	$0	$0	$183,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	215	$50,055,400	$0	$0	$50,055,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$369,800	$0	$0	$369,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$410,000	$0	$0	$410,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	$5,855,000	$0	$0	$5,855,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$235,500	$0	$0	$235,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	$5,317,600	$0	$0	$5,317,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$3,187,800	$0	$0	$3,187,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$459,700	$0	$0	$459,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$6,340,000	$0	$0	$6,340,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$6,340,000	$0	$0	$6,340,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$4,226,800	$0	$0	$4,226,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$4,226,800	$0	$0	$4,226,800
TOTAL				**320**	**$371,040,700**	**$0**	**$0**	**$371,040,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1478632478	9485937845	Y	2025/05/19	2025/05/13	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO GP FLANCES (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1036600579	ARANGO JOHN																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827374	8	CONSORCIO GP FLANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GP FLANCES	CR 43 A 19 17 PISO 5	FLANDES-TOLIMA	4441188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1478632478	9485937845	Y	2025/05/19	2025/05/13	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1065815261		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HERRERA JAIMES CARMEN ROCIO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1		V	$ 2.060.000	230301		16 %	$ 81.588	$ 13.100	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 81.588	$ 3.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 81.588	$ 0	CCF03	4 %	$ 68.666	$ 2.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		V	$ 2.060.000	230301		16 %	$ 81.588	$ 13.100	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 81.588	$ 3.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 81.588	$ 0	CCF03	4 %	$ 68.666	$ 2.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28		V	$ 2.060.000	230301		16 %	$ 2.241.371	$ 358.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.241.371	$ 89.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.241.371	$ 156.000	CCF03	4 %	$ 2.241.371	$ 89.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 384.900	$ 0	$ 0	$ 96.300	$ 156.000	$ 95.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 77140142		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GUERRERO GIL JESUS ENRIQUE	20001000 - 20	000000005	CESAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 116.733	$ 18.700	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 116.733	$ 4.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 116.733	$ 0	CCF15	4 %	$ 84.000	$ 3.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 116.733	$ 18.700	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 116.733	$ 4.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 116.733	$ 0	CCF15	4 %	$ 84.000	$ 3.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 3.024.000	$ 483.900	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 3.024.000	$ 121.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.024.000	$ 210.500	CCF15	4 %	$ 3.024.000	$ 121.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACESAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 521.300	$ 0	$ 0	$ 130.400	$ 210.500	$ 127.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98614371		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GRACIANO USUGA CARLOS MARIO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1		V	$ 2.000.000	231001		16 %	$ 96.127	$ 15.400	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 96.127	$ 3.900	$ 0	14-25		0,000 %	$ 96.127	$ 0	CCF03	4 %	$ 66.666	$ 2.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		V	$ 2.000.000	231001		16 %	$ 96.127	$ 15.400	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 96.127	$ 3.900	$ 0	14-25		0,000 %	$ 96.127	$ 0	CCF03	4 %	$ 66.666	$ 2.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28		V	$ 2.000.000	231001		16 %	$ 2.553.261	$ 408.600	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.553.261	$ 102.200	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.553.261	$ 177.800	CCF03	4 %	$ 2.553.261	$ 102.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 439.400	$ 0	$ 0	$ 110.000	$ 177.800	$ 107.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 834.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1106895020		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ PRECIADO JUAN SEBASTIAN	73001000 - 73	000000005	TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 1.620.000	231001		16 %	$ 2.126.544	$ 340.300	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 2.126.544	$ 85.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.126.544	$ 148.100	CCF50	4 %	$ 2.126.544	$ 85.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO TOLIMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 340.300	$ 0	$ 0	$ 85.100	$ 148.100	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 658.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98380560		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORAL MESIAS LUIS FABIAN	20001000 - 20	000000005	CESAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1			V	$ 3.130.000	25-14		16 %	$ 148.431	$ 23.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 148.431	$ 6.000	$ 0	14-25		0,000 %	$ 148.431	$ 0	CCF15	4 %	$ 104.333	$ 4.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 3.130.000	25-14		16 %	$ 148.431	$ 23.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 148.431	$ 6.000	$ 0	14-25		0,000 %	$ 148.431	$ 0	CCF15	4 %	$ 104.333	$ 4.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28			V	$ 3.130.000	25-14		16 %	$ 3.749.196	$ 599.900	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.749.196	$ 150.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.749.196	$ 261.000	CCF15	4 %	$ 3.749.196	$ 150.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFACESAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 647.500	$ 0	$ 0	$ 162.000	$ 261.000	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.228.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98497121		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORREA GALEANO JESUS MARIA	5240000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1		V	$ 2.070.000	25-14		16 %	$ 102.024	$ 16.400	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 102.024	$ 4.100	$ 0	14-25		0,000 %	$ 102.024	$ 0	CCF03	4 %	$ 69.000	$ 2.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		V	$ 2.070.000	25-14		16 %	$ 102.024	$ 16.400	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 102.024	$ 4.100	$ 0	14-25		0,000 %	$ 102.024	$ 0	CCF03	4 %	$ 69.000	$ 2.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28		V	$ 2.070.000	25-14		16 %	$ 2.547.000	$ 407.600	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.547.000	$ 101.900	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.547.000	$ 177.300	CCF03	4 %	$ 2.547.000	$ 101.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 440.400	$ 0	$ 0	$ 110.100	$ 177.300	$ 107.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 835.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11220679		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PRADA SABOGAL JOHN JAIRO	73001000 - 73	000000005	TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			V	$ 2.000.000	230301		16 %	$ 2.818.841	$ 451.100	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 2.818.841	$ 112.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.818.841	$ 196.200	CCF50	4 %	$ 2.818.841	$ 112.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO TOLIMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 451.100	$ 0	$ 0	$ 112.800	$ 196.200	$ 112.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 872.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71643474		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PINEDA BEDOYA ORLEY DE JESUS	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1			F	$ 11.770.000	25-14		16 %	$ 392.333	$ 62.800	$ 2.000	$ 2.000	EPS010		4 %	$ 392.333	$ 15.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 392.333	$ 0	CCF03	4 %	$ 392.333	$ 15.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			F	$ 11.770.000	25-14		16 %	$ 392.333	$ 62.800	$ 2.000	$ 2.000	EPS010		4 %	$ 392.333	$ 15.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 392.333	$ 0	CCF03	4 %	$ 392.333	$ 15.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	28	28	28	28			F	$ 11.770.000	25-14		16 %	$ 10.985.333	$ 1.757.700	$ 55.000	$ 55.000	EPS010		4 %	$ 10.985.333	$ 439.500	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 10.985.333	$ 764.600	CCF03	4 %	$ 10.985.333	$ 439.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.883.300	$ 59.000	$ 59.000	$ 470.900	$ 764.600	$ 470.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.707.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98524053		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RESTREPO ARREDONDO JORGE WILSON	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.000.000	230301		16 %	$ 98.386	$ 15.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 98.386	$ 4.000	$ 0	14-25		0,000 %	$ 98.386	$ 0	CCF03	4 %	$ 66.666	$ 2.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.000.000	230301		16 %	$ 98.386	$ 15.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 98.386	$ 4.000	$ 0	14-25		0,000 %	$ 98.386	$ 0	CCF03	4 %	$ 66.666	$ 2.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28			V	$ 2.000.000	230301		16 %	$ 2.389.131	$ 382.300	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.389.131	$ 95.600	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.389.131	$ 166.300	CCF03	4 %	$ 2.389.131	$ 95.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 413.900	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 166.300	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020416659		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MIRANDA USUGA LEONARDO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1			V	$ 3.650.000	230301		16 %	$ 129.765	$ 20.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 129.765	$ 5.200	$ 0	14-25		0,000 %	$ 129.765	$ 0	CCF03	4 %	$ 121.666	$ 4.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 3.650.000	230301		16 %	$ 129.765	$ 20.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 129.765	$ 5.200	$ 0	14-25		0,000 %	$ 129.765	$ 0	CCF03	4 %	$ 121.666	$ 4.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28			V	$ 3.650.000	230301		16 %	$ 3.591.813	$ 574.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.591.813	$ 143.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.591.813	$ 250.000	CCF03	4 %	$ 3.591.813	$ 143.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 616.300	$ 0	$ 0	$ 154.100	$ 250.000	$ 153.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.173.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001968814		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ JIMENEZ JORGE LUIS	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	2	2	2	2		V	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 132.629	$ 21.300	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 132.629	$ 5.400	$ 0	14-25		0,000 %	$ 132.629	$ 0	CCF03	4 %	$ 94.900	$ 3.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		V	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 66.314	$ 10.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 66.314	$ 2.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 66.314	$ 0	CCF03	4 %	$ 47.450	$ 1.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		V	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 66.314	$ 10.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 66.314	$ 2.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 66.314	$ 0	CCF03	4 %	$ 47.450	$ 1.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		V	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 66.314	$ 10.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 66.314	$ 2.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 66.314	$ 0	CCF03	4 %	$ 47.450	$ 1.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	25	25	25	25		V	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.462.183	$ 234.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.462.183	$ 58.500	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.462.183	$ 101.800	CCF03	4 %	$ 1.462.183	$ 58.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 287.400	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 101.800	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 76312109		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MUÑOZ RICARDO ALBERTO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	2	2	2	2		F	$ 11.760.000	231001		16 %	$ 784.000	$ 125.500	$ 4.000	$ 4.000	EPS010		4 %	$ 784.000	$ 31.400	$ 0	14-25		0,000 %	$ 784.000	$ 0	CCF03	4 %	$ 784.000	$ 31.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	2	2	2	2		F	$ 11.760.000	231001		16 %	$ 784.000	$ 125.500	$ 4.000	$ 4.000	EPS010		4 %	$ 784.000	$ 31.400	$ 0	14-25		0,000 %	$ 784.000	$ 0	CCF03	4 %	$ 784.000	$ 31.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		F	$ 11.760.000	231001		16 %	$ 392.000	$ 62.800	$ 2.000	$ 2.000	EPS010		4 %	$ 392.000	$ 15.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 392.000	$ 0	CCF03	4 %	$ 392.000	$ 15.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		F	$ 11.760.000	231001		16 %	$ 392.000	$ 62.800	$ 2.000	$ 2.000	EPS010		4 %	$ 392.000	$ 15.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 392.000	$ 0	CCF03	4 %	$ 392.000	$ 15.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1		F	$ 11.760.000	231001		16 %	$ 392.000	$ 62.800	$ 2.000	$ 2.000	EPS010		4 %	$ 392.000	$ 15.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 392.000	$ 0	CCF03	4 %	$ 392.000	$ 15.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	23	23	23	23		F	$ 11.760.000	231001		16 %	$ 9.016.000	$ 1.442.600	$ 45.100	$ 45.100	EPS010		4 %	$ 9.016.000	$ 360.700	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 9.016.000	$ 627.600	CCF03	4 %	$ 9.016.000	$ 360.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.882.000	$ 59.100	$ 59.100	$ 470.600	$ 627.600	$ 470.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.569.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93453874		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SALCEDO OVIEDO JOSE SERAFIN	73001000 - 73	000000005	TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	231001		16 %	$ 117.854	$ 18.900	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 117.854	$ 4.800	$ 0	14-25		0,000 %	$ 117.854	$ 0	CCF50	4 %	$ 84.000	$ 3.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	231001		16 %	$ 117.854	$ 18.900	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 117.854	$ 4.800	$ 0	14-25		0,000 %	$ 117.854	$ 0	CCF50	4 %	$ 84.000	$ 3.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
									X						0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	231001		16 %	$ 117.854	$ 18.900	$ 0	$ 0	EPS037		0 %	$ 117.854	$ 0	$ 0	14-25		0,000 %	$ 117.854	$ 0	CCF50	0 %	$ 117.854	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	27	27	27	27			V	$ 2.520.000	231001		16 %	$ 2.805.783	$ 449.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 2.805.783	$ 112.300	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.805.783	$ 195.300	CCF50	4 %	$ 2.805.783	$ 112.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO TOLIMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 505.700	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 195.300	$ 119.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 942.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1105678184		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OVIEDO SANCHEZ JOEL	73001000 - 73	000000005	TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		V	$ 2.520.000	231001		16 %	$ 3.670.435	$ 587.300	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 3.670.435	$ 146.900	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.670.435	$ 255.500	CCF50	4 %	$ 3.670.435	$ 146.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO TOLIMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 587.300	$ 0	$ 0	$ 146.900	$ 255.500	$ 146.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.136.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15404771		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ARANGO MORALES GUSTAVO ENRIQUE	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	1	1	1	1			V	$ 4.000.000	25-14		16 %	$ 158.917	$ 25.500	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 158.917	$ 6.400	$ 0	14-25		0,000 %	$ 158.917	$ 0	CCF03	4 %	$ 133.333	$ 5.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 4.000.000	25-14		16 %	$ 158.917	$ 25.500	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 158.917	$ 6.400	$ 0	14-25		0,000 %	$ 158.917	$ 0	CCF03	4 %	$ 133.333	$ 5.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	28	28	28	28			V	$ 4.000.000	25-14		16 %	$ 3.936.233	$ 629.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.936.233	$ 157.500	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.936.233	$ 274.000	CCF03	4 %	$ 3.936.233	$ 157.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 680.800	$ 0	$ 0	$ 170.300	$ 274.000	$ 168.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.293.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11205344		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DEVIA VERA DIEGO ARMANDO	11001000 - 11	000000005	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	1	1	1	1			V	$ 2.000.000	230301		16 %	$ 89.300	$ 14.300	$ 0	$ 0	EPS002		0 %	$ 89.300	$ 0	$ 0	14-25		0,000 %	$ 89.300	$ 0	CCF24	0 %	$ 89.300	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	29	29	29	29			V	$ 2.000.000	230301		16 %	$ 2.676.087	$ 428.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.676.087	$ 107.100	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.676.087	$ 186.300	CCF24	4 %	$ 2.676.087	$ 107.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 442.500	$ 0	$ 0	$ 107.100	$ 186.300	$ 107.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71601871		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					CALLE CASTRO NIXON ARTURO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	0	1	1	1			V	$ 5.190.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 175.808	$ 7.100	$ 0	14-25		0,000 %	$ 175.808	$ 0	CCF03	4 %	$ 173.000	$ 7.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	0	1	1	1			V	$ 5.190.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 175.808	$ 7.100	$ 0	14-25		0,000 %	$ 175.808	$ 0	CCF03	4 %	$ 173.000	$ 7.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	0	28	28	28			V	$ 5.190.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 4.844.000	$ 193.800	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 4.844.000	$ 337.200	CCF03	4 %	$ 4.844.000	$ 193.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 337.200	$ 207.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 753.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11438343		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GARIBELLO MUÑOZ ARNULFO ELIECER	73001000 - 73	000000005	TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	3	3	3	3			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 321.191	$ 51.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 321.191	$ 12.900	$ 0	14-25		0,000 %	$ 321.191	$ 0	CCF50	4 %	$ 252.000	$ 10.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	2	2	2	2			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 214.127	$ 34.300	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 214.127	$ 8.600	$ 0	14-25		0,000 %	$ 214.127	$ 0	CCF50	4 %	$ 168.000	$ 6.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 107.064	$ 17.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 107.064	$ 4.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 107.064	$ 0	CCF50	4 %	$ 84.000	$ 3.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 107.064	$ 17.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 107.064	$ 4.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 107.064	$ 0	CCF50	4 %	$ 84.000	$ 3.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 107.064	$ 17.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 107.064	$ 4.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 107.064	$ 0	CCF50	4 %	$ 84.000	$ 3.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	22	22	22	22			V	$ 2.520.000	230301		16 %	$ 2.722.239	$ 435.600	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 2.722.239	$ 108.900	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.722.239	$ 189.500	CCF50	4 %	$ 2.722.239	$ 108.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO TOLIMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 572.900	$ 0	$ 0	$ 143.300	$ 189.500	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.041.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 8328334		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OSORIO LOPEZ ONEDIS ENRIQUE	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												L			0	2	2	2	2			V	$ 2.210.000	25-14		16 %	$ 212.673	$ 34.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 212.673	$ 8.600	$ 0	14-25		0,000 %	$ 212.673	$ 0	CCF03	4 %	$ 147.333	$ 5.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	2	2	2	2			V	$ 2.210.000	25-14		16 %	$ 212.673	$ 34.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 212.673	$ 8.600	$ 0	14-25		0,000 %	$ 212.673	$ 0	CCF03	4 %	$ 147.333	$ 5.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.210.000	25-14		16 %	$ 106.336	$ 17.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 106.336	$ 4.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 106.336	$ 0	CCF03	4 %	$ 73.666	$ 3.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.210.000	25-14		16 %	$ 106.336	$ 17.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 106.336	$ 4.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 106.336	$ 0	CCF03	4 %	$ 73.666	$ 3.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												L			0	1	1	1	1			V	$ 2.210.000	25-14		16 %	$ 106.336	$ 17.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 106.336	$ 4.300	$ 0	14-25		0,000 %	$ 106.336	$ 0	CCF03	4 %	$ 73.666	$ 3.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	23	23	23	23			V	$ 2.210.000	25-14		16 %	$ 2.730.471	$ 436.900	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 2.730.471	$ 109.300	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.730.471	$ 190.100	CCF03	4 %	$ 2.730.471	$ 109.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 556.400	$ 0	$ 0	$ 139.400	$ 190.100	$ 130.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.016.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-16, 03:59:48 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77671119

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GISAICO SAS				
Documento	NI 890917464	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4033730		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	348
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BLAIR LLORENS JUAN DIEGO	**Identificación**	CC 70126654		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1109265839		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PARRA ARAGON DUVAN CAMILO	73001000 - 73	000000005	TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 2.000.000	230301		16 %	$ 2.921.739	$ 467.500	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 2.921.739	$ 116.900	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.921.739	$ 203.400	CCF50	4 %	$ 2.921.739	$ 116.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO TOLIMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 467.500	$ 0	$ 0	$ 116.900	$ 203.400	$ 116.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 904.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901926544	8	VETRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 72 A 120 - 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3143810088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1452118286	9485614324	E	2025/05/13	2025/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$6,458,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1233888957	BALLEN AVILA WILMAR ROYEIRO	X																	23030 1	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	Si
2	CC	1193557138	BENITO BERNAL DANIEL CAMILO	X								X									23030 1	27	EPS005	27	CCF34	27	14-4	27	6.960%	27	Si
3	CC	1193557138	BENITO BERNAL DANIEL CAMILO										X								23030 1	2	EPS005	2	CCF34	2	14-4	2	0.000%	2	Si
4	CC	1007540299	BLANCO CARO JOHAN STEBAN	X																	23030 1	30	EPS005	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	Si
5	CC	3837071	BOHORQUEZ TOVAR JENIS JOSE	X																	23100 1	30	EPS005	30	CCF07	30	14-4	30	6.960%	30	Si
6	CC	1121934460	MONROY GUTIERREZ EDWIN CRISTOBAL	X																	23030 1	30	EPS017	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	Si
7	CC	1122918805	MUÑOZ CANO NICOL AGARTH	X																	25-14	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	Si
8	CC	52347284	PARRA CURTIDOR MARIA EDILMA	X																	23030 1	20	EPS002	20	CCF34	20	14-4	20	6.960%	20	Si
9	CC	52347284	PARRA CURTIDOR MARIA EDILMA										X								23030 1	10	EPS002	10	CCF34	10	14-4	10	0.000%	10	Si
10	CC	1070615528	PATIÑO OSPINA JHOAN ESTEBAN	X																	23030 1	30	EPS037	30	CCF24	30	14-4	30	6.960%	30	Si
11	CC	9237709	PEDROZO MARTINEZ JORMAN	X																	23030 1	30	EPS037	30	CCF07	30	14-4	30	6.960%	30	Si
12	CC	1093748759	SANDOVAL OROZCO IDA LISBETH	X	X																25-14	28	EPS037	28	CCF36	28	14-4	28	6.960%	28	Si
13	CC	79907187	SINDICUE PEREZ MIGUEL ANTONIO	X																	25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	Si
14	CC	1110500878	VIÑA HERNANDEZ JEFFERSON ARNULFO	X	X																23020 1	1	EPS005	1	CCF50	1	14-4	1	6.960%	1	Si
Total			**Afiliados(12)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,371,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,187,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,947,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,436,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$1,436,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$825,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$420,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$114,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	$112,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$1,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$825,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$289,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$236,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$228,500
TOTAL				**12**	**$6,458,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79562452	0	BERNAL RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS	cr 15 7-16	ORTEGA-TOLIMA	3102187450	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	06566763	9485636953	E	2025/05/14	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,866,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124244418	ALFONSO YEISON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1022402430	BERNAL CESAR		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF46	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
3	CC	79607792	BERNAL JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	5967620	GUTIERREZ ROMULO	X																		0	$0	$0	EPS041	27	$1,281,150	$51,300	CCF46	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0	Si	$191,800
5	CC	1007396429	GUZMAN JUNIOR	X																	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF46	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
6	CC	1124243399	MENDEZ CRISTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	11223265	RAMIREZ SANTIAGO		X																230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF46	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
8	CC	1105691488	RICO JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	17690446	SANCHEZ JANCY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1106633202	TAPIERO ARLEHISON		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF46	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
11	CC	1106486177	VARON YEYSSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF46	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	93020611	VIUCHE WINER	X																	230201	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF46	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
Total	**Afiliados(12)**																						$11,862,500	$1,898,400			$13,143,650	$526,300			$13,143,650	$526,300			$13,143,650	$915,300		$0	$0		$3,866,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79562452	0	BERNAL RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS	cr 15 7-16	ORTEGA-TOLIMA	3102187450	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	06566763	9485636953	E	2025/05/14	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,866,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,898,400	$0	$0	$1,898,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,283,300	$0	$0	$1,283,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$387,300	$0	$0	$387,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$915,300	$0	$0	$915,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$915,300	$0	$0	$915,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$526,300	$0	$0	$526,300
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	12	$526,300	$0	$0	$526,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$526,300	$0	$0	$526,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$262,200	$0	$0	$262,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$165,300	$0	$0	$165,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$41,800	$0	$0	$41,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				12	$3,866,300	$0	$0	$3,866,300

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que PROCOPAL S.A. identificado(a) con NI 890906388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA MARIA SALDARRIAGA CALDERON identificado(a) con CC 1020448032

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	28									X									4%	$227,200
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	1													L					4%	$8,200
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	1													X					4%	$8,200
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	28									X									16%	$908,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													L					16%	$32,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													X					16%	$32,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	28									X										$28,400
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	1													L						$1,100
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	1													X						$1,100
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	28									X										$28,400
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	1													L						$1,100
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	1													X						$1,100
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	28									X									0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	1													L					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	1													X					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	28									X									0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	1													L					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	1													X					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	28									X									6.96%	$395,200
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													L					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													X					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	28									X									4%	$227,200
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													L					4%	$8,200

Certificados de Aportes

Se certifica que PROCOPAL S.A. identificado(a) con NI 890906388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ANDRES BEDOYA GARCIA identificado(a) con CC 1036629241

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	29									X									4%	$347,600
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	1													L					4%	$12,000
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	29									X									16%	$1,390,200
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													L					16%	$48,000
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	29									X										$43,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	1													L						$1,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	29									X										$43,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	1													L						$1,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	29									X									0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	1													L					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	29									X									0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	1													L					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	29									X									6.96%	$604,700
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													L					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	29									X									4%	$347,600
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	1													L					4%	$12,000

Este certificado se expide el día 2025-05-22 a las 09:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que PROCOPAL S.A. identificado(a) con NI 890906388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAIDA IVONNE BERRIO CORREA identificado(a) con CC 44006112

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	7													X					4%	$35,400
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	23												X						4%	$116,200
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	7													X					16%	$141,400
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	23												X						16%	$464,500
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	7													X						$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	23												X							$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	7													X						$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	23												X							$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	7													X					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	23												X						0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	7													X					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	23												X						0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	7													X					0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	23												X						0%	$0
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	7													X					4%	$35,400
9486238328	1499249989	E	2025-05-22	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	23												X						4%	$116,200

Este certificado se expide el día 2025-05-22 a las 09:15.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 32019990

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900369518
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	Teléfono	4130803
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7971087972**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	abril / 2025	Periodo Cotización Salud	mayo / 2025
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2025/05/09
Número Autorización	1470292353		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	GLORIA JENNY DE FATIMA	Apellidos	MEJIA SIERRA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	32019990
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 2.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD		Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Dias	30	IBC	$ 6.359.500
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 254.400
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 254.400**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Dias	30	IBC	$ 6.359.500
Clase de Riesgo	III	Tarifa	2,436 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 155.000**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 6.359.500	$ 254.400

TOTAL PAGADO:	**$ 663.800**

Planilla Pagada

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-09, 09:09:13 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77829334

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

PAGADA 2025-05-08 15:49:39.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EVALTEC SAS				
Documento	NI 800237326	**Dirección**	CL 32E #80 B - 117 BELEN MIRAVALLE		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4119954		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	24
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TOBON GARCIA JORGE ALBERTO	**Identificación**	CC 8405479		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 8405479		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					TOBON GARCIA JORGE ALBERTO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30		F	$ 9.337.328	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 9.337.328	$ 373.500	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 9.337.328	$ 406.200	CCF03	4 %	$ 9.337.328	$ 373.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.500	$ 406.200	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.153.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-09, 09:10:27 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77829334

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

PAGADA 2025-05-08 15:49:39.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EVALTEC SAS				
Documento	NI 800237326	**Dirección**	CL 32E #80 B - 117 BELEN MIRAVALLE		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4119954		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	24
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TOBON GARCIA JORGE ALBERTO	**Identificación**	CC 8405479		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43459697		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MARTINEZ NARANJO STELLA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 9.337.328	25-14		16 %	$ 9.337.328	$ 1.494.000	$ 46.700	$ 46.700	EPS010		4 %	$ 9.337.328	$ 373.500	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 9.337.328	$ 406.200	CCF03	4 %	$ 9.337.328	$ 373.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.494.000	$ 46.700	$ 46.700	$ 373.500	$ 406.200	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.740.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Certificación
Bancaria

Fecha: 05 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa CONSORCIO GP FLANDES, identificado con NIT No 901827374 denominada Consorcio GP FLANDES, a la fecha 12/05/2024, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	24500017192	06/04/2024 (M/D/A)	ACTIVA	PUERTA DEL RIO	245

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) 000014103635267 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO GP FLANDES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 43 A # 19 - 17 P 5 ED BLOCK CENTRO EMPRESARIAL

42. Correo electrónico: procopal@procopal.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 4 1 1 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 4 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 04 - 30 / 16 : 04: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ DE MESA GUTIERREZ JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) **000014103635267 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 4 2 3	
81. Hasta	2 0 2 7 0 3 2 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) **000014103635267 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 3 5 3 0 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ DE MESA	GUTIERREZ	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 1 2 6 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BLAIR	LLORENS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141036352671

(415)7707212489984(8020) **000014103635267 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 7 3 7 4	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 0 6 3 8 8	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROCOPAL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 4 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 1 7 4 6 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GISAICO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 4 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 9 8 1 4 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ORGANIZACION EDYFICA S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 4 2 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FO-DGN-MC - 2025 - 03
Bogotá D.C., 15 de Abril de 2025

Doctor
JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
Representante Legal
CONSORCIO GP FLANDES
Carrera 43 A No. 19 - 17 P 5 ED BLOCK CENTRO EMPRESARIAL
Medellin - Antioquia

ASUNTO : PATRIMONIO AUTÓNOMO 319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES

INFORME MENSUAL - MARZO DE 2025

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Marzo de 2025 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FICS
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Factura(s) Comisión Fiduciaria
- Comunicación Beneficiario Final
- Lineas de Atencion Telefonicas

Así mismo, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual establece que todos los clientes vinculados a entidades financieras actualizaran anualmente su información, de manera atenta solicitamos la actualización de los datos e información básica, según el formato denominado "Solicitud de Vinculación y Actualización Persona Jurídica/Natural" y anexos allí requeridos.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 8 cuentas de orden o 25 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Defensor Del Consumidor Financiero

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas:
• defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co
• Lzorro@bancodeoccidente.com.co
• defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

JOAQUIN FERNANDO CANABAL RODRIGUEZ
Director Regional Monteria
jcanabal@fiduoccidente.com.co

WILFRIDO BENEDETTY PICO
Ejecutivo de Gestion de Nego
wbenedetty@fiduoccidente.com.co

Wilfrido Enrique Enrique Benedetty Pico
Joaquin Fernando Canabal Rodriguez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Marzo de 2025

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$9,184,429,628.26
INGRESOS		$14,483.42
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$14,483.42	
EGRESOS		$1,148,283,982.97
Pago con aportes	$1,148,283,982.97	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$8,037,247,856.87
TOTAL ACTIVO		$8,037,247,856.87
DISPONIBLE		$8,037,247,856.87
Saldo cuentas bancarias	$8,034,900,325.19	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$2,347,531.68	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0.00
CUENTAS POR COBRAR		$0.00
OTROS ACTIVOS		$0.00
TOTAL PASIVO		$1,087,728.16
Rendimientos acreedores fiduciarios	$717,228.16	
Ing. recibidos para Revisoría Fiscal	$370,500.00	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$8,036,160,128.71

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES
Periodo : 2025 - Marzo

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	9,187,779,930.86	5,324,869.69	-1,155,856,943.68	8,037,247,856.87
11	EFECTIVO	9,185,446,882.60	5,310,007.16	-1,155,856,564.57	8,034,900,325.19
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	9,185,446,882.60	5,310,007.16	-1,155,856,564.57	8,034,900,325.19
111505	BANCOS NACIONALES	9,185,446,882.60	5,310,007.16	-1,155,856,564.57	8,034,900,325.19
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	9,185,446,882.60	5,310,007.16	-1,155,856,564.57	8,034,900,325.19
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,333,048.26	14,862.53	-379.11	2,347,531.68
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	2,333,048.26	14,862.53	-379.11	2,347,531.68
130205	EMISORES NACIONALES	2,333,048.26	14,862.53	-379.11	2,347,531.68
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDIN	2,333,048.26	14,862.53	-379.11	2,347,531.68
2	PASIVO	-3,350,302.60	1,158,496,329.00	-1,156,233,754.56	-1,087,728.16
25	CUENTAS POR PAGAR	-779,495.40	1,151,703,242.80	-1,151,640,975.56	-717,228.16
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	1,150,923,747.40	-1,150,923,747.40	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	1,150,923,747.40	-1,150,923,747.40	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	1,150,923,747.40	-1,150,923,747.40	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-779,495.40	779,495.40	-717,228.16	-717,228.16
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-779,495.40	779,495.40	-717,228.16	-717,228.16
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-779,495.40	779,495.40	-717,228.16	-717,228.16
29	OTROS PASIVOS	-2,570,807.20	6,793,086.20	-4,592,779.00	-370,500.00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-2,570,807.20	6,793,086.20	-4,592,779.00	-370,500.00
290795	OTROS	-2,570,807.20	6,793,086.20	-4,592,779.00	-370,500.00
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-2,570,807.20	6,793,086.20	-4,592,779.00	-370,500.00
3	PATRIMONIO	-9,184,429,628.26	1,391,159,331.00	-242,889,831.45	-8,036,160,128.71
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-9,184,417,080.00	1,391,159,331.00	-242,875,348.03	-8,036,133,097.03
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
350505	APORTES EN DINERO	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
35050501	APORTES EN DINERO	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	2,117,839,836.00	1,391,159,331.00	-242,875,348.03	3,266,123,818.97
351005	RESTITUCIONES DE APORTES	0.00	242,629,499.00	-242,629,499.00	0.00
35100501	DEVOLUCION DE APORTES	0.00	242,629,499.00	-242,629,499.00	0.00
351010	PAGOS A TERCEROS	2,117,839,836.00	1,148,529,832.00	-245,849.03	3,266,123,818.97
35101001	PAGO CON APORTES	2,117,839,836.00	1,148,529,832.00	-245,849.03	3,266,123,818.97
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-12,548.26	0.00	-14,483.42	-27,031.68
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-12,548.26	0.00	-14,483.42	-27,031.68
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-12,548.26	0.00	-14,483.42	-27,031.68
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-12,548.26	0.00	-14,483.42	-27,031.68
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-12,548.26	0.00	-14,862.53	-27,410.79
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	-12,548.26	0.00	-14,862.53	-27,410.79
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-12,548.26	0.00	-14,862.53	-27,410.79
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-12,548.26	0.00	-14,862.53	-27,410.79
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-12,548.26	0.00	-14,862.53	-27,410.79
5	GASTOS	12,548.26	4,612,099.70	-4,597,237.17	27,410.79
51	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	4,597,616.28	-4,597,237.17	379.11
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	0.00	379.11	0.00	379.11
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	0.00	379.11	0.00	379.11
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (	0.00	379.11	0.00	379.11
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	4,597,237.17	-4,597,237.17	0.00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	4,597,237.17	-4,597,237.17	0.00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	4,597,237.17	-4,597,237.17	0.00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	12,548.26	14,483.42	0.00	27,031.68
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	12,548.26	14,483.42	0.00	27,031.68
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	12,548.26	14,483.42	0.00	27,031.68
59050001	GANANCIAS	12,548.26	14,483.42	0.00	27,031.68

FO-DGN-MC - 2025 - 04
Bogotá D.C., 15 de Mayo de 2025

Doctor
JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA
Representante Legal
CONSORCIO GP FLANDES
Carrera 43 A No. 19 - 17 P 5 ED BLOCK CENTRO EMPRESARIAL
Medellin - Antioquia

ASUNTO : PATRIMONIO AUTÓNOMO 319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES

INFORME MENSUAL - ABRIL DE 2025

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 30 de Abril de 2025 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FICS
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Factura(s) Comisión Fiduciaria
- Comunicación Beneficiario Final
- Lineas de Atencion Telefonicas

Así mismo, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual establece que todos los clientes vinculados a entidades financieras actualizaran anualmente su información, de manera atenta solicitamos la actualización de los datos e información básica, según el formato denominado "Solicitud de Vinculación y Actualización Persona Jurídica/Natural" y anexos allí requeridos.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 8 cuentas de orden o 25 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Defensor Del Consumidor Financiero

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas:
• defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co
• Lzorro@bancodeoccidente.com.co
• defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

JOAQUIN FERNANDO CANABAL RODRIGUEZ
Director Regional Monteria
jcanabal@fiduoccidente.com.co

WILFRIDO BENEDETTY PICO
Ejecutivo de Gestion de Nego
wbenedetty@fiduoccidente.com.co

Wilfrido Enrique Enrique Benedetty Pico
Joaquin Fernando Canabal Rodriguez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 30 de Abril de 2025

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$8,036,160,128.71
INGRESOS		$3,708.15
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$3,708.15	
EGRESOS		$2,664,579,415.07
Pago con aportes	$2,664,579,415.07	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$5,372,564,557.78
TOTAL ACTIVO		$5,372,564,557.78
DISPONIBLE		$5,372,564,557.78
Saldo cuentas bancarias	$5,372,163,317.95	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$401,239.83	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0.00
CUENTAS POR COBRAR		$0.00
OTROS ACTIVOS		$0.00
TOTAL PASIVO		$980,135.99
Rendimientos acreedores fiduciarios	$609,635.99	
Ing. recibidos para Revisoría Fiscal	$370,500.00	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$5,371,584,421.79

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
319067 - FID 319067 CONSORCIO GP FLANDES
Periodo : 2025 - Abril

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	8,037,247,856.87	13,221,399.14	-2,677,904,698.23	5,372,564,557.78
11	EFECTIVO	8,034,900,325.19	13,217,690.99	-2,675,954,698.23	5,372,163,317.95
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	8,034,900,325.19	13,217,690.99	-2,675,954,698.23	5,372,163,317.95
111505	BANCOS NACIONALES	8,034,900,325.19	13,217,690.99	-2,675,954,698.23	5,372,163,317.95
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	8,034,900,325.19	13,217,690.99	-2,675,954,698.23	5,372,163,317.95
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,347,531.68	3,708.15	-1,950,000.00	401,239.83
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	2,347,531.68	3,708.15	-1,950,000.00	401,239.83
130205	EMISORES NACIONALES	2,347,531.68	3,708.15	-1,950,000.00	401,239.83
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDIN	2,347,531.68	3,708.15	-1,950,000.00	401,239.83
2	PASIVO	-1,087,728.16	2,676,605,856.32	-2,676,498,264.15	-980,135.99
25	CUENTAS POR PAGAR	-717,228.16	2,665,947,801.32	-2,665,840,209.15	-609,635.99
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	2,665,230,573.16	-2,665,230,573.16	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	2,665,230,573.16	-2,665,230,573.16	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	2,665,230,573.16	-2,665,230,573.16	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-717,228.16	717,228.16	-609,635.99	-609,635.99
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-717,228.16	717,228.16	-609,635.99	-609,635.99
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-717,228.16	717,228.16	-609,635.99	-609,635.99
29	OTROS PASIVOS	-370,500.00	10,658,055.00	-10,658,055.00	-370,500.00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-370,500.00	10,658,055.00	-10,658,055.00	-370,500.00
290795	OTROS	-370,500.00	10,658,055.00	-10,658,055.00	-370,500.00
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-370,500.00	10,658,055.00	-10,658,055.00	-370,500.00
3	PATRIMONIO	-8,036,160,128.71	2,664,579,415.07	-3,708.15	-5,371,584,421.79
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-8,036,133,097.03	2,664,579,415.07	0.00	-5,371,553,681.96
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
350505	APORTES EN DINERO	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
35050501	APORTES EN DINERO	-11,302,256,916.00	0.00	0.00	-11,302,256,916.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	3,266,123,818.97	2,664,579,415.07	0.00	5,930,703,234.04
351010	PAGOS A TERCEROS	3,266,123,818.97	2,664,579,415.07	0.00	5,930,703,234.04
35101001	PAGO CON APORTES	3,266,123,818.97	2,664,579,415.07	0.00	5,930,703,234.04
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-27,031.68	0.00	-3,708.15	-30,739.83
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-27,031.68	0.00	-3,708.15	-30,739.83
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-27,031.68	0.00	-3,708.15	-30,739.83
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-27,031.68	0.00	-3,708.15	-30,739.83
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-27,410.79	0.00	-3,708.15	-31,118.94
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	-27,410.79	0.00	-3,708.15	-31,118.94
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-27,410.79	0.00	-3,708.15	-31,118.94
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-27,410.79	0.00	-3,708.15	-31,118.94
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-27,410.79	0.00	-3,708.15	-31,118.94
5	GASTOS	27,410.79	10,664,882.22	-10,661,174.07	31,118.94
51	GASTOS DE OPERACIONES	379.11	10,661,174.07	-10,661,174.07	379.11
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	379.11	0.00	0.00	379.11
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	379.11	0.00	0.00	379.11
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (	379.11	0.00	0.00	379.11
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	10,661,174.07	-10,661,174.07	0.00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	10,661,174.07	-10,661,174.07	0.00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	10,661,174.07	-10,661,174.07	0.00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	27,031.68	3,708.15	0.00	30,739.83
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	27,031.68	3,708.15	0.00	30,739.83
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	27,031.68	3,708.15	0.00	30,739.83
59050001	GANANCIAS	27,031.68	3,708.15	0.00	30,739.83

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**Nro. Producto Destino**	221800287
Nro. Identificación	899999059	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	408912830	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/05/09	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/05/09	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$609,635.99	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	408A3512512900RR
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIE
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/05/09
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	62
Nro. Control	TBE12900AP	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

15.2288.04-187

Medellín, 17 de Julio de 2025

Señores:
CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES Dra.
ROSELLY PAJARO
Representante legal Bogotá

Referencia: **Contrato No. 23001258 H4 2023:**
Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).

Asunto: Oficio Remisorio de Acta de obra No 5.

Cordial saludo,


Por medio de la presente me permito enviar corte de obra No. 5 con sus respectivos soportes y documentos requeridos para la presente entrega.

Cordialmente,



RICARDO ALBERTO MUÑOZ
Director de Obra
Consorcio GP Flandes

Anexo 1: Lista de documentos para actas parciales de cobro que se envían en un solo PDF.
Anexo 2: Certificados de Pagos de seguridad social y parafiscales con certificaciones de contador y revisores fiscales en PDF.
Anexo 3: Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios en Excel

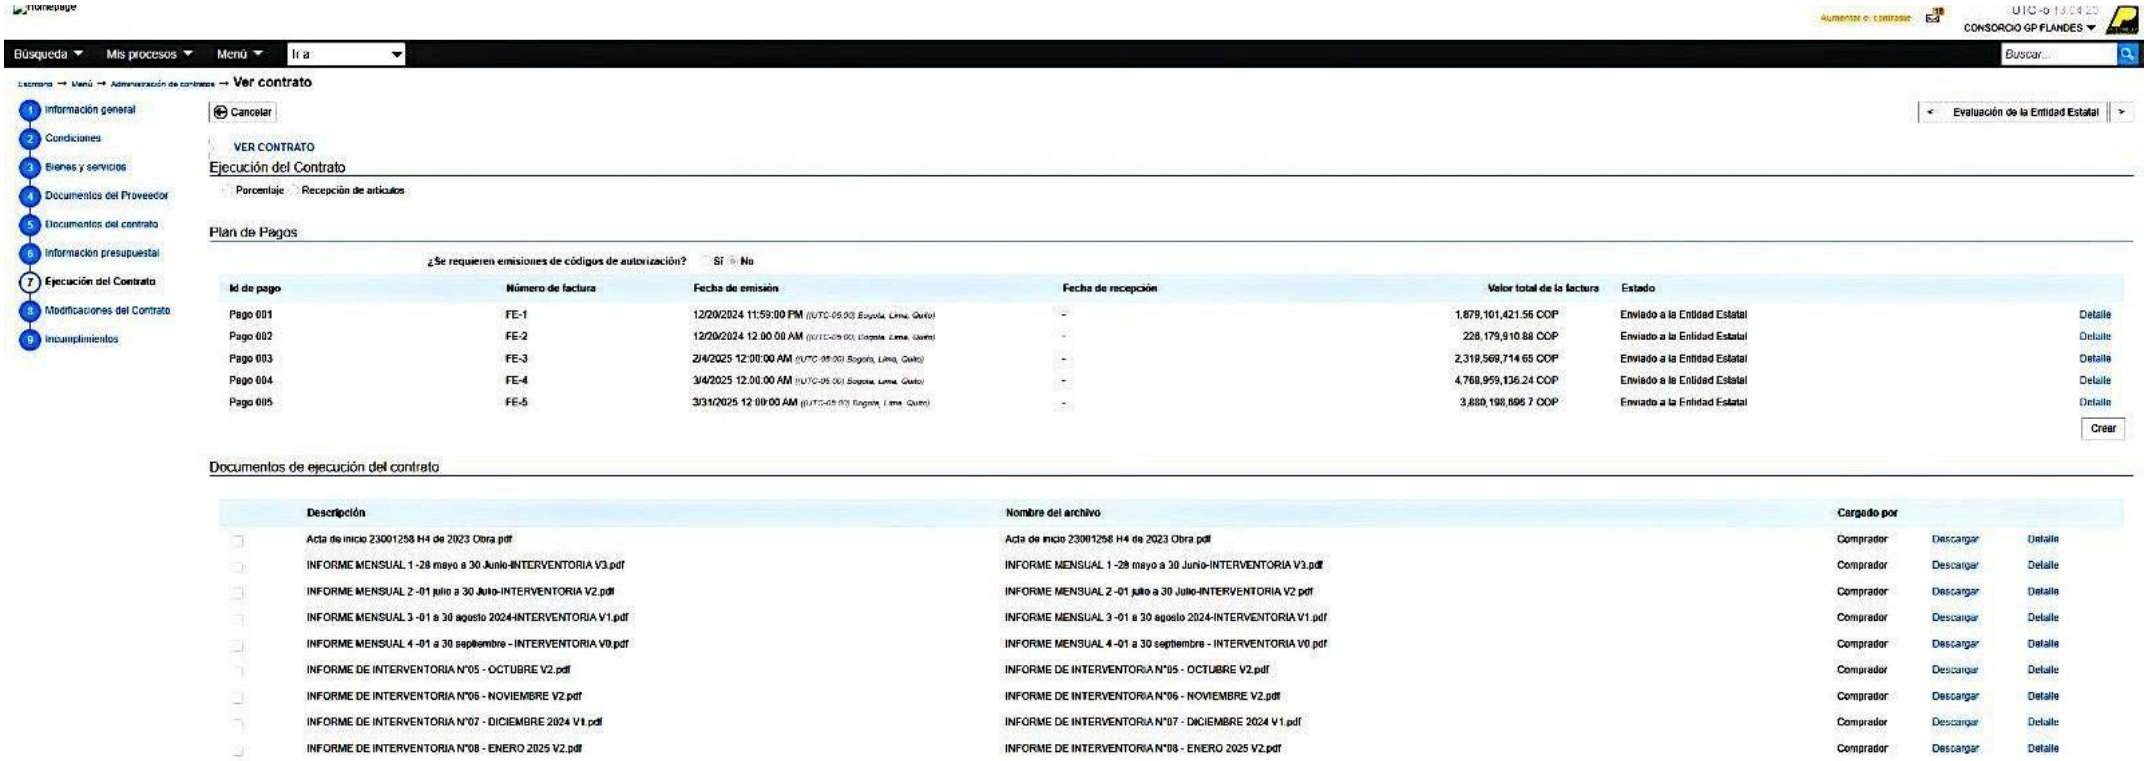

Powered by CamScanner

3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	PREACTA 05 25/04/2025

RESUMEN CANTIDADES DE EXCAVACION EN ZONAS DE SEGURIDAD

UBICACIÓN	OBSERV.	ABSC. INI	ABSC. FINAL	LONGITUD	COSTADO	VOLUMEN
PISTA	COMPLETO	K0+101,00	K1+120,00	1019,00	DERECHO	5890,61
PISTA	COMPLETO	K0+0,00	K1+180,00	1180,00	IZQUIERDO	12411,70
RESA SUR	COMPLETO	-K0+60,00	K0+0,00	60,00	SUR	529,49
ALPHA	COMPLETO	K0+75,30	K0+200,00	124,70	DERECHO	506,31
ALPHA	COMPLETO	K0+36,52	K0+200,00	163,48	IZQUIERDO	700,90
BRAVO	COMPLETO	K0+35,61	K0+180,00	144,39	DERECHO	519,83
BRAVO	COMPLETO	K0+62,81	K0+180,00	117,19	IZQUIERDO	365,17
					TOTAL	**20G24,01**

3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	PREACTA 05 25/04/2025

TABLA DE CALCULO DE CANTIDADES DE EXCAVACIÓN EN ZONAS DE SEGURIDAD

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO DERECHO K0+101 - K0+400

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+101.000	19,77	0,00	0,00
0+110.000	18,97	174,33	174,33
0+120.000	16,32	176,46	350,79
0+130.000	14,37	153,47	504,26
0+140.000	12,63	135,02	639,28
0+150.000	10,51	115,72	755,00
0+160.000	8,51	95,12	850,12
0+170.000	6,51	75,09	925,21
0+180.000	5,55	60,27	985,47
0+190.000	4,12	48,35	1033,82
0+200.000	4,58	43,50	1077,32
0+210.000	4,04	43,08	1120,40
0+220.000	4,41	42,25	1162,65
0+230.000	4,34	43,73	1206,38
0+240.000	4,56	44,47	1250,86
0+250.000	4,53	45,42	1296,28
0+260.000	5,00	47,63	1343,91
0+270.000	6,87	59,37	1403,28
0+280.000	6,69	67,81	1471,09
0+290.000	6,19	64,42	1535,51
0+300.000	6,30	62,45	1597,96
0+310.000	5,71	60,04	1658,00
0+320.000	6,86	62,85	1720,85
0+330.000	6,60	67,29	1788,14
0+340.000	6,72	66,60	1854,74
0+350.000	6,45	65,84	1920,59
0+360.000	5,25	58,48	1979,07
0+370.000	5,69	54,67	2033,75
0+380.000	5,46	55,74	2089,49
0+390.000	6,37	59,17	2148,66
0+400.000	5,37	58,70	2207,36

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO DERECHO K0+410 - K0+710

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+410.000	3,61	44,90	2252,26
0+420.000	4,14	38,78	2291,04
0+430.000	4,50	43,24	2334,29
0+440.000	4,25	43,79	2378,07
0+450.000	4,67	44,62	2422,69
0+460.000	5,37	50,19	2472,88
0+470.000	5,80	55,83	2528,71
0+480.000	5,78	57,90	2586,61
0+490.000	6,35	60,66	2647,27
0+500.000	6,17	62,60	2709,87
0+510.000	5,65	59,14	2769,01
0+520.000	5,94	57,99	2827,00
0+530.000	6,30	61,19	2888,19
0+540.000	7,04	66,69	2954,88
0+550.000	6,34	66,94	3021,82
0+560.000	5,46	59,02	3080,83
0+570.000	5,61	55,34	3136,17
0+580.000	5,90	57,53	3193,70
0+590.000	5,71	58,04	3251,74
0+600.000	5,52	56,15	3307,90
0+610.000	5,49	55,04	3362,94
0+620.000	6,21	58,49	3421,43
0+630.000	6,54	63,74	3485,17
0+640.000	6,20	63,69	3548,87
0+650.000	6,15	61,77	3610,64
0+660.000	5,64	58,96	3669,60
0+670.000	5,21	54,24	3723,84
0+680.000	4,21	47,09	3770,93
0+690.000	5,90	50,56	3821,49
0+700.000	5,55	57,24	3878,73
0+710.000	5,99	57,70	3936,43

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente INTERVENTORIA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO H. ALZATE G. CONTRATISTA	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente Jose Daniel Villegas Buriago. CONTRATISTA
CONSORCIO GP FLANDES	

3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	PREACTA 05 25/04/2025

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO DERECHO K0+720 - K1+063.8G

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+720.000	6,00	59,95	3996,38
0+730.000	6,81	64,00	4060,38
0+740.000	7,54	71,72	4132,10
0+750.000	8,02	77,79	4209,89
0+760.000	7,44	77,30	4287,19
0+770.000	8,90	81,68	4368,87
0+780.000	9,38	91,37	4460,25
0+790.000	10,44	99,11	4559,35
0+800.000	10,09	102,66	4662,01
0+810.000	9,36	97,22	4759,23
0+820.000	9,72	95,36	4854,59
0+830.000	9,28	94,99	4949,58
0+840.000	8,09	86,87	5036,45
0+850.000	7,82	79,56	5116,01
0+860.000	7,38	75,99	5192,00
0+870.000	7,23	73,03	5265,03
0+880.000	5,70	64,64	5329,67
0+890.000	4,30	50,01	5379,68
0+900.000	3,40	38,48	5418,17
0+910.000	3,57	34,82	5452,99
0+920.000	3,81	36,91	5489,90
0+930.000	3,11	34,64	5524,54
0+940.000	1,91	25,14	5549,68
0+950.000	1,61	17,62	5567,30
0+960.000	1,32	14,67	5581,97
0+970.000	1,32	13,23	5595,20
0+980.000	0,82	10,74	5605,94
0+990.000	1,71	12,67	5618,61
1+000.000	1,90	18,05	5636,66
1+010.000	3,25	25,76	5662,43
1+020.000	3,66	34,58	5697,01
1+030.000	2,61	31,39	5728,40
1+040.000	3,03	28,19	5756,59
1+050.000	2,82	35,58	5792,17
1+060.000	1,11	21,53	5813,70
1+063.891	1,40	4,89	5818,59

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO DERECHO K1+0G2,56 - K1+120

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
1+092.564	0,49	0,00	0,00
1+100.000	0,50	3,68	3,68
1+110.000	2,08	36,22	39,90
1+120.000	3,67	32,12	72,02

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente	INTERVENTORIA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES			
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	ALVARO H. ALZATE G. CONTRATISTA	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente	José Daniel Villegas Buriago. CONTRATISTA
CONSORCIO GP FLANDES			

CONSORCIO GP FLANDES

Rehabilitación Aeropuerto Santiago Vila de Flandes

3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	PREACTA 05 25/04/2025

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO IZQUIERDA K0+000 - K0+350.000

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+000.000	27,11	0,00	0,00
0+010.000	22,68	248,95	248,95
0+020.000	16,74	197,12	446,08
0+030.000	15,41	160,75	606,83
0+040.000	16,69	160,50	767,33
0+050.000	18,77	177,32	944,65
0+060.000	18,55	186,63	1131,29
0+070.000	19,88	192,16	1323,45
0+080.000	20,57	202,27	1525,71
0+090.000	22,12	213,46	1739,18
0+100.000	20,70	214,09	1953,27
0+110.000	20,05	203,75	2157,01
0+120.000	19,04	195,44	2352,45
0+130.000	18,50	187,69	2540,14
0+140.000	16,39	174,46	2714,60
0+150.000	16,05	162,21	2876,82
0+160.000	11,94	139,92	3016,74
0+170.000	9,82	108,77	3125,50
0+180.000	9,21	95,15	3220,66
0+190.000	8,13	86,72	3307,38
0+200.000	7,71	79,22	3386,60
0+210.000	8,42	80,68	3467,29
0+220.000	7,86	81,42	3548,71
0+230.000	7,54	77,00	3625,71
0+240.000	8,34	79,38	3705,09
0+250.000	8,55	84,45	3789,54
0+260.000	10,05	93,04	3882,58
0+270.000	9,79	99,23	3981,81
0+280.000	9,55	96,73	4078,54
0+290.000	9,62	95,88	4174,42
0+300.000	9,21	94,14	4268,56
0+310.000	10,29	97,50	4366,06
0+320.000	12,31	113,02	4479,08
0+330.000	13,15	127,29	4606,37
0+340.000	15,11	141,30	4747,66
0+350.000	15,47	152,90	4900,56

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO IZQUIERDA K0+360 - K0+688.63

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+360.000	10,95	132,09	5032,65
0+370.000	9,98	104,67	5137,32
0+380.000	13,35	116,66	5253,98
0+390.000	12,65	130,00	5383,98
0+400.000	11,48	120,64	5504,62
0+410.000	11,55	115,14	5619,76
0+420.000	11,81	116,79	5736,55
0+430.000	12,99	124,00	5860,55
0+440.000	13,65	133,24	5993,79
0+450.000	11,44	125,46	6119,25
0+460.000	9,07	102,54	6221,79
0+470.000	7,68	83,75	6305,55
0+480.000	10,56	91,23	6396,78
0+490.000	10,83	106,95	6503,73
0+500.000	9,16	99,96	6603,69
0+510.000	10,09	96,27	6699,96
0+520.000	9,94	100,15	6800,11
0+530.000	12,05	109,96	6910,07
0+540.000	12,61	123,29	7033,36
0+550.000	14,73	136,69	7170,05
0+560.000	15,39	150,59	7320,63
0+570.000	16,87	161,31	7481,94
0+580.000	14,71	157,91	7639,85
0+590.000	12,26	134,85	7774,71
0+600.000	12,16	122,12	7896,83
0+610.000	11,87	120,14	8016,97
0+620.000	12,52	121,96	8138,93
0+630.000	11,65	120,86	8259,78
0+640.000	12,31	119,80	8379,58
0+650.000	13,32	128,17	8507,75
0+660.000	13,05	131,86	8639,61
0+670.000	13,74	125,01	8764,62
0+680.000	14,66	132,25	8896,87
0+688.632	12,57	117,53	9014,40

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO CRUZ AVILA
CARGO: Topógrafo
MAT:01-3466

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEROVIAS FLANDES

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G.
CARGO: Topógrafo
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: José Daniel Villegas Buriago.
CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA

CONSORCIO GP FLANDES

3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	PREACTA 05 25/04/2025

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO IZQUIERDA K0+727.11 - K1+006.G8

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+727.110	8,49	0,00	0,00
0+730.000	9,39	25,83	25,83
0+740.000	9,79	123,35	149,18
0+750.000	14,31	117,09	266,27
0+760.000	14,29	143,02	409,29
0+770.000	14,84	145,65	554,94
0+780.000	18,57	167,03	721,97
0+790.000	19,55	190,62	912,58
0+800.000	18,52	190,39	1102,97
0+810.000	18,69	186,06	1289,03
0+820.000	17,40	180,46	1469,49
0+830.000	11,97	146,86	1616,35
0+840.000	10,45	112,08	1728,43
0+850.000	10,00	102,24	1830,68
0+860.000	9,64	98,22	1928,90
0+870.000	8,82	92,33	2021,23
0+880.000	7,89	83,58	2104,81
0+890.000	8,74	83,18	2188,00
0+900.000	6,82	77,84	2265,83
0+910.000	6,76	67,91	2333,74
0+920.000	5,33	60,44	2394,18
0+930.000	4,82	50,75	2444,93
0+940.000	4,10	44,59	2489,52
0+950.000	4,27	41,86	2531,39
0+960.000	3,31	37,92	2569,31
0+970.000	3,25	32,82	2602,13
0+980.000	3,32	32,86	2634,99
0+990.000	3,28	31,90	2666,88
1+000.000	3,56	23,27	2690,15
1+006.977	4,12	15,21	2705,36

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD
PISTA COSTADO IZQUIERDA K1+051.04 - K1+180.00

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
1+051.038	3,12	0,00	0,00
1+060.000	4,30	33,09	33,09
1+070.000	6,77	55,39	88,49
1+080.000	7,11	69,34	157,83
1+090.000	5,88	64,88	222,71
1+100.000	5,18	55,27	277,98
1+110.000	6,59	58,82	336,80
1+120.000	5,30	59,43	396,23
1+130.000	5,19	52,48	448,71
1+140.000	4,74	49,68	498,39
1+150.000	4,42	45,80	544,19
1+160.000	5,19	48,04	592,23
1+170.000	5,03	51,09	643,32
1+180.000	4,70	48,62	691,94

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente INTERVENTORIA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO H. ALZATE G. CONTRATISTA	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente Jose Daniel Villegas Buriago. CONTRATISTA
CONSORCIO GP FLANDES	

3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	PREACTA 05 25/04/2025

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD

RESA SUR K0-060.00 - K0+000.00

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
-60	4,61	0,00	0,00
-50	3,10	38,57	38,57
-40	1,92	25,12	63,70
-30	3,25	25,87	89,57
-20	8,86	60,59	150,16
-10	19,39	141,26	291,41
0+000.000	28,23	238,08	529,49

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD

CALLE ALPHA COSTADO DERECHO K0+075.301 - K0+200.000

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+075.301	4,06	0,00	0,00
0+080.000	4,66	20,48	20,48
0+090.000	5,34	49,97	70,45
0+100.000	5,74	55,40	125,85
0+110.000	4,61	51,75	177,60
0+120.000	5,02	48,15	225,75
0+130.000	4,19	46,06	271,81
0+140.000	3,61	39,00	310,81
0+150.000	3,59	35,97	346,78
0+160.000	3,26	34,21	380,99
0+170.000	2,93	30,94	411,93
0+180.000	2,62	27,79	439,72
0+190.000	3,64	31,30	471,02
0+200.000	3,42	35,28	506,31
0+200.000	3,42	0,00	506,31

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD

CALLE ALPHA COSTADO IZQUIERDO K0+036.523 - K0+200.000

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+036.523	3,58	0,00	0,00
0+040.000	3,74	12,72	12,72
0+050.000	4,66	41,98	54,70
0+060.000	4,00	43,26	97,96
0+070.000	4,89	44,42	142,38
0+080.000	5,23	50,61	192,99
0+090.000	1,60	34,16	227,15
0+100.000	5,70	36,49	263,63
0+110.000	5,34	55,21	318,84
0+120.000	4,93	51,34	370,18
0+130.000	4,54	47,35	417,53
0+140.000	4,42	44,81	462,33
0+150.000	4,44	44,27	506,60
0+160.000	4,24	43,39	549,99
0+170.000	3,88	40,61	590,60
0+180.000	3,63	37,53	628,14
0+190.000	3,58	36,03	664,17
0+200.000	3,77	36,73	700,90
0+200.000	3,77	0,00	700,90

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente **INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO H. ALZATE G. **CONTRATISTA**	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente Jose Daniel Villegas Buriago. **CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	PREACTA 05 25/04/2025

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD

CALLE BRAVO COSTADO IZQUIERDO K0+062.813 - K0+180.000

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+062.813	3,05	0,00	0,00
0+070.000	3,13	22,22	22,22
0+080.000	3,97	35,48	57,69
0+090.000	4,40	41,83	99,52
0+100.000	2,07	32,33	131,85
0+110.000	3,35	27,06	158,91
0+120.000	3,40	33,74	192,66
0+130.000	2,73	30,68	223,34
0+140.000	2,99	28,63	251,97
0+150.000	2,97	29,81	281,78
0+160.000	2,87	29,19	310,97
0+170.000	2,85	28,59	339,56
0+180.000	2,27	25,61	365,17
0+180.000	2,27	0,00	365,17

EXCAVACION ZONAS DE SEGURIDAD

CALLE BRAVO COSTADO DERECHO K0+035.607- K0+180.000

ABSCISA	AREA CORTE	VOLUMEN CORTE	CORTE ACUMULADO
0+035.607	2,45	0,00	0,00
0+040.000	2,94	11,84	11,84
0+050.000	2,95	29,47	41,30
0+060.000	3,41	31,84	73,14
0+070.000	4,15	37,81	110,94
0+080.000	4,60	43,74	154,68
0+090.000	4,42	45,09	199,77
0+100.000	4,78	45,99	245,76
0+110.000	2,85	38,16	283,92
0+120.000	4,21	35,29	319,22
0+130.000	4,06	41,33	360,55
0+140.000	3,25	36,53	397,08
0+150.000	3,31	32,80	429,88
0+160.000	2,99	31,51	461,39
0+170.000	2,81	29,01	490,39
0+180.000	3,08	29,43	519,83

FIRMA: NOMBRE: ALVARO CRUZ AVILA CARGO: Topógrafo MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente **INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo **CONTRATISTA**	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buriago. CARGO: Ingeniero Residente **CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

RESUMEN DE CANTIDADES DE AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD

UBICACIÓN	OBSERV.	ABSC. INI	ABSC. FINAL	LONGITUD	COSTADO	VOLUMEN
PISTA	COMPLETO	K0+101,00	K1+684,89	1583,89	DERECHO	23950,34
PISTA	COMPLETO	K0+0,00	K1+684,89	1684,89	IZQUIERDO	24677,89
ALPHA	COMPLETO	K0+75,30	K0+200,00	124,70	DERECHO	342,92
ALPHA	COMPLETO	K0+36,52	K0+200,00	163,48	IZQUIERDO	449,56
BRAVO	COMPLETO	K0+35,61	K0+180,00	144,39	DERECHO	397,08
BRAVO	COMPLETO	K0+62,81	K0+180,00	117,19	IZQUIERDO	322,26
					TOTAL	50140,05

DESCUENTO ACUMULADO ACTA 4	G6G2,10
TOTAL A COBRAR ACTA 5	40447,G5

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	PREACTA 05 25/04/2025

TABLAS DE CALCULO DE VOLÚMENES DE AFIRMADO PARA ZONAS DE SEGURIDAD

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO DERECHO
K0+101 - K0+430

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+101.000	15,40	0,00	0,00
0+110.000	15,40	138,60	138,60
0+120.000	15,40	154,00	292,60
0+130.000	15,40	154,00	446,60
0+140.000	15,40	154,00	600,60
0+150.000	15,40	154,00	754,60
0+160.000	15,40	154,00	908,60
0+170.000	15,40	154,00	1062,60
0+180.000	15,40	154,00	1216,60
0+190.000	15,40	154,00	1370,60
0+200.000	15,40	154,00	1524,60
0+210.000	15,40	154,00	1678,60
0+220.000	15,40	154,00	1832,60
0+230.000	15,40	154,00	1986,60
0+240.000	15,40	154,00	2140,60
0+250.000	15,40	154,00	2294,60
0+260.000	15,40	154,00	2448,60
0+270.000	15,40	154,00	2602,60
0+280.000	15,40	154,00	2756,60
0+290.000	15,40	154,00	2910,60
0+300.000	15,40	154,00	3064,60
0+310.000	15,40	154,00	3218,60
0+320.000	15,40	154,00	3372,60
0+330.000	15,40	154,00	3526,60
0+340.000	15,40	154,00	3680,60
0+350.000	15,40	154,00	3834,60
0+360.000	15,40	154,00	3988,60
0+370.000	15,40	154,00	4142,60
0+380.000	15,40	154,00	4296,60
0+390.000	15,40	154,00	4450,60
0+400.000	15,40	154,00	4604,60
0+410.000	15,40	154,00	4758,60
0+420.000	15,40	154,00	4912,60
0+430.000	15,40	154,00	5066,60

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO DERECHO
K0+440 - K0+780

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+440.000	15,40	154,00	5220,60
0+450.000	15,40	154,00	5374,60
0+460.000	15,40	154,00	5528,60
0+470.000	15,40	154,00	5682,60
0+480.000	15,40	154,00	5836,60
0+490.000	15,40	154,00	5990,60
0+500.000	15,40	154,00	6144,60
0+510.000	15,40	154,00	6298,60
0+520.000	15,40	154,00	6452,60
0+530.000	15,40	154,00	6606,60
0+540.000	15,40	154,00	6760,60
0+550.000	15,40	154,00	6914,60
0+560.000	15,40	154,00	7068,60
0+570.000	15,40	154,00	7222,60
0+580.000	15,40	154,00	7376,60
0+590.000	15,40	154,00	7530,60
0+600.000	15,40	154,00	7684,60
0+610.000	15,40	154,00	7838,60
0+620.000	15,40	154,00	7992,60
0+630.000	15,40	154,00	8146,60
0+640.000	15,40	154,00	8300,60
0+650.000	15,40	154,00	8454,60
0+660.000	15,40	154,00	8608,60
0+670.000	15,40	154,00	8762,60
0+680.000	15,40	154,00	8916,60
0+690.000	15,40	154,00	9070,60
0+700.000	15,40	154,00	9224,60
0+710.000	15,40	154,00	9378,60
0+720.000	15,40	154,00	9532,60
0+730.000	15,40	154,00	9686,60
0+740.000	15,40	154,00	9840,60
0+750.000	15,40	154,00	9994,60
0+760.000	15,40	154,00	10148,60
0+770.000	15,40	154,00	10302,60
0+780.000	15,40	154,00	10456,60

FIRMA: NOMBRE: ALVARO CRUZ AVILA CARGO: Topógrafo MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente INTERVENTORIA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G. CARGO: Topógrafo CONTRATISTA	FIRMA: NOMBRE: José Daniel Villegas Buriago. CARGO: Ingeniero Residente CONTRATISTA
CONSORCIO GP FLANDES	

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	PREACTA 05 25/04/2025

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO DERECHO
K0+7G0 - K1+063.8G1

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+790.000	15,40	154,00	10610,60
0+800.000	15,40	154,00	10764,60
0+810.000	15,40	154,00	10918,60
0+820.000	15,40	154,00	11072,60
0+830.000	15,40	154,00	11226,60
0+840.000	15,40	154,00	11380,60
0+850.000	15,40	154,00	11534,60
0+860.000	15,40	154,00	11688,60
0+870.000	15,40	154,00	11842,60
0+880.000	15,40	154,00	11996,60
0+890.000	15,40	154,00	12150,60
0+900.000	15,40	154,00	12304,60
0+910.000	15,40	154,00	12458,60
0+920.000	15,40	154,00	12612,60
0+930.000	15,40	154,00	12766,60
0+940.000	15,40	154,00	12920,60
0+950.000	15,40	154,00	13074,60
0+960.000	15,40	154,00	13228,60
0+970.000	15,40	154,00	13382,60
0+980.000	15,40	154,00	13536,60
0+990.000	15,40	154,00	13690,60
1+000.000	15,40	154,00	13844,60
1+010.000	15,40	154,00	13998,60
1+020.000	15,40	154,00	14152,60
1+030.000	15,40	154,00	14306,60
1+040.000	15,40	154,00	14460,60
1+050.000	15,40	154,00	14614,60
1+060.000	15,40	154,00	14768,60
1+063.891	15,40	59,92	14828,52

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO DERECHO
K1+0G2.564 - K1+440.000

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
1+092.564	15,40	0,00	0,00
1+100.000	15,40	114,51	114,51
1+110.000	15,40	154,00	268,51
1+120.000	15,40	154,00	422,51
1+130.000	15,40	154,00	576,51
1+140.000	15,40	154,00	730,51
1+150.000	15,40	154,00	884,51
1+160.000	15,40	154,00	1038,51
1+170.000	15,40	154,00	1192,51
1+180.000	15,40	154,00	1346,51
1+190.000	15,40	154,00	1500,51
1+200.000	15,40	154,00	1654,51
1+210.000	15,40	154,00	1808,51
1+220.000	15,40	154,00	1962,51
1+230.000	15,40	154,00	2116,51
1+240.000	15,40	154,00	2270,51
1+250.000	15,40	154,00	2424,51
1+260.000	15,40	154,00	2578,51
1+270.000	15,40	154,00	2732,51
1+280.000	15,40	154,00	2886,51
1+290.000	15,40	154,00	3040,51
1+300.000	15,40	154,00	3194,51
1+310.000	15,40	154,00	3348,51
1+320.000	15,40	154,00	3502,51
1+330.000	15,40	154,00	3656,51
1+340.000	15,40	154,00	3810,51
1+350.000	15,40	154,00	3964,51
1+360.000	15,40	154,00	4118,51
1+370.000	15,40	154,00	4272,51
1+380.000	15,40	154,00	4426,51
1+390.000	15,40	154,00	4580,51
1+400.000	15,40	154,00	4734,51
1+410.000	15,40	154,00	4888,51
1+420.000	15,40	154,00	5042,51
1+430.000	15,40	154,00	5196,51
1+440.000	15,40	154,00	5350,51

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466		FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente	
	CONSORCIO AEROVIAS FLANDES		INTERVENTORIA
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO H. ALZATE G.		FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente José Daniel Villegas Buitrago.	
CONTRATISTA			CONTRATISTA
	CONSORCIO GP FLANDES		

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	PREACTA 05 25/04/2025

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO DERECHO
K1+450.000 - K1+684.8G0

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
1+450.000	15,40	154,00	5504,51
1+460.000	15,40	154,00	5658,51
1+470.000	15,40	154,00	5812,51
1+480.000	15,40	154,00	5966,51
1+490.000	15,40	154,00	6120,51
1+500.000	15,40	154,00	6274,51
1+510.000	15,40	154,00	6428,51
1+520.000	15,40	154,00	6582,51
1+530.000	15,40	154,00	6736,51
1+540.000	15,40	154,00	6890,51
1+550.000	15,40	154,00	7044,51
1+560.000	15,40	154,00	7198,51
1+570.000	15,40	154,00	7352,51
1+580.000	15,40	154,00	7506,51
1+590.000	15,40	154,00	7660,51
1+600.000	15,40	154,00	7814,51
1+610.000	15,40	154,00	7968,51
1+620.000	15,40	154,00	8122,51
1+630.000	15,40	154,00	8276,51
1+640.000	15,40	154,00	8430,51
1+650.000	15,40	154,00	8584,51
1+660.000	15,40	154,00	8738,51
1+670.000	15,40	154,00	8892,51
1+680.000	15,40	154,00	9046,51
1+684.890	15,40	75,31	9121,82

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO IZQUIERDO
K0+000.000 - K0+350.000

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+000.000	15,40	0,00	0,00
0+010.000	15,40	154,00	154,00
0+020.000	15,40	154,00	308,00
0+030.000	15,40	154,00	462,00
0+040.000	15,40	154,00	616,00
0+050.000	15,40	154,00	770,00
0+060.000	15,40	154,00	924,00
0+070.000	15,40	154,00	1078,00
0+080.000	15,40	154,00	1232,00
0+090.000	15,40	154,00	1386,00
0+100.000	15,40	154,00	1540,00
0+110.000	15,40	154,00	1694,00
0+120.000	15,40	154,00	1848,00
0+130.000	15,40	154,00	2002,00
0+140.000	15,40	154,00	2156,00
0+150.000	15,40	154,00	2310,00
0+160.000	15,40	154,00	2464,00
0+170.000	15,40	154,00	2618,00
0+180.000	15,40	154,00	2772,00
0+190.000	15,40	154,00	2926,00
0+200.000	15,40	154,00	3080,00
0+210.000	15,40	154,00	3234,00
0+220.000	15,40	154,00	3388,00
0+230.000	15,40	154,00	3542,00
0+240.000	15,40	154,00	3696,00
0+250.000	15,40	154,00	3850,00
0+260.000	15,40	154,00	4004,00
0+270.000	15,40	154,00	4158,00
0+280.000	15,40	154,00	4312,00
0+290.000	15,40	154,00	4466,00
0+300.000	15,40	154,00	4620,00
0+310.000	15,40	154,00	4774,00
0+320.000	15,40	154,00	4928,00
0+330.000	15,40	154,00	5082,00
0+340.000	15,40	154,00	5236,00
0+350.000	15,40	154,00	5390,00

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO: Topógrafo
ALVARO CRUZ AVILA
MAT:01-3466

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEROVIAS FLANDES

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G.
CARGO: Topógrafo
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: Jose Daniel Villegas Buitrago.
CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA

CONSORCIO GP FLANDES

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	PREACTA 05 25/04/2025

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO IZQUIERDO
K0+360.000 - K0+688.632

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+360.000	15,40	154,00	5544,00
0+370.000	15,40	154,00	5698,00
0+380.000	15,40	154,00	5852,00
0+390.000	15,40	154,00	6006,00
0+400.000	15,40	154,00	6160,00
0+410.000	15,40	154,00	6314,00
0+420.000	15,40	154,00	6468,00
0+430.000	15,40	154,00	6622,00
0+440.000	15,40	154,00	6776,00
0+450.000	15,40	154,00	6930,00
0+460.000	15,40	154,00	7084,00
0+470.000	15,40	154,00	7238,00
0+480.000	15,40	154,00	7392,00
0+490.000	15,40	154,00	7546,00
0+500.000	15,40	154,00	7700,00
0+510.000	15,40	154,00	7854,00
0+520.000	15,40	154,00	8008,00
0+530.000	15,40	154,00	8162,00
0+540.000	15,40	154,00	8316,00
0+550.000	15,40	154,00	8470,00
0+560.000	15,40	154,00	8624,00
0+570.000	15,40	154,00	8778,00
0+580.000	15,40	154,00	8932,00
0+590.000	15,40	154,00	9086,00
0+600.000	15,40	154,00	9240,00
0+610.000	15,40	154,00	9394,00
0+620.000	15,40	154,00	9548,00
0+630.000	15,40	154,00	9702,00
0+640.000	15,40	154,00	9856,00
0+650.000	15,40	154,00	10010,00
0+660.000	15,40	154,00	10164,00
0+670.000	15,40	154,00	10318,00
0+680.000	15,40	154,00	10472,00
0+688.632	15,40	132,94	10604,94

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO IZQUIERDO
K0+727.110 - K1+006.G77

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+727.110	11,66	0,00	0,00
0+730.000	11,50	33,46	33,46
0+740.000	12,16	167,98	201,44
0+750.000	15,40	154,48	355,92
0+760.000	15,40	154,00	509,92
0+770.000	15,40	154,00	663,92
0+780.000	15,40	154,00	817,92
0+790.000	15,40	154,00	971,92
0+800.000	15,40	154,00	1125,92
0+810.000	15,40	154,00	1279,92
0+820.000	15,40	154,00	1433,92
0+830.000	15,40	154,00	1587,92
0+840.000	15,40	154,00	1741,92
0+850.000	15,40	154,00	1895,92
0+860.000	15,40	154,00	2049,92
0+870.000	15,40	154,00	2203,92
0+880.000	15,40	154,00	2357,92
0+890.000	15,40	154,00	2511,92
0+900.000	15,40	154,00	2665,92
0+910.000	15,40	154,00	2819,92
0+920.000	15,40	154,00	2973,92
0+930.000	15,40	154,00	3127,92
0+940.000	15,40	154,00	3281,92
0+950.000	15,40	154,00	3435,92
0+960.000	15,40	154,00	3589,92
0+970.000	15,40	154,00	3743,92
0+980.000	15,40	154,00	3897,92
0+990.000	14,50	151,45	4049,37
1+000.000	14,50	154,60	4203,97
1+006.977	15,40	107,66	4311,63

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO CRUZ AVILA
CARGO: Topógrafo
MAT:01-3466

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO: Ingeniero Residente
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEROVIAS FLANDES

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO H. ALZATE G.
CARGO: Topógrafo
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: José Daniel Villegas Buriago.
CARGO: Ingeniero Residente
CONTRATISTA

CONSORCIO GP FLANDES

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	PREACTA 05 25/04/2025

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO IZQUIERDO
K1+051.038 - K1+400.000

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
1+051.038	15,40	0,00	0,00
1+060.000	15,40	138,01	138,01
1+070.000	15,40	154,00	292,01
1+080.000	15,40	154,00	446,01
1+090.000	15,40	154,00	600,01
1+100.000	15,40	154,00	754,01
1+110.000	15,40	154,00	908,01
1+120.000	15,40	154,00	1062,01
1+130.000	15,40	154,00	1216,01
1+140.000	15,40	154,00	1370,01
1+150.000	15,40	154,00	1524,01
1+160.000	15,40	154,00	1678,01
1+170.000	15,40	154,00	1832,01
1+180.000	15,40	154,00	1986,01
1+190.000	15,40	154,00	2140,01
1+200.000	15,40	154,00	2294,01
1+210.000	15,40	154,00	2448,01
1+220.000	15,40	154,00	2602,01
1+230.000	15,40	154,00	2756,01
1+240.000	15,40	154,00	2910,01
1+250.000	15,40	154,00	3064,01
1+260.000	15,40	154,00	3218,01
1+270.000	15,40	154,00	3372,01
1+280.000	15,40	154,00	3526,01
1+290.000	15,40	154,00	3680,01
1+300.000	15,40	154,00	3834,01
1+310.000	15,40	154,00	3988,01
1+320.000	15,40	154,00	4142,01
1+330.000	15,40	154,00	4296,01
1+340.000	15,40	154,00	4450,01
1+350.000	15,40	154,00	4604,01
1+360.000	15,40	154,00	4758,01
1+370.000	15,40	154,00	4912,01
1+380.000	15,40	154,00	5066,01
1+390.000	15,40	154,00	5220,01
1+400.000	15,40	154,00	5374,01

LLENO AFIRMADO PISTA COSTADO IZQUIERDO
K1+410.000 - K1+684.8G0

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
1+410.000	15,40	154,00	5528,01
1+420.000	15,40	154,00	5682,01
1+430.000	15,40	154,00	5836,01
1+440.000	15,40	154,00	5990,01
1+450.000	15,40	154,00	6144,01
1+460.000	15,40	154,00	6298,01
1+470.000	15,40	154,00	6452,01
1+480.000	15,40	154,00	6606,01
1+490.000	15,40	154,00	6760,01
1+500.000	15,40	154,00	6914,01
1+510.000	15,40	154,00	7068,01
1+520.000	15,40	154,00	7222,01
1+530.000	15,40	154,00	7376,01
1+540.000	15,40	154,00	7530,01
1+550.000	15,40	154,00	7684,01
1+560.000	15,40	154,00	7838,01
1+570.000	15,40	154,00	7992,01
1+580.000	15,40	154,00	8146,01
1+590.000	15,40	154,00	8300,01
1+600.000	15,40	154,00	8454,01
1+610.000	15,40	154,00	8608,01
1+620.000	15,40	154,00	8762,01
1+630.000	15,40	154,00	8916,01
1+640.000	15,40	154,00	9070,01
1+650.000	15,40	154,00	9224,01
1+660.000	15,40	154,00	9378,01
1+670.000	15,40	154,00	9532,01
1+680.000	15,40	154,00	9686,01
1+684.890	15,40	75,31	9761,32

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente **INTERVENTORIA**
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO H. ALZATE G. **CONTRATISTA**	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente Jose Daniel Villegas Buriago. **CONTRATISTA**
CONSORCIO GP FLANDES	

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	PREACTA 05 25/04/2025

LLENO AFIRMADO ALPHA COSTADO DERECHO
K0+075.301- K0+200.000

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+075.301	2,75	0,00	0,00
0+080.000	2,75	12,92	12,92
0+090.000	2,75	27,50	40,42
0+100.000	2,75	27,50	67,92
0+110.000	2,75	27,50	95,42
0+120.000	2,75	27,50	122,92
0+130.000	2,75	27,50	150,42
0+140.000	2,75	27,50	177,92
0+150.000	2,75	27,50	205,42
0+160.000	2,75	27,50	232,92
0+170.000	2,75	27,50	260,42
0+180.000	2,75	27,50	287,92
0+190.000	2,75	27,50	315,42
0+200.000	2,75	27,50	342,92
0+200.000	2,75	0,00	342,92

LLENO AFIRMADO ALPHA COSTADO IZQUIERDO
K0+036.523- K0+200.000

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+036.523	2,75	0,00	0,00
0+040.000	2,75	9,56	9,56
0+050.000	2,75	27,50	37,06
0+060.000	2,75	27,50	64,56
0+070.000	2,75	27,50	92,06
0+080.000	2,75	27,50	119,56
0+090.000	2,75	27,50	147,06
0+100.000	2,75	27,50	174,56
0+110.000	2,75	27,50	202,06
0+120.000	2,75	27,50	229,56
0+130.000	2,75	27,50	257,06
0+140.000	2,75	27,50	284,56
0+150.000	2,75	27,50	312,06
0+160.000	2,75	27,50	339,56
0+170.000	2,75	27,50	367,06
0+180.000	2,75	27,50	394,56
0+190.000	2,75	27,50	422,06
0+200.000	2,75	27,50	449,56
0+200.000	2,75	0,00	449,56

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente INTERVENTORIA
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES	
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo ALVARO H. ALZATE G. CONTRATISTA	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente Jose Daniel Villegas Buriago. CONTRATISTA
CONSORCIO GP FLANDES	

3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	PREACTA 05 25/04/2025

LLENO AFIRMADO BRAVO COSTADO DERECHO
K0+035.607- K0+180.000

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+035.607	2,75	0,00	0,00
0+040.000	2,75	12,08	12,08
0+050.000	2,75	27,50	39,58
0+060.000	2,75	27,50	67,08
0+070.000	2,75	27,50	94,58
0+080.000	2,75	27,50	122,08
0+090.000	2,75	27,50	149,58
0+100.000	2,75	27,50	177,08
0+110.000	2,75	27,50	204,58
0+120.000	2,75	27,50	232,08
0+130.000	2,75	27,50	259,58
0+140.000	2,75	27,50	287,08
0+150.000	2,75	27,50	314,58
0+160.000	2,75	27,50	342,08
0+170.000	2,75	27,50	369,58
0+180.000	2,75	27,50	397,08

LLENO AFIRMADO BRAVO COSTADO IZQUIERDO
K0+062.813- K0+180.000

Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
0+062.813	2,75	0,00	0,00
0+070.000	2,75	19,76	19,76
0+080.000	2,75	27,50	47,26
0+090.000	2,75	27,50	74,76
0+100.000	2,75	27,50	102,26
0+110.000	2,75	27,50	129,76
0+120.000	2,75	27,50	157,26
0+130.000	2,75	27,50	184,76
0+140.000	2,75	27,50	212,26
0+150.000	2,75	27,50	239,76
0+160.000	2,75	27,50	267,26
0+170.000	2,75	27,50	294,76
0+180.000	2,75	27,50	322,26
0+180.000	2,75	0,00	322,26

FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	ALVARO CRUZ AVILA MAT:01-3466	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente	GAR
	CONSORCIO AEROVIAS FLANDES		INTERVENTORIA
FIRMA: NOMBRE: CARGO: Topógrafo	ALVARO H. ALZATE G.	FIRMA: NOMBRE: CARGO: Ingeniero Residente	VB Jose Daniel Villegas Buriago.
	CONTRATISTA		CONTRATISTA
	CONSORCIO GP FLANDES		

INFORME MENSUAL No. 10

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)



CONSORCIO GP FLANDES

CONTRATO 23001258 H4

25 DE MARZO DE 2025

LISTA DE DISTRIBUCION

El Original y las copias del presente documento han sido entregados a las siguientes dependencias:

DEPENDENCIA	ORIGINAL	COPIA
CONSORCIO GP FLANDES	X	
CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	X	
SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA AEROCIVIL		X

CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSION	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
25/03/2025	V1.0	Versión inicial

RESPONSABLES Y FIRMAS

NOMBRE CARGO EMPRESA	Ricardo Alberto Muñoz Director de obra Consorcio GP Flandes	John Edgar Arango Especialista PMP Consorcio GP Flandes	Consorcio Aerovías de Flandes
RESPONSABILIDAD	Elaboró	Revisó	Aprobó

Índice de contenido

Índice de contenido 3
Índice de tablas 5
Índice de ilustraciones 5
INTRODUCCION 7
DATOS GENERALES 9
CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y BALANCE. 14
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN. 15
GESTION DEL PROGRAMA DE GERENCIA 35
Informe de la dirección, gestión y control del trabajo de obra. 35
Informe de gestión del conocimiento del contrato. 36
Informe de gestión del control integrado de cambios. 36
Informe de validación y control del alcance. 39
Observaciones y conclusiones a la gestión del cumplimiento del contrato y sus riesgos. 40
Informe de control del cronograma. 43
Informe de control de los costos. 51
Informe de gestión y control de la calidad. 54
Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones. 57
Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del contrato. 63
Informe de monitoreo de riesgos. 65
Informe de gestión de la participación de los interesados 69
Gestión de recursos y adquisiciones 71
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 74
ANEXOS. 76
ANEXO 1: Laboratorios y Ensayos. 76
ANEXO 2: Acta de obra presentada con todos sus soportes y formatos de control de programación y financiero. 76
ANEXO 3: Formatos de control. 76

ANEXO 4: Registro fotográfico fechado, redactado y localizado (antes y después de las actividades ejecutadas). 76

ANEXO 5: Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes. 76

ANEXO 6: Informe de gestión SISOMA, para las actividades de campo, vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta área. 76

Índice de tablas

Tabla 1- Datos generales del estado de los contratos (fuente propia) 9
Tabla 2. Estado de gestiones y permisos 9
Tabla 3- Listado de actividades del mes (fuente propia) 10
Tabla 4- *Cumplimiento de la programación (fuente propia)* 11
Tabla 5- Detalle inversión mensual marzo de 2025 (Fuente propia) 12
Tabla 6- *Detalle de ejecución mensual a marzo de 2025 (miles de pesos) (Fuente propia)* 14
Tabla 7- Matriz de integración con las áreas de conocimiento (fuente propia) 35
Tabla 8. Resumen de la gestión de cambios propuestos. 39
Tabla 9. Estado pólizas Contrato Publicadas en el Secop II 40
Tabla 10. Amparo y vigencia póliza RCE 41
Tabla 11. Amparos y vigencias pólizas de cumplimiento. 42
Tabla 12- Actividades programadas para el mes de marzo de 2025 (fuente propia) 43
Tabla 13- Recursos dispuestos para las actividades programadas en el mes 45
Tabla 14- Balance financiero del contrato con corte al acta de obra N°5 (fuente propia) 51
Tabla 15- Análisis de precios unitarios de ítems No Previstos en proceso de aprobación 52
Tabla 16- Actividades facturadas Acta #5 de obra (fuente propia) 53
Tabla 17. Controles a implementar actividades ejecutadas mes 5. 56
Tabla 18- Matriz de interesados actualizada a marzo de 2025 (fuente propia) 58
Tabla 19- Resumen de comités de obra realizados en el mes de marzo del año 2025 (fuente propia) 62
Tabla 20 - Control de correspondencia enviada (fuente propia) 63
Tabla 21 - Control de correspondencia recibida (fuente propia) 63
Tabla 22 - Tratamiento y valoración a los riesgos de la etapa de construcción (fuente propia) 67
Tabla 23 - Listado de riesgos gestionados con el tratamiento propuesto en la matriz 69
Tabla 24. Matriz de Interesados actualizada 70
Tabla 25 - Adquisición del equipo de especialistas 72
Tabla 26 - Adquisición del equipo de dirección 72
Tabla 27 - Adquisición del equipo de construcción 73
Tabla 28. Relación proveedores inscritos. 73

Índice de ilustraciones

Ilustración 1- Estrategia constructiva aeropuerto de Flandes (fuente propia) 13
Ilustración 2- Avance de ejecución de obra en función de la Inversión 32
Ilustración 3- Cumplimiento inversión por capítulos 46
Ilustración 4- Construcción de canal Norte 47
Ilustración 5- Box Coulvert Calle de rodaje Bravo 47
Ilustración 6- Construcción de Box Coulvert Calle de rodaje Alpha 48

Ilustración 7- Construcción calle de rodaje Bravo 48
Ilustración 8- Explanación de calle de rodaje Alpha 49
Ilustración 9- Rehabilitación de pista 50
Ilustración 10- Conformación de afirmado en zonas de seguridad 50
Ilustración 11- Comportamiento de la ejecución frente a la programación en el informe semanal (fuente propia) 59

INTRODUCCION

De acuerdo con el programa de gerencia el proyecto se desarrolla con un enfoque PREDICTIVO y en el presente informe se resumen las gestiones realizadas durante las etapas de EJECUCION, SEGUIMIENTO y CONTROL del proyecto cuyo objeto es realizar el "MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)"

En el informe de marzo del año 2025, que corresponde al décimo mes de ejecución del contrato, se presenta la gestión de las áreas de conocimiento para el buen desarrollo de las actividades de obra y el control que se adelanta tanto para el aseguramiento de la calidad como en el control de cambios.

Las obras y todos sus componentes complementarios se están desarrollando acorde a lo programado, a pesar de los enormes inconvenientes y retrasos que ha causado la llegada de la fuerte ola invernal a causa del fenómeno de la niña. En el periodo del mes de marzo del año 2025, no fue posible alcanzar la meta propuesta para el mes, pero se logró adelantar algunas de las actividades previstas acorde a las condiciones de trabajo y donde el invierno lo ha permitido.

Para resaltar, nos encontramos en proceso de aprobación de los ítems No Previstos junto con la Interventoría y la Aeronáutica Civil, en donde se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el tipo de asfalto a emplear en la mezcla asfáltica, dado que hay una inconsistencia entre la descripción del ítem y la especificación técnica del formato 8B de los pliegos de condiciones. Se envió una carta solicitando el reconocimiento del ítem 2.6 - mezcla asfáltica PG 76-10, utilizando asfalto PG 70-10, y se retiró el NP correspondiente que se estaba proponiendo con un tipo de mezcla asfáltica diferente.

En cuanto al programa de trabajo, el contratista, desde el inicio de la etapa de construcción, ha tenido un adelanto respecto a la línea base de cronograma, el cual se ha estado disminuyendo hasta la entrada del fuerte invierno, y se han perdido varias jornadas de trabajo porque todos los frentes de obras se han inundado, y la lluvia constante no ha permitido drenar y secar las áreas a intervenir. En este aspecto, el pronóstico no es bueno, ya que el IDEAM está mencionando que el fenómeno de la niña va a ir por lo menos hasta finales del mes de abril de 2025.

En lo referente a la ejecución de obra, además de las intervenciones en la pista, y las calles de rodaje, se iniciaron las excavaciones en la zona RESA SUR pero el invierno no permitió continuar en este frente de trabajo, con el agravante de que en las dos calles se proyectan estructuras tipo box coulvert de 65m de longitud cada uno, y esas estructuras también se encuentran afectadas por la ola invernal.

En cuanto a los riesgos, fue posible gestionar el acceso a la obra por la vía privada de la hacienda San Rafael y de esta forma mitigar los problemas con la comunidad de la vía urbana que conduce al Aeropuerto Santiago Vila de Flandes.

Se cumplió el segundo mes de los 4 meses previstos de cierre total del aeropuerto para llevar a cabo las actividades constructivas de la FASE 2, programado entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2025, alcanzando una ejecución del 32,4% acorde a lo programado para los meses de febrero y marzo de 2025.

DATOS GENERALES

Estado general del contrato

El contrato actualmente se encuentra en etapa de construcción concentrando las intervenciones en los hitos de la FASE 2, acorde a los estudios y diseños apropiados por el consorcio GP Flandes y que fueron aprobados por la interventoría.

En la tabla 1 se presenta un resumen general tanto de la información contractual del contratista de obra como de la interventoría, en lo referente a los contratos celebrados por la entidad contratante "UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL", para el desarrollo del objeto del contrato que es "MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF):

DATOS	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista:	□□□□□R□I□□□□□LA□D□□□	□□□□□R□I□□A□R□□□A□□D□□□LA□D□□□
Contrato No:	□□□□□□5□□□4□	□□□□□□□□□□□□□
Valor Inicial:	□4□□□□□□□□4□□□□□□□□	□4□□□□□□□4□□□□□□□□
Plazo pre-construcción:	4□M□□□□□	4□M□□□□□
Plazo de construcción:	□5□M□□□□□	□5□M□□□□□
Plazo total:	□□□M□□□□□	□□□M□□□□□
Fecha de iniciación:	□□□□ □□□□4□	□□□□ □□□□4□
Fecha de vencimiento:	□□□di□□□5□	□□□di□□□5□

Tabla 1- Datos generales del estado de los contratos (fuente propia)

Información general del proyecto

- Para el correcto desarrollo de la etapa de construcción se deben tramitar los siguientes permisos, aprobaciones y reuniones que han continuado en el mes de marzo:

DESCRIPCIÓN GESTIÓN / PERMISO	ESTADO
Trámite del permiso de aprovechamiento forestal	Pendiente radicar por parte de la Aerocivil ante Cortolima
Concepto de señalización	En trámite
Permiso de circulación por la Ruta 40 ante la ANI	En trámite

Tabla 2. Estado de gestiones y permisos

En el mes de marzo recibieron los documentos firmados por la Aerocivil para radicar el plan de aprovechamiento forestal ante CORTOLIMA.

Igualmente se avanza en la legalización de los precios No Previstos, resultantes de la etapa de pre-construcción, para lo cual se han realizado mesas de trabajo en conjunto con la supervisión y la interventoría, en donde se ha establecido la no procedencia del nuevo precio de la mezcla asfáltica, sin embargo se solicita por parte del consorcio GP Flandes, el reconocimiento de la mezcla asfáltica usando como aglutinante un asfalto de grado de desempeño PG 70-10 como lo indica la especificación del formato 8B de los pliegos de condiciones.

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Programación de obra

Para la etapa constructiva se presenta un cronograma basado en las cantidades de obra actualizadas en el presupuesto del diseño ajustado y la estrategia constructiva aprobada. Para el mes de marzo se tenían programadas desde la línea base las siguientes actividades:

ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE FLANDES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
FASE 2 (K0+400 - K1+350) Cierre aeropuerto
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PISTA (K0+485 a K1+350)
Fresado de carpeta asfáltica existente
Subbase granular
Base granular P-209
Excavación mecánica
Mejoramiento con piedra rajón
MEJORAMIENTO DE MARGENES CENTRO
Nivelación de zonas de seguridad K1+085 a K1+350
Descapote
Lleno con material tipo afirmado
Obras complementarias
Box Coulvert calle Bravo

Tabla 3- Listado de actividades programadas para el mes de marzo 2025 (fuente propia)

Basados en la ejecución de las actividades de la tabla 3 y obras adicionales, se presenta semanalmente un informe con el avance, completando al corte del presente informe lo correspondiente a la semana 44 desde el inicio del contrato, como se muestra en la siguiente tabla.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL DE OBRA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 9

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			FECHA:	28-mar-25
Semana No	44	Del :	22-mar-25	AL:	28-mar-25
Plazo Total		582	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		304	días		
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)		52,23%			
Nombre del Supervisor :		ING. JUANITA VILLAMIZAR			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA LADO AIRE DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado construcción	1,62%	29,00%	(%) Ejecutado	1,72%	35,18%
Valor programado ($)	$ 788.343.760	$ 14.099.253.373	Valor ejecutado($)	$ 837.305.761	$ 17.105.928.106
			Evaluación	Avance =	6,18%
				Valor avance =	$ 3.006.674.733

Tabla 4- Cumplimiento de la programación (fuente propia)

Como se puede observar, se lleva un adelanto del 6,18% del valor total del contrato, el cual equivale a $ 3.006.674.733 con respecto a lo planeado con corte al 25 de marzo de 2025.

En los informes semanales se presenta un registro fotográfico que muestra la ejecución de las tareas descritas complementado con un seguimiento a la inversión para llevar un riguroso control del avance de la ejecución.

Igualmente se llevan a cabo comités semanales de seguimiento en compañía de la supervisión y la interventoría, se hacen mesas de trabajo sobre temas importante, reuniones de socialización con diferentes interesados y el control de correspondencia.

Se encuentran consolidadas todas las actividades preliminares en los diferentes frentes de trabajo y se cuenta con todos los recursos, tales como, personal, herramienta menor, materiales, laboratorio en obra, volquetas, maquinaria y equipos, además de la logística necesaria para el desarrollo de las actividades constructivas.

A pesar del fuerte invierno que azota todo el país y en especial las lluvias presentadas a principio de mes en la zona de las obras, lo que ha dificultado el normal desarrollo del cronograma de actividades y ha generado reprocesos en varios frentes, se logró construir rápidamente drenajes para la evacuación de las aguas y dar continuidad a las actividades programadas, sin embargo la fuerte ola invernal ha generado que se inunden algunos frentes de trabajo, pero se adelantaron trabajos en el box Coulvert de Bravo, subbase granular y mejoramiento de zonas de seguridad.

Presupuesto de obra

Para el mes de marzo de 2025 se tenía prevista la siguiente inversión presupuestal acorde al programa de trabajo y el flujo de inversión:

ACTIVIDAD	mar-25
FASE 2 (K0+400 - K1+350) Cierre aeropuerto	**$ 3.011.753.057,98**
REHABILITACION DE PAVIMENTOS	$ 991.074.783,14
Rehabilitación de pista K0+400 a K1+350	$ 991.074.783,14
Subbase reciclada	$ 597.896.453,62
Base granular P-209	$ 393.178.329,52
MEJORAMIENTO DE MARGENES CENTRO	$ 2.020.678.274,84
Nivelación de zonas de seguridad K1+085 a K1+350	$ 1.553.850.365,65
Filtros subsuperficiales	$ 100.923.300,38
Lleno con material tipo afirmado	$ 1.452.927.065,27
Obras complementarias	$ 466.827.909,19
Box Coulvert calle Bravo	$ 419.395.805,51
Box Coulvert calle Bravo 1	$ 18.794.335,96
Aprovechamiento forestal	$ 28.637.767,72
FASE 4 - AYUDAS VISUALES	$ 23.488.710,57
Adecuación de cuarto técnico	$ 23.488.710,57

Tabla 5- Detalle inversión mensual marzo de 2025 (Fuente propia)

Para el mes de marzo, la ejecución realizada derivará en una facturación de $ 3.173.349.844, encontrándonos por encima del valor programado para el mes, aún que debido al invierno se tuvieron que desviar los recursos para otros frentes de trabajo que no estaban programados pero que igualmente generaron avance en el programa de obra, tales como:

- Descapote
- Excavación de canales
- Concreto de canales
- Acero de canales
- Mejoramiento con piedra rajón
- Excavación en zonas de seguridad
- Excavación para ampliación de pista
- Fresado de calles de rodaje
- Excavación y mejoramiento para calles de rodaje

Programación y Estrategia constructiva:

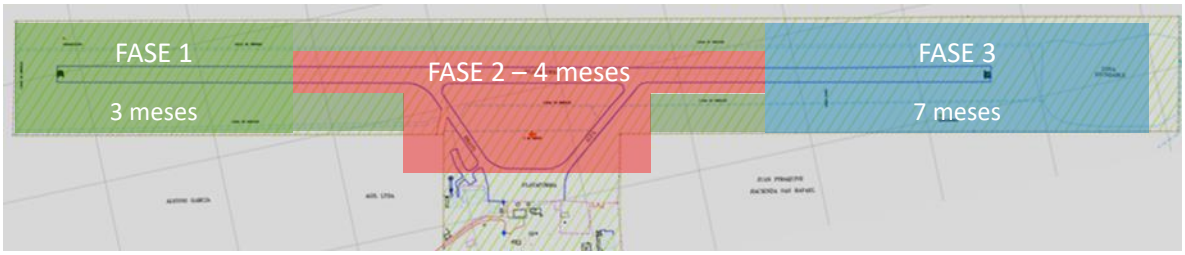


Ilustración 1- Estrategia constructiva aeropuerto de Flandes (fuente propia)

Actualmente nos encontramos en la FASE 2, donde se tiene el HITO de 1.200 m de pista pavimentada para el día 31 de mayo de 2025.

Para el cumplimiento de este HITO, se deben realizar las siguientes actividades:

- **Fresado de pista**: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100%, el material producto del fresado denominado "RAP" según los diseños se mezcla con material granular existente debajo del pavimento actual.
- **Reciclado de pavimento**: consiste en el mezclado con ayuda de una maquina tipo recicladora, la cual tiene un tambor con puntas que es capaz de remover el granular existente y revolverlo con el RAP, para conformar una subbase tipo P-154.
- **Conformación y compactación de subbase reciclada**: Consiste en la extensión del material mezclado a los niveles de diseño y su compactación hasta alcanzar el 100% de la densidad de laboratorio.
- **Suministro e instalación de base granular**: Consiste en la colocación de base P-259 sobre la capa subyacente de subbase, en un espesor de 15 cm y su posterior compactación al 100 % de ensayo de laboratorio.
- **Suministro e instalación de mezcla asfáltica:** Una vez instalada la base granular se debe imprimar con emulsión asfáltica, para luego instalar la mezcla asfáltica P-401.
- **Señalización horizontal:** Con el fin de entrar en operación se debe evaluar en conjunto con la interventoría la señalización mínima que se debe pintar para el correcto funcionamiento del tramo de pista que se va a colocar en servicio.
- **Zonas de seguridad:** Simultáneamente se debe trabajar en las zonas aledañas a la pista para garantizar la seguridad de las aeronaves en caso de un incidente por salida de pista de una aeronave.
- **Calle de rodaje**: Igualmente se estará trabajando en las calles de rodaje Alpha y Bravo, para habilitar al menor una calle para la operación del aeropuerto y el acceso a la plataforma.
- **Drenajes:** Paralelamente se debe avanzar en la construcción de canales y box Coulvert en las diferentes zonas intervenidas, con el fin de garantizar la correcta evacuación de las aguas lluvias.

También se debe avanzar en el trámite del permiso de aprovechamiento forestal, tanto para los árboles del sector sur del aeropuerto como de los árboles del canal de descole.

En cuanto a las vías de acceso en el presente mes se destaca la gestión realizada por el consorcio GP Flandes para habilitar el paso de las volquetas por la vía privada de la hacienda San Rafael, con lo cual se disminuye en un 80% el paso de vehículos cargados por la vía urbana de acceso al aeropuerto Santiago Vila de Flandes.

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y BALANCE.

Planes de trabajo ejecutados y programados.

Al 25 de marzo de 2025, la ejecución de programa de trabajo respecto al programa de la línea base se presenta en la tabla 6.

Periodo de Ejecución		Proyectado ($ millones)			Ejecutado ($ millones)	
Mes	Fase	Ejecución Mensual	Vr. x FASE	Proyección Acumulada	Ejecución Periodica	Ejecución Acumulada
may-24	PRE CONSTRUCCIÓN	$ 1	$ 190	$ 1	$ -	$ -
jun-24		$ 68		$ 69	$ 94	$ 94
jul-24		$ 78		$ 147	$ 71	$ 165
ago-24		$ 43		$ 190	$ 48	$ 213
sep-24		$ -		$ 190	$ 16	$ 229
oct-24		$ -		$ 190	$ -	$ 229
nov-24	FASE 1	$ 1.114	$ 6.571	$ 1.304	$ 2.321	$ 2.550
dic-24		$ 3.747		$ 5.050	$ 3.895	$ 6.445
ene-25		$ 1.711		$ 6.761	$ 3.410	$ 9.855
feb-25	FASE 2	$ 3.847	$ 21.775	$ 10.608	$ 3.969	$ 13.824
mar-25		$ 3.491		$ 14.099	$ 3.282	$ 17.106
abr-25		$ 6.612		$ 20.711	$ -	
may-25		$ 7.825		$ 28.536	$ -	
jun-25	FASE 3	$ 5.961	$ 19.545	$ 34.497	$ -	
jul-25		$ 4.733		$ 39.230	$ -	
ago-25		$ 3.374		$ 42.605	$ -	
sep-25		$ 3.616		$ 46.221	$ -	
oct-25		$ 906		$ 47.127	$ -	
nov-25		$ 955		$ 48.082	$ -	
dic-25		$ -		$ 48.082	$ -	

Tabla 6- Detalle de ejecución mensual a marzo de 2025 (miles de pesos) (Fuente propia)

De la tabla anterior se observa un adelanto en su ejecución respecto a lo programado de un 6,18% en función del valor total del contrato.

Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo del contratista de obra.


En el “ANEXO 6: Informe de gestión SISOMA, para las actividades de campo, vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta área”; se presenta la ejecución de los componentes de Seguridad y salud en el trabajo, social y ambiental del proyecto para el presente mes.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN.

Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

Durante el mes de marzo del año 2025 se llevaron a cabo actividades de obra, como se muestra en el siguiente registro, en siete frentes de trabajo.

1- Actividades de replanteo, localización y levantamientos topográficos (se mantuvieron 4 comisiones de topografía durante todo el periodo)

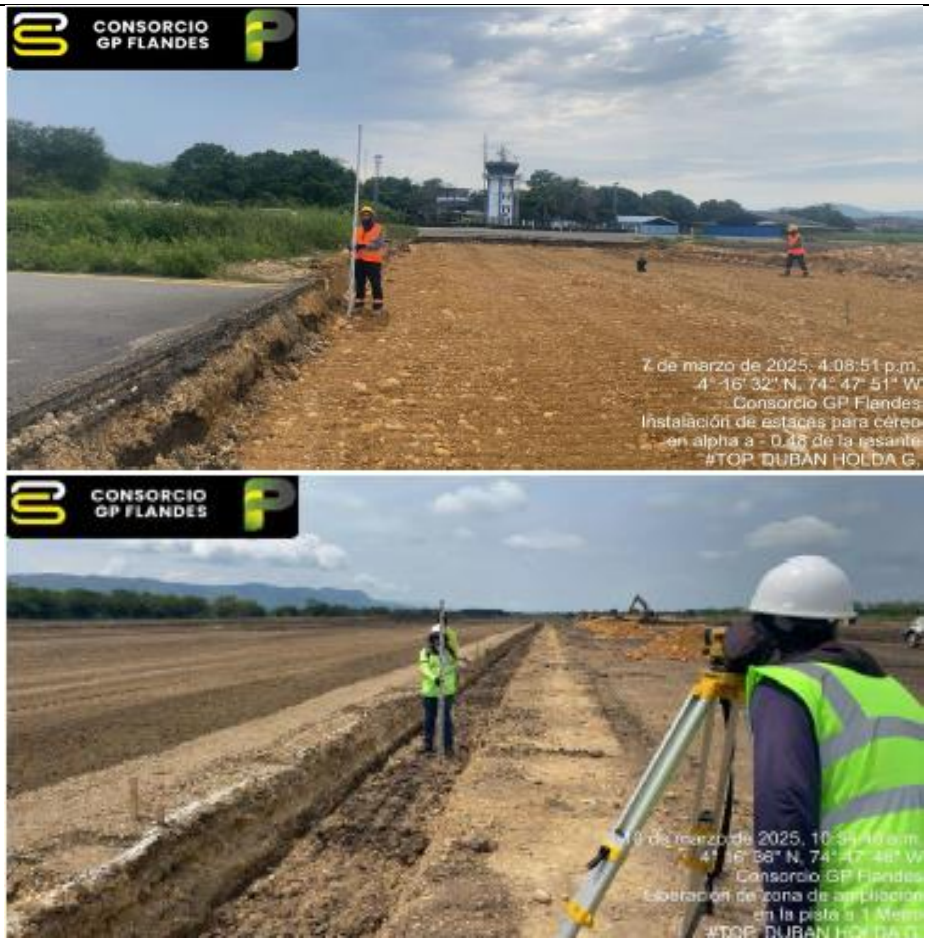

Se realiza localización y replanteo, y chequeo de niveles de excavación en los diferentes frentes de trabajo que se tienen en obra, tales como pista, calles de rodaje, box Coulvert en las calles de rodaje Bravo y Alpha, los canales y las zonas de seguridad en los costados noroccidental y nororiental.

2-□ Descapote.



En el frente de las Zonas de seguridad, se terminó el descapote de todos los sectores a intervenir haciendo falta solo la zona de los árboles donde se tramita el permiso de aprovechamiento forestal.

3-□ Excavación para mejoramiento de zonas de seguridad



En las zonas de seguridad se adelanta la excavación para el mejoramiento de la subrasante entre el K0+200 y el K0+682 por ambos costados, y la excavación entre el K0+700 a K0+980 por ambos costados, en donde las lluvias causaron reprocesos y sobreexcavación, se autoriza la conformación y colocación de afirmado para evitar que futuras lluvias sigan afectando la subrasante.

4-□ Llenos en limo y B-400 para mejoramiento de zonas de seguridad








En las zonas de seguridad se avanza en varios sectores simultáneamente con actividades como excavación para mejoramiento, instalación de afirmado tipo B400, colocación de limo y llenado de canales existentes. También se abrió un frente adicional para conformar el terraplén de la zona RESA sur.

Se logró avanzar con la instalación de material de segunda capa en el mejoramiento con afirmado que se está instalando entre el K1+090 a K1+300 por ambos costados.

5-□ Excavación para construcción de canales.

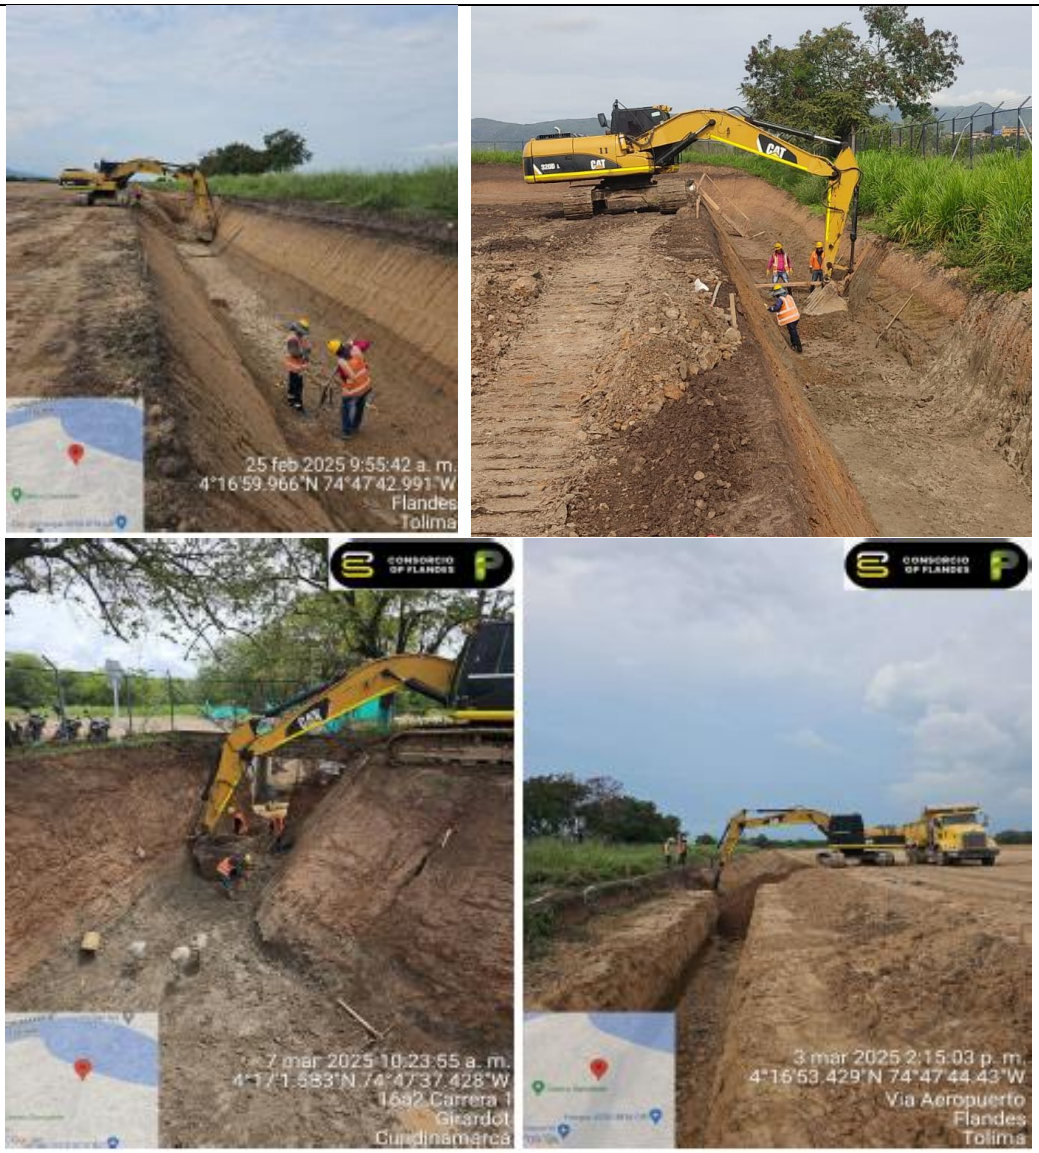

Se desarrollan actividades de excavación y perfilación de canales zona norte / Costado izquierdo donde se tuvieron inconvenientes la semana pasada por la erosión de taludes por las fuertes lluvias y gran parte de la semana del 22 al 28 de febrero de 2025. Se estuvo corrigiendo la base del canal. Durante la semana del 15 al 21 de marzo no hubo avance en este frente ya que debido a las fuertes lluvias hubo que drenar zonas de trabajo, y esto ocasionó que el agua de dichas zonas inundadas derivó o se condujo hacia los canales, y se mantuvo la lámina de agua en los canales.

6-□ Instalación de concreto en los canales.







Se desarrollan actividades de formaleteria, amarre de acero, malla electrosoldada y vaciado de concreto de 21 Mpa en la zona norte del canal de salida. Estas tareas se vieron afectadas por el empozamiento de agua lluvia en las zonas de trabajo.

7-□ Excavación para construcción de filtros.



Construcción de filtros en el sector norte, costado izquierdo (excavaciones, colocación de geodrén con tubería d=6" y material filtrante.

8-□ Box Coulvert de salida.








Terminación de box Coulvert de salida, en este frente se fallaron los testigos de concreto a 7 y 14 días, obteniendo resistencias satisfactorias por lo que se procede con el llenado de los aproches y aletas, para retomar el paso por esta estructura en la vía que conduce al campamento de obra.
Adecuación paso vehicular en Box Coulvert de salida

9-□ Box coulvert calle de rodaje Bravo.



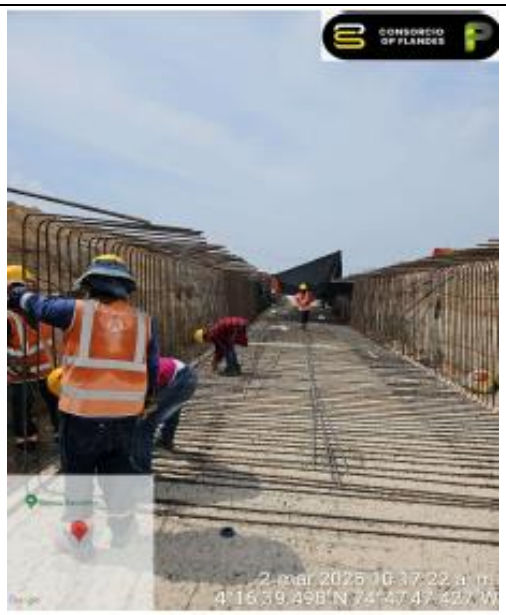



En este frente se realiza la instalación de acero de refuerzo y vaciado de piso y muros. Se avanzó en la instalación de acero de losa superior en la segunda etapa, se realiza limpieza de la parte inferior con hidro lavadora y se continúa con la evacuación de agua y lodo para despejar el área de trabajo y poder avanzar en la parte inferior de la estructura debido a las inundaciones.

10- Box coulvert calle de rodaje Alpha.









Se ejecuta la excavación total de la estructura y la colocación del mejoramiento para la cimentación del box. Instalación de concreto 1500 PSI para el solado. Se realiza la demolición de una tubería 36" revestida existente para continuar el trabajo del Box, ya que genera peligro en el área de trabajo. Las fuertes lluvias e inundaciones no han permitido la instalación del acero de refuerzo de las paredes.

11- Calle de rodaje Bravo





En este frente se terminó con la actividad de fresado y se iniciaron las actividades de excavación del material existente para la posterior instalación de la estructura de pavimento. La fuerte ola invernal afectó bastante la ejecución de las actividades en este frente de trabajo, se logró drenar el área de trabajo y con aproximadamente tres días de sol que hicieron se logró estabilizar la subrasante, aunque se generó un considerable reproceso y sobreexcavación, se autoriza la colocación de piedra rajón como mejoramiento y evitar que se vuelva a afectar la subrasante por las lluvias.

12- Calle de rodaje Alpha.





En este frente se terminó con la actividad de fresado y se iniciaron las actividades de excavación del material existente y la instalación de piedra para el mejoramiento de la subrasante. Debido a las inundaciones se tuvo que drenar la zona y se realizó la preparación de la superficie para iniciar la instalación de subbase en el sector aledaño a la plataforma, en el sector aledaño a la pista se debe completar el nivel con material tipo afirmado B-400, en este empalme con la pista se tuvo mayor afectación por la inundación, pero se logra recuperar para avanzar con la subbase.

13- Pista.







En este frente, se avanza con las ampliaciones laterales y la colocación y céreo de la subbase reciclada entre el K1+090 al K1+685. El fresado y el reciclaje ya se completaron, mezclando el material producto del fresado (RAP) con el granular existente.

Se retiran fallos dado que el material se encuentra muy saturado por las lluvias de las últimas semanas y en algunas zonas alcanzó a penetrar hasta la subrasante, dañando el material de soporte tipo limo por lo que se hace necesario retirar este material y remplazarlo con piedra rajón.

En una parte de la pista (0+890 a K0+460) no fue posible hacer el mezclado con material granular, debido a que no hay suficiente espesor y aparece muy superficial el mejoramiento con crudo de río y piedras, por lo que se debe subir la rasante unos centímetros y garantizar los espesores del diseño de la estructura de pavimentos.

14- Impactos generados por las lluvias en el mes de marzo













Debido a las fuertes lluvias se tuvieron reprocesos en la excavación mecánica y perfilación de canales, disminuyendo el rendimiento de esta actividad, al igual que ha causado retrasos en el vaciado de concretos en canales y box Coulvert.

Se tuvieron afectaciones e inundaciones en los diferentes frentes que causaron retrasos y reprocesos por lluvias entre el 8 y el 21 de marzo de 2025.

El sector sur del aeropuerto continúa inundado con una lámina de agua de aproximadamente 1,0 m

Aún que las lluvias se presentan generalmente en horas de la noche, durante el día se trata de drenar las áreas inundadas, pero no se alcanza a secar el material de soporte, que no resiste el paso de las volquetas, por lo que se tuvieron que suspender actividades varios días.

Otro problema que se viene presentando con las lluvias, es que son de larga duración y baja intensidad, lo que ha comenzado a saturar la capa de subbase que se tiene extendida en la pista, pero el agua alcanza a penetrar hasta la subrasante que está compuesta por un suelo tipo limo, que al contacto con el agua pierde su capacidad portante y mantiene el agua entre sus partículas, reflejando fallos en la capa superior.

Otra afectación importante, se presentó en el box Coulvert donde las inundaciones arrastraron sedimentos que quedaron atrapados en medio de la parrilla de acero de la losa inferior y dañaron el tramo que estaba listo para el vaciado de concreto, por lo cual se tuvo que desarmar todo el acero, lavar con agua a presión y volver a armar la parrilla inferior junto con el arranque de los muros.





15- Calidad









Control de concretos: Por cada mixer de concreto que llega a la obra se le toma el asentamiento y la temperatura, como primer control de calidad, luego se sacan muestras de concreto en cilindros de 100x200 mm sea una vez por jornada o por cada 50 m³ o cada 200 m³; al momento no se han superado los 50 m³ por ende se toma un juego de 9 cilindros por cada tipo de resistencia, después de 24 horas se marcan y se llevan a la poceta de curado para poder fallar a los 7, 14 y 28 días.

Ya se ha implementado el laboratorio en obra, en donde se procesarán ensayos para verificación del control de calidad de materiales granulares de los diferentes proveedores, tales como, afirmado, subbases, subbases con material reciclado, bases y mezcla asfáltica, mediante ensayos de clasificación (Granulometría, limite líquido y el IP), y densidades por el método del cono de arena. Se implemento una prensa doble rango para la falla de espécimen de concreto.

Visitamos a los diferentes proveedores de granulares (Nautila, La colina y Mavi) y hacemos recorridos periódicos en obra para la toma de muestras semanales.

Todos los equipos están calibrados y tienen su certificado emitido por Pinzuar.

16- Componente social









Las estrategias implementadas por el consorcio GP Flandes para fomentar la contratación de personal local, mediante un programa de empleo dirigido a las comunidades vecinas de los barrios: Obrero, Los Almendros, Aprovitef, La Esperanza, ha logrado vincular el 76% de personal local al proyecto generando empleos directos, al igual que los empleos indirectos a través de proveedores locales como ferreterías, empresas de vigilancia, suministro de baños, suministro de agua, suministro de combustible, etc.

El beneficio del proyecto para la comunidad local se representa en la generación de empleo y mejora las condiciones socioeconómicas de la región, impactando sectores vulnerables como se logró con la vinculación de 4 madres cabezas de familia como controladoras viales.

17- Vías de acceso al proyecto.





En las fotografías se observa la vía privada de la Hacienda San Rafael para el acceso alterno al aeropuerto de Flandes





En las fotografías se observan los trabajos de mantenimiento en la Vía de acceso al aeropuerto

A pesar de los arreglos realizados por parte del consorcio GP Flandes para mantener la vía urbana de acceso al Aeropuerto Santiago Vila, continuaron las quejas de algún sector de la comunidad, razón por la cual, la alcaldía municipal de Flandes expone el acuerdo 094 de 2021 en el cual no se permite el transito de vehículos de mas de dos ejes y mas de 10 Ton por las vías urbanas del municipio con el fin de prohibir la circulación de volquetas por esta vía de acceso a la obra.

El consorcio GP Flandes en aras de solucionar un acceso alterno a la obra, realiza una negociación con el propietario de la hacienda San Rafael, para usar la vía interna de la finca para salir del aeropuerto hasta la Ruta 40 para el tránsito de las volquetas.

Gráfica avance físico del contrato de obra para la Fase 2

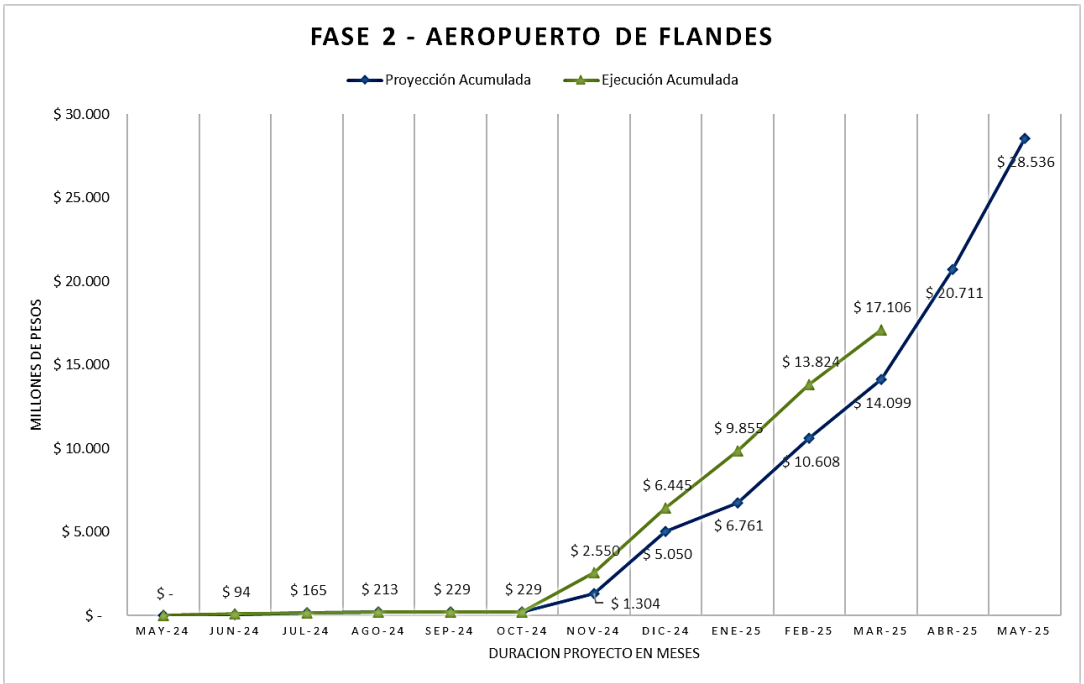


Ilustración 2- Avance de ejecución de obra en función de la Inversión

Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.

Las siguientes actividades, aunque se encuentran relacionadas en la línea base de cronograma como ejecutables en el presente mes, corresponden a ítems No Previstos, los cuales aún no han sido aprobados por lo cual se reprogramaran en su momento.

Se aclara que estas actividades no generan retrasos en el proyecto y se podrían llevar hasta la fase final donde se contemplan la mayoría de actividades del sistema de ayudas visuales.

Programación de actividades para el siguiente periodo.

Las actividades que dentro de la línea base se encuentran programadas para el mes de abril son las siguientes:

MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE FLANDES

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

FASE 2 (K0+485 - K1+350) Cierre aeropuerto

REHABILITACION Y AMPLIACION DE PISTA

- Rehabilitación de pista
  - Subbase granular P-154
  - Base granular P-209
  - Mezcla asfáltica P-401
- Ampliación de pista
  - Excavación mecánica
  - Colocación de piedra rajón

CALLES DE RODAJE

- Calle de rodaje Alpha
  - Subbase granular P-154
  - Base granular P-209
- Calle de rodaje Bravo
  - Subbase granular P-154
  - Base granular P-209

MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD

- Conformación de zonas de seguridad K1+085 a K1+350
  - Excavación mecánica
  - Lleno con material tipo afirmado
  - Colocación de limo orgánico
- Obras complementarias
  - Box Coulvert calle alfa
  - Obra civil eléctrica
  - Canales perimetrales
  - Filtros

Resumen al control de gestión, a partir de la programación.

Se destaca el cumplimiento a la gestión del cronograma a pesar de los inconvenientes derivados del invierno, enunciado por el IDEAM como fenómeno de la niña, además de los inconvenientes tenidos con el acceso al aeropuerto y los permisos de intervención. A partir del siguiente mes comenzarán las actividades de construcción de carpetas asfálticas, actividad crítica para proyecto, y se espera que las inclemencias del clima no causen mayores estragos en las áreas disponibles para trabajar para el cumplimiento de cronograma. Dentro de los compromisos del presente mes, se concertó llevar a cabo la elaboración y control de un cronograma exclusivo para las actividades del capítulo eléctrico, como se muestra a continuación:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - OBRA CIVIL ELECTRICA

No.	DESCRIPCION				ABRIL DE 2025				
1	**Preliminares**	**P/E**	**Unidad**	**Cantidad**	**1 al 6**	**7 al 13**	**14 al 20**	**21 al 27**	**28 al 30**
1.1	Investigación plataforma	P	gl	1	1				
		E							
1.2	Pases de tubería en calles de rodaje	P	m	36	36				
		E							
2	**Canalizacion de ductos 4Ø4"**	**Unidad**	**Unidad**	**Cantidad**	**1 al 6**	**7 al 13**	**14 al 20**	**21 al 27**	**28 al 30**
2.1	Localizacion y replanteo	ml	ml	870	870				
2.2	Excavacion mecanica	m3	m3	208,8		56,26	56,25	56,29	40
2.3	Instalacion de cama en arena	m3	m3	10,44		2,81	2,81	2,81	2,01
2.4	Instalacion de ductos 4Ø4"	ml	ml	870		217,5	217,5	217,5	217,5
2.5	Instalacion de separadores	und	und	60		17	17	17	9
2.6	Instalacion de cable de cobre desnudo No.6 AWG	ml	ml	901,5		245,66	245,66	245,66	164,52
2.7	Instalacion de cinta de señalizacion	ml	ml	870		234,33	234,34	234,33	167
2.8	Lleno con material proveninte de la excavacion	m3	m3	174		46,88	46,88	46,88	33,36
3	**Cajas 274 y 275**								
3.1	Instalacion de cajas prefabricadas	und		19				12	7
3.2	Contruccion caja 275	und		2					2
3.3	Adecuacion de caja prefabricadas	und		21				10	11

La investigación de la plataforma es una actividad definida en las reuniones semanales entre el equipo de interventoría y contratista, en donde se detectó la necesidad de estudiar mas a detalle las ocho interferencias que se presentan con la infraestructura existente.

También se encontró la necesidad de hacer un pequeño cambio en la ubicación de los pases eléctricos en las calles de rodaje, dado que hay interferencia con la construcción de los box Coulvert de ambas calles, por lo pronto se localizará la nueva ubicación y se construirán los pases con tubería de 4 pulgadas de diámetro, recubiertas con concreto f'c=28 Mpa.

Se informa que las cámaras de inspección para las redes eléctricas se harán prefabricadas en concreto, para agilizar el proceso constructivo, actividad que ya se encuentra en ejecución con un proveedor local.

GESTION DEL PROGRAMA DE GERENCIA

Informe de la dirección, gestión y control del trabajo de obra.

Actualmente el proyecto se encuentra en los procesos de EJECUCION, CONTROL y SEGUIMIENTO, y se desarrolla de acuerdo con los planes de gestión para cada área de conocimiento establecidos en el programa de gerencia, donde se establecen las principales acciones a implementar como se detalla a continuación:

PLAN DE GESTION	EJECUCION Y SEGUIMIENTO
Alcance	Definición de solicitudes adicionales realizadas por la administración del aeropuerto de Flandes Definición de tipo de asfalto a emplear en la mezcla P-401 Control de cambios
Cronograma	Ampliación del NOTAM de cierre
	Reprogramación de NPs
	Trámite del permiso de aprovechamiento forestal
	Control de cambios
Costos	Especificaciones de materiales, según grado de desempeño del asfalto
	Flujo de caja y medición de avance por obra ejecutada
	Trámite de precios No Previstos
Riesgos	Tratamiento y estrategia de respuesta Seguimiento y gestión de nuevos riesgos
Comunicaciones	Matriz de interesados
	Correspondencia Actas de comité de obra Actas de vecindad y entorno Reunión con interesados
Calidad	Plan de inspección y ensayos Cumplimiento de materiales a emplear Certificación de equipos de laboratorio Control de fuentes de material con proveedores Implementación de laboratorio en obra Aseguramiento de la calidad en actividades desarrolladas Certificación de materiales empleados en la obra
Recursos y adquisiciones	Compra y negociación de insumos
	Contratación de personal
	Gestión del anticipo y Trámite de órdenes de pago por fiducia Gestión de pagos de cortes de obra Contratación de nuevos equipos para la FASE 2 Contratación de operadores de la zona y disminución del personal foráneo

Tabla 7- Matriz de integración con las áreas de conocimiento (fuente propia)

Informe de gestión del conocimiento del contrato.

La gestión del conocimiento del contrato es un proceso crítico para garantizar que todas las partes involucradas en el proyecto estén alineadas con los términos y condiciones del contrato. Este proceso implica la recopilación, organización, almacenamiento y difusión de información relevante sobre el contrato y el seguimiento a los documentos importantes que rigen las obligaciones tanto de contratista como de la entidad contratante. Para el presente mes se revisaron temas relacionados con los siguientes documentos:

Especificaciones técnicas – formato 8A: se revisó lo correspondiente al contenido de los informes semanales y mensuales, encontrando una opción de mejora en los siguientes aspectos:

- Informe semanal: Se incluye la relación de maquinaria en obra, al igual que un aparte de la gestión social con los beneficios técnicos y sociales del proyecto, que se venían consignando en la Bitácora de obra.
- Informe mensual: Se incluye en los anexos los informes de las áreas de apoyo, que se venían presentando independientemente.

Especificaciones técnicas – formato 8B: Se revisó lo correspondiente al material aglutinante de la mezcla asfáltica y se envió comunicación al respecto para aclarar la inconsistencia que se encontró con la descripción del ítem de mezcla asfáltica, como se detalla a continuación:

- Se solicita el reconocimiento económico de los ítems 2.6, 4.3 y 5.6 correspondientes al SUMINSITRO E INSTALACION CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFALTICA PG 76-10, usando como aglutinante de asfalto, Performance Grade (PG) 70-10, como lo establece la especificación técnica que se encuentra en el formato 8B- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Anexo 1 – Anexo técnico: Se revisó lo correspondiente a los materiales a emplear en el proyecto, definiendo la prevalencia de la especificación sobre la descripción del ítem, como se muestra a continuación:

- Los materiales, suministros y demás elementos que requiera utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.

Informe de gestión del control integrado de cambios.

La gestión del control integrado de cambios es el proceso para identificar, evaluar, aprobar o rechazar, implementar y controlar los cambios en los requisitos, el alcance, el cronograma, el presupuesto o cualquier otro aspecto del proyecto. Este proceso es esencial para garantizar que los

cambios se realicen de manera controlada y que el proyecto se mantenga alineado con los objetivos establecidos.

Resumen de actividades: Durante el mes de marzo del año 2025, se ejecutaron actividades de obra y procesos que requirieron ejecutar el control integrado de cambios debido a solicitudes de la entidad contratante, la interventoría o desde el contratista. La de solicitudes de cambio recibidas durante el mes, incluyendo su estado actual, es la siguiente:

- Cambios en la estructura del informe semanal y mensual.
- Cambio en materiales para llenos.
- Cambio del tamaño del triturado en el concreto para estructuras.
- Cambio en metodología de comunicación.
- Cambio en uso de material filtrante por material de afirmado.
- Cambio en descarga de desagües de las cajas eléctricas.
- Ejecución área adicional Calle Bravo.
- Cambio de asfalto a utilizar en la mezcla asfáltica para la pista.
- No ejecución de reemplazos en zona reza y franja de pista sur.
- Aumento de las paredes del canal perimetral en la parte adyacente a la rejilla a causa de los represamientos.

En la tabla 8 se describe el estado de los cambios en lo referente a las Aprobaciones de cambio, Implementación de cambios y Control de cambios

SOLICITUD DE CAMBIO	ESTADO	IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
Estructura del informe semanal y mensual. Solicitado por: Interventoría	Aprobado en comité de obra # 3	A partir del 25 de marzo de 2025	Se complementa el contenido de los informes con la inclusión de los informes mensuales de las áreas SST, Ambiental, social y calidad.
Aprobación del material drenante de los filtros Solicitado por: Contratista	Aprobado en comité de obra # 3	Entrega de soporte del especialista en geotecnia del consorcio GP Flandes	Se propone la utilización del material tipo B-400 como material drenante para los filtros
Aprobación del crudo de río para el mejoramiento de subrasante Solicitado por: Contratista	Aprobado en comité de obra # 3	Entrega de soporte del especialista en geotecnia del consorcio GP Flandes	Se propone la utilización de material crudo de río a cambio de rajón

Material de transición entre el mejoramiento la estructura de los Box Coulvert Solicitado por: Contratista	Aprobado en comité de obra # 3	Entrega de soporte del especialista en geotecnia del consorcio GP Flandes	Cambio de subbase tipo P-154 de la especificación de los planos por subbase tipo B-200, de acuerdo a los ítems contractuales del formulario No. 1 de precios y cantidades
Tamaño Máximo del agregado del concreto para estructuras y canales. Solicitado por: Contratista	Aprobado en comité de obra # 2	Art. 630 – norma Invias, TM máximo en mezclas de concreto	Uso de TM ½" para mejorar el acabado de los concretos y uso de los moldes de 4" para rotura de muestras de concreto
Descarga de desagües de las cajas eléctricas. Solicitado por: Interventoría	Propuesto en comité de obra # 2	En revisión técnica y definición presupuestal	Conectar los drenajes de las cajas a los filtros, evaluar pertinencia de que los sistemas hidráulicos queden conectados con los eléctricos
Ampliar la intervención de la Calle de rodaje Bravo, hasta el borde la plataforma Solicitado por: Contratista	Propuesto en comité de obra # 2	En revisión presupuestal.	Ampliación necesaria para completar el alcance de manera correcta, dado el estado del pavimento de la calle de rodaje en el empalme con la plataforma
Aglutinante a utilizar en la mezcla asfáltica de los pavimentos a instalar en la pista y calles de rodaje. Solicitado por: Contratista	la interventoría presenta concepto favorable	Pendiente respuesta de la entidad contratante.	Inconsistencias entre la especificación técnica y la descripción del ítem en el formulario No. 1 de precios y cantidades
Excavaciones para la cimentación del terraplén en zona RESA y franja de pista sur. Solicitado por: Interventoría	Ordenado	Durante recorrido de obra y debido a la inundación causada por la intensa ola invernal, se considera prudente no ejecutar esta actividad	Se ordena suspender las excavaciones y realizar el mejoramiento directamente sobre el terreno descapotado. En el tramo que se alcanzó a ejecutar de acuerdo a los diseños se nivelará con crudo de río

Rejilla para garantizar la seguridad del aeropuerto en la salida del canal norte Solicitado por: Contratista	Propuesto en comité # 5	Pendiente entrega de diseño y soportes del comportamiento del canal por reducción de la sección hidráulica	Análisis de la altura de la lámina de agua con el caudal calculado para los canales de acuerdo al periodo de retorno contemplado en los diseños.
Actualización plan de inspección y ensayos incluyendo actividades del componente eléctrico Solicitado por: Interventoría	En revisión por interventoría	Se complementa el Plan de Inspección y Ensayos “PIE” con la parte eléctrica y se entrega para revisión de interventoría	Establecer y cumplir los estándares y pruebas que deben realizarse para aprobación de las obras eléctricas ejecutadas.

Tabla 8. Resumen de la gestión de cambios propuestos.

Lecciones aprendidas:

Los cambios propuestos en los procedimientos permiten un mayor control en la ejecución y el aseguramiento de la calidad.

Los cambios propuestos en el uso de materiales de la zona mejoran el rendimiento de las actividades, pero mantienen la calidad.

Los cambios propuestos en las áreas a intervenir son necesarios para mantener el alcance garantizando el correcto funcionamiento del aeropuerto.

Informe de validación y control del alcance.

Alcance técnico.

Para completar el alcance establecido luego de la culminación de la etapa de pre-construcción, se presentaron durante el mes de marzo de 2025 las siguientes actividades complementarias para garantizar el normal desarrollo del cronograma y la estabilidad de las obras construidas:

- Revegetalización de taludes en taludes de canales excavados por afectación de la ola invernal.
- Servidumbre por vía privada para el ingreso de material en volquetas al proyecto.
- Bombeo de aguas lluvia.
- Incorporación de fibras en los concretos para minimizar la aparición de fisuras.
- Demolición de estructuras de concreto

Dado que la Autoridad Aeronáutica objetó la pavimentación de los 3m de márgenes a lado y lado de la pista como estaba en los diseños originales, se aumentó el mejoramiento de las zonas de seguridad los 28 m medidos desde el borde de pista. Para la implementación en obra se requiere tramitar una modificación al contrato, donde se incluyen ítems No Previstos mediante balance de cantidades sin necesidad de adicionar el presupuesto dispuesto por la entidad de acuerdo con los siguientes cambios que arrojó la apropiación de los diseños:

1. Canal de descarga por fuera del predio del aeropuerto
2. Reciclaje de material tipo RAP producto del fresado
3. Colocación de limo como capa final de amortiguación en zonas de seguridad
4. Construcción de filtros en zonas de seguridad
5. Adecuación de Cuarto técnico para equipo eléctricos
6. Actualización de software de control del sistema de ayudas visuales

Los anteriores puntos describen las modificaciones que se deben realizar en el presupuesto de obra para dejar el aeropuerto operativo, manteniendo el mismo alcance inicial que corresponde al mejoramiento de la infraestructura lado aire del aeropuerto Santiago Vila, llevando a categoría 3:C en cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC 14.

Finalmente se puede concluir que las obras al interior del aeropuerto tienen una modificación en el alcance en tres aspectos, la primera tiene que ver con el cuarto eléctrico, la segunda con la incorporación de obras de drenaje subsuperficial en las zonas de seguridad y la tercera con la implementación de un canal de descole para las aguas captadas al interior del aeropuerto.

Conclusiones a la gestión del cumplimiento del contrato y sus riesgos.

Pólizas y garantías de cumplimiento

Las garantías del contrato se encuentran expedidas, firmadas, aportadas a la entidad y publicadas en la plataforma SECOP II del contrato:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.14947405	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2,431,030,239.00 COP	JMalucelli Travelers	12/31/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.14945596	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	51,007,098,665.00 COP	JMalucelli Travelers	1/1/2031 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle	

Tabla 9. Estado pólizas Contrato Publicadas en el Secop II

Es de anotar que en la plataforma del SECOP II, la entidad contratante aún no ha aprobado la última versión de las pólizas correspondiente a la actualización con el acta de inicio.

A continuación, describimos en detalle los amparos, vigencias y montos de las garantías del contrato:

Identificación de la garantía	CO1.WRT.14947405
Referencia de la garantía	**RCE**
Estado	Pendiente de aprobación por la entidad en SECOP II
Justificación	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Responsabilidad civil extracontractual
Tipo de garantía	• Contrato de seguro
Entidad aseguradora	JMalucelli Travelers
Número de póliza	2057668
Tomador	CONSORCIO GP FLANDES
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extracontractual	2,431,030,239.00 COP	12/31/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Tabla 10. Amparo y vigencia póliza RCE

Identificación de la garantía	CO1.WRT.14945596
Referencia de la garantía	**Cumplimiento**
Estado	Pendiente de aprobación por la entidad en SECOP II

Justificación	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Responsabilidad civil extracontractual
Tipo de garantía	• Contrato de seguro
Entidad aseguradora	JMalucelli Travelers
Número de póliza	2057667
Tomador	CONSORCIO GP FLANDES
Beneficiario	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11,302,256,916.00 COP	5/1/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14,586,181,434.00 COP	5/1/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	9,724,120,956.00 COP	1/1/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	14,586,181,434.00 COP	1/1/2031 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	808,357,925.00 COP	1/1/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Tabla 11. Amparos y vigencias pólizas de cumplimiento.

Informe de control del cronograma.

A continuación, se presenta el seguimiento al flujo de inversión para las actividades desarrolladas por el consorcio GP Flandes, en el mes de marzo de 2025:

Capitulos -Actividades (CA)		TOTAL ACUMULADO PROYECTADO HASTA MARZO	% OBRA ACUMULADO PROYECTADO	TOTAL PROYECTADO EN MARZO	% TOTAL PROYECTADO
		TOTAL ACUMULADO EJECUTADO HASTA MARZO	% OBRA ACUMULADO EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO EN MARZO	% TOTAL EJECUTADO
GENERALES	Proyectado	□□□□□□□□□44	□□□□□	□□5□□□□□□□	□□□□4□
	Ejecutado	□□□4□□□□□□□	4□□□□	□□□□□□4□□□4	□□□□□□
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA	Proyectado	□□□□□□□4□□4□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□4□□□□
	Ejecutado	□55□□□4□□□4	□□□□□	□□□□□□□□□□□	5□□□□□
NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	Proyectado	□□□□□□□□□□□□	4□□□□□	□□45□□□□□□□5	□□□□□□
	Ejecutado	□□□□□□□□□□□4□□	□□5□□	□□□□□□5□□□□□□	□□□□4□
REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA	Proyectado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
	Ejecutado	□45□□□□□□□□	□□□5□	□4□□□□5□□□□	□□□□□□
REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO	Proyectado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
	Ejecutado	□□□□□□□□□□4	□□□□□	□□5□□□4□□□□	□□□□□□
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Proyectado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
	Ejecutado	□□□□□□□□□□	□□4□□	□□	□□□□□
SISTEMA DE DRENAJE	Proyectado	□□□5□□5□□□□□	□□□□□□	□□	□□□□□
	Ejecutado	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□4□□□□□□□□	□□□□4□
BOX COULVERT	Proyectado	□□□□□□5□□□□	□□5□□	□4□□□□□□□4□	4□□5□□
	Ejecutado	□□□□□□□□5□□□	□□□□□	□5□□□□□□□4	4□□□□□
AYUDAS VISUALES (SISTEMA DE ILUMINACIÓN)	Proyectado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
	Ejecutado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS	Proyectado	□□□□□4□5□4□5	□□5□□	□□□□□4□5□4□5	□□□□□□□□
	Ejecutado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
GESTIÓN FORESTAL	Proyectado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
	Ejecutado	□□	□□□□□	□□	□□□□□
APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS	Proyectado	□□□□□□□□□5□	□□5□	□□	□□□□□
	Ejecutado	□□□□□□□4□□□□	□□4□	□□	□□□□□
VALOR BÁSICO DE OBRA (1)		$14.099.253.373	100,00%	$3.491.236.653	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (1')		$17.105.928.106	100,00%	$3.282.293.849	

Tabla 12- Actividades programadas para el mes de marzo de 2025 (fuente propia)

En el mes de marzo de 2025, solo se ejecutaron las actividades contractuales programadas que corresponden a la línea base, pero no se pudo avanzar con los ítems No Previstos por falta de aprobación por parte de la entidad contratante.

En el seguimiento al programa de inversiones, se observa que no se alcanzó la meta del 7,26% del valor total del contrato, pero se alcanzó un 6,83% a pesar de las lluvias e inundaciones ocurridas durante todo el mes.

En la ejecución acumulada se mantiene un avance con respecto a lo programado al final del mes de marzo de 2025, correspondiente a un 6.25% logrando adelantar actividades en varios frentes de trabajo consiguiendo una ejecución acumulada del 35,58% sobre un 29,32%, sin embargo la afectación por el invierno a penas se está empezando a manifestar en las actividades de pista, en donde se han detectado fallos por humedad en el material de soporte de la subrasante.

Con este resultado, el contratista se encuentra cumpliendo los indicadores de gestión de Porcentaje de ejecución y de costo del proyecto que establece la Aeronáutica Civil.

Como parte de la gestión del cronograma el consorcio GP Flandes ha dispuesto de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas como se muestra en la tabla 8:

DESCRIPCIÓN	**RECURSOS**
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5 comisiones de topografía 5 estación total 5 niveles de precisión 1 equipo RTK
DESCAPOTE A MÁQUINA Y EXCAVACIONES, RAJÓN	1 buldócer 1 excavadoras 20 Ton 2 volquetas 2 ayudantes 2 controladoras de tránsito
MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD	1 excavadora 20 Ton 2 motoniveladoras 2 Buldócer 2 miniexcavadoras 1 vibro compactador 1 carrotanque de agua 1 retrocargador de llantas 7 volquetas 6 ayudantes
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PISTA	1 fresadora 1 recicladora 2 motoniveladora 2 vibro compactador

	1 carrotanque de agua 3 volquetas 6 ayudantes 1 retrocargador de llantas
INSTALACIÓN DE CONCRETOS	15 ayudantes 12 oficiales Formaletas 2 Minicargador Herramienta menor Laboratorio Concreto Argos 23 ayudantes 12 oficiales
CALLES DE RODAJE ALPHA Y BRAVO	1 motoniveladora 1 vibro compactador 1 carrotanque de agua 1 excavadora 20 Ton 6 volquetas 6 ayudantes

Tabla 13- Recursos dispuestos para las actividades programadas en el mes

Indicadores de gestión:

Cuantificación del tiempo real ejecutado: SPI

SPI = EV / PV = 17.106/ 14.099 = **1,21**

Donde:

PV: Valor Planeado acumulado a marzo de 2025

EV: Valor Ejecutado acumulado (corte informe semanal # 44)

Evaluación: EVAL (etapa de construcción = 15 meses)

EVAL = Tiempo de ejecución total / 100 x Avance

Tiempo de ejecución total = 15 x 30 = 450 días

Avance = 6,25%

EVAL = 450 / 100 x 4,44 = 28,2 días

La evaluación del tiempo arroja un muy buen desempeño por parte del contratista de obra.

En la Ilustración 3 se puede observar el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el mes de marzo de 2025, de acuerdo a la programación de obra.

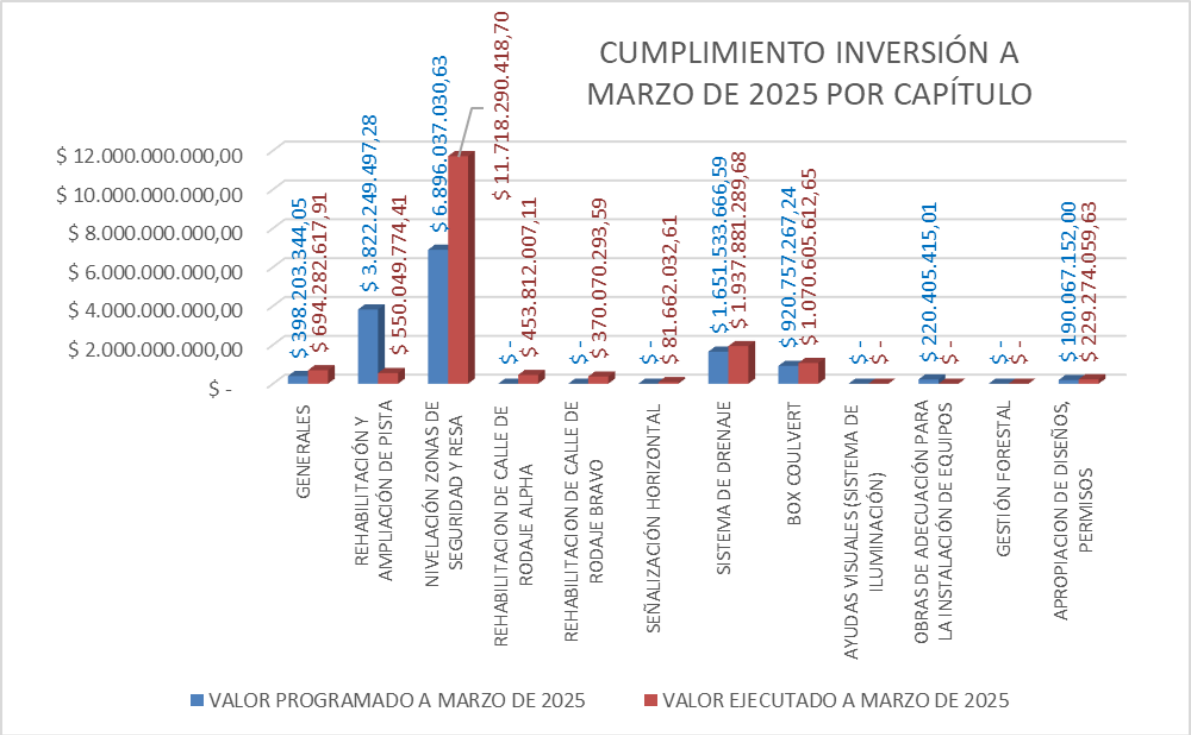


Ilustración 3- Cumplimiento inversión por capítulos

Por otro lado, el mes de marzo de 2025 finaliza con la ejecución de siete (7) frentes de trabajo simultáneos, distribuidos así:

Frente 1. Canales: En este frente, se están llevando a cabo actividades de excavación en el canal ubicado en el costado izquierdo. Además, se instala malla electrosoldada y vaciado de concreto de 21 Mpa en la zona norte del canal de salida. Debido a las fuertes lluvias presentadas durante el mes, las actividades en este frente se han desarrollado de manera intermitente debido a las inundaciones. Durante la última semana solo se avanzó significativamente en las excavaciones, lo que se permitió drenar las zonas inundadas y dar continuidad a las actividades en otros sectores. En cuanto al vaciado de concreto solo se pudo terminar el empalme en la zona norte y el canal derecho.



Ilustración 4- Construcción de canal Norte

Frente 2: Box coulvert calle de rodaje Bravo. en este frente se avanzó en la instalación del acero de losa superior en la segunda etapa, se realiza limpieza de la parte inferior con hidrolavadora y se continúa con la evacuación de agua y lodo para despejar el área de trabajo y poder avanzar en la parte inferior de la estructura debido a las inundaciones. Durante la última semana se realiza el vaciado de muros de la tercera etapa y se avanzó en la instalación de acero de losa superior en este mismo tramo. Por otro lado, en el tramo final de losa inferior donde ya estaba listo para vaciar antes de la inundación y debido al arrastre de sedimentos, es necesario desarmar todo el acero de la losa inferior, se realiza lavado con agua a presión y se inicia de nuevo el armado de la zona afectada en la losa inferior.



Ilustración 5- Box Coulvert Calle de rodaje Bravo

Frente 3: Box Coulvert calle de rodaje Alpha. En este frente, se realizó la instalación de concreto 1500 PSI para el solado, pero no se pudo iniciar la instalación del acero de refuerzo por la inundación de las áreas de trabajo.



Ilustración 6- Construcción de Box Coulvert Calle de rodaje Alpha

Frente 4: Calle de rodaje Bravo. Se logra drenar el área de trabajo debido a que se inundó toda la zona excavada, y, con varios días de sol que hicieron se logra estabilizar la subrasante, aunque hay bastantes reprocesos y sobre excavación. En este frente se autoriza la colocación de piedra rajón como mejoramiento y evitar que se vuelva a dañar la subrasante por las lluvias. En este frente, se terminó el mejoramiento en piedra rajón y se continuó con la instalación de la siguiente capa de subbase P-154 en los dos sectores (Pista y Plataforma)



Ilustración 7- Construcción calle de rodaje Bravo

Frente 5: Calle de rodaje Alpha. Luego de la excavación, se logra drenar la zona y se prepara la superficie para iniciar la instalación de subbase en el sector aledaño a la plataforma. En el

sector aledaño a la pista se debe completar el nivel con material tipo afirmado B-400, en este empalme con la pista se tuvo mayor afectación por la inundación, pero se logra recuperar para avanzar con la subbase. En la zona comprendida entre plataforma y box coulvert, se liberaron las áreas de subbase, mientras que en la zona entre box coulvert y pista se completó la instalación de la capa de piedra rajón, la cual fue aceptada por la interventoría. Esto permite continuar con la instalación de la subbase en la zona correspondiente.



Ilustración 8- Explanación de calle de rodaje Alpha

Frente 6: Pista, En este frente se terminó la tarea de reciclaje en la que logró mezclar el material producto del fresado (RAP) con el granular existente. Se realiza el cereo de la subbase reciclada entre el K1+400 a K1+685, y entre el K1+090 a K1+400. Se avanza con las ampliaciones laterales. Se retiran fallos dado que el material se encuentra muy saturado por las lluvias de las últimas semanas. En la zona sur se dispone de otra cuadrilla de intervención para retirar también fallos y aprovechar los días soleados para secar el material húmedo. Se liberó el tramo comprendido entre K1+600 y K1+685 para la instalación de la base granular. Además, se avanzó en la ampliación de pista entre K0+770 hacia menores en ambos costados. Debido a la infiltración de las aguas lluvias por las capas existentes, el terreno de fundación que corresponde a limos se vio afectado, mostrando fallos en la estructura superior, por lo que fue necesario retirar este material y remplazar con piedra rajón.



Ilustración 9- Rehabilitación de pista

Frente 7: Zonas de seguridad. Este frente se divide en dos partes, la primera corresponde al mejoramiento con afirmado que se está instalando entre el K1+090 a K1+300 por ambos costados, en esta zona se logró avanzar con la instalación de material de segunda capa. La otra parte corresponde a la excavación entre el K0+700 a K0+980 por ambos costados, en donde las lluvias causaron reprocesos y sobre excavación, en este frente se autoriza la conformación y colocación de afirmado para evitar que futuras lluvias sigan dañando la subrasante. Adicionalmente se ejecuta la excavación y construcción de filtros.



Ilustración 10- Conformación de afirmado en zonas de seguridad

Informe de control de los costos.

A continuación, se presenta el balance financiero acumulado incluyendo la etapa de pre-construcción y el acta de obra No. 5 con periodo de corte del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2025, en el que se observa la obra ejecutada para el periodo citado correspondiente al 6,53% respecto al valor total del contrato.

Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		$ 48.620.604.781
2.Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 48.620.604.781
4. Valor pagado del anticipo %	23,3%	$ 11.302.256.916
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 37.318.347.865
6. Valor presente acta		$ 3.173.349.844
7. Valor amortizado en la presente acta	23,3%	$ 739.390.514
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 2.433.959.330
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 10.931.851.107
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 2.142.157.773
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 24.668.067.353
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 23.952.537.428
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ 8.420.708.629
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		33,42%

Tabla 14- Balance financiero del contrato con corte al acta de obra N°5 (fuente propia)

Para este período se realizaron actividades en diferentes frentes de trabajo y se validaron las obras con base en los diseños aprobados, con el fin de controlar que solo se ejecute la obra contratada, como sigue:

Durante el presente mes, se presentaron todos los soportes para tramitar los precios No Previstos, mediante la implementación de mesas de trabajo entre interventoría y contratista, en donde se estudiaron los siguientes ítems:

VALORACION DE LOS ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr.UNITARIO	Vr. PARCIAL
NP-01	REVESTIMIENTO DE CANAL CON PIEDRA PEGADA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS	M2	439,00	$ 178.038,00	$ 78.158.682,00
NP-02	SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA	M3	13.440,00	$ 107.000,00	$ 1.438.080.000,00
NP-03	TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD	M2	221.604,60	$ 3.600,00	$ 797.776.560,00
NP-04	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERÍA 4")	M	428,00	$ 81.829,00	$ 35.022.812
NP-05	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6")	M	5.992,00	$ 109.149,00	$ 654.020.808
NP-06	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8")	M	4.044,00	$ 125.192,00	$ 506.276.448
NP-07	ADECUACION CUARTO ELECTRICO	UND	1,00	$ 28.141.912,00	$ 28.141.912
NP-08	TRASLADO DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONEXIÓN DE REGULADORES	UND	1,00	$ 65.952.905,00	$ 65.952.905
					$ 3.603.430.127

Tabla 15- Análisis de precios unitarios de ítems No Previstos en proceso de aprobación

Se tiene pendiente la elaboración de la propuesta de precios no previstos para otras actividades de obra y de índole eléctrico.

Actividades ejecutadas en el periodo.

Las actividades ejecutadas y su cantidad de obra validada por interventoría son las siguientes:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5	
		CANT	V/ PARCIAL
1- GENERALES			
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	59.703,7	$ 131.348.140
2- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA			
2.1	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	712,9	$ 46.837.530
2.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	472,0	$ 77.408.000
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	935,7	$ 182.461.500
3.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	3.023,2	$ 114.594.396
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	9.614,1	$ 631.646.370
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	4.829,8	$ 695.491.200
5.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	5.078,3	$ 333.644.310
5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2.146,8	$ 352.075.200
7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	3.303,0	$ 217.007.100
7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	78,8	$ 78.952.005
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	1.028,8	$ 10.344.584
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	10.455,0	$ 105.125.025
8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	109,8	$ 182.123.503
11- GESTIÓN FORESTAL			
SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU			**$ 3.159.058.863**
IVA			$ 14.290.981
A. TOTAL OBRAS			**$ 3.173.349.844**

Tabla 16- Actividades facturadas Acta #5 de obra (fuente propia)

En la ejecución mensual hubo un valor ejecutado por encima de los programado de $ 37.153.707, y en el acumulado se tiene un adelanto de $ 2.170 millones (incluyendo las obras ejecutadas no cobradas correspondientes a los NP'S en proceso de aprobación), lo que representa un 15% por encima a lo planeado.

Como parte de la gestión de costo, se destacan las siguientes acciones para completar las tareas propuestas para el mes de marzo del año 2025:

1- Implementación de frentes de trabajo por fuera de la zona de seguridad en la nueva clasificación de aeródromo 2:B
2- Excavación de canales por etapas para generar zonas de drenaje en caso de lluvias
3- Extensión de las jornadas de trabajo a jornadas nocturnas para aprovechar los momentos sin lluvia en la zona y contrarrestar los tiempos muertos del personal y los equipos. Adicional para evitar fisuramientos en los concretos por vaciados durante climas extremos.
4- Actividades de bombeo y "secado" del material para mitigar la afectación por las lluvias.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la interventoría para analizar y revisar la fórmula de ajuste con los índices ICOCIV de acuerdo con el contrato de obra, en donde se define que se utilizará el indicador global para el cálculo del factor de ajuste tomando los meses de abril de los años 2025 y 2024 para dicho calculo y se aplicará desde el mes de enero de 2025, con el mismo valor de ajuste para todo el año, mes a mes.

Indicadores de gestión del costo

Cumplimiento: VAL

VAL = Costo real período / costo programado período x 100

Costo real período = $ 2.445.000.000

Costo programado período = $ 3.136.196.137

VAL = 77,9%.

La variación del costo presentada se debe a dos razones principalmente:

1- Lluvias intensas durante todo el mes e inundaciones.
2- Aprobación de ítems No Previstos

Informe de gestión y control de la calidad.

Las actividades de obra ejecutadas durante el mes de marzo de 2025 fueron las siguientes:

1.1, LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD

2.1, EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

2.3, MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

2.4, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.

3.1, DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)

3.2, EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

3.3, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.

5.2, EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

5.3, MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

7.2, EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

7.3, CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.

7.13, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)

8.2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)

8.4, CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0m, INCLUYE CINTA PVC

Los controles de obra descritos en el plan de inspección y ensayos fueron realizados durante las intervenciones. Los ensayos o análisis respecto a la calidad de la obra ejecutada se presentarán en el siguiente mes y corresponden a los siguiente:

ACTIVIDAD	ENSAYO / EVIDENCIA
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	Para los niveles y estaciones: -□ Certificado de calibración vigente (Externo) -□ PCF-62 Control del Equipo de Seguimiento y Medición -□ Sticker de calibración -□ CC-F-38 Programación de Verificación y Calibración de Equipos -□ CCP-01 Procedimiento para el control de los equipos de seguimiento y medición

	-□ PCF-30 Recibo de Niveles por Topografía R2 -□ Cartera topográfica
Actividades de excavación y descapote	Para la geometría: -□ Informe de inspección en obra -□ Registros de visita a obra del geotecnista. -□ Cartera topográfica Para el acabado: -□ De ser necesario adelantar ensayos de PDC para determinar la cota final de la excavación según el tipo de suelo.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS. MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154 RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT.	Para el material: -□ Ensayo de laboratorio externo de DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV E – 161 – 13 Para el acabado geométrico: -□ Informe de inspección en obra -□ Cartera topográfica
ACERO DE REFUERZO	-□ Certificado de Calidad del material -□ FR-CO-06 Informe de inspección en obra
CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56. CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0m, INCLUYE CINTA PVC.	Para el material: -□ Remisión. -□ Resultado del ensayo a compresión. -□ FR-CO-06 Informe de inspección en obra -□ FR-CO-10 Control resistencia a la compresión de concreto Para el elemento vaciado: -□ FR-CO-06 Informe de inspección en obra -□ FR-CO-10 Resistencia a la compresión de concretos

Tabla 17. Controles a implementar actividades ejecutadas mes 5.

Como parte del aseguramiento de la calidad durante el mes de marzo se adelantaron ensayos de RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO bajo la norma INV E – 410: 2013 para la mezcla de concreto que se está utilizando en la construcción del Box Coulvert y demás estructuras de drenaje. Los resultados de las resistencias a 28 días están cumpliendo con la normatividad y los

estándares del plan de inspección de ensayos. Las densidades del afirmado, la sub-base y la subbase reciclada están cumpliendo las densidades de compactación mínimas para aprobación de lotes.

En el anexo 1 al presente informe se adjuntan los ensayos de calidad de los materiales y análisis de los resultados.

Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el mes de marzo del año 2025 se identifican nuevos interesados y se alimenta la matriz de interesados en la que se incluyen tanto representantes de la entidad contratante, como de la interventoría y contratista, y la comunidad aeroportuaria de Flandes, como sigue:

MATRIZ DE INTERESADOS

Obra:	MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES	Fecha última actualización:	31/10/2024	CONSORCIO GP FLANDES

Parte Interesada	Nombre Contacto	Cargo	Tel/Cel	Correo electrónico	Observaciones
AEROCIVIL	Andres Arboleda Salazar	Secretario de servicios aeroporturaios	3102356471	andres.arboleda@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Alexander García	Jefe Contratos de mantenimiento Aerocivil	3112699634	alexander.garcia@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Juanita Villamizar	Supervisora del contrato	3194891110	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Johan Camilo Silva	Ingeniero de apoyo a la supervision	3166260591	camilo.silva@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Michel Moreno	Ingeniero de apoyo a la supervision	3124509795	michel.moreno@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Hayder Suarez Zamudio	Supervisor Contrato de Interventoría			
	Gilma del Pilar Lozano	Administradora Aeropuerto Flandes	3208792261	gilma.lozano@aerocivil.gov.co	Operación del aeropuerto
INTERVENTORIA	Roselly Pajaro	Representante Legal	3012331719	gerencia@gepobras.com	Resultado de interventoría
	Nelson López	Consorciado EPYPSA	3107663103	nelson.lopez@epypsa.com	Resultado de interventoría
	Alfredo Pérez Santos	Director de Interventoría	3167528617	interventoriaflandes@gmail.com	Cumplimiento del contrato
	Jose David	Residente de interventoría	3134286246	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
	Andres Carrillo	Auxiliar de ingeniería de interventoría	3208366270	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
CONTRATISTA	Juan Carlos López de Mesa	Representante Legal	3207971787	gerencia@procopal.com	Resultado del contrato de obra
	Juan Diego Blair Llorens	Gerente General Gisaico	3116297156	gerencia@gisaico.com.co	Resultado del contrato de obra
	Jose Fránklin Hincapie	Gerente UEN Infraestructura Gisaico	3104953297	franklin.hincapie@gisaico.com.co	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ruben Medina	Director técnico Procopal	3104360382	ruben.medina@procopal.com	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ricardo Alberto Muñoz	Director de obra consorcio GP Flandes	3108900285	ricardo.munoz@procopal.com	Dirección y Gestión del proyecto
	Jhon Velez	Ingeniero de apoyo	3225944964	jhon.velez@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Jose Daniel Villegas	Ingeniero residente	3148414926	jose.villegas@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Alvaro Alzate	Topografo líder oficina técnica	3136638805	alvaro.alzate@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
AUTORIDADES	Ana Judith Gamboa	Alcaldesa de Flandes	3102152832	Alcaldesa@flandes.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Adriana Magali Matiz	Gobernadora del Tolima	(608) 2611111	contactenos@tolima.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Salomón Said Arias	Alcalde de Girardot	(601) 8393510	atencionalciudadano@girardot-cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Jorge Emilio Rey	Gobernador de Cundinamarca	(601) 7490000	contactenos@cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Andrés Perez Frías	Comandante policia Flandes	3213760022	Flandes@policia.gov.co	Seguridad física
	Jorge Tobón	Evaltec	3154593672	gerencia@evaltec.com	Consultoría
PROVEEDORES	Ricardo Adame	Skytech	3105747923	ceo@skytechsas.com	Consultoría
	Wilson Castell	Cayto tractores	3102231718		Petreos y mezcla asfaltica
	Enrique Mayorga	Mavi Pavimentaciones	3153112256		Petreos y mezcla asfaltica
	Gustavo Pabón	Nautila	3142534199		Materiales petreos
	Felipe Cardenas	Base fija de operaciones - FBO	3125016916		Alquiler zonas de campamento
	Monica Sanchez	Concretos La Floresta	3203876292		Materiales petreos
COMUNIDAD	Luis Henry Varon	Predios contiguos al Aeropuerto	3173705451	henryvaron@me.com	Zodme, afirmado y vía de acceso
	Juan Carlos Ramirez	Predios contiguos al Aeropuerto	3158317059		Posible Zodme por permiso de nivel
	Diego Alvarez	Analista de rutas de SATENA	3192476210	diego.alvarez@satena.com	Nueva ruta en Flandes
	Bernardo Alvarez	Representante Inveraereas	3112365943	inveaereassas@gmail.com	Operación aeropuerto
	David Vilaro	Escuela de instrucción Aeronova	3219703344	coor.calidad@ptcacademy.net	Operación aeropuerto
	Fernando Crespo	Escuela de instrucción Aeroandes	3114428838	operacionesgirardot@aeroandes.edu.co	Operación aeropuerto
	Nestor Caballero	Escuala de instrucción Acahel	3102485525	acahel.academia@gmail.com	Operación aeropuerto
	Elizabeth Medina	Escuela de instrucción Protecnica	3142280014	sms@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Abel Urrea	Escuela de instrucción Aeroclub	3112536392	gerencia@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Ricardo Ospina - Maria Paula G	Escuala de paracaidismo SKY	3165290699	jefedeoperaciones@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Veronica Restrepo	Asociación de pilotos y aeronaves	3204960558	ricardo@skydivecolombia.com	Operación aeropuerto
	Miguel Angel Ponce	Globe Air FuelIL (combustible aviones)	3124576900	gerencia@gafcolombia.com	Operación aeropuerto
	Felipe Cardenas	FBO - Aerotaxis Guaymaral	3112365943	lfcfbo@hotmail.com	Operación aeropuerto
	Raul Carvajal	Junta de acción comunal - Los Almendros	3219464118		Bienestar para la comunidad

Tabla 18- Matriz de interesados actualizada a marzo de 2025 (fuente propia)

Adicionalmente como parte de la gestión de las comunicaciones se mantienen los grupos de WhatsApp creados con interventoría y supervisión para una comunicación permanente entre las partes, destacando los siguientes temas tratados en el mes de marzo de 2025:

- Trámite de Anticipo y creación de terceros en la fiducia
- Permiso del propietario del predio del contiguo al aeropuerto

- Llegada de equipos a obra
- NOTAM y socialización explotadores aeropuerto
- Trámite aprovechamiento forestal
- Registro fotográfico del avance de la obra
- Agenda de comité de seguimiento
- Afectaciones por el clima
- Precios de obra extra
- Facturación de actas de obra
- Trámite para la aprobación de los ítems no previstos
- Aprobación de la Valla de la obra
- Compromisos y entregables
- Acta de obra No. 5
- - Programa social y vía de acceso al aeropuerto

También se ha hecho entrega de informes semanales para cuatro (4) semanas del mes de marzo de 2025, donde se informan las actividades realizadas con su respectivo registro fotográfico y se hace el informe de avance con respecto a lo programado, como se observa en la siguiente gráfica:

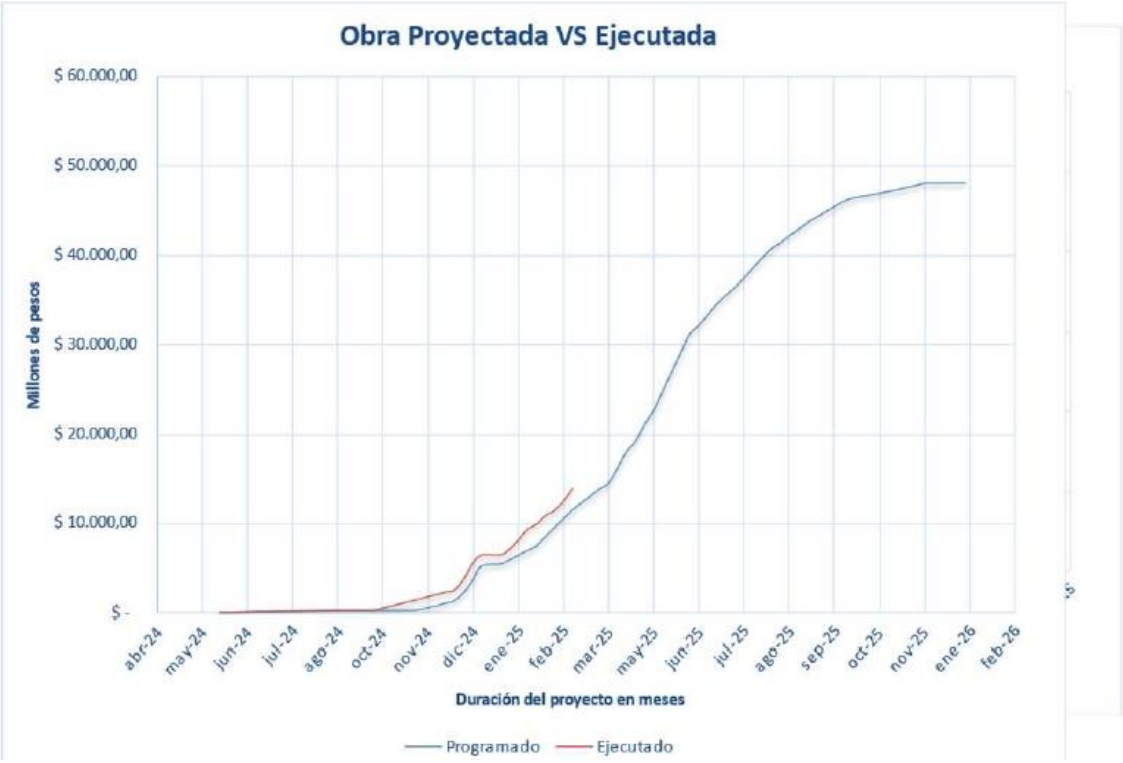


Ilustración 11- Comportamiento de la ejecución frente a la programación en el informe semanal (fuente propia)

En cuanto a las reuniones realizadas durante el mes de febrero se destacan las reuniones con los especialistas aeronáuticos y las reuniones con los especialistas en pavimentos.

Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.

Durante el mes de marzo del año 2025 se realizaron 5 comités de obra, como se relaciona a continuación:

Comité No.	Temas de la reunión	Planes de acción	Cumplimiento
33. Fecha: 26/02/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 32. Cantidades semanales de obra Respuesta Memorandos enviados. Gestión “SISOMA”.	Entrega proceso constructivo del material reciclado usado en pista. Concepto cambio de materiales por material crudo y B-400 por parte del geotecnista. Concepto escrito e Inventario de árboles. Permiso utilización del aljibe. Permiso de nivelación lote contiguo. Campaña de orden y aseo. Señalización con maletines en excavaciones profundas. Consulta sobre disposición de las cajas de inspección existentes a la gerencia del aeropuerto. Charla de seguridad y refuerzo de la protección en obra en el Box Coulvert #2. Implementación de un nuevo baño móvil.	Contratista 04/03/2025 Contratista 10/03/2025 Contratista 10/03/2025 Contratista 10/03/2025 Contratista 12/03/2025 Contratista 28/02/2025 Contratista 05/03/2025 Contratista 05/03/2025 Contratista 28/02/2025 Contratista 28/02/2025
34. Fecha: 05/03/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 33. Cambio forma de comunicación correspondencia oficial. Inclusión de los componentes SISOMA en el informe mensual. Propuesta punto de atención a la administración. Avance de obra.	Revisión NP’s por parte de la Interventoría. Soporte técnico cambio material filtrante por material de afirmado. Revisión alternativa ejecución de desagües de las cajas eléctricas hacia los filtros. Completar actas de vecindad en hangares vecinos. Revisar interferencia red contraincendios del aeropuerto con las redes eléctricas (Replanteo eléctrico)	Contratista, Interventoría 05/03/2025 Contratista 14/03/2025 Contratista 06/03/2025 Contratista 26/03/2025 Contratista 12/03/2025

	Incorporación componente de aprovechamiento forestal en el informe mensual.	Evaluación de intervención área adicional Calle Bravo. Envío documentación de trámites realizados de la vía de Hacienda San Rafael a la ANI. Actualización PMT incluyendo el uso de la vía de la concesión Sumapaz. Ajuste acta social del 18-feb.-25 Contestar requerimiento de la Entidad con relación a la revisión de obstáculos de la cabecera 20 (Correo del 26 de febrero)	Actividad suspendida. Contratista 05/03/2025 Pendiente. Interventoría 10/03/2025 Interventoría 10/03/2025
35. Fecha: 12/03/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 34. Permiso de aprovechamiento forestal Cortolima. Análisis Fitosanitario. Permiso de nivelación Lote contiguo. Revisión red contra incendios. Intervención área duras y blandas de la plataforma. Inclusión componente eléctrico en informes semanales. Inicio actividad hidrosiembra en taludes de canales.	Acta firmada permiso de aprovechamiento forestal Revisión “cruces” red eléctrica vs hidráulica vs red contra incendio. Cronograma trabajos eléctricos. Revisión NP’S y especificaciones ítems eléctricos (plan de inspección y ensayos) Inicio actividad hidrosiembra en taludes de canales. Revisión ingreso de agua por canales naturales costado suroccidental y box coulvert costado Nororiental.	Interventoría 14/03/2025 Contratista 25/03/2025 Contratista 27/03/2025 Contratista 01/04/2025 Contratista 01/04/2025 Contratista 01/04/2025
36. Fecha: 26/03/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 35. Interferencia de redes. Revisión NOTAM. Informes semanales y mensuales. Avance de obra y mediciones para el acta. Pago Fallos en llenos. Situación rejilla canal perimetral y aumento de altura de las paredes. Mejoramiento terreno zona reza y franja de pista sur. Revisión componente eléctrico.	Propuesta de solución de interferencias de redes. Entrega Valla Informativa Diseño hidráulico plataforma. Hoja de vida Ingeniero eléctrico. Recorrido árboles cabecera sur e informe. Propuesta de rejilla canal de salida.	Contratista 02/04/2025 Contratista 02/04/2025 Contratista 01/04/2025 Contratista 01/04/2025 Contratista 03/04/2025 Contratista 02/04/2025

Tabla 19- Resumen de comités de obra realizados en el mes de marzo del año 2025 (fuente propia)

Como se puede observar en el mes de marzo se trataron temas importantes y necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas, también se dio trámite a las solicitudes por parte del contratista y se elaboró el cuarto corte de obra del consorcio GP Flandes, además de varias modificaciones en usos de materiales y en los procedimientos de intervención.

Se dejaron claros temas relevantes del tema de informes semanales y mensuales para la etapa de obra, y la relevancia del componente de redes de todo tipo en el proyecto.

Correspondencia

Como se puede observar en las siguientes tablas, se ha mantenido una comunicación formal y fluida entre las partes. Destacando los temas relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales, en donde el contratista ha suministrado la información solicitada por la interventoría, haciendo los ajustes requeridos y las aclaraciones pertinentes, de una manera ágil y efectiva.

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)		CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA		**Código:** FC - 01 **Revisión:** 01 **Vigencia:** Mayo de 2022
Área:	**Tecnica**	**Contrato / Obra:**	**Contrato No. 23001258 H4 2023 / Aeropuertop Flandes**	**Mejoramiento de la infraestructura lado aire del aeropuerto Santiago Vila de Flandes**
FECHA	**ASUNTO**	**CONSECUTIVO**	**DESTINATARIO**	**RESPUESTA**
1/03/2025	Solicitud de entrada y salida de volquetas por RUTA 40	15_2288_04_111	Via Sumapaz Via Bogota-Girardot, Variante	No. 20251630011911
7/03/2025	Su comunicado SPI 142/2025	15_2288_04_112	José Arcesio Vargas Benitez - Secretario de planeación e infraestructura - Alcaldía de Flandes	CIAF-1322H32023-246
10/03/2025	Su comunicado SPI 142/2025	15_2288_04_112	José Arcesio Vargas Benitez - Secretario de planeación e infraestructura - Alcaldía de Flandes	No. 1658
7/03/2025	Pago de los items 2.6, 4.3, 5.6 del formulario 1 - precios y cantidades del contrato	15_2288_04_113	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
10/03/2025	Acta de obra No. 4	15-2288-04-114	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
11/03/2025	Solicitud de entrada y salida de volquetas por RUTA 40	15-2288-04-115	ANI Agencia Nacional de Infraestructura - Via Bogotá-Girardot, Variante	
11/03/2025	Ajuste rasante pista y calles de rodaje	15-2288-04-116	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
12/03/2025	Oficio Remisorio de Acta de obra No. 4	15-2288-04-117	Representante legal de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
13/03/2025	Respuesta Memorando No. 2 - soporte técnico cambio de materiales	15-2288-04-118	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
14/03/2025	Solicitud comité No. 33 - Material de relleno para filtros.	15-2288-04-119	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
17/03/2025	Informe de fiducia consorcio GP Flandes - mes de febrero de 2025	15-2288-04-120	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	
17/03/2025	Tramite del permiso de aprovechamiento forestal	15-2288-04-121	Director de Interventoria Consorcio Aerovias Flandes	

Tabla 20 - Control de correspondencia enviada (fuente propia)

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)			CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA				**Código:** FC - 02 **Revisión:** 01 **Vigencia:** Julio de 2024
Área:	**Tecnica**	**Contrato / Obra:**	**Contrato No. 23001258 H4 2023 / Aeropuertop Flandes**	**Objeto contrato:**	**Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).**		
CONSECUTIVO INTERNO	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA OFICIO**	**ASUNTO**	**CÓDIGO DEL DOCUMENTO RECIBIDO**	**DIRIGIDO A**	**OFICIO RESPUESTA**	**OBSERVACIONES**
		5/03/2025	Devolución acta de cobro No. 4 - Febrero	CIAF-1322H32023-244	Ricardo Alberto Muñoz		
		5/03/2025	Respuesta a Solicitud presentada mediante radicado de entrada No. 20251630001084 y asunto: "Solicitud entrada y salida de volquetas por RUTA 40".	No. 20251630011911	Ricardo Alberto Muñoz		
		6/03/2025	Remisión de solicitud de intervención vial - Oficio S.P.I 142/2025	CIAF-1322H32023-246	Ricardo Alberto Muñoz		
		14/03/2025	Solicitud instalación Punto de Atención al Usuario	CIAF-1322H32023-253	Ricardo Alberto Muñoz		
		14/03/2025	No más utilización de las vías urbanas		Juan Carlos Lopez de Mesa Gutierrez		

Tabla 21 - Control de correspondencia recibida (fuente propia)

Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del contrato.

Descripción:

Este apartado del informe se enfoca en el seguimiento y control de los riesgos identificados en el contrato y en la evaluación de la efectividad de las respuestas o planes de mitigación que se han

implementado para abordarlos. Su objetivo es asegurar que los riesgos contractuales se gestionen proactivamente para minimizar su impacto negativo en el proyecto.

Contenido y Detalle:

El informe debe proporcionar una visión clara del estado de los riesgos contractuales y la implementación de las respuestas durante el período del informe (mensual). Debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

Revisión de los Riesgos Contractuales Identificados:

Lista de riesgos: Una lista de los riesgos contractuales clave que se han identificado previamente.

Estado actual de los riesgos: El estado actual de cada riesgo (por ejemplo, abierto, cerrado, en monitoreo).

Cambios en la probabilidad o impacto: Mencionar si ha habido cambios significativos en la probabilidad de ocurrencia o el impacto potencial de algún riesgo.

Nuevos riesgos identificados: Identificación de cualquier nuevo riesgo contractual que haya surgido durante el mes y su evaluación inicial.

Implementación de las Respuestas a los Riesgos:

Resumen de las respuestas implementadas: Descripción de las respuestas o planes de mitigación que se implementaron durante el mes para abordar los riesgos contractuales.

Estado de la implementación: El estado de implementación de cada respuesta (por ejemplo, completada, en progreso, pendiente).

Desviaciones de los planes originales: Mencionar si hubo alguna desviación significativa de los planes de respuesta originales y las razones de estas desviaciones.

Efectividad de las Respuestas Implementadas:

Evaluación de la efectividad: Una evaluación de la efectividad de las respuestas implementadas para mitigar los riesgos. Esto puede incluir datos cuantitativos (si están disponibles) o cualitativos basados en la observación y el juicio del equipo del proyecto.

Indicadores clave de rendimiento (KPIs): Si se definieron KPIs para medir la efectividad de las respuestas, informar sobre su estado.

Necesidad de ajustes: Identificar si es necesario realizar ajustes a las respuestas implementadas o desarrollar respuestas alternativas.

Riesgos Emergentes o Cambios en el Entorno:

Identificación de nuevos riesgos: Mencionar cualquier riesgo nuevo relacionado con el contrato que haya surgido debido a cambios en el entorno del proyecto o en las condiciones contractuales.

Evaluación inicial de los nuevos riesgos: Una evaluación inicial de la probabilidad e impacto potencial de estos nuevos riesgos.

Acciones Correctivas y Preventivas:

Acciones correctivas: Describir cualquier acción correctiva que se haya tomado para abordar los riesgos que ocurrieron o que no se gestionaron eficazmente.

Acciones preventivas: Describir cualquier acción preventiva que se esté planificando o implementando para evitar la ocurrencia de riesgos futuros.

Lecciones Aprendidas:

Lecciones aprendidas sobre la gestión de riesgos contractuales: Documentar las lecciones aprendidas durante el mes sobre lo que funcionó bien y lo que podría mejorarse en la gestión de los riesgos contractuales y la implementación de las respuestas.

En resumen, este apartado del informe debe proporcionar una visión clara de cómo se están gestionando los riesgos asociados al contrato, si las respuestas implementadas están siendo efectivas y qué acciones se están tomando para abordar nuevos riesgos o mejorar la gestión en el futuro.

Informe de monitoreo de riesgos.

A la fecha continuamos realizando la gestión de riesgo bajo la matriz presentada durante la etapa de pre-construcción. En la tabla 11 se relacionan los principales riesgos (por probabilidad e impacto) seleccionados en el análisis inicial de ocurrencia de eventos, y describiremos la materialización de algunos y el tratamiento dado por parte del contratista.

ETAPA DE CONSTRUCCION

FECHA: Noviembre de 2024

No.	Descripcion	Tipo	Tratamiento propuesto	Clasificación despues del tratamiento		
				Probabilidad	Impacto	Categoría
1	Incrementos inesperados en los costos de insumos, materiales y/o transporte y/o equipos debido a la fluctuación de los precios del mercado en el sitio y el entorno del sitio en donde se ejecutará el contrato debido a cambios intempestivos de las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado.	Económico	Tramitar el anticipo y hacer un análisis de fuente de materiales, para negociar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo de la obra.	1	2	3
2	Escases de mano de obra calificada y no calificada	Económico	Realizar la divulgación de vacantes en las diferentes plataformas y redes sociales locales. Hacer estrategias de contratación con la alcaldía del municipio de Flandes	1	2	3
3	Mayores costos del transporte de material resultante o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado.	Económico	Realizar una investigación en los predios vecinos donde se cuenta con permisos de nivelación, para disponer adecuadamente el material de excavación resultante de la obra. Reciclar material de acuerdo al PAGA, para la conformación de la capa blanda en la superficie final de las zona de seguridad.	1	2	3
4	Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones en las vias de acceso al Aeropuerto.	Social Politico	Monitorear constantemente el entorno de vecindad al aeropuerto y hacer gestión social, atender las PQRS de la comunidad vecina de forma inmediata	1	2	3
5	Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas.	Social Politico	Implementar adecuadamente un Plan de Manejo de Transito, mantener humectadas las vías de acceso al aeropuerto que son destapadas. Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social que permita mantener una comuniocación fluida y asertiva con las comunidades del entorno del Aeropuerto o de la zona de obra. Articular proyectos sociales con la alcaldía local y atender necesidades básicas de las counidades vulnerables.	2	3	5
6	Retención forzada de personal y/o equipos	Social Politico	Implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. Establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales de la zona.	2	3	5
7	Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros	Social Politico	Incluir en la matriz de interesados a los operadores del aeropuerto, gremios, proyectos de desarrollo vecinos e indagar sobre sus intereses y como gestionarlos	2	3	5
8	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Social Politico	Establecer un plan de seguridad física, contratar una empresa de seguridad y mantener comunicación con el servicio de vigilancia del aeropuerto	1	3	4
9	Terminación o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia de la ejecución de un contrato de concesión u otro contrato en ejecución y/o modificaciones al contrato de concesion u otros contratos existentes en el Aeropuerto.	Operacional	Solicitar a la interventoría información sobre contratos vigentes o en trámite del aeropuerto, tanto en su operación como en la construcción de infraestructura física	1	2	3

10	Falta del contrato suscrito de interventoría para el incio del contrato de obra	Operacional	Trasladar a la entidad, manteniendo las obligaciones del contratista de obra al día en cumplimiento de todos los requerimientos contractuales	1	3	4
12	Demoras en la expedición de permisos internos por el concesionario o el explotador del aeródromo o aeropuerto para realizar los trabajos en áreas restringidas de la zona lado tierra o lado aire del aeropuerto.	Operacional	Gestionar permiso con propietario de predio privado Conseguir concepto de franjas en el mes de noviembre 2024 Realizar trabajos en zonas donde no se requieran permisos	1	3	4
22	Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra	Operacional	Implementar un plan integral de vectores de acuerdo a la normavidad vigente aplicable	1	2	3
24	Riesgos por eventos asociados a la operación aeréa.	Operacional	Tramitar los NOTAM necesarios para la ejecución de los trabajos de construcción	1	2	3
26	No disponibilidad de "STOCK" para sistemas de ayudas visuales, cuando se afecte como consecuencia de daños causados por el contratista	Operacional	Realizar un plan de compras de acuerdo con la programación de obra y adelantar el contrato con el proveedor especializado para que inicie los procesos de importación	2	2	4
27	Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto.	Natural	Construir canales provisionales para un adecuado manejo de las aguas lluvias	2	2	4
28	Altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan la potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos	Natural	Construir vías industriales para acceder a los sitios de trabajo en donde sea posible	2	2	4
31	Ocurrencia de fenómenos naturales que puedan afectar la ejecución de la obra.	Natural	Monitorear las redes de emergencia como bomberos, defensa civil y oficina nacional de atención de desastres, para establecer los planes de contingencia que se requieran	1	2	3
32	Hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos.	Natural	Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios.	1	2	3
36	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Social Politico	Monitorear las redes sociales de la alcaldía de Flandes, La Gobernación del Tolima y su alineación con el gobierno nacional	1	2	3
37	Cambio en los indicadores de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras.	Financiero	Tramite del anticipo de obra y gestión de pago de actas con cortes mensuales, legalización de los precios No Previstos	2	3	5

Tabla 22 - Tratamiento y valoración a los riesgos de la etapa de construcción (fuente propia)

Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Como se puede observar tenemos los siguientes riesgos en color rojo, que representan una amenaza para el proyecto y que deben mantenerse monitoreados e implementar los tratamientos adecuados, como se describe a continuación:

Riesgo 4: Se puso en funcionamiento la nueva vía de acceso al aeropuerto, y se le realizo mantenimiento a la anterior vía que pasa del barrio obrero, aprovitef y la esperanza.	

Riesgos 27 y 28: Se han presentado fuertes lluvias que han inundado las zonas de trabajo generando retrasos en la ejecución de actividades de excavación, conformación de subrasante, colocación de materiales de lleno, granulares y RAP; colocación de acero de refuerzo, vaciado de concretos. Se han empleado metodologías de retiro del agua de manera manual y mecánica, extensión de jornada laboral y protección contra el flujo de agua, pero no han sido efectivas.	
Riesgo 3: Se ha logrado mitigar el riesgo de pérdidas económicas del contratista a causa del aumento de precios de materias primas y materiales en general con los proveedores del proyecto mediante pagos de anticipo con los recursos de la fiducia que administra el anticipo del proyecto.	
Riesgo 40: Respecto al NP relacionado con el asfalto, la entidad manifestó que no ve factible su inclusión bajo las condiciones establecidas, ya que implicaría que la entidad pague una actividad de menor especificación a un mayor precio que el contractual. Se enfatizó que se podría mantener el asfalto contractual conservando la misma estructura propuesta, sin necesidad de incluir el nuevo NP, dado que el cambio solo afectaría el gradiente de temperatura y no la estructura como tal. Aún está pendiente un informe con el que se pretende demostrar que la ejecución de los trabajos con un asfalto tipo PG 70-22 en lugar del PG76-10 tendría los mismos resultados en lo concerniente a acabado, durabilidad, comportamiento y demás	

propiedad físicas y químicas de la estructura final.	

Tabla 23 - Listado de riesgos gestionados con el tratamiento propuesto en la matriz

Como se puede observar en las medidas tomadas anteriormente para los riesgos materializados, el tratamiento a funcionado adecuadamente y se ha logrado mantener dentro de niveles aceptables para la ejecución. En cuanto a los otros riesgos se mantienen los tratamientos propuestos y constante monitoreo.

Informe de gestión de la participación de los interesados

Este apartado del informe se centra en la comunicación y gestión de las relaciones con todas las partes interesadas (stakeholders) del proyecto. Su objetivo principal es asegurar que los interesados estén informados, comprometidos y que sus expectativas sean gestionadas adecuadamente para contribuir al éxito del proyecto.

Identificación de los Interesados Clave:

MATRIZ DE INTERESADOS

Obra:	MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES	Fecha última actualización:	31/10/2024	CONSORCIO GP FLANDES

Parte Interesada	Nombre Contacto	Cargo	Tel/Cel	Correo electrónico	Observaciones
AEROCIVIL	Andres Arboleda Salazar	Secretario de servicios aeroporturaios	3102356471	andres.arboleda@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Alexander García	Jefe Contratos de mantenimiento Aerocivil	3112699634	alexander.garcia@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Juanita Villamizar	Supervisora del contrato	3194891110	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Johan Camilo Silva	Ingeniero de apoyo a la supervision	3166260591	camilo.silva@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Michel Moreno	Ingeniero de apoyo a la supervision	3124509795	michel.moreno@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Hayder Suarez Zamudio	Supervisor Contrato de Interventoría			
	Gilma del Pilar Lozano	Administradora Aeropuerto Flandes	3208792261	gilma.lozano@aerocivil.gov.co	Operación del aeropuerto
INTERVENTORIA	Roselly Pajaro	Representante Legal	3012331719	gerencia@gepobras.com	Resultado de interventoría
	Nelson López	Consorciado EPYPSA	3107663103	nelson.lopez@epypsa.com	Resultado de interventoría
	Alfredo Pérez Santos	Director de Interventoría	3167528617	interventoriaflandes@gmail.com	Cumplimiento del contrato
	Jose David	Residente de interventoría	3134286246	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
	Andres Carrillo	Auxiliar de ingeniería de interventoría	3208366270	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
CONTRATISTA	Juan Carlos López de Mesa	Representante Legal	3207971787	gerencia@procopal.com	Resultado del contrato de obra
	Juan Diego Blair Llorens	Gerente General Gisaico	3116297156	gerencia@gisaico.com.co	Resultado del contrato de obra
	Jose Fránklin Hincapie	Gerente UEN Infraestructura Gisaico	3104953297	franklin.hincapie@gisaico.com.co	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ruben Medina	Director técnico Procopal	3104360382	ruben.medina@procopal.com	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ricardo Alberto Muñoz	Director de obra consorcio GP Flandes	3108900285	ricardo.munoz@procopal.com	Dirección y Gestión del proyecto
	Jhon Velez	Ingeniero de apoyo	3225944964	jhon.velez@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Jose Daniel Villegas	Ingeniero residente	3148414926	jose.villegas@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Alvaro Alzate	Topografo líder oficina técnica	3136638805	alvaro.alzate@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
AUTORIDADES	Ana Judith Gamboa	Alcaldesa de Flandes	3102152832	Alcaldesa@flandes.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Adriana Magali Matiz	Gobernadora del Tolima	(608) 2611111	contactenos@tolima.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Salomón Said Arias	Alcalde de Girardot	(601) 8393510	atencionalciudadano@girardot-cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Jorge Emilio Rey	Gobernador de Cundinamarca	(601) 7490000	contactenos@cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Andrés Perez Frías	Comandante policia Flandes	3213760022	Flandes@policia.gov.co	Seguridad física
PROVEEDORES	Jorge Tobón	Evaltec	3154593672	gerencia@evaltec.com	Consultoría
	Ricardo Adame	Skytech	3105747923	ceo@skytechsas.com	Consultoría
	Wilson Castell	Cayto tractores	3102231718		Petreos y mezcla asfaltica
	Enrique Mayorga	Mavi Pavimentaciones	3153112256		Petreos y mezcla asfaltica
	Gustavo Pabón	Nautila	3142534199		Materiales petreos
	Felipe Cardenas	Base fija de operaciones - FBO	3125016916		Alquiler zonas de campamento
	Monica Sanchez	Concretos La Floresta	3203876292		Materiales petreos
COMUNIDAD	Luis Henry Varon	Predios contiguos al Aeropuerto	3173705451	henryvaron@me.com	Zodme, afirmado y vía de acceso
	Juan Carlos Ramirez	Predios contiguos al Aeropuerto	3158317059		Posible Zodme por permiso de nivel
	Diego Alvarez	Analista de rutas de SATENA	3192476210	diego.alvarez@satena.com	Nueva ruta en Flandes
	Bernardo Alvarez	Representante Inveraereas	3112365943	inveaereassas@gmail.com	Operación aeropuerto
	David Vilaro	Escuela de instrucción Aeronova	3219703344	coor.calidad@ptcacademy.net	Operación aeropuerto
	Fernando Crespo	Escuela de instrucción Aeroandes	3114428838	operacionesgirardot@aeroandes.edu.co	Operación aeropuerto
	Nestor Caballero	Escuela de instrucción Acahel	3102485525	acahel.academia@gmail.com	Operación aeropuerto
	Elizabeth Medina	Escuela de instrucción Protecnica	3142280014	sms@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Abel Urrea	Escuela de instrucción Aeroclub	3112536392	gerencia@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Ricardo Ospina - Maria Paula C	Escuela de paracaidismo SKY	3165290699	jefedeoperaciones@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Veronica Restrepo	Asociación de pilotos y aeronaves	3204960558	ricardo@skydivecolombia.com	Operación aeropuerto
	Miguel Angel Ponce	Globe Air FuelIL (combustible aviones)	3124576900	gerencia@gafcolombia.com	Operación aeropuerto
	Felipe Cardenas	FBO- Aerotaxis Guaymaral	3112365943	lfcfbo@hotmail.com	Operación aeropuerto
	Raul Carvajal	Junta de acción comunal - Los Almendros	3219464118		Bienestar para la comunidad

Tabla 24. Matriz de Interesados actualizada

No se han materializado cambios en el nivel de influencia o interés de ningún interesado clave.

Estrategias de Gestión de la Participación:

Todos los interesados cuentan con un espacio para su participación y manifestación de necesidades o expectativas en el proyecto, estos espacios son comités de obra, comités de cada componente, reuniones con la entidad contratante y con la interventoría, reuniones con los especialistas, comités

internos del contratista, reuniones con la comunidad, reuniones con proveedores, y, adicionalmente se cuentan con datos de contacto del Consorcio contratista para recibir por medio escrito cualquier comunicación o citación que requiera un interesado.

No se han realizado ajustes a las estrategias de participación debido a cambios en las necesidades o expectativas de los interesados.

Entre los temas principales tratados con los interesados en general, se encuentra lo referente al periodo de cierre del aeropuerto y a las afectaciones a la comunidad.

El nivel de compromiso actual de los interesados clave es de apoyo, no se tienen interesados con nivel de compromiso neutral o de resistencia. Por lo anterior, se concluye que no existen brechas entre el nivel de participación deseado y el nivel actual.

A la fecha no se han planeado acciones para mejorar la participación de los interesados que no están suficientemente comprometidos debido a que no sea necesario.

No se han presentado riesgos nuevos relacionados con la participación de los interesados que haya surgido durante el mes, ni incidentes o problemas que hayan afectado la relación con los interesados.

En resumen, se está llevando una buena gestión de los interesados de manera integral de cómo se están gestionando las relaciones con los interesados, asegurando que se les informa adecuadamente, se gestionan sus expectativas y se fomenta su participación para contribuir al éxito del proyecto de construcción.

La ejecución del proyecto para el mejoramiento del aeropuerto de Flandes, representa para todo el personal vinculado al proyecto una oportunidad de conocimiento de nueva normatividad aplicada a este tipo de infraestructura, mediante la divulgación del Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC14 en las charlas diarias.

También permite conocer cómo se deben desarrollan las actividades en un aeropuerto, apegados al plan de seguridad operacional aprobado por la entidad.

La conformación de diferentes grupos de apoyo para el proyecto, integrado por personal de obra, mejora sus saberes en temas complementarios, como el que se desarrolló durante el mes con apoyo del SENA para la prestación de primeros auxilios.

Gestión de recursos y adquisiciones

En cuanto a las adquisiciones resaltamos la consolidación de los equipos de la siguiente manera.

Se tiene el acompañamiento de los siguientes especialistas:

Especialidad	Nombre
Pavimentos	Stella Martínez Naranjo
Geotecnia	Jorge Alberto Tobón García
Hidrología e Hidráulica	Gloria Jenny Mejía Sierra
Eléctrico AGL	William Ricardo Adame Manosalva
Costos y Programación	Carlos Andrés Bedoya
Ambiental	Ana María Saldarriaga
Forestal	Leidy Johana Calderón

Tabla 25 - Adquisición del equipo de especialistas

Como equipo directivo y acompañamiento en la etapa de pre-construcción se tiene a las siguientes personas:

Cargo	Nombre
Director de obra	Ricardo Alberto Muñoz
Residente de obra 1	José Daniel Villegas
Residente de obra 2	Jorge Mario Soto
Ingeniero de apoyo	Jhon Edison Vélez
Jefe de topografía	Álvaro Álzate
Profesional social	Maida Berrío
Gestor SST	Alexander Acevedo
Abogada	Luz Mercedes Vélez
Especialista PMP	John Edgar Arango

Tabla 26 - Adquisición del equipo de dirección

Como equipo de construcción complementario se ha dispuesto al siguiente personal

Cargo	Nombre
Técnico Sisoma	Alex Gustavo Pachón
Auxiliar SST	Estefany Tafur
Auxiliar Social	Mary Cruz Vélez
Ingeniero mecánico	Pablo Torres
Técnicos electricistas	Cristian Castellanos, Ángel Duván Manosalva Johan Smith Rozo Julio Nova
Topógrafos	Heli Castro Villareal Nixon Arturo Calle Leonardo Miranda Álvaro Álzate
Cadeneros tecnólogos	Luisa Fernanda Perdomo David Ricardo Rodríguez Gustavo Andrés Rubiano Diana Ortiz

Tabla 27 - Adquisición del equipo de construcción

Para la elaboración de las fichas PAGA se ha contratado a la especialista ambiental Norella Galvis.

Dentro de los proveedores de materiales, se han adelantado negociaciones con los siguientes:

Proveedor	Localización	Materiales que proveen
Nautila SAS	Km 5 vía Flandes hacia El Espinal	Base y Subbase granular
MAVI Pavimentos	Km 3 vía a Carmen de Apicalá	Recebo Base y Subbase granular Mezcla asfáltica
Cantera La Colina	Km 8 vía a Melgar sector Nilo	Afirmado B400
Ferretería Multihierros Girardot	Sede principal en Girardot, fuentes de material en Melgar	Piedra rajón
Tornillería La 7a	Girardot	Materiales de construcción
Ana Carvajal	Km 3 vía a Ibagué	Combustible
Argos	Intercambiador Espinal	Concreto hidráulico
Stecker aceros	Planta de Bogotá	Acero de refuerzo

Tabla 28. Relación proveedores inscritos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Durante el mes de marzo se continuó la gestión de los trámites para conseguir los diferentes permisos que se requieren para la ejecución de la obra.

2- El consorcio GP Flandes hasta la fecha ha superado las metas propuestas en el programa de obra, alcanzando un avance del 21,32%, que corresponde al porcentaje de diferencia entre lo ejecutado y lo planeado a marzo de 2025 (incluyendo ejecución de actividades con precios no previstos). Se observa adelanto en actividades como la intervención de la pista y las calles de rodaje donde ya se ha terminado la etapa de fresado y conformación con RAP, además del descapote que ya se ha ejecutado en todas las áreas disponibles, mostrando un excelente desempeño del contratista con miras al cumplimiento de los compromisos de la FASE 2, pero la afectación de la fuerte ola invernal pone en riesgo el cumplimiento del Hito de 1.200 m para el 31 de mayo de 2025.

3- Con corte a 25 de marzo de 2025 se tiene una obra ejecutada acumulada de $17.105.928.106 (DIECISIETE MIL CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS.)

4- De acuerdo con los planes de acción de los comités de obra, se continúa con los siguientes pendientes por parte de la entidad contratante:

- Aprobación de actas de vecindad y entorno.
- Aprobación plan de aprovechamiento forestal.
- Revisión de propuesta técnica para control de microfisuras en concreto.

5- Se continúa con el trámite de aprobación de Precios No Previstos resultantes de la etapa de pre-construcción y como parte de la optimización de los diseños.

6- En la gestión de las comunicaciones se presenta un buen cuadro de control tanto de correspondencia recibida como enviada, y a la fecha no se evidencian comunicados sin respuesta mayor a una semana.

7- En la gestión del riesgo se observa que los tratamientos implementados han funcionado y que las amenazas materializadas fueron bien gestionadas, especialmente a la mitigación de afectaciones ambientales en los acopios y la vía de acceso. Se continúa gestionando las soluciones en el tema técnico de las microfisuras. Por otro lado, las estrategias de mitigación de las afectaciones por la mala temporada climática no han sido suficientes para disipar las afectaciones causadas por la misma, aunque se han ejecutado bombeos, extensiones de

jornada, protecciones; se han generado demasiados tiempos muertos que de continuar con la tendencia dicho clima, implicaría una ampliación en el plazo de la Fase 2 del proyecto.

8- En la gestión de la calidad se obtienen resultados óptimos de densidades en campo, lo que ayuda a comprobar la calidad de las fuentes de materiales para el afirmado que se requiere en el mejoramiento de la zona de seguridad. Igualmente, en lo referente a las resistencias de concreto.

9- En la gestión de las adquisiciones se destacan los equipos de personas conformadas para las diferentes etapas que conlleva el proyecto. Adicionalmente se destaca la constante disponibilidad de equipo que ha permitido obtener unos rendimientos por encima de lo esperado en las actividades de instalación de materiales granulares, y en el fresado y reciclaje de la estructura existente.

10- El contratista se encuentra al día en la entrega de los requerimientos efectuados por la interventoría y en la presentación de los informes semanales en formato de la entidad contratante.

11- A pesar de la fuerte lluvia se ha logrado mantener un ritmo de ejecución que permita continuar por encima de la línea base de cronograma, sin embargo, está pendiente realizar una reprogramación por ajustes en las actividades próximas a ejecutar y los cambios en el alcance.

ANEXOS.

ANEXO 1: Laboratorios y Ensayos.

- Copia de los laboratorios realizados durante el periodo.
- Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos.
- Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de mantenimiento.
- Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.
- Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.

ANEXO 2: Acta de obra presentada con todos sus soportes y formatos de control de programación y financiero.

ANEXO 3: Formatos de control.

- Relación de personal en obra.
- Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.
- Control climatológico y de horas trabajadas.
- Materiales en obra y programados para labor.

ANEXO 4: Registro fotográfico fechado, redactado y localizado (antes y después de las actividades ejecutadas).

ANEXO 5: Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes.

- Copia del libro diario de obra.

ANEXO 6: Informe de gestión SISOMA, para las actividades de campo, vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta área.

INFORME MENSUAL No. 11

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)



CONSORCIO GP FLANDES

CONTRATO 23001258 H4

30 DE ABRIL DE 2025

LISTA DE DISTRIBUCION

El Original y las copias del presente documento han sido entregados a las siguientes dependencias:

DEPENDENCIA	ORIGINAL	COPIA
CONSORCIO GP FLANDES	X	
CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES	X	
SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA AEROCIVIL		X

CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSION	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
28/04/2025	V1.0	Versión borrador
03/05/2025	V2.0	Versión entrega inicial
16/05/2025	V3.0	Versión final
23/05/2025	V4.0	Versión con contenido bajo Formato 8A

RESPONSABLES Y FIRMAS

NOMBRE CARGO EMPRESA	Ricardo Alberto Muñoz Director de obra Consorcio GP Flandes	John Edgar Arango Especialista PMP Consorcio GP Flandes	Consorcio Aerovías de Flandes
RESPONSABILIDAD	Elaboró	Revisó	Aprobó

Índice de contenido

Índice de contenido 3
Índice de tablas 6
Índice de ilustraciones 7
INTRODUCCION 8
DATOS GENERALES 9
Estado general del contrato 9
Información general del proyecto 9
CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10
Cumplimiento de programación, actividades, presupuesto y balance. 10
Planes de trabajo ejecutados y programados. 19
Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo del contrato de obra. 20
Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 23
Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 25
Resumen del cumplimiento del contrato de obra y actividades ejecutadas 27
Informe de cada uno de los profesionales con las actividades realizadas. 33
Certificación de pago de honorarios firmada por cada uno de los profesionales 33
REGISTRO FOTOGRÁFICO 33
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN. 50
Avance de actividades de obra 50
Gráfica avance físico del contrato de obra 50
Actividades ejecutadas en el periodo. 52
Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento. 53
Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada 55
Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios). 55
Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 56
Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 56
LABORATORIOS Y ENSAYOS. 58

Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 58
Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos. 58
Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de mantenimiento. 58
Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo. 58
Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos. 58
CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 59
Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado. 59
Soporte de las actas de pago 59
Grafica presupuestal 59
Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra. 60
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 61
Alcance administrativo 61
Alcance técnico 61
Alcance ambiental. 61
Alcance de seguros. 61
Alcance a la evaluación de riesgos. 61
Alcance contable. 62
Otros alcances de gestión. 62
FORMATOS DE CONTROL 62
Relación de personal en obra. 62
Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 62
Control climatológico y de horas trabajadas. 63
Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 63
Materiales en obra y programados para labor. 63
GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES. 64
GESTION DEL PROGRAMA DE GERENCIA 66
Informe de la dirección, gestión y control del trabajo de obra. 66
Informe de gestión del conocimiento del contrato. 67

Informe de gestión del control integrado de cambios. 67
Informe de validación y control del alcance. 69
Informe de control del cronograma. 69
Informe de control de los costos. 73
Informe de gestión y control de la calidad. 77
Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones. 78
Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del contrato. 82
Informe de monitoreo de riesgos. 84
Informe de gestión de la participación de los interesados 84
Gestión de recursos y adquisiciones 86
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 89
ANEXOS. 91
Ambiental 91
Calidad 91
Social 91
SST 91
Técnico 91

Índice de tablas

Tabla 1- Datos generales del estado de los contratos (fuente propia) 9
Tabla 2. Estado de gestiones y permisos 9
Tabla 3- Listado de actividades programadas para el mes de abril 2025 (fuente propia) 11
Tabla 4- Cumplimiento de la programación (fuente propia) 12
Tabla 5-Seguimiento a la programación de obra (fuente propia) 12
Tabla 6- Detalle inversión mensual abril de 2025 (Fuente propia) 17
Tabla 7- Resumen de actividades ejecutadas (fuente propia) 19
Tabla 8. Indicadores de gestión 21
Tabla 9. Estado pólizas Contrato Publicadas en el Secop II 21
Tabla 10. Amparo y vigencia póliza RCE 22
Tabla 11. Amparos y vigencias pólizas de cumplimiento. 23
Tabla 12- Resumen de comités de obra realizados en el mes de abril del año 2025 (fuente propia) 25
Tabla 13. Listado de riesgos gestionados con el tratamiento propuesto en la matriz 27
Tabla 14. Actividades ejecutadas en abril de 2025 53
Tabla 15. Cantidades programadas por ítem VS cantidades ejecutadas por ítem para abril de 2025 54
Tabla 16. Actividades programadas para mayo de 2025 56
Tabla 17. Cuadro de control presupuestal programado VS ejecutado 59
Tabla 18. Relación de actas de cobro a la fecha 60
Tabla 19- Control de correspondencia enviada (fuente propia) 64
Tabla 20 - Control de correspondencia recibida (fuente propia) 65
Tabla 21- Matriz de integración con las áreas de conocimiento (fuente propia) 67
Tabla 22. Resumen de la gestión de cambios propuestos. 69
Tabla 23- Actividades programadas para el mes de abril de 2025 (fuente propia) 70
Tabla 24- Recursos dispuestos para las actividades programadas en el mes 72
Tabla 25- Balance financiero del contrato con corte al acta de obra N° 6 (fuente propia) 73
Tabla 26- Análisis de precios unitarios de ítems No Previstos en proceso de aprobación 74
Tabla 27- Actividades facturadas Acta #6 de obra (fuente propia) 75
Tabla 28. Controles a implementar actividades ejecutadas mes 6. 78
Tabla 29- Matriz de interesados actualizada a abril de 2025 (fuente propia) 81
Tabla 30. Riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia. 83
Tabla 31. Matriz de Interesados actualizada 85
Tabla 32 - Adquisición del equipo de especialistas 87
Tabla 33 - Adquisición del equipo de dirección 87
Tabla 34 - Adquisición del equipo de construcción 87
Tabla 35. Relación proveedores inscritos. 88

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Curva de seguimiento a la ejecución frente a lo programado (fuente propia) 13
Ilustración 2- Mapa del clima en Colombia para el mes de abril (Fuente: IDEAM)..... 14
Ilustración 3- Pronóstico de lluvias para los meses de mayo y junio de 2025 (fuente: IDEAM) 15
Ilustración 4- Estrategia constructiva aeropuerto de Flandes (fuente propia) 19
Ilustración 5- Cumplimiento inversión por capítulos 28
Ilustración 6- Construcción de canal Norte 29
Ilustración 7- Box Coulvert Calle de rodaje Bravo 29
Ilustración 8- Construcción de Box Coulvert Calle de rodaje Alpha 30
Ilustración 9- Construcción calle de rodaje Bravo 31
Ilustración 10- Explanación de calle de rodaje Alpha..... 31
Ilustración 11- Rehabilitación de pista 32
Ilustración 12- Conformación de afirmado en zonas de seguridad..... 33
Ilustración 13. Gráfica avance físico del contrato de obra (acumulado) 51
Ilustración 14. Valor ejecutados y programados mensuales..... 51
Ilustración 15. Gráfica de control presupuestal a abril de 2025..... 60

INTRODUCCION

De acuerdo con el programa de gerencia el proyecto se desarrolla con un enfoque PREDICTIVO y en el presente informe se resumen las gestiones realizadas durante las etapas de EJECUCION, SEGUIMIENTO y CONTROL del proyecto cuyo objeto es realizar el "MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)"

En el informe de abril del año 2025, que corresponde al undécimo mes de ejecución del contrato, se presenta la gestión de las áreas de conocimiento para el buen desarrollo de las actividades de obra y el control que se adelanta tanto para el aseguramiento de la calidad como en el control de cambios.

En este informe se consignan igualmente los inconvenientes que se han tenido con el normal desarrollo del cronograma de obras, debido a los a la fuerte ola invernal en Colombia. En el periodo del mes de abril del año 2025, se logró adelantar algunas de las actividades previstas a pesar de las difíciles condiciones de trabajo, mediante la implementación de un plan de contingencia por parte del consorcio GP Flandes para mitigar las afectaciones causadas por las lluvias.

Se cumplió el tercer mes de los 4 meses previstos de cierre total del aeropuerto para llevar a cabo las actividades constructivas de la FASE 2, programado entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2025, alcanzando una ejecución del 42.75%, mostrando un gran atraso con respecto a lo programado, por lo que se solicitará mantener el cierre del aeropuerto por un mes más, con un monitoreo constante de las afectaciones por el invierno y el desarrollo de las actividades, ya que de continuar el clima como se ha venido presentando, muy seguramente tampoco se alcance el Hito para finales de junio y se deba continuar con el cierre del aeropuerto por algún tiempo más.

DATOS GENERALES

Estado general del contrato

El contrato actualmente se encuentra en etapa de construcción concentrando las intervenciones en los hitos de la FASE 2, acorde a los estudios y diseños apropiados por el consorcio GP Flandes y que fueron aprobados por la interventoría.

DATOS	CONTRATO DE OBRA	ESTADO DE AVANCE (Valores en acta de obra)	%
Contratista:	□□□□□R□I□□□□□LA□D□□□	□	□
Contrato No:	□□□□□□5□□□4□	□	□
Valor Inicial:	□4□□□□□□□□4□□□□□	□□□□□□4□□□□□□□□□□	4□□□□ □□
Plazo pre-construcción:	4□M□□□□□	□□□ □l□□□d□□□A□r□□i□d□□	□□□□ □
Plazo de construcción:	□5□M□□□□□	□□M□□□□□	4□□□□ □
Plazo total:	□□□M□□□□□	□□□M□□□□□	5□□□□ □
Fecha de iniciación:	□□□□ □□□□□□4□	□□□□br□□5□	□
Fecha de vencimiento:	□□□di□□□□□5□	□□□di□□□□□5□	□

Tabla 1- Datos generales del estado de los contratos (fuente propia)

Información general del proyecto

Para el correcto desarrollo de la etapa de construcción se deben tramitar los siguientes permisos, aprobaciones y reuniones que han continuado en el mes de abril:

DESCRIPCIÓN GESTIÓN / PERMISO	ESTADO
Trámite del permiso de aprovechamiento forestal para la tala de los 316 árboles del sector sur del aeropuerto y los 18 árboles del canal de descole por fuera del aeropuerto.	Radicado por parte de la Aerocivil ante Cortolima
Legalización de los precios No previstos y la definición del grado de desempeño del asfalto a emplear en la carpeta	En trámite
Solicitud del NOTAM para la ampliación del cierre del aeropuerto.	En trámite
Instalación de Valla Informativa	Ejecutada

Tabla 2. Estado de gestiones y permisos

En el mes de abril se adelantaron reuniones entre las partes involucradas en el componente forestal, con el fin de articular criterios y agilizar el trámite ante la autoridad para radicar el plan de aprovechamiento forestal ante CORTOLIMA.

Igualmente se avanza en la legalización de los precios No Previstos, resultantes de la etapa de pre-construcción, para lo cual se han realizado mesas de trabajo en conjunto con la interventoría, en donde se solicita por parte del consorcio GP Flandes, el reconocimiento de la mezcla asfáltica usando como aglutinante un asfalto de grado de desempeño PG 70-10 como lo indica la especificación del formato 8B de los pliegos de condiciones, debido a la inconsistencia con el formulario de precios del contrato.

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Cumplimiento de programación, actividades, presupuesto y balance.

Para la etapa constructiva se presenta un cronograma basado en las cantidades de obra actualizadas en el presupuesto del diseño ajustado y la estrategia constructiva aprobada. Para el mes de abril se tenían programadas desde la línea base las siguientes actividades:

1	***GENERALES***
1.1	*LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD*
2	***REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA***
2.1	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*
2.3	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*
2.4	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.*
2.5	*SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)*
2.6	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10*
2.8	*SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.*
NP-02	*SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA*
3	***NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA***
3.1	*DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)*
3.3	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.*
NP-03	*TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD*
4	***REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA***
4.1	*FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*

4.2	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).*
4.3	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10*
4.5	*SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.*
4.6	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*
4.7	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*
4.8	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.*
7	***SISTEMA DE DRENAJE***
7.1	*DEMOLICIÓN DE TRAMO EXISTENTE DE CANAL (DEMOLICIÓN DE SECCION DE 3 METROS DE CANAL PARA LA EXCAVACIÓN DE LA OBRA DE DESCARGA). INCLUYE RETIRO*
7.2	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*
7.3	*CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.*
7.13	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)*
NP-04	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERÍA 4")*
NP-05	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6")*
NP-06	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8")*
NP-09	*REVESTIMIENTO DE CANAL CON PIEDRA PEGADA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS*
8	***BOX COULVERT***
8.1	*EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.*
8.2	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy' 60000 psi)*
8.3	*RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT*
8.4	*CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC*
8.5	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*
10	***OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS***
10.1	*CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 60 X 60 X 120 CM INTERIORES CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 274 CODENSA*
10.2	*CONSTRUCCIÓNDE LAS CÁMARAS DE TIRO HALADO DE MEDIDAS 70 X 120 X 170 CM INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 275 CODENSA*
10.3	*CANALIZACIÓN DE DOS (2) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*
10.4	*CANALIZACIÓN DE UN (1) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*
10.5	*CANALIZACIÓN DE UN (4) DUCTOS DE 4" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*

Tabla 3- Listado de actividades programadas para el mes de abril 2025 (fuente propia)

Sin embargo y debido a la falta de aprobación de los ítems No Previstos no se han podido avanzar en actividades, tales como, subbase reciclada, filtros y adecuación de cuarto eléctrico, esto aunado a las afectaciones por el invierno, al cierre del mes de abril muestra una desaceleración en la ejecución con respecto a la línea base, presentando un atraso de 6 días.

Basados en la ejecución de las actividades de la tabla 3, se presenta semanalmente un informe con el avance del proyecto, completando al corte del presente informe lo correspondiente a la semana 48 desde el inicio del contrato un atraso de $ 613 millones, como se muestra en la siguiente tabla.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL DE OBRA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 9

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		FECHA:		25-abr-25
Semana No	48	Del :	19-abr-25	AL:	25-abr-25
Plazo Total		582	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		332	días		
Porcentaje del tiempo transcurrido(%)		57,04%			
Nombre del Supervisor :		ING. JUANITA VILLAMIZAR			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA LADO AIRE DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado construcción	2,27%	41,98%	(%) Ejecutado	1,51%	40,72%
Valor programado ($)	$ 1.102.036.291	$ 20.411.471.119	Valor ejecutado($)	$ 733.701.788	$ 19.797.474.980
			Evaluación	Avance =	-1,26%
				Valor avance =	-$ 613.996.139

Tabla 4- Cumplimiento de la programación (fuente propia)

Como se puede observar, se lleva un leve atraso del 1,26% del total del contrato en ejecución (en financiero es menos como veremos más adelante), con respecto a lo planeado con corte al 25 de abril de 2025.

Período de Ejecución		Proyectado ($ millones)			Ejecutado ($ millones)	
Mes	Fase	Ejecución Mensual	Vr. x FASE	Proyección Acumulada	Ejecución Periodica	Ejecución Acumulada
may-24	PRE CONSTRUCCIÓN	$ 1	$ 190	$ 1	$ -	$ -
jun-24		$ 68		$ 69	$ 94	$ 94
jul-24		$ 78		$ 147	$ 71	$ 165
ago-24		$ 43		$ 190	$ 48	$ 213
sep-24		$ -		$ 190	$ 16	$ 229
oct-24		$ -		$ 190	$ -	$ 229
nov-24	FASE 1	$ 1.114	$ 6.571	$ 1.304	$ 2.321	$ 2.550
dic-24		$ 3.747		$ 5.050	$ 3.895	$ 6.445
ene-25		$ 1.711		$ 6.761	$ 3.410	$ 9.855
feb-25	FASE 2	$ 3.847	$ 21.775	$ 10.608	$ 3.969	$ 13.824
mar-25		$ 3.491		$ 14.099	$ 3.282	$ 17.106
abr-25		$ 6.612		$ 20.711	$ 3.450	$ 20.556
may-25		$ 7.825		$ 28.536		
jun-25	FASE 3	$ 5.961	$ 19.545	$ 34.497	$ -	
jul-25		$ 4.733		$ 39.230	$ -	
ago-25		$ 3.374		$ 42.605	$ -	
sep-25		$ 3.616		$ 46.221	$ -	
oct-25		$ 906		$ 47.127	$ -	
nov-25		$ 955		$ 48.082	$ -	
dic-25		$ -		$ 48.082	$ -	

Tabla 5-Seguimiento a la programación de obra (fuente propia)

Página

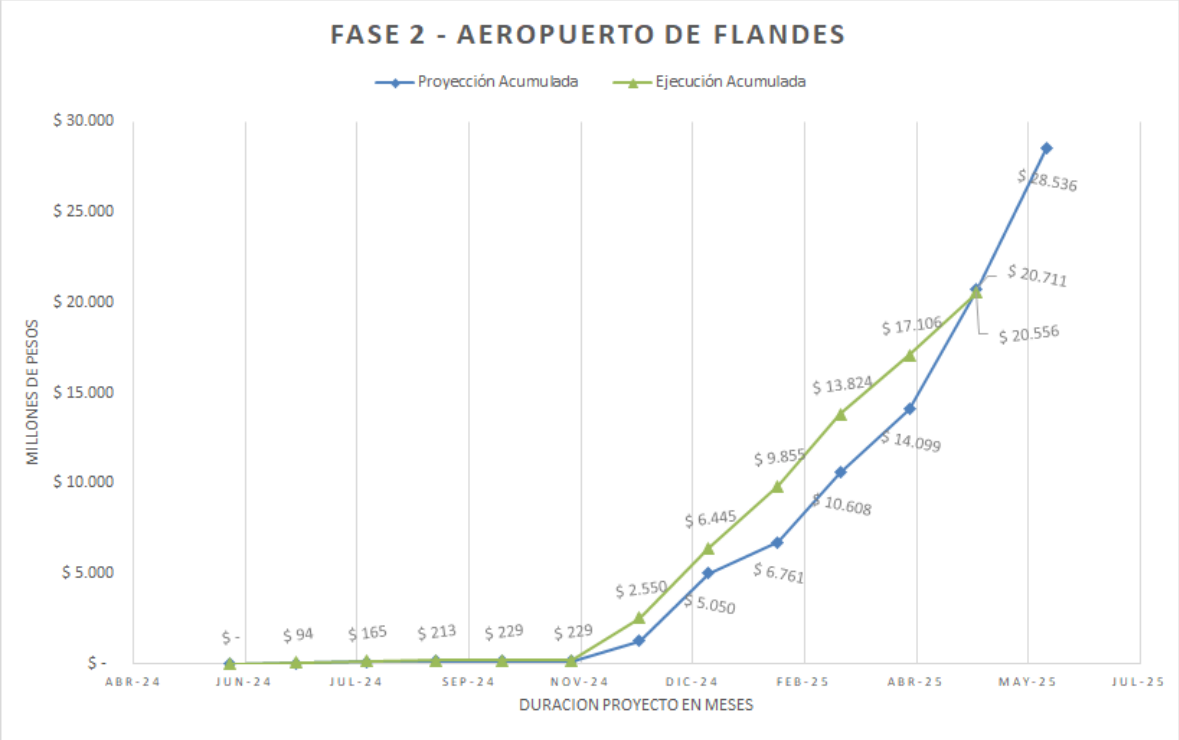


Ilustración 1. Curva de seguimiento a la ejecución frente a lo programado (fuente propia)

En los informes semanales se presenta un registro fotográfico que muestra la ejecución de las tareas descritas complementado con un seguimiento a la inversión para llevar un registro del avance de la ejecución.

Igualmente se llevan a cabo comités semanales de seguimiento en compañía de la supervisión y la interventoría, se hacen mesas de trabajo sobre temas importante, reuniones de socialización con diferentes interesados y el control de correspondencia.

Se avanza en todas las actividades programadas para los diferentes frentes de trabajo y se cuenta con todos los recursos necesarios, tales como, personal, herramienta menor, materiales, laboratorio en obra, volquetas, maquinaria y equipos, además de la logística necesaria para el desarrollo de las actividades constructivas. En este aspecto más adelante se detallará el plan de contingencia que ha implementado el consorcio GP Flandes, para mitigar el impacto por los tiempos muertos, mediante el incremento de la fuerzo productiva, tanto en equipos como en personal.

El clima en el municipio de Flandes - Tolima, durante el mes de abril de 2025 ha sido más lluvioso de lo normal de acuerdo a los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), donde se ha informado que la primera temporada de lluvias del año, que normalmente va

de marzo a junio, ha presentado precipitaciones superiores al promedio histórico y se observa que abril es el mes con mayor intensidad de lluvias de lo corrido del año, con incrementos de hasta un 50% en comparación con años anteriores.

La Influencia de fenómenos climáticos globales, como el fenómeno de La Niña, ha aumentado de las precipitaciones en todo el territorio nacional. Además, la oscilación de Madden-Julian, una fase climática que afecta la actividad convectiva en los trópicos ha contribuido a intensificar las lluvias en varias regiones del país.

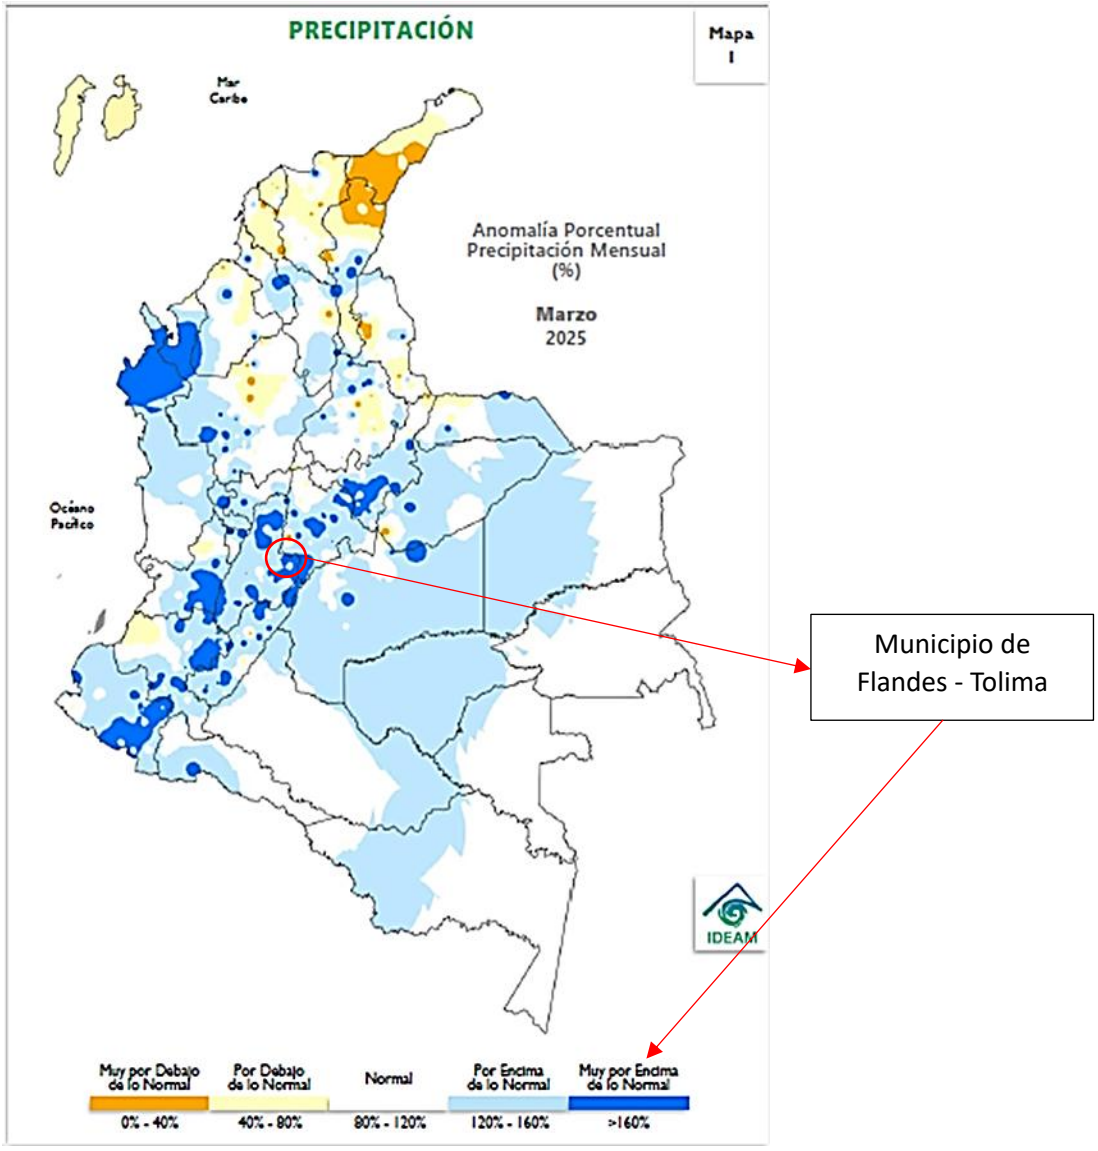


Ilustración 2- Mapa del clima en Colombia para el mes de abril (Fuente: IDEAM)

Como se puede observar en el mapa anterior publicado por el IDEAM, el incremento de las lluvias para la zona del municipio de Flandes se encuentra “MUY POR ENCIMA DE LO NORMAL”. Lo cual ha sido evidente en el aeropuerto, causando inundaciones de las áreas de trabajo, lo cual ha dificultado el normal desarrollo de las actividades constructivas.

Pronóstico en el departamento del Tolima

El IDEAM ha emitido alertas específicas para varios municipios del Tolima debido al aumento de las lluvias y el riesgo de deslizamientos. Municipios como Ataco, Natagaima y Ortega están en alerta roja, mientras que Flandes se encuentra en alerta amarilla. Estas alertas indican un riesgo moderado de deslizamientos y otros eventos asociados a las lluvias intensas. Además, se han reportado inundaciones en municipios como Chaparral y en la vía que conduce a Ataco, lo que ha llevado a las autoridades a coordinar acciones de mitigación, como el dragado de afluentes.

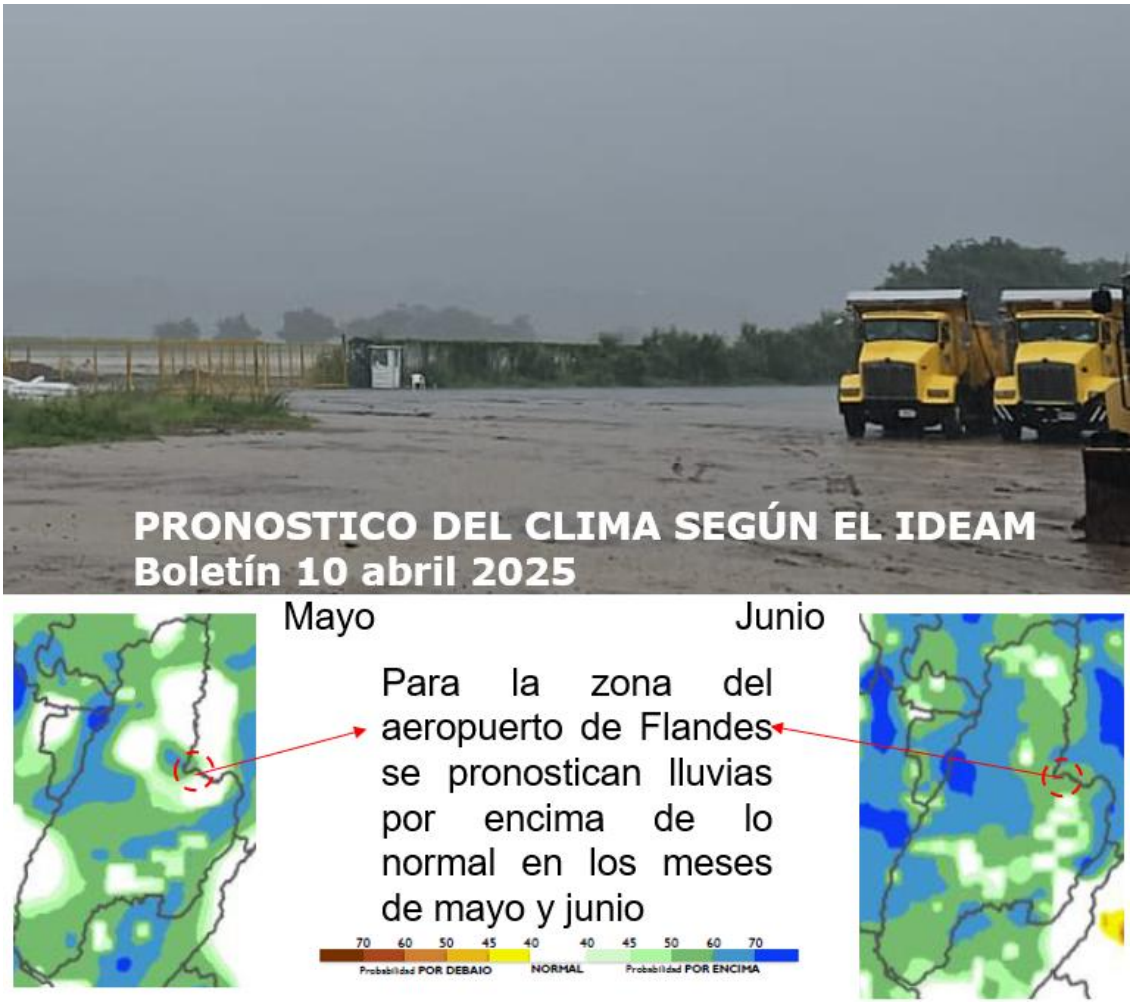


Ilustración 3- Pronóstico de lluvias para los meses de mayo y junio de 2025 (fuente: IDEAM)

Como se puede observar en los gráficos anteriores el pronóstico no es bueno para la ejecución de las actividades de obra, dado que se muestra que el mes de junio, será aún mas lluvioso que mayo.

Presupuesto de obra

Para el mes de abril de 2025 se tenía prevista la siguiente inversión presupuestal acorde al programa de trabajo y el flujo de inversión:

Totales		**$ 6.612.217.746**
1	***GENERALES***	***$ 91.878.856***
1.1	*LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD*	$ 91.878.856
2	***REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA***	***$ 2.694.187.420***
2.1	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	$ 54.953.468
2.3	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	$ 151.327.877
2.4	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.*	$ 81.267.806
2.5	*SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)*	$ 706.643.508
2.6	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10*	$ 1.506.562.825
2.8	*SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.*	$ 82.939.385
NP-02	*SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA*	$ 110.492.550
3	***NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA***	***$ 1.185.423.464***
3.1	*DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)*	$ 906.545.660
3.3	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.*	$ 134.188.409
NP-03	*TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD*	$ 144.689.395
4	***REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA***	***$ 1.102.044.442***
4.1	*FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	$ 9.285.174
4.2	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).*	$ 113.185.716
4.3	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10*	$ 316.096.000
4.5	*SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.*	$ 11.066.952
4.6	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	$ 212.211.000
4.7	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	$ 265.089.600
4.8	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.*	$ 175.110.000

7	***SISTEMA DE DRENAJE***	**$ 450.950.631**
7.1	*DEMOLICIÓN DE TRAMO EXISTENTE DE CANAL (DEMOLICIÓN DE SECCION DE 3 METROS DE CANAL PARA LA EXCAVACIÓN DE LA OBRA DE DESCARGA). INCLUYE RETIRO*	$ 13.466
7.2	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	$ 72.044.579
7.3	*CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.*	$ 74.357.490
7.13	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)*	$ 56.566.604
NP-04	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERÍA 4")*	$ 6.841.987
NP-05	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6")*	$ 136.015.459
NP-06	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8")*	$ 99.706.576
NP-09	*REVESTIMIENTO DE CANAL CON PIEDRA PEGADA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS*	$ 5.404.469
8	***BOX COULVERT***	**$ 394.848.591**
8.1	*EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.*	$ 44.585.908
8.2	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)*	$ 139.033.111
8.3	*RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT*	$ 3.704.713
8.4	*CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC*	$ 191.125.474
8.5	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	$ 16.399.385
10	***OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS***	**$ 692.884.342**
10.1	*CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 60 X 60 X 120 CM INTERIORES CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 274 CODENSA*	$ 59.996.870
10.2	*CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 70 X 120 X 170 CM INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 275 CODENSA*	$ 9.096.987
10.3	*CANALIZACIÓN DE DOS (2) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	$ 54.384.675
10.4	*CANALIZACIÓN DE UN (1) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	$ 65.564.280
10.5	*CANALIZACIÓN DE UN (4) DUCTOS DE 4" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	$ 503.841.530

Tabla 6- Detalle inversión mensual abril de 2025 (Fuente propia)

Para el mes de abril, se logró realizar una facturación de $ 3.506 millones, encontrándonos por debajo del valor programado para este mes, básicamente debido al invierno atípico y sus consecuencias evidentes en las zonas de trabajo, reprocesos y tiempos muertos de ejecución, sin embargo, el consorcio GP Flandes ha realizado grandes esfuerzos para aprovechar los tiempos secos mediante las siguientes acciones:

- ✓ Aumento de equipos para la construcción: Con esto se logró mejorar los rendimientos, dado que para procesar algunos materiales necesarios en las obras fue necesario extenderlos para que secaran, esta actividad adicional requiere de mayores recursos y se consiguió optimizar los tiempos secos para avanzar en alguna medida, en las actividades programadas.
- ✓ Aumento de la planta de personal: En el mes de abril se reforzaron las actividades constructivas en los box Coulvert, introduciendo un contratista de mano de obra local, para ejecutar más obra en los tiempos secos, con lo cual se logró terminar el box Coulvert de la calle de rodaje Bravo y avanzar a un 60% el box Coulvert de la calle de rodaje Alpha.
- ✓ Construcción de canales provisionales: con esta medida se logró acelerar el drenaje de las áreas inundadas hacia los canales perimetrales y de esta forma aprovechar mejor los tiempos secos y disminuir las afectaciones por las lluvias.
- ✓ Aceleración de las excavaciones en canales perimetrales: Con la implementación de un paso provisional en la calle de rodaje Bravo 1, se logró desaguar el costado sur-oriental del aeropuerto para conseguir la evacuación de las zonas de seguridad que estaban inundadas.

Con las anteriores medidas se lograron adelantar las siguientes actividades:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES	VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 6	
		UND.	CANT	V/ PARCIAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD)	M2	52.070,0	$ 114.554.000
2.1	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	755,6	$ 49.642.920
2.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	755,6	$ 123.918.400
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	7,5	$ 1.462.500
2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)	M3	2.182,5	$ 458.477.775
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	5.650,3	$ 371.224.710
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	M3	8.583,3	$ 1.235.995.200
5.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	449,7	$ 29.545.290
5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	321,5	$ 52.726.000
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	746,6	$ 145.587.000
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	448,0	$ 94.111.360
7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.353,7	$ 88.938.090
7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	M3	58,6	$ 58.713.039
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	768,7	$ 7.729.279
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	33.132,5	$ 333.147.288
8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	M3	195,7	$ 324.604.459

Tabla 7- Resumen de actividades ejecutadas (fuente propia)

Planes de trabajo ejecutados y programados.

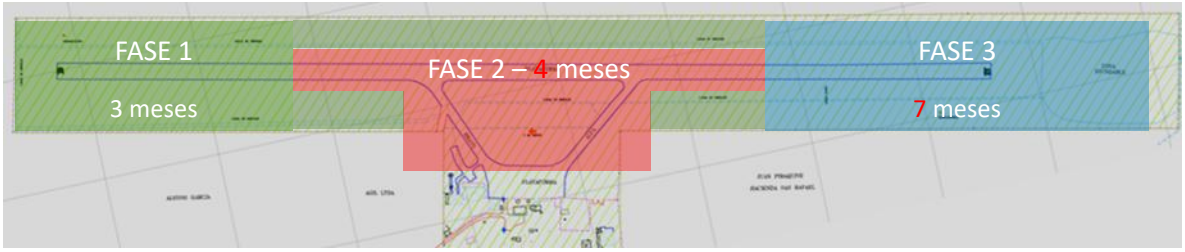


Ilustración 4- Estrategia constructiva aeropuerto de Flandes (fuente propia)

Actualmente nos encontramos en la FASE 2, donde se tiene el HITO de 1.200 m de pista pavimentada para el día 31 de mayo de 2025.

Los retrasos por el invierno han afectado el cumplimiento del HITO, por lo cual se solicitará la ampliación de la FASE 2 por un mes más, llevando el cierre del aeropuerto hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, si el invierno continúa de la forma como se ha venido presentando, es probable que no se logre cumplir para esta fecha, dado que la aplicación de mezcla asfáltica requiere 20 días corridos de tiempo seco.

Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo del contrato de obra.

Gestión Técnica – Obra Civil

Durante el mes de abril se avanzó en los frentes de obra correspondientes a pista, calles de rodaje Alpha y Bravo, box coulverts, zonas de seguridad y sistemas de drenaje. Se ejecutaron actividades de excavación, conformación de base y subbase, vaciado de concreto, y mejoramiento de zonas afectadas por fallos en la subrasante. Se destaca la culminación del box coulvert de la calle de rodaje Bravo y el 60% de avance del de la calle Alpha.

Gestión Eléctrica

Se adelantaron las adecuaciones previas para la instalación de ductos eléctricos. Se replanteó el paso de las canalizaciones, definiendo su alineamiento paralelo al box coulvert con aprobación de la interventoría. Además, se identificaron necesidades de drenaje en las cajas eléctricas, las cuales fueron incluidas como solicitud de cambio.

Gestión Ambiental

Se continuó con el trámite del permiso de aprovechamiento forestal ante CORTOLIMA, adelantando reuniones con la interventoría, Aerocivil y el equipo forestal. Se instalaron cerramientos perimetrales de señalización para proteger los árboles susceptibles de tala. Se construyeron canales provisionales para manejo de aguas lluvias y se implementaron acciones para evitar erosión de taludes y canales sin revestimiento.

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Durante el mes se realizaron jornadas de sensibilización en prevención de enfermedades tropicales, como fiebre amarilla, incluyendo vacunación. Se mantuvieron los controles de ingreso, uso de EPP y vigilancia a condiciones climáticas. No se presentaron accidentes laborales durante el mes reportado.

Gestión Social

Se realizó una jornada de socialización del proyecto con la comunidad aledaña, incluyendo visitas puerta a puerta. Se logró la vinculación de 99 personas locales, representando el 63% del personal total. Se atendieron requerimientos de veeduría y se sostuvo reunión con la Contraloría para presentar avances y condiciones de ingreso.

Indicador	Meta / Esperado	Logrado abril 2025	Observaciones
Avance físico acumulado del contrato	≥ 45%	42,75%	Atraso por condiciones climáticas extremas
Avance financiero acumulado del contrato	≥ 45%	40,6%	Correspondientes al acta de obra No. 6
Porcentaje de personal local contratado	≥ 60%	63%	Cumplido
Actividades críticas ejecutadas dentro del cronograma	100%	85%	Algunas suspendidas por lluvias / reprocesos
Ensayos de laboratorio con cumplimiento técnico	100%	95%	13 de 15 densidades cumplieron. Se tomaron medidas correctivas.
Actividades ambientales ejecutadas según plan	≥ 90%	85%	Se mantiene pendiente aprobación de aprovechamiento forestal
Acciones correctivas SST implementadas	100%	100%	Vacunación, jornadas, uso de EPP

Tabla 8. Indicadores de gestión

Pólizas y garantías de cumplimiento

Las garantías del contrato se encuentran expedidas, firmadas, aportadas a la entidad y publicadas en la plataforma SECOP II del contrato:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.14947405	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2,431,030,239.00 COP	JMalucelli Travelers	12/31/2025 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.14945596	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	51,007,098,665.00 COP	JMalucelli Travelers	1/1/2031 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle	

Tabla 9. Estado pólizas Contrato Publicadas en el Secop II

Es de anotar que en la plataforma del SECOP II, la entidad contratante aún no ha aprobado la última versión de las pólizas correspondiente a la actualización con el acta de inicio.

A continuación, describimos en detalle los amparos, vigencias y montos de las garantías del contrato:

Identificación de la garantía	CO1.WRT.14947405
Referencia de la garantía	**RCE**
Estado	Pendiente de aprobación por la entidad en SECOP II
Justificación	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Responsabilidad civil extracontractual
Tipo de garantía	• Contrato de seguro
Entidad aseguradora	JMalucelli Travelers
Número de póliza	2057668
Tomador	CONSORCIO GP FLANDES
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extracontractual	2,431,030,239.00 COP	12/31/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Tabla 10. Amparo y vigencia póliza RCE

Identificación de la garantía	CO1.WRT.14945596
Referencia de la garantía	**Cumplimiento**
Estado	Pendiente de aprobación por la entidad en SECOP II

Justificación	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Responsabilidad civil extracontractual
Tipo de garantía	Contrato de seguro
Entidad aseguradora	JMalucelli Travelers
Número de póliza	2057667
Tomador	CONSORCIO GP FLANDES
Beneficiario	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11,302,256,916.00 COP	5/1/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14,586,181,434.00 COP	5/1/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	9,724,120,956.00 COP	1/1/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	14,586,181,434.00 COP	1/1/2031 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	808,357,925.00 COP	1/1/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Tabla 11. Amparos y vigencias pólizas de cumplimiento.

Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.

Durante el mes de abril del año 2025 se realizaron 5 comités de obra, como se relaciona a continuación:

Comité No.	Temas de la reunión	Planes de acción	Cumplimiento
37. Fecha: 04/04/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 36. Revisión y firma acta N°5 de obra. Pagos pendientes de actas y órdenes de giro fiducia. Avance de obra – afectaciones por el clima. Retrasos en actividades de la ruta crítica por las intensas lluvias.	Firma del Acta 04 Remisión de la Operación de Fiducia No. 06 Firma de la Operación de Fiducia No. 06 Informe patología de fallos Presentar tema afectación por lluvias a la Entidad Radicar Oficio en donde se estipule la fecha límite para ingresar e intervenir el cuarto de reguladores	Interventoría 08/04/2025 Contratista 04/04/2025 Interventoría 09/04/2025 Contratista (sin definir) Interventoría (sin definir) Contratista (sin definir)
38. Fecha: 11/0/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 37. Revisión y firma acta N°5 de obra. Avance de obra – afectaciones por el clima. NOTAM NP'S Permiso de aprovechamiento forestal	Revisión de los documentos de la Operación No. 06 de la Fiducia. Remisión de la gestión realizada por el contratista para el trámite y obtención del permiso de aprovechamiento forestal. Evaluación interna respecto al trámite de aprovechamiento forestal, y programación de una reunión con asistencia de i) Contratista, ii) Interventor y iii) Especialista forestal y Abogada apoderada de Aerocivil. Remitir la información del aumento de lluvias y del posible traslado del NOTAM a los operadores del aeropuerto.	Interventoría 16/0/2025 Contratista 14/04/2025 Aerocivil 06/03/2025 Contratista 26/03/2025 Aerocivil
39. Fecha: 16/04/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 38. Revisión y firma acta N°5 de obra. Avance de obra – afectaciones por el clima. Permiso de aprovechamiento forestal	Reunión: Contratista, Interventor, Especialista forestal y Abogada apoderada de Aerocivil. Propuesta de diseño cajas y drenajes bajo calles de rodaje	Aerocivil 23/04/2025 Contratista 22/04/2025
40. Fecha: 23/04/2025	Verificación – presentaciones participantes Revisión compromisos comité 39. Revisión y firma acta N°5 de obra. Avance de obra – afectaciones por el clima.	Radicar respuesta a observaciones de NP´s Radicar respuesta a observaciones de la Autoridad Ambiental Remitir a la interventoría oficio comunicando que iniciará el desarrollo de las actividades en el cuarto eléctrico.	Interventor, 25/04/2025 Interventor, 25/04/2025 Contratista, 30/04/2025

	NP'S Permiso de aprovechamiento forestal Obras cuarto eléctrico Veeduría PQR lote privado	Remitir al contratista oficio tipo para que responda el requerimiento de la veeduría Creación de una carpeta en la nube para remitir material audiovisual del proyecto Remisión a la Interventoría de las Actas de comité de obra que se encuentren en su revisión	Aerocivil, Una vez el equipo legal de la Entidad 5elabore el documento Contratista, 30/04/2025 Contratista, 30/04/2025

Tabla 12- Resumen de comités de obra realizados en el mes de abril del año 2025 (fuente propia)

Como se puede observar en el mes de abril se trataron temas importantes y necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas, también se dio trámite a las solicitudes por parte del contratista y se elaboró el cuarto corte de obra del consorcio GP Flandes, además de varias modificaciones en usos de materiales y en los procedimientos de intervención.

Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Como se puede observar tenemos los siguientes riesgos en color rojo, que representan una amenaza para el proyecto y que deben mantenerse monitoreados e implementar los tratamientos adecuados, como se describe a continuación:

Riesgos 27 y 28: Se han presentado fuertes lluvias que han inundado las zonas de trabajo generando retrasos en la ejecución de actividades de excavación, conformación de subrasante, colocación de materiales de lleno, granulares y RAP; colocación de acero de refuerzo, vaciado de concretos. Se han empleado metodologías de retiro del agua de manera manual y mecánica, extensión de jornada laboral y protección contra el flujo de agua, pero no han sido efectivas. Este riesgo se encuentra materializado de manera que por motivo del mismo ya la ejecución se encuentra por debajo de lo programado a la fecha, y va a seguir aumentándose el desfase si continúa el atípico invierno.	

Riesgo 31 y 39: Frente a la presencia de fallos en la estructura de la pista, el Director de la Interventoría, identifica como su posible causa la presencia de suelos limosos con presencia de material orgánico, los cuales pueden estar presentes en otras zonas de la pista y generar inconvenientes a futuro, situación que ha sido agravada por las fuertes precipitaciones que han ocasionado que las aguas lluvias se infiltren y lleguen hasta la subrasante, Por tal motivo, se establece la necesidad de contar con un informe técnico que identifique la patología que originó los fallos y que presente una alternativa de solución integral, documento cuya elaboración está a cargo de la interventoría.	
Riesgo 40: Respecto al NP relacionado con el asfalto, la entidad manifestó que no ve factible su inclusión bajo las condiciones establecidas. Aún está pendiente la aprobación por parte de la entidad contratante	

Riesgo 23, 27, 28, 31 y 39: El director de Obra indica que, con base en mediciones pluviométricas realizadas por su cuenta, y con base en los registros históricos, ha evidenciado que las lluvias presentadas durante los meses de marzo y abril de presente año, presentan un régimen más intenso que el promedio histórico, razón por la cual, concluye que de continuar las lluvias se afectará el hito del 31 de mayo. A lo cual, el director de la Interventoría se compromete a presentar el tema a la supervisión de la Entidad.	

Tabla 13. Listado de riesgos gestionados con el tratamiento propuesto en la matriz

Como se puede observar en las medidas tomadas anteriormente para los riesgos materializados, el tratamiento ha funcionado adecuadamente y se ha logrado mantener dentro de niveles aceptables para la ejecución, sin embargo, es posible que se deban tomar medidas adicionales referentes a ampliación de plazos de etapas de intervención (NOTAM). En cuanto a los otros riesgos se mantienen los tratamientos propuestos y constante monitoreo.

Resumen del cumplimiento del contrato de obra y actividades ejecutadas.

En la Ilustración 5 se puede observar el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el mes de abril de 2025, de acuerdo a la programación de obra.

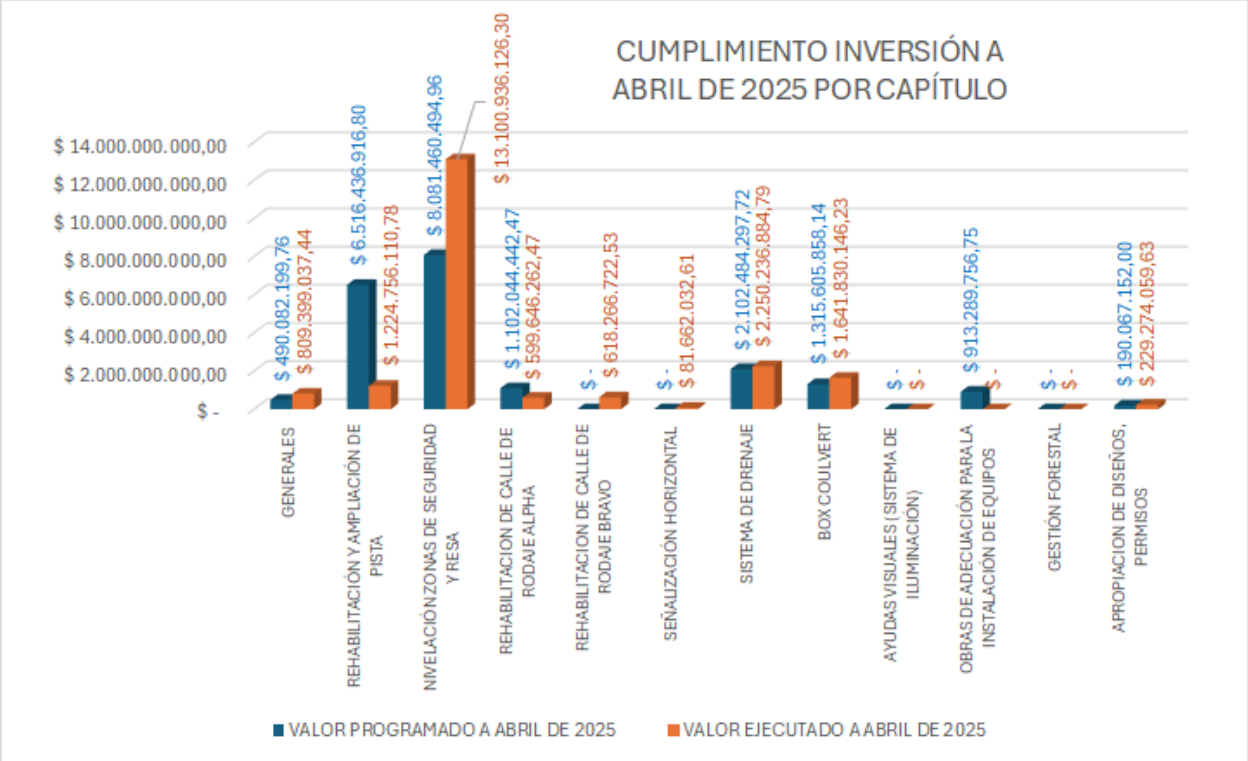


Ilustración 5- Cumplimiento inversión por capítulos

Por otro lado, el mes de abril de 2025 contempló la continuidad de ejecución de siete (7) frentes de trabajo simultáneos, distribuidos así:

Frente 1. Canales: En este frente, se continúa con la excavación del canal derecho entre las abscisas K1+100 a K1+200 y se logra el revestimiento con concreto de 6 placas para los canales entre las calles de rodaje alpha y bravo.



Ilustración 6- Construcción de canal Norte

Frente 2: Box coulvert calle de rodaje Bravo. En este frente la estructura ya se encuentra terminada, se realizaron los aproches sobre la calle de rodaje y se instaló subbase granular sobre la estructura de concreto. Se hace el replanteo del paso de tuberías eléctricas y se definió con interventoría hacerlo paralelo al alineamiento del box.



Ilustración 7- Box Coulvert Calle de rodaje Bravo

Frente 3: Box Coulvert calle de rodaje Alpha. En este frente, se logró terminar todo el piso del box y se avanzó en muros laterales en un tramo de 8m en el sector central.



Ilustración 8- Construcción de Box Coulvert Calle de rodaje Alpha

Frente 4: Calle de rodaje Bravo. Se avanza en la instalación de subbase granular FAA P-209, se logra instalar el material a lo largo de toda la calle, incluso sobre el box coulvert, se deja por ceros a los niveles por topografía y está pendiente validar densidades para avanzar a la capa de base granular.



Ilustración 9- Construcción calle de rodaje Bravo

Frente 5: Calle de rodaje Alpha. Luego de la excavación, se logra drenar la zona y se prepara la superficie para iniciar la instalación de subbase en el sector aledaño a la plataforma. En el sector aledaño a la pista se debe completar el nivel con material tipo afirmado B-400, en este empalme con la pista se tuvo mayor afectación por la inundación, pero se logra recuperar para avanzar con la subbase. En la zona comprendida entre plataforma y box coulvert, se liberaron las áreas de subbase, mientras que en la zona entre box coulvert y pista se completó la instalación de la capa de piedra rajón, la cual fue aceptada por la interventoría. Esto permite continuar con la instalación de la subbase en la zona correspondiente. Se suspendieron las actividades a mediados del mes hasta que se termine el box coulvert que atraviesa la Calle.



Ilustración 10- Explanación de calle de rodaje Alpha

Frente 6: Pista, En este frente se realiza la instalación y conformación de base granular. Asimismo, se avanza en la conformación en subbase reciclada. Fue necesario implementar actividades de retiro de fallos presentados en la subrasante.



Ilustración 11- Rehabilitación de pista

Frente 7: Zonas de seguridad. Este frente se divide en dos partes, la primera corresponde al mejoramiento con afirmado que se está instalando en ambos costados, en esta zona se logró avanzar con la instalación de material de segunda capa. La otra parte corresponde al cereo de la subrasante por ambos costados, en donde las lluvias causaron reprocesos y reconformación del material, en este frente se autoriza la conformación y colocación de afirmado para evitar que futuras lluvias sigan dañando la subrasante. Adicionalmente se la construcción de filtros por el costado izquierdo, sector norte de la pista en 6" y 8".



Ilustración 12- Conformación de afirmado en zonas de seguridad

Informe de cada uno de los profesionales con las actividades realizadas.

Como anexos al presente informe, se hace entrega de la documentación de los componentes ambiental, calidad, social, SST y técnico; donde se encuentran los respectivos informes para cada una de las áreas.

Certificación de pago de honorarios firmada por cada uno de los profesionales.

Debido a que se tienen unas cuentas por pagar aún pendientes por parte de los especialistas que se encuentran contratados por contrato de prestación de servicios y/o contratos de consultoría, esta información se remitirá particularmente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de junio de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante el mes de abril del año 2025 se llevaron a cabo actividades de obra, como se muestra en el siguiente registro:

1- Actividades de replanteo, localización y levantamientos topográficos (se mantuvieron entre 4 y 6 comisiones de topografía durante todo el periodo)





Se realiza localización y replanteo, y chequeo de niveles de excavación en los diferentes frentes de trabajo que se tienen en obra, tales como pista, calles de rodaje, box Coulvert en las calles de rodaje Bravo y Alpha, los canales y las zonas de seguridad en los costados noroccidental y nororiental.

2-□ Reparaciones en la Subrasante.





Aunque ya se habían culminado las actividades de fresado y mezclado de subbase granular, logrando reciclar el material tipo RAP, las fuertes lluvias saturaron los materiales y el agua logró penetrar el mejoramiento existente y llegar hasta la subrasante, en donde en algunos sectores de la pista se encontraba un suelo limo arcilloso muy plástico, de color negro que al contacto con el agua genera inestabilidad de las capas superiores.

En revisión con el personal de la interventoría en sitio, se decidió retirar el material bueno correspondiente a la estructura del pavimento (Subbase reciclada y mejoramiento existente), para luego retirar el material limoso y húmedo, y remplazarlo con crudo de río usado como mejoramiento por su gran cantidad de piedra bola, la cual densifica el suelo de fundación y mejora la capacidad portante del terreno.

3-□ Llenos en limo y B-400 para mejoramiento de zonas de seguridad












En las zonas de seguridad, se tuvieron, como en todos los frentes de trabajo, afectaciones por la lluvia, el material tipo limo totalmente saturado y encharcado no permitió la operación de la maquinaria la mayoría del tiempo.

La Instalación, conformación y reconformación de material afirmado tipo B-400 en zonas de seguridad fue necesario para lograr un material estable y que se dejara compactar, teniendo que extender las jornadas laborales, para aprovechar al máximo los tiempos secos.

4-□ Excavación para construcción de canales.

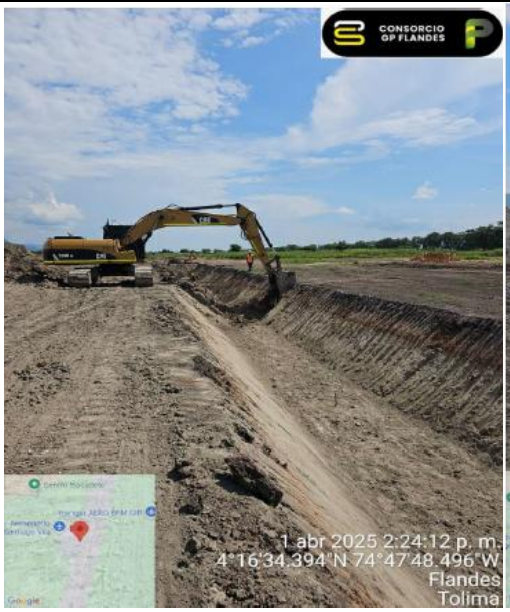







Se realiza la excavación a sección definitiva del canal izquierdo ubicado entre las calles de rodaje Alpha y Bravo. Los canales han servido para desaguar las áreas de trabajo, pero al no estar terminados con su revestimiento, estos también se han empezado a erosionar, por lo que se

deberá acelerar su revegetalización. Igualmente se adelantó la excavación del canal occidental y se hizo el paso sobre la calle de rodaje Bravo 1, mediante la colocación de tubería para ingreso de volquetas. También se construyeron canales provisionales para acelerar la evacuación de las aguas lluvias de la zona de seguridad.

5-□Revestimiento de canales con concreto f'c=21 Mpa.









Los canales permanecen con agua y no se ha podido tener un buen rendimiento en esta actividad, solo se logra realizar el vaciado de algunas placas intermedias en el canal izquierdo ubicado entre las calles de rodaje Alpha y Bravo, dado que en este sector se instaló un sistema de bombeo que ha permitido reducir el nivel del agua para la ejecución de esta actividad.

6-□ Excavación para construcción de filtros y canales provisionales de desague









Se continúa con la construcción de filtros por el costado izquierdo, sector norte de la pista en 6" y 8" en las zonas de seguridad, con lo cual se ayuda al drenaje más rápido de las zonas de seguridad y las excavaciones permiten el manejo de las aguas lluvias, evitando la inundación de los sectores en donde se lograron adelantar estas actividades.

También se construyen algunas zanjas provisionales para encausar las aguas y permitir el rápido drenaje de las zonas inundadas.

7- Box coulvert calle de rodaje Bravo.







Durante el presente periodo se culminó este frente de trabajo. Se realizaron los últimos vaciados de la losa superior del tercer tramo. Se trabajó en los aproches de la calle de rodaje al box, en donde se acuerda con interventoría hacer un mejoramiento adicional de 4 m a lado y lado para mejorar la transición entre la estructura del pavimento de la calle y el box. Se ejecutaron los aproches sobre la calle de rodaje y se instaló subbase granular sobre la estructura de concreto.

Se hace el replanteo del paso de tuberías eléctricas y se definió con interventoría hacerlo paralelo al alineamiento del box.

8- Box coulvert calle de rodaje Alpha.







En este frente de trabajo, inicialmente no fue posible avanzar en la estructura debido a la permanencia de agua estancada y para no afectar los trabajos aguas abajo en el box de Calle Bravo. Luego de realizar labores de limpieza y evacuación de agua y lodo, se logró avanzar con la instalación del acero de refuerzo correspondiente a la losa inferior y se adelantó el 100% del concreto de la losa inferior con su correspondiente armado de acero de muros. Para lograr este

avance se tuvo que realizar un manejo de aguas provenientes del canal izquierdo, mediante la construcción de dos canales provisionales por la calle de rodaje, lo que permitió el vaciado de muros del Box y losa superior en algunos tramos centrales.

9-□Calle de rodaje Bravo





En este frente se completa la instalación de subbase granular P-154 en todo el sector (incluso sobre el Box Coulvert). Se continúa con la instalación y conformación de la base granular en el sector comprendido entre la pista y el box coulvert. Adicionalmente, se ejecutó la demolición de la carpeta asfáltica en la abscisa K0+106 y se avanzó con la conformación y compactación de

material tipo B-400 para la estructura, en el área correspondiente a la demolición de la alcantarilla existente. Se completa la excavación hasta los bordes del box coulvert y se realiza el mejoramiento con piedra rajón (crudo de río) en los aproches al Box.

10- Calle de rodaje Alpha.





Hasta la mitad del periodo se concluye la ejecución de la instalación de subbase en los dos sectores (pista y Box Coulvert) y se inicia la instalación de base granular P-209 en el sector junto a la

plataforma. Este frente se suspende, y se concentran los recursos en la construcción del box coulvert para aprovechar al máximo los escasos tiempos secos que se presentaron.

11- Pista.





En este frente, se ejecuta el retiro de fallos en la subrasante de pista en el sector comprendido entre el K1+200 a K1+300. Se inicia la instalación de base granular entre el K1+200 a K+685, al igual que en la plataforma de viraje norte. Asimismo, se avanza en la conformación de subbase reciclada entre las abscisas K0+900 y K1+300.

12- Impactos generados por las lluvias en el mes de abril.









Durante los días del 29 de marzo al 20 de abril, se presentaron lluvias en la noche y en la madrugada, limitando el desarrollo normal de las actividades programadas. En atención a esta situación, el consorcio implementó la extensión de varias jornadas laborales con el fin de recuperar el ritmo de ejecución y avanzar en las diferentes actividades constructivas. En la última semana del periodo solo se presentaron lluvias en la madrugada del lunes 21 de abril y miércoles 23 de abril.

Debido a las fuertes y constantes lluvias se han presentado afectaciones en la subrasante de la pista, ya que el agua ha logrado penetrar hasta la capa de limo arcilloso que soporta la pista y que al contacto con el agua se reblandece mostrando fallos en la superficie de la subbase. Como

tratamiento de esta anomalía se establece en conjunto con interventoría el retiro del material en mal estado y su remplazo por piedra rajón (crudo de río) con el cual se densifica los suelos inestables y se mejora la capacidad de la subrasante, para luego volver a conformar la capa de subbase de la estructura del pavimento de la pista.

13- Calidad






En este mes de abril se instalaron concretos de 3.000 psi y 4.000 psi, a los cuales se les realizó control de resistencia, asentamiento y temperatura en obra.





En las densidades por el método del cono de arena, en este mes se hicieron 15 para la Subbase RCO, donde 13 cumplieron con su porcentaje de compactación (100%) estas fueron desde el K1+500 al K1+100, liberadas por interventoría, para su respectiva instalación de Base. Se tomaron 2 densidades en la calle de rodaje de bravo, donde cumplió con el 100% de compactación.

Dando función al laboratorio en obra, en donde se procesan ensayos para verificación del control de calidad de materiales granulares de los diferentes proveedores, tales como, afirmado, subbases, subbases con material reciclado, bases y mezcla asfáltica, mediante ensayos de clasificación (Granulometría, limite líquido y el IP), y densidades por el método del cono de arena. Se implemento una prensa doble rango para la falla de espécimen de concreto.

Visitamos a los diferentes proveedores de granulares (Nautila, La colina y Mavi) y hacemos recorridos periódicos en obra para la toma de muestras semanales.

Todos los equipos están calibrados y tienen su certificado emitido por Pinzuar.

14- Componentes sociales – ambiental – seguridad y salud en el trabajo.





Por parte del consorcio GP Flandes se realizó capacitación por parte del Ingeniero Forestal y la Ingeniera Ambiental sobre Medidas de protección y prevención en zonas donde se realizará aprovechamiento forestal y se logró la participación del 90% del personal vinculado al consorcio GP Flandes, en donde se presentaron recomendaciones del cuidado e importancia de estos.

Igualmente, en la capacitación se informó sobre el proceso que se debe adelantar ante la corporación autónoma regional del Tolima "CORTOLIMA", para conseguir el permiso de tala de los individuos arbóreos que se encuentran tanto en el sector sur del aeropuerto como en el canal de descole por fuera del aeropuerto, en donde se recalcó que no es permitido afectar estos árboles sin

dicha autorización, además se indicó que se ha instalado un cerramiento perimetral para señalizar el área de los árboles susceptibles de aprovechamiento forestal.

Se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto, en cumplimiento con los lineamientos contractuales establecidos, la cual contiene la información correspondiente al contrato en ejecución.

En las reuniones diarias realizadas se informó al personal sobre la situación de fiebre amarilla en el departamento del Tolima por lo que se solicitó y realizó jornada de vacunación para prevención sobre el tema.


Se realizó una Jornada de socialización del proyecto a la comunidad. Como parte del beneficio social del proyecto se resalta la divulgación y acercamiento desde el área social del consorcio GP Flandes, para llegar a la comunidad vecina y lograr la vinculación de personal al proyecto, a través de socializaciones puerta a puerta en los barrios vecinos.

Se recibió visita de la contraloría general de la república, en donde se pudo comprobar el estado actual del proyecto y la ejecución de las diferentes actividades que lo componen. Adicionalmente, se tuvo reunión virtual de seguimiento con representantes de la contraloría departamental, en donde se presentó el comité de veeduría ciudadana y se respondieron algunas inquietudes sobre el ingreso a la obra por la vía privada y se programó un recorrido de obra con la veeduría. Se comentó en dicha reunión del personal local que se ha contratado, alcanzando 99 personas de la región lo que representa un 63% del total del proyecto, generando empleo para la comunidad vecina.

15- Vías de acceso al proyecto.





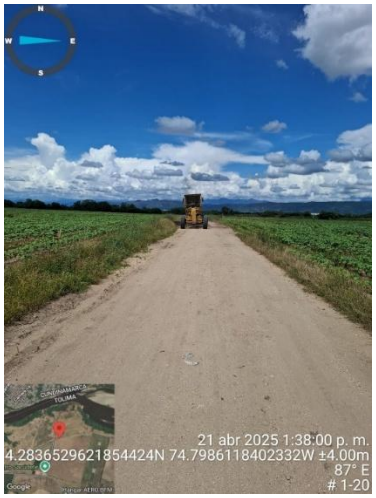

En las fotografías se observa la vía privada de la Hacienda San Rafael para el acceso alterno al aeropuerto de Flandes. Y también los trabajos de mantenimiento en la Vía urbana de acceso al aeropuerto

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN.

La construcción del aeropuerto es un megaproyecto que demanda una planificación meticulosa y un control riguroso para asegurar su culminación exitosa dentro de los plazos establecidos. Este aparte tiene como objetivo principal presentar un análisis detallado del estado actual de la programación del proyecto, identificando desviaciones, evaluando su impacto y proponiendo acciones correctivas. Un control efectivo de la programación no solo garantiza la eficiencia en el uso de recursos, sino que también minimiza los riesgos asociados a retrasos, sobrecostos y afectaciones a la calidad. A lo largo de este capítulo, se desglosarán los aspectos clave del seguimiento y la gestión de las actividades, ofreciendo una visión clara del progreso y las proyecciones para la entrega de esta infraestructura vital.

Avance de actividades de obra

Este subcapítulo presenta una fotografía precisa del progreso del proyecto en relación con la línea base de planificación. Se incluirá una comparación entre el avance real y el programado para las fases y actividades clave, destacando si el proyecto se encuentra adelantado, en tiempo o atrasado.

Para el caso del avance acumulado al mes de abril de 2025, y tal como lo podemos deslumbrar en la ilustración N°13, se tiene un atraso en valor del contrato corresponde a una ejecución de $155.463.736 (0,33% del valor total del contrato), lo anterior se extrae de que tenemos una ejecución acumulada de $20.556.007.383 contra una proyección a la fecha de corte de $20.711.471.119. Es de destacar que, para el mes de abril de 2025, por primera vez el contrato se encuentra por debajo de la línea base de cronograma, ya que desde que inició la etapa de construcción la ejecución mensual y acumulada siempre se estuvo por encima de lo programado.

Para el caso de la ejecución puntual del mes de abril de 2025, se obtuvo una ejecución de $3.450.079.276 contra un valor programado para el mes de $6.612.217.746, meta que bajo las condiciones climáticas actuales fue totalmente inviable alcanzar, y valor que tiene como particularidad que era el pico más alto de ejecución para todo el contrato.

Gráfica avance físico del contrato de obra



Ilustración 13. Gráfica avance físico del contrato de obra (acumulado)

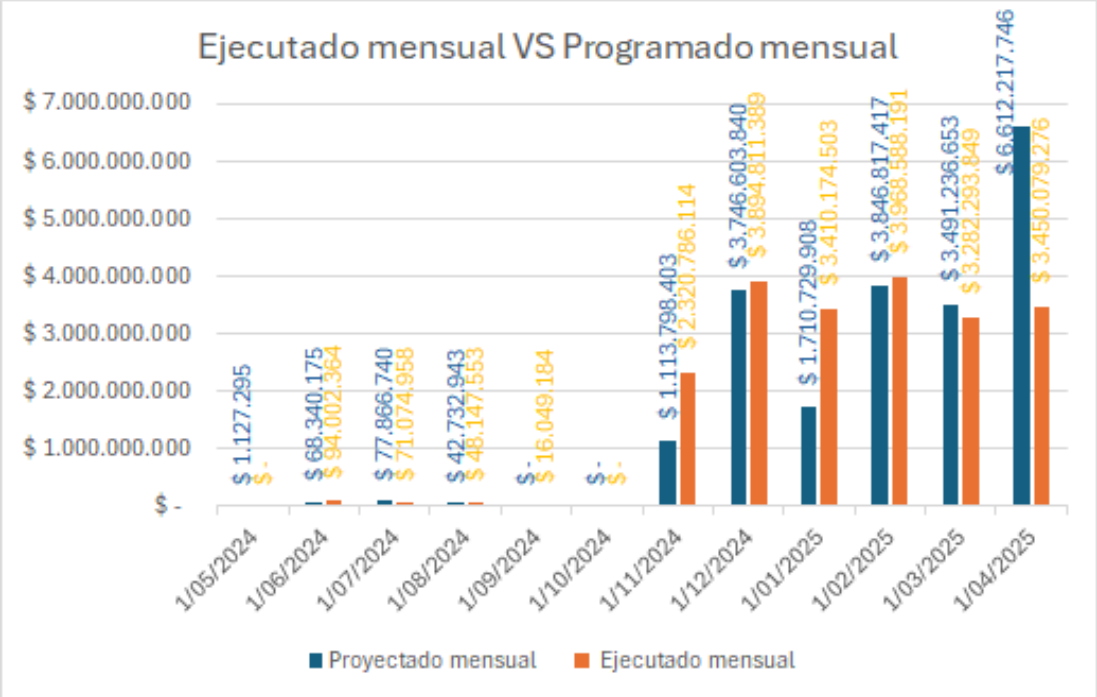


Ilustración 14. Valor ejecutados y programados mensuales

Actividades ejecutadas en el periodo.

Las actividades ejecutadas en el periodo fueron las siguientes:

GRUPO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS	UND	Abr (cantidades ejecutadas y subtotales en valor $)
			$ 3.450.079.276
1	**GENERALES**		**$ 115.116.420**
1.1	*LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD*	M2	52.090,00
2	**REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA**		**$ 674.706.336**
2.1	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	674,75
2.3	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	M3	718,75
2.5	*SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)*	M3	2.425,20
3	**NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA**		**$ 1.382.645.708**
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	3.206,50
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	M3	8.095,50
4	**REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA**		**$ 145.834.255**
4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	744,50
5	**REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO**		**$ 248.196.429**
5.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	90,00
5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	88,40
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	687,75
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	440,60
7	**SISTEMA DE DRENAJE**		**$ 312.355.595,11**
7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	2.017,75
7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	M3	82,53
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	1.101,35
NP-05	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6")	M	214,10
NP-06	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8")	M	492,40
8	**BOX COULVERT**		**$ 571.224.534**

8.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	-3.348,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)	KG	36.717,02
8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	M3	249,07
8.5	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	38,40

Tabla 14. Actividades ejecutadas en abril de 2025

Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.

GRUPO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS	UND	CANTIDAD PROGRAMADA ABRIL 2025	CANTIDAD EJECUTADA ABRIL 2025	DIFERENCIA
	Totales				
1	***GENERALES***				
1.1	*LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD*	M2	41.763,12	52.090,00	10.326,88
2	***REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA***				
2.1	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	*836,43*	*674,75*	- 161,68
2.3	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	M3	*922,73*	*718,75*	- 203,98
2.4	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.*	M3	*416,76*	-	- 416,76
2.5	*SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)*	M3	*3.363,85*	*2.425,20*	- 938,65
2.6	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10*	M3	*1.369,60*	-	- 1.369,60
2.8	*SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.*	M2	*26.919,63*	-	- 26.919,63
NP-02	*SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA*	M3	*1.032,64*	-	- 1.032,64
3	***NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA***				
3.1	*DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)*	M2	*23.916,26*	-	- 23.916,26
3.3	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.*	M3	*931,86*	*3.206,50*	2.274,64
NP-03	*TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD*	M2	*40.191,50*	-	- 40.191,50
4	***REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA***				
4.1	*FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	*181,61*	-	- 181,61
4.2	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).*	M3	*538,80*	-	- 538,80

4.3	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10*	M3	*287,36*	-	- 287,36
4.5	*SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.*	M2	3.592,00	-	- 3.592,00
4.6	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	3.230,00	-	- 3.230,00
4.7	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	M3	1.616,40	-	- 1.616,40
4.8	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.*	M3	898,00	*744,50*	- 153,50
7	***SISTEMA DE DRENAJE***				
7.1	*DEMOLICIÓN DE TRAMO EXISTENTE DE CANAL (DEMOLICIÓN DE SECCION DE 3 METROS DE CANAL PARA LA EXCAVACIÓN DE LA OBRA DE DESCARGA). INCLUYE RETIRO*	UND	0,04		- 0,04
7.2	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	1.096,57	*2.017,75*	921,18
7.3	*CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.*	M3	*74,21*	*82,53*	8,32
7.13	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)*	KG	*5.625,72*	*1.101,35*	- 4.524,37
NP-04	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERÍA 4")*	M	*85,95*		- 85,95
NP-05	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6")*	M	*1.203,78*	*214,10*	- 989,68
NP-06	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8")*	M	*812,46*	*492,40*	- 320,06
NP-09	*REVESTIMIENTO DE CANAL CON PIEDRA PEGADA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS*	M2	*30,36*		- 30,36
8	***BOX COULVERT***				
8.1	*EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.*	M3	*678,63*	- *3.348,00*	- 4.026,63
8.2	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)*	KG	*13.827,26*	*36.717,02*	22.889,76
8.3	*RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT*	M3	*30,00*		- 30,00
8.4	*CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC*	M3	*115,23*	*249,07*	133,84
8.5	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	M3	*100,00*	38,40	- 61,60
10	***OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS***				
10.1	*CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 60 X 60 X 120 CM INTERIORES CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 274 CODENSA*	UND	*33,78*		- 33,78
10.2	*CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 70 X 120 X 170 CM INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 275 CODENSA*	UND	*2,67*		- 2,67
10.3	*CANALIZACIÓN DE DOS (2) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP . INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	M	*207,43*		- 207,43
10.4	*CANALIZACIÓN DE UN (1) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	M	*385,23*		- 385,23
10.5	*CANALIZACIÓN DE UN (4) DUCTOS DE 4" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	M	*1.274,24*		- 1.274,24

Tabla 15. Cantidades programadas por ítem VS cantidades ejecutadas por ítem para abril de 2025

Las estrategias y medidas concretas para mitigar el impacto de las desviaciones identificadas no han sido una solución válida. La única manera de recuperar el atraso en la ejecución es un cambio radical en el estado del clima o una reprogramación de la línea base de cronograma mediante ampliación del plazo de hitos parciales y/o del contrato. Esta sería la única acción realista y medible.

Adicional al no cumplimiento de ejecución de cantidades de actividades de instalación de granulares y excavaciones, un gran porcentaje de las actividades no ejecutadas corresponden también a la imposibilidad de comenzar las actividades de aplicación de mezclas asfálticas en caliente.

Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Dentro del anexo denominado “Técnico”, se encuentra la subcarpeta denominada “Anexo 1. Acta de obra y formatos complementarios”, dentro de dicha carpeta está contenido el archivo correspondiente al acta parcial de obra #6.

Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

GRUPO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS	UND	CANTIDAD PROGRAMADA MAYO 2025
	Totales		
1.1	*LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD*	M2	150.930,55
2	***REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA***		
2.1	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	804,18
2.3	*MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	M3	888,46
2.4	*SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.*	M3	401,28
2.5	*SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)*	M3	2.144,31
2.6	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10*	M3	1.184,89
2.8	*SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.*	M2	10.246,58
NP-02	*SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA*	M3	1.660,27
3	***NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA***		
3.1	*DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)*	M2	78.138,66
3.2	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	

6	***SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL***		
6.1	*SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y PISTA.*	M2	*33,78*
6.2	*MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO. INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INLCUYE MICROESFERAS.*	M	*2,67*
7	***SISTEMA DE DRENAJE***		
7.1	*DEMOLICIÓN DE TRAMO EXISTENTE DE CANAL (DEMOLICIÓN DE SECCION DE 3 METROS DE CANAL PARA LA EXCAVACIÓN DE LA OBRA DE DESCARGA). INCLUYE RETIRO*	UND	0,04
7.2	*EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO*	M3	1.096,57
7.3	*CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.*	M3	74,21
7.13	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)*	KG	5.625,72
NP-04	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERÍA 4")*	M	85,95
NP-05	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6")*	M	1.203,78
NP-06	*CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8")*	M	812,46
NP-09	*REVESTIMIENTO DE CANAL CON PIEDRA PEGADA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS*	M2	30,36
10	***OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS***		
10.1	*CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 60 X 60 X 120 CM INTERIORES CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 274 CODENSA*	UND	33,78
10.2	*CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TIRO Y HALADO DE MEDIDAS 70 X 120 X 170 CM INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE MARCO Y TAPA VER NORMA CS 275 CODENSA*	UND	2,67
10.3	*CANALIZACIÓN DE DOS (2) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP . INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	M	207,43
10.4	*CANALIZACIÓN DE UN (1) DUCTOS DE 2" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	M	385,23
10.5	*CANALIZACIÓN DE UN (4) DUCTOS DE 4" PVC DEL TIPO PESADO TDP. INCLUYE ZANJA DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, LECHO EN ARENA, TAPADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. ZONA BLANDA*	M	1.274,24

Tabla 16. Actividades programadas para mayo de 2025

Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

Dentro del anexo denominado “Técnico”, se encuentra la subcarpeta denominada “Anexo 1. Acta de obra y formatos complementarios”, dentro de dicha carpeta está contenido el archivo correspondiente al Formato financiero Acta Parcial de obra #6

Resumen al control de gestión, a partir de la programación.

- Atraso por primera vez: El proyecto ha experimentado un retraso significativo en abril de 2025, marcando la primera vez que la ejecución acumulada cae por debajo de la línea base

del cronograma desde el inicio de la etapa de construcción. Esto es un punto de inflexión crítica, dado que anteriormente la ejecución siempre estuvo por encima de lo programado.

- Desviación Cuantificable: El atraso representa un valor de $155.463.736, lo que equivale a un 0.33% del valor total del contrato. Si bien porcentualmente parece pequeño, es el primer indicio de una reducción negativa en el progreso general del proyecto.

- Impacto del pico de ejecución no alcanzado: El mes de abril de 2025 tenía la particularidad de ser el pico más alto de ejecución programado para todo el contrato ($6.612.217.746). La ejecución real fue de solo $3.450.079.276, lo que significa que no se logró alcanzar el 50% de la meta mensual programada. Esta falta de cumplimiento en el mes más crítico ha contribuido significativamente al atraso acumulado.

- Causas del atraso: Las condiciones climáticas adversas son identificadas como la principal razón por la cual no se pudo alcanzar la meta de ejecución en abril. Estas condiciones afectarán directamente la posibilidad de llevar a cabo actividades clave como la instalación de granulares, excavaciones y, de manera crucial, la aplicación de mezclas asfálticas en caliente.

- Ineficacia de las estrategias de mitigación: Las estrategias y medidas concretas implementadas hasta el momento para mitigar el impacto de las desviaciones no han sido efectivas. Esto sugiere que las soluciones aplicadas no fueron suficientes o adecuadas para enfrentar el enorme impacto que implicó el drástico estado climático en el proyecto.

- Soluciones limitadas y drásticas: La única vía realista y medible para recuperar el atraso es mediante un cambio radical en el estado del clima o una reprogramación de la línea base del cronograma. Esta reprogramación implicaría una ampliación del plazo de hitos parciales y/o del contrato, lo que indica que el equipo del proyecto no ve otras alternativas viables para la recuperación del cronograma bajo las condiciones actuales.

- Impacto en actividades clave: El atraso no solo se refleja en la ejecución económica, sino también en el no cumplimiento de cantidades de actividades específicas, particularmente en la instalación de granulares y excavaciones, y la imposibilidad de iniciar las actividades de aplicación de mezclas asfálticas en caliente. Esto puede generar un efecto dominó en las fases subsiguientes del proyecto.

- En resumen, el proyecto se encuentra en un punto crítico debido a un atraso impulsado principalmente por condiciones climáticas desfavorables y la imposibilidad de cumplir con las metas de ejecución en un mes clave. La situación actual sugiere que, sin un cambio

drástico en el clima o una reprogramación del cronograma, la recuperación del proyecto será extremadamente desafiante.

LABORATORIOS Y ENSAYOS.

Copia de los laboratorios realizados durante el periodo.

Revisar documento denominado: “Informe_Laboratorio_&_Ensayos”, anexo al presente informe. La ruta dentro del drive compartido es: *INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Calidad*

Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos.

Revisar documento denominado: “Informe_Laboratorio_&_Ensayos”, anexo al presente informe. La ruta dentro del drive compartido es: *INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Calidad*

Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de mantenimiento.

Revisar documentos denominados: “Informe_Laboratorio_&_Ensayos” y “Anexos Certificados de Calibración y Calidad”, anexos al presente informe. La ruta dentro del drive compartido es: *INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Calidad*

Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.

Revisar documento denominado: “Informe_Laboratorio_&_Ensayos”, anexo al presente informe. La ruta dentro del drive compartido es: *INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Calidad*

Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.

Revisar documento denominado: “Informe_Laboratorio_&_Ensayos”, anexo al presente informe. La ruta dentro del drive compartido es: *INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Calidad*

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

A continuación, se realizará la presentación del balance presupuestal del contrato acumulado a la fecha de corte del presente informe.

Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

Período de Ejecución		Proyectado ($ millones)			Ejecutado ($ millones)	
Mes	Fase	Ejecución Mensual	Vr. x FASE	Proyección Acumulada	Ejecución Periodica	Ejecución Acumulada
may-24	PRE CONSTRUCCIÓN	$ 1	$ 190	$ 1	$ -	$ -
jun-24		$ 68		$ 69	$ 94	$ 94
jul-24		$ 78		$ 147	$ 71	$ 165
ago-24		$ 43		$ 190	$ 48	$ 213
sep-24		$ -		$ 190	$ 16	$ 229
oct-24		$ -		$ 190	$ -	$ 229
nov-24	FASE 1	$ 1.114	$ 6.571	$ 1.304	$ 2.321	$ 2.550
dic-24		$ 3.747		$ 5.050	$ 3.895	$ 6.445
ene-25		$ 1.711		$ 6.761	$ 3.410	$ 9.855
feb-25	FASE 2	$ 3.847	$ 21.775	$ 10.608	$ 3.969	$ 13.824
mar-25		$ 3.491		$ 14.099	$ 3.282	$ 17.106
abr-25		$ 6.612		$ 20.711	$ 3.450	$ 20.556
may-25		$ 7.825		$ 28.536		
jun-25	FASE 3	$ 5.961	$ 19.545	$ 34.497	$ -	
jul-25		$ 4.733		$ 39.230	$ -	
ago-25		$ 3.374		$ 42.605	$ -	
sep-25		$ 3.616		$ 46.221	$ -	
oct-25		$ 906		$ 47.127	$ -	
nov-25		$ 955		$ 48.082	$ -	
dic-25		$ -		$ 48.082	$ -	

Tabla 17. Cuadro de control presupuestal programado VS ejecutado

Soporte de las actas de pago.

Dentro de la carpeta que contiene el anexo técnico, se encuentra el archivo denominado “Preacta Correccion_Memorias de campo Acta No. 6”.

Grafica presupuestal.

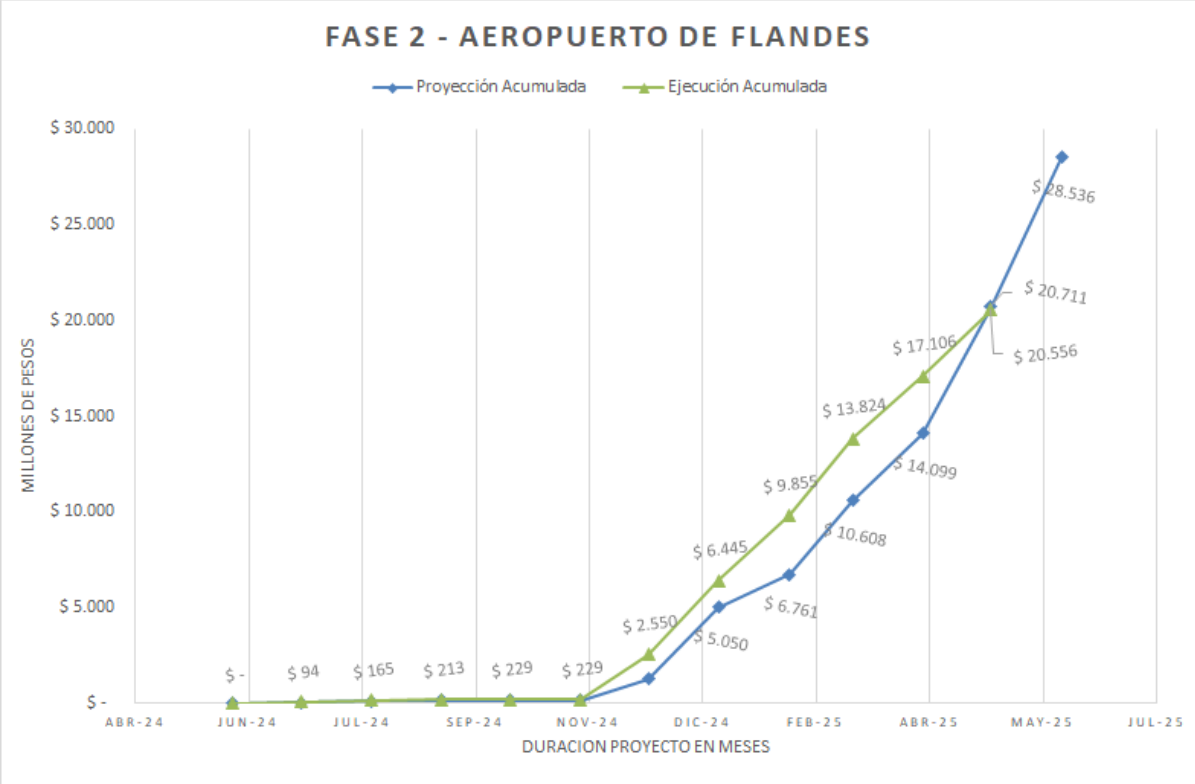


Ilustración 15. Gráfica de control presupuestal a abril de 2025

Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra.

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	Estado de la cuenta
1	Del 26 de octubre al 20 de noviembre 2024	$ 2.105.281.332	PAGADO
2	Del 21 de noviembre al 10 de diciembre de 2024	$ 2.319.499.920	PAGADO
3	Del 11 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025	$ 4.768.959.136	PAGADO
4	Del 26 de enero al 25 de febrero de 2025	$ 3.880.198.697,00	FACTURADO
5	Del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025	$ 3.161.686.919,00	EN REVISIÓN
6	Del 26 de marzo al 25 de abril de 2025	$ 3.506.167.111,00	EN REVISIÓN

Tabla 18. Relación de actas de cobro a la fecha

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS.

Alcance administrativo

Durante el mes de abril de 2025 se continuó con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se radicaron los informes requeridos, se celebraron comités de obra y se dio trámite a observaciones de la interventoría. La comunicación entre las partes ha sido fluida y oportuna, permitiendo gestionar adecuadamente compromisos y solicitudes. Se destaca la atención efectiva a los requerimientos de veeduría, Contraloría y comunidad. Se destaca que todo el personal profesional, técnico y administrativo obligatorio estuvo vinculado al contratista durante todo el periodo.

Alcance técnico.

El proyecto mantiene su ejecución en siete frentes de trabajo. A pesar del atraso del 1,26% en la ejecución física acumulada, se avanzó en la instalación de subbases, bases granulares, construcción de canales, box coulverts y zonas de seguridad. La gestión técnica ha permitido mitigar parte de los efectos negativos del clima mediante reorganización de frentes y refuerzo de personal y maquinaria.

Alcance ambiental.

Se continúa con la gestión para obtener el permiso de aprovechamiento forestal, con acompañamiento técnico y social. Se instalaron cerramientos y se realizaron capacitaciones al personal en medidas de prevención ambiental. Se construyeron canales provisionales para manejo de aguas lluvias. No se presentaron hallazgos negativos por parte de la autoridad ambiental en este periodo.

Alcance de seguros.

Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil se encuentran actualizadas, firmadas y radicadas en SECOP II, aunque aún están pendientes de aprobación formal por parte de la entidad contratante. Se garantiza la vigencia y cobertura de los riesgos asociados al contrato, incluyendo los amparos de calidad, estabilidad, cumplimiento y RCE.

Alcance a la evaluación de riesgos.

Durante abril se materializaron riesgos críticos por ola invernal, con impactos directos sobre la subrasante de la pista y zonas de seguridad. Se implementaron medidas correctivas como reemplazo de materiales afectados y construcción de canales provisionales. También se gestionó con la interventoría la posibilidad de prorrogar la FASE 2. Los riesgos continúan bajo seguimiento técnico.

Alcance contable.

Se realizó la facturación correspondiente al Acta de Obra No. 6 por un valor de $3.506 millones. Aunque representa un valor inferior al programado, el balance financiero del contrato se mantiene estable, con seguimiento al flujo de caja, ejecución presupuestal y cumplimiento del cronograma financiero pactado.

Otros alcances de gestión.

Se destaca la labor social con la comunidad vecina, mediante jornadas informativas, socializaciones y vinculación de mano de obra local. Se alcanzó un 63% de contratación local, superando la meta propuesta. Asimismo, se mantuvo comunicación activa con entidades de control (Contraloría) y actores clave (Aerocivil, veeduría), consolidando una gestión integral y transparente del proyecto.

FORMATOS DE CONTROL.

Relación de personal en obra.

Durante el mes de abril de 2025, el personal en obra estuvo compuesto por un promedio de 157 trabajadores entre técnicos, operarios, profesionales de apoyo y personal administrativo. De este total, **99 personas son de origen local**, representando un **63% de contratación local**, lo cual responde a los compromisos sociales del proyecto.

La relación detallada de nombres, cargos, jornadas y afiliaciones se encuentra en el documento denominado “Informe SST Abril 2025 - CGPF VERS. 02”, el cual se encuentra ubicado en la ruta INFORMES MENSUALES 2025 / Anexo SST / Inf. SST Abril 2025 / .

Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

El proyecto mantuvo un parque de maquinaria activo con retroexcavadoras, vibrocompactadores, motoniveladoras, volquetas, plantas de mezcla, tanques de agua y equipos de laboratorio. Se incrementó la operación de maquinaria durante los días secos para mitigar retrasos por lluvias, lo cual se refleja en el aumento de las horas máquina trabajadas.

La relación de equipos y el control horario correspondiente se presenta en el Anexo denominado "Control equipos" que se encuentra en la siguiente ruta del drive compartido: INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Técnico / Anexo 2 Formatos de control de obra.

Control climatológico y de horas trabajadas.

Se registraron precipitaciones casi diarias entre el 29 de marzo y el 20 de abril, con interrupciones recurrentes en las madrugadas y noches. El proyecto implementó **jornadas extendidas** en los días secos para recuperar productividad.
El registro de condiciones climáticas, incluyendo fuentes del IDEAM y el monitoreo en sitio, así como el cuadro consolidado de horas laborales ejecutadas se encuentra en el Anexo denominado "Informe de Lluvias Flandes Abril 2025" que se encuentra en la siguiente ruta del drive compartido: INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Técnico / Anexo 2 Formatos de control de obra.

Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.

Durante el mes de abril, no se tienen relacionadas ordenes de trabajo particulares por parte de la Interventoría del proyecto.

Materiales en obra y programados para labor.

Durante el mes se recibieron materiales como piedra rajón, base y subbase granular, concreto premezclado, acero de refuerzo y tubos para filtros.

Se mantuvo inventario actualizado y control de calidad sobre los materiales entrantes mediante ensayos de laboratorio.

El "Informe_Laboratorio_&_Ensayos", anexo al presente informe cuya ruta dentro del drive compartido es: *INFORMES MENSUALES / Abril 2025 / Calidad,* incluye:

Certificados de calidad por proveedor

Cantidades programadas vs. ejecutadas

Resultados de pruebas de calidad y laboratorio

GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.

Como se puede observar en las siguientes tablas, se ha mantenido una comunicación formal y fluida entre las partes. Destacando los temas relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales, en donde el contratista ha suministrado la información solicitada por la interventoría, haciendo los ajustes requeridos y las aclaraciones pertinentes, de una manera ágil y efectiva.

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)		CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA		**Código:** FC - 01 **Revisión:** 01 **Vigencia:** Mayo de 2022
Área:	**Tecnica**	**Contrato / Obra:**	**Contrato No. 23001258 H4 2023 / Aeropuertop Flandes**	**Mejoramiento de la infraestructura lado aire del aeropuerto Santiago Vila de Flandes**
FECHA	**ASUNTO**	**CONSECUTIVO**	**DESTINATARIO**	**RESPUESTA**
22/03/2025	Respuesta PQRS sobre tránsito de volquetas por las vías de Flandes	15-2288-04-122	Jillian Dickson Rodriguez Alvis - Coordinador de veeduría	
26/03/2025	Su comunicado CIAF-1258H42023-260	15-2288-04-123	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
26/03/2025	Firmas actas de vecindad	15-2288-04-124	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
26/03/2025	Su comunicado CIAF-1322H32023-261	15-2288-04-125	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
27/03/2025	Firma de acta de entorno de la vía al aeropuerto Santiago Vila de Flandes Tolima	15-2288-04-126	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
27/03/2025	Actas de Entrega elementos eléctricos encontrados en pista y calles de rodaje	15-2288-04-127	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
27/03/2025	Su comunicado S.P.I-233-2025	15-2288-04-128	Alcaldía de flandes - José Arcesio Vargas Benitez- Secretario de Planeación e Infraestructura	
28/03/2025	Respuesta al PQRS No. 10 - recibido el día 13/03/2025 sobre el Boxcoulvert de Salida	15-2288-04-129	Yesid Ávila	
29/03/2025	Respuesta al PQRS No. 11 - recibido el día 22/03/2025 sobre hueco en anden peatonal	15-2288-04-130	Cesar Enrique Mirque Sánchez - Usuario Comunidad de Flandes	
2/04/2025	Propuesta pasos peatonales sobre los canales	15-2288-04-131	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
2/04/2025	Propuesta rejilla seguridad canal de salida	15-2288-04-132	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
2/04/2025	Entrega de Informe Mensual No. 10	15-2288-04-133	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
4/04/2025	Respuesta a solicitud de donación para aula de clases	15-2288-04-134	I.E. Manuela Omaña - Mg. Héctor Hernando Ospina Sánchez	
7/04/2025	Su comunicado CIAF-1322H322023-262	15-2288-04-135	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
8/04/2025	Actas de Entrega elementos eléctricos encontrados en pista y calles de rodaje	15-2288-04-136	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
10/04/2025	Su comunicado CIAF-1322H32023-263	15-2288-04-137	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
21/04/2025	Respuesta radicado Id: 1649202	15-2288-04-138	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
14/04/2025	Trabajos programados Semana Santa 2025	15-2288-04-139	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
14/04/2025	Oficio Remisorio de Acta de obra No. 5	15-2288-04-140	Consorcio Aerovías Flandes - Roselly Pajaro	
27/04/2025	Sus comunicados CIAF-1322H32023-289 y CIAF-1322H32023-291	15-2288-04-141	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
27/04/2025	Punto de atención ciudadano	15-2288-04-142	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
27/04/2025	Profesional social	15-2288-04-143	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
27/04/2025	Firmas actas de vecindad	15-2288-04-144	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
28/04/2025	Respuesta al comunicado CIAF-1322H32023-264	15-2288-04-145	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	
29/04/2025	Invitación para socialización de cambio en el NOTAM para los trabajos de construcción en el aeropuerto Santiago Vila de Flandes (VF)	15-2288-04-146	Funcionarios Públicos, Explotadores y Operadores del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes (VF) y demás interesados	
30/04/2025	PQRS Nicomedes Ávila	15-2288-04-147	Consorcio Aerovías Flandes - Alfredo Pérez Santos	

Tabla 19- Control de correspondencia enviada (fuente propia)

REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	**Código:** FC - 02 **Revisión:** 01 **Vigencia:** Julio de 2024

Área:	**Tecnica**	**Contrato / Obra:**	**Contrato No. 23001258 H4 2023 / Aeropuertop Flandes**	**Objeto contrato:**	**Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).**		
CONSECUTIVO INTERNO	**FECHA RECIBIDO**	**FECHA OFICIO**	**ASUNTO**	**CÓDIGO DEL DOCUMENTO RECIBIDO**	**DIRIGIDO A**	**OFICIO RESPUESTA**	**OBSERVACIONES**
		5/03/2025	Devolución acta de cobro No. 4 - Febrero	CIAF-1322H32023-244	Ricardo Alberto Muñoz		
		5/03/2025	Respuesta a Solicitud presentada mediante radicado de entrada No. 20251630001084 y asunto: "Solicitud entrada y salida de volquetas por RUTA 40".	No. 20251630011911	Ricardo Alberto Muñoz		
		6/03/2025	Remisión de solicitud de intervención vial - Oficio S.P.I 142/2025	CIAF-1322H32023-246	Ricardo Alberto Muñoz		
		14/03/2025	Observaciones al informe mensual de obra No. 9 (Febrero 2025)	CIAF-1322H32023-251	Ricardo Alberto Muñoz		
		14/03/2025	Observaciones actas de vecindad entregadas mediante oficio con consecutivo 15.2288.04.0107 de fecha de 12 de febrero de 2025.	CIAF-1322H32023-252	Ricardo Alberto Muñoz		
		14/03/2025	Solicitud instalación Punto de Atención al Usuario	CIAF-1322H32023-253	Ricardo Alberto Muñoz		
		14/03/2025	No más utilización de las vías urbanas		Juan Carlos Lopez de Mesa Gutierrez		
		25/03/2025	Circulación de vehículos de carga (Volquetas Doble Troque) Sobre la vía aeropuerto, entre la carrera 7 y Aeropuerto Santiago Vila.	S.P.I-233-2025	Ricardo Alberto Muñoz		
		25/03/2025	Oficio 15288.04-113 - Pago de Items 2.6, 4.3 y 5.6 del formulario 1 - Precios y Cantidades	CIAF-1322H32023-258	Juanita Villamizar		
		26/03/2025	Traslado solicitud de información - Punto 10 del derecho de petición 0345 2025	CIAF-1322H32023-260	Ricardo Alberto Muñoz		
		26/03/2025	Observaciones informe semanal No. 43	CIAF-1322H32023-261	Ricardo Alberto Muñoz		
		26/03/2025	Seguimiento y requerimientos ambientales	CIAF-1322H32023-262	Ricardo Alberto Muñoz		
		26/03/2025	Primera reiteración por la no atención de las observaciones del informe mensual - Comunicado CIAF-2025-251 del 14 de marzo de 2025	CIAF-1322H32023-263	Ricardo Alberto Muñoz		
		26/03/2025	Fisuramiento de placas de canales	CIAF-1322H32023-264	Ricardo Alberto Muñoz		
		26/03/2025	Solicitud Ingeniero Residente Eléctrico de Obra Etapa de Construcción.	CIAF-1322H32023-266	Ricardo Alberto Muñoz		
		7/04/2025	Respuesta comunicado CIAF-1322H32023-256, "Ítems no previstos (NP)" contrato de obra 23001258 H4 de 2023 - Segunda revisión	2025262000014341	Alfredo Pérez Santos		
		9/04/2025	Respuesta a solicitud de ajuste a rasante. Radicado No. 15.2288.04-116	CIAF-1322H32023-279	Ricardo Alberto Muñoz		
		11/04/2025	Aprobación 16 Actas de Vecindad y devolución de 14 actas para firma del profesional social.	CIAF-1322H32023-280	Ricardo Alberto Muñoz		
		11/04/2025	Horario de Atención del Punto de Atención al Usuario	CIAF-1322H32023-281	Ricardo Alberto Muñoz		
		11/04/2025	Respuesta comunicado No. 15.2288.04-137 - "Respuesta comunicado CIAF-1322H32023-263". Autorización postulación Ingeniero residente de obra eléctrico.	CIAF-1322H32023-282	Ricardo Alberto Muñoz		
		12/04/2025	Programación de obra en Semana Santa.	CIAF-1322H32023-283	Ricardo Alberto Muñoz		
		15/04/2025	Respuesta comunicado CIAF-1322H32023-258 "Oficio 15288.04-113-Pago de Ítems 2.6, 4.3 y 5.6 del formulario 1 - Precios y Cantidades."	2025263000015956	Alfredo Pérez Santos		
		16/04/2025	Traslado radicado 20253311000081446 Id: 1648669, solicitud de concepto integral frente a las inquietudes de la Gerencia del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes - ubicación luces de borde de pista.	2025262000016314	Alfredo Pérez Santos		

Tabla 20 - Control de correspondencia recibida (fuente propia)

GESTION DEL PROGRAMA DE GERENCIA

Informe de la dirección, gestión y control del trabajo de obra.

Actualmente el proyecto se encuentra en los procesos de EJECUCION, CONTROL y SEGUIMIENTO, y se desarrolla de acuerdo con los planes de gestión para cada área de conocimiento establecidos en el programa de gerencia, donde se establecen las principales acciones a implementar como se detalla a continuación:

PLAN DE GESTION	EJECUCION Y SEGUIMIENTO
Alcance	Definición de solicitudes de cambio
	Aprobación de obras adicionales por invierno
	Definición de tipo de asfalto a emplear en la mezcla P-401
	Control de cambios
	Actualización plan de trabajo (Anexo Técnico al presente informe)
Cronograma	Ampliación del NOTAM de cierre
	Revisión de precios No Previstos
	Trámite del permiso de aprovechamiento forestal
	Intensificación del cronograma
	Control de cambios
Costos	Especificaciones de materiales, según grado de desempeño del asfalto
	Flujo de caja y medición de avance por obra ejecutada
	Ejecución de pases eléctricos sin perforación dirigida
	Trámite de precios No Previstos
	Control de cambios
Riesgos	Implementación de la respuesta a riesgos manifestados
	Seguimiento y gestión de riesgos
	Afectaciones por invierno e imprevistos
Comunicaciones	Matriz de interesados
	Correspondencia y Bitácora
	Actas de comité de obra y reunión en obra
	Reunión especialistas ambiental y forestal
Calidad	Plan de inspección y ensayos
	Aseguramiento de la calidad en actividades desarrolladas
	Certificación de materiales empleados en la obra
Recursos y adquisiciones	Compra y negociación de insumos
	Contratación de personal
	Gestión del anticipo y Trámite de órdenes de pago por fiducia

	Seguimiento e Informe social
SISOMA	Resumen informe SST Resumen informe Ambiental

Tabla 21- Matriz de integración con las áreas de conocimiento (fuente propia)

Informe de gestión del conocimiento del contrato.

Este proceso implica el seguimiento a los documentos importantes que rigen las obligaciones tanto de contratista como de la entidad contratante. Para el presente mes se revisaron temas relacionados con los siguientes documentos:

Especificaciones técnicas – formato 8A: se revisó lo correspondiente al contenido de los informes semanales y mensuales, encontrando una opción de mejora en los siguientes aspectos:

- *Informe semanal: Se incluye la relación de maquinaria en obra, al igual que un aparte de la gestión social con los beneficios técnicos y sociales del proyecto, que se venían consignando en la Bitácora de obra.*
- *Informe mensual: Se incluye en los anexos los informes de las áreas de apoyo, que se venían presentando independientemente.*

Especificaciones técnicas – formato 8B: Se revisó lo correspondiente al material aglutinante de la mezcla asfáltica y se envió comunicación al respecto para aclarar la inconsistencia que se encontró con la descripción del ítem de mezcla asfáltica, como se detalla a continuación:

- *Se solicita el reconocimiento económico de los ítems 2.6, 4.3 y 5.6 correspondientes al SUMINISTRO E INSTALACION CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFALTICA PG 76-10, usando como aglutinante de asfalto, Performance Grade (PG) 70-10, como lo establece la especificación técnica que se encuentra en el formato 8B- ESPECIFICACIONES TECNICAS.*

Anexo 1 – Anexo técnico: Se revisó lo correspondiente a los materiales a emplear en el proyecto, definiendo la prevalencia de la especificación sobre la descripción del ítem, como se muestra a continuación:

- *Los materiales, suministros y demás elementos que requiera utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.*

Informe de gestión del control integrado de cambios.

Este proceso es esencial para garantizar que los cambios se realicen de manera controlada y que el proyecto se mantenga alineado con los objetivos establecidos.

Resumen de actividades: Durante el mes de abril del año 2025, se ejecutaron actividades de obra y procesos que requirieron ejecutar el control integrado de cambios debido a solicitudes de la entidad contratante, la interventoría o desde el contratista. La de solicitudes de cambio tramitadas durante este mes, son las siguientes:

- Ampliación del cierre del aeropuerto por un mes más y por consiguiente de la FASE 2
- Drenaje de las cajas eléctricas.
- Cambio de asfalto a utilizar en la mezcla asfáltica para la pista.
- Retiro de fallos causados por el invierno y su reconocimiento mediante ítems contractuales
- No ejecución de la perforación horizontal dirigida, para el componente eléctrico.
- Construcción de rejilla metálica en el canal de salida, para garantizar la seguridad del aeropuerto
- Implementación de pasos peatonales sobre los canales perimetrales

En la siguiente tabla se describe el estado de los cambios:

SOLICITUD DE CAMBIO	ESTADO	IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
El director de Obra indica que las fuertes lluvias presentadas están afectando el desarrollo de actividades de la ruta crítica, por lo cual, de continuar las lluvias, propone ampliar el cierre del aeropuerto hasta el 30 junio. Solicitado por: Contratista	Propuesto comité semanal #38	El Ing. Camilo Silva de la Aerocivil, solicita continuar incluyendo la descripción del clima y sus afectaciones a la obra, en los informes semanales. Además, indica que, si es posible mover el NOTAM, siempre y cuando se sustente técnicamente, para lo cual recomienda en él incluir información climática y su pronóstico.	El director de Interventoría indica que las estaciones meteorológicas que estaban ubicadas en el Aeropuerto de Flandes fueron levantadas para desarrollar las actividades propias del proyecto, sin embargo, indica que hay una estación ubicada en Girardot y que de ella puede ser extraída la información que evidencie el aumento de lluvias en la zona.
La gerencia del aeropuerto manifiesta que, debido a las acciones de mantenimiento de los canales, se requiere de pasos peatonales sobre los mismos Solicitado por: Interesado gerencia aeropuerto	Propuesto comité semanal #39	Pendiente Valoración económica	Se debe realizar un balance de cantidades para su implementación
Drenaje de las cajas eléctricas. Solicitado por: Interventoría	Propuesto en comité de obra # 2	En revisión técnica y definición presupuestal	Evaluar pertinencia de que los sistemas hidráulicos queden conectados con los eléctricos
Ampliar la intervención de la Calle de rodaje Bravo, hasta el borde la plataforma Solicitado por: Contratista	Propuesto en comité de obra # 2	En revisión presupuestal.	Ampliación necesaria, dado el estado del pavimento de la calle de rodaje en el empalme con la plataforma

Aglutinante a utilizar en la mezcla asfáltica de los pavimentos a instalar en la pista y calles de rodaje. Solicitado por: Contratista	la interventoría presenta concepto favorable	Pendiente respuesta de la entidad contratante.	Inconsistencias entre la especificación técnica y la descripción del ítem en el formulario No. 1 de precios y cantidades

Tabla 22. Resumen de la gestión de cambios propuestos.

Informe de validación y control del alcance.

Dado que la Autoridad Aeronáutica solicitó reevaluar la pertinencia de la pavimentación de los 3 m de márgenes a lado y lado de la pista como estaba en los diseños originales, se gestiona un balance de cantidades para repartir estos recursos en otras actividades necesarias para la correcta operación del aeropuerto Santiago Vila de Flandes. Para la implementación en obra se solicitó una modificación al contrato mediante el formato 69, donde se incluyen ítems No Previstos mediante balance de cantidades sin necesidad de adicionar el presupuesto dispuesto por la entidad de acuerdo con los siguientes cambios que arrojó la apropiación de los diseños:

1. Canal de descarga por fuera del predio del aeropuerto
2. Reciclaje de material tipo RAP producto del fresado
3. Colocación de limo como capa final de amortiguación en zonas de seguridad
4. Construcción de filtros en zonas de seguridad
5. Adecuación de Cuarto técnico para equipo eléctricos
6. Actualización de software de control del sistema de ayudas visuales

Los anteriores puntos describen las modificaciones que se deben realizar en el presupuesto de obra para dejar el aeropuerto operativo, para completar alcance inicial que corresponde al mejoramiento de la infraestructura lado aire del aeropuerto Santiago Vila, llevando a categoría 3:C en cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC 14.

Informe de control del cronograma.

A continuación, se presenta el seguimiento al flujo de inversión para las actividades desarrolladas por el consorcio GP Flandes, en el mes de abril de 2025:

Capitulos -Actividades (CA)		TOTAL ACUMULADO PROYECTO HASTA ABRIL/2025 TOTAL ACUMULADO EJECUTADO HASTA ABRIL/2025	(%) OBRA ACUMULADA PROYECTADA (%) OBRA ACUMULADA EJECUTADA	VALOR TOTAL PROYECTADO MES DE ABRIL/2025 VALOR TOTAL EJECUTADO MES DE ABRIL/2026	(%) TOTAL PROYECTADO A ABRIL/2025 (%) TOTAL EJECUTADO A ABRIL/2025
GENERALES	Proyectado	$490.082.200	2,37%	$91.878.856	18,75%
	Ejecutado	**$809.399.037**	3,94%	$115.116.420	14,22%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA	Proyectado	$6.516.436.917	31,46%	$2.694.187.420	41,34%
	Ejecutado	**$1.224.756.111**	5,96%	$674.706.336	55,09%
NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	Proyectado	$8.081.460.495	39,02%	$1.185.423.464	14,67%
	Ejecutado	**$13.100.936.126**	63,73%	$1.382.645.708	10,55%
REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE ALPHA	Proyectado	$1.102.044.442	5,32%	$1.102.044.442	100,00%
	Ejecutado	**$599.646.262**	2,92%	$145.834.255	24,32%
REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE BRAVO	Proyectado	$0	0,00%	$0	0,00%
	Ejecutado	**$618.266.723**	3,01%	$248.196.429	40,14%
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Proyectado	$0	0,00%	$0	0,00%
	Ejecutado	**$81.662.033**	0,40%	$0	0,00%
SISTEMA DE DRENAJE	Proyectado	$2.102.484.298	10,15%	$450.950.631	21,45%
	Ejecutado	**$2.250.236.885**	10,95%	$312.355.595	13,88%
BOX COULVERT	Proyectado	$1.315.605.858	6,35%	$394.848.591	30,01%
	Ejecutado	**$1.641.830.146**	7,99%	$571.224.534	34,79%
AYUDAS VISUALES (SISTEMA DE ILUMINACIÓN)	Proyectado	$0	0,00%	$0	0,00%
	Ejecutado	**$0**	0,00%	$0	0,00%
OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS	Proyectado	$913.289.757	4,41%	$692.884.342	75,87%
	Ejecutado	**$0**	0,00%	$0	0,00%
GESTIÓN FORESTAL	Proyectado	$0	0,00%	$0	0,00%
	Ejecutado	**$0**	0,00%	$0	0,00%
APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR	Proyectado	$190.067.152	0,92%	$0	0,00%
	Ejecutado	**$229.274.060**	1,12%	$0	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA PROGRAMADO A ABRIL/2025		**$ 20.711.471.119**	100%	**$ 6.612.217.746**	
VALOR BÁSICO DE OBRA EJECUTADO A ABRIL/2025		**$ 20.556.007.383**	100%	**$ 3.450.079.276**	

Tabla 23- Actividades programadas para el mes de abril de 2025 (fuente propia)

En el mes de abril de 2025, solo se ejecutaron las actividades contractuales programadas que corresponden a la línea base, pero no se pudo avanzar con los ítems No Previstos por falta de aprobación por parte de la entidad contratante.

En el seguimiento al programa de inversiones, se observa que no se alcanzó la meta del 13,75% del valor total del contrato, pero se alcanzó un 7,18%, superior al valor ejecutado del mes anterior, a pesar del recrudecimiento e incremento extremo las lluvias e inundaciones ocurridas durante todo el mes.

En la ejecución acumulada, por primera vez desde el inicio del contrato, se tiene un avance por debajo respecto a lo programado al final del mes de abril de 2025, correspondiente a un -0.33% que se traduce a una ejecución acumulada del 42,75% sobre un 43,08% programado, pero como el

invierno va a extenderse hasta el mes de junio según informe del IDEAM, el retraso continuará aumentando y la actividad de pavimentación se convierte en la ruta crítica para el cumplimiento de la programación.

Como parte de la gestión del cronograma el consorcio GP Flandes ha dispuesto de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas como se muestra en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	**RECURSOS**
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6 comisiones de topografía 6 estación total 6 niveles de precisión 1 equipo RTK
DESCAPOTE A MÁQUINA Y EXCAVACIONES, RAJÓN	1 buldócer 1 excavadoras 20 Ton 2 volquetas 2 ayudantes 2 controladoras de tránsito
MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD	1 excavadora 20 Ton 2 motoniveladoras 2 buldócer 2 miniexcavadoras 1 vibro compactador 1 carrotanque de agua 1 retrocargador de llantas 8 volquetas 6 ayudantes
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PISTA	1 fresadora 1 recicladora 2 motoniveladora 2 vibro compactador 1 carrotanque de agua 3 volquetas 6 ayudantes 1 retrocargador de llantas
INSTALACIÓN DE CONCRETOS	15 ayudantes 12 oficiales Formaletas 1 Minicargador Herramienta menor Laboratorio Concreto Argos 23 ayudantes 12 oficiales

CALLES DE RODAJE ALPHA Y BRAVO	1 motoniveladora 1 vibro compactador 1 carrotanque de agua 1 excavadora 18 Ton 1 retrocargador de llantas 6 volquetas 6 ayudantes

Tabla 24- Recursos dispuestos para las actividades programadas en el mes

Indicadores de gestión:

Cuantificación del tiempo real ejecutado: SPI

SPI = EV / PV = 19.797/ 20.411= 0,97

Donde:

PV: Valor Planeado acumulado a abril de 2025

EV: Valor Ejecutado acumulado (corte informe semanal # 48)

Se observa una desaceleración considerable en la ejecución, con una pérdida importante del avance pasando de un SPI=1,21 con el que se cerró el informe del periodo anterior a un SPI=0,97 del presente periodo, debido a las afectaciones de las áreas de trabajo por el invierno atípico que se presenta en el aeropuerto de Flandes y en general en todo el país. Como plan de acción se han implementado el trabajo en días festivos y trabajo en horario extendido, llevando las jornadas hasta horas nocturnas para aprovechar los tiempos secos.

Evaluación: EVAL (etapa de construcción = 15 meses)

EVAL = (Tiempo de ejecución total / 100) x Avance

Tiempo de ejecución total = 15 x 30 = 450 días

Avance = -1,26%

EVAL = (450 / 100) x 1.262 = -6 días

El impacto del invierno se ve reflejado en este indicador, que pasó de un adelanto de 28 días en el mes pasado a un atraso de 6 días en este mes, para un impacto total al cronograma por las lluvias que resultan en una pérdida de 34 días.

Informe de control de los costos.

A continuación, se presenta el balance financiero acumulado incluyendo la etapa de pre-construcción y el acta de obra No. 6 con periodo de corte del 26 de marzo de 2025 al 25 de abril de 2025, en el que se observa la obra a facturar para el periodo citado correspondiente al 5,54% respecto al valor total del contrato.

Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		**40,60%**

Tabla 25- Balance financiero del contrato con corte al acta de obra N° 6 (fuente propia)

Para este período se realizaron actividades en diferentes frentes de trabajo y se validaron las obras con base en los diseños aprobados, con el fin de controlar que solo se ejecute la obra contratada, como sigue:

Durante el presente mes, se presentaron todos los soportes para tramitar los precios No Previstos, mediante la implementación de mesas de trabajo entre interventoría y contratista, en donde se estudiaron los siguientes ítems:

VALORACION DE LOS ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr.UNITARIO	Vr. PARCIAL
NP-01	REVESTIMIENTO DE CANAL CON PIEDRA PEGADA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS	M2	439,00	$ 178.038,00	$ 78.158.682,00
NP-02	SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA	M3	13.440,00	$ 107.000,00	$ 1.438.080.000,00
NP-03	TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD	M2	221.604,60	$ 3.600,00	$ 797.776.560,00
NP-04	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERÍA 4")	M	428,00	$ 81.829,00	$ 35.022.812
NP-05	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6")	M	5.992,00	$ 109.149,00	$ 654.020.808
NP-06	CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8")	M	4.044,00	$ 125.192,00	$ 506.276.448
NP-07	ADECUACION CUARTO ELECTRICO	UND	1,00	$ 28.141.912,00	$ 28.141.912
NP-08	TRASLADO DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONEXIÓN DE REGULADORES	UND	1,00	$ 65.952.905,00	$ 65.952.905
					$ 3.603.430.127

Tabla 26- Análisis de precios unitarios de ítems No Previstos en proceso de aprobación

Se tiene pendiente la elaboración de la propuesta de precios no previstos para otras actividades de obra y de índole eléctrico.

Actividades ejecutadas en el periodo.

Las actividades ejecutadas y su cantidad de obra validada por interventoría son las siguientes:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES	VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 6	
		UND.	CANT	VR PARCIAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD)	M2	52.070,0	$ 114.554.000
2.1	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	755,6	$ 43.642.320
2.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	755,6	$ 123.918.400
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	7,5	$ 1.462.500
2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)	M3	2.182,5	$ 458.477.775
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	5.650,3	$ 371.224.710
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.	M3	8.583,3	$ 1.235.995.200
5.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	449,7	$ 29.545.290
5.3	MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	321,5	$ 52.726.000
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.	M3	746,6	$ 145.587.000
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).	M3	448,0	$ 94.111.360
7.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.353,7	$ 88.938.090
7.3	CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.	M3	58,6	$ 58.713.039
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy 60000 psi)	KG	768,7	$ 7.723.273
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fy 60000 psi)	KG	33.132,5	$ 333.147.288
8.4	CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC	M3	195,7	$ 324.604.459

Tabla 27- Actividades facturadas Acta #6 de obra (fuente propia)

Como parte de la gestión de costo, se destacan las siguientes acciones para completar las tareas propuestas para el mes de abril del año 2025:

1- Implementación de jarillones para protección de zonas de trabajo.
2- Excavación de canales por etapas para generar zonas de drenaje en caso de lluvias
3- Extensión de las jornadas de trabajo a jornadas nocturnas para aprovechar los momentos sin lluvia en la zona y contrarrestar los tiempos muertos del personal y los equipos.
4- Actividades de bombeo y “secado” del material para mitigar la afectación por las lluvias.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la interventoría para analizar y revisar la fórmula de ajuste con los índices ICOCIV de acuerdo con el contrato de obra, en donde se define que se utilizará el indicador global para el cálculo del factor de ajuste tomando los meses de abril de los años 2025 y 2024 para dicho calculo y se aplicará desde el mes de enero de 2025, con el mismo valor de ajuste para todo el año, mes a mes.

Indicadores de gestión del costo

Cumplimiento: VAL

VAL = Costo real período / costo programado período x 100

Costo real período = $ 3.450.079.276

Costo programado período = $ 6.612.217.746

VAL = 52,18%.

La variación del costo presentada se debe principalmente a:

1- Lluvias intensas durante todo el mes e inundaciones.

Informe de gestión y control de la calidad.

Las actividades de obra ejecutadas durante el mes de abril de 2025 fueron las siguientes:

1.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD)

2.1 EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

2.3 MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

2.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.

2.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS)

3.2 EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

3.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.

5.2 EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

5.3 MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

5.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.

5.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).

7.2 EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

7.3 CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.

7.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)

8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi)

8.4 CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC

Los controles de obra descritos en el plan de inspección y ensayos fueron realizados durante las intervenciones. Los ensayos o análisis respecto a la calidad de la obra ejecutada se presentarán en el siguiente mes y corresponden a los siguiente:

ACTIVIDAD	ENSAYO / EVIDENCIA
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS SEGUIMIENTO Y RECORD	Para los niveles y estaciones: -□ Certificado de calibración vigente (Externo) -□ PCF-62 Control del Equipo de Seguimiento y Medición -□ Sticker de calibración -□ CC-F-38 Programación de Verificación y Calibración de Equipos -□ CCP-01 Procedimiento para el control de los equipos de seguimiento y medición -□ PCF-30 Recibo de Niveles por Topografía R2 -□ Cartera topográfica
Actividades de excavación y descapote	Para la geometría: -□ Informe de inspección en obra -□ Registros de visita a obra del geotecnista. -□ Cartera topográfica Para el acabado: -□ De ser necesario adelantar ensayos de PDC para determinar la cota final de la excavación según el tipo de suelo.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS. MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154 RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX COULVERT.	Para el material: -□ Ensayo de laboratorio externo de DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV E – 161 – 13 Para el acabado geométrico: -□ Informe de inspección en obra -□ Cartera topográfica
ACERO DE REFUERZO	-□ Certificado de Calidad del material -□ FR-CO-06 Informe de inspección en obra
CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56. CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0m, INCLUYE CINTA PVC.	Para el material: -□ Remisión. -□ Resultado del ensayo a compresión. -□ FR-CO-06 Informe de inspección en obra -□ FR-CO-10 Control resistencia a la compresión de concreto Para el elemento vaciado: -□ FR-CO-06 Informe de inspección en obra -□ FR-CO-10 Resistencia a la compresión de concretos

Tabla 28. Controles a implementar actividades ejecutadas mes 6.

Como parte del aseguramiento de la calidad durante el mes de abril se adelantaron ensayos de RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO bajo la norma INV E – 410: 2013 para la mezcla de concreto que se está utilizando en la construcción del Box Coulvert y demás estructuras de drenaje. Los resultados de las resistencias a 28 días están cumpliendo con la normatividad y los estándares del plan de inspección de ensayos. Las densidades del afirmado, la sub-base y la subbase reciclada están cumpliendo las densidades de compactación mínimas para aprobación de lotes.

En el anexo de Calidad al presente informe se adjuntan los ensayos de calidad de los materiales y análisis de los resultados.

Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el mes de abril del año 2025 se identifican nuevos interesados y se alimenta la matriz de interesados en la que se incluyen tanto representantes de la entidad contratante, como de la interventoría y contratista, y la comunidad aeroportuaria de Flandes, como sigue:

Obra:	**MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES**	**Fecha última actualización:**	**19/05/2025**	**CONSORCIO GP FLANDES**

Parte Interesada	Nombre Contacto	Cargo	Tel/Cel	Correo electrónico	Observaciones
AEROCIVIL	Andres Arboleda Salazar	Secretario de servicios aeroporturaios	3102356471	andres.arboleda@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Alexander García	Jefe Contratos de mantenimiento Aerocivil	3112699634	alexander.garcia@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Juanita Villamizar	Supervisora del contrato	3194891110	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Johan Camilo Silva	Ingeniero de apoyo a la supervision	3166260591	camilo.silva@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Hayder Suarez	Ingeniero de apoyo a la supervision	3112489948	hayder.suarez@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Gilma del Pilar Lozano	Administradora Aeropuerto Flandes	3208792261	gilma.lozano@aerocivil.gov.co	Operación del aeropuerto
	Oscar Ramirez	Jefe de torre Aeropuerto de Flandes	3042491589	oscara.ramirez@aerocivil.gov.co	Operación del aeropuerto
	Mario Ramirez	Supervisor de area de maniobra	3144451064	mario.ramirez@aerocivil.gov.co	Operación del aeropuerto
INTERVENTORIA	Roselly Pajaro	Representante Legal	3012331719	gerencia@gepobras.com	Resultado de interventoría
	Nelson López	Consorciado EPYPSA	3107663103	nelson.lopez@epypsa.com	Resultado de interventoría
	Alfredo Perez	Director de Interventoría	3153669168	alfredoperez_santos@hotmail.com	Cumplimiento del contrato
	Omar Ruge	Coordinador de interventoría	3125210322	tecnicaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
	Daniel Quintana	Residente administrativo interventoría	3102010228	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
CONTRATISTA	Juan Carlos López de Mesa	Representante Legal	3207971787	gerencia@procopal.com	Resultado del contrato de obra
	Juan Diego Blair Llorens	Gerente General Gisaico	3116297156	gerencia@gisaico.com.co	Resultado del contrato de obra
	Jose Fránklin Hincapie	Gerente UEN Infraestructura Gisaico	3104953297	franklin.hincapie@gisaico.com.co	Apoyo a la Gestión del contrato

	Ruben Medina	Director técnico Procopal	3104360382	ruben.medina@procopal.com	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ricardo Alberto Muñoz	Director de obra consorcio GP Flandes	3108900285	ricardo.munoz@procopal.com	Dirección y Gestión del proyecto
	Angel García	Directora financiera Gisaico	3117698407	angela.garcia@gisaico.com.co	Rentabilidad y financiación
	David Munera	Director financiero Procopal	3113186581	david.munera@procopal.com	Rentabilidad y financiación
	Jhon Velez	Ingeniero de apoyo	3225944964	jhon.velez@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Jose Daniel Villegas	Ingeniero residente	3148414926	jose.villegas@procopal,com	Residente de obra
	Orley Pineda	Ingeniero coordinador	3113121808	orley.pineda@gisaico.com.co	Residente de obra
	John Edgar Arango Salas	Gerente de proyectos	3147931569	arangosalas@gmail.com	PMP
	Jorge Soto	Ingeniero coordinador	3147722132	jorge.soto@procopal.com	Residente de obra
AUTORIDADES	Ana Judith Gamboa	Alcaldesa de Flandes	3102152832	Alcaldesa@flandes.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Adriana Magali Matiz	Gobernadora del Tolima	(608) 2611111	contactenos@tolima.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Salomón Said Arias	Alcalde de Girardot	(601) 8393510	atencionalciudadano@girardot-cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Jorge Emilio Rey	Gobernador de Cundinamarca	(601) 7490000	contactenos@cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Andrés Perez Frías	Comandante policia Flandes	3213760022	Flandes@policia.gov.co	Seguridad física
PROVEEDORES	Jorge Tobón	Evaltec	3154593672	gerencia@evaltec.com	Consultoría
	Ricardo Adame	Skytech	3105747923	ceo@skytechsas.com	Consultoría
	Wilson Castell	Cayto tractores	3102231718	gerencia@cayto.com	Petreos y mezcla asfaltica
	Enrique Mayorga	Mavi Pavimentaciones	3153112256	gerencia@gmail.com	Petreos y mezcla asfaltica
	Gustavo Pabón	Nautila	3142534199	nautilasas@hotmail.com	Materiales petreos
	Felipe Cardenas	Base fija de operaciones - FBO	3125016916	inveaereassas@gmail.com	Alquiler zonas de campamento
	Luis Eduardo Torres	TS Ingeniería	3044570877	comercial@tsingenieria.com.co	Materiales petreos
COMUNIDAD	Luis Henry Varon	Predios contiguos al Aeropuerto	3173705451	henryvaron@me.com	Zodme, afirmado y vía de acceso
	Rene piloto	Aeroclub de colombia	3178538395	-	Piloto y operador del aeropuerto
	Nicomedes Ávila	Predios contiguos al Aeropuerto	3207444901	-	Posible Zodme por

					permiso de nivelación
	Diego Alvarez	Analista de rutas de SATENA	3192476210	diego.alvarez@satena.com	Nueva ruta en Flandes
	Bernardo Alvarez	Representante Inveraereas	3112365943	inveaereassas@gmail.com	Operación aeropuerto
	David Vilaro	Escuela de instrucción Aeronova	3219703344	coor.calidad@ptcacademy.net	Operación aeropuerto
	Fernando Crespo	Escuela de instrucción Aeroandes	3114428838	operacionesgirardot@aeroandes.edu.co	Operación aeropuerto
	Nestor Caballero	Escuala de instrucción Acahel	3102485525	acahel.academia@gmail.com	Operación aeropuerto
	Elizabeth Medina	Escuela de instrucción Protecnica	3142280014	sms@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Abel Urrea	Escuela de instrucción Aeroclub	3112536392	gerencia@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Ricardo Ospina - Maria Paula Ospina	Escuala de paracaidismo SKY	3165290699	jefedeoperaciones@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Veronica Restrepo	Asociación de pilotos y aeronaves	3204960558	ricardo@skydivecolombia.com	Operación aeropuerto
	Miguel Angel Ponce	Globe Air FuellL (combustible aviones)	3124576900	gerencia@gafcolombia.com	Operación aeropuerto
	Felipe Cardenas	FBO - Aerotaxis Guaymaral	3112365943	lfcfbo@hotmail.com	Operación aeropuerto
	Raul Carvajal	Junta de acción comunal - Los Almendros	3219464118	-	Bienestar para la comunidad

Tabla 29- Matriz de interesados actualizada a abril de 2025 (fuente propia)

Adicionalmente como parte de la gestión de las comunicaciones se mantienen los grupos de WhatsApp creados con interventoría y supervisión para una comunicación permanente entre las partes, destacando los siguientes temas tratados en el mes de abril de 2025:

- Trámite de Anticipo y creación de terceros en la fiducia
- PQR’s
- NOTAM
- Trámite aprovechamiento forestal
- Registro fotográfico del avance de la obra
- Agenda de comité de seguimiento
- Afectaciones por el clima
- Precios de obra extra
- Facturación de actas de obra
- Trámite para la aprobación de los ítems no previstos
- Aprobación de la Valla de la obra
- Compromisos y entregables
- Acta de obra No. 5
- Programa social y vía de acceso al aeropuerto

También se ha hecho entrega de informes semanales para cuatro (4) semanas del mes de abril de 2025, donde se informan las actividades realizadas con su respectivo registro fotográfico y se hace

el informe de avance con respecto a lo programado, y los datos contractuales del proyecto además de la gestión de pagos, avance de componentes, datos del personal y maquinaria asignada al proyecto, entre otros.

En cuanto a las reuniones realizadas durante el mes de abril se destacan las reuniones con los especialistas aeronáuticos y las reuniones con los especialistas en pavimentos.

Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del contrato.

Los riesgos identificados como de probabilidad más alta que pueden afectar el proyecto en la etapa de construcción, y su respectivo tratamiento supuesto, son los siguientes:

GESTION DEL RIESGO - AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES

ETAPA DE CONSTRUCCION

FECHA: abril 2025

No.	Descripcion	Tipo	Tratamiento propuesto	Calificación despues del tratamiento		
				Probabilidad	Impacto	Categoría
1	Incrementos inesperados en los costos de insumos, materiales y/o transporte y/o equipos debido a la fluctuación de los precios del mercado en el sitio y el entorno del sitio en donde se ejecutará el contrato debido a cambios intempestivos de las condiciones macroeconó micas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado.	Económico	Tramitar el anticipo y hacer un análisis de fuente de materiales, para negociar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo de la obra.	1	5	6
2	Escases de mano de obra calificada y no calificada	Económico	Realizar la divulgación de vacantes en las diferentes plataformas y redes sociales locales. Hacer estrategias de contratación con la alcaldía del municipio de Flandes	1	2	3
3	Mayores costos del transporte de material resultante o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado.	Económico	Realizar un estudio de mercado que identifique diferentes alternativas para el transporte y disposición final del material resultante de la ejecución de la obra	1	4	5
4	Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestacion es en las vias de acceso al Aeropuerto.	Social Politico	Monitorear constantemente el entorno de vecindad al aeropuerto y buscar rutas alternas	5	5	10
5	Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas.	Social Politico	Cumplimiento de acuerdos establecidos con alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Implementar adecuadamente un PMT y hacer un acta de entorno de las vías de acceso al aeropuerto. Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social, vincular personal de la zona como beneficio social a la comunidad vecina	5	2	7
6	Retención forzada de personal y/o equipos	Social Politico	Implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. Establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales de la zona.	2	5	7
7	Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros	Social Politico	Incluir en la matriz de interesados a los operadores del aeropuerto, gremios, proyectos de desarrollo vecinos e indagar sobre sus intereses y como gestionarlos	1	2	3
8	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Social Politico	Establecer un plan de seguridad física y evaluar las posibles ubicaciones de campamentos	5	2	7
9	Terminación o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia de la ejecución de un contrato de concesión u otro contrato en ejecución y/o modificaciones al contrato de concesion u otros contratos existentes en el Aeropuerto.	Operacional	Solicitar a la interventoría información sobre contratos vigentes o en trámite del aeropuerto, tanto en su operación como en la construcción de infraestructura física	1	3	4
10	Falta del contrato suscrito de interventoría para el incio del contrato de obra	Operacional	Solicitar a la supervisión una copia del contrato de interventoría	1	3	4
12	Demoras en la expedición de permisos internos por el concesionario o el explotador del aeródromo o aeropuerto para realizar los trabajos en áreas restringidas de la zona lado tierra o lado aire del aeropuerto.	Operacional	Durante la reunión de inicio y la visita de obra al aeropuerto, establecer con la interventoría el procedimiento para el trámite de los carnets y permiso para ingreso a lado aire del aeropuerto	1	2	3
13	Interferencia en la continuidad de los trabajos generado por código azul	Operacional	Planes de ejecución rápida al cronograma de obras para recuperar los eventuales atrasos	1	1	2
14	Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones en la zona de ejecución de la obra.	Operacional	Implementación de un PGIR y PMA	1	1	2
16	Cortes accidentales a las redes REAN / REAP/RTAN / RTAP existentes en el Aeropuerto.	Operacional	Solicitar a la interventoría los planos de circuitos de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP que cruzan la zona de las obras.	1	2	3
17	Afectación involuntaria a la red hidráulica de aguas residuales construida	Operacional	Solicitar a la interventoría los planos de redes de alcantarillado del aeropuerto	2	2	4
18	Afectación involuntaria a la operación generada por contingencias presentadas en el traslado de redes internas y externas (Hidrosanitari as, electricas y gas) del Aeropuerto	Operacional	Realizar un plan de contingencia de traslado de redes si se llegase a identicar alguna red que no se tuvo en cuenta en los diseños y que se haya detectado durante la construcción	1	1	2
22	Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra	Operacional	Implementar un plan integral de vectores de acuerdo a la normavidad vigente aplicable	3	3	6
24	Riesgos por eventos asociados a la operación aeréa.	Operacional	Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias que puedan afectar la operatividad del aeropuerto, por causas imputables a la ejecución de la obra.	1	3	4
26	No disponibilidad de "STOCK" para sistemas de ayudas visuales, cuando se afecte como consecuencia de daños causados por el contratista	Operacional	Asegurar en la etapa de inicio del proyecto que se contará con los insumos que permita realizar el adecuado mantenimiento a los sistemas de ayudas visuales	1	1	2
27	Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto.	Natural	Construcción de canales perimetrales y drenajes provisionales para desaguar rápidamente las zonas que se puedan inundar, causando la menor afectación al aeropuerto	5	5	10
28	Altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan la potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos	Natural	Incrementar los recurso de personal y equipos para optimizar el trabajo en los tiempos secos. Implementar jornadas de trabajo extendidas y dias festivos	5	5	10
31	Ocurrencia de fenómenos naturales que puedan afectar la ejecución de la obra.	Natural	Monitorear las redes de emergencia como bomberos, defensa civil y oficina nacional de atención de desastres, para establecer los planes de contingencia que se requieran	2	2	4
32	Hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos.	Natural	Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios.	1	1	2
36	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Social Politico	Acercamiento a las autoridades locales y monitoreo de las politicas gubernamentales. Rutas alternas por psoibles bloqueos de vías de acceso al aeropuerto	3	3	6
37	Cambio en los indicadores de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras.	Financiero	Tramite del anticipo de obra y gestión de pago de actas con cortes mensuales, apropiación de recursos para los ajustes a los precios unitarios	3	5	8

Tabla 30. Riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia.

Informe de monitoreo de riesgos.

Para el mes de abril se manifestaron los siguientes riesgos:

4. Afectación en las vías de acceso al aeropuerto: Por acción interpuesta por veedores de la comunidad y debido a que en el municipio de Flandes existe un decreto que impide la circulación vehículos de más de dos ejes y más de 10 Ton, se suspendió el acceso de las volquetas y mixer por la vía urbana de acceso al aeropuerto. Como medida de mitigación se realizó una negociación de una servidumbre por un predio vecino, lo que permitió la continuidad de los trabajos programados para el mes de abril.

27. Inundaciones en el área de trabajo: Debido a las fuertes lluvias presentadas en el mes de abril de 2025, se presentaron inundaciones en varios frentes de trabajo, para lo cual se construyeron drenajes provisionales y se aceleraron las excavaciones de los canales con el fin de desaguar más rápidamente las zonas Anegadas. Esta medida permitió ingresar más rápidamente a las zonas afectadas, dado que se logró disminuir la lámina de agua con rapidez y con la acción del sol, el secado de algunos frentes de trabajo donde se pudo avanzar con actividades como afirmado en zonas de seguridad.

28. Altos niveles de precipitación: Como plan de acción para mitigar las afectaciones por el invierno, se incrementó la planta de personal y se contrataron maquinas adicionales, colocando el consorcio GP Flandes mayores recursos durante los tiempos secos y de esta forma adelantar la mayor cantidad de obra posible en estos periodos.

37. Riesgo de liquidez: Por el cambio de año y la legalización de las vigencias presupuestales, las actas de pago se demoraron y la liquidez tuvo afectaciones, para lo cual se ha logrado disminuir los tiempos de revisión y aprobación de actas por parte del interventor y de esta forma poder tramitar las actas de pago pendientes.

Informe de gestión de la participación de los interesados

Este apartado del informe se centra en la comunicación y gestión de las relaciones con todas las partes interesadas (stakeholders) del proyecto. Su objetivo principal es asegurar que los interesados estén informados, comprometidos y que sus expectativas sean gestionadas adecuadamente para contribuir al éxito del proyecto.

MATRIZ DE INTERESADOS

Obra:	MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES	Fecha última actualización:	31/10/2024	CONSORCIO GP FLANDES

Parte Interesada	Nombre Contacto	Cargo	Tel/Cel	Correo electrónico	Observaciones
AEROCIVIL	Andres Arboleda Salazar	Secretario de servicios aeroporturaios	3102356471	andres.arboleda@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Alexander García	Jefe Contratos de mantenimiento Aerocivil	3112699634	alexander.garcia@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Juanita Villamizar	Supervisora del contrato	3194891110	juanita.villamizar@aerocivil.gov.co	Cumplimiento del contrato
	Johan Camilo Silva	Ingeniero de apoyo a la supervision	3166260591	camilo.silva@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Michel Moreno	Ingeniero de apoyo a la supervision	3124509795	michel.moreno@aerocivil.gov.co	Cumplimiento de Interventoría
	Hayder Suarez Zamudio	Supervisor Contrato de Interventoría			
	Gilma del Pilar Lozano	Administradora Aeropuerto Flandes	3208792261	gilma.lozano@aerocivil.gov.co	Operación del aeropuerto
INTERVENTORIA	Rosely Pajaro	Representante Legal	3012331719	gerencia@gepobras.com	Resultado de interventoría
	Nelson López	Consorciado EPYPSA	3107663103	nelson.lopez@epypsa.com	Resultado de interventoría
	Alfredo Pérez Santos	Director de Interventoría	3167528617	interventoriaflandes@gmail.com	Cumplimiento del contrato
	Jose David	Residente de interventoría	3134286246	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
	Andres Carrillo	Auxiliar de ingeniería de interventoría	3208366270	interventoriaflandes@gmail.com	Apoyo de interventoría
CONTRATISTA	Juan Carlos López de Mesa	Representante Legal	3207971787	gerencia@procopal.com	Resultado del contrato de obra
	Juan Diego Blair Llorens	Gerente General Gisaico	3116297156	gerencia@gisaico.com.co	Resultado del contrato de obra
	Jose Fránklin Hincapie	Gerente UEN Infraestructura Gisaico	3104953297	franklin.hincapie@gisaico.com.co	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ruben Medina	Director técnico Procopal	3104360382	ruben.medina@procopal.com	Apoyo a la Gestión del contrato
	Ricardo Alberto Muñoz	Director de obra consorcio GP Flandes	3108900285	ricardo.munoz@procopal.com	Dirección y Gestión del proyecto
	Jhon Velez	Ingeniero de apoyo	3225944964	jhon.velez@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Jose Daniel Villegas	Ingeniero residente	3148414926	jose.villegas@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
	Alvaro Alzate	Topografo líder oficina técnica	3136638805	alvaro.alzate@procopal.com	Apoyo a la dirección de obra
AUTORIDADES	Ana Judith Gamboa	Alcaldesa de Flandes	3102152832	Alcaldesa@flandes.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Adriana Magali Matiz	Gobernadora del Tolima	(608) 2611111	contactenos@tolima.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Salomón Said Arias	Alcalde de Girardot	(601) 8393510	atencionalciudadano@girardot-cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Jorge Emilio Rey	Gobernador de Cundinamarca	(601) 7490000	contactenos@cundinamarca.gov.co	Ampliación del aeropuerto
	Andrés Perez Frías	Comandante policia Flandes	3213760022	Flandes@policia.gov.co	Seguridad física
PROVEEDORES	Jorge Tobón	Evaltec	3154593672	gerencia@evaltec.com	Consultoría
	Ricardo Adame	Skytech	3105747923	ceo@skytechsas.com	Consultoría
	Wilson Castell	Cayto tractores	3102231718		Petreos y mezcla asfaltica
	Enrique Mayorga	Mavi Pavimentaciones	3153112256		Petreos y mezcla asfaltica
	Gustavo Pabón	Nautila	3142534199		Materiales petreos
	Felipe Cardenas	Base fija de operaciones - FBO	3125016916		Alquiler zonas de campamento
	Monica Sanchez	Concretos La Floresta	3203876292		Materiales petreos
COMUNIDAD	Luis Henry Varon	Predios contiguos al Aeropuerto	3173705451	henryvaron@me.com	Zodme, afirmado y vía de acceso
	Juan Carlos Ramirez	Predios contiguos al Aeropuerto	3158317059		Posible Zodme por permiso de nivel
	Diego Alvarez	Analista de rutas de SATENA	3192476210	diego.alvarez@satena.com	Nueva ruta en Flandes
	Bernardo Alvarez	Representante Inveraereas	3112365943	inveaereassas@gmail.com	Operación aeropuerto
	David Vilaro	Escuela de instrucción Aeronova	3219703344	coor.calidad@ptcacademy.net	Operación aeropuerto
	Fernando Crespo	Escuela de instrucción Aeroandes	3114428838	operacionesgirardot@aeroandes.edu.co	Operación aeropuerto
	Nestor Caballero	Escuela de instrucción Acahel	3102485525	acahel.academia@gmail.com	Operación aeropuerto
	Elizabeth Medina	Escuela de instrucción Protecnica	3142280014	sms@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Abel Urrea	Escuela de instrucción Aeroclub	3112536392	gerencia@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Ricardo Ospina - Maria Paula C	Escuela de paracaidismo SKY	3165290699	jefedeoperaciones@aeroclubdecolombia.com	Operación aeropuerto
	Veronica Restrepo	Asociación de pilotos y aeronaves	3204960558	ricardo@skydivecolombia.com	Operación aeropuerto
	Miguel Angel Ponce	Globe Air FuelIL (combustible aviones)	3124576900	gerencia@gafcolombia.com	Operación aeropuerto
	Felipe Cardenas	FBO- Aerotaxis Guaymaral	3112365943	lfcfbo@hotmail.com	Operación aeropuerto
	Raul Carvajal	Junta de acción comunal - Los Almendros	3219464118		Bienestar para la comunidad

Tabla 31. Matriz de Interesados actualizada

No se han materializado cambios en el nivel de influencia o interés de ningún interesado clave.

Estrategias de Gestión de la Participación:

Todos los interesados cuentan con un espacio para su participación y manifestación de necesidades o expectativas en el proyecto, estos espacios son comités de obra, comités de cada componente, reuniones con la entidad contratante y con la interventoría, reuniones con los especialistas, comités

internos del contratista, reuniones con la comunidad, reuniones con proveedores, y, adicionalmente se cuentan con datos de contacto del Consorcio contratista para recibir por medio escrito cualquier comunicación o citación que requiera un interesado.

No se han realizado ajustes a las estrategias de participación debido a cambios en las necesidades o expectativas de los interesados.

Entre los temas principales tratados con los interesados en general, se encuentra lo referente al periodo de cierre del aeropuerto y a las afectaciones a la comunidad.

El nivel de compromiso actual de los interesados clave es de apoyo, no se tienen interesados con nivel de compromiso neutral o de resistencia. Por lo anterior, se concluye que no existen brechas entre el nivel de participación deseado y el nivel actual.

A la fecha no se han planeado acciones para mejorar la participación de los interesados que no están suficientemente comprometidos.

No se han presentado riesgos nuevos relacionados con la participación de los interesados que haya surgido durante el mes, ni incidentes o problemas que hayan afectado la relación con los interesados.

En resumen, se está llevando una buena gestión de los interesados de manera integral de cómo se están gestionando las relaciones con los interesados, asegurando que se les informa adecuadamente, se gestionan sus expectativas y se fomenta su participación para contribuir al éxito del proyecto de construcción.

La ejecución del proyecto para el mejoramiento del aeropuerto de Flandes representa para todo el personal vinculado al proyecto una oportunidad de conocimiento de nueva normatividad aplicada a este tipo de infraestructura, mediante la divulgación del Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC14 en las charlas diarias.

También permite conocer cómo se deben desarrollan las actividades en un aeropuerto, apegados al plan de seguridad operacional aprobado por la entidad.

La conformación de diferentes grupos de apoyo para el proyecto, integrado por personal de obra, mejora sus saberes en temas complementarios, como el que se desarrolló durante el mes con apoyo del SENA para la prestación de primeros auxilios.

Gestión de recursos y adquisiciones

En cuanto a las adquisiciones resaltamos la consolidación de los equipos de la siguiente manera.

Se tiene el acompañamiento de los siguientes especialistas:

Especialidad	Nombre
Pavimentos	Stella Martínez Naranjo
Geotecnia	Jorge Alberto Tobón García
Hidrología e Hidráulica	Gloria Jenny Mejía Sierra
Eléctrico AGL	William Ricardo Adame Manosalva
Costos y Programación	Carlos Andrés Bedoya
Ambiental	Ana María Saldarriaga
Forestal	Leidy Johana Calderón

Tabla 32 - Adquisición del equipo de especialistas

Como equipo directivo y acompañamiento en la etapa de pre-construcción se tiene a las siguientes personas:

Cargo	Nombre
Director de obra	Ricardo Alberto Muñoz
Residente de obra 1	José Daniel Villegas
Residente de obra 2	Jorge Mario Soto
Ingeniero de apoyo	Jhon Edison Vélez
Jefe de topografía	Álvaro Álzate
Profesional social	Maida Berrío
Gestor SST	Alexander Acevedo
Abogada	Luz Mercedes Vélez
Especialista PMP	John Edgar Arango

Tabla 33 - Adquisición del equipo de dirección

Como equipo de construcción complementario se ha dispuesto al siguiente personal

Cargo	Nombre
Técnico Sisoma	Alex Gustavo Pachón
Auxiliar SST	Estefany Tafur / Rocío Herrera
Auxiliar Social	Mary Cruz Vélez
Ingeniero mecánico	Pablo Torres
Técnicos electricistas	Cristian Castellanos, Ángel Duván Manosalva, Johan Smith Rozo, Julio Nova
Cadeneros tecnólogos	Luisa Fernanda Perdomo, David Ricardo Rodríguez, Gustavo Andrés Rubiano, Diana Ortiz

Tabla 34 - Adquisición del equipo de construcción

Para la elaboración de las fichas PAGA se ha contratado a la especialista ambiental Norella Galvis.

Dentro de los proveedores de materiales, se han adelantado negociaciones con los siguientes:

Proveedor	Localización	Materiales que proveen
Nautila SAS	Km 5 vía Flandes hacia El Espinal	Base y Subbase granular
MAVI Pavimentos	Km 3 vía a Carmen de Apicalá	Recebo Base y Subbase granular Mezcla asfáltica
Cantera La Colina	Km 8 vía a Melgar sector Nilo	Afirmado B400
Ferretería Multihierros Girardot	Sede principal en Girardot, fuentes de material en Melgar	Piedra rajón
Tornillería La 7a	Girardot	Materiales de construcción
Ana Carvajal	Km 3 vía a Ibagué	Combustible
Argos	Intercambiador Espinal	Concreto hidráulico
Stecker aceros	Planta de Bogotá	Acero de refuerzo

Tabla 35. Relación proveedores inscritos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Durante el mes de abril se continuó la gestión de los trámites para conseguir los diferentes permisos que se requieren para la ejecución de la obra, entre los más relevantes se encuentra pendiente el permiso de aprovechamiento forestal.

2- El consorcio GP Flandes hasta el periodo anterior, siempre había superado en cada periodo evaluado las metas propuestas en el programa de obra, alcanzando avances hasta del 5,5% del valor total del contrato, sin embargo, debido a las enormes afectaciones causadas por el atípico invierno, y a pesar de las implementación realizadas para mitigar los riesgos, esta "ventaja en el avance fue disminuyéndose entre los meses de marzo y abril de 2025 finalizando a corte de este informe con un desfase negativo del 0,33% del valor total del contrato. Este retraso es preocupante debido a que se deriva principalmente de los rendimientos bajos o nulos en las actividades de la ruta crítica por causa del mal clima, y sus afectaciones podrían ser no solo económicas, sino que podrían derivar en ampliaciones de plazos de etapas de ejecución que impliquen modificar el NOTAM, así como del plazo contractual de todo el proyecto. Lo anterior debido a que con miras al cumplimiento de los compromisos de la FASE 2 la afectación de la fuerte ola invernal prácticamente impide el cumplimiento del Hito de 1.200 m para el 31 de mayo de 2025.

3- Con corte a 25 de abril de 2025 se tiene una obra ejecutada acumulada de $20.556.007.383 (VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.)

4- De acuerdo con los planes de acción de los comités de obra, se continúa con los siguientes pendientes por parte de la entidad contratante:

- Aprobación plan de aprovechamiento forestal.
- Ampliación/modificación NOTAM de cierre del aeropuerto.

5- Se continúa con el trámite de aprobación de Precios No Previstos resultantes de la etapa de pre-construcción y como parte de la optimización de los diseños.

6- En la gestión de las comunicaciones se presenta un buen cuadro de control tanto de correspondencia recibida como enviada, y a la fecha no se evidencian comunicados sin respuesta mayor a una semana.

7- En la gestión del riesgo se observa que los tratamientos implementados no fueron efectivos frente a la excesiva afectación por el mal clima, y que para las amenazas materializadas se han ejecutado acciones que, aunque han sido bien gestionadas no han servido para impedir

la disminución o detención total del rendimiento de las actividades de obra, especialmente a la mitigación de afectaciones ambientales en los acopios y la vía de acceso. Las horas realmente trabajadas en el periodo, y con la salvedad que su uso fue prácticamente para mitigar las afectaciones por las lluvias y no para avanzar en la ejecución, se pueden verificar en el anexo de Formatos de control - Control climatológico y de horas trabajadas dentro de la carpeta del anexo Técnico.

8- En la gestión de la calidad se obtienen resultados óptimos de densidades en campo, lo que ayuda a comprobar la calidad de las fuentes de materiales para el afirmado que se requiere en el mejoramiento de la zona de seguridad. Igualmente, en lo referente a las resistencias de concreto.

9- En la gestión de las adquisiciones se destacan los equipos de personas conformadas para las diferentes etapas que conlleva el proyecto. Adicionalmente se destaca la constante disponibilidad de equipo que ha permitido obtener unos rendimientos por encima de lo esperado en las actividades de instalación de materiales granulares, y en el fresado y reciclaje de la estructura existente.

10- El contratista se encuentra al día en la entrega de los requerimientos efectuados por la interventoría y en la presentación de los informes semanales en formato de la entidad contratante.

11- A pesar de la fuerte lluvia se ha logrado mantener un ritmo de ejecución que permita mantenerse cerca de la línea base de cronograma

ANEXOS.

https://drive.google.com/drive/folders/1R02ES2wlJD-BsGBTMGrCBFZu4JFc-4Lc?usp=drive_link

Ambiental

Calidad

Social

SST

Técnico
