AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	000
SEDE:	MOCOA
FECHA:	06-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

ALCUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD APROBADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1,00	**PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	675,00	185,92	$ 14.704,20	$ 9.925.335	$ 2.733.805
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15,00	15,00	0,00	$ 18.391,57	$ 275.874	$ 0,00
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 22.279,09	$ 0	$ 0,00
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 39.823,88	$ 0	$ 0,00
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0,00	0,00	0,00	$ 7.352,10	$ 0	$ 0,00
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,90	30,90	0,00	$ 24.312,50	$ 751.256	$ 0,00
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35,00	35,00	0,00	$ 17.852,18	$ 624.826	$ 0,00
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00	0,00	0,00	$ 98.028,00	$ 0	$ 0,00
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,50	444,50	0,00	$ 7.964,82	$ 3.540.362	$ 0,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0,00	0,00	0,00	$ 61.267,50	$ 0	$ 0,00
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 73.521,00	$ 0	$ 0,00
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7,00	7,00	0,00	$ 12.092,27	$ 84.646	$ 0,00
1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540,00	350,00	190,00	$ 9.976,39	$ 3.491.737	$ 1.895.514
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 18.694.036**	**$ 4.629.319**
2,00	**MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA**							

2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,90	16,90	0,00	$ 109.639,18	$ 1.852.902	$ 0,00
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	13,83	0,00	$ 110.465,53	$ 1.527.738	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 3.380.640**	**$ 0**
3,00	**ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575,00	575,00	0,00	$ 11.763,78	$ 6.764.174	$ 0,00
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15,00	15,00	0,00	$ 31.323,52	$ 469.853	$ 0,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 34.899,16	$ 0	$ 0,00
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,50	850,50	0,00	$ 17.869,76	$ 15.198.231	$ 0,00
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,90	507,90	0,00	$ 25.123,27	$ 12.760.109	$ 0,00
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	1118,54	0,00	$ 21.394,52	$ 23.930.626	$ 0,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0,00	0,00	0,00	$ 40.266,31	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 59.122.992**	**$ 0**
4,00	**ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA**							
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 98.356,17	$ 0	$ 0,00

4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	210,67	0,00	$ 80.516,32	$ 16.962.373	$ 0,00
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,50	444,50	0,00	$ 93.547,34	$ 41.581.793	$ 0,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100,00	100,00	0,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899	$ 0,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335,00	335,00	0,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678	$ 0,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	660,65	0,00	$ 60.536,38	$ 39.993.359	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 105.672.102**	**$ 0**
5,00	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0,00	0,00	0,00	$ 129.887,10	$ 0	$ 0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0,00	0,00	0,00	$ 21.906,54	$ 0	$ 0,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0,00	0,00	0,00	$ 59.858,93	$ 0	$ 0,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0,00	0,00	0,00	$ 11.864,02	$ 0	$ 0,00
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 80.750,57	$ 0	$ 0,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 522.429,72	$ 0	$ 0,00
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7,00	7,00	0,00	$ 130.327,80	$ 912.295	$ 0,00
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 206.267,25	$ 0	$ 0,00
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 94.425,47	$ 0	$ 0,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0,00	0,00	0,00	$ 330.844,50	$ 0	$ 0,00

	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 912.295**	**$ 0**
6,00	**CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 53.679,24	$ 0	$ 0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	0,00	0,00	0,00	$ 67.472,15	$ 0	$ 0,00
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540,00	540,00	0,00	$ 146.892,97	$ 79.322.204	$ 0,00
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0,00	0,00	0,00	$ 101.824,52	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 79.322.204**	**$ 0**
7,00	**CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	29,57	0,00	$ 392.473,48	$ 11.605.441	$ 0,00
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 364.704,08	$ 0	$ 0,00
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0,00	0,00	0,00	$ 343.098,00	$ 0	$ 0,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0,00	0,00	0,00	$ 836.112,47	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 11.605.441**	**$ 0**
8,00	**URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	0,00	0,00	$ 110.467,05	$ 0	$ 0,00

8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 90.853,28	$ 0	$ 0,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	un	75,00	75,00	0,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783	$ 0,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0,00	0,00	0,00	$ 690.222,15	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 22.565.783**	**$ 0**
9,00	**ITEMNS NO PREVISTOS.**							
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	675,00	185,92	$ 108.123,00	$ 72.983.025	$ 20.102.228
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45,00	45,00	0,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855	$ 0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162,00	162,00	0,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478	$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,60	94,60	0,00	$ 27.871,00	$ 2.636.597	$ 0,00
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	406,60	0,00	$ 117.617,00	$ 47.823.072	$ 0,00
9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	180,90	0,00	$ 89.294,00	$ 16.153.285	$ 0,00

9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	112,00	0,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256	$ 0,00
9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	60,60	0,00	$ 33.995,00	$ 2.060.097	$ 0,00
9,09	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UN	75,00	75,00	0,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575	$ 0,00
9,10	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10,00	10,00	0,00	$ 32.738,00	$ 327.380	$ 0,00
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35,00	35,00	0,00	$ 15.619,00	$ 546.665	$ 0,00
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML	12,40	12,40	0,00	$ 31.238,00	$ 387.351	$ 0,00
9,13	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND	3,00	3,00	0,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425	$ 0,00
9,14	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	12,40	0,00	$ 127.475,00	$ 1.580.690	$ 0,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	10,00	0,00	$ 55.000,00	$ 550.000	$ 0,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	35,00	0,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665	$ 0,00
9,17	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	450,49	0,00	$ 22.619,00	$ 10.189.633	$ 0,00

9,18	DESMONTE E INSTLACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1,00	1,00	0,00	$ 885.356,00	$ 885.356	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 183.381.405**	**$ 20.102.228**
SUBTOTAL							**$ 484.656.898**	**$ 24.731.547**
ADMINISTRACIÓN 22%							$ 106.624.518	$ 5.440.940
IMPUESTOS 3%							$ 14.539.707	$ 741.946
UTILIDAD 5%							$ 24.232.845	$ 1.236.577
IVA 19% (UTILIDAD)							$ 4.604.241	$ 234.950
SUMAS TOTALES (valor ejecutado – Valor por ejecutar)							**$ 634.658.208**	**$ 32.385.961**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO							**$ 667.044.169**	

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Áreas intervenidas

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de recepción de documentos:	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico
2	Oficina de trabajo social	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico
3	Oficina Primera Infancia	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico acondicionados
4	Cocineta	se evidencia averiacion en el respaldo interno de la cocina integral bajo la superficie de la estufa	100%	Se requiere remplazar el tablero para suplir la grieta interna y subsanar el acabado de la cocina integral
5	Área de baños (damas-caballeros- discapacitados)	Se evidencia filtración de humedad en la superficie baja de las ventanas Se observa humedad presentada en la parte de afuera del baño para personas con movilidad reducida, este problema ya se presentó con	100%	Se requiere instalación de flan ches y super board o en su defecto aplicar estuco.

		anterioridad y no se ha dado solución		
6	Bodega	Aprueba interventoría	100%	
7	Pasillos y rampa	Se observa filtración de agua por la cubierta en la parte superior del muro ubicado en el pasillo de la rampa que lleva a las oficinas del centro zonal Mocoa		se requiere instalación de cinta multiseal, sikaflex constructor ya que este ofrece una excelente adhesión, gran capacidad de movimiento y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
8	Quiosco (auditorio)	En el actual auditorio o quiosco se debe manejar de manera correcta la pendiente toda vez que hay rebose y hay contrapendiente al lugar del drenaje de aguas lluvias.		Se requiere soldadura de platina para darle una pendiente adecuada
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN		
1	Pasillo recepción	Aprueba interventoría		
2	Oficina de Psicología y protección	Se observa en el recorrido que al prender los aires acondicionados y pasado un aproximado de 2 horas se encuentra una filtración de agua en una de las lámparas cercanas al aire acondicionado, posiblemente por la tubería del aire acondicionado		Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lamparas
3	Sala de conferencias	Se observa una humedad evidenciada en la expansión de la pintura en todo el canal ubicado en el antiguo auditorio del centro zonal el cual presta funciones como oficinas actualmente,		Se realizará el resane en el ingreso parte superior y especificar de que parte cubierta o cielo raso, una lámina o placa, toda vez que existe una posible filtración de agua y se garantizan la debida corrección, Registro fotográfico.
4	Oficina de Defensoría protección 1	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina de Trabajo Social	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina de Defensoría de Familia 1	Aprueba interventoría		N/A
7	Oficina defensoría de Familia 2	Aprueba interventoría		N/A
8	Oficina de Coordinación	Aprueba interventoría		N/A
9	Rampas y Pasillos	Aprueba interventoría		N/A

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ÁREA No 3		OBSERVACIÓN		
1	Oficina Jurídica	Aprueba interventoría		N/A
2	Oficina de Nutrición	Aprueba interventoría		N/A
3	Área de Línea Verde	Aprueba interventoría		N/A
4	Cuarto de Máquinas y sistemas	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina 1	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina 2	Aprueba interventoría		N/A
ÁREA No 4		OBSERVACIÓN		
1	Parqueadero y pasillos exteriores	Se observa que el piso terminado en Gress cuenta con un escalón sobre el acceso principal del centro zonal Mocoa, se debe realizar y ajustar portón a nivel de piso de ingreso a parqueadero.		Realizar un rampa ya que son elementos arquitectónicos que permiten salvar diferencias de altura entre espacios
	OTRAS ÁREAS			
	Atención al ciudadano	Se observa en el recorrido que al prender los aires acondicionados y pasado un aproximado de 2 horas se encuentra una filtración de agua en el aire acondicionado, posiblemente por la tubería del aire acondicionado.		Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		N/A
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		N/A
	Grupo de planeación y sistemas regional	Pendiente por entregar		N/A
	Primera infancia y nutrición - Regional	Pendiente por entregar		N/A

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N/A
2	Oficina de CORDINACIÓN	Aprueba interventoría	100%	N/A
3	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N/A

5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
6	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría	100%	N/A
7	Cocina	Aprueba interventoría	100%	N/A
8	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
9	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría	100%	N/A
10	PASILLOS	Aprueba interventoría	100%	N/A
11	ESCALERAS ACCESO	Aprueba interventoría	100%	N/A
12	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría	100%	N/A
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	UNIDAD SANITARIA			N/A
2	CAJA DE INSPECCIÓN			N/A
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40

BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

Retiro y disposición final pañete interior y/o exterior - raspado de ladrillo

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5,00	3,00		15,00	1,00		15,00
TOTAL							15,00

Retiro y disposición final canal aguas lluvia

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANT	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
FACHADA POSTERIOR	14,60				1,00		14,60
ARCHIVO	16,30				1,00		16,30
TOTAL							30,90

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 FRENTE ACCESO PRINCIPAL ACCESOS	18.00				1.00		18.00
TRAMO 2	6.00				2.00		12.00
TRAMO 3 FRENTE A KIOSCO	5.00				1.00		5.00
TOTAL							35,00

Retiro y disposición de enchapes y muros (M2)

ALCUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
OFICINA 5	0.64	1.60		1.02	1.00		1.02
TOTAL							444,50

Retiro Y Disposición Final De Espejos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.53	0.90		2.28	1.00		2.28
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
BAÑOS DAMAS	3.15	0.90		2.84	1.00		2.84
OFICINA PSICOLOGIA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
TOTAL							7,00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14,60	8,00				1,00	116,80
BAÑO CABALLEROS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DAMAS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DISCAPACITADOS	2,00	3,00				1,00	6,00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4,50	4,30				1,00	19,35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	1,50	1,00				1,00	1,50
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4,00	3,60				1,00	14,40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4,00	3,00				1,00	12,00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0,94	1,87				1,00	1,76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15,20	4,00				1,00	60,80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3,96	3,51				1,00	13,90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4,50	7,80				1,00	35,10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3,00	1,09				1,00	3,27
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3,50	3,20				1,00	11,20
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5,53	3,90				1,00	21,57
	2,20	3,80				1,00	8,36
TOTAL							350,00

Muro Superboard Doble Cara 0.10 M (Incluye Estructura, Accesorios, Anclaje, Cinta Y Pintura). (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
KIOSCO	2,50	0,95				1,00	2,38
	2,53	0,95				1,00	2,40
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,56	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,55	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
TOTAL							16,90

Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)	CANTIDAD		TOTAL

ALCUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			UNIDADES A CONSTRUIR	
	2.50	0.95					1.00	2.38
	2.53	0.95					1.00	2.40
	2.55	0.95					1.00	2.42
	2.56	0.95					1.00	2.43
	2.55	0.95					1.00	2.42
	2.55	0.95					1.00	2.43
	2.55	0.95					1.00	2.42
	3.90	2.05	1.80				1.00	6.20
	3.85	2.45	1.80				1.00	7.63
TOTAL								13.83

Impermeabilización De Muros Con Aditivo Sika Transparente O Similar (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA DE EXTERIORES	165.00		1.20	198.00	1.00		198.00
INTERIORES	300.00		1.00	300.00	1.00		300.00
FACHADA DE EXTERIORES	64.17		1.20	77.00	1.00		77.00
TOTAL							575,00

Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm (Suministro E Instalación De Pañete Muro)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5.00	3.00		15.00	1.00		15.00
TOTAL							15,00

Estuco Acrílico Para Humedad Incluye Filo Y Dilataciones (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)					CANTIDAD	UNIDADES A	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA				

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

							CONSTRUIR	
BAÑOS CABALLEROS	15.16					1.00		15.16
BAÑOS DAMAS	15.00					1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03					1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00					1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20					1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94					1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11					1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75					1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18					1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36					1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58					1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54			1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01			1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91			1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45				1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32			1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04				1.00		5.54
	0.36	0.70				1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85				1.00		9.98
	3.44	0.75				1.00		2.58
	0.75	2.28				1.00		1.71
	1.45	0.75				1.00		1.09
	3.50	2.87				1.00		10.05
	2.28	0.156				1.00		0.36
	0.82	0.88				1.00		0.72
	1.20	0.80				1.00		0.96
	0.50	0.85				1.00		0.43
	1.82	0.05				1.00		0.09
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24			2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94			2.00		85.82
FILO	18.00							18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27			1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35			1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10				1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25				1.00		17.19

DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90				1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	2.75				1.00		21.18
NUTRICIÓN	3.99	2.87		6.00		1.00		68.71
	5.70	1.04				1.00		5.93
	1.05	1.21				1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00		1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00		1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00		1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00		1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	4.02	2.74	2.25	2.00		1.00		17.54
								850.50

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo koraza doble vida de Pintuco o equivalente de igual calidad o superior. incluye preparación de superficie. (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	7.05	3.24	5.11	1.00			17.73
	30.00	5.70	25.97	2.00			290.06
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	17.00	2.65	23.11				21.94
	14.50	2.95	5.00				37.78
FACHADA PRINCIPAL INGRESO	5.35	3.30					17.66
	3.75	2.65					9.94
	3.05	2.65	4.00				4.08
	8.00	3.20	4.30				21.30
	3.20	4.00	2.21				5.30
FACHADA PARTE POSTERIRO AREA KIOSKO	3.74	3.12	0.98				10.69
	3.74	0.70					1.31
	4.10	3.12					12.79
	4.10	1.30	3.80				0.77
	4.20	3.45	5.10				9.39
	4.20	0.97					2.04
	3.15	3.45	0.78				10.09
	3.15	0.81					1.28
	4.44	3.89	1.80				15.47
	4.44	0.11					0.24

CARTERAS VENTANAS FACHADA POSTERIOR	1.32	0.20		2.00			0.53
	0.52	0.20		2.00			0.21
	0.39	0.28		2.00			0.22
	0.08	1.39		2.00			0.22
	1.23	0.28		2.00			0.69
	1.09	0.20		2.00			0.44
	0.96	0.28		2.00			0.54
	0.38	0.28		2.00			0.21
	0.54	0.20		2.00			0.22
	0.08	1.09		2.00			0.17
	0.41	1.98		2.00			1.62
	0.08	2.56		2.00			0.41
	0.08	2.14		1.00			0.17
	0.39	2.56		2.00			2.00
	2.87	0.20		2.00			1.15
	0.27	2.71		2.00			1.46
	0.08	1.55		2.00			0.25
	1.40	1.27		2.00			3.56
	2.87	0.08		2.00			0.46
	1.16	0.20		2.00			0.46
	0.30	1.01		2.00			0.61
	0.65	0.30		2.00			0.39
	0.08	1.16		2.00			0.19
	0.08	0.65		2.00			0.10
	1.16	0.20		2.00			0.46
	1.00	0.30		2.00			0.60
	0.64	0.20		2.00			0.26
	0.49	0.30		2.00			0.29
	0.08	1.15		2.00			0.18
							507,90

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
BAÑOS CABALLEROS	15.16			|	1.00		15.16

BAÑOS DAMAS	15.00				1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03				1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00				1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20				1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94				1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11				1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75				1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18				1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36				1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58				1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51			1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80			1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80			1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54		1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01		1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91		1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45			1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32		1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04			1.00		5.54
	0.36	0.70			1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85			1.00		9.98
	3.44	0.75			1.00		2.58
	0.75	2.28			1.00		1.71
	1.45	0.75			1.00		1.09
	3.50	2.87			1.00		10.05
	2.28	0.156			1.00		0.36
	0.82	0.88			1.00		0.72
	1.20	0.80			1.00		0.96
	0.50	0.85			1.00		0.43
	1.82	0.05			1.00		0.09

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24		2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94		2.00		85.82

FILO	18.00						18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27		1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35		1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10			1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25			1.00		17.19
DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90			1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	1.16			1.00		8.93
COORDINACIÓN	11.70	2.87	18.14		4.00		61.76
COORDINACIÓN	3.99	2.87		6.00	1.00		68.71
	5.70	1.04			1.00		5.93
	1.05	1.21			1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00	1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00	1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00	1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00	1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	2.74	1.90		2.00	1.00		10.41
	4.12	2.74	2.24	2.00	1.00		18.10
OFICINA 3	12.50	2.74	7.00	1.00	1.00		27.25
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINAS	7.70	2.74	7.80	1.00	1.00		13.30
TIMPANOS	0.73	0.58		2.00	1.00		0.85
	0.77	1.94		2.00	1.00		2.99
	1.04	1.30		2.00	1.00		2.70
	0.44	1.49		1.00	1.00		0.66
	0.12	1.49		1.00	1.00		0.18
	0.13	1.30		1.00	1.00		0.17
	1.00	1.16		1.00	1.00		1.16
	0.13	1.16		1.00	1.00		0.15
DEFENSORIA FAMILIA 2	7.70	1.59			1.00		12.24
FILOS	145.90				1.00		145.90
							1,118.54

Tableta Gress Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	1.00				3.25		3.25
	5.90				13.70		80.83
							210,67

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
total							444.50

Guarda escoba En Gres (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 PARQUEADERO	30.00				1.00		30.00
TRAMO 2 PASILLOS Y CIRCULACIÓN PRIMERA INFANCIA	40.00				1.00		40.00
TRAMO 3 CIRCULACIONES KIOSKO	30.00				1.00		30.00
Total							100,00

C

Guarda Escoba En Cerámica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 1	190.00				1.00		190.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	100.00				1.00		100.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	45.00				1.00		45.00
total							335.0

Alistado Pisos 1:3, E=0.04 (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08

SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	6.10				13.70		83.57
total							660.65

Espejo Incoloro 3 Mm Sin Biselar (Suministro E Instalación De Espejo) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.40	0.90		2.2		1.00	2.16
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑOS DAMAS	3.05	0.90		2.7		1.00	2.75
BAÑOS DAMAS	0.10	0.90		0.1		1.00	0.09
OFICINA PSICOLOGI	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑO DE CABALLEROS	0.12	0.90		0.1		1.00	0.11
total							7.00

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14.60	8.00				1.00	116.80
BAÑO CABALLEROS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DAMAS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	3.00				1.00	6.00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4.50	4.30				1.00	19.35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS						1.00	
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4.00	3.60				1.00	14.40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4.00	3.00				1.00	12.00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0.94	1.87				1.00	1.76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15.20	4.00				1.00	60.80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00	13.90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00	35.10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00	5.40
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3.50	3.60				1.00	12.60
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5.53	3.90				1.00	21.57
	5.51	3.80				1.00	20.94
OFICINA DE CONFERENCIAS	16.00	8.00				1.00	128.00
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	3.40	3.90				1.00	13.26
PASILLO INGRESO PRINCIPAL	2.00	6.60				1.00	13.20
OFICINA NUTRICIÓN	2.00	1.60				1.00	3.20
CUARTO ELECTRICO	4.06	1.90				1.00	7.71
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINA	2.81	3.57				1.00	10.02
							540.00

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
	1.60	1.50				1.00	2.40
	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.62	1.50				1.00	3.93

	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.57	1.50				1.00	3.86
							29.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00
PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO 1					3.00		3.00
ATENCIÓN AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMA					2.00		2.00
							75.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			

BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CABALLETES	45.00				1.00		45.00
TOTAL							45.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 1	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	25.00				1.00		25.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	15.00				2.00		30.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 4	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	18.00				1.00		18.00

FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	19.00				1.00		19.00
TOTAL							162.00

SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	15.00				1.00		15.00
TRAMO 2	20.00				1.00		20.00
TRAMO 3	20.00				1.00		20.00
TRAMO 4	25.00				1.00		25.00
TRAMO 5	14.60				1.00		14.16
TOTAL							94.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				6.00		43.80
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 2 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				14.00		102.20
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 3 ARCHIVO	17.30				10.00		173.00
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	14.60				6.00		87.60
TOTAL							406.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
VIGAS KIOSCO	5.00				8.00		40.00

	4.00				8.00		32.00
	3.50				8.00		28.00
CORREAS DE CUBIERTA							
TRAMO 1	4.50				1.00		4.50
TRAMO 2	4.00				1.00		4.00
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TRAMO 4	15.70				3.00		47.10
TRAMO 5	4.50				3.00		13.50
TRAMO 6	7.30				1.00		7.30
TOTAL							180.90

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2"X 11/2" Cal 16.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREAS KIOSKO	14.00				8.00		112.00
TOTAL							112.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	4.50				2.00		9.00
TRAMO 2	15.70				3.00		47.10
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TOTAL							60.60

DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00

PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO1					3.00		3.00
ATENCION AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMAS					2.00		2.00
TOTAL							75.00

DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS					2.00		2.00
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.00		8.00
TOTAL							10.00

DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00

AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTA							35.00

DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)(UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
KIOSCO					1.00		1.00
ANTIGUO AUDITORIO					2.00		2.00
TOTAL							3.00

INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE). (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS							
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.84		8.84
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					1.16		1.16
TOTAL							10.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00
AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00

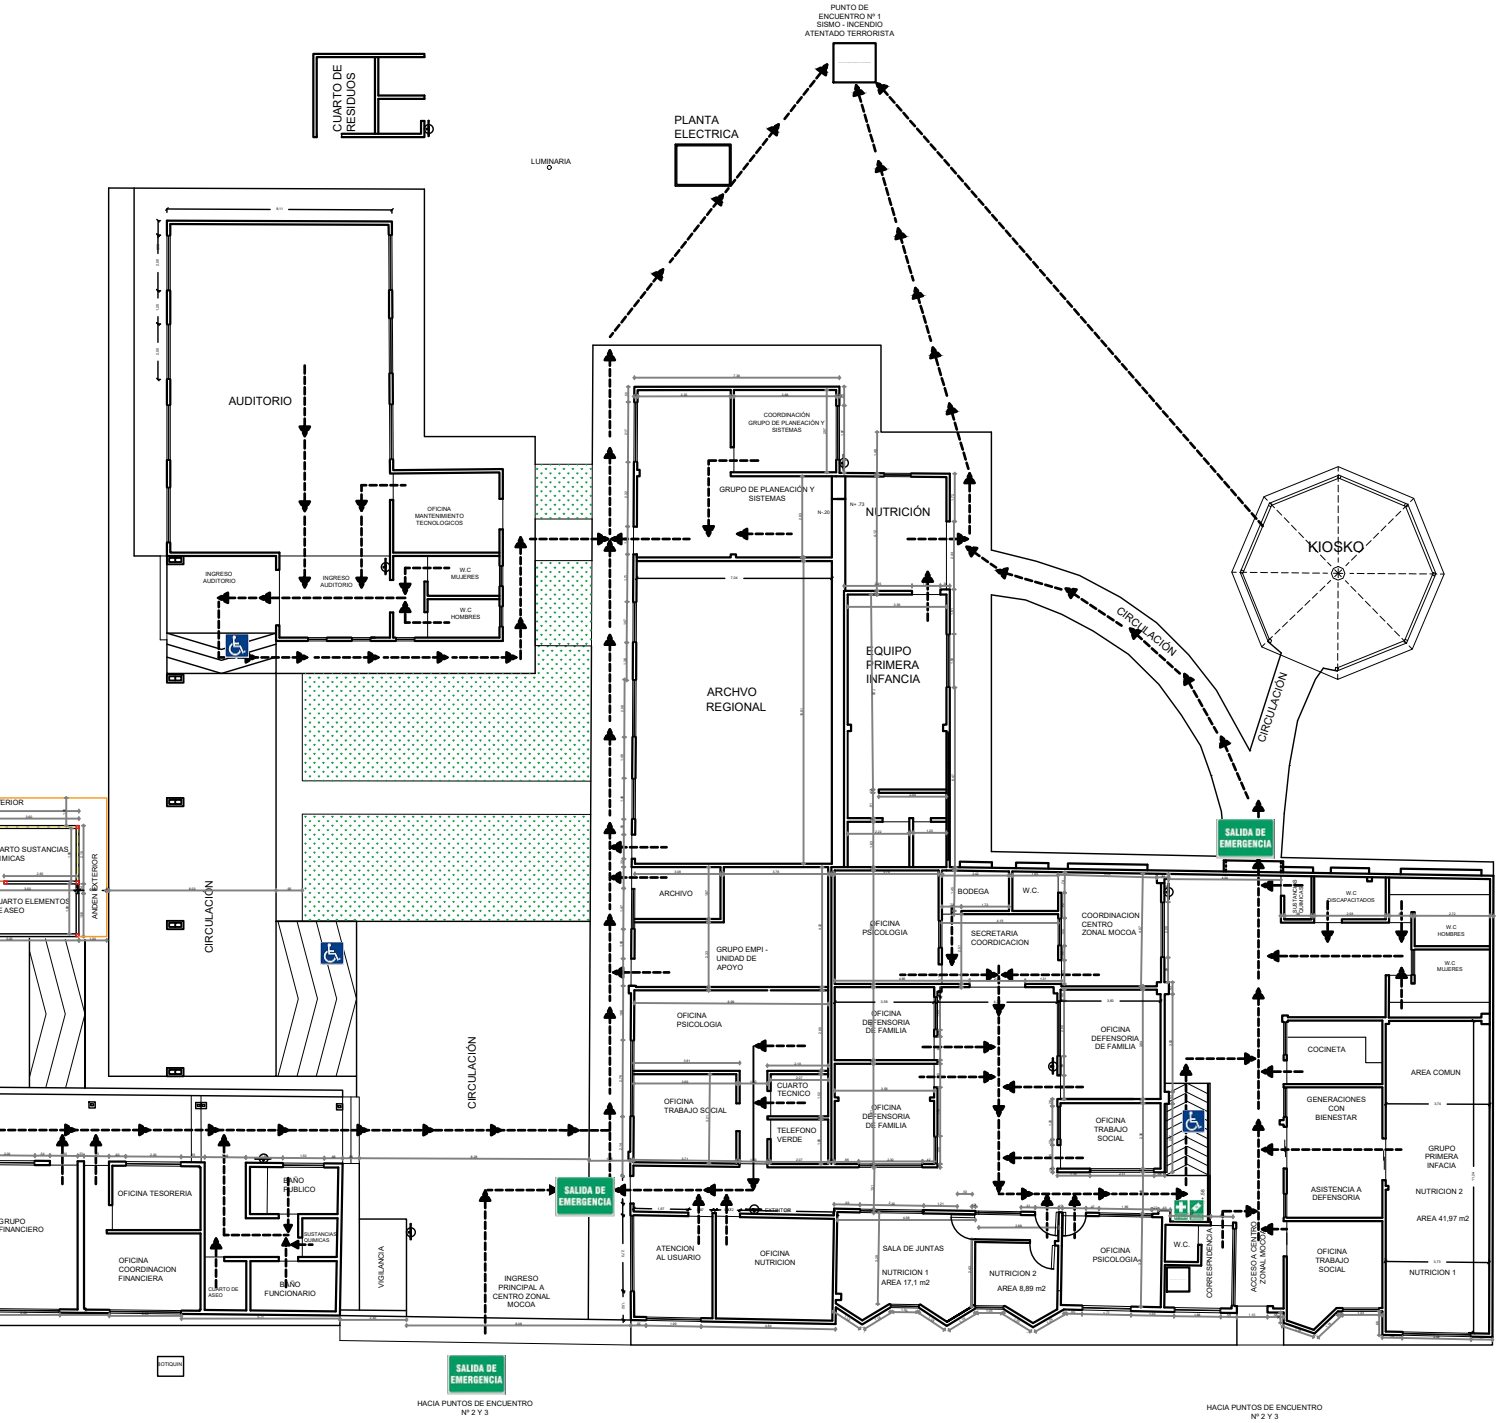
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTAL							35.00

DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TOTAL							450.49


DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA					1.00		1.00
TOTAL							1.00



	MODIFICACIONES FECHA 1. MODIFICACIONES 00-00-00	PLANOS DE REFERENCIA 1. PLANO No. ARCHIVOS DE REFERENCIA 1. PLANO No.	ESTUDIOS TECNICOS ING. ---------- CALCULOS ESTRUCTURALES INSTALACIONES HIDRAULICAS ING.---------- INSTALACIONES ELECTRICAS ING. ----------	COLABORADORES ---------- ARQ.----------	CONTIENE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA REGIONAL PUTUMAYO Y CENTRO ZONAL MOCOA. RUTA DE EVACUACIÓN. HOJA 02 DE 02 ESCALA 1 : 125 FECHA 19-JUNIO - 2023 ARCHIVO Planos CZ La Hormiga.dwg LEVANTAMIENTO ARQ. PRACTICANTES Mitsu Hinostroza, P Fco. PEC - RUTAS DE EVACUACIÓN A-001

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

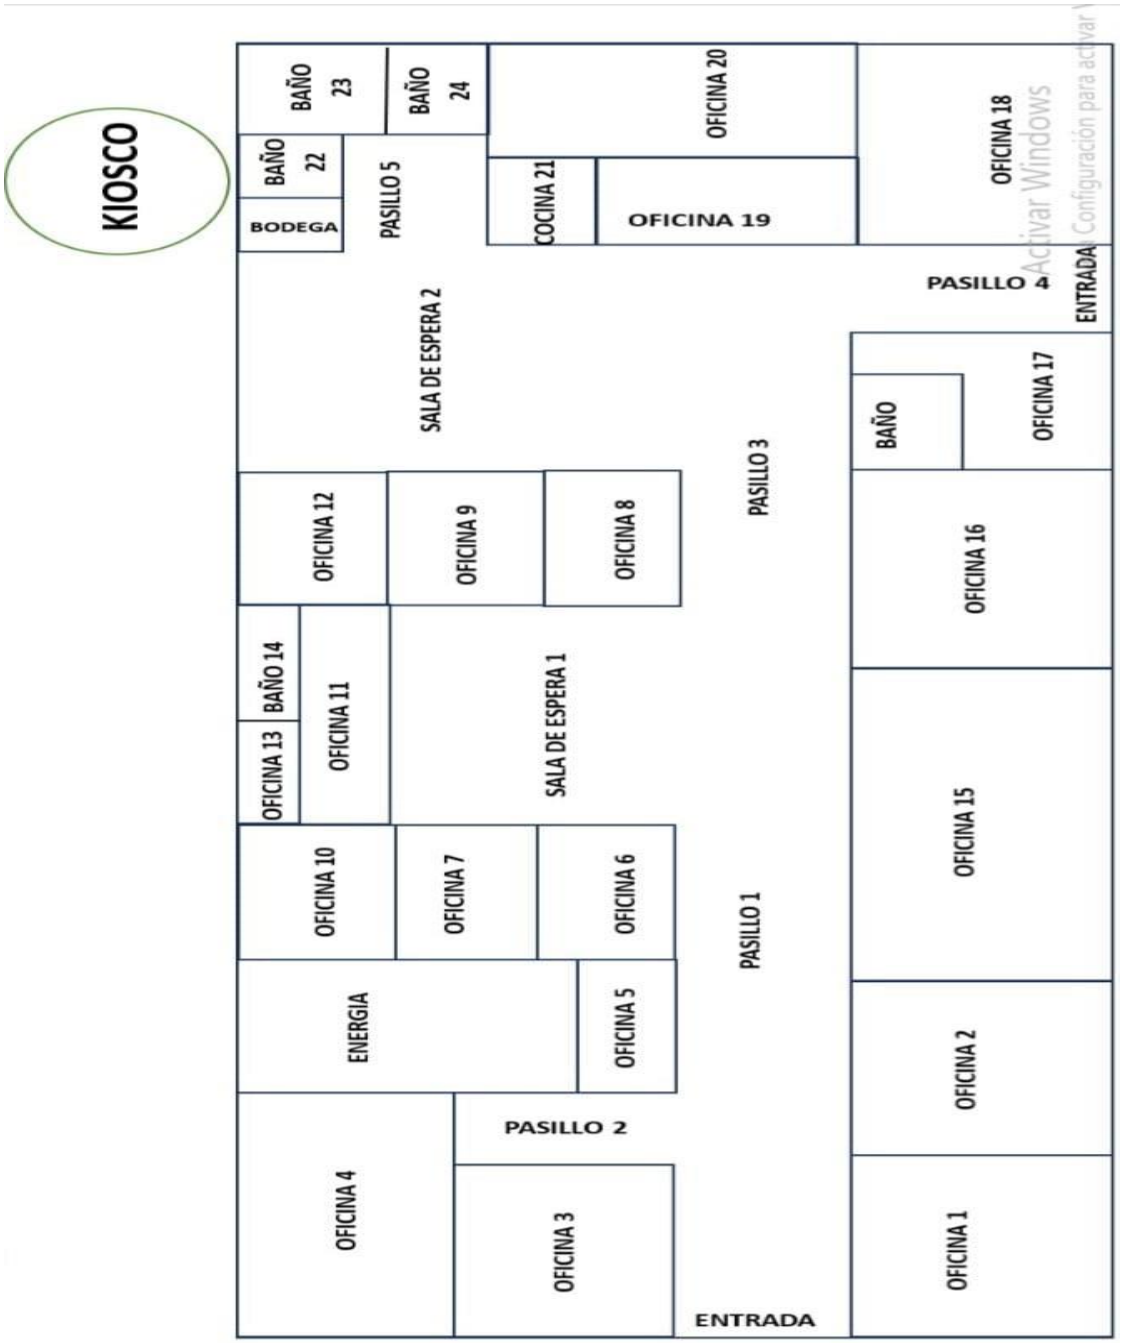

3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

Zonas de archivo con humedades 	Aires acondicionados con drenaje de agua 
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Área de baños (damas-caballeros- discapacitados) con humedad 	Cocineta faltante por realizar detalles y resanes 
 Zonas exteriores a las unidades sanitarias por las cuales ingresaba humedad	 Detecciones de humedades, acciones correctivas

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

 Accion correctiva para canal que está en contrapendiete al desague en quiosco	 Detecciones de humedades, acciones correctivas
 Detecciones de huemedades en canales de cubierta	 Detecciones de humedades, se solicitan acciones correctivas

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**



Se solcitan reparaciones de pendientes en rejillas de drenajes



Detecciones de irregularidades en empalmes de cielo raso



Se Detecciones de humedades, se solicitan acciones correctivas



Detecciones de irregularidades en pintura de paredes, se solicitan acciones correctivas.

Detecciones de humedades en ventanas, se solicitan  Detecciones de humedades en puertas, se solicitan acciones correctivas	 Detecciones de humedades en ventanas, se solicitan acciones correctivas

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área.

se dio cumplimiento a los presupuestos, cantidades y valores unitarios pactados por el contratista y avalados por la interventoría, y a las condiciones establecidas por la entidad en la FCT, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y aprobado por las partes, se deben realizar algunas acciones correctivas para lo cual se dejará una acta de evidencias de las reparaciones, lo anterior se da como recibido una vez se ajusten por el contratista de obra.

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés f. Buendia Martínez
CONTRATISTA DE OBRA – R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

Firma_____
Nombre:
COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO SUPERVISION del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ACTA No:	001
SEDE:	MOCOA
FECHA:	12-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan en el área #4 y otros espacios . En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato.*".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

Scanned with CamScanner

ALCUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD APROBADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA					
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	185,92	$ 14.704,20	$ 2.733.805
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15	0	$ 18.391,57	$ 0,00
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M (DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0	0	$ 22.279,09	$ 0,00
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m (DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0	0	$ 39.823,88	$ 0,00
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0	0	$ 7.352,10	$ 0,00
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,9	0	$ 24.312,50	$ 0,00
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35	0	$ 17.852,18	$ 0,00
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0	0	$ 98.028,00	$ 0,00
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,5	0	$ 7.964,82	$ 0,00
1,1	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0	0	$ 61.267,50	$ 0,00
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0	0	$ 73.521,00	$ 0,00
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7	0	$ 12.092,27	$ 0,00
1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540	190	$ 9.976,39	$ 1.895.514
	SUBTOTAL CAPITULO					$ 4.629.319
2	MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA					
2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,9	0	$ 109.639,18	$ 0,00
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	0	$ 110.465,53	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					$ 0
3	ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA					
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575	0	$ 11.763,78	$ 0,00
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15	0	$ 31.323,52	$ 0,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0	0	$ 34.899,16	$ 0,00
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,5	0	$ 17.869,76	$ 0,00

Scanned with CamScanner

3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,9	0	$ 25.123,27	$ 0,00
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	0	$ 21.394,52	$ 0,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0	0	$ 40.266,31	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					**$ 0**
4	**ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA**					
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0	0	$ 98.356,17	$ 0,00
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	0	$ 80.516,32	$ 0,00
4,03	CERÁMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,5	0	$ 93.547,34	$ 0,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100	0	$ 16.288,99	$ 0,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335	0	$ 16.434,86	$ 0,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	0	$ 60.536,38	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					**$ 0**
5	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**					
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0	0	$ 129.887,10	$ 0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0	0	$ 21.906,54	$ 0,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0	0	$ 59.858,93	$ 0,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0	0	$ 11.864,02	$ 0,00
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0	0	$ 80.750,57	$ 0,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0	0	$ 522.429,72	$ 0,00
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7	0	$ 130.327,80	$ 0,00
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0	0	$ 206.267,25	$ 0,00
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0	0	$ 94.425,47	$ 0,00
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0	0	$ 330.844,50	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					**$ 0**

Scanned with CamScanner

6	CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA					
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0	0	$ 53.679,24	$ 0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA, INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINARÍA.)	ml	0	0	$ 67.472,15	$ 0,00
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540	0	$ 146.892,97	$ 0,00
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0	0	$ 101.824,52	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					$ 0
7	CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA					
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	0	$ 392.473,48	$ 0,00
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0	0	$ 364.704,08	$ 0,00
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0	0	$ 343.098,00	$ 0,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0	0	$ 836.112,47	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					$ 0
8	URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA					
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0	0	$ 110.467,05	$ 0,00
8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0	0	$ 90.853,28	$ 0,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METÁLICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.	un	75	0	$ 300.877,11	$ 0,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0	0	$ 690.222,15	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					$ 0
9	ITEMNS NO PREVISTOS.					
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	185,92	$ 108.123,00	$ 20.102.228
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	0	$ 93.819,00	$ 0,00

Scanned with CamScanner

9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162	0	$ 55.219,00	$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,6	0	$ 27.871,00	$ 0,00
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,6	0	$ 117.617,00	$ 0,00
9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA QUIOSCO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS METÁLICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2".) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,9	0	$ 89.294,00	$ 0,00
9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA QUIOSCO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2".) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112	0	$ 61.038,00	$ 0,00
9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,6	0	$ 33.995,00	$ 0,00
9,09	DESMONTE DE LÁMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA.	UN	75	0	$ 35.861,00	$ 0,00
9,1	DESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10	0	$ 32.738,00	$ 0,00
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35	0	$ 15.619,00	$ 0,00
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES.	ML	12,4	0	$ 31.238,00	$ 0,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa). (1,0x2,20)	UND	3	0	$ 1.164.475,00	$ 0,00
9,14	INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,4	0	$ 127.475,00	$ 0,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10	0	$ 55.000,00	$ 0,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35	0	$ 30.619,00	$ 0,00
9,17	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	0	$ 22.619,00	$ 0,00
9,18	DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1	0	$ 885.356,00	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					**$ 20.102.228**
	SUBTOTAL					**$ 24.731.547**
	ADMINISTRACIÓN 22%					$ 5.440.940
	IMPUESTOS 3%					$ 741.946
	UTILIDAD 5%					$ 1.236.577
	IVA 19% (UTILIDAD)					$ 234.950
	SUMAS TOTALES (valor ejecutado – Valor por ejecutar)					**$ 32.385.961**

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Áreas intervenidas

ÁREA No 1	OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
Nutrición y archivo		100	
Oficina de archivo		100	
ÁREA No 2	**OBSERVACIÓN**	**Ejecutado en %**	**Descripción de acciones correctivas**
Archivo - regional		100	
ÁREA No 3	**OBSERVACIÓN**	**Ejecutado en %**	**Descripción de acciones correctivas**
Oficinas de planeación y sistemas		100	
ÁREA No 4	**OBSERVACIÓN**	**Ejecutado en %**	**Descripción de acciones correctivas**
Oficina de primera infancia-regional		100	

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
Área N°1. Oficina de nutrición y de archivo	0,29	6,00		1,74		1,00	1,74
	4,00	6,50		26,00		1,00	26,00
Área N°2. Archivo regional y Área N°3 grupo de planeación y sistemas	14,60	5,00		73,00		1,00	73,00
	17,30	4,00		69,20		1,00	69,20
Área N°4. primera infancia regional	3,20	5,00		16,00		1,00	16,00
TOTAL							185,94

Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material (M2)

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD		ANCHO	ALTO	ÁREA			
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA		3,32	3,80				1,00	12,62
OFICINA PEQUEÑA PRIMERA INFANCIA	4,74		3,50				1,00	16,59
OFICINA RECEPCIÓN	2,43		3,02				1,00	7,34
OFICINA RECEPCIÓN - BAÑO	2,00		1,00				1,00	2,00
ÁREA COCINETA	3,50		3,00				1,00	10,50
PASILLO SALA DE ESPERA ÁREA 2	8,00		4,50				1,00	36,00
COORDINACIÓN	11,80		6,00				1,00	70,80
PASILLO INGRESO PRINCIPAL	2,00		6,60		13,20		1,00	13,20
OFINA NUTRICIÓN	2,00		1,60		3,20		1,00	3,20
CUARTO ELÉCTRICO	4,09		1,90		7,77		1,00	7,77
PASILLO ENTRADA CUARTO ELÉCTRICO Y OFICINA	2,80		3,57		9,98		1,00	9,98
TOTAL								190,00

Suministro e instalación de cubierta en upvc cresta alta e:2,5mm incluye accesorios para su correcta instalación.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
Área N°1. Oficina de nutrición y de archivo	0,29	6,00		1,74		1,00	1,74
	4,00	6,50		26,00		1,00	26,00
Área N°2. Archivo regional y Área N°3 grupo de planeación y sistemas	14,60	5,00		73,00		1,00	73,00
	17,30	4,00		69,20		1,00	69,20
Área N°4. primera infancia regional	3,20	5,00		16,00		1,00	16,00
TOTAL							185,94

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal

Scanned with CamScanner

Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.

2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato.*".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

CENTRO ZONAL MOCOA							
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD APROBADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,00	**PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA**						
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	675,00	185,92	$ 14.704,20	$ 9.925.335
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15,00	15,00	0,00	$ 18.391,57	$ 275.874
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 22.279,09	$ 0
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 39.823,88	$ 0

Scanned with CamScanner

1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0,00	0,00	0,00	$ 7.352,10	$ 0
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,90	30,90	0,00	$ 24.312,50	$ 751.256
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35,00	35,00	0,00	$ 17.852,18	$ 624.826
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00	0,00	0,00	$ 98.028,00	$ 0
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,50	444,50	0,00	$ 7.964,82	$ 3.540.362
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0,00	0,00	0,00	$ 61.267,50	$ 0
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 73.521,00	$ 0
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7,00	7,00	0,00	$ 12.092,27	$ 84.646
1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540,00	350,00	190,00	$ 9.976,39	$ 3.491.737
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 18.694.036**
2,00	**MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA**						
2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,90	16,90	0,00	$ 109.639,18	$ 1.852.902
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	13,83	0,00	$ 110.465,53	$ 1.527.738
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 3.380.640**
3,00	**ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA**						
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575,00	575,00	0,00	$ 11.763,78	$ 6.764.174
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15,00	15,00	0,00	$ 31.323,52	$ 469.853
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 34.899,16	$ 0

Scanned with CamScanner

3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,50	850,50	0,00	$ 17.869,76	$ 15.198.231
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,90	507,90	0,00	$ 25.123,27	$ 12.760.109
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	1118,54	0,00	$ 21.394,52	$ 23.930.626
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0,00	0,00	0,00	$ 40.266,31	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 59.122.992**
4,00	**ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA**						
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 98.356,17	$ 0
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	210,67	0,00	$ 80.516,32	$ 16.962.373
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,50	444,50	0,00	$ 93.547,34	$ 41.581.793
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100,00	100,00	0,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335,00	335,00	0,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	660,65	0,00	$ 60.536,38	$ 39.993.359
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 105.672.102**
5,00	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**						
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0,00	0,00	0,00	$ 129.887,10	$ 0
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0,00	0,00	0,00	$ 21.906,54	$ 0

Scanned with CamScanner

5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0,00	0,00	0,00	$ 59.858,93	$ 0
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0,00	0,00	0,00	$ 11.864,02	$ 0
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 80.750,57	$ 0
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 522.429,72	$ 0
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7,00	7,00	0,00	$ 130.327,80	$ 912.295
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 206.267,25	$ 0
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 94.425,47	$ 0
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0,00	0,00	0,00	$ 330.844,50	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 912.295**
6,00	**CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA**						
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 53.679,24	$ 0
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	0,00	0,00	0,00	$ 67.472,15	$ 0
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540,00	540,00	0,00	$ 146.892,97	$ 79.322.204
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0,00	0,00	0,00	$ 101.824,52	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 79.322.204**
7,00	**CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA**						

Scanned with CamScanner

ALCUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	29,57	0,00	$ 392.473,48	$ 11.605.441
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 364.704,08	$ 0
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0,00	0,00	0,00	$ 343.098,00	$ 0
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0,00	0,00	0,00	$ 836.112,47	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 11.605.441**
8,00	**URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA**						
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	0,00	0,00	$ 110.467,05	$ 0
8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 90.853,28	$ 0
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	un	75,00	75,00	0,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0,00	0,00	0,00	$ 690.222,15	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 22.565.783**
9,00	**ITEMNS NO PREVISTOS.**						
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	675,00	185,92	$ 108.123,00	$ 72.983.025

Scanned with CamScanner

ALTUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45,00	45,00	0,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162,00	162,00	0,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,60	94,60	0,00	$ 27.871,00	$ 2.636.597
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	406,60	0,00	$ 117.617,00	$ 47.823.072
9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	180,90	0,00	$ 89.294,00	$ 16.153.285
9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	112,00	0,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256
9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	60,60	0,00	$ 33.995,00	$ 2.060.097
9,09	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UN	75,00	75,00	0,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575
9,10	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10,00	10,00	0,00	$ 32.738,00	$ 327.380
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35,00	35,00	0,00	$ 15.619,00	$ 546.665
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML	12,40	12,40	0,00	$ 31.238,00	$ 387.351

Scanned with CamScanner

9,13	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND	3,00	3,00	0,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425
9,14	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	12,40	0,00	$ 127.475,00	$ 1.580.690
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	10,00	0,00	$ 55.000,00	$ 550.000
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	35,00	0,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665
9,17	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	450,49	0,00	$ 22.619,00	$ 10.189.633
9,18	DESMONTE E INSTLACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1,00	1,00	0,00	$ 885.356,00	$ 885.356
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 183.381.405**

SUBTOTAL	**$ 484.656.898**
ADMINISTRACION 22%	$ 106.624.518
IMPUESTOS 3%	$ 14.539.707
UTILIDAD 5%	$ 24.232.845
IVA 19% (UTILIDAD)	$ 4.604.241
	$ 634.658.208

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA área #4 y otras áreas; área numero1, área numero 2, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

Áreas intervenidas

	ÁREA N°1	OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
5	Área de baños (damas-caballeros-discapacitados) (pacillo)	Se evidencia moho u oxido del entorno del marco de la lampara instalada por causa de la humedad.	100%	Se requiere retiro y cambio de la lampara para el mejoramiento de su calidad de vida útil y presentación
	ÁREA No 2	OBSERVACIÓN		
4	Oficina de Defensoría protección 1	Detección de pintura en antepecho de ventana		Se requiere limpieza de superficie
5	Oficina de Trabajo Social	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina de Defensoría de Familia 1	Aprueba interventoría		N/A
7	Oficina defensoría de Familia 2	Aprueba interventoría		N/A
8	Oficina de Coordinación	Aprueba interventoría		N/A
9	Rampas y Pasillos	Aprueba interventoría		N/A
	ÁREA No 3	OBSERVACIÓN		
1	Oficina Jurídica	Aprueba interventoría		N/A
2	Oficina de Nutrición	Aprueba interventoría		N/A
3	Área de Línea Verde	Aprueba interventoría		N/A
4	Cuarto de Máquinas y sistemas	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina 1	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina 2	Aprueba interventoría		N/A
	ÁREA No 4	OBSERVACIÓN		
1	Parqueadero y pasillos exteriores	Se observa que el piso terminado en Gress cuenta con un escalón sobre el acceso principal del centro zonal Mocoa, se debe realizar y ajustar portón a nivel de piso de ingreso a parqueadero.		Realizar una rampa ya que son elementos arquitectónicos que permiten salvar diferencias de altura entre espacios
	OTRAS ÁREAS			
	Atención al ciudadano	Se observa en el recorrido que al prender los aires		Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

		acondicionados y pasado un aproximado de 2 horas se encuentra una filtración de agua en el aire acondicionado, posiblemente por la tubería del aire acondicionado.		averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		N/A
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		N/A
	Grupo de planeación y sistemas regional	Pendiente por entregar		N/A
	Primera infancia y nutrición - Regional	Pendiente por entregar		N/A

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría		N/A
2	Oficina de CORDINACIÓN	Detección de pintura en cornisas		Se requiere limpieza de cornisas y emboquillado
3	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría		N/A
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Detección de pintura en antepecho de ventana		Se requiere limpieza de superficie
5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría		N/A
7	Cocina	Aprueba interventoría		N/A
8	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría		N/A
9	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría		N/A
10	PASILLOS	Detección de manchones de pintura en guarda escobas		Se requiere limpieza en guarda escobas de gres
11	ESCALERAS ACCESO			N/A
12	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría		N/A


Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

	ÁREA No 2	OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	UNIDAD SANITARIA			N/A
2	CAJA DE INSPECCIÓN			N/A
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita


Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

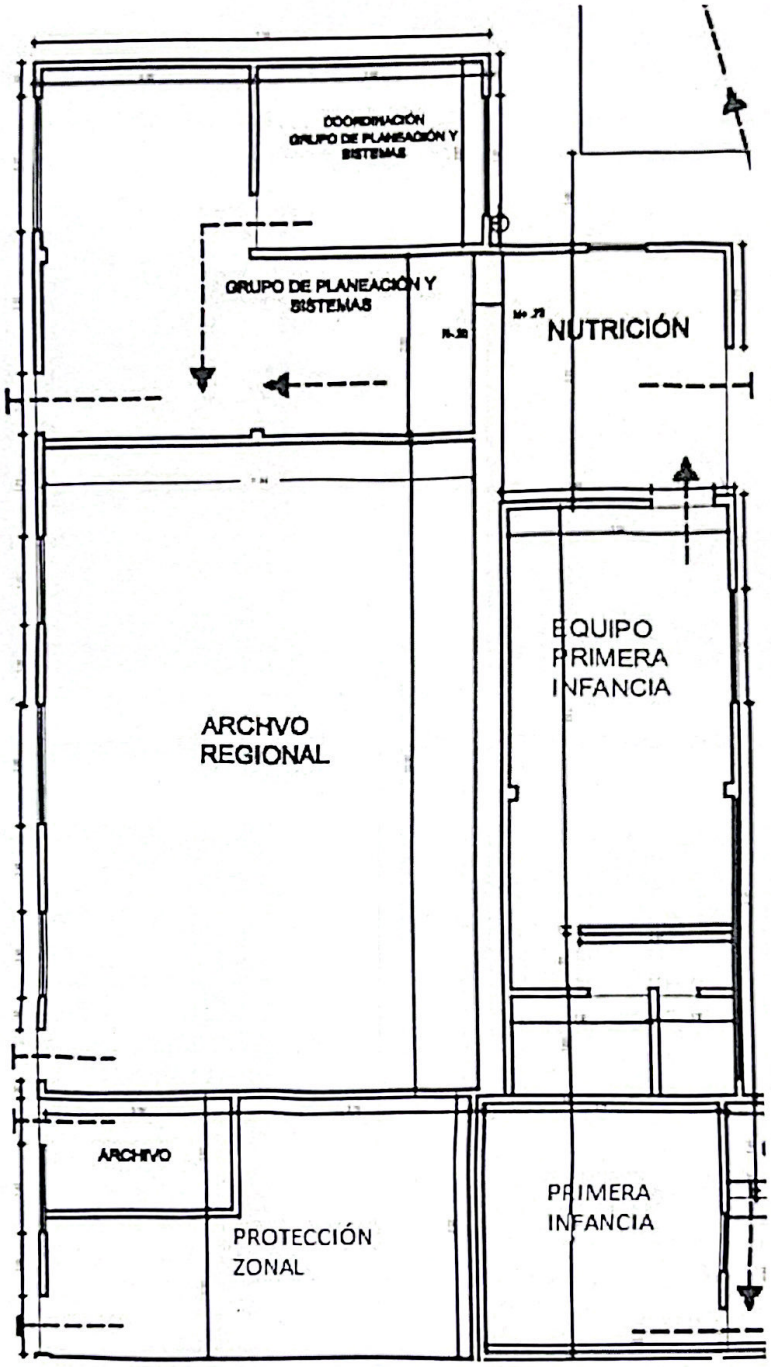


Scanned with CamScanner

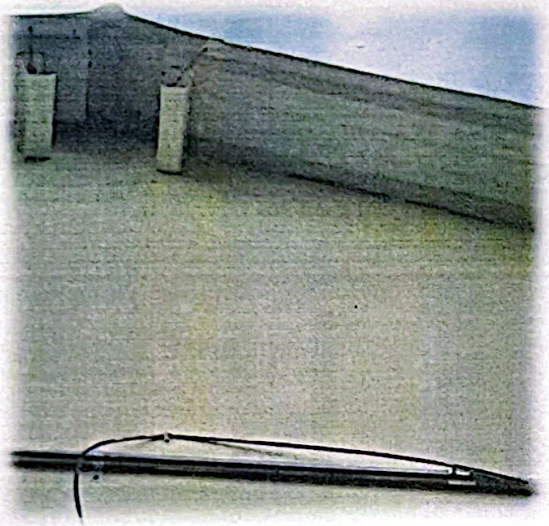
Terminado de cubierta, aplicar acciones correctivas



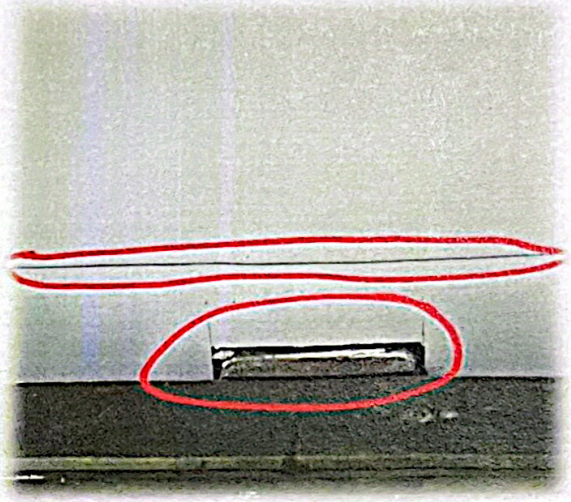Deteccion de inperfeccion en filos de cielo razo






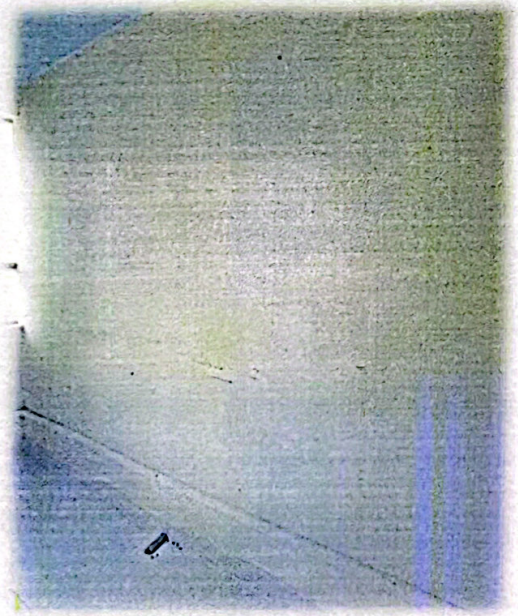
manchas en pared, aplicar acciones correctivas



Manchas en guarda escobas, aplicar acciones correctivas



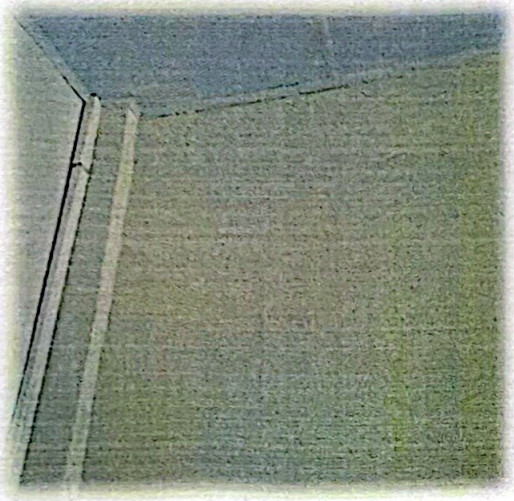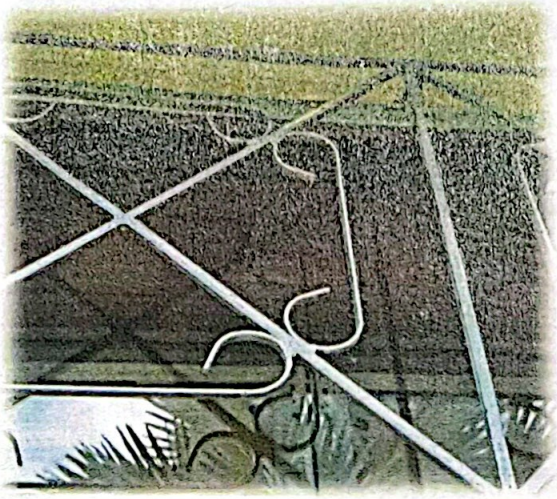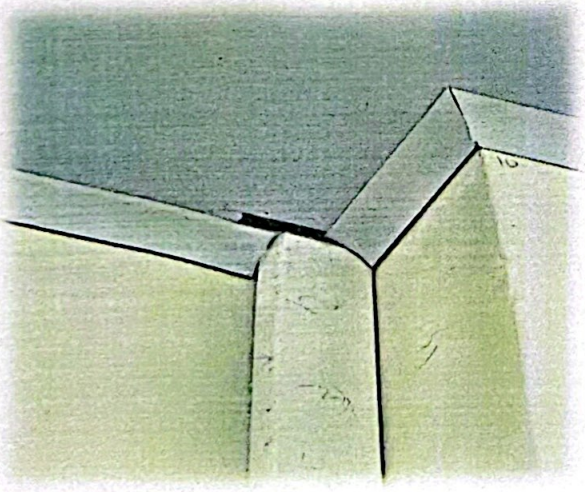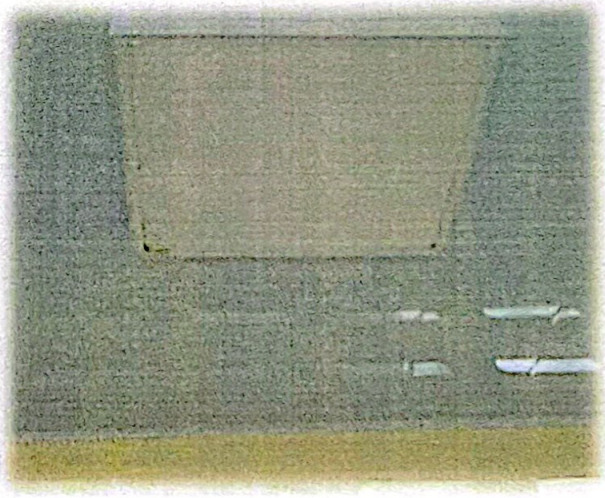Scanned with CamScanner

vigas y omegas de cielo Razo la unión de las láminas se encuentran mal ubicadas donde estéticamente se encuentran mal visto, aplicar acciones correctivas 	pintura en antepecho de ventana, aplicar acciones correctivas 
 Detecciones de irregularidades en empalmes de cielo raso	 Deteccion de moho u oxido del marco de la lampara

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área.

se dio cumplimiento a los presupuestos, cantidades y valores unitarios pactados por el contratista y avalados por la interventoría, y a las condiciones establecidas por la entidad en la FCT, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y aprobado por las partes, se deben realizar algunas acciones correctivas para lo cual se dejará un acta de evidencias de las reparaciones, lo anterior se da como recibido una vez se ajusten por el contratista de obra.

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Andrés Buendia M	Firma
En Representación de	Consorcio Obra PTY 024	
Correo electrónico	anfebum 0 hotmail.com	
Teléfono	3133967689.	
NOMBRE	Milcidy Natalid Florez Gaviria	Firma
En Representación de	al cubo	
Correo electrónico	supervisoradeinterventoria2018@gmail.com	
Teléfono	3118225197.	
NOMBRE	Jhon Muñoz	Firma
En Representación de	ICBF	
Correo electrónico	JhonJ.Muñoz@ICB.GOV.CO	
Teléfono	3114808384	
NOMBRE	Liliana Patricia Ortega Arias	Firma
En Representación de	ICBF	
Correo electrónico	Liliana.Ortega@icbf.gov.co	
Teléfono	3132021182	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés f. Buendia Martínez
CONTRATISTA DE OBRA – R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ACTA No:	002
SEDE:	MOCOA
FECHA:	31-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoria del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan en las áreas ya entregadas en actas de seguimiento de espacios intervenidos con fecha **20-03-2025 la cual se continuo a prueba de interventoría hasta la fecha actual , con lo anterior el** área #4 y otros espacios área #1 y área #2. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, se requiere que la interventoria adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
2. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
3. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato.*".

4. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

Scanned with CamScanner

ALCUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

CENTRO ZONAL MOCOA							
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROBADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA						
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	675,00	185,92	$ 14.704,20	$ 9.925.335
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15,00	15,00	0,00	$ 18.391,57	$ 275.874
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 22.279,09	$ 0
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 39.823,88	$ 0
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0,00	0,00	0,00	$ 7.352,10	$ 0
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,90	30,90	0,00	$ 24.312,50	$ 751.256
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35,00	35,00	0,00	$ 17.852,18	$ 624.826
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00	0,00	0,00	$ 98.028,00	$ 0
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,50	444,50	0,00	$ 7.964,82	$ 3.540.362
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0,00	0,00	0,00	$ 61.267,50	$ 0
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 73.521,00	$ 0
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7,00	7,00	0,00	$ 12.092,27	$ 84.646
1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540,00	350,00	190,00	$ 9.976,39	$ 3.491.737
	SUBTOTAL CAPITULO						$ 18.694.036
2,00	MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA						

Scanned with CamScanner

2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,90	16,90	0,00	$ 109.639,18	$ 1.852.902
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	13,83	0,00	$ 110.465,53	$ 1.527.738
	SUBTOTAL CAPITULO						$ 3.380.640
3,00	ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA						
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575,00	575,00	0,00	$ 11.763,78	$ 6.764.174
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15,00	15,00	0,00	$ 31.323,52	$ 469.853
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 34.899,16	$ 0
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,50	850,50	0,00	$ 17.869,76	$ 15.198.231
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,90	507,90	0,00	$ 25.123,27	$ 12.760.109
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	1118,54	0,00	$ 21.394,52	$ 23.930.626
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0,00	0,00	0,00	$ 40.266,31	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						$ 59.122.992
4,00	ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA						
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 98.356,17	$ 0
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	210,67	0,00	$ 80.516,32	$ 16.962.373

Scanned with CamScanner

4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,50	444,50	0,00	$ 93.547,34	$ 41.581.793
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100,00	100,00	0,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335,00	335,00	0,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	660,65	0,00	$ 60.536,38	$ 39.993.359
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 105.672.102**
5,00	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**						
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0,00	0,00	0,00	$ 129.887,10	$ 0
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0,00	0,00	0,00	$ 21.906,54	$ 0
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0,00	0,00	0,00	$ 59.858,93	$ 0
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0,00	0,00	0,00	$ 11.864,02	$ 0
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 80.750,57	$ 0
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 522.429,72	$ 0
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7,00	7,00	0,00	$ 130.327,80	$ 912.295
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 206.267,25	$ 0
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 94.425,47	$ 0
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0,00	0,00	0,00	$ 330.844,50	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 912.295**
6,00	**CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA**						

Scanned with CamScanner

6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 53.679,24	$ 0
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	0,00	0,00	0,00	$ 67.472,15	$ 0
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540,00	540,00	0,00	$ 146.892,97	$ 79.322.204
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0,00	0,00	0,00	$ 101.824,52	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 79.322.204**
7,00	**CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA**						
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	29,57	0,00	$ 392.473,48	$ 11.605.441
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 364.704,08	$ 0
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0,00	0,00	0,00	$ 343.098,00	$ 0
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0,00	0,00	0,00	$ 836.112,47	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 11.605.441**
8,00	**URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA**						
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	0,00	0,00	$ 110.467,05	$ 0
8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 90.853,28	$ 0

Scanned with CamScanner

8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	un	75,00	75,00	0,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0,00	0,00	0,00	$ 690.222,15	$ 0
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 22.565.783**
9,00	**ITEMNS NO PREVISTOS.**						
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	675,00	185,92	$ 108.123,00	$ 72.983.025
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45,00	45,00	0,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162,00	162,00	0,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,60	94,60	0,00	$ 27.871,00	$ 2.636.597
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	406,60	0,00	$ 117.617,00	$ 47.823.072
9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	180,90	0,00	$ 89.294,00	$ 16.153.285
9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	112,00	0,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256

Scanned with CamScanner

9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	60,60	0,00	$ 33.995,00	$ 2.060.097
9,09	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UN	75,00	75,00	0,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575
9,10	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10,00	10,00	0,00	$ 32.738,00	$ 327.380
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35,00	35,00	0,00	$ 15.619,00	$ 546.665
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML	12,40	12,40	0,00	$ 31.238,00	$ 387.351
9,13	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND	3,00	3,00	0,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425
9,14	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	12,40	0,00	$ 127.475,00	$ 1.580.690
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	10,00	0,00	$ 55.000,00	$ 550.000
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	35,00	0,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665
9,17	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	450,49	0,00	$ 22.619,00	$ 10.189.633
9,18	DESMONTE E INSTLACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1,00	1,00	0,00	$ 885.356,00	$ 885.356
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 183.381.405**
	SUBTOTAL						**$ 484.656.898**
	ADMINISTRACION 22%						$ 106.624.518
	IMPUESTOS 3%						$ 14.539.707

Scanned with CamScanner

UTILIDAD 5%	$ 24.232.845
IVA 19% (UTILIDAD)	$ 4.604.241
	$ 634.658.208

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Áreas intervenidas

	ÁREA N°1	Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	observaciones
1	Oficina de recepción de documentos:	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico,	100%	aprobado
2	Oficina de trabajo social	Se evidencia pintura en los aires acondicionados Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico	100%	aprobado
3	Oficina Primera Infancia	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico acondicionados	100%	aprobado
4	Cocineta	Se requiere remplazar el tablero para suplir la grieta interna y subsanar el acabado de la cocina integral	100%	aprobado
5	Área de baños (damas-caballeros-discapacitados)	Se requiere instalación de flan ches y super board o en su defecto aplicar estuco, Se requiere retiro y cambio de la lampara para el mejoramiento de su calidad de vida útil y presentación	100%	aprobado
6	Bodega	Aprueba interventoría	100%	

Scanned with CamScanner

7	Pasillos y rampa	se requiere instalación de cinta multiseal, sikaflex constructor ya que este ofrece una excelente adhesión, gran capacidad de movimiento y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.	100%	aprobado
8	Quiosco (auditorio)	Se requiere soldadura en platina para darle una pendiente adecuada	100%	aprobado
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	100%	aprobado
1	Pasillo recepción	Aprueba interventoría		
2	Oficina de Psicología y protección	Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas	100%	aprobado
3	Sala de conferencias	Se realizará el resane en el ingreso parte superior y especificar de que parte cubierta o cielo raso, una lámina o placa, toda vez que existe una posible filtración de agua y se garantizan la debida corrección, Registro fotográfico.	100%	aprobado
4	Oficina de Defensoría protección 1	Detección de pintura en antepecho de ventana, Se requiere limpieza de superficie	100%	aprobado
5	Oficina de Trabajo Social	Aprueba interventoría		aprobado
6	Oficina de Defensoría de Familia 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
7	Oficina defensoría de Familia 2	Aprueba interventoría	100%	aprobado
8	Oficina de Coordinación	Aprueba interventoría	100%	aprobado
9	Rampas y Pasillos	Aprueba interventoría	100%	aprobado
ÁREA No 3		OBSERVACIÓN		

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

1	Oficina Jurídica	Aprueba interventoría	100%	aprobado
2	Oficina de Nutrición	Aprueba interventoría	100%	aprobado
3	Área de Línea Verde	Aprueba interventoría	100%	aprobado
4	Cuarto de Máquinas y sistemas	Aprueba interventoría	100%	aprobado
5	Oficina 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
6	Oficina 2	Aprueba interventoría	100%	aprobado
ÁREA No 4		OBSERVACIÓN		
1	Parqueadero y pasillos exteriores	Realizar una rampa ya que son elementos arquitectónicos que permiten salvar diferencias de altura entre espacios	100%	aprobado
	OTRAS ÁREAS			
	Atención al ciudadano	Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas	100%	aprobado
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		N/A
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		N/A
	Grupo de planeación y sistemas regional	Pendiente por entregar		N/A
	Primera infancia y nutrición - Regional	Pendiente por entregar		N/A

ÁREA N°1		Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	OBSERVACIÓN
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	APROBADO
2	Oficina de COORDINACIÓN	Se requiere limpieza de cornisas y emboquillado	100%	APROBADO
3	Oficina de PSICOLOGÍA	Aprueba interventoría	100%	APROBADO
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Detección de pintura en antepecho de ventana, se requiere limpieza de superficie	100%	APROBADO
5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	Aprueba interventoría	100%	APROBADO
6	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría	100%	APROBADO
7	Cocina	Aprueba interventoría	100%	APROBADO

Scanned with CamScanner

8	Oficina de PSICOLOGÍA	Aprueba interventoría	100%	APROBADO
9	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría	100%	APROBADO
10	PASILLOS	Se requiere limpieza de pintura en guarda escobas de grees	100%	APROBADO
11	ESCALERAS ACCESO		100%	APROBADO
12	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría		APROBADO
ÁREA No 2		**Descripción de acciones correctivas**	**Ejecutado en %**	**Observaciones**
1	UNIDAD SANITARIA		100%	APROBADO
2	CAJA DE INSPECCIÓN		100%	APROBADO
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		N/A
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		N/A

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
Área N°1. Oficina de nutrición y de archivo	0,29	6,00		1,74		1,00	1,74
	4,00	6,50		26,00		1,00	26,00
Área N°2. Archivo regional y Área N°3 grupo de planeación y sistemas	14,60	5,00		73,00		1,00	73,00
	17,30	4,00		69,20		1,00	69,20
Área N°4. primera infancia regional	3,20	5,00		16,00		1,00	16,00
TOTAL							185,94

Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	3,32	3,80				1,00	12,62
OFICINA PEQUEÑA PRIMERA INFANCIA	4,74	3,50				1,00	16,59
OFICINA RECEPCIÓN	2,43	3,02				1,00	7,34

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

OFICINA RECEPCIÓN - BAÑO	2,00	1,00				1,00	2,00
ÁREA COCINETA	3,50	3,00				1,00	10,50
PASILLO SALA DE ESPERA ÁREA 2	8,00	4,50				1,00	36,00
COORDINACIÓN	11,80	6,00				1,00	70,80
PASILLO INGRESO PRINCIPAL	2,00	6,60		13,20		1,00	13,20
OFINA NUTRICIÓN	2,00	1,60		3,20		1,00	3,20
CUARTO ELÉCTRICO	4,09	1,90		7,77		1,00	7,77
PASILLO ENTRADA CUARTO ELÉCTRICO Y OFICINA	2,80	3,57		9,98		1,00	9,98
TOTAL							190,00


Suministro e instalación de cubierta en upvc cresta alta e:2,5mm incluye accesorios para su correcta instalación.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
Área N°1. Oficina de nutrición y de archivo	0,29	6,00		1,74		1,00	1,74
	4,00	6,50		26,00		1,00	26,00
Área N°2. Archivo regional y Área N°3 grupo de planeación y sistemas	14,60	5,00		73,00		1,00	73,00
	17,30	4,00		69,20		1,00	69,20
Área N°4. primera infancia regional	3,20	5,00		16,00		1,00	16,00
TOTAL							185,94

En el siguiente registro fotográfico se evidencia algunas mejoras en pro a las correcciones que exige interventoría con el ánimo de presentar y al desarrollo de la obra como ejecución

Scanned with CamScanner




AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

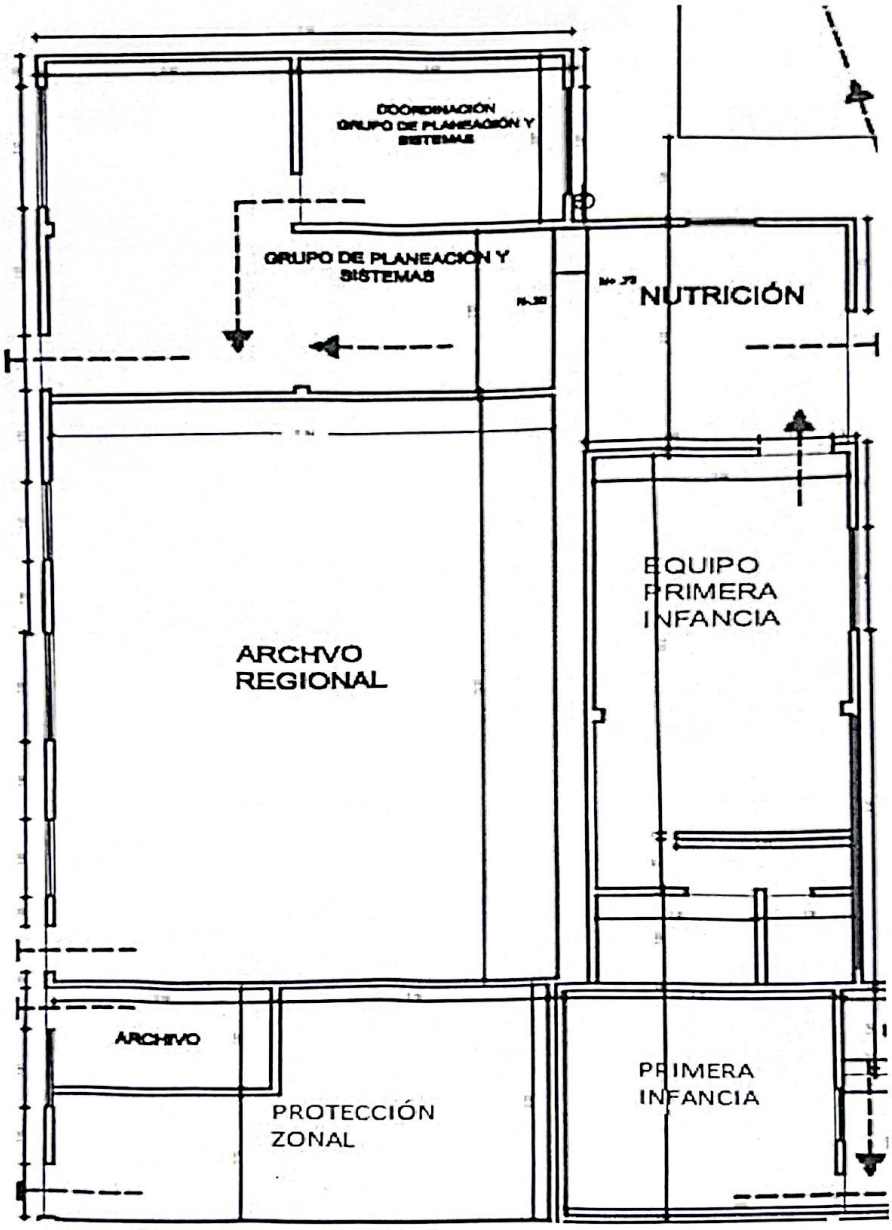

Scanned with CamScanner





CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

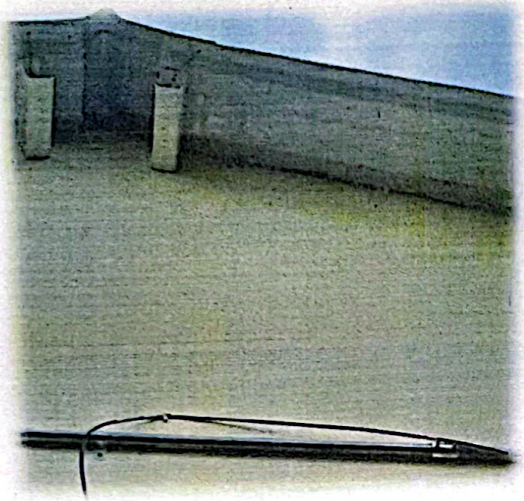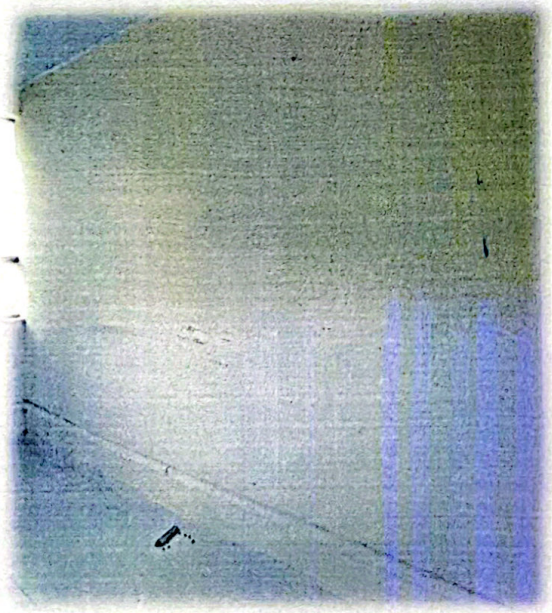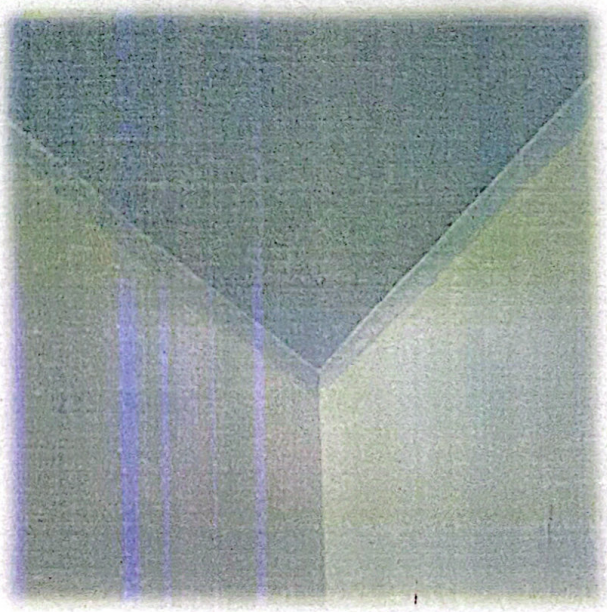3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES 	**DESPUÉS** 
ANTES 	**DESPUÉS** 



Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

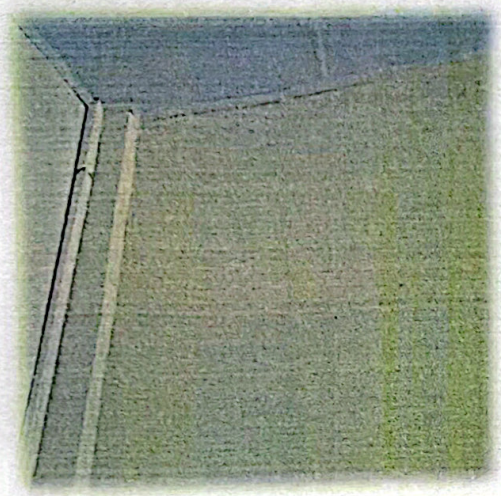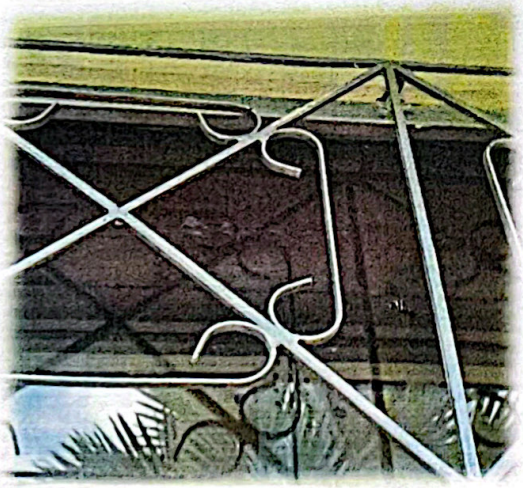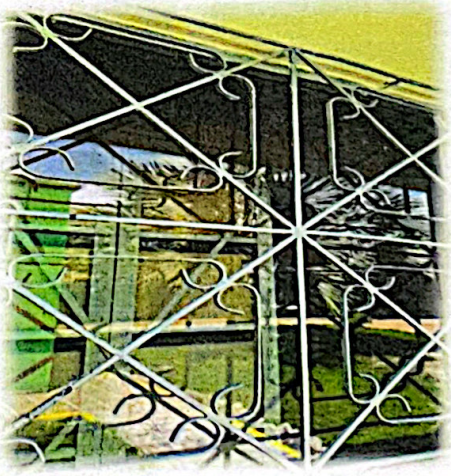ANTES	DESPUÉS
	 
ANTES	**DESPUÉS**
	

Scanned with CamScanner


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

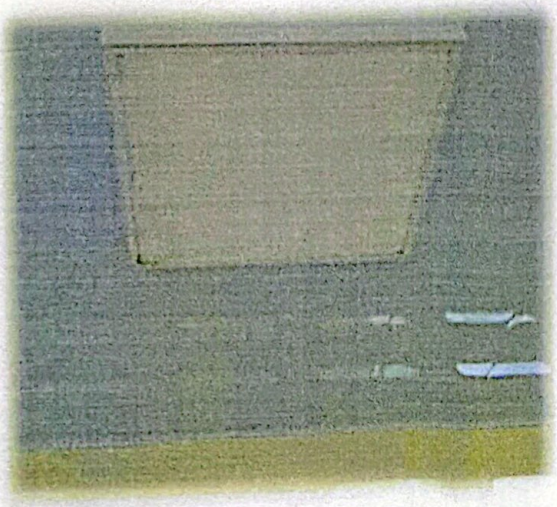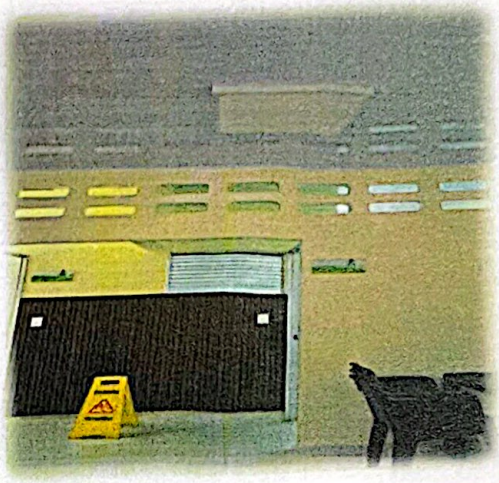ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	


Scanned with CamScanner

CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

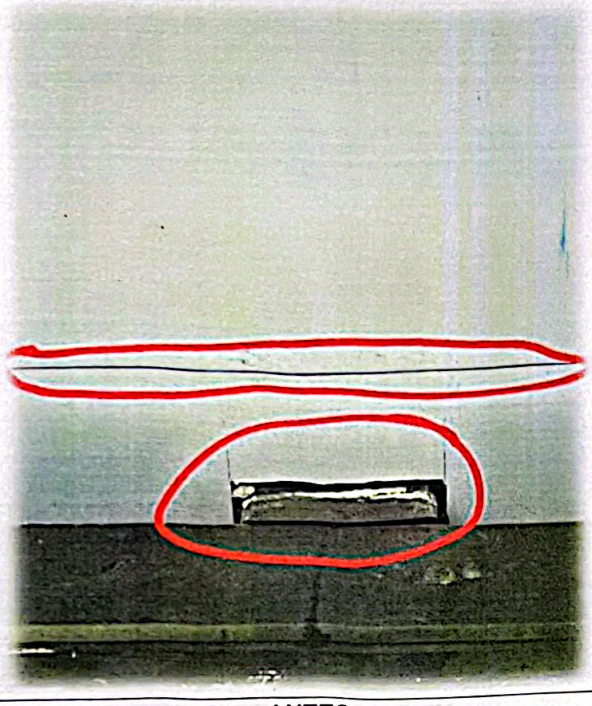
ANTES



DESPUÉS

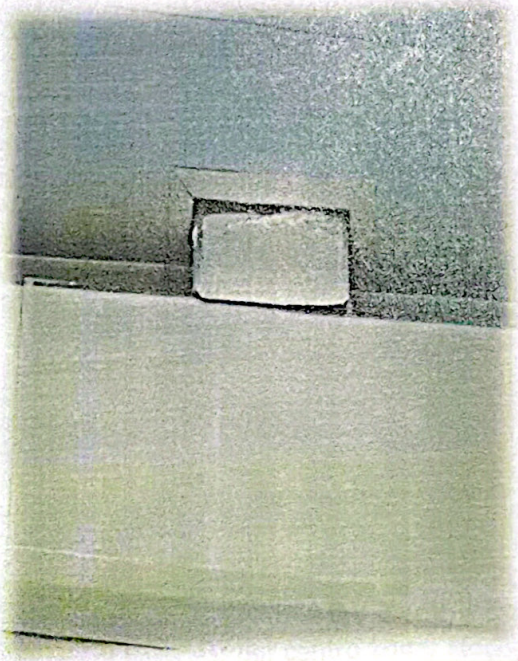

ANTES

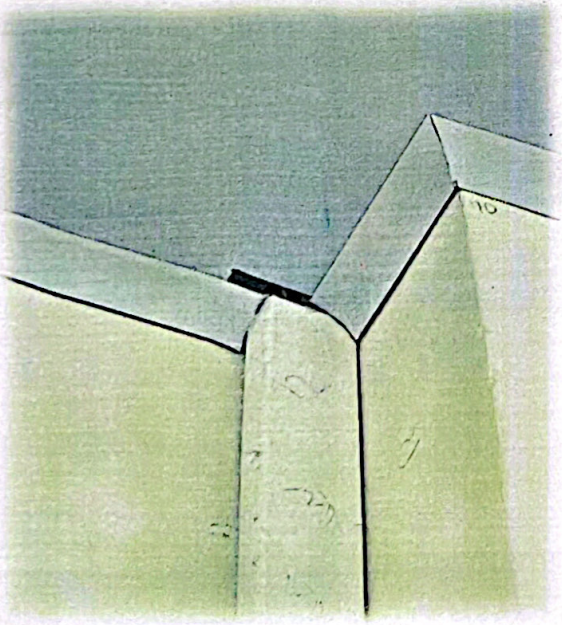


DESPUÉS



Scanned with CamScanner

TUBO INTEGRAL S.A.S. NIT NO. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

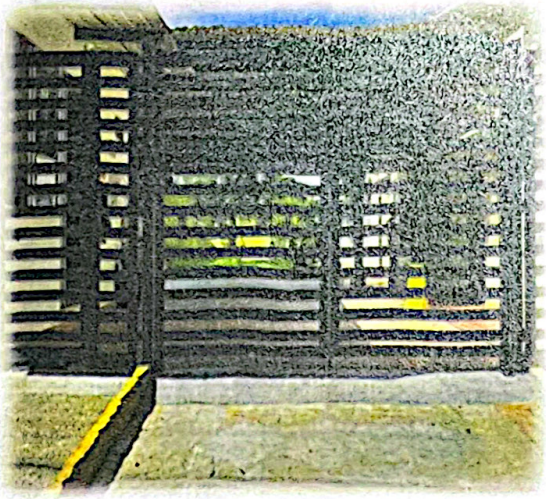ANTES	DESPUÉS
	

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones (si las hubiese), respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Mocoa, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

se dio cumplimiento a los presupuestos, cantidades y valores unitarios pactados por el contratista y avalados por la interventoría, y a las condiciones establecidas por la entidad en la FCT, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y aprobado.

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		

Scanned with CamScanner

CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT NO. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Andrés Buendia M	Firma
En Representación de	Comercio Amp pyto 24	
Correo electrónico	anteban@hotmail.com	
Teléfono	3133967629	
NOMBRE	Mileidy Natalia Florez Gaviria	Firma
En Representación de	al cubo	
Correo electrónico	Supervisoradcinterventoria2018@gmail.com	
Teléfono	3118225197.	
NOMBRE	Jhon Muñoz	Firma
En Representación de	ICBF	
Correo electrónico	Jhonj.Munoz@ICBF.GOV.CO	
Teléfono	3114808384	
NOMBRE	Liliana Patricia Ortiz Arcila	Firma
En Representación de	ICBF	
Correo electrónico	Liliana.Ortiza@icbf.gov.co	
Teléfono	3132921282	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés f. Buendia Martínez
CONTRATISTA DE OBRA – R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

Scanned with CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO COMITÉ TÉCNICO**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	
SEDE:	ACTA GENERAL – COMITÉ TÉCNICO
FECHA:	08-04-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisión ejecución de obra en todas las sedes	**Contratista**	**15-04-2025**

2. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Se hace revisión de la ejecución de obras a la fecha, así:

2.1. CENTRO ZONAL MOCOA:

El contratista tiene ejecutadas las obras de primer piso contempladas en las siguientes áreas

ÁREA N°1

1. Oficina de recepción de documentos 2. Oficina de trabajo social 3. Oficina Primera Infancia 4. Cocineta 5. Área de baños (damas-caballeros- discapacitados) 6. Bodega 7. Pasillos y rampa 8. Kiosco (auditorio)

ÁREA No 2

1. Pasillo recepción, 2. oficina de Psicología, 3. Sala de conferencias, 4. oficina de Defensoría protección 1, 5. oficina de Trabajo Social 6. oficina de Defensoría de Familia 1, 7. oficina defensoría de Familia 2, 8. oficina de Coordinación, 9. Rampas y Pasillos

ÁREA No 3

1. oficina Jurídica 2. oficina de Nutrición 3. Área de Línea Verde 4. Cuarto de Máquinas y sistemas 5. oficina 1 6. oficina 2 ÁREA No 4 1. Parqueadero y pasillos exteriores Donde se realizaron observaciones y mejoras de acuerdo a las actas de seguimiento de la obra y que aún se continúan en otras áreas en ejecución dentro del establecimiento, (cambio de cubierta, demolición de piso, pintura, mejoramiento en puntos identificados como rampa en el portón principal el cual ya se subsanó, identificación de puntos con humedades los cuales se le dieron tratamiento algunas áreas, pero faltan por corregir según requerimientos remitidos al contratista ejecutor.

Powered by CamScanner

De acuerdo con lo anterior, a la fecha el contratista presenta un 95.00% de ejecución del presupuesto aprobado, con un pendiente del 5.0% de ejecución que representa la terminación del cambio de cubierta en el auditorio y los baños y el cambio de piso en el auditorio.

En el cronograma de obra se puede evidenciar que el retraso en la ejecución de obra en sede Mocoa debería ser de un 100%, presenta un retraso del 5%

2.2. CENTRO ZONAL SIBUNDOY:

Se realizó en el segundo piso el cambio de cubierta, mantenimiento de cielo raso, cambio de cielo raso, pintura y en el baño del primer piso se realizó el cambio de enchape, colocación de unidades sanitarias, lavamanos y reinstalación del orinal, se encuentra ejecutando actividades con 3 personas en obra, en ejecución cambio de cubierta sobre la tarima del auditorio, cambio de cubierta en los baños, pintura en baños y pendiente cambio de piso en el auditorio.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha el contratista presenta un 74,43% de ejecución del presupuesto aprobado, con un pendiente del 25,57% de ejecución que representa la terminación del cambio de cubierta en el auditorio y los baños y el cambio de piso en el auditorio.

En el cronograma de obra se puede evidenciar que el retraso en la ejecución de obra en sede Sibundoy debería ser de un 97%, presenta un retraso del 22.57%, respecto al avance ejecutado del 74.43%

2.3. CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO

Debido a la proximidad de la fecha 15 de abril 2025, se encuentra ejecutando actividades con 8 personas en obra con pendientes a terminación de acabados, instalación de lámparas led cambio de interruptores, estuco, pintura, enchapes, humedales identificados y correcciones de acuerdo a observaciones técnicas de interventoría.

Con lo anterior a la fecha el contratista presenta Avance acumulado a corte de 27 de marzo 2025 con 74.37% y Avance semana 5; del 21 de marzo al 27 de marzo 2025; 7.24%

En el cronograma de obra se puede evidenciar que el retraso en la ejecución de obra en sede Puerto Caicedo debería ser de un 95%, presenta un retraso del 20,63% respecto a la ejecución del 74.37 %

2.4. CDI TERNURITAS II PUERTO ASIS

Debido a la proximidad de la fecha 15 de abril 2025, se encuentra ejecutando actividades con 4 personas en obra con pendientes a terminación de acabado en pintura en muro, pintura en ventanas, puertas, humedales identificados y correcciones de acuerdo a observaciones técnicas de interventoría como por ejemplo la ubicación pertinente y estético de la tubería de agua que presenta de forma visible y suple las necesidades del lavadero y la poceta lava traperos donde está expuesto visiblemente, apertura de una puerta a aledaña a la que se realizó en un

Powered by CamScanner

inicio, el cual se requiere la mejora desde ya que el tiempo lo amerita pues atraviesa el cielo razón sin tener en cuenta las necesidades vitales de esta instalación.

Con lo anterior a la fecha el contratista presenta Avance acumulado a corte de un 86.43%.

En el cronograma de obra se puede evidenciar que el retraso en la ejecución de obra en sede Puerto Asís debería ser de un 97%, presenta un retraso del 10.57% respecto al avance ejecutado del 86.43%.

2.5. De acuerdo con lo anterior se tiene los siguientes avances:

SEDE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ATRASO
CENTRO ZONAL MOCOA	100.00%	95.00%	5%
CENTRO ZONAL SIBUNDOY	97.00%	74.43%	22.57%
CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	95.00%	74.37%	20.63%
CDI TERNURITAS II PUERTO ASIS	97.00%	86.43%	10.57%

De acuerdo con lo anterior, se establece que hasta el día 15 de abril de 2025, el contratista no alcanzará al cumplimiento de la ejecución de actividades programadas

2.6. RESPUESTA ICBF A OFICIO ITV86003982024-007 RADICADO EL 30 DE ENERO DE 2025

Asunto: Solicitud de lineamiento BOLSA DE RECURSOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

De acuerdo con lo anterior, se solicita a la entidad contratante para que remita el lineamiento para el ítem "ACTIVIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS QUE DEMANDEN TRABAJO EN ALTURAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO. NOTA: El valor de actividades de trabajo en altura no es sujeto de evaluación razón por la cual los proponentes deben ofertar el mismo valor." Por un valor de $130'000.000, teniendo en cuenta que este ítem no presenta el Análisis de Precios Unitarios y según la CLÁUSULA QUINTA Contrato de Obra No. 86003782024 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO, indica que "La valoración económica de las actividades a realizar se deberán hacer base los precios del mercado, para esto se deberá soportar mediante presentación de tres (3) cotizaciones de las cuales el contratista deberá presentar una, para las dos restantes el ICBF solicitará a empresas locales, de las cuales el supervisor escogerá la más favorable para el Instituto, teniendo en cuenta el menor precio y este será el precio que el ICBF pagará al contratista.

Powered by CamScanner

Una vez notificado, el contratista deberá entregar un cronograma de actividades a realizar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, previa definición del precio mediante el procedimiento anteriormente descrito, el cual será evaluado y aprobado por el supervisor (...)",
De esta manera se solicita a la entidad contratante para que remita lo estipulado para el ítem "ACTIVIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS QUE DEMANDEN TRABAJO EN ALTURAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO" del cual se requiere de las cotizaciones (1 remitida por el contratista, 2 por ICBF), la aprobación de precios y cronograma por parte del supervisor del contrato.

3. COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
TERMINACIÓN DE OBRAS	**Contratista**	**15-04-2025**
BOLSA DE RECURSOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	**ICBF**	

1. Sede Puerto Asís se requieren aplicación de productos especiales para eliminar la humedad, se requiere enviar a interventoría las especificaciones técnicas, y certificado de calidad y el procedimiento para que sea aprobado, el acta de vecindad debe tener claridad en el alcance de la intervención y la restricción de la propietaria
2. EL contratista de obra se compromete a entregar Mocoa el día viernes 11 de abril de 2025
3. Sede Caicedo, se establece como compromiso el 16 de abril de 2025, contando con una prórroga.
4. Sede Sibundoy se compromete el contratista de obra el 25 de abril de 2025.
5. Sede Puerto Asís se compromete el contratista de obra entrega el día 15 de marzo de 2025.
6. se solicita por parte del contratista de obra e interventoría un plazo adicional hasta el 30 de abril de 2025.
7. Respuesta al oficio requerimiento por parte de interventoría de fecha 7 de abril de 2025 se entrega respuesta el 9 de abril de 2025.
8. Solicitud de prórroga por parte de obra e interventoría, la obra entregará a interventoría, en horas de mañana, se remite todos los documentos adicionados también los INP y condiciones que el se consideren tener en cuenta en el modificatorio.
9.

Powered by CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Guillermo Andres Barrueta Parra	Firma
En Representación de	Contratista - Grupo Jurídico ICBF	
Correo electrónico	Guillermo.Barrueta@icbf.gov.co	
Teléfono	3165858809	
NOMBRE	Andrea Milena Murial Enriquez	Firma
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	andreamurial@hotmail.com	
Teléfono	3173762047	
NOMBRE	ADELINA JIMENEZ LOPEZ	Firma
En Representación de	ICBF_DIRECCION	
Correo electrónico	Adelina.jimenez@icbf.gov.co	
Teléfono	3103457455	
NOMBRE	Maxari Melo Barbano	Firma
En Representación de	ICB - Contratista Grupo Juridico	Maxari Melo B.
Correo electrónico	Elcy.melo@icbf.gov.co	
Teléfono	3108661637	
NOMBRE	Diliana Patricia Ortega Ayala	Firma
En Representación de	ICBF- Supervisión	P.O
Correo electrónico	diliana.ortega@icbf.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	Jhon Jairo Muñoz Ocedo	Firma
En Representación de	ICBF -	
Correo electrónico	Jhond.Munoz@icbf.gov.co.	
Teléfono		
NOMBRE	Milcidy Natalid Florez Gaviria	Firma
En Representación de	al cubo	

Powered by CamScanner

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO COMITÉ TÉCNICO**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Firma
Nombre: ANDRES BUENDÍA MARTÍNEZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: MAURICIO JIMÉNEZ DUEÑAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: LILIANA ORTEGA
SUPERVISORA del CONTRATO

Powered by CamScanner

ACTA No:	003
SEDE:	MOCOA
FECHA:	13-04-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento es un acta de recibo final de espacios intervenidos, teniendo en cuenta la finalización de la obra física y la entrega de las instalaciones para uso del personal del ICBF.

Se tiene las siguientes consideraciones:

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa.
2. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo de la obra física por parte de interventoría, dando cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las obligaciones contractuales recibiendo a satisfacción las obras ejecutadas.

3. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

BALANCE DE OBRA DE CENTRO ZONAL MOCOA

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
I	**CENTRO ZONAL MOCOA**				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,0	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	M2	860,92	$ 14.704,20	$ 12.659.140,00
1,2	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	M2	15,00	$ 18.391,57	$ 275.874,00


1,3	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M (DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	M2		$ 22.279,09	$ -
1,4	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m (DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2		$ 39.823,88	$ -
1,5	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	M		$ 7.352,10	$ -
1,6	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	M	30,90	$ 24.312,50	$ 751.256,00
1,7	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	M	35,00	$ 17.852,18	$ 624.826,00
1,8	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UND		$ 98.028,00	$ -
1,9	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	M2	444,50	$ 7.964,82	$ 3.540.362,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	UND		$ 61.267,50	$ -
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	UND		$ 73.521,00	$ -
1.12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	M2	7,00	$ 12.092,27	$ 84.646,00
1.13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	540,00	$ 9.976,39	$ 5.387.251,00
2,0	**MAMPOSTERÍA**				
2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	16,90	$ 109.639,18	$ 1.852.902,00
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	13,83	$ 110.465,53	$ 1.527.738,00
3	**ACABADOS PISOS Y PAREDES**				
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	575,00	$ 11.763,78	$ 6.764.173,44
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	M2	15,00	$ 31.323,52	$ 469.852,80
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 34.899,16	$ -
3,04	ESTUCO ACRÍLICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	850,50	$ 17.869,76	$ 15.198.230,88
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	507,90	$ 25.123,27	$ 12.760.108,83
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1.118,54	$ 21.394,52	$ 23.930.626,89
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	M2		$ 40.266,31	$ -

4,0	**ENCHAPE PISOS Y MUROS**				
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2		$ 98.356,17	$ -
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	210,67	$ 80.516,32	$ 16.962.373,13
4,03	CERÁMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	444,50	$ 93.547,34	$ 41.581.792,63
4,04	GUARDA ESCOBA EN GRES (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	M	100,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	M	335,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678,40
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	660,65	$ 60.536,38	$ 39.993.359,45
5,0	**HIDROSANITARIO**				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	M		$ 129.887,10	$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	M		$ 21.906,54	$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M		$ 59.858,93	$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA 1/2"	M		$ 11.864,02	$ -
5,05	REGISTRO 1/2"	UND		$ 80.750,57	$ -
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND		$ 522.429,72	$ -
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	M2	7,00	$ 130.327,80	$ 912.295,01
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND		$ 206.267,25	$ -
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARA 1/2"	UND		$ 94.425,47	$ -
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	UND		$ 330.844,50	$ -
6,0	**CUBIERTA**				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	M2		$ 53.679,24	$ -
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA, INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ML		$ 67.472,15	$ -
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	540,00	$ 146.892,97	$ 79.322.203,73

6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	M2		$ 101.824,52	$ -
7,0	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	29,57	$ 392.473,48	$ 11.605.441,00
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 364.704,08	$ -
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND		$ 343.098,00	$ -
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	M2		$ 836.112,47	$ -
8,0	**URBANISMO**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 110.467,05	$ -
8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	M2		$ 90.853,28	$ -
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METÁLICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	75,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 690.222,15	$ -
9,0	**ITEM NO PREVISTOS**				
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA instalación.	M2	860,92	$ 108.123,00	$ 93.085.253,16
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	45,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855,00
NP,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	162,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478,00
NP,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	94,60	$ 27.871,00	$ 2.636.596,60
NP,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE CORREAS METÁLICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	$ 117.617,00	$ 47.823.072,20
NP-06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y QUIOSCO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS METÁLICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	$ 89.294,00	$ 16.153.284,60
NP-07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2"X 11/2" Cal 16.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256,00

NP-08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	$ 33.995,00	$ 2.060.097,00
NP-11	DESMONTE DE LÁMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA.	UND	75,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575,00
NP-12	DESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	$ 32.738,00	$ 327.380,00
NP-13	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UND	35,00	$ 15.619,00	$ 546.665,00
NP-14	DESMONTE DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES.	ML	12,40	$ 31.238,00	$ 387.351,20
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa). (1,0x2,20)	UND	3,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425,00
NP-19	INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	$ 127.475,00	$ 1.580.690,00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	$ 55.000,00	$ 550.000,00
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665,00
NP-24	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	$ 22.619,00	$ 10.189.633,31
NP-25	DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE.	UND	1,00	$ 885.356,00	$ 885.356,00
				SUBTOTAL	**$ 509.388.446**
				ADMINISTRACIÓN 22,00%	$ 112.065.458
				IMPREVISTOS 3,00%	$ 15.281.653
				UTILIDAD ANTES DE IVA 5,00%	$ 25.469.422
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%	$ 4.839.190
				TOTAL	**$ 667.044.169**

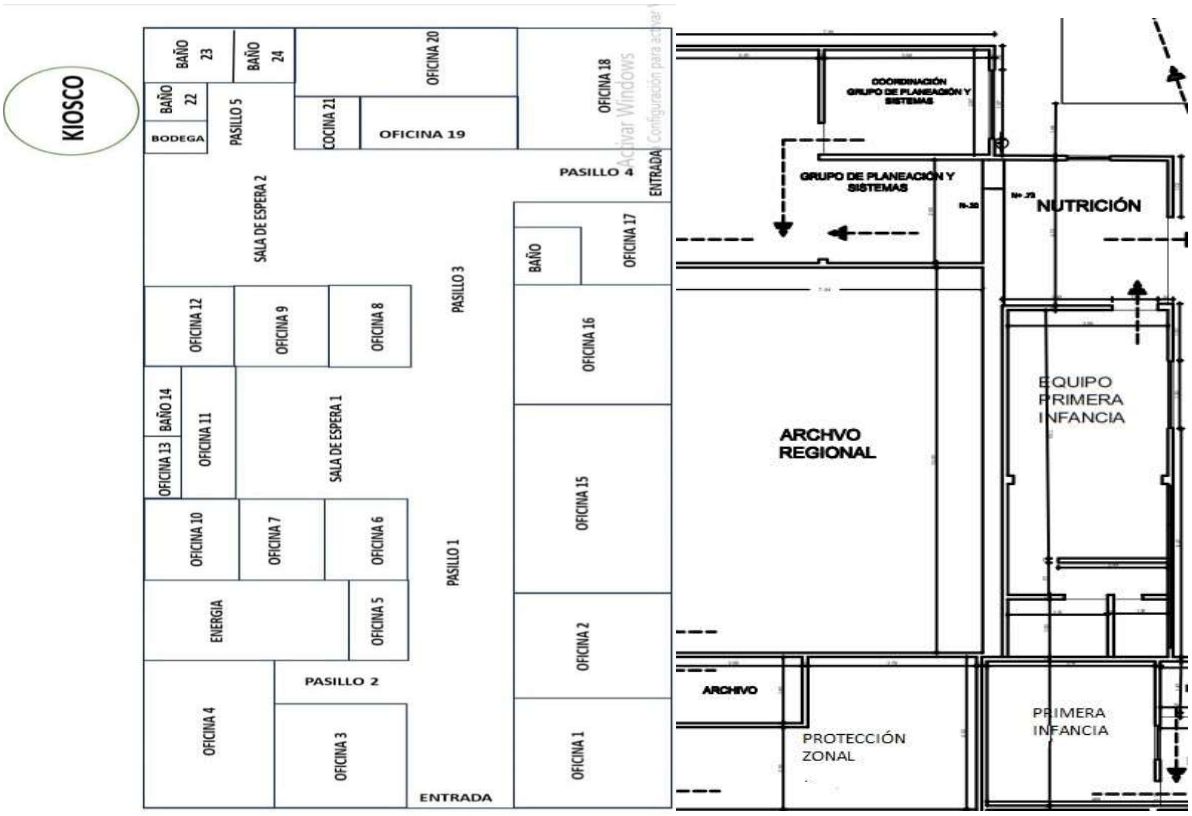3. ÁREAS INTERVENIDAS DEL CENTRO ZONAL MOCOA



En la sede del centro zonal Mocoa, se procede a verificar la ejecución de obra en las áreas mencionadas

Una vez revisadas las áreas intervenidas, se tienen las siguientes observaciones:

ÁREA N°1		Descripción de acciones	Ejecutado en	observaciones
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	N/A	100	Aprueba interventoría
2	Oficina de CORDINACIÓN	N/A	100	Aprueba interventoría
3	Oficina de PSICOLOGIA	N/A	100	Aprueba interventoría
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	N/A	100	Aprueba interventoría

5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	N/A	100	Aprueba interventoría
6	Oficina de NUTRICIÓN	N/A	100	Aprueba interventoría
7	Cocina	N/A	100	Aprueba interventoría
8	Oficina de PSICOLOGIA	N/A	100	Aprueba interventoría
9	Oficina de FAMILIA 1	N/A	100	Aprueba interventoría
10	PASILLOS	N/A	100	Aprueba interventoría
11	ESCALERAS ACCESO	N/A	100	Aprueba interventoría
12	VACÍO INTERNO	N/A	100	Aprueba interventoría
ÁREA No 2		**Descripción de acciones correctivas**	**Ejecutado en %**	**observaciones**
1	UNIDAD SANITARIA	N/A	100	Aprueba interventoría
2	CAJA DE INSPECCIÓN	N/A	100	Aprueba interventoría
3	Archivo - regional	N/A	100	Aprueba interventoría
4	Protección - zonal	N/A	100	Aprueba interventoría


4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DESPUES**
	


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ANTES	**DESPUES**
	
ANTES	**DESPUES**
	
ANTES	**DESPUES**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**


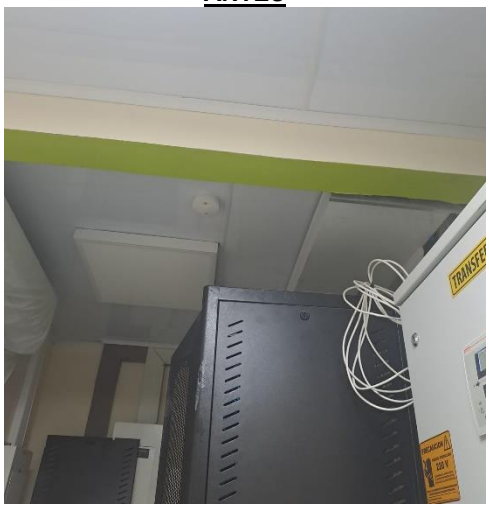
ANTES	**DESPUES**
	
ANTES	**DESPUES**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

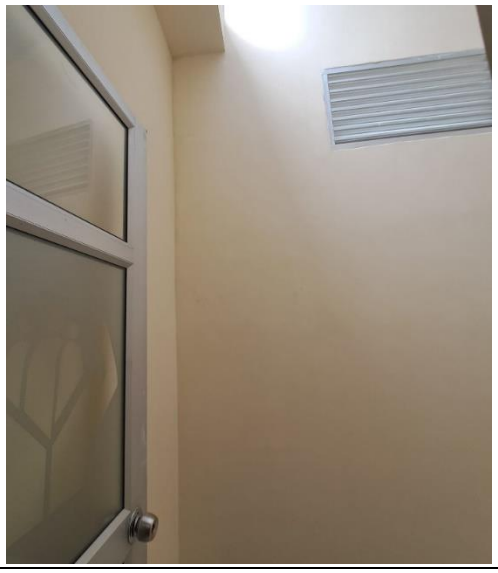ANTES	**DESPUES**
	

ANTES	**DESPUÉS**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

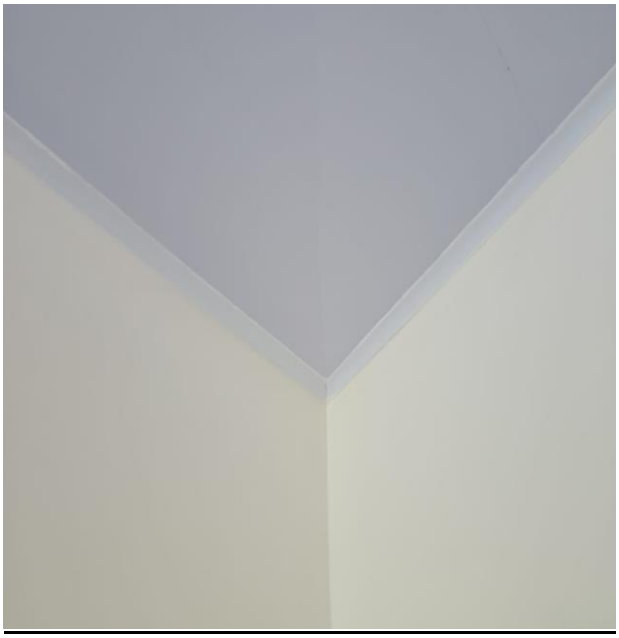
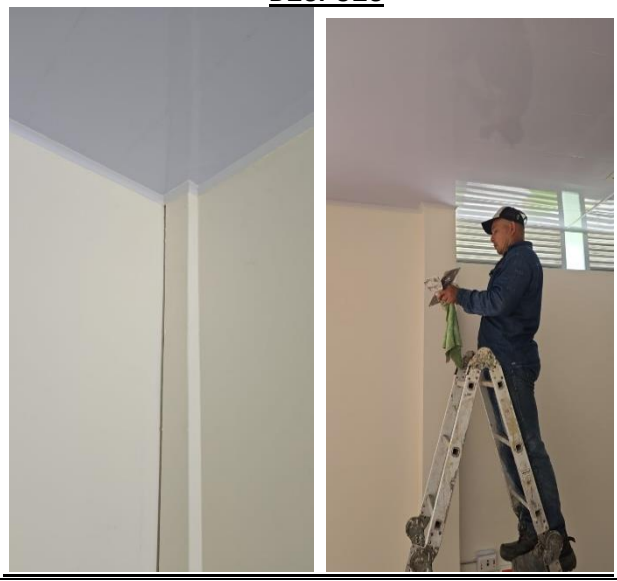
ANTES 	**DESPUÉS** 
ANTES 	**DESPUÉS** 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	


ANTES	DESPUÉS
	
ANTES	**DESPUÉS**
	


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

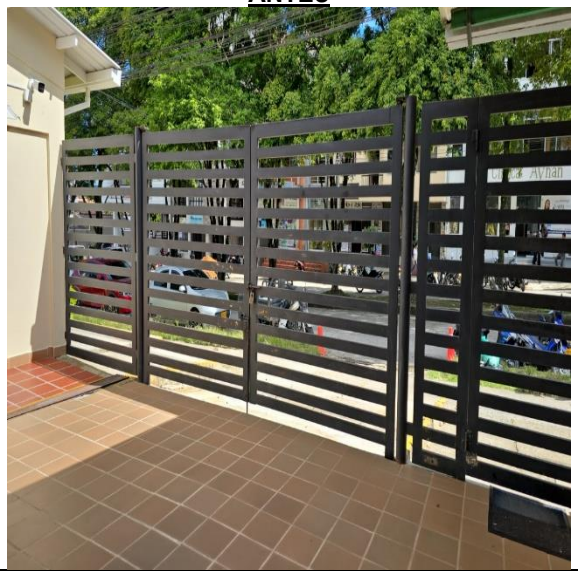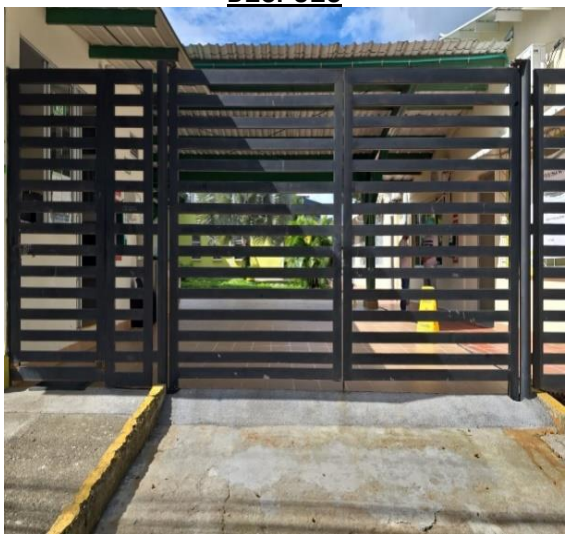
ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**





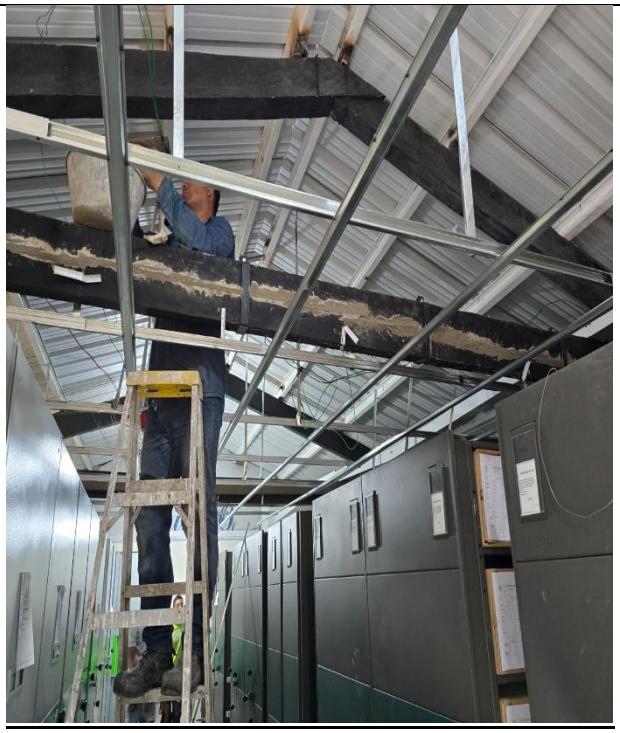




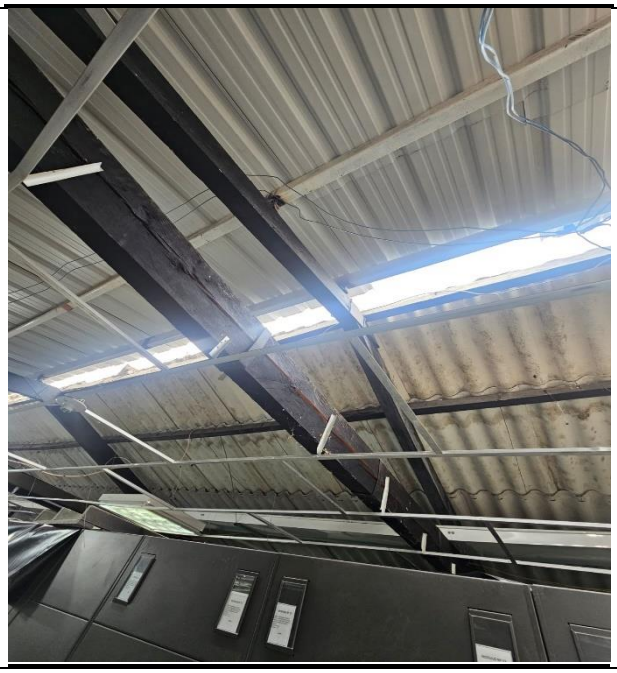


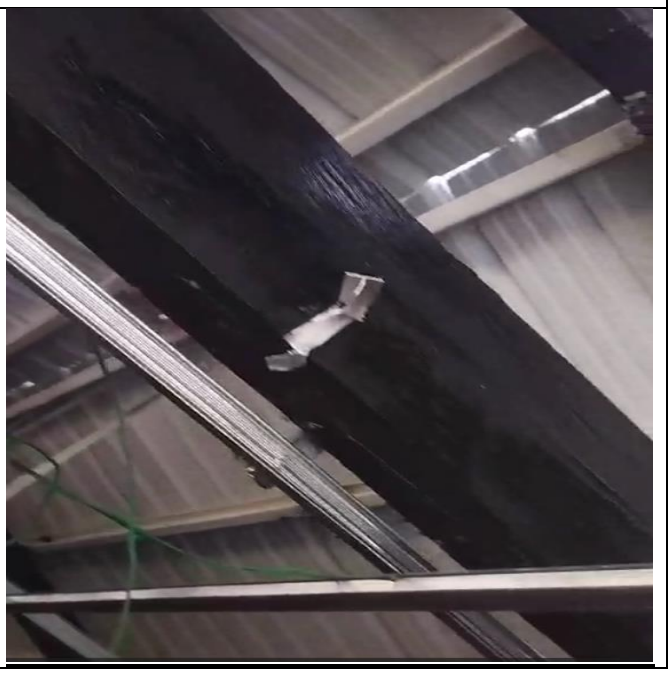


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

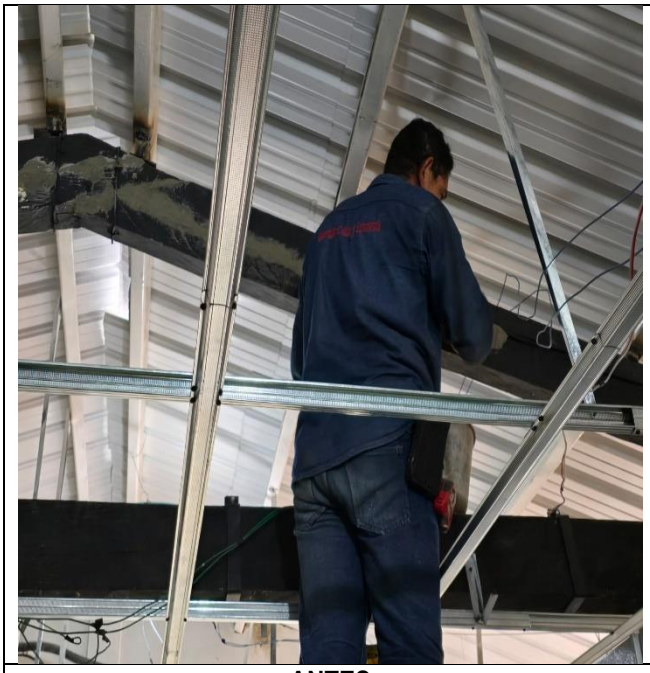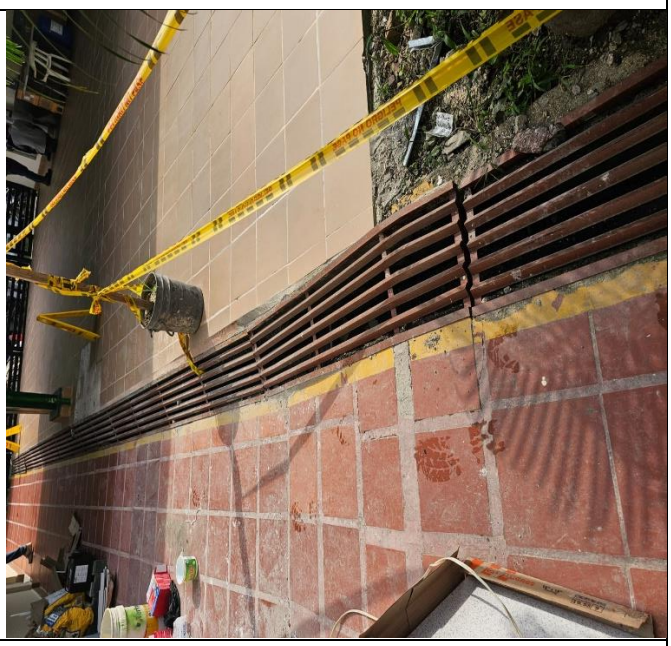	
ANTES	**DESPUÉS**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

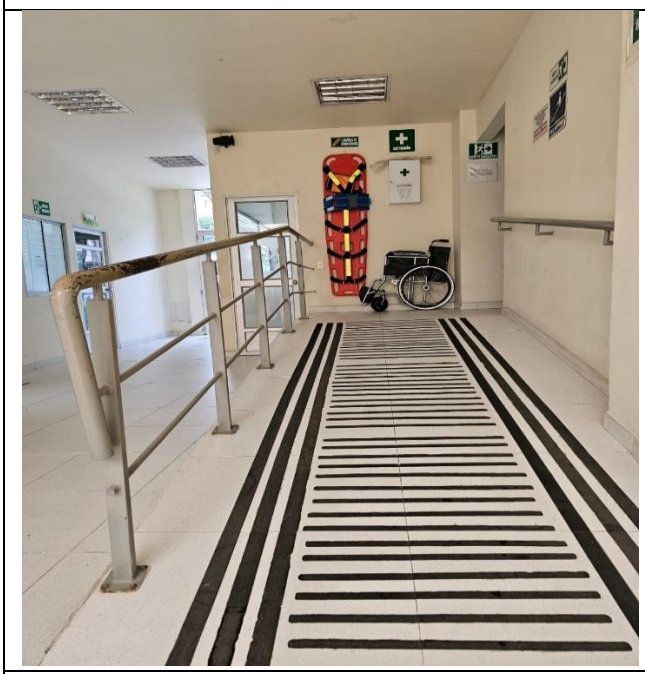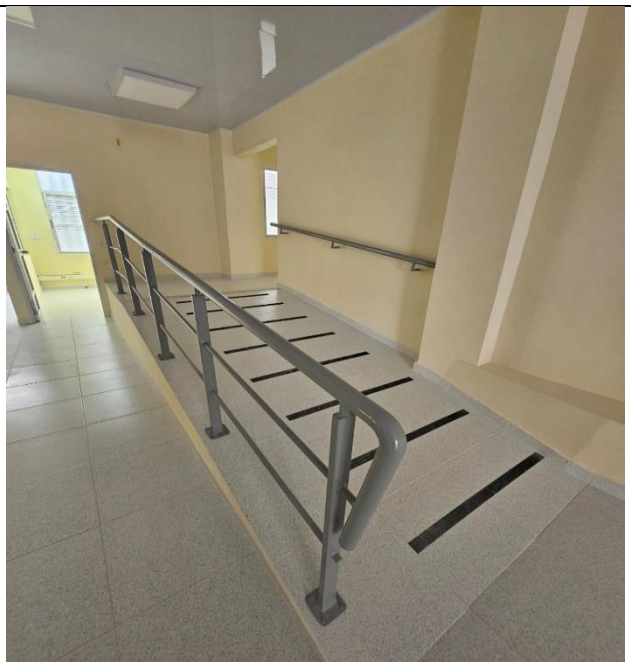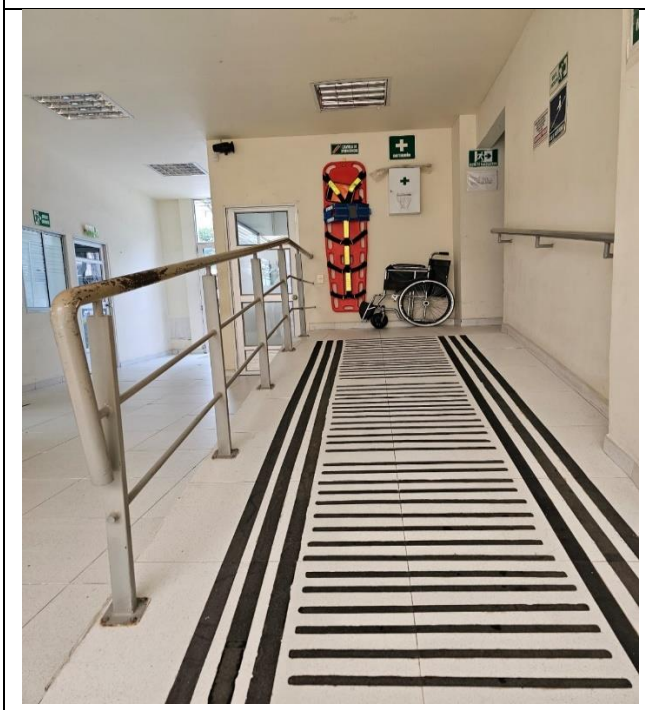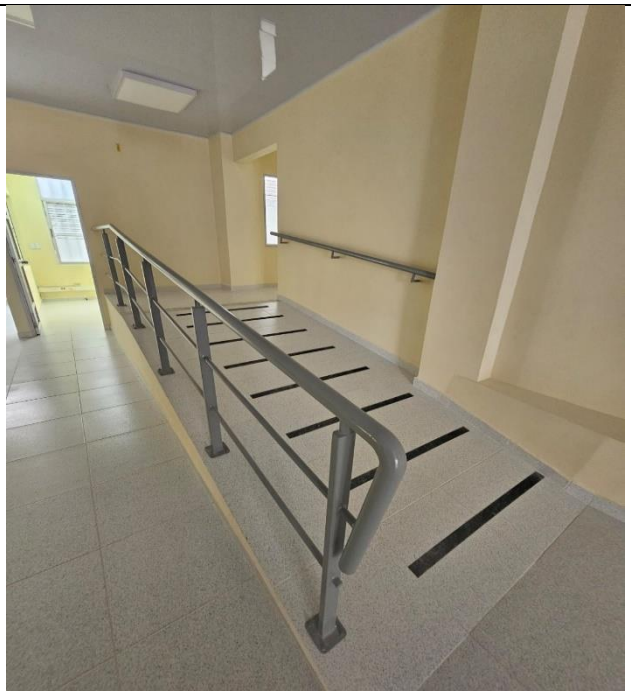ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE RECIBO FINAL DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

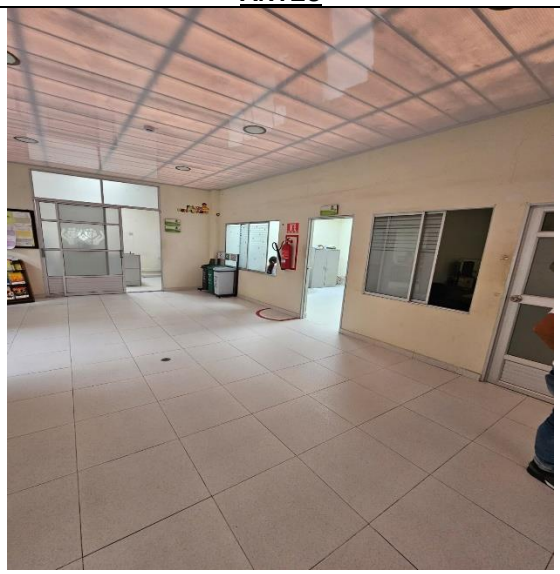ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	

Se deja evidencia de la ejecución de obra, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Mocoa, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés Buendia M.
CONTRATISTA DE OBRA-R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
