	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — 51,00 (Numeración consecutiva) del 6-jun al 12-jun. Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000' LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LOS SECTORES 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.
INTEGRANTES: N.A
CONTRATO No. 1683 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.396.583.663,00
FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 2.396.583.663,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
INTEGRANTES: N.A
CONTRATO No. 1873 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO: 20/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	SALDO EJECUTADO DEL 2024 EN 2025	2025	2026	ACUMULADO
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 776.740.829		$ 997.337.234	$ 622.505.600,00	$ 2.396.583.663
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 535.951.169,40		$ 174.767.520	$ -	$ 174.767.520
	SALDO DE VIGENCIA	$ 240.789.660	$ -	$ 822.569.714	$ 622.505.600,00	$ 1.445.075.314
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328		$ 15.897.994.304	$ 1.055.119.450,00	$ 16.953.113.754
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 578.691.017	$ 484.690.969			$ 484.690.969
	SALDO DE VIGENCIA	$ 826.593.311	$ 341.902.342	$ 15.897.994.304	$ 1.055.119.450,00	$ 17.295.016.096

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): ACUMULADO	$ 2.355.891.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.395.799.767,67	59,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.396.583.663,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.419.909.036,66	59,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.123.952,68	100,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.123.952,68	100,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-059190
PERIODO FACTURADO: may-25
VALOR FACTURA: $ 83.111.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: AUN NO SE TIENEN CUENTAS TRAMITADAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.050.198.082,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.063.381.986,01	26,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 23.193.051,01	0,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.193.051,01	0,57%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-059996
PERIODO FACTURADO: may-25
VALOR FACTURA: $ 99.398.790,05

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: AUN NO SE TIENEN CUENTAS TRAMITADAS

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes:	1,20
Acumulado:	0,76

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100%
Meta Física Ejecutada %: 96%
Avance o Atraso Físico %: 4%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base							Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual		Unidad	Cantidad	Vigencia		Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenieniento rutinario		5 dias	12	5 dias			Prog	10			10	96,0%
							Ejec	10			10	96,0%
*							Prog					
							Ejec					
*							Prog					
							Ejec					
*							Prog					
							Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑAS	6	6
HERRAMIENTA MENOR	15	15
Total	21	21

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FOI	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


JORNADA DE TAPAHUECOS CON MATERIAL DE ACOPIO DEL PR 80+0200 AL PR 80+0450 EL DIA 6 DE JUNIO SE PRESENTARON LLUVIAS DESDE LAS 10:00 AM HASTA LAS 11:30 AM.
ROCERÍA DEL PR 83+0000 AL PR 86+0000 EL DIA 9 DE JUNIO SE PRESENTARON LLUVIAS DESDE LAS 09:00 AM HASTA LAS 11:00 AM.
ROCERÍA DEL PR 86+0000 AL PR 88+0500 EL DIA 10 DE JUNIO SE PRESENTARON LLUVIAS DESDE LAS 11:45 AM HASTA LAS 02:00 PM.
RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO EN EL PR 89+0200
LAVADO DE PONTÓN EN EL PR 09+0100 EL DIA 11 DE JUNIO SE PRESENTARON LLUVIAS DESDE LAS 10:30 AM HASTA LAS 03:30 PM.
ROCERÍA DEL PR 88+0500 AL PR 90+0000
JORNADA DE TAPAHUECOS DEL PR 79+0900 AL PR 84+0150.

OBSERVACIÓN:EN ESTA SEMANA SE DIO PRIPRIDAD A LA ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA CAPA DE RODADURA, NOS ENCONTRAMOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS LO CUAL GENERA UN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Limpieza de cunetas
Limpieza de obras de arte
Limpieza de calzada
Limpieza de puentes
Despeje de señalización y alinear las señales que estén torcidas.
INICIANDO PR 71+0700 AL PR 78+0000.
ROCERÍA DEL PR 4+0000 AL PR 8+0000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

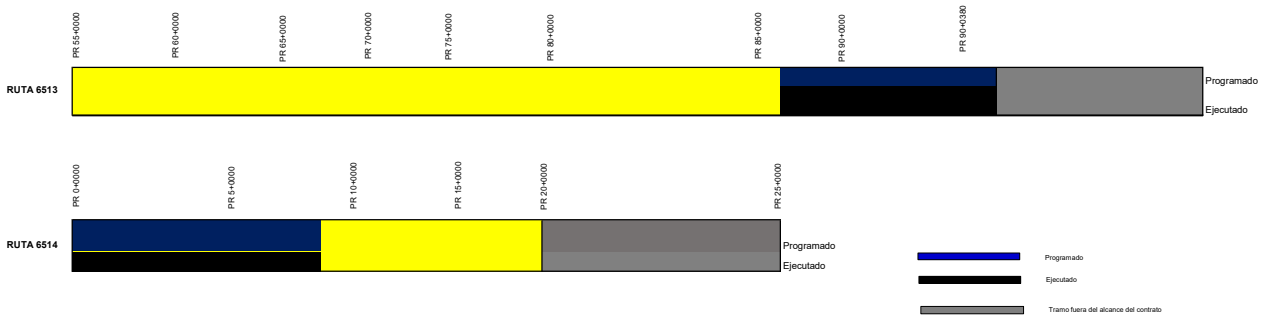

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







JORNADA DE TAPAHUECOS CON MATERIAL DE ACOPIO DEL PR 80+0200







ROCERÍA DEL PR 83+0000







ROCERÍA DEL PR 86+0000







LAVADO DE PONTÓN EN EL PR 09+0100

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EL AVANCE DE ROCERIA SE VE AFECTADO POR LOS TIPOS DE PASTO QUE SE DAN EN ESTE TRAMO, LOS CUALES PUEDEN LLEGAR A UNA ALTURA HASTA DE 3 M Y TORNA UNA ALTURA DE 40 CM EN MENOS DE 5 DIAS.	FIRMA NOMBRE: CLAUDIA MARITZA HURTADO Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
