	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 49,00 del 23-may al 29-may (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000" LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.		
INTEGRANTES:	N.A		
CONTRATO No.	1735 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00
FECHA DE INICIO:	13 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULAD	$ 2.705.541.774,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:

ADMINISTRADOR VIAL:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO		
INTEGRANTES:	N.A		
CONTRATO No.	1873 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	SALDO EJECUTADO DEL 2024 EN 2025	2025	2026	ACUMULADOS CTO
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 877.044,399		$ 1.125.443.642	$ 703.053.736,00	$ 2.705.541.777
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 578.849.303	$ 375.147.880,80	$ -	$ -	$ 4.786.113.403
	SALDO DE VIGENCIA	$ 298.195.096	-$ 76.952.785,14	$ 1.125.443.642	$ 703.053.736,00	$ 2.126.692.474
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328		$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450,00	$ 24.301.188.492
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 578.691.017	$ 385.292.179,28	$ -	$ -	$ 3.251.361.110
	SALDO DE VIGENCIA	$ 826.593.311	$ 441.301.132,04	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450,00	$ 22.382.720.869

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) ,
(Indicar valores en pesos) ,

OBRA

VALOR **BÁSICO** CONTRATO DE OBRA (A): ACUMULADO	$ 2.273.564.516,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 909.800.991,00	40,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.705.541.777,40	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.082.663.059,00	40,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.883.624,00	100,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.883.624,00	100,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-046879
PERIODO FACTURADO: abr-25
VALOR FACTURA: $ 93.786.970,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.050.198.082,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 963.983.195,96	23,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.462.264,83	0,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.462.264,83	0,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-046378
PERIODO FACTURADO: abr-25
VALOR FACTURA: $ 96.266.849,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes:	1,03
Acumulado:	1,06

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100%
Meta Física Ejecutada %: 100%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual		Unidad	Cantidad	Vigencia		Vigencia (n)
Mantenimiento rutinario		5 dias	11	5 dias		
*						
*						
*						

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector 2	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	%
Prog	11						10	100,0%
Ejec	11						10	100,0%
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑA	9	9
HERRAMIENTA MENOR	10	10
Total	19	19

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENT	SI	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENT	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


TAPAHUECOS CON ASFALTO EN FRIO DEL PR 02+0800 AL PR 04+0850
PODA DE ÁRBOL EN RIESGO DE CAER SOBRE LA VÍA EN EL PR 05 +0450
LIMPIEZA AL PUENTE CRAVO SUR EL PR 02+0250
LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 02+0250 AL PR 02+0600
ROCERÍA DEL PR 12+0000 AL PR 14+0000 Y ROCERÍA DEL PR 25+0200 AL PR 26+0200
ROCERÍA DEL PR 14+0000 AL PR 16+0400
RETIRO DE ÁRBOL EN RIESGO DE CAER SOBRE A LA VÍA EN EL PR 01+085
TAPAHUECOS DEL PR 55+0000 AL PR 38+0900 EN EL PR 06+0900 AL PR 07+0000
PODA DE ÁRBOL EN RIESGO DE CAER SOBRE LA VÍA EN EL PR 48+0900
RETIRO DE ARBOLES CAÍDOS EN EL PR 36+0070 Y EN EL PR 27+0750 Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS COLMATADAS DEL PR 25+0200 AL PR 26+0200

OBSERVACIÓN: NOS ENCONTRAMOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS LO CUAL GENERA UN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERÍA DE 16+0500 AL 25+0000 (PRIORIDAD)
LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS COLMATADAS DEL PR 26+0200 AL PR 27+0800
SEÑALIZACION DEL PR 48+0900 (PRIORIDAD)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







TAPAHUECOS CON ASFALTO EN FRIO DEL PR 02+0800







PODA DE ÁRBOL EN RIESGO DE CAER SOBRE LA VÍA EN EL PR 05 +0450







ROCERÍA DEL PR 12+0000








ROCERÍA DEL PR 14+0000





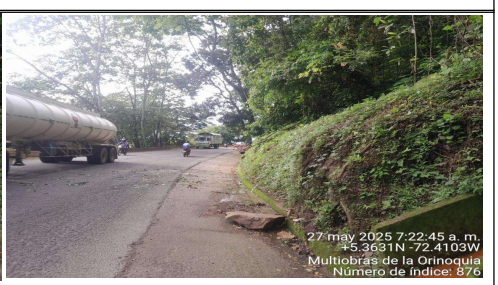

RETIRO DE ÁRBOL EN RIESGO DE CAER SOBRE A LA VÍA EN EL PR 01+085







LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS COLMATADAS DEL PR 25+0200







LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS COLMATADAS DEL PR 26+0200

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
EL AVANCE DE ROCERIA SE VE AFECTADO POR LOS TIPOS DE PASTO QUE SE DAN EN ESTE TRAMO, LOS CUALES PUEDEN LLEGAR A UNA ALTURA HASTA DE 3 M Y TORNA UNA ALTURA DE 40 CM EN MENOS DE 5 DIAS.	FIRMA NOMBRE: CLAUDIA MARITZA HURTADO Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
