	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 50,00 del 30-may al 5-jun (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000" LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.
INTEGRANTES: N.A
CONTRATO No. 1735 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.705.541.774,00
FECHA DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 2.705.541.774,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:

ADMINISTRADOR VIAL: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
INTEGRANTES: N.A
CONTRATO No. 1873 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO: 20/06/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	SALDO EJECUTADO DEL 2024 EN 2025	2025	2026	ACUMULADOS CTO
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 877.044.399		$ 1.125.443.642	$ 703.053.736,00	$ 2.705.541.777
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 578.849.303	$ 375.147.880,80	$ -	$ -	$ 4.786.113.403
	SALDO DE VIGENCIA	$ 298.195.096	-$ 76.952.785,14	$ 1.125.443.642	$ 703.053.736,00	$ 2.126.692.474
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328		$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450,00	$ 24.301.188.492
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 578.691.017	$ 385.292.179,28	$ -	$ -	$ 3.251.361.110
	SALDO DE VIGENCIA	$ 826.593.311	$ 441.301.132,04	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450,00	$ 22.382.720.869

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR **BASICO** CONTRATO DE OBRA (A): ACUMULADO	$ 2.273.564.516,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 928.190.593,00	40,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios v Diseños. gestión predial. social. ambiental v otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.705.541.777,40	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.104.546.683,00	40,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.883.624,00	100,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.883.624,00	100,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-046879
PERIODO FACTURADO: abr-25
VALOR FACTURA: $ 93.786.970,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.050.198.082,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 963.983.195,96	23,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.462.264,83	0,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.462.264,83	0,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-046378
PERIODO FACTURADO: abr-25
VALOR FACTURA: $ 96.266.849,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,03
Acumulado:	1,04

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90%
Meta Física Ejecutada %: 90%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual		Unidad	Cantidad	Vigencia		Vigencia (n)
Mantenimiento rutinario		4 dias	11	4 dias		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	1	Tramo y/o sector 2	1	Tramo y/o sector (n)	1	Total	%
Prog	11						10	90,0%
Ejec	11						10	90,0%
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑA	9	9
HERRAMIENTA MENOR	10	10
Total	19	19

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENT SI		NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENT SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTO AL PR 48+0900 SE INSTALÓ SEÑALIZACIÓN CINTA PELIGRO Y TUBOS
LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN DEL PR 25+0800 AL PR 26+0400
LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 26+0200 AL PR 26+0400
SE PRESENTARON LLUVIAS EL 30 DE MAYO
SE REALIZÓ SEÑALIZACIÓN CINTA PELIGRO EN EL PR 36+0900 POR PERDIDA DE CABEZOTE DE ALCANTARILLA.
DESPUNTE DE DERRUMBE DEL PR 01+0600
RETIRO DE ÁRBOL SOBRE LA CUNETA DEL PR 07+0200
ROCERÍA DEL PR 16+0400 AL PR 19+0000
SE PRESENTARON LLUVIAS DURANTE LA JORNADA EL 4 DE JUNIO
ROCERÍA DEL PR 19+0000 AL PR 21+0000
DESPEJE EN CUNETA DEL PR 02+0200
ROCERÍA DEL PR 21+0000 AL PR 23+0500
INSTALACIÓN CINTA PELIGRO EN EL PR 04+0100


OBSERVACIÓN: NOS ENCONTRAMOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS LO CUAL GENERA UN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERÍA DE 23+0600 AL 35+0600 (PRIORIDAD)

LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS COLMATADAS DEL PR 26+0500 AL PR 27+0800

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO








LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN DEL PR 25+0800



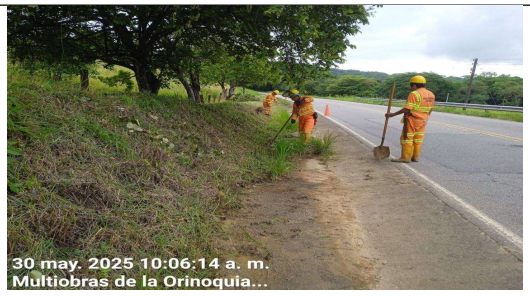



LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS DEL PR 26+0200







SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTO AL PR 48+0900 SE INSTALÓ SEÑALIZACIÓN CINTA PELIGRO Y TUBOS







RETIRO DE ÁRBOL SOBRE LA CUNETA DEL PR 07+0200







ROCERÍA DEL PR 16+0400

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EL AVANCE DE ROCERIA SE VE AFECTADO POR LOS TIPOS DE PASTO QUE SE DAN EN ESTE TRAMO, LOS CUALES PUEDEN LLEGAR A UNA ALTURA HASTA DE 3 M Y TORNA UNA ALTURA DE 40 CM EN MENOS DE 5 DIAS.	FIRMA NOMBRE: CLAUDIA MARITZA HURTADO Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
