
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM410 DE** de 2023_

INFORME DE INTERVENTORIA No. _2

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Objeto Contrato:_____

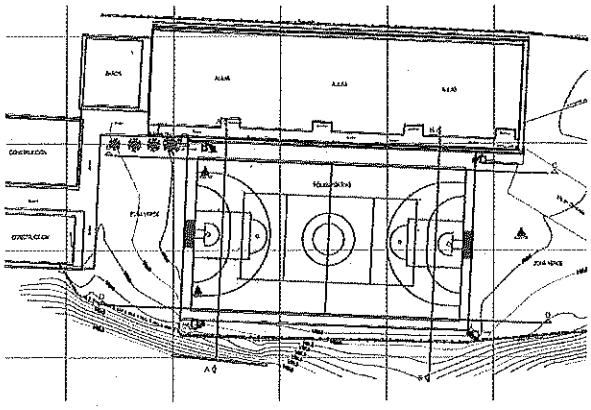

MUNICIPIO: _____**EL AGRADO-**_____.

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM410 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	NATALIA BUSTOS BOTERO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM410**____ DE 223___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 1 de Diciembre al 28 De Diciembre de 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.767.496-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS ($129.699.011) M/CTE.		
VALOR CORRESPONDIENTE A LA VEREDA BUENAVISTA	$ 44.002.643		
VALOR TOTAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS ($129.699.011) M/CTE.		


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH376 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA **ALTO BUENAVISTA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	**JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ**	**NIT:**	**79.356.655.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ**	**C.C:**	**79.356.655.**

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	3 MESES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL:	3 MESES
VALOR INICIAL:	$ 524.045.228,04
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Alto Buenavista de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila

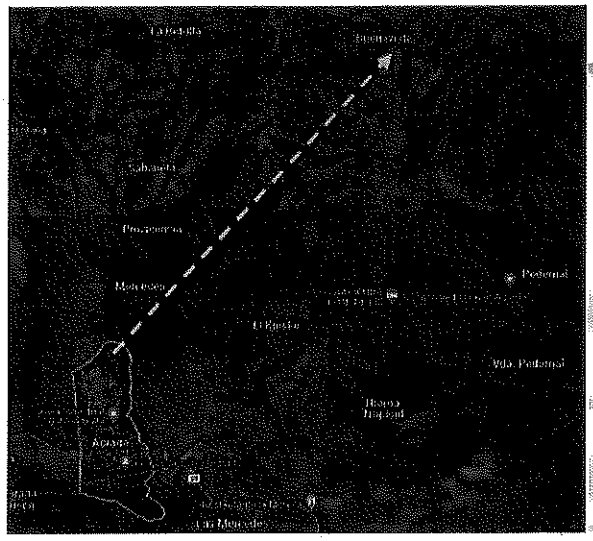

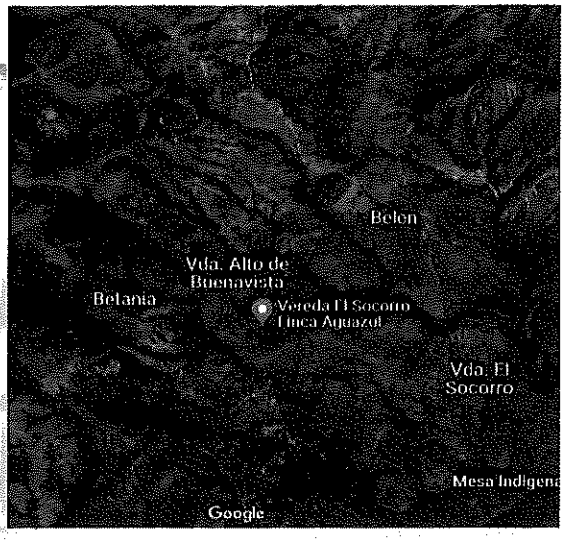

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Alto Buenavista de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema autoportante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, plaza contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades de avance de obra se han centrado en la formalización y ordenamiento contractual, adecuación del terreno y las actividades preliminares. Tal como se describen en este informe.

SEMANA (1-2 DICIEMBRE)

En revisión conjunta de la implantación del proyecto en el área se evidencia la necesidad de realizar mayores cantidades de localización y replanteo por lo cual se suspende la ejecución de dicha actividad hasta tanto se realice la aprobación de mayores y menores cantidades de obra.
Se inician actividades de transporte de material pétreo al sitio de la obra desde el proveedor masseq
Se continua con la consecución de documentos requeridos para la radicación del anticipo de obra.

SEMANA (4-9 DICIEMBRE)

El contratista avanza en la consecución y organización de documentos para solicitar el desembolso del anticipo del contrato y se radican el 5 de Diciembre plazo establecido por la entidad por la entidad para radicar.
Se realiza desmonte de postes eléctricos en la obra.

El día 04de diciembre se efectúa la socialización y creación de comité de veeduría en la vereda la ondina, estando presente el contratista de obra, interventoría, comunidad y apoyo a la supervisión del Inderhuila

SEMANA (11-16 DICIEMBRE)
El contratista ejecuta actividades de
Excavación manual sin clasificar.en Eje b\ Zapatas c3 y c 4

SEMANA (18-23 DICIEMBRE)

Durante esta semana el Contratista inicia las actividades de obra capitulo CIMENTACION, ESTRUCTURA EN CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRANSPORTE.

Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas M3
Demolición de cuneta existente

SEMANA (25-28 DICIEMBRE)

Durante esta semana el Contratista continua las actividades de obra capitulo CIMENTACION, ESTRUCTURA EN CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRANSPORTE.

Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga M3
Transporte de materiales pétreos M3-KM

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	08/11/2023	50		29-12-2023
Suspensión No. 1	28/11/2023			
Reiniciación No. 1				
TERMINACIÓN Cto.				
TOTAL DIAS		50	0	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	1	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE VEEDURIA 1	1	4 DE DICEMBRE
ACTA DE CONSERTACION Y SOCIALIZACION DE OBRA N 1	1	4 DICIEMBRE
ACTA DE SUSPENSION	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	1. Se Continua con las actividades de revisión de planos y cantidades en obra 2. Se realiza revisión y aprobación de los entregables realizados por el contratista, APU, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3. Se realiza aprobación de la documentación requerida para el desembolso del anticipo de obra. 4. Se realiza acta de socialización del proyecto el día 4 de Diciembre de 2023 y Acta de conformación del comité de veeduría.

b). Actividades Administrativas.

1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra y certifica la revisión de perfiles requeridos para la correcta ejecución de la obra.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
Julio Ricardo Rojas Hernández	Director de Obra
Diego Fernando Cárdenas Ortiz	Residente de Obra
María Claudia Ortegón Prada	Residente SISO
Raul Alfonso Rojas Hernández	Maestro General de obras /Técnico en Estructuras en Concreto
German Alonso Tenorio Navarro	Oficial de obra
Carlos Alberto Fajardo	Oficial de obra
Eduardo José León Barraza	Oficial de obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha. Solo excavaciones manuales.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades preliminares (replanteos, excavaciones, cortes)
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**Planilla relacionada pago de aporte** **Julio Ricardo Rojas Hernández RL** **NRO. DE PLANILLA 9459533753** Pago 4 de Diciembre de 2023 Nro 9461033119 18 de Enero de 2024 Personal Operativo de obra NRO PLANILLAS 9463592027-9461809666-9461804393 19 de enero de 2024

la interventoría certifica que se realiza la verificación de la totalidad de las afiliaciones del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional Y Entrega de dotación.

c). Actividades Operativas.

1. Se realiza control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se ejecutan las siguientes cantidades de obra.

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Localización y replanteo	452.92M2	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Demolición de cuneta</td><td>17,40</td><td>Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)</td></tr>
<tr><td>Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.</td><td>37.5 m3</td><td>Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)</td></tr>
<tr><td>Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga</td><td>12.5 M3</td><td>Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)</td></tr>
<tr><td>Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas C2 Y C3</td><td>490.85 KILOS</td><td>Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)</td></tr>
<tr><td>Desmonte postes de iluminación existentes.</td><td>4 unidades</td><td>Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)</td></tr>
<tr><td>Transporte de material pétreo</td><td>3882.82</td><td>Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)</td></tr>
</table>
2. se verifican los procedimientos de armado de acero y fundición de concreto ciclópeo utilizados por el contratista para la correcta ejecución de las obras.
3. Se verifica en obra que la placa a demoler no es de 0.10 si no de 0.15 por lo que se debe realizar un NP para dicha actividad.
4. Se evidencia en obra la necesidad de realizar acta de modificación de mayores y menores cantidades para la correcta ejecución de la obra por lo que el contratista solicita la suspensión del contrato de obra a partir del 28 de Diciembre de 2023 mientras se realizan cambios y modificaciones contractuales, dicha solicitud se aprueba por interventoría por lo que se suspende con aprobación del Inder en la fecha propuesta.</td></tr>
<tr><td>d). Actividades Logisticos.</td><td>1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra.
2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato</td></tr>
<tr><td>e). Obligaciones de Carácter Ambiental.</td><td>1. Se realiza revisión del plan de manejo ambiental del contratista, y plan de calidad. Y se realiza seguimiento de implementación en obra.</td></tr>
<tr><td>f). Actividades Financieras.</td><td>1. Se realiza revisión y aprobación de la documentación de gestión del Anticipo del contratista radicado al Inder el 5 de Diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td>g). Actividades Jurídicos.</td><td>1. Se realiza seguimiento a polizas y garantías las cuales no han surtido cambios</td></tr>
</table>

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196697	0	28/10/2023	Cumplimiento del contrato	28/10/2023	30/06/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	28/10/2023	30/06/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28/10/2023	29/12/2026
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses Y 0 Dia.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	0	28/10/2023	28/10/2023	29/12/2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	1	14/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	13/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	13/07/2024
				08/11/2023	08/11/2023	13/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses Y 0 Dia.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	1	14/11/2023	08/11/2023	11/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 . ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	2	14/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	13/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	13/07/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	13/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Dia.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	2	14/11/2023	08/11/2023	11/01/2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

La *temporada templada* dura *1,3 meses*, del *28 de agosto* al *7 de octubre*, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 29 °C. El mes más cálido del año en Agrado es *septiembre*, con una temperatura máxima promedio de 29 °C y mínima de *20 °C*. a *temporada fresca* dura *3,1 meses*, del *18 de abril* al *21 de julio*, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de *28 °C*. El mes más frío del año en Agrado es *junio*, con una temperatura mínima promedio de *20 °C* y máxima de *28 °C*. *TEMPORADA DE LLUVIAS EN LA ZONA.*

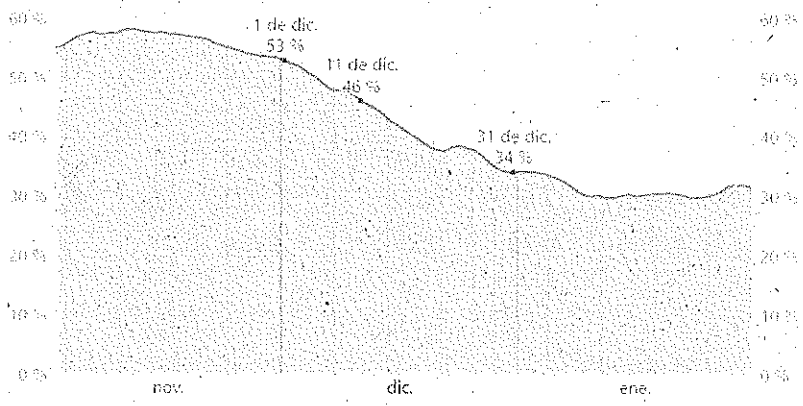

El porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de precipitación, excluidas las cantidades inferiores a 0,01 in, solo nieve, solo lluvia y nieve el mismo día

Temperatura máxima y mínima promedio en Agrado. Tomado de Weather Spark
https://es.weatherspark.com/v/22372/Clima-promedio-en-Agrado-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

10. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
20-12-2023	**AGRADO**	**ACTA DE COMITÉ DE OBRA N 02 (SE ADJUNTA)**

11. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoria)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**7711430**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA7 CONSORCIADO	**PRESTACION DE SERVICIOS**
YILBERTH JULIO GARCIA BERNAL	**19306098**	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CONTRATO POR OBRA O LABOR**

INGRID DELGADO	1.075.277.887	SECRETARIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	Obra o labor
WILFREDO JIMENEZ	12266827	TOPOGRAFO	PRESTACION DE SERVICIO
LUIS ANGEL RAMIREZ ORTIZ	1094967003	CADENERO	PRESTACION DE SERVICIO

12.RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	$190200	$148600	$30100	$0.00	$0.00	7907245981/ 7920151961
YILBERTH JULIO GARCIA BERNAL	N.A	84000	146200	84000	0	1066108138
JOSE WILMER CHILITO	190100	147500	84800	$0.00	$0.00	9460964549
INGRID DELGADO	193800	151500	6400	48500	60700	7916968501
WILFREDO JIMENEZ	$185600	$145000	$6100	$0	$0.00	8628711311-8629691190
LUIS ANGEL RAMIREZ ORTIZ	$111400	$27900	$3700	$27900	$0.00	8628711286

13.RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	0	02-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	01/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	01/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	02-11-2023	01-11-2023	01-02-2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	1 (anulado)	15-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	01/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	01/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	1 (anulado)	15-11-2023	01/11/2023	01/02/2024

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	2	15-11-2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	08/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/02/2024	08/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	2	15-11-2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato		
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		
				Estabilidad y Calidad de Obras		

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

14. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

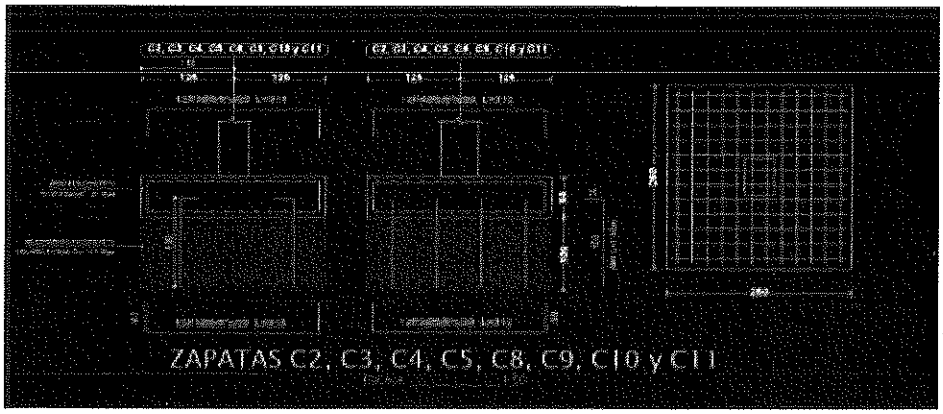

ACERO DE REFUERZO ZAPATAS

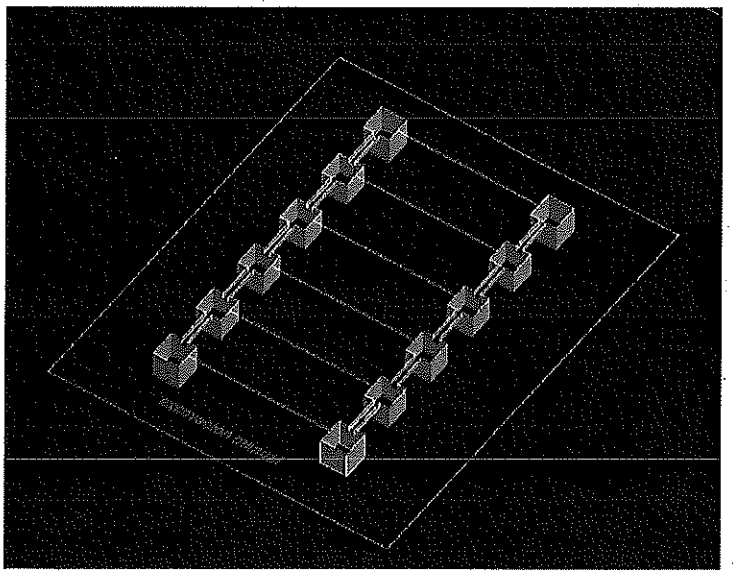

LOCALIZACION DE ZAPATAS PROYECTO

SEGUIIENTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE OBRA											
DIAGRAMA DE AVANCE											
CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCION DE OBRA MENSUAL			ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% DE AVANCE	CANT.	% DE AVANCE	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,1	Localización y replanteo.	m2	525,92	$ 3.550,01	$ 1.867.020	452,92	$ 1.607.869,62	0,384%	552,92	0,468%	
1,2	Demolición cuneta existente.	ML	31,00	$ 7.546,50	$ 233.942	17,40	$ 131.309,17	0,031%	17,40	0,031%	
1,3	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	68,84	$ 10.741,42	$ 739.439	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
1,4	Demolición de placa de concreto e= 0.10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	53,81	$ 26.219,03	$ 1.410.846	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
1,5	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.454,35	$ 232.909	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
1,6	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	305,52	$ 45.896,87	$ 14.022.412	37,50	$ 1.721.132,70	0,411%	37,50	0,411%	
1,7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	129,86	$ 83.656,05	$ 10.863.574	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
Subtotal					$ 29.370.142,45	$ 507,82	$ 3.460.311,49				
								0,000%	0,00	0,000%	
2	CIMENTACION					0,00		0,000%	0,00	0,000%	
2,1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	95,69	$ 33.934,04	$ 3.247.148,29	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
2,2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	82,49	$ 359.173,42	$ 29.628.215,09	12,50	$ 4.489.667,70	1,071%	12,50	1,071%	
2,3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	66,16	$ 617.635,70	$ 40.862.778,18	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
2,4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	kg	4.290,00	$ 7.100,02	$ 30.459.068,64	490,85	$ 3.485.042,85	0,831%	490,85	0,831%	
2,5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	5,89	$ 740.330,42	$ 4.360.546,15	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
2,6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	kg	1.114,00	$ 7.100,02	$ 7.909.417,82	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
Subtotal					$ 116.467.174,16		$ 7.974.710,55				
							$ -	0,000%	0,00	0,000%	
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO					0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
3,1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	16,80	$ 918.705,70	$ 15.434.255,83	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
3,2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.465,00	$ 7.100,02	$ 31.701.571,44	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
3,3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	17,00	$ 1.002.558,82	$ 17.043.499,87	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
3,4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.970,00	$ 7.100,02	$ 13.987.031,52	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
3,5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.254,37	$ 2.325.092,30	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
Subtotal					$ 80.491.450,95						
							$ -	0,000%	0,00	0,000%	
4	CUBIERTA					0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	
4,1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	570,30	$ 211.070,78	$ 120.373.663,55	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%	

Subtotal					**$ 120.373.663,55**	$ -	$ -			
							$ -	0,000%	0,00	0,000%
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**						$ -	0,000%	0,00	0,000%
5,1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.763,62	$ 4.691.581,89	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
5,2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.702.217,57	$ 7.404.435,14	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	52,21	$ 84.539,50	$ 4.413.807,50	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
5,4	Cuenta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	61,40	$ 83.658,90	$ 5.136.656,71	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
Subtotal					**$ 21.646.481,24**	$ -	$ -			
							$ -	0,000%	0,00	0,000%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						$ -	0,000%	0,00	0,000%
6,1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	51,20	$ 79.960,38	$ 4.093.971,66	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
6,2	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	17,00	$ 106.843,91	$ 1.816.346,50	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
6,3	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	20,00	$ 218.547,78	$ 4.370.955,68	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
6,4	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.182,18	$ 698.364,35	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
Subtotal					**$ 10.979.638,20**	$ -	$ -	0,000%	0,00	0,000%
							$ -	0,000%	0,00	0,000%
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,1	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4,00	$ 292.676,22	$ 1.170.704,86	4,00	$ 1.170.704,86	0,279%	4,00	0,279%
7,2	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.429,69	$ 1.912.289,06	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,3	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	4,70	$ 45.896,87	$ 215.715,30	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,4	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha, e=0,40 mts	ML	29,40	$ 49.227,92	$ 1.447.300,85	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,5	Transición aérea-subterránea tubería EMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.801,29	$ 607.602,58	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,6	Transición aérea-subterránea tubería EMC 1"	UND	2,00	$ 281.625,40	$ 563.250,80	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,7	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.482,62	$ 1.014.482,62	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,8	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.690.376,43	$ 4.690.376,43	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%


7,10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 368.118,41	$ 4.417.420,90	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 58.018,69	$ 3.481.121,28	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.440,88	$ 12.197.290,56	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.766,93	$ 972.766,93	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.980,93	$ 1.032.980,93	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
Subtotal					**$ 35.136.604,21**		**$ 1.170.704,86**			
							$ -	0,000%	0,00	0,000%
8	**TRANSPORTE**					0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
8,1	Transporte de materiales petreos	M3-KM	4346,56	$ 1.097,66	$ 4.771.027,66	3882,82	$ 4.262.000,67	1,017%	3882,82	1,017%
Subtotal					**$ 4.771.027,66**		**$ 4.262.000,67**		**$ 3.882,82**	0,000%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 419.236.182,43**		**$ 16.970.360,03**	**4,023%**		**4,10000%**
	AVANCE DE OBRA						**4,10000%**			

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING.**FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA
CONSORCIO WF

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

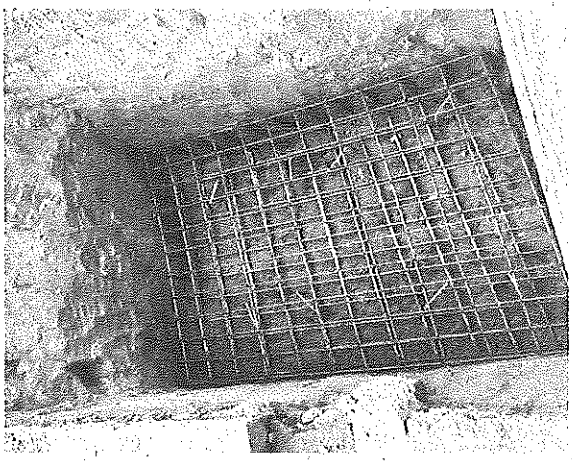

INSTALACION DE ACERO PARA ZAPATAS 1



DESMANTELAMIENTO DE POSTES 1



Socializacion y creacion de veeduria 1

17. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1. El 4 de Diciembre se realiza la conformación del comité de veeduría con personal del área de influencia y al socilializacion del contrato.
2. El 20 de diciembre de 2023, durante la reunión del comité de obra, se identificó la necesidad de realizar un acta de mayores y menores cantidades debido a las discrepancias encontradas en el área de trabajo. Entre las principales diferencias observadas se incluyen:

- Cambio de espesor: La placa de demolición, contractualmente especificada con un espesor de 10 cm, ha sido encontrada con un espesor de 15 cm en el campo.
- Mayores cantidades: Se han detectado incrementos en las cantidades para localización y replanteo, así como la necesidad de crear nuevos ítems, entre otros ajustes.

3. De acuerdo a lo revisado en planos se sugiere a la entidad realizar ajustes en los diseños estructurales.

4. En el mes de Diciembre se presentan precipitaciones constantes lo que impide la ejecución de las obras.

Dado lo anterior, se ha decidido suspender temporalmente la ejecución de la obra con el fin de generar los cambios contractuales necesarios de acuerdo con las nuevas condiciones encontradas.

	13 de febrero 2024	
ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(DD/MM/AA)	ING.NATALIA BUSTOS BOTERO
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8658020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7907245981	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			27		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	440940648

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 185.600	$ 4.600	$ 190.200
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 4.600	$ 190.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP														
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPEND		$ 3.227.300				NO								01-30										230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 338.800

Planilla Física
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7920151961	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			71		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	527574577
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			7907245961	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/02/06

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 1.800	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 1.800	$ 0	$ 30.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2023/12/08	2024/01/29	NEQUI	51	$422,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA (1 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																								
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
1	CC	76320749	CHILITO JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(1																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2023/12/08	2024/01/29	NEQUI	51	$422,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODICO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$4,500	$0	$190,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$4,500	$0	$190,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 80,800	$4,000	$0	$84,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$ 80,800	$4,000	$0	$84,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
TOTAL				1	$411,400	$5,000	$0	$422,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7916968501	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			49				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			480405999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 185.600	$ 5.200	$ 193.800
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 5.200	$ 193.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500
SUBTOTALES:			$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 34.800	$ 1.600	$ 36.400
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 23.200	$ 1.100	$ 24.300
SUBTOTALES:			$ 58.000	$ 2.700	$ 60.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075277687	DELGADO RANGEL INGRID YOHANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	$ 7711430	$ 6.100	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 460.900

PAGOSIMPLE |

Fecha creación reporte: 2024-01-26, 03:00:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1066108138

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

Fecha limite de pago: 2024-01-24

PAGADA 26/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901767496	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8608020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7701233	CHARRY MORENO JOSE ALEXANDER	01	00		X														0	28	28	28	28	COLPENSIONES	$ 2.100.000	$ 336.000	NUEVA EPS S.A.	$ 2.100.000	$ 84.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.100.000	$ 148.200	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 19306098	GARCIA BERNAL YILBERT JULIO	01	04		X														0	0	28	28	28	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	COMPENSAR EPS	$ 2.100.000	$ 84.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.100.000	$ 148.200	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.200
CC 1003952873	MEDINA POLANIA LAURA DANIELA	01	00	X	X														0	20	20	20	20	PROTECCION	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 773.334	$ 4.100	COMFAMILIAR HUILA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.873.334	$ 4.973.334	$ 4.973.334	$ 4.973.334	$ 459.800	$ 0	$ 0	$ 199.000	$ 296.500	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.154.300	$ 700	$ 1.155.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8628711286
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8628120225
Fecha Pago Planilla: 2024-01-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	WSOLUCIONES TOPOGRAFICAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901401002	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 1 9 53	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4312	CORREO ELECTRÓNICO	LYLTRAMITESYSERVICIOS@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	31232913
FAX	0	SUCURSAL	2023	NOMBRE SUCURSAL	2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12266827	PRIMER APELLIDO	JIMENEZ	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	WILFREDO	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$3.325.334		8628711286

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1083880125	01	No	No	No	41	551	1131202	Fijo	GUZMAN MOSQUERA CAROLINA	$1.160.000
CC-1125411453	01	No	No	No	41	551	1131201	Fijo	LOPEZ CORDOBA ARLEY ALEXANDER	$1.160.000
CC-1075296430	01	No	No	No	41	551	1131201	Integral	LOPEZ MORALES CLAUDIA MILENA	$1.160.000
CC-1094967003	01	No	No	No	41	551	1131201	Fijo	RAMIREZ ORTIZ LUIS ANGEL	$1.160.000
CC-1079388427	01	No	No	No	41	551	5711001	Fijo	SALAZAR BETANCOURT YILBER JESUS	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1083880125			X	2023-12-18																									0		
CC - 1125411453			X	2023-12-18																									0		
CC - 1075296430																													0		
CC - 1094967003			X	2023-12-18																									0		
CC - 1079388427	X	2023-12-20																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1083880125	PORVENIR	18	$696.000	0.1600000	$111.400	$0	$0	$111.400	$0	$0	$0
CC - 1125411453	PORVENIR	18	$696.000	0.1600000	$111.400	$0	$0	$111.400	$0	$0	$0
CC - 1075296430	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1094967003	PORVENIR	18	$696.000	0.1600000	$111.400	$0	$0	$111.400	$0	$0	$0
CC - 1079388427	PORVENIR	11	$425.334	0.1600000	$68.100	$0	$0	$68.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1083880125	SANITAS	18	$696.000	0.0400000	$27.900	$0	0	$0	0	$0	18	$696.000	1	0.0052200	$3.700
CC - 1125411453	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$696.000	0.0400000	$27.900	$0	0	$0	0	$0	18	$696.000	1	0.0052200	$3.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075296430	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
CC - 1094967003	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$696.000	0.0400000	$27.900	$0	0	$0	0	$0	18	$696.000	1	0.0052200	$3.700
CC - 1079388427	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$425.334	0.0400000	$17.100	$0	0	$0	0	$0	11	$425.334	2	0.0696000	$29.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1083880125	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$696.000	0.0400000	$27.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1125411453	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$696.000	0.0400000	$27.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075296430	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094967003	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$696.000	0.0400000	$27.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079388427	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$425.334	0.0400000	$17.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$587.900	$0	$0	$0	$0	13	$6.900	$0	$0	$594.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$119.300	$0	0	$0	0	$0	$119.300	13	$1.400	$0	$120.700	$0	0	$0	$0	$120.700	$0	$0	$120.700
SANITAS	1	$27.900	$0	0	$0	0	$0	$27.900	13	$400	$0	$28.300	$0	0	$0	$0	$28.300	$0	$0	$28.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$46.900	0	$0	$0	$46.900	13	$600	$47.500	0	$0	$0	$47.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$133.300	13	$1.600	$134.900
SENA	0	$0	13	$0	$0
ICBF	0	$0	13	$0	$0
ESAP	0	$0	13	$0	$0
MinEdu	0	$0	13	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$149.000
PENSIONES	1	$594.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$47.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$134.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$926.200

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	WILFREDO JIMENEZ
IDENTIFICACION:	CC-12266827
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-09
FECHA DE PAGO:	2024-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	8628711311
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655093476
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 145.000	$ 146.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 185.600	$ 186.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 336.700	$ 339.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILFREDO JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-12266827
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-01-09
FECHA DE PAGO:	2024-03-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-12
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	8629691190
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629691190
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 74.700	$ 79.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 74.700	$ 79.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 74.700	$ 79.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/02/2024

EL INTERVENTOR

H A C E C O N S T A R:

El Interventor, certifica que el informe presentado por el ejecutor del contrato No. CLPIH376 DE 2023, *cuyo objeto es* **la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA**, *cumple con los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el* ***CONTRATISTA DE OBRA,*** *en donde fue revisada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría revisó y verifico las planillas de seguridad social del contratista de obra del personal relacionado en el informe del periodo comprendido del 1 de Diciembre de 2023 al 28 de Diciembre de 2023 , así mismo se revisó y avalo los siguientes documentos :*

- *Seguimiento a Plan de gerencia bimensual , plan de calidad e Informe HSEQ*

Para constancia se firma a los trece 13 días del mes de Febrero de 2024.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Interventoría

FECHA : 4 / 12 / 2023	MUNICIPIO:	Agrado	SITIO/UBICACIÓN:	Vereda Alto Buenavista	
HORA : 3:00 Pm	Nº DEL ACTA	1		Nº PAG.	

OBJETIVO :	CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA N° **CLPIH376** DE 2023 CUYO OBJETO ES: **"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N° **CIHCM410** DE 2023 CUYO OBJETO ES: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN LA VEREDA LA ONDINA, VEREDA SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

ORDEN DEL DÍA:

ITEMS	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludo y control de asistencia	INDERHUILA
2	Presentación de las empresas contratistas del Proyecto	Supervisor Inderhuila
3	Socialización de las condiciones técnicas del Proyecto.	Supervisor Inderhuila
4	Socialización de fecha de Inicio de obra y el manejo de la mano de Obra no calificada	Contratista de Obra e Interventoria
5	Conformación de Veeduría Ciudadana	Supervisor, contratista de Obra e Interventoría
6	Compromisos por parte del Municipio con la Obra	Supervisor Inderhuila – Representante del Municipio
7	Varios	

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	TELEFONO	DIRRECCION	FIRMA
	Juan Carlos Cham	7706793	Productor	3157006949	Fca la Quinta	
	HERMINSO SANCHEZ	8325255		3117755574		HERMINSO SANCHEZ
	Alberto Sanchez	83259655	agricultor	3249361053	Campo bello	Alberto Sanchez
	Eugenio Sandez H.	12224977	Agricultor	—	alto Buenavista	
	Germán Alejandro M.	1003767644	Agricultor	3127899044	alto Buenavista	Alejandro M
	Otoniel Sanchez	83251993	Agricultor	3222730929	alto buenavista	Otoniel Sanchez
	Salvador Sanchez	8327282	Agricultor	3125323293	alto Buenavista	
	Celso Villanueva	12798334	agricultor	3139662124	alto buena vista	Celso Villanueva
	Marlon Yamena Carvajal	1055824676	Agricultura	3162922755	Alto Buenavista	
	Jairo Alonso Trujillo	79441886	Contratista	3016631564	Alto Buena Vista	
	Ricardo Rojas Hdez	79356666	Arquitecto	3017558184	Alto Bna Vista	
	Oscar Yesid Castaño	4.888.032	Socializador	3123954281	Toma Cuatro	

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A

Observaciones:

Apoyo a la Supervisión INDERHUILA:

Nombre: Natalia Bibiana Bahos

Firma:

Se anexa registro fotográfico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE AGRADO

ACTA No. 01

Siendo las 3:00 Pm del día 04 de Diciembre de 2023, se reunieron los representantes de la comunidad del **LA VEREDA ALTO BUENAVISTA** del municipio de **AGRADO - HUILA**, , con el fin de conformar el comité de veeduría ciudadana del contrato de obra N° **CLPIH376** de 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA"** y del contrato de Interventoría N° **CIHCM410** de 2023 cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN LA VEREDA LA ONDINA, VEREDA SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

A decisión unánime se postularon los siguientes miembros de la comunidad, quedando conformado por los siguientes integrantes; estableciendo el comide de veeduría ciudadana de la Vereda Alto Buenavista, Zona Rural del municipio del Agrado, Huila.

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
Alberto S.	Sanchez Cruz	83258655	3156561985	
[illegible]		1271985363	3138062125	

Después, de haber verificado a cada uno de los firmantes y la aceptación de este comité de veeduría ciudadana se deja constancia y se adjunta la firma de las personas que verifica la veracidad del hecho.

FIRMA: _____
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
C.C:
Contrato No. **CLPIH376** de 2023.

FIRMA: _____
CONSORCIO WF
R.L **FAIVER EDUARDO PERDMO POLANIA**
C.C:
Contrato No. **CIHCM410** de 2023.

Nombre Proyecto	*"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA"*			**Acta No.**	02
No. De Contrato obra	CLPIH 376-2023	**Lugar:**	VIRTUAL		
No. De Contrato Interventoría	CIHCM 410-2023				
Fecha	20/12/2023	**Hora Inicio**	2:00 PM	**Hora Final**	2:30 PM

OBJETO DE LA REUNION
Socialización de avance

AGENDA	
1	1. Avance de obra. 2. Compromisos.

DESARROLLO

Se reunieron de forma virtual por medio de Google meet, siendo las 2:00pm, el personal técnico de interventoría CONSORCIO WF (Director Ing. Faiver Eduardo Perdomo, Residente Yilber Garcia), el personal técnico de obra (Director Arq. Julio Ricardo Rojas y residente Ing. Diego Cardenas) y el apoyo a la supervisión Ing. Natalia Bustos Botero del inderhuila, con la finalidad de socializar los siguientes temas los siguientes temas:

1. El contratista de obra manifiesta al apoyo a la supervisión que al realizar la excavación de zapata en cierto eje, fue necesario de corte y demolición de la placa existente, la cual dio como resultado que la placa no es de e:0.10 como la establecida en el contrato si no que es de e:0.15 por lo cual se requiere la creación de un item no previsto para la ejecución de las actividades, por otro lado se manifiesta algunos ajuste en diseño.

2. La interventoría frente a ello confirma que la placa existente la cual se debe demoler para continuar con las excavaciones de zapata y vigas de cimentación tiene un espesor de 15 cm, por lo tanto no se continuará con las excavaciones toda vez no se haga un balance de mayores y menores cantidades, aun así en las dos áreas donde se inició con la demolición se continuo trabajando en ciclópeo y otras actividades con el fin de no dejar excavaciones abierta.

3. El apoyo a la supervisión manifiesta que las observaciones a los diseños estructurales se remitan de manera formal para realizar traslado de observaciones al profesional respectivo.

4. Los contratistas concluyen la revisión de las cantidades se evidencia la necesidad de realizar un balance general de mayores y menores cantidades de obra de acuerdo a las condiciones encontradas en terreno, así mismo manifiestan que durante los días de diciembre se han presentado fuertes lluvias en la vereda Alto Buenavista lo que no ayuda en ejecución de obra, motivo por el cual considera tener en cuenta una posible suspensión del contrato.

DESARROLLO

Compromisos:

1. Entrega de informe mes No.2
2. Revisión de avance de proyecto
3. Analizar posible Suspensión de Obra

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	CONSORCIO WF – DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
YILBER GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
NATALIA BUSTOS BOTERO	APOYO SUPERVISION - INDERHUILA	
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	CONTRATISTA	
DIEGO CARDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

- Descargue de material petreo triturado de la planta de Blasco y carro de acero para continuar con los parrillos para los zapatas del eje del otro lado
- Se suspende el contrato por lluvias y combra en diagonal.

Residente obra. Director. Residente WF

10 de julio de 2024
Tiempo: Soleado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cárdenas: Residente de Obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
Personal Operativo: Tecnico en Estructuras (2)
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (2)
Actividades
- Se reinicia el contrato de obra
- Se realiza el proceso de fundicion de concreto conforme a las especificaciones tecnicas establecidas, garantizando el cumplimiento de los parámetros requeridos en terminos de preparación, mezcla, colocación y compactacion del material

Residente obra. Dir. obra. Residente WF

11 de Julio de 2024
Tiempo: Soleado.
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra.
Maria Claudia ortegon - Residente SISO.
Personal Operativo: Tecnico en Estructuras (2)

Personal operativo: Maestro de obra (1)
Oficial de obra (3)
Ayudante de Obra (1).

Actividades.
- Se realiza revision del perfil estratigrafico de los ejes frente a la malla y unos concreto ciclopeo a los demás ejes.

Residente obra Dir. obra. RESIDENTE WF

27 de diciembre de 2024
Tiempo: Nublado.
Personal: Juan Ricardo Reios. - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Personal operativo: Maestro de obra (1)
Oficial de obra (3)
Ayudante de Obra (1).

Actividades.
- Se realiza el retiro de escombros del área de trabajo.

Residente obra Dir. obra. RESIDENTE WF

28 de diciembre de 2023.
- Tiempo: Nuboso
- Personal de Obra: Juan Ricardo Reios - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas. Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon: Residente SISO
Personal operativo: Maestro de Obra (1)
Oficial de Obra (3)
Ayudante de obra (1).

Actividades:

22 de diciembre de 2023.
Tiempo: nublado.
Personal: Juan Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
personal operativo: Maestro de obra (1)
Oficial de Obra (3)
ayudante de Obra (1)
Actividades:
- Se realizo la perfilacion de ejes frente a la malla y se continua con el concreto ciclopeo.

Residente obra. Director de obra. Residente UT

23 de diciembre de 2023.
DIA No laborado.

Residente obra.

24 de diciembre de 2023.
DIA FESTIVO DOMINGO.

Residente obra.

25 de diciembre de 2023.
DIA FESTIVO Lunes.

Residente obra.

26 de diciembre de 2023.
Tiempo: nublado
personal: Juan Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortega - Residente SISO.

Scanned with CamScanner

Actividades
- Se realiza remoción de material de los excavaciones hasta el momento.

Residente obra Dir. obra. Residente WF

20 de diciembre de 2023.
Tiempo: Soleado (am) - Lluvioso (pm)
Personal: Jairo Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Personal operativo - Maestro de obra (1).
Oficial de Obra (3)
Ayudante de Obra (1).

Actividades.
- Se realiza comite de obra #2 se analiza solicitud de suspencion por lluvias y cambio de diseños.
- Se realiza la perfilacion de ejes frente a la malla y se continua con el concreto ciclopeo para zapatas.

Residente obra Dir. obra. Residente WF

21 de diciembre de 2023
Tiempo: Lluvioso.
Personal: Jairo Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
Personal operativo - Maestro de obra (1)
Oficial de obra (3)
Ayudante de obra (1).

Actividades
- Se realiza la perfilacion de ejes frente a la malla y se continua con el concreto ciclopeo.

Residente obra Dir. obra. Residente WF

Scanned with CamScanner

16 de diciembre de 2023.
Tiempo: Soleado - Lluvioso.
Tipo de labor ejecutada.
Residente obra.

17 de diciembre de 2023.
Día festivo domingo.
Residente obra.

18 de diciembre de 2023
Tiempo: soleado (am) lluvioso (pm)
Personal: David Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente SISO.
Nora Claudia Ortegon - Residente SISO.
Personal operativo - Maestro de obra (1)
Oficial de obra (3).
Ayudante de obra (1).
Actividades:
- Con la armadura de los zapatas, lotas, se realiza el vaciado del concreto ciclopeo según especificaciones en los planos.

Residente obra. Dir. obra. Residente SST

19 de diciembre de 2023
Tiempo: soleado (am) lluvioso (pm)
Personal: David Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Nora Claudia Ortegon - Residente SISO.
Personal operativo: Maestro de obra (1)
Oficial de Obra (3)
Ayudante de obra (1).

Scanned with CamScanner

de lluvia no se puede seguir con los excavaciones.

Residente obra

Dir. obra.

Residente SST

14 de diciembre de 2023

Tiempo: Soleado (am) Lluvioso (pm)

Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
Personal Contractual: Maestro de obra (1)
Oficial de obra (3).
Ayudante de Obra (1)

Actividades

- Se realiza figuado de acero para los parrillas de los zapatos ya excavados.

Residente obra

Dir. obra.

Residente SST

15 de diciembre de 2023

Tiempo: Soleado (am) Lluvioso (pm).

Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Personal de Obra: Maestro de obra (1)
Oficial de obra (3)
Ayudante de obra (1)

Actividades:

Se comienza con el armado de los parillas para los zapatos ya excavados

Residente obra

Residente SST

Scanned with CamScanner

frente al colegio.
- Corte de acero para los conados.
- Se continua con la demolicion de cuneta.

Residente obra. Dir. obra. Residente WF

12 de diciembre de 2023.
Tiempo: Nublado.
Personal: John Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Personal operativo: Maestro de obra (1)
oficial de obra (3)
ayudante de Obra (1)

Actividades.
Se continua con las excavaciones manuales de los ejes frente al colegio, con el corte de acero para los conados de los zapatas y con la demolicion de la cuneta

Residente obra. Dir. obra. Residente WF

13 de diciembre de 2023.
Tiempo: Lluvioso.
Personal: John Ricardo Rojas. - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas O. - Residente de obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Personal operativo: Maestro de obra (1)
oficial de obra (3)
ayudante de Obra (1).

Actividades.
- Se procede a armar la viga de amarre para el figurado del acero. Ya que por motivos

Scanned with CamScanner

08 de diciembre de 2023

Tiempo Soleado:

Personal: Juan Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Maria Claudia Ortega - Residente SISO
Personal operativo - Maestro general de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudante de obra (1)

Actividades:
- Se inicia con el corte y figurado de acero para armado de cimentación para los ejes 1/A

Residente obra

Director obra

Residente SIF

09 de diciembre de 2023

Tipo de trabajo:

Residente obra

Residente SIF

10 de diciembre de 2023

Tipo festivo domingo.

Residente obra

11 de diciembre de 2023

Tiempo: Soleado

Personal: Juan Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Maria Claudia Ortega - Residente SISO
Personal operativo - Maestro general de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudante de obra (1)

Actividades
- Se continua con las excavaciones manuales de los ejes

06 de diciembre de 2023.
Tiempo : Soleado.
Personal: Julio Ricardo Rojas: Director de Obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Maria Claudia Ortegón - Residente SISO.
Personal Operativo: Maestro Gral Obras (1)
Oficial de Obra (3)
Ayudante de obra (1)

Actividades:
- Se llevo a cabo la recepción de materiales conforme al cronograma establecido, verificando que los insumos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

Residente obra | Director. | Residente

07 de diciembre de 2023.
Tiempo : Soleado.
Personal : Julio Ricardo Rojas - Director de obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegón - Residente SISO.
Personal operativo: Maestro Gral Obras (1)
Oficial de obra (3)
Ayudante de obra (1)

Actividades:
- Se recepciona el material de acero de la obra para comenzar el figurado para el armado de cimentas de zapatas, según planos.

Residente obra. | Residente SST

Dir. obra.

Scanned with CamScanner

04 de diciembre de 2023
Tiempo Nublado
Personal: Laura Ricardo Rojas - Directora de Obra
Diego Fernando Cárdenas - Residente de Obra
Kr Claudia Ortegon - Residente SISO
Personal operativo: operarios (3)
ayudantes (2)
Hasta los Guantes (1)

Actividades:
- Se hace desmonte de gastos de Plantación
- Se continua con la demolición de la cuneta
- Se continua con la excavación manual
- Se lleva acabo recolección de la obra y se realiza la vecindad por los señores Alberto Sánchez y Celia Villanueva.

Residente Obra, Director, Residente SISO

05 de diciembre de 2023
Tiempo Soleado
Personal: Laura Ricardo Rojas - Directora de Obra
Diego Fco Cardenas - Residente de Obra
Kr Claudia Ortegon - Residente SISO
Personal operativo - Hasta los Guantes (1)
operarios (3)
ayudantes (2)

Actividades:
- Se sigue con la excavación manual

Residente Obra, Director, Residente SISO

Scanned with CamScanner

30 de noviembre de 2023.
Tiempo: Soleado.
Personal: Julio Ricardo Reyes - Director de Obra.
Duvier Aurivi - Oficial de obra.
Actividad:
- Excavacion y replantes.

Director.

01 de diciembre de 2023.
Tiempo: soleado.
Personal: Julio Ricardo Reyes - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Karen Claudia Ortega - Residente SISO
Personal operativo: Operarios (3).
Ayudante (1)
Maestro de obras (1).
Actividades:
- Se realiza demolicion de cimientos.
- Se comienza excavacion de los zapatas eje frente colegio.

Residente obra. Dir. obra.

02 de diciembre de 2023
tiempo: Soleado.
DIA NO LABORADO.

Residente obra.

03 de diciembre de 2023.
DIA festivo domingo.
Cel. Residente obra.

Scanned with CamScanner

26 de noviembre de 2023.
Tiempo: Soleado.
Tio festivo domingo.

Residente WF

Dir. obra.

27 de noviembre de 2023.
Tiempo: Soleado.
personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Aaron - Auxiliar - apoyo de obra.
Acuerdos:
- Se termina la contratación de personal autorizado para inicio de labores el 27/11/2023.

Residente WF

Dir. obra.

28 de noviembre de 2023
Tiempo: Soleado.
personal: Julio Ricardo Rojas. Director de Obra.
Aaron Auxiliar - apoyo de obra
Acuerdos:
- Se instala la valla informativa de obra en sitio.
- Se inicia la ejecución de actividades preliminares como localización y replanteo.

Residente WF

Dir. obra.

29 de noviembre de 2023
Tiempo: Soleado.
personal: Julio Ricardo Rojas. Director de obra
Acuerdos: Se continua con la localización y replanteo

Residente WF

Dir. obra.

Scanned with CamScanner

Neiva, Diciembre 05 de 2023.

V.ALTBUE. WF41023-004

Señores
INDERHUILA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NEIVA - HUILA

REFERENCIA 1: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM410-2023 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

REFERENCIA 2: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. CLPIH 376 DE 2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS POR LA INTERVENTORIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir los documentos verificados por parte de la INTERVENTORIA, para el desembolso de anticipo del Contrato de Obra Pública No. CLPIH 376 DE 2023.

1. DOC FINANCIEROS - CONFORMACIÓN DE FIDUCIARIA
2. CUENTA DE COBRO O FACTURA
3. COPIA CERTIFICACIÓN BANCARIA
4. CERTIFICADO PARAFISCALES DEL CONTRATISTA
5. FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS – FURC
6. VALIDACIÓN APUS DE LOS ITEMS DEL CONTRATO

7. VERIFICACIÓN DE PERSONAL TECNICO - FORMATO TÉCNICO DIH-CFLD-F12
8. SOPORTE DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL RELACIONADO EN FORMATO TÉCNICO DIH-CFLD-F12
9. CERTIFICADO DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDD SOCIAL INTEGRAL DEL PERSONAL RELACIONADO EN FORMATO TÉCNICO DIH-CFLD-F12
10. ANEXAR RUT
11. FLUJO DE INVERSION DE ANTICIPO - PM-GID-F13
12. FOTO VALLA PUBLICITARIA
13. DISCRIMINACIÓN DEL AIU

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus requerimientos.

Atentamente,

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
R.L. CONSORCIO WF
Interventor

Neiva, diciembre 18 de 2023.

V.ALTBUE. WF41023-006

Señores
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909
Representante Legal y Director de Obra

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH376 de 2023, que tiene por Objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: *SOLICITUD INFORMES MENSUALES*

Cordial saludo,

En virtud del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de referencia, comedidamente me permito solicitar se allegue a la interventoría, los informes mensuales tal como se describe en las **obligaciones de información** estipuladas contractualmente y resumidas líneas abajo.

De igual manera de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en virtud de solicitud de información realizada de días atrás en oficio con **ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO**, comedidamente me permito reiterar la necesidad de que se envié a la Interventoría lo requerido.

Que es imperativo que luego de identificar problemáticas en el sitio de ejecución de la obra, se notifique a la interventoría, por escrito, y con los soportes requeridos, para que nosotros podamos hacer la evaluación y cuantificación de las respectivas solicitudes y adicional a ello, poder elevarlas ante la entidad contratista INDERHUILA.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

1. Absolver las observaciones y requerimientos realizados por el supervisor delegado por el Inderhuila, las que realicen los órganos de control y las autoridades locales.

2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoria, el avance de cada uno de los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

3. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría que contenga un resumen de actividades y desarrollo de la obra junto con la documentación técnica, como la bitácora de obra, planos récord de obra aprobados por la interventoria, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, Póliza de Estabilidad de la Obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y Salvo, por todo concepto, de los proveedores.

4. Llevar una bitácora de obra, en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Este registro debe encontrarse debidamente foliado y firmado por el director de obra, el residente y el director de la interventoria; al cual tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Inderhuila.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.

6. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato realizados por el Interventor, el Inderhuila, los órganos de control o la comunidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.

7. Presentar para aprobación por parte del Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y previo a la suscripción del Acta de Inicio, los documentos relacionados con el AIU, Fiducia para la correcta inversión y manejo del Anticipo, Plan de Inversión del Anticipo y Cronograma de Trabajo, adicional a los documentos solicitados en la lista de chequeo para la solicitud del pago del anticipo.

8. Asumir el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

De esta manera, quedamos atentos al trámite de lo contenido en este oficio.

Sin otro particular;

ING. FAIVER E. PERDOMO P.
Representante Legal
Interventoría

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 507 Edificio Diego de Ospina
Teléfono: 608 8668020
Correo Electrónico: consorciowf23@gmail.com
Neiva - Huila
