
Informe Buena

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM410 DE** de 2023_

INFORME DE INTERVENTORIA No. __4__

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

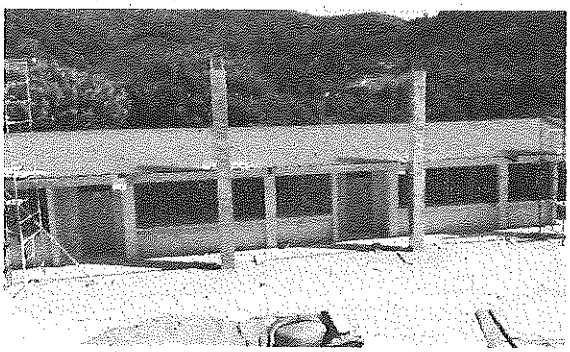

MUNICIPIO: Agrado- Vereda Buena vista

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM410 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	NATALIA BUSTOS BOTERO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM410**____ DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 1 de Agosto al 31 de Agosto
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.767.496-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	1 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
OTROSI No. 1 28/12/2023	MODIFICACIÓN CLAUSULA SEPTIMA – CAMBIO FUENTE DE FINANCIACIÓN
ACTA DE SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	16 DE MAYO DE 2023
OTROSI No. 2 16/05/2024	Modificación a la Cláusula Cuarta, Plazo del contrato –Vigencia fiscal-
OTROSI No. 3 24/06/2024	Modificación a la Cláusula Cuarta, plazo del contrato - Prórroga de UN (1) MES-.
OTROSI No. 4 23/07/2024	Modificación a la Cláusula Cuarta, Plazo del contrato - Prórroga de UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS.
OTROSI No. 5 28/08/2024	Modificación a la Cláusula Cuarta, Plazo del contrato - Prórroga de UN (1) MES.
PLAZO TOTAL:	SIETE (6) MESES Y 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL, 2024
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS ($129.699.011) M/CTE.


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH376 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA **ALTO BUENAVISTA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	**JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ**	**CONTRATISTA**	**JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ**	**REPRESENTANTE LEGAL:**	**JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ**

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	3 MESES
ACTA DE SUSPENSION	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO	10 DE JULIO 2024
PLAZO ADICIONAL 22 DE JULIO DE 2024	1 MES Y 15 DIAS
PLAZO TOTAL:	4 Y 15 DIAS MESES
VALOR INICIAL:	$ 524.045.228,04
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Alto Buenavista de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila

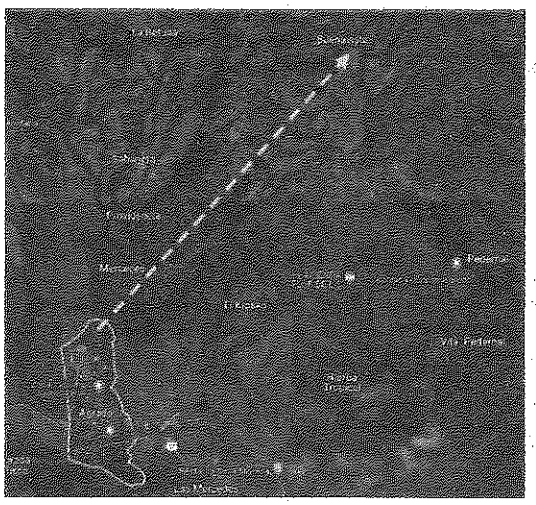

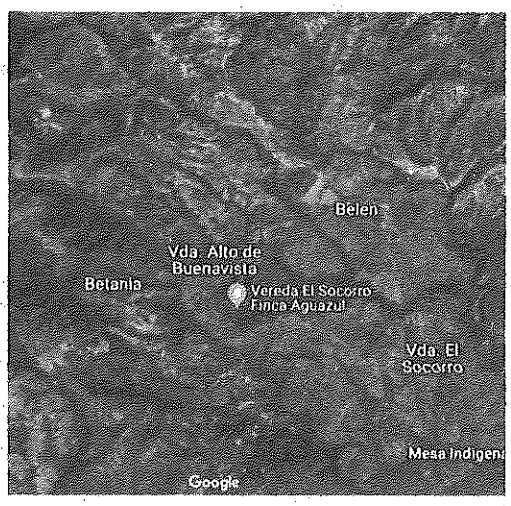

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Alto Buenavista de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema autoportante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, placa contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	118,92	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza relleno de Zapatas, vigas y placas en los ejes A Y B

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	22,40	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza solado de Limpieza en los Ejes A y B vigas c1 a c12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	64,54	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza solado de Limpieza en los Ejes A y B vigas C1 a C12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	42,37	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza solado de Zapatas de C1 A C12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	11,20	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza viga de cimentación eje A viga C1 a C6 eje B viga C7 a C12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	18,30	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza construcción de 12 columnas Eje A Y B

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	3230,75	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

De acuerdo a los planos de las especificaciones se realiza la instalación de acero de refuerzo Para columnas.

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	31,00	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

De acuerdo a el diseño se ejecuta la construcción de cuneta contigua al eje B

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,15 cm.	97	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza ampliación de Placa en el Eje A y columa C1 a C7 y C6 a C 12, Igualmente En el área de zapatas.

Actividades	Cantidad Total	Municipio

	Ejecutada	
Corte de placa en concreto para dilataciones; incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	80,00	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza dilatación de la placa de piso en concreto

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción de viga canal en concreto	16,83	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza la construcción de la viga canal en los ejes A Y B de acuerdo a las dimensiones Contempladas en el diseño.

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga canal	2035,35	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

De acuerdo a diseño se realiza la instalación de acero de Refuerzo en la viga Canal

ctividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Mortero impermeabilizado en Viga canal	33,44	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza instalación de mortero en Viga canal

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	08/11/2023			
Suspensión No. 1	28-12-2023	50		
Reiniciación No. 1	10-07-2024		195	4-10-2024
TERMINACIÓN Cto.	4-10-2024	50		
TOTAL DIAS		100	195	

7. **ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
OTRO SI MODIFICATORIO	3	24/06/2024
ACTA ACLARATORIA OTRO SI No.3	-	25/06/2024
ACTA JUSTIFICACION PARA PRORROGA	4	23/07/2024
OTRO SI MODIFICATORIO	4	24/07/2024
ACTA JUSTIFICACION PARA PRORROGA	5	28/08/2024
OTRO SI MODIFICATORIO	5	28/08/2024
ACTA JUSTIFICACION PARA PRORROGA Y ADICION	6	03/10/2024
OTRO SI MODIFICATORIO	6	04/10/2024
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA	1	10/10/2024
OTRO SI MODIFICATORIO	3	24/06/2024
ACTA ACLARATORIA OTRO SI No.3	-	25/06/2024
ACTA JUSTIFICACION PARA PRORROGA	4	23/07/2024
OTRO SI MODIFICATORIO	4	24/07/2024

8. **ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO**

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	1. Se verifican los trabajos y condiciones técnicas durante el periodo del presente informe 2. Se realiza comité de obra N 4 para socialización de las obras a ejecutarse en la vía de ingreso a la vereda Buenavista, donde se plantea la necesidad de realizar una suspensión de la obra por el termino de 30 días. Debido a la construcción de placa huella el cual impide el ingreso de la cubierta autoportante. 3. Se realiza revisión de Pago de seguridad social del mes de Agosto 2024 del personal de obra 4. Se ha realizado cumplimiento en las polizas del contrato de acuerdo a las modificaciones generadas. 5. Se inspeccionaron las actividades ejecutadas y se encuentran en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

b). **Actividades Administrativas.**	1 Revisión de documentación del personal que ingresa al contrato. 2. se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal.

c). **Actividades Operativas.**

Se realiza la verificación y aprobación de las siguientes cantidades de obra.

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	118,92	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza relleno de Zapatas, vigas y placas en los ejes A Y B

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	22,40	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza solado de Limpieza en los Ejes A y B vigas c1 a c12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	64,54	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza solado de Limpieza en los Ejes A y B vigas C1 a C12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	42,37	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza solado de Zapatas de C1 A C12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	11,20	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza viga de cimentación eje A viga C1 a C6 eje B viga C7 a C12

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	18,30	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza construcción de 12 columnas Eje A Y B

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	3230,75	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

De acuerdo a los planos de las especificaciones se realiza la instalación de acero de refuerzo para columnas.

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	31,00	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

De acuerdo a el diseño se ejecuta la construcción de cuneta contigua al eje B

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,15 cm.	97	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza ampliación de Placa en el Eje A y columa C1 a C7 y C6 a C 12, Igualmente En el área de zapatas.

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Corte de placa en concreto para dilataciones, incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	80,00	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza dilatación de la placa de piso en concreto

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Construcción de viga canal en concreto	16,83	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza la construcción de la viga canal en los ejes A Y B de acuerdo a las dimensiones Contempladas en el diseño.

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga canal	2035,35	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

De acuerdo a diseño se realiza la Instalación de acero de Refuerzo en la viga Canal

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Mortero impermeabilizado en Viga canal	33,44	Agrado-Huila (Vereda Alto de Buenavista)

Se realiza instalación de mortero en Viga canal

Se verifico que las actividades realizadas cumplen con las especificaciones técnicas y lo descrito en el contrato de obra.

d). **Actividades Logísticos.**

1. Se verifica el personal del contratista de obra, tiempo de dedicación y se solicita al contratista los pagos de seguridad social o afiliaciones del personal

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
Julio Ricardo Rojas Hernández	Director de Obra
Diego Fernando Cárdenas Ortiz	Residente de Obra
María Claudia Ortegón Prada	Residente SISO
Raúl Alfonso Rojas Hernández	Maestro General de obras /Técnico en Estructuras en Concreto
German Alonso Tenorio Navarro	Oficial de obra
Carlos Alberto Fajardo	Oficial de obra
Eduardo José León Barraza	Oficial de obra
Anturi Ancizar	Oficial de obra

Juan Carlos Romero Torres	Oficial de obra
José Zoilo Cáceres Ibargüen	Ayudante de obra
Rodolfo Cáceres Ibargüen	Ayudante de obra
Uriel Antonio Cáceres Ibargüen	Ayudante de obra
Elkin Darío Caro Estrada	Ayudante de obra
Giovanny Caro Estrada	Ayudante de obra
Paula Andrea Derazo Arango	Ayudante de obra
Álvaro León Barraza	Ayudante de obra
William Palacios Caicedo	Ayudante de obra
Marlon Stiven Torres Arroyo	Ayudante de obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se realiza seguimiento de materiales, ficha técnica de Cemento, Acero, licencia de canteras. Se realiza toma de cilindros de concretos para Vigas, zapatas ejes A Y B
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**Planilla relacionada:** 9471895027 05-09-2024 **Planilla relacionada:** 9471604426 22-08-2024

2. Se realiza seguimiento de Programa de gerencia de proyectos por parte del contratista se entregan los informes correspondientes.

3. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad.

4. Se verificó en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional.

5. Se realizó comité de obra N. 04 el día 21 de Agosto de 2024, Mediante el cual se expone actividades logísticas y administrativas realizadas. Y los inconvenientes presentados en la ejecución.

6. Se efectúan mediciones de obra y se aprueban las cantidades descritas

	7. Se realiza control de calidad de los materiales y revisión de fichas técnicas.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. se realiza la entrega por parte del contratista de las licencias ambientales de los materiales pétreos.
f). **Actividades Financieras.**	Se inician actividades de proyección de acta parcial de obra.

g). **Actividades Jurídicos.**

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISION (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	0	28/10/2023	Cumplimiento del contrato	28/10/2023	30/06/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	28/10/2023	30/06/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laboralés	28/10/2023	29/12/2026
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses Y 0 Dia	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	0	28/10/2023	28/10/2023	29/12/2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISION (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	1	14/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	13/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	13/07/2024
				08/11/2023	08/11/2023	13/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses Y 0 Dia.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	1	14/11/2023	08/11/2023	11/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	2	14/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	13/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	13/07/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	13/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Dia.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	2	14/11/2023	08/11/2023	11/01/2024

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-40-101196607	3	03/01/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	31/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	31/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	28/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses Y 0 Día	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	3	03/01/2024	03/01/2024	28/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 . ACTA DE REINICIO No. 1.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	4	15/07/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	31/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	31/07/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	31/07/2024
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	4	15/07/2024	08/11/2023	11/01/2029


POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	5	26/07/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	19/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	19/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	19/08/2024
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	5	15/07/2024	08/11/2023	19-08-2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

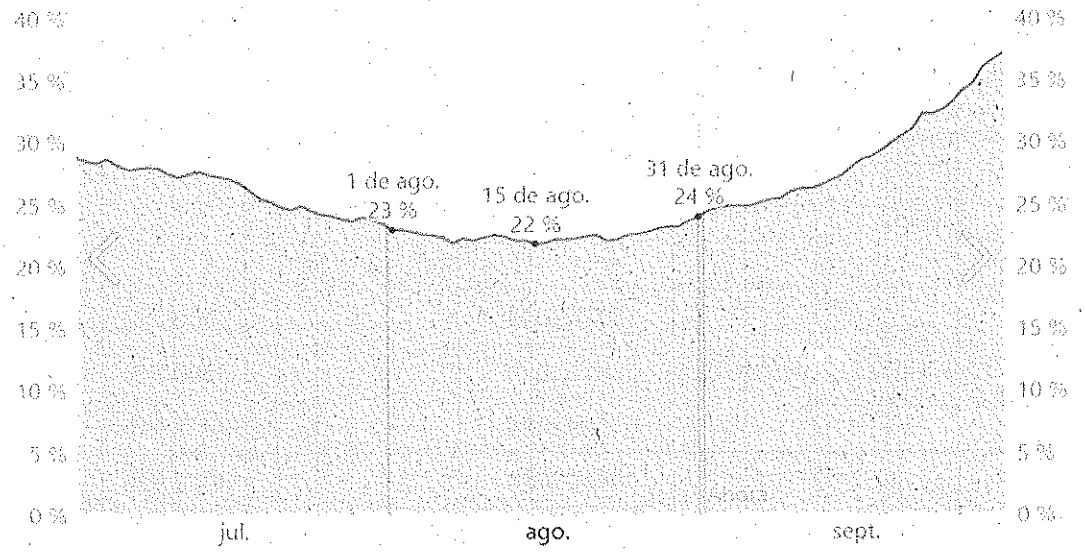

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3000 PSI	1; 3,3: 1,1
Diseños de mezcla para base.	***N.A***	
Compresión simple al concreto.	***N.A***	
Ensayo de compactación de campo	***N.A***	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

TOMA DE PRUEBAS DE CILINDROS DE CONCRETO EN OBRA REALIZADO POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATA CONCRETO DE 3000 PSI	06/08/2024	13/08/2024	X			3000 PSI	2127 PSI	
		20/08/2024		X		3000 PSI	2875 PSI	
		03/08/2024			X	3000 PSI	3226 PSI	CUMPLE
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI	12/08/2024	19/08/2024	X			3000 PSI	2190 PSI	
		26/08/2024		X		3000 PSI	2766 PSI	
		09/09/2024			X	3000 PSI	3204 PSI	CUMPLE
COLUMNA CONCRETO DE 3000 PSI	20/08/2024	27/08/2024	X			3000 PSI	2223 PSI	
		3/09/2024		X		3000 PSI	2777 PSI	
		17/09/2024			X	3000 PSI	3230 PSI	CUMPLE

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	**30-07-2024**	$131.011.307.01	----------	$ $131.011.307.01
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 524.040.534.87	$	$ 524.040.534.87		$524.040.534.87

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
23 de Agosto de 2024	NEIVA	REVISION DE AVANCE DE OBRA, VERIFICACION DE CONDICIONES PARA SUSPENSION DE OBRA MOTIVO INICIO DE PLACA HUELLA QUE IMPIDE EL INGRESO DE CUBIERTA

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (__10/__07/___2024_) al (_30_/_07_/__2024__)			FISICO
Informe HSEQ (periodo del (_10_/_07_/___2024_) al (31__/_07_/__2024__)	INFORME CONTRATISTA MES DE AGOSTO		FISICO
Actas de comités (periodo del (__/__/____) al (__/__/____)	ACTA DE COMITÉ N 4		FISICA
Acta de mayores y menores cantidades de obra.			

14.
15.

16. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
VICTOR JADIR PEREZ MENDEZ	1075253474	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACION DE SERVICIOS
YILBERTH JULIO GARCIA BERNAL	19306098	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

INGRID DELGADO	1075277887	SECRETARIA	POR OBRA O LABOR
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR

17. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA

18. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA
VICTOR JADIR PEREZ	$304000	$237500	$46300	$11400	$0	72911764
YILBERTH JULIO GARCIA BERNAL	$360.000	$90.000	$156.600	$90.000	$	1066142617
INGRID DELGADO	$208000	$52000	$6800	$52000	$	7942763780
FAIVER EDUARDO POLANIA	$562900	$439.800	$85.700	$	$	7942763675
JOSE WILMER CHILITO	$208.000	$162.000	$	$	$	9471846817

19. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	0	02-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversiòn del anticipo	01/11/2023	01/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	01/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	02-11-2023	01-11-2023	01-02-2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	1 (anulado)	15-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	01/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	01/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	1 (anulado)	15-11-2023	01/11/2023	01/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	2	15-11-2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	08/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/02/2024	08/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	2	15-11-2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza actualizada (OTROSI MODIFICATORIO N°1)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	3	17-05-2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	3	15-11-2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza actualizada (REINICIO)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	4	18-05-2024	Cumplimiento del contrato	16/05/2024	31/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/05/2024	30/06/2027

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	4	18-05-2024	08/11/2023	30/06/2024

Póliza actualizada (OTROSI N°2)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	5	18-05-2024	Cumplimiento del contrato	16/05/2024	31/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/05/2024	30/06/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	30/06/2024	30/06/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	5	18-05-2024	08/11/2023	30/06/2024

Póliza actualizada (OTROSI N°3)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	6	03-07-2024	Cumplimiento del contrato	27/06/2024	31/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/06/2024	31/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	30/07/2024	30/07/2029
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	7	25-07-2024	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/07/2024	13/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	13/09/2024	13/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	7	25-07-2024	08/11/2023	13/09/2024

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


(Describir el contenido del plano)

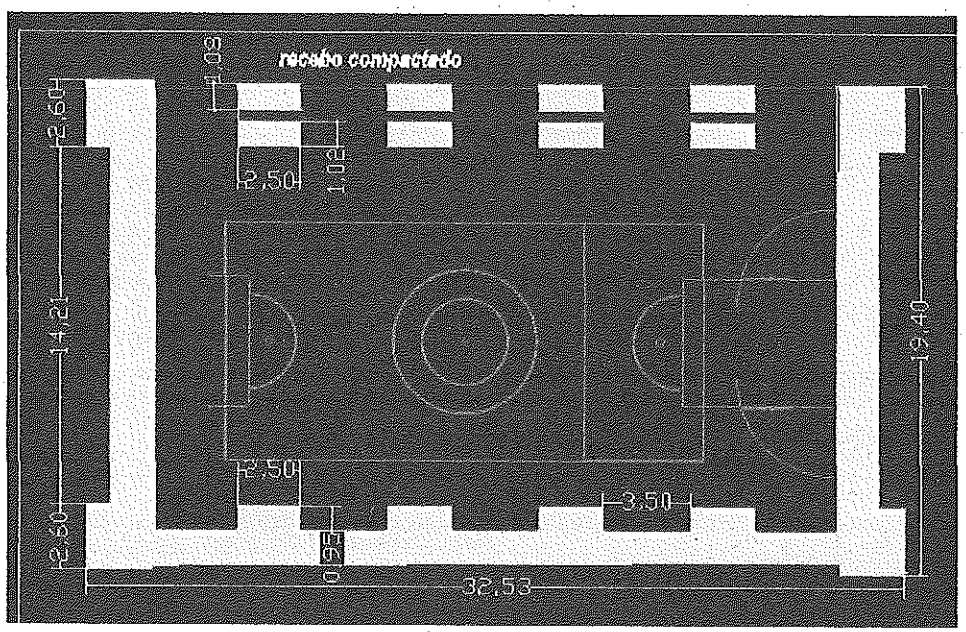


RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL

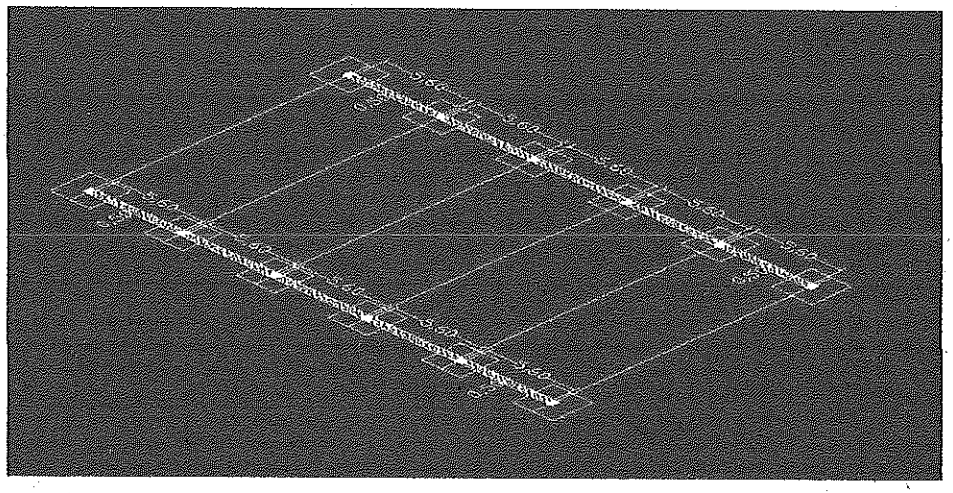


ACTIVIDAD SOLADO DE LIMPIEZA

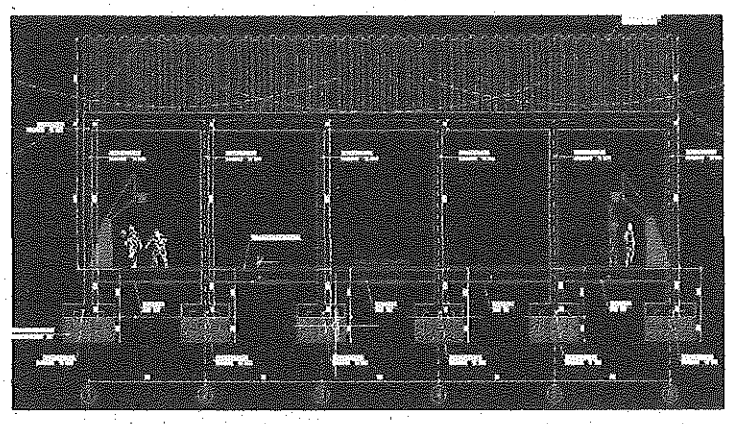


ACTIVIDAD CONCRETO CICLOPEO

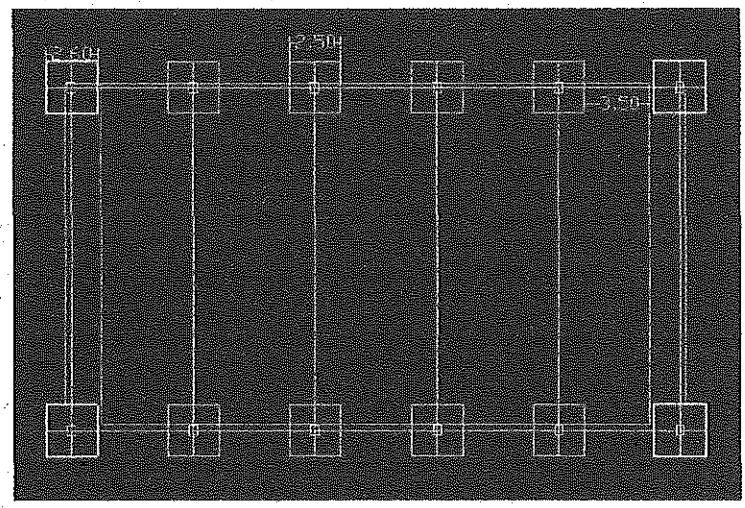


CONSTRUCCION DE ZAPATAS

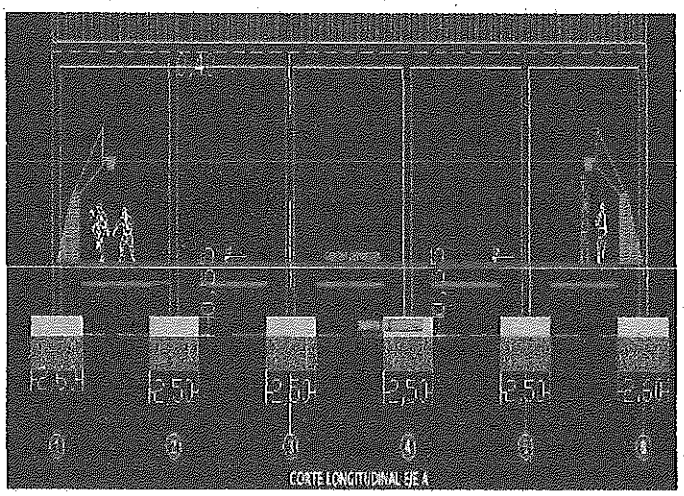


ACTIVIDAD ZAPATAS EN CONCRETO

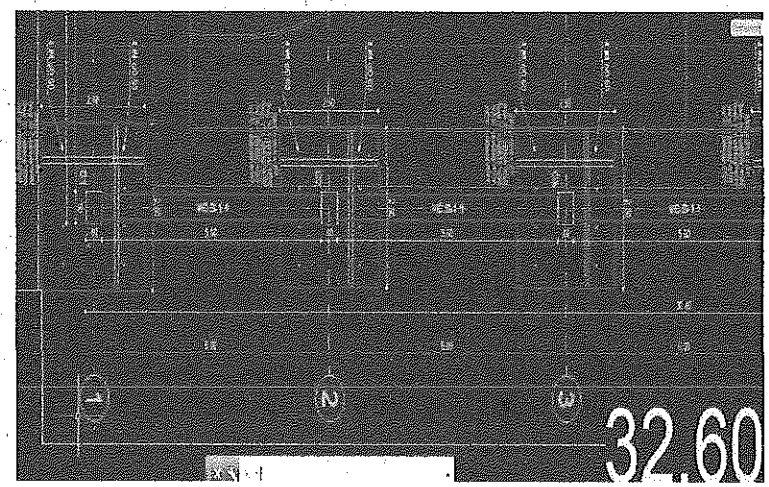


ACTIVIDAD VIGAS DE CIMENTACION

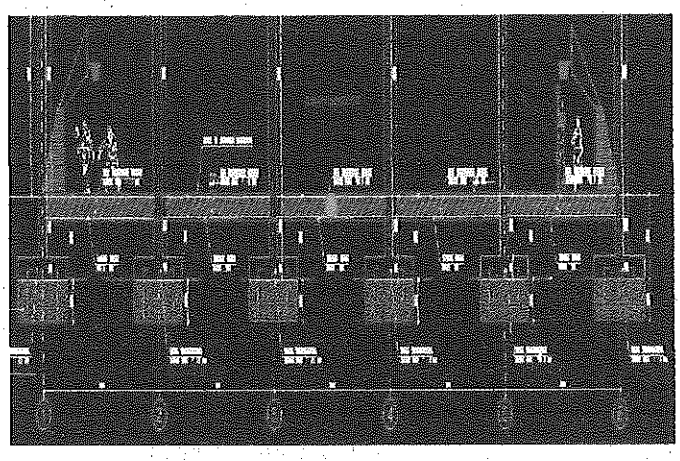


VIGA DE CIMENTACION

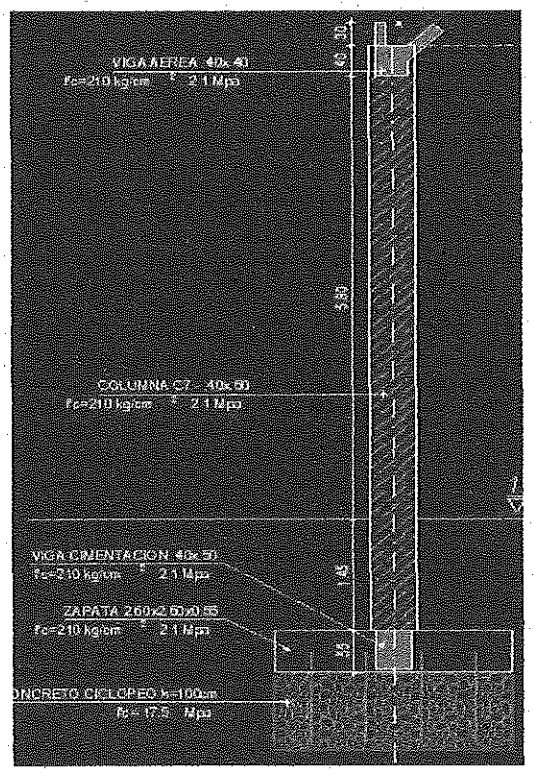


ACTIVIDAD COLUMNAS EN CONCRETO

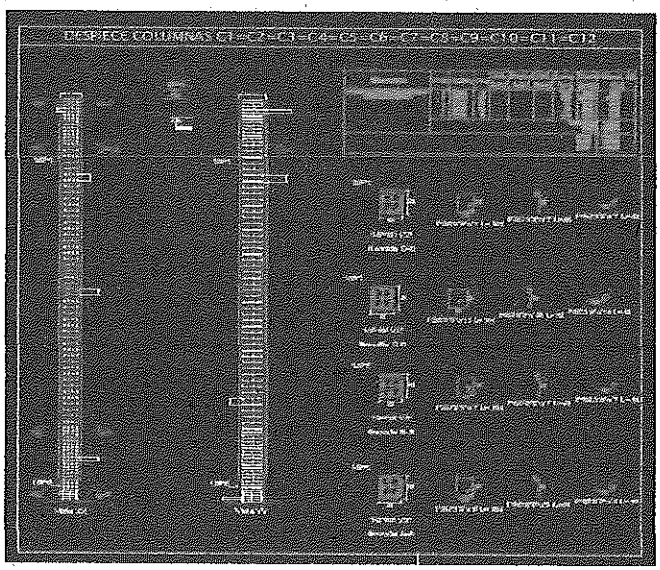


DESPIECE HIERRO COLUMNAS

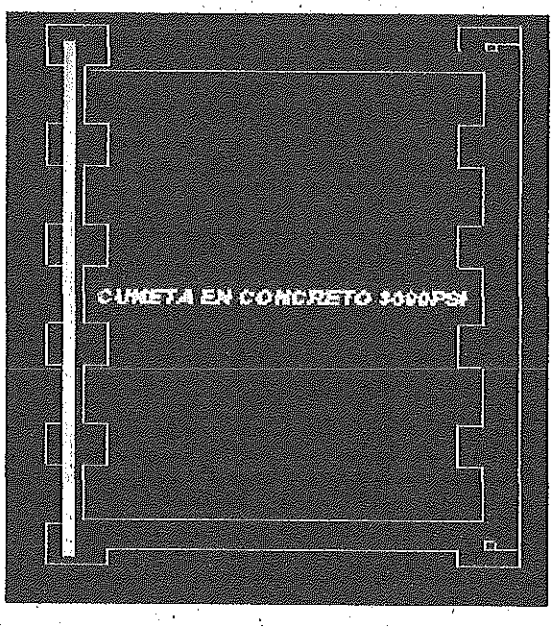

CUNETAS EN CONCRETO

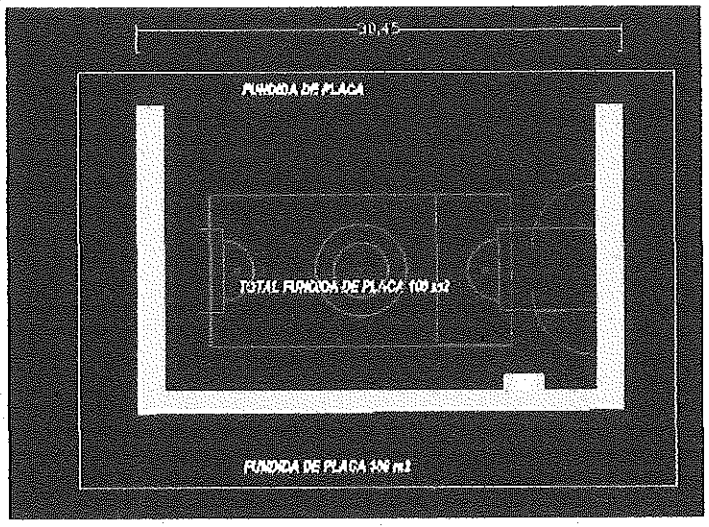

PLACA EN CONCRETO ESPESOR 15 cm

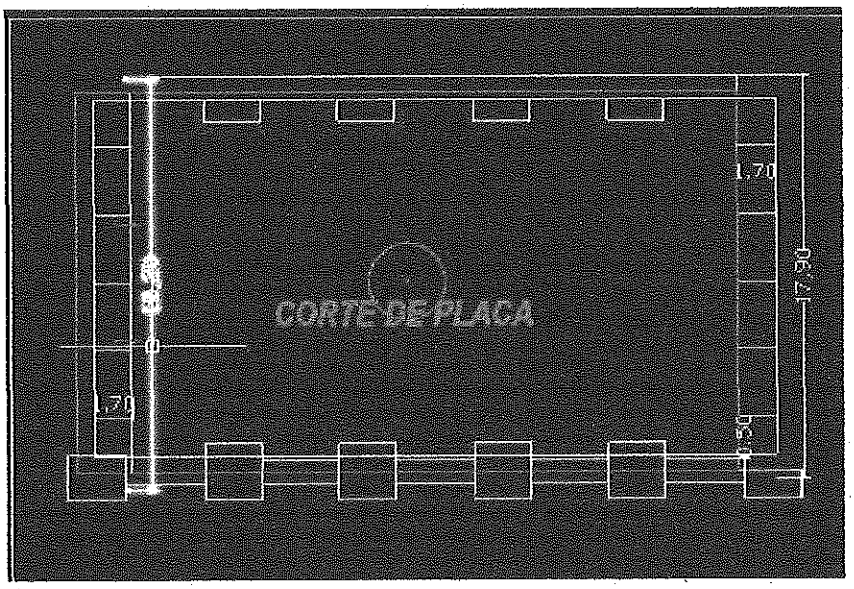

CORTE PLACA EN CONCRETO PARA DILATACIONES

1. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

DIAGRAMA DE AVANCE

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	% EJECUCIÓN
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES									
1,1	Localización y replanteo.	M2	632,44	$ 3.550,01	$ 2.245.167	0,00	$ -	0,00%	632,44	0,53554%
1,2	Demolición cuneta existente.	ML	17,40	$ 7.546,50	$ 131.309	0,00	$ -	0,00%	17,40	0,03132%
1,3	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	0,00	$ 10.741,42	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
1,4	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	0,00	$ 26.219,03	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
1,5	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	0,00	$ 116.454,35	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
1,6	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	275,49	$ 45.896,87	$ 12.644.129	0,00	$ -	0,00%	275,49	3,01602%
1,7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	118,92	$ 83.656,05	$ 9.948.377	118,92	$ 9.948.377,23	2,37300%	118,92	2,37300%
NP 1,8	Corte de placa de concreto e=0,15 mts	ML	135,70	$ 15.428,00	$ 2.093.580	0,00	$ -	0,00%	135,70	0,49938%
NP 1,9	Demolición de placa de concreto e= 0,15 mts. Incluye retiro de material sobrante	M2	51,68	$ 31.551,00	$ 1.630.556	0,00	$ -	0,00%	51,68	0,38894%
Subtotal					**$ 28.693.118,00**		**$ 9.948.377,23**			

2	**CIMENTACION**									
2,1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	22,40	$ 33.934,04	$ 760.122,50	22,40	$ 760.122,50	0,18131%	22,40	0,18131%
2,2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	77,04	$ 359.173,42	$ 27.670.719,97	64,54	$ 23.181.052,27	5,52940%	77,04	6,60033%
2,3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	42,37	$ 617.635,70	$ 26.169.224,78	42,37	$ 26.169.224,78	6,24218%	42,37	6,24218%
2,4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	kg	3.055,23	$ 7.100,02	$ 21.692.181,88	0,00	$ -	0%	3055,23	4,83%
2,5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	11,20	$ 740.330,42	$ 8.291.700,66	11,20	$ 8.291.700,66	1,97783%	11,20	1,97783%
2,6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.370,95	$ 7.100,02	$ 9.733.766,94	0,00	$ -	0%	1370,95	22,49771%
Subtotal					**$ 94.317.716,72**		**$ 58.402.100,20**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3,1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	18,30	$ 918.705,70	$ 16.812.314,38	18,30	$ 16.812.314,38	4,01026%	18,30	4,01026%
3,2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.230,75	$ 7.100,02	$ 22.938.376,69	3230,75	$ 22.938.376,69	5,47152%	3230,75	5,47152%
3,3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	16,83	$ 1.002.558,82	$ 16.873.064,87	16,83	$16.873.064,87	4,02475%	16,83	4,02475%
3,4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2.035,35	$ 7.100,02	$ 14.451.017,57	2035,35	$14.451.017,57	3,44702%	2035,35	3,44702%
3,5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	0,00	$ 40.254,37	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
NP 3,6	Mortero impermeabilizado en viga canal	M2	33,44	$ 54.107,00	$ 1.809.338,08	33,44	$1.809.338,08 -	0,43158%	33,44	0,43158%

Subtotal					**$ 72.884.111,59**		**$ 39.750.691,08**			
4	**CUBIERTA**									
4,1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	570,30	$ 211.070,78	$ 120.373.663,55	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
Subtotal					**$120.373.663.55**		**$ -**			
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**									
5,1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.763,62	$ 4.691.581,89	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
5,2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0,00	$ 3.702.217,57	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	0,00	$ 84.539,50	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
5,4	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	31,00	$ 83.658,90	$ 2.593.426,02	31,00	$ 2.593.426,02	0,61861%	31,00	0,61861%
NP 5,5	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,15 cm	M2	128,96	$ 126.537,00	$ 16.318.211,52	97	$ 12.274.089,00	2,92775%	128,96	2,92775%
NP 5,6	Cerramiento en malla eslabonada cal 10	ML	4,00	$ 314.590,00	$ 1.258.360,00		$ -		4	0,0000%
NP 5,7	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón,	UN	2.00	$ 1.519.757,00	$ 3.039.514,00		$ -		0,00	0,00%

	Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos,									
NP 5,8	Corte de placa en concreto para dilataciones, incluye suministro e instalación de sellante para junta de	ML	113,40	$ 28.141,00	$ 3.191.189,40	80,00	$ 2.251.280,00	0,53700%	80,00	0,53700%
NP 5,9	Suministro e instalación de rejilla plástica trafico peatonal para cárcamo.	ML	31,00	$ 288.946,00	$ 8.957.326,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
NP 5,10	Esgrafiado en graniplast	M2	230,00	$ 31.368,00	$ 7.214.640,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
NP 5,11	Pintura vinilo tipo 1, (tres manos)	M2	125,28	$ 23.600,00	$ 2.956.608,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
Subtotal					**$ 50.220.856,84**		**$ 17.498.406,02**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6,1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	55,20	$ 79.960,38	$ 4.413.813,20	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
6,2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	ML	17,00	$ 106.843,91	$ 1.816.346,50	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
6,3	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	0,00	$ 218.547,78	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
6,4	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0,10 mts según diseño	UND	2,00	$ 349.182,18	$ 698.364,35	0,00	$ -	0,00%	0,00	0,00%
Subtotal					**$ 6.928.524,05**		**$ -**			
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									

7,1	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.	UND	4,00	$ 292.676,22	$ 1.170.704,86	4,00	$ -	0,00%	4,00	0,28%
7,2	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.429,69	$ 1.912.289,06	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,3	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	4,70	$ 45.896,87	$ 215.715,30	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,4	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29,40	$ 49.227,92	$ 1.447.300,85	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.801,29	$ 607.602,58	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,6	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.625,40	$ 563.250,80	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,7	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.482,62	$ 1.014.482,62	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,8	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.690.376,43	$ 4.690.376,43	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,9	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.331,32	$ 1.413.301,12	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 368.118,41	$ 4.417.420,90	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%



7,11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 58.018,69	$ 3.481.121,28	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.440,88	$ 12.197.290,56	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.766,93	$ 972.766,93	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
7,14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.980,93	$ 1.032.980,93	0,00	$ -	0,000%	0,00	0,000%
Subtotal					**$35.136.604,21**		$ -			
8	**TRANSPORTE**									
8,1	Transporte de materiales pétreos	M3-KM	9727,85	$ 1.097,66	$ 10.677.832,92	0,00	$ -	0,000%	9727,85	2,54700%
	SUBTOTAL CAPITULO				**$ 10.677.832,92**		$ -			
	Total Costo Directo				**$419.232.427,89**		**$ 125.599.574,53**			
	% DE AVANCE DE OBRA MENSUAL							**37,77222%**		
	% DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO							**53,636661710348500**		






NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO WF

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

21. REGISTRO FOTOGRAFICO

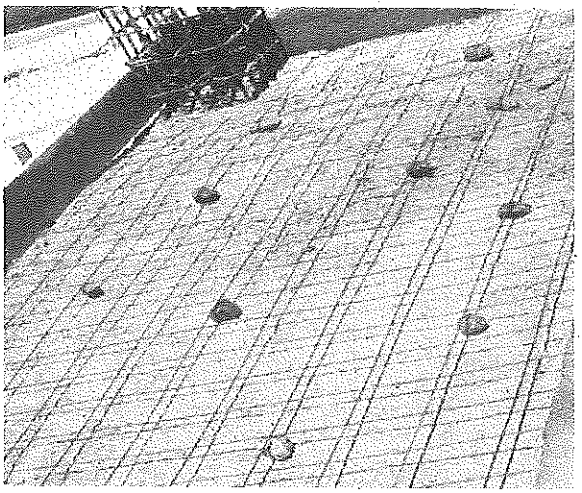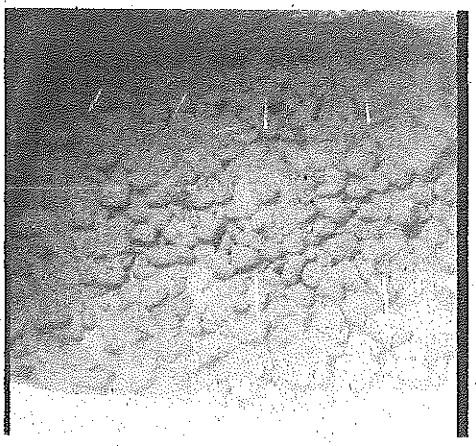ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE AGRADO	
	
RELLENO DE RECEBO	RELLENO DE RECEBO
	
SOLADO BAJO VIGA	CONCRETO CICLOPEO

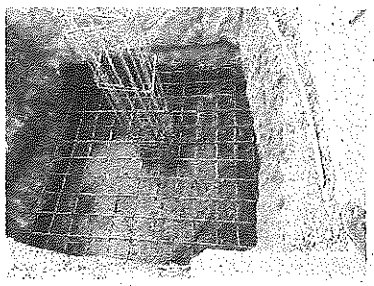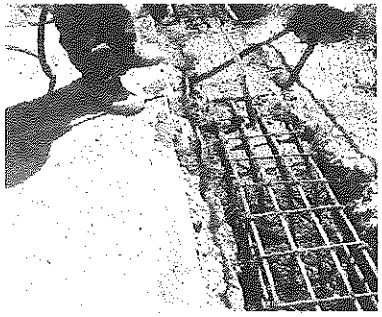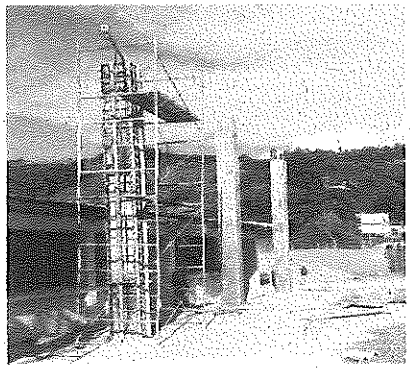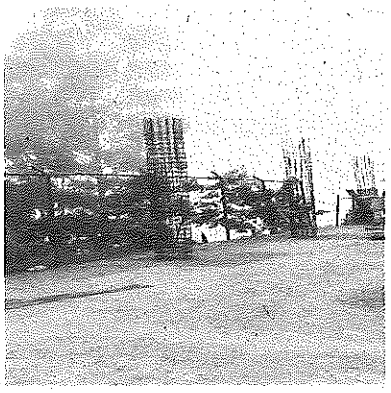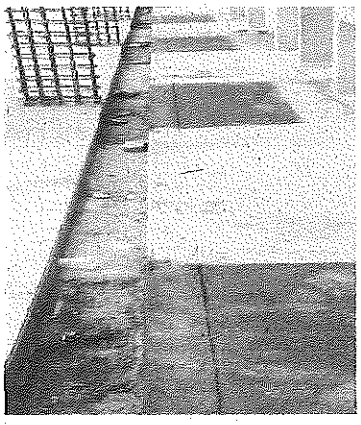	
ACERO Y CONCRETO DE ZAPATAS	CONCRETO Y ACERO DE VIGA DE CIMENTACION
	
CONCRETO Y ACERO DE VIGA DE CIMENTACION	CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN CONCRETO
	
CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO	PLACA DE PISO EN CONCRETO

22. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Una vez aprobada el acta de Mayores y menores cantidades de obra, el contratista inicia actividades de ejecución sin contratiempo teniendo un avance significativo en la ejecución de la obra.
- Se adelantan actividades en campo con material que se encuentra en sitio, debido a la construcción de placa huella en la vereda se debe suspender el desarrollo de la obra ya que no es posible el ingreso de personal y de material.
- Se procede adelantar documentos para cobro de acta parcial de obra.

23. ANEXOS

1. Pago de seguridad social
2. Bitacora de Obra
3. Ensayos de laboratorio

ING. VICTOR JADIR PEREZ MENDEZ	(DD/MM/AA) **23-09-2024**	ING.NATALIA BUSTOS BOTERO
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA"***		**Acta No.**	04
No. De Contrato obra		CLPIH 376-2023	**Lugar:**	VIRTUAL	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 410-2023			
Fecha	23/08/2024	**Hora Inicio**	2:00 PM	**Hora Final**	2:30 PM

OBJETO DE LA REUNION

Verificación de cantidades de balance de obra, solicitud de suspensión de obra.

AGENDA

1. Avance de obra.
2. Solicitud de suspensión de obra.
3. Compromisos.

DESARROLLO

Se reunieron de forma virtual por medio de Google meet, siendo las 2:00pm, delegados y/o representantes de la interventoría CONSORCIO WF. y representantes del contratista de obra JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ para socializar los siguientes temas:

1. Se ilustra avance de obra y se relacionan actividades de ejecución.
2. Por parte del contratista se solicita la suspensión de obra debido a la Placa huella que se construirá por parte del Municipio del Agrado en la vereda Buenavista lo que impide el acceso d ellos materiales.
   Por lo que se solicita al contratista realizar el tramite pertinente para aprobación de la suspensión de Obra de 30 dias.

Compromisos:

1. Realizar entrega de los oficios de solicitud de suspensión.

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
VICTOR JADIR PEREZ MENDEZ	CONSORCIO WF - INTERVENTORIA	
YILBERT JULIO GARCIA BERNAL	CONSORCIO WF - INTERVENTORIA	
NATALIA BUSTOS BOTERO	APOYO SUPERVISION - INDERHUILA	
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	CONTRATISTA	

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-30, 04:08:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	VICTOR JADIR PEREZ MENDEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1075253474
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72911764
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	878255443
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 599.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 304.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 237.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 46.300	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 11.400	$ 0
		SubTotales:		$ 599.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 599.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 CF 507	TELÉFONO:	8686020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7942763675			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			23				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			5395348125

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 0	$ 562.900	$ 9.800	$ 572.700
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 9.800	$ 572.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 439.800	$ 7.600	$ 0	$ 447.400
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 7.600	$ 0	$ 447.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$1.500	$ 0	$ 87.200
SUBTOTALES:									$ 85.700	$1.500	$ 0	$ 87.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SLP		PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							
1	CC 7711430	FAIVER POLANIA EDUARDO PERDOMO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 3.517.650				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.650	7711430	$ 85.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.107.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8688020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			820156727

7942763780 / E-EMPLEADOS

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544.000
SUBTOTALES:										$ 544.000	$ 0	$ 544.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136.000	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 136.000
SUBTOTALES:													$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 136.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 153.000	$ 153.000	$ 0	$ 0	$ 153.000
SUBTOTALES:									$ 153.000	$ 0	$ 0	$ 153.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 136.000	$ 0	$ 136.000
SUBTOTALES:			$ 136.000	$ 0	$ 136.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES				
																											PENSIÓN						SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075277867	DELGADO RAMOS INGRID YOMARA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 7711430	$ 9.600	30	$ 1.300.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1079174280	POLANIA LEIVA YINA DARIME	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.100.000	$ 7711430	$ 146.200	30	$ 2.100.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 969.000

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PAGOSIMPLE |

Fecha creación reporte: 2024-09-22, 10:43:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1067450814

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

Fecha limite de pago: 2024-09-23

PAGADA 22/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901767496	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8608020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19306096	GARCIA BERNAL YILBERT JULIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.250.000	$ 360.000	COMPENSAR EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	ARL SURA	$ 2.250.000	$ 156.800	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.800
CC 32257191	LOPEZ ROJAS YARDLEY NATHALIA	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.250.000	$ 360.000	EPS SANITAS	$ 2.250.000	$ 90.000	ARL SURA	$ 2.250.000	$ 156.800	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.800
CC 1003952873	MEDINA POLANIA LAURA DANIELA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 6.800	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800
CC 1012354706	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.250.000	$ 360.000	EPS SANITAS	$ 2.250.000	$ 90.000	ARL SURA	$ 2.250.000	$ 156.800	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 8.050.000	$ 8.050.000	$ 8.050.000	$ 8.050.000	$ 1.288.000	$ 0	$ 0	$ 322.000	$ 476.600	$ 322.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.408.600	$ 0	$ 2.408.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25N Cra 8 Torres del Rio 305G	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	910749234	947146817	I	2024/09/11	2024/09/13	NEQUI	2	$371,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76320749	CHILITO JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$370,500

2024/09/13 02:34 PM

EL INTERVENTOR

HACE CONSTAR:

El Interventor, certifica que el informe presentado por el ejecutor del contrato No. **CLPIH376 DE 2023**, *cuyo objeto es "***la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA"** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA

cumple con los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el ***CONTRATISTA DE OBRA,*** *en donde fue revisada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría revisó y verifico las planillas de seguridad social del contratista de obra del personal relacionado en el informe del periodo comprendido del 1 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto, así mismo reviso y avalo los siguientes documentos :*

- *Seguimiento al plan de Gerencia, Seguimiento al plan de calidad, Informe HSEQ, Pruebas de concreto de 3000 PSI de las estructuras construidas.*

Para constancia se firma a los veintitrés 23 días del mes de Septiembre de 2024.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Interventoría

Ayudante de obra (2)

Actividades
- Se sigue con la excavación manual de las zapatas de cimentación

Cruz
Residente obra. DM. obra.

01 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cordero - Residente de Obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
Operativo - Técnico en estructuras (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (3)

(Ayudantes) - Actividades
- Se llevaron actividades de fundición de solado de limpieza esto con el fin de evitar que no sale en contacto directo con la subrasante natural, dicho solado se realizo en concreto de 2000 PSI dando cumplimiento a los requerimientos estructurales del proyecto.

Cruz
Residente obra. DM. obra.

02 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra
Diego Fernando Cordero - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
Operativo: Técnico en estructuras (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (3)

Actividades:

- Se realizo el proceso de vibrado del concreto conforme a los especificaciones técnicos establecidos, garantizando el cumplimento de los parámetros definidos en términos de proporción, mezcla, colocación y compactación de material.

Residente obra.

D'K. obra.

03 de Agosto de 2024.
DIA NO LABORADO

Residente obra.

04 de Agosto de 2024
Dia festivo domingo

Residente obra.

05 de Agosto de 2024.
Tiempo: Nublado.
Personal: Juan Ricardo Rojas - Director de obras
Diego Fernando Cardenas - Residente de obras
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Operativos - Tecnico en estructuras (1)
Oficial de obra (2)
Ayudante (9)
Actividades.
- Se hace el retiro de escombros de los canchas. para tener el espacio suficiente para poder trabajar y poder entrar, guardar y sacar material.

Residente obra.

D'K. obra.

06 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cordero. - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Operativo - Tecnico en estructuras (1)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (9)

Actividades
- Ya con el aseado de limpieza seco, procedemos con la fundicion de zapatas con sus respectivos conectos de acero instalado y dejar los pedestales de los Columnas en proyeccion

Residente obra.

Dir. obra.

07 de Agosto de 2024.
Tiempo.: soleado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cordero. - Residente de Obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Operativo - Tecnico en estructura (1)
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Actividades
- Se procede con el armado de Columnas y armado de acero de viga de cimentacion, junto con las actividades de relleno

residente obra.

DIR. obra.

08 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Mario Claudio Ortegon - Residente SISO
Operativo - Tecnico en estructuras (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (3)
Actividades.
- Se hace la excavación manual donde irán los vigas de cimentación según lo proyectado en los planos y se sigue con las actividades de armado de acero para vigas de cimentación y columnas.

Residente obra.

Dir. obra.

09 de Agosto de 2024
Tiempo: Soleado.
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Mario Claudio Ortegon - Residente SISO
operativo - Tecnico en Estructuras (1)
Oficial de obra (2)
ayudante de obra (3)
Actividades
- Se terminan actividades de armado, amarre y excavaciones manuales de viga de cimentación para la fundición de las vigas y se deja el solado de limpieza listo.

Residente obra.

Dir. obra.

10 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado
personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo - Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)
Actividades
- Ya con el soleado de limpieza seco, se procede con la fundicion de vigas de cimentacion ya con el acero instalado.

Residente obra. Dir. obra.

11 de agosto de 2024
Dia festivo domingo.

Residente obra.

12 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado.
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo - Tecnico en estructura (1)
Oficial de obra (2)
ayudante de obra (9)
(Ayudante) - Actividades
- Se siguen actividades de relleno y compactaciones mecánicas, junto con el amarre de acero en las proyecciones de las columnas y se termina la fundicion de la viga
- Se toman muestras de concreto para

llevar al laboratorio para pruebas de resistencia.

Residente obra. Dir. obra.

13 de agosto de 2024
Tiempo: Nublado
personal: Julio Ricardo Rojas. Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo - Tecnico de estructura C1)
Oficial de obra C2)
ayudante de obra C9)
Actividades
- Se trae material desde bodega, como estibas. de madera, andamio certificado, alineadores, parales, cerchos, para la fundición de columnas y viga de canal y se comienza con la armada de formaleta para proceder a fundir.

Residente obra. Dir. obra.

14 de agosto de 2024
Tiempo: Lluvioso.
Personal: Julio Ricardo Rojas. Director de obra
Diego Fernando Cardenas. Residente de obra
Maria Claudia Ortega - Residente SISO.
operativo - Tecnico en estructuras C1)
Oficial de obra C2)
ayudante de obra C9)
Actividades: Se paran actividades por lluvias

Residente obra. Dir. obra.

15 de agosto de 2024
Tiempo: Nublado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo: Tecnico en estructura (1)
oficial de obra (2)
ayudante de obra (9)

Actividades
- Se hace limpieza en el área para tener disponibilidad de descargue de material pétreo para tener material suficiente para las fundiciones de columnas

Residente obra. Dir. obra.

16 de agosto de 2024
Tiempo: Nublado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo - Tecnico en estructura (1)
oficial de obra (2)
ayudante de obra (9)

Actividades:
Se continua con el armado de formaleta para fundida de columnas de I eje B desde C7 a C12 y el eje A desde C1 al C6

Residente obra. Dir. obra.

17 de agosto de 2024
DIA NO LABORADO

Residente obra.

18 de agosto de 2024
-Un festivo domingo.

Residente obra.

19 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado
Personal: Jairo Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Operativo: Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
ayudantes de obra (9)

Actividades
Se toman niveles de columnas para corroborar que todo este segun las medidas y proyecciones de los planos y se procede a fundir las columnas del eje B entre C7 a C12

Residente obra. Dir. obra.

20 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado
Personal: Jairo Ricardo Rojas. Director de obra.
Diego Fernando Cardenas. Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
Operativo - Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
ayudante de obra (9)
Actividades.
- Se continua con la fundida de columnas entre los ejes B desde C7 a C12 y eje A entre C1 a C6
- Se toman muestras del concreto para llevar

al laboratorio para pruebas de resistencia.

Residente obra

Dir. obra.

21 de agosto de 2024

Tiempo: Soleado

Personal: Juan Ricardo Rojas - Director de obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
Operativo - Tecnico en estructuras (1)
- oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (9)

ACTIVIDADES

Se sigue con el proceso de fundicion de las columnas y se comienza a desencofrar las columnas de fundida ayer al lado del eje A como del eje B.

Dir. obra

Residente obra.

22 de Julio de 2024 - Agosto.

Tiempo: Soleado.

Personal: Juan Ricardo Rojas - Director de Obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo: Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
ayudantes de obra (9)

Actividades

- Se comienza con el proceso de corte y excavacion de placa del piso para extender la longitud de la concha y se comienza con el armado de la paramentela para la construccion de la viga canal de EJE A desde el C1 al C6 y del eje B desde.

C7 al C12.

Residente obra.

Dir. obra.

23 de agosto de 2024.
Tiempo: Nublado.
Personal: Dario Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cardenas - Residente de Obra
Daria Claudia Ortegon: Residente SISO
Operativo - Tecnico en estructuras C1)
Oficial de obras C2)
Ayudante de obras C9)

Actividades
- Se lleva a cabo el comite de obra #4, se trata temo relacionado con el cierre de la obra de ingreso a la obra por aplicacion de placa huella.
- Se hace armada de la malla electrosoldada para la fundicion de la extension de la concha segun planos y teniendo en cuenta la hidratacion de las columnas fundidas, una vez terminado el armado de la formaleta de viga canal se procede a figurar y amarrar el refuerzo en eje A desde C1 a C6 y eje B desde C7 a C12, de acuerdo a los diseños

Residente obra. Dir. obra.

24 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado.
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
Operativo - Tecnico en estructuras C1)

oficial de obra (2)
ayudantes de obra (9)

Actividades
Se hace el proceso de descopiado de las columnas faltantes e instalación de viga perimetral para el correcto curado de las columnas. Se termina con la figurado de refuerzo en eje Dy B para viga canal y se procede con la actividad de medida en concreto, quedando terminada en su totalidad

Residente obra. Dir. obra.

25 de agosto de 2024
Día festivo domingo

Residente obra.

26 de agosto de 2024
tiempo: Soleado
personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Corderos - Residente de obra
Nora Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo - técnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
ayudante de obra (9)

Actividades.
. Se realiza actividad de hidratación de columnas como de la viga canal.

Residente obra.

Dir. obra.

27 de agosto de 2024
tiempo: Soleado
personal: Julio Ricardo Rojas Director de obra
Diego Fernando Corderos: Residente de obra.
Maria Claudia Ortegon - Residente siso.
operativo: Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
ayudante de obra (9)
Actividades
- Se funde donde se instalo la malla electrosoldada para la ampliacion de la cancha segun planos.

Residente obra. Dir. obra.

28 de agosto de 2024
tiempo: Nublado.
personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Corderos - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente siso.
operativo: Tecnico en estructura (1)
oficial de obra (2)
ayudante de obra (9)
Actividades
- Se hace hidratacion a los columnas y viga canal de ejes A y B a la placa fundida para un correcto curado.

Residente obra. Dir. obra.

29 de agosto de 2024
Tiempo: Nublado
Personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Corderos - Residente Obra

Maria Claudia Ortegon · Residente siso
operativo · Tecnico en estructuras (1)
oficial de obras (2)
ayudantes de obra (6)

Actividades
· Se realizo jornada de limpieza y demarcacion para el corte donde va la dilatacion y se realizo la aplicacion de mortero impermeabilizado en los vigas canales.

Residente obra. dir.obra.

30 de agosto de 2024
Tiempo: Nublado.
Personal: Julio Ricardo Rojas · Director de obra
Diego Fernando Cardenas · Residente de obra
Maria Claudia Ortegon · Residente siso
operativo · Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
ayudantes de obra (6)

Actividades
Se realizo parte de corte y dilatacion con su respectivo sellante.

Residente obra. Dir. obra.

31 de agosto de 2024
Tiempo: Soleado.
Personal: Julio Ricardo Rojas · Director de obra
Diego Fernando Cardenas · Residente de obra
Maria Claudia Ortegon · Residente siso
operativo · Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2).

ayudante de obra (6)

Actividades

- Se comienza a descapotar las vigas canales con el fin de proyectar la instalación de la cubierta.

Residente obra Ayud. obra.

01 de septiembre de 2024

Día festivo domingo

Residente obra.

02 de septiembre de 2024

tiempo: Soleado

personal: Julio Ricardo Rojas - Director de obra.
Diego Fernando Cardenas - Residente de obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO.
operativo - Tecnico en estructuras (1)
oficial de obra (2)
ayudantes de obra (4)

Actividades

- Se realiza parte del corte y delotación con su respectivo sellante.

Residente obra. Dir. obra.

03 de septiembre de 2024

tiempo: Soleado

personal: Julio Ricardo Rojas - Director de Obra
Diego Fernando Cardenas - Residente Obra
Maria Claudia Ortegon - Residente SISO
operativo - Tecnico en estructuras (1)
