INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No

100– 2024

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA LOS SERVICIOS PARA REALIZAR REPARACIONES DE OBRAS LOCATIVAS Y REFORMAS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO CONSIDERADAS COMO MEJORAS NECESARIAS, CON EL FIN DE ADECUAR LAS MEDIDAS DEL ÁREA DE TRABAJO DENTRO DE LAS OFICINAS DEL QUINTO (5) PISO DEL EDIFICIO CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES.

03 DE FEBRERO DE 2025
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

CONTRATISTA:

HABITAT SPACE S.A.S.

CONTENIDO

1. DATOS DEL CONTRATO

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1 INTRODUCCION

2.2 SUPERVISION DE INTERVENTORIA

2.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES E INFORMACIÓN

3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

4. ESTADO DE AVANCES DE ITEMS CONTRATADOS

5. PRESUPUESTO OFICIAL DE ACTVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	100 - 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las Medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del edificio Centro cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales.
VALOR DEL CONTRATO:	Noventa y siete millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta con cuarenta y dos centavos $ 97.643.640,42 (incluido IVA)
VALOR ADICIONAL.	25.5974,72
ANTICIPO:	N/NA
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 días
PLAZO ADICIONAL:	30 días
FECHA DE INICIO:	16-12-2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-01-2025
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales de acuerdo con actas mensuales de obra ejecutada (Ítems de obra efectivamente terminados en obra), los cuales deberán contar con el visto bueno del supervisor de obra, e informe técnico de avance de obra mensual. Para cada uno de estos pagos parciales, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento.
GARANTIAS EXPEDIDAS:	Cumplimiento del contrato Calidad del servicio Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Responsabilidad civil extracontractual

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

❖ INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el desarrollo y ejecución de las obras enunciadas dentro del objeto contractual contenido en el contrato de obra No. 100 - 2024; suscrito entre LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA y HABITAT SPACE S.A.S desde su iniciación hasta la entrega final, y cuyos datos identificadores son los siguientes:

❖ SUPERVISION DE LA INTERVENTORÍA

De conformidad con lo establecido en el contrato, se ha designado al ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE y ING. CONNY PATIÑO OROZCO como supervisores del contrato para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

❖ ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor contrato inicial	Valor adicional	Valor total contratado	Valor ejecutado	%	Valor por ejecutar	%
$ 72.046.168,00	25.5974,72	$ 97.643.640,42	$ 97.643.640,42	100%	---	100%

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES E INFORMACIÓN




LOCALIZACIÓN



VISTA EXTERIOR

Una vez iniciado el contrato, el día 16 de diciembre de 2024 se empezaron las actividades. Las actividades a ejecutar se llevaron a cabo en las zonas indicadas en las plantas arquitectónicas correspondientes al quinto piso del Centro Cívico de Barranquilla, específicamente en las oficinas señaladas a continuación.

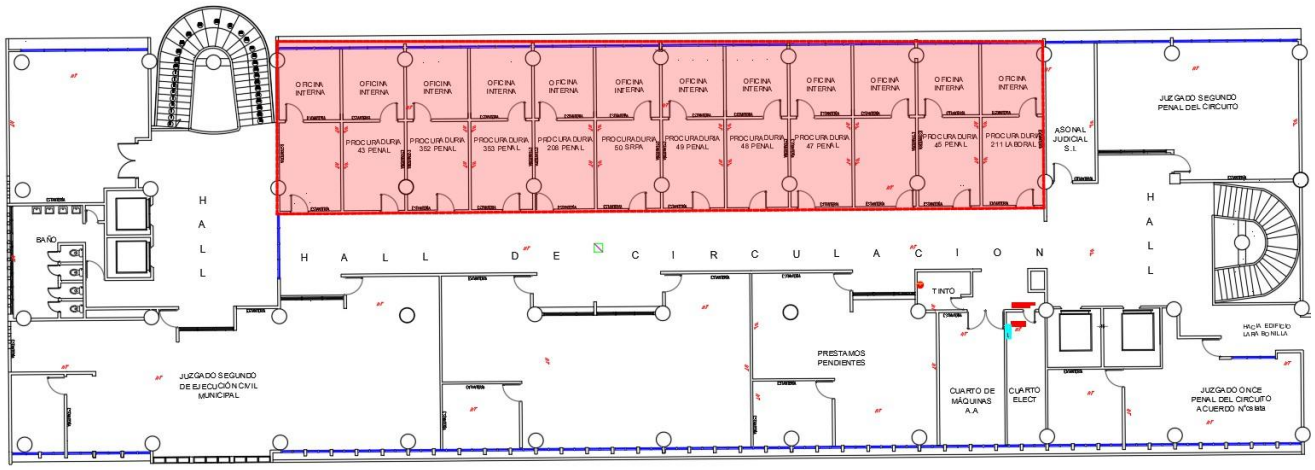

QUINTO PISO

Estas actividades se centraron en las oficinas de la Procuraduría Penal números 43, 45, 47, 48, 49, 208, 352, 353 y sus respectivas oficinas internas, así como en las oficinas de la Procuraduría SRPA número 50 con su respectiva oficina interna y la oficina de la Procuraduría Laboral número 211 y su oficina interna.











3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD					
Fase	**Tarea**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Duración (días)**	**Ejecucion**
Preliminares	Limpieza general del área de trabajo	16-12-2024	18-12-2024	3	100%
Demoliciones y preparación	Demolición de muros para vanos de puertas y ventanas	19-12-2024	21-12-2024	3	100%
Demoliciones y preparación	Escarificación de estuco y pintura	19-12-2024	21-12-2024	3	100%
Demoliciones y preparación	Desmonte de cielo raso y puertas	19-12-2024	21-12-2024	3	100%
Estructura y Mampostería	Levantamiento de muros con bloque vibrado	26-12-2024	28-12-2024	3	100%
Estructura y Mampostería	Pañete y acabado de muros	29-12-2024	30-12-2024	2	100%
Acabados	Estucado y pintura en muros interiores	02-01-2025	07-01-2025	5	100%
Acabados	Enchape de cerámica y detalles en granito	08-01-2025	10-01-2025	3	100%
Acabados	Instalación de cielo raso en drywall	11-01-2025	15-01-2025	4	100%
Carpintería y metalmecánica	Mantenimiento e instalación de puertas de madera	16-01-2025	19-01-2025	4	100%
Instalaciones eléctricas	Montaje de cableado, tableros y tuberías	23-01-2025	26-01-2025	4	100%
Instalaciones eléctricas	Instalación de tomas, canaletas y accesorios	27-01-2025	29-01-2025	3	100%
Inspección y entrega	Revisión final y ajustes	30-01-2025	31-01-2025	2	100%

4. ESTADO DE AVANCE DE ITEMS CONTRATADOS

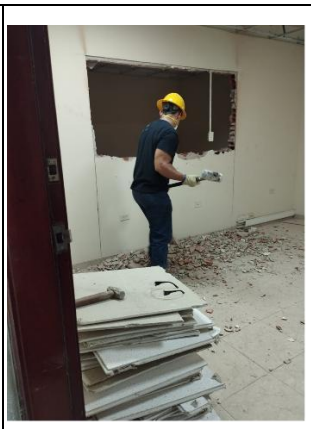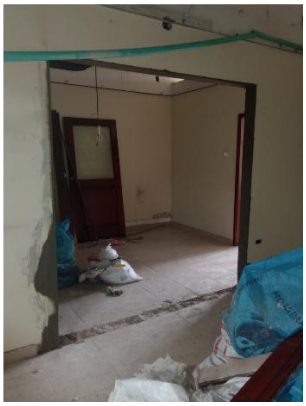	 
LIMPIEZA GENERAL	DEMOLICION DE MURO PARA VANOS (PUERTAS Y VENTANAS)
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

	
PAÑETE PARA FILOS APERTURA DE VANOS PARA OFICINAS DE PISO 5 y 6	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO EN OFICINAS DEL 5 PISO
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

	
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 PUERTAS	ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 1, 2 3, 4, 5 y 6
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**


	
FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO INTERIOR EN OFICINA 1,2,3,4,5 y 6
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

	
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE OFICINA DE 1 A 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL OFICINA DE 1 A 6
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**


	
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO OFICINA DE 1 A 6	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA (COLOR NEGRO) OFICINAS
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

	
REPARACION DE DETALLES DE GRANITO LAVADO (MURO DE PASAMANOS)	DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

 	   
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,20 MTS X 0,40 MTS CORREDIZA Y CON PANEL DE VIDRIO FIJO DE 0,60 DE ALTURA.(PARA ATENCION AL PUBLICO)
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

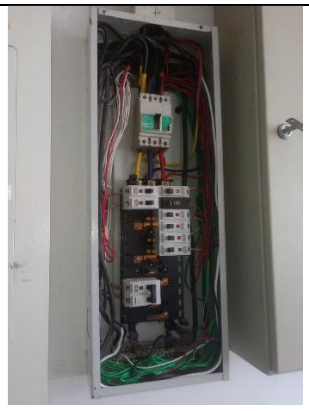 	 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X40AMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE THHN 4X8+10 CU
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

 	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 1/2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X40AMP, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES.
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

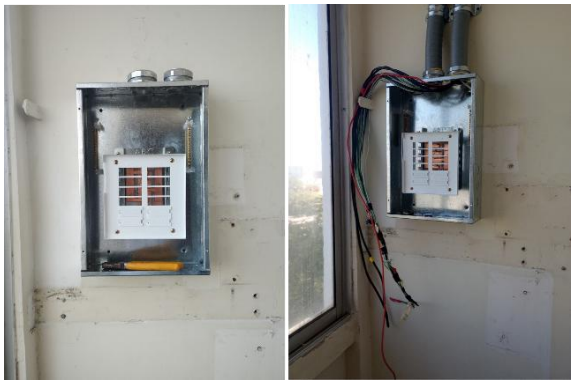	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" INCLUYE 12 CAJAS DE PASO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES.
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

 	 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA DEXON 100x45 CON SEPARADOR INTERNO.	INSTALACION DE TOMA LEVINTON BEIGE CON TAPA
AVANCE: Entregado 100%	**AVANCE: Entregado 100%**

HÁBITAT SPACE S.A.S

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°:		ENTIDAD CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	TIPO DE ACTA			
OBJETO:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	FECHA DE INICIO:	16/12/2024	VALOR ADICIONAL 1:	$ 25.597.472,00	ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	
CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:		VALOR ADICIONAL 2:		ACTA DE REINICIO 1:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:		PLAZO ADICIONAL CONTRACTUAL:	N/NA	VALOR CONTRATO FINAL:	$ 97.643.640,42	FECHA FIN DEL CONTRATO:	
INTERVENTORIA:		VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 72.046.168,42				
AVANCE DE OBRA:		VALOR DEL ANTICIPO:					
NUMERO DE ACTA DE AVANCE DE OBRA:	UNO (1)	FECHA DEL PRESENTE ACTA: 8/01/2024	PORCENTAJE ANTICIPO:	VALOR PENDIENTE A FACTURAR:			

DESCRIPCION		CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO				ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD2	VALOR TOTAL2	CANTIDAD3	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**							0,00	$ -
1.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	396,00	$ 2.590,00	$ 1.025.640,00	396,00	$ 1.025.640,00	0,00	$ -
2.0	**MAMPOSTERIA**								
2.1	DEMOLICION DE MURO PARA VANOS (PUERTAS Y VENTANAS) (2,00 X 2,00)	MT2	37,00	$ 33.300,00	$ 1.232.100,00	37,00	$ 1.232.100,00	0,00	$ -
2.2	PAÑETE PARA FILO	ML	88,20	$ 7.400,00	$ 652.680,00	88,20	$ 652.680,00	0,00	$ -
2.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	24,00	$ 46.586,70	$ 1.118.080,80	24,00	$ 1.118.080,80	0,00	$ -
2.4	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	48,00	$ 19.502,70	$ 936.129,60	48,00	$ 936.129,60	0,00	$ -
2.5	ESCARRIFICACION DE ESTUCO	MT2	780,50	$ 2.220,00	$ 1.732.710,00	780,50	$ 1.732.710,00	0,00	$ -
2.6	ESCARIFICACION DE PINTURA	MT2	780,50	$ 2.220,00	$ 1.732.710,00	780,50	$ 1.732.710,00	0,00	$ -
3.0	**ESTRUCTURA**								
3.1	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	UND	6,00	$ 336.774,00	$ 2.020.644,00	6,00	$ 2.020.644,00	0,00	$ -
4.0	**ACABADOS**								
4.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO, INTERIOR	MT2	804,50	$ 6.660,00	$ 5.357.970,00	804,50	$ 5.357.970,00	0,00	$ -
4.2	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	MT2	396,00	$ 3.700,00	$ 1.465.200,00	396,00	$ 1.465.200,00	0,00	$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	396,00	$ 59.937,04	$ 23.735.067,84	396,00	$ 23.735.067,84	0,00	$ -
4.4	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO	MT2	804,50	$ 5.180,00	$ 4.167.310,00	804,50	$ 4.167.310,00	0,00	$ -
4.5	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA (COLOR NEGRO)	MT2	6,78	$ 57.871,70	$ 392.315,14	6,78	$ 392.315,14	0,00	$ -
4.6	REPARACION DE DETALLES DE GRANITO LAVADO (MURO DE PASAMANOS)	ML	12,35	$ 25.900,00	$ 319.865,00	12,35	$ 319.865,00	0,00	$ -
5.0	**CARPINTERIA EN MADERA**								
5.1	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	24,00	$ 5.920,00	$ 142.080,00	24,00	$ 142.080,00	0,00	$ -
5.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE DESMONTE, CAMBIO DE CERRADURA TIPO POMO Y BISAGRAS.	MT2		$ 35.623,60	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	UND	18,00	$ 362.526,00	$ 6.525.468,00	18,00	$ 6.525.468,00	0,00	$ -
6.0	**CARPINTERIA METALICA**								
6.1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS PROYECTANTES EN CARPINTERIA METALICA. INCLUYE REEMPLAZO DE SEGUROS EN MAL ESTADO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MOVILES. (MODULO COMPLETO DE VENTANAS)	UND		$ 11.100,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2	SUMINISTRO DE INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,20 MTS X 0,40 MTS CORREDIZA Y CON PANEL DE VIDRIO FIJO DE 0,60 DE ALTURA.(PARA ATENCION AL PUBLICO)	UND	6,00	$ 703.000,00	$ 4.218.000,00	6,00	$ 4.218.000,00	0,00	$ -
							$ -	0,00	$ -
7,00	**INSTLACIONES ELECTRICAS**						$ -	0,00	$ -
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X40AMP	UN	1	$ 284.000,00	$ 284.000,00	1,00	$ 284.000,00	0,00	$ -
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE THHN 4X8+10 CU	ML	210	$ 23.000,00	$ 4.830.000,00	210,00	$ 4.830.000,00	0,00	$ -
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 1/2"	ML	36	$ 28.000,00	$ 1.008.000,00	36,00	$ 1.008.000,00	0,00	$ -
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X40AMP, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES.	UN	1	$ 486.000,00	$ 486.000,00	1,00	$ 486.000,00	0,00	$ -
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" INCLUYE 12 CAJAS DE PASO	ML	48	$ 18.000,00	$ 864.000,00	48,00	$ 864.000,00	0,00	$ -
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES.	UN	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00	1,00	$ 430.000,00	0,00	$ -
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA DEXON 100x45 CON SEPARADOR INTERNO.	ML	90	$ 23.000,00	$ 2.070.000,00	90,00	$ 2.070.000,00	0,00	$ -
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DEXON PARA SALIDA DE TOMA	UN	144	$ 9.000,00	$ 1.296.000,00	144,00	$ 1.296.000,00	0,00	$ -
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 2"	ML	45	$ 4.500,00	$ 202.500,00	45,00	$ 202.500,00	0,00	$ -
7.10	INSTALACION DE TUBO PVC 1/2" sch 40	ML	40	$ 4.500,00	$ 180.000,00	40,00	$ 180.000,00	0,00	$ -
7.11	INSTALACION DE RED PARA CIRCUITOS DE TOMAS THHN 3X12AWG.	ML	750	$ 8.100,00	$ 6.075.000,00	750,00	$ 6.075.000,00	0,00	$ -
7.12	INSTALACION DE TOMA LEVINTON BEIGE CON TAPA	UN	48	$ 20.000,00	$ 960.000,00	48,00	$ 960.000,00	0,00	$ -
7.13	INSTALACION DE TOMA LEVINTON NARANJA CON TAPA	UN	48	$ 25.000,00	$ 1.200.000,00	48,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ -
7.14	DESBLOQUEO DE SOFTWARE A.A. CENTRAL	UN	1	$ 285.872,74	$ 285.872,74	1,00	$ 285.872,74	0,00	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 76.945.343,12**	**TOTAL COSTO DIRECTO**	**$ 76.945.343,12**	**TOTAL COSTO DIRECTO**	**$ -**
	Administracion 10%				**$ 7.694.534,31**	**Administracion 10%**	**$ 7.694.534,31**	**Administracion 10%**	**$ -**
	Imprevistos 5 %				**$ 3.847.267,16**	**Imprevistos 5 %**	**$ 3.847.267,16**	**Imprevistos 5 %**	**$ -**
	Utilidad 10%				**$ 7.694.534,31**	**Utilidad 10%**	**$ 7.694.534,31**	**Utilidad 10%**	**$ -**
	19 % IVA sobre utilidad			$ 0,00	**$ 1.461.961,52**	**19 % IVA sobre utilidad**	**$ 1.461.961,52**	**19 % IVA sobre utilidad**	**$ -**
	TOTAL COSTO NETO			$ 97.643.640,42	**$ 97.643.640,42**	**TOTAL COSTO NETO**	**$ 97.643.640,42**	**TOTAL COSTO NETO**	**$ -**

NOTA:

REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

FIRMA: ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE
SUPERVISOR
BARRANQUILLA

ING. CONNY PATIÑO OROZCO
SUPERVISOR
RAMA JUDICIAL DE BARRANQUILLA
RAMA JUDICIAL DE

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	PRELIMINARES	**ITEM**	**1.1**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	M2	**ACTIVIDAD:**	LIMPIEZA GENERAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
LIMPIEZA GENERAL	1,00		396,00	396,00	1	396,00	$ 2.590,00	$ 1.025.640,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
TOTAL LIMPIEZA GENERAL M2:						396,00	VALOR TOTAL:	$ 1.025.640,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S


HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	MAMPOSTERIA	**ITEM**	**2.1**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	M2	**ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE MURO PARA VANOS (PUERTAS Y VENTANAS) (2,00 X 2,00)	

REGISTRO FOTOGRAFICO



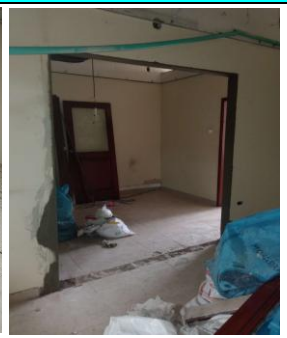

Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
DEMOLICION DE MURO PARA VANOS (PUERTAS Y VENTANAS) (2,00 X 2,00) EN APERTURA PARA AMPLIACON DE OFICINAS	2,15	2,20		4,73	6	28,37	$ 33.300	$ 944.624,43
DEMOLICION DE MURO PARA VANOS (PUERTAS Y VENTANAS) (1,20 X 1,10) EN VENTANAS DE ATENCION	1,25	1,15		1,44	6	8,63	$ 33.300	$ 287.462,25
								$ - ,00
								$ - ,00
								$ - ,00
								$ - ,00
								$ - ,00
								$ - ,00
TOTAL DEMOLICION DE MUROS PARA VANOS M2:						37,00	VALOR TOTAL:	$ 1.232.100,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	MAMPOSTERIA	**ITEM**	**2.2**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	ML	**ACTIVIDAD:**	PAÑETE PARA FILO	

REGISTRO FOTOGRAFICO






Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
PAÑETE PARA FILOS APERTURA DE VANOS PARA OFICINAS DE PISO 5		2,00	5,10	10,20	6	61,20	$ 7.400,00	$ 452.880,00
PAÑETE PARA FILOS APERTURA DE VANOS PARAVENTANAS DE ATENCION EN OFICINAS DE PISO 6		1,10	4,09	4,50	6	27,00	$ 7.400,00	$ 199.804,44
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
TOTAL PAÑETE PARA FILOS ML:						**88,20**	**VALOR TOTAL:**	**$ 652.680,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	MAMPOSTERIA	**ITEM**	**2.3**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO EN OFICINAS DEL 5 PISO PUERTAS	1,00	2,16		2,16	6	12,96	$ 46.586,70	$ 603.763,63
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO EN OFICINAS DEL 5 PISO VENTANAS OFICINA	0,80	1,20		0,96	6	5,76	$ 46.587,00	$ 268.341,12
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO EN OFICINAS DEL 5 PISO VENTANAS OFICINA	0,50	1,20		0,60	4	2,40	$ 46.587,00	$ 111.808,80
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO EN OFICINAS DEL 5 PISO VENTANAS OFICINA	0,60	1,20		0,72	4	2,88	$ 46.587,00	$ 134.170,56
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
TOTAL LEVANTE DE BLOQUE VIBRADO M2:						24,00	VALOR TOTAL:	$ 1.118.080,80

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	MAMPOSTERIA	**ITEM**	**2.4**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 PUERTAS	1,00	2,16		2,16	12	25,92	$ 19.502,70	$ 505.509,98
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 VENTANAS	0,80	1,20		0,96	12	11,52	$ 19.502,70	$ 224.671,10
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 VENTANAS	0,50	1,20		0,60	8	4,80	$ 19.502,70	$ 93.612,96
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 VENTANAS	0,60	1,20		0,72	8	5,76	$ 19.502,70	$ 112.335,55
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
TOTAL PAÑETE ALLANADO SOBRE MUROS M2:						48,00	VALOR TOTAL:	$ 936.129,60

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	MAMPOSTERIA	**ITEM**	**2.5**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**	ESCARRIFICACION DE ESTUCO	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	DESCUENTO VANOS Y VENTANAS	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 1	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 2	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 3	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 4	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 5	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 6	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
								$ -
								$ -
TOTAL ESCARRIFICACION DE ESTUCO M2:						**780,50**	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.732.710,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	MAMPOSTERIA	**ITEM**	**2.6**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**	ESCARIFICACION DE PINTURA		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	DESCUENTO VANOS Y VENTANAS	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 1	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 2	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 3	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 4	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 5	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
ESCARRIFICACIÓN DE ESTUCO OFICINA 6	27,04	2,53	62,10	130,08	1	130,08	$ 2.220,00	$ 288.784,53
								$ -
								$ -
TOTAL ESCARRIFICACION DE PINTURA M2:						**780,50**	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.732.710,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	ESTRUCTURA	**ITEM**	**3.1**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UND	**ACTIVIDAD:**		FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	1,00		6,00	6,00	1	6,00	$ 336.774,00	$ 2.020.644,00
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
								$ -
								$ -
TOTAL FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO UND:						6,00	VALOR TOTAL:	$ 2.020.644,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	ACABADOS	**ITEM**	**4.1**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO, INTERIOR		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	DESCUENTO VANOS Y VENTANAS	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO INTERIOR EN OFICINA 1	27,04	2,53	63,69	134,09	1	134,09	$ 6.660,00	$ 893.009,96
ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO INTERIOR OFICINA 2	27,04	2,53	63,69	134,09	1	134,09	$ 6.660,00	$ 893.009,96
ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO INTERIOR OFICINA 3	27,04	2,53	63,69	134,09	1	134,09	$ 6.660,00	$ 893.009,96
ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO INTERIOR OFICINA 4	27,04	2,53	63,69	134,09	1	134,09	$ 6.660,00	$ 893.009,96
ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO INTERIOR OFICINA 5	27,04	2,53	63,69	134,09	1	134,09	$ 6.660,00	$ 893.009,96
ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO INTERIOR OFICINA 6	27,04	2,53	63,69	134,09	1	134,09	$ 6.660,00	$ 893.009,96
								$ -
								$ -
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO SOBRE PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO, INTERIOR M2:						**804,50**	**VALOR TOTAL:**	**$ 5.357.970,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	ACABADOS	**ITEM**	**4.2**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE OFICINA 1	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 3.700,00	$ 244.201,11
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE OFICINA 2	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 3.700,00	$ 244.201,11
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE OFICINA 3	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 3.700,00	$ 244.201,11
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE OFICINA 4	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 3.700,00	$ 244.201,11
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE OFICINA 5	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 3.700,00	$ 244.201,11
DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA < 3.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE OFICINA 6	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 3.700,00	$ 244.201,11
								$ -
								$ -
TOTAL DESMONTE DE CIELO RASO M2:						**396,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.465.200,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	ACABADOS	**ITEM**	**4.3**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL OFICINA 1	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 59.937,04	$ 3.955.862,62
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL OFICINA 2	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 59.937,00	$ 3.955.859,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL OFICINA 3	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 59.937,00	$ 3.955.859,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL OFICINA 4	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 59.937,00	$ 3.955.859,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL OFICINA 5	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 59.937,00	$ 3.955.859,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL OFICINA 6	6,95		9,50	66,00	1	66,00	$ 59.937,00	$ 3.955.859,98
								$ -
								$ -
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL UND:						396,00	VALOR TOTAL:	$ 23.735.067,84

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**		**ITEM**	**4.4**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	DESCUENTO DE VANOS Y PUERTAS	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO OFICINA 1	31,00	2,53	65,25	165,08	1	134,08	$ 5.180,00	$ 694.547,35
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO OFICINA 2	31,00	2,53	65,25	165,08	1	134,08	$ 5.180,00	$ 694.547,35
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO OFICINA 3	31,00	2,53	65,25	165,08	1	134,08	$ 5.180,00	$ 694.547,35
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO OFICINA 4	31,00	2,53	65,25	165,08	1	134,08	$ 5.180,00	$ 694.547,35
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO OFICINA 5	31,00	2,53	65,25	165,08	1	134,08	$ 5.180,00	$ 694.547,35
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO OFICINA 6	31,00	2,53	65,25	165,08	1	134,08	$ 5.180,00	$ 694.547,35
								$ -
								$ -
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS COLOR BLANCO M2:						**804,50**	**VALOR TOTAL:**	**$ 4.167.310,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**		**ITEM**	**4.5**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	MT2	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA (COLOR NEGRO) OFICINAS	0,94		1,20	1,13	6	6,78	$ 57.871,70	$ 392.315,14
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
								$ -
								$ -
ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA (COLOR NEGRO) M2:						6,78	VALOR TOTAL:	$ 392.315,14

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**		**ITEM**	**4.6**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	ML	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
REPARACION DE DETALLES DE GRANITO LAVADO (MURO DE PASAMANOS)			2,06	2,06	6	12,35	$ 25.900,00	$ 319.782,12
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
				0,00	1	0,00		$ -
								$ -
								$ -
REPARACION DE DETALLES DE GRANITO LAVADO (MURO DE PASAMANOS) ML:						12,35	VALOR TOTAL:	$ 319.782,12

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	CARPINTERIA EN MADERA	**ITEM**	**5.1**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UND	**ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL				1,00	24	24,00	$ 5.920,00	$ 142.080,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
TOTAL DESMONTE DE PUERTAS DE MANDERA UND:						24,00	VALOR TOTAL:	$ 142.080,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	CARPINTERIA EN MADERA	**ITEM**	**5.3**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA				1,00	18	18,00	$ 362.526,00	$ 6.525.468,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL UND:						**18,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 6.525.468,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**		**ITEM**	**6.2**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
SUMINISTRO DE INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,20 MTS X 0,40 MTS CORREDIZA Y CON PANEL DE VIDRIO FIJO DE 0,60 DE ALTURA.(PARA ATENCION AL PUBLICO)				1,00	6	6,00	$ 703.000,00	$ 4.218.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO DE INSTALACION DE VENTANA METALICA 1,20 MTS X 0,40 MTS CORREDIZA Y CON PANEL DE VIDRIO FIJO DE 0,60 DE ALTURA.(PARA ATENCION AL PUBLICO) UND:						**6,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 4.218.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.1**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X40AMP				1,00	1	1,00	$ 284.000,00	$ 284.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X40AMP UND:						1,00	VALOR TOTAL:	$ 284.000,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.2**	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE THHN 4X8+10 CU			210,00	210,00	1	210,00	$ 23.000,00	$ 4.830.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE THHN 4X8+10 CU ML:						**210,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 4.830.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.3**	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	ML	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 1/2"			36,00	36,00	1	36,00	$ 28.000,00	$ 1.008.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 1/2" ML:						**36,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.008.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.4**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X40AMP, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES.				1,00	1	1,00	$ 486.000,00	$ 486.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X40AMP, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES. UND						1,00	VALOR TOTAL:	$ 486.000,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.5**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	ML	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" INCLUYE 12 CAJAS DE PASO			48,00	48,00	1	48,00	$ 18.000,00	$ 864.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" INCLUYE 12 CAJAS DE PASO						48,00	VALOR TOTAL:	$ 864.000,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.6**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES.				1,00	1	1,00	$ 430.000,00	$ 430.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES PARCIALES. UND:						1,00	VALOR TOTAL:	$ 430.000,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.7**	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	ML	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA DEXON 100x45 CON SEPARADOR INTERNO.			90,00	90,00	1	90,00	$ 23.000,00	$ 2.070.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA DEXON 100x45 CON SEPARADOR INTERNO. ML						**90,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 2.070.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.8**	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DEXON PARA SALIDA DE TOMA				1,00	144	144,00	$ 9.000,00	$ 1.296.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DEXON PARA SALIDA DE TOMA UND:						144,00	VALOR TOTAL:	$ 1.296.000,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.9**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	ML	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO

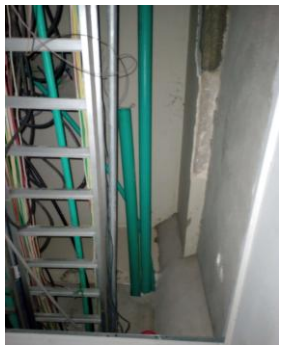



Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 2"			45,00	45,00	1	45,00	$ 4.500,00	$ 202.500,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 2"ML:						**45,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 202.500,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S


HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.10**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**		**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



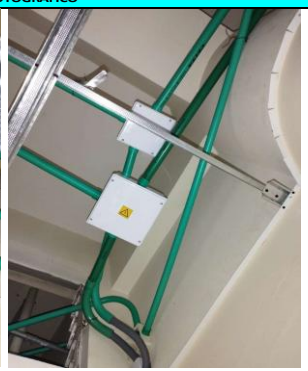

Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
INSTALACION DE TUBO PVC 1/2" sch 40			40,00	40,00	1	40,00	$ 4.500,00	$ 180.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
INSTALACION DE TUBO PVC 1/2" sch 40						40,00	**VALOR TOTAL:**	**$ 180.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.11**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	ML	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
INSTALACION DE RED PARA CIRCUITOS DE TOMAS THHN 3X12AWG.			750,00	750,00	1	750,00	$ 8.100,00	$ 6.075.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
INSTALACION DE RED PARA CIRCUITOS DE TOMAS THHN 3X12AWG ML:						**750,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 6.075.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.12**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
INSTALACION DE TOMA LEVINTON BEIGE CON TAPA				0,00	48	48,00	$ 20.000,00	$ 960.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
INSTALACION DE TOMA LEVINTON BEIGE CON TAPA UND:						48,00	**VALOR TOTAL:**	**$ 960.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.13**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripcion	**Dimensiones**				**No Elem.**	**Medida Total**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**	**Area**				
INSTALACION DE TOMA LEVINTON NARANJA CON TAPA				0,00	48	48,00	$ 25.000,00	$ 1.200.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
INSTALACION DE TOMA LEVINTON NARANJA CON TAPA						**48,00**	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.200.000,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

HÁBITAT SPACE S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA:	HABITAT SPACE S.A.S	**OBJETO:**	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales	**CAPITULO:**	INSTLACIONES ELECTRICAS	**ITEM**	**7.14**	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA	**SUPERVISOR DE OBRA:**	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE ING. CONNY PATIÑO OROZCO	**UNIDAD**	UN	**ACTIVIDAD:**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto	Longitud	Area				
 	DESBLOQUEO DE SOFTWARE A.A. CENTRAL				0,00	1	1,00	$ 285.872,74	$ 285.872,74
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
	DESBLOQUEO DE SOFTWARE A.A. CENTRAL UND:						1,00	VALOR TOTAL:	$ 285.872,74

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
HABITAT SPACE S.A.S

Cordialmente,

Cony De Jesus Patiño Orozco.
Ing. Civil - Profesional Universitario Grado 9
Supervisora de contrato.

Alfredo Rafael Hadechni Munive
Jefe de Mantenimiento y Soporte Tecnológico – Grado 11
Supervisor de Contrato
