Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITACORA DE OBRA
SABADO, 10 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Lluvioso.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Finaliza la demolición del cuerpo de box coulvert existente con el uso de equipo de demolición
- Se presenta visita de obra por parte del señor Alcalde de la ciudad el Dr. Alexander Baquero y funcionarios de su despacho, para verificar el estado actual de las obras realizadas, resolver inquietudes de la comunidad y demás relacionado al contrato de obra No 1822 de 2023

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

"BITACORA DE OBRA"

No se realizaron actividades por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		Se presentan lluvias en horas de la madrugada lo que retrasa el inicio de labores del proyecto durante las primeras horas de la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
LUNES, 12 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Lluvioso.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realiza la construcción de placa base de pozo pluvial MP-29 con la respectiva parrilla de acero, además de realizar manejo de aguas debido al alto nivel freatico que se presenta
- Se realiza nivelación de subbase en sector de cra 43 entre calles 79 y 80, actividad que se había dificultado por las lluvias presentadas en días anteriores
- Se realizan actividades de limpieza en zona de cuerpo de box coulvert fase para facilitar las labores de construcción del nuevo elemento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigargegor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldia de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	8	2024	7:00	11:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		Se presentan lluvias en horas de la madrugada lo que retrasa el inicio de labores del proyecto durante las primeras horas de la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	8	2024	7:00:00	11:30:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITACORA DE OBRA
MARTES, 13 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Lluvioso.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realiza la instalación de tubería pluvial de diam 16" entre los pozos MP-29 y MP-18 en el sector pluvial 3 con la respectiva cama de arena, rellenos, además de realizar manejo de aguas debido al alto nivel freatico que se presenta
- Continua la nivelación de subbase en sector de cra 43 entre calles 79 y 80, actividad que se había dificultado por las lluvias presentadas en dias anteriores
- Se realizan actividades de limpieza en zona de cuerpo de box coulvert fase para facilitar las labores de construcción del nuevo elemento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldia de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITACORA DE OBRA
MIERCOLES, 14 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Lluvioso.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realiza la formaleteada y construcción de primer anillo en concreto de pozo MP-29 en el sector pluvial 3 con el respectivo mezclado, vertido y vibrado de concreto de 4000 psi.
- Se realiza la excavación y vertido de solado en caja sumidero del colector pluvial perteneciente al pozo MP-29 ubicados sobre la carrera 43
- Continua la nivelación de subbase en sector de cra 43 entre calles 79 y 80, actividad que se habia dificultado por las lluvias presentadas en días anteriores
- Se realizan actividades de limpieza en zona de cuerpo de box coulvert fase para facilitar las labores de construcción del nuevo elemento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldia de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43 EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
JUEVES, 15 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Nublado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realiza la formaleteada y construcción de segundo anillo en concreto de pozo MP-29 en el sector pluvial 3.
- Se realiza la excavación y vertido de solado en caja sumidero del cclector pluvial perteneciente al pozo MP-28 ubicados sobre la carrera 43, además se realiza la instalación de tuberías pluviales 12" de sumideros en los pozos MP-28 y MP-29 con el respectivo relleno y atraque en arena.
- Continua la nivelación de subbase en sector de cra 43 entre calles 79 y 80, actividad que se había dificultado por las lluvias presentadas en días anteriores, se realiza mejoramiento en fallo de estructura de pavimento en el que se repuso un area debilitado en arcillas explandibles por material de río granular de tamaño 3", con el respectivo extendido y compactación del mismo
- Se realizan actividades de limpieza en zona de cuerpo de box coulvert fase para facilitar las labores de construcción del nuevo elemento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

- Los árboles continúan prestando obstaculización en la excavación del Box Coulvert.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre:FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
VIERNES, 16 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realiza la formaleteada y construcción de segundo anillo en concreto de pozo MP-29 en el sector pluvial 3.
- Se realiza la excavación e instalación de tuberías pluviales 12" de sumideros en los pozos MP-29 con el respectivo relleno y atraque en arena.
- Continua la nivelación de subbase en sector de cra 43 entre calles 80 y 82, actividad que se había dificultado por las lluvias presentadas en días anteriores, se realiza mejoramiento en fallo de estructura de pavimento en el que se repuso un area debilitado en arcillas explandibles por material de río granular de tamaño 3", con el respectivo extendido y compactación del mismo
- Se realizan actividades de limpieza en zona de cuerpo de box coulvert fase para facilitar las labores de construcción del nuevo elemento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
\DENERO						
:OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	8	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
SABADO, 17 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Continua la nivelación de subbase en sector de cra 43 entre calles 80 y 82, actividad que se había dificultado por las lluvias presentadas en días anteriores, se realiza mejoramiento en fallo de estructura de pavimento en el que se repuso un area debilitado en arcillas explandibles por material de río granular de tamaño 3", con el respectivo extendido y compactación del mismo
- Se realizan actividades de limpieza en zona de separador, recolección de residuos de obra y señalización respectiva de excavaciones, sumideros y pozos abiertos a lo largo del proyecto

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]ENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA

No se realizaron actividades por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
bre: CAMILO ANDRES CABALLERO AZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]DENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
LUNES, 19 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realiza la formaleteada y construcción de segundo anillo en concreto de pozo MP-29 en el sector pluvial 3.
- Se realiza la excavación e instalación de tuberías pluviales 12" de sumideros en los pozos MP-29 con el respectivo relleno y atraque en arena.
- Continua la nivelación de subbase en sector de cra 43 entre calles 80 y 82, actividad que se habia dificultado por las lluvias presentadas en días anteriores, se realiza mejoramiento en fallo de estructura de pavimento en el que se repuso un area debilitado en arcillas explandibles por material de río granular de tamaño 3", con el respectivo extendido y compactación del mismo
- Se realizan actividades de limpieza en zona de cuerpo de box coulvert fase para facilitar las labores de construcción del nuevo elemento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

- Los árboles continúan prestando obstaculización en la excavación del Box Coulvert.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MARTES, 20 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realiza la instalación de tubería de diametro 33 pulg entre los pozos MP-21 a MP-22, con el respectivo atraque y cama de arena, y rellenos hasta nivel de pavimento exisitente
- Se realiza el respectivo manejo de transito sobre la Carrera 43 entre las calle 74sur a 75 sur, a fin de poder realizar los trabajos pertinentes sin afectar el desarrollo de las actividades diarias de comunidad
- Se realizan actividades de detallado de conexión de tuberías de sumideros en pozos de inspección sobre calzada derecha de sector pluvial 3 del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68173 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REIÑA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]ENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITACORA DE OBRA
MIERCOLES, 21 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Continuan la instalación de tubería de diametro 33 pulg entre los pozos MP-21 a MP-22, con el respectivo atraque y cama de arena, y rellenos hasta nivel de pavimento exisitente
- Se realiza el respectivo manejo de transito sobre la Carrera 43 entre las calle 74sur a 75 sur, a fin de poder realizar los trabajos pertinentes sin afectar el desarrollo de las actividades diarias de comunidad
- Continuan actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
ervisor de obra1
estro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
bre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACCRA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
JUEVES, 22 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en zona de separador sobre cra 43 entre calle 79 y 80, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Se realizan actividades de detallado de pozos de inspección sobre calzada derecha del proyecto, finiquitando terminados de tuberías de sumidero en pozos de inspección
- Se realiza la construcción de cajas de inspección de viviendas entre Calles 81sur y 82sur sobre Cra 43, con la respectiva malla electrosoldada y el concreto de 3000 psi requerido
- Continuan actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en las primeras horas de la jornada lo que retrasa el inicio de las actividades de obra durante las primeras 2 horas del día
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
VIERNES, 23 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Lluvia.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continua la instalación de sardineles A-10 en intersección de cra 43 con calle 79sur calzada izq, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Continua la construcción de cajas de inspección de viviendas entre Calles 81sur y 82sur sobre Cra 43, con la respectiva malla electrosoldada y el concreto de 3000 psi requerido
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS
Se realiza mesa de socialización y definición de actividades del pluvial sector 3 respecto al descole en sector Caño Corcovado, con presencia de la Comunidad de los diferentes sectores del proyecto como Villa Juliana, Villa del Lago, Maporita, Las Palmas y sector Caño Corcovado,

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	24	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
)ENERO						
)S						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	8	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
SABADO, 24 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Nublado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Finaliza la instalación de sardineles A-10 en intersección de cra 43 con calle 79sur calzada izq, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados
- Se realiza jornada de orden y aseo de obra, y recuperación de señalización a lo largo de toda la obra, con lo que ante el fin de semana se deja todo debidamente señalizado para la seguridad de los transeuntes y vehiculos.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
[illegible]erador4
[illegible]iales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
[illegible]re:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	25	8	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO - (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de
Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	8	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA

No se realizaron actividades por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
nbre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
mbre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	8	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
LUNES, 26 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Nublado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Se realizan excavaciones para la instalación de tuberías de acometidas domiciliarias entre las calles 81sur a 82sur sobre Cra 43, conexion que se realiza entre las viviendas y la tubería sanitaria principal en este punto con el uso respectivo de accesorios tipo Silla Yee y semicodos sanitarios cuando se requiera.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
)ENERO						
)S						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	8	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MARTES, 27 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan excavaciones para la instalación de tuberías de acometidas domiciliarias entre las calles 81sur a 82sur sobre Cra 43, conexion que se realiza entre las viviendas y la tubería sanitaria principal en este punto con el uso respectivo de accesorios tipo Silla Yee y semicodos sanitarios cuando se requiera.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados
- Se realiza la construcción de cañuelas de pozos de inspección sobre calzada derecha de carrera 43 del sector 3 del proyecto

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra:1
Maestro general de obra:1
Operador:4
Oficiales:3
Ayudante:10
Topógrafo:1
Cadenero:1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	8	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MIERCOLES, 28 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan excavaciones para la instalación de tuberías de acometidas domiciliarias entre las calles 81sur a 82sur sobre Cra 43, conexior que se realiza entre las viviendas y la tubería sanitaria principal en este punto con el uso respectivo de accesorios tipo Silla Yee y semicodos sanitarios cuando se requiera.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra:1
Maestro general de obra:1
Operador:4
Oficiales:3
Ayudante:10
Topógrafo:1
Cadenero:1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minicargador 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]DENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	8	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
JUEVES, 29 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan excavaciones para la instalación de tuberías de acometidas domiciliarias entre las calles 81sur a 82sur sobre Cra 43, conexion que se realiza entre las viviendas y la tubería sanitaria principal en este punto cor el uso respectivo de accesorios tipo Silla Yee y semicodos sanitarios cuando se requiera.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de materia! de subbase para aproximación a niveles adecuados
- Se realiza la construcción de cajas de inspección de viviendas entre Calles 81sur y 82sur sobre Cra 43, con la respectiva malla electrosoldada y el concreto de 3000 psi requerido

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

ERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
pervisor de obra:1
Maestro general de obra:1
Operador:4
Oficiales:3
Ayudante:10
Topógrafo:1
Cadenero:1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
bre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

ndo se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	8	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
VIERNES, 30 DE AGOSTO DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Finalizan las excavaciones para la instalación de tuberías de acometidas domiciliarias entre las calles 81sur a 82sur sobre Cra 43 y tambien entre las calles 80sur a 81sur sobre Cra 43, conexion que se realiza entre las viviendas y la tuberia sanitaria principal en este punto con el uso respectivo de accesorios tipo Silla Yee y semicodos sanitarios cuando se requiera.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados
- Se realiza la construcción de cajas de inspección de viviendas entre Calles 80sur y 81sur sobre Cra 43, con la respectiva malla electrosoldada y el concreto de 3000 psi requerido

ERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra:1
Maestro general de obra:1
Operador:4
Oficiales:3
Ayudante:10
Topógrafo:1
Cadenero:1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volquéta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-63176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registrar observacionas generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	31	8	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
IOS						

Alcaldia de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA

No se realizaron actividades por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
mbre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	9	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	9	2024	7:00:00	16:30:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados, se realiza la conformación de las intersecciones de las calles 80 sur y 82 sur del sector 3 del proyecto

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante9
Topógrafo1
Cadenero1
SISO: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	9	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	9	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derècha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados, se realiza la conformación de las intersecciones de las calles 80 sur y 82 sur del sector 3 del proyecto

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante9
Topógrafo1
Cadenero1
SISO: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	4	9	2024	7:00	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
TROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	9	2024	7:00:00	16:30:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MIERCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material de subbase para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante9
Topógrafo1
Cadenero1
SISO: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en horas de la mañana lo que retrasa el inicio de labores del proyecto durante las primeras horas de la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
:OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTÁDO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continuan la instalación de tubería de diametro 33 pulg entre los pozos MP-21 a MP-22, con el respectivo atraque y cama de arena, y rellenos hasta nivel de pavimento exisitente
- Se realiza el respectivo manejo de transito sobre la Carrera 43 entre las calle 74sur a 75 sur, a fin de poder realizar los trabajos pertinentes sin afectar el desarrollo de las actividades diarias de comunidad

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante9
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
SABADO, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Se realizan actividades de limpieza en zona de separador, recolección de residuos de obra y señalización respectiva de excavaciones, sumideros y pozos abiertos a lo largo del proyecto

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Rudante9
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	8	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITAÇORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Se realiza suministro y extendido de material tam max 2 pulg. en zona de box coulvert zona de aproche
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
pógrafo1
adenero1
S: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Nublado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Se realiza suministro y extendido de material tam max 2 pulg. en zona de box coulvert zona de aproche
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Se realiza mejoramiento de fallos presentados en estructura de pavimento en sector 1 del proyecto, con lo cual se realiza el retiro de material contaminado, y se dispone de material 3 pulg para mejorar la capacidad de carga en estos puntos especificos, sobre el cual se dispondrá la estructura del pavimento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigàrcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MIERCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Nublado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Se realiza suministro y extendido de material tam max 2 pulg. en zona de box coulvert zona de aproche
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continua mejoramiento de fallos presentados en estructura de pavimento en sector 1 del proyecto, con lo cual se realiza el retiro de material contaminado, y se dispone de material 3 pulg para mejorar la capacidad de carga en estos puntos especificos, sobre el cual se dispondrá la estructura del pavimento

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]PENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Se realiza suministro y extendido de material tam max 2 pulg. en zona de box coulvert zona de aproche
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Se realiza la instalación de sardineles en zona de separador sobre cra 43 entre calle 80 sur y 82 sur, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
perador4
ciales3
yudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
mbre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	9	2024	7:00	11:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
DENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	9	2024	7:00:00	11:30:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Se realiza la excavación para cajas de inspección en sector 3 del proyecto, a modo de realizar la debida construcción y vertida de concreto de estas
- Continua la instalación de sardineles en zona de separador sobre cra 43 entre calle 80 sur y 82 sur, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
ficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
ombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	9	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]DENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	9	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
SABADO, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Nublado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 3 y 2 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continuan la excavación para cajas de inspección en sector 3 del proyecto, a modo de realizar la debida construcción y vertida de concreto de estas
- Continua la instalación de sardineles en zona de separador sobre cra 43 entre calle 80 sur y 82 sur, con el respectivo alineamiento, suministro de arena y nivelación requerida.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales3
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 27

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
TROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA

No se realizaron actividades por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Nublado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continua la instalación de tubería pluvial de diametros de 33" en sector porfía del proyecto en dirección al descole del proyecto, donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tubería instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	9	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	9	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continua la instalación de tubería pluvial de diametros de 33" en sector porfía del proyecto en dirección al descole del proyecto, donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tuberia instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]DENERO						
[illegible]ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MIERCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura.
- Continua la instalación de tubería pluvial de diametros de 33" en sector porfía del proyecto en dirección al descole del proyecto, donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tuberia instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Nublado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continua la instalación de tubería pluvial de diametros de 33" en sector porfía en dirección al descole del proyecto y de tubería de 16" en sector 3 Maporita conexión entre pozos, donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tuberia instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Nublado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continua la instalación de tubería pluvial de diametros de 33" en sector porfía en dirección al descole del proyecto y de tubería de 14" en sector 3 Maporita conexión entre pozos, donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tubería instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	21	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
TROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
SABADO, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Nublado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximaciòn a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Se realizan actividades de limpieza en zona de separador, recolección de residuos de obra y señalización respectiva de excavaciones, sumideros y pozos abiertos a lo largo del proyecto

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
ógrafo1
[illegible]enero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	9	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA

No se realizaron actividades por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

9727

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	9	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

9728

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
MIERCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continua la instalación de tubería pluvial de diametros de 33" en sector porfía en dirección al descole del proyecto donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tuberia instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
[illegible]udante10
[illegible]pógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoria1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS
Se presenta afectación en tubería de acueducto perteneciente a la red de ASOGESTORES quienes son los encargados de la operación del suministro de agua en el sector de Porfía.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
[illegible]bre:		N° Mat. Profesional:	
[illegible]mbre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

9729

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	9	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

9730

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITACORA DE OBRA
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Continua la instalación de tubería pluvial de diametros de 33" en sector porfía en dirección al descole del proyecto, donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tuberia instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
Topógrafo1
Cadenero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

9731

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	9	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	28	9	2024	07:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

9734

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	9	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
SABADO, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha de sector 2 y 1 del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehículos se ha deteriorado la carpeta de rodadura
- Finaliza la instalación de tubería pluvial de diametros de 16" en sector porfía en sector 3 Maporita conexión entre pozos MP-29 y proyección de tubería hacia el barrio, donde se realiza la respectiva alineación, excavación, atraque en arena y relleno respectivo de la tuberia instalada del proyecto.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
udante10
ógrafo1
denero1
HS: 1
Controlador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
bre:		N° Mat. Profesional:	
bre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

9735

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	9	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

9736

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITACORA DE OBRA

No se realizaron actividades por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
bre:		N° Mat. Profesional:	
ore:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

9737

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	9	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
ROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

9739

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	9	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

BITÁCORA DE OBRA
VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLIMA:
Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

- Continuó la figuración de acero para obras generales.
- Continuan las actividades de estructura de pavimento sobre calzada derecha del proyecto, se realiza suministro de material para aproximación a niveles adecuados, se realiza mejoramiento de material extendido puesto que con el paso de vehiculos se ha deteriorado la carpeta de rodadura.
- Se realiza la instalación de sardineles A-10 en separador entre calle 80sur y 82sur realizando el remate en curva de sarindel, donde se realiza la excavación, alineación, sentado y atraque de elementos.

PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA
Supervisor de obra1
Maestro general de obra1
Operador4
Oficiales2
Ayudante10
Topógrafo1
adenero1
: 1
ontrolador vial: 3
Almacenista: 1
Residente de Interventoría1

TOTAL: 26

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Vibro-compactador1
Estación topográfica1
Nivel topográfico1
Trompo mezclador1
Rana compactadora0
Volqueta doble troque 0
Volqueta sencilla 4
Cortadora de concreto 1
Planta eléctrica1
Bomba sumergible 1
Vibradora de concreto 0
Pulidoras 1
Minigarcagor 1

HERRAMIENTA MENOR

- Carretillas 4
- Picos 10
- Palas 14

NOTAS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
mbre:		N° Mat. Profesional:	
ombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SOLEADO TODO EL DÍA, NO SE PRESENTAN LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias		0		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SÍ		OBRUSADA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SÍ		RETRO EXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	3	SÍ		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	10	SÍ		TRÓMPO METÁLICO	1	
CELADOR	0	NO		CARRETILLAS	4	
TOPÓGRAFO	1	SÍ		PALAS Y PICAS	10	
CADENERO	2	SÍ		RASTRAS	3	
OTROS VIALISTAS	3	SÍ		HERRAMIENTA MENOR	GLB.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
7.3.2.3. TUBERÍA PVC. 16"	ML	INSTALACIÓN PROYECCIÓN TUBERIA DE MP-29 A MANDEITO			
A.I.P.7. SARDINEL BAJO RAMPA	UN	INSTALACION Y NIVELADO DE SARDINEL SECCIÓN 2 BAJO E.			
A.I.P.6. ARENA LAVADA RIO	M3	CAMA DE ARENA SENTADO Y ATRAQUE SARDINEL			
4.1. SARDINEL A-10	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUA FIGURACION DE ACERO PARA OBRAS GENERALES.
* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 EN ZONA DE SECTOR 3 SOBRE SEPARADOR EN PUNTO PROXIMO A LA CALLE 89 FINALIZANDO EL REMATE EN CURVA DE SARDINEL, CON ESTO SE REALIZA LA EXCAVACION, ALINEACIÓN, SENTADO Y ATRAGUE DE ELEMENTOS.
* SE REALIZA INSTALACION DE SARDINELES BAJO RAMPA EN ZONA DE SECTOR 2 DEL PROYECTO. SOBRE CALZADA IZQUIERDA, SE REALIZA EXCAVACION, ALINEACIÓN, SENTADO Y ATRAGUE DE ELEMENTOS.
* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 16" PVC CORRESPONDIENTE A LA RED PLUVIAL DEL SECTOR 3. SE INSTALA LA PROYECCIÓN DE TUBERIA PLUVIAL QUE CONDUCE DESDE EL BOMBEO MAPOTA HASTA EL POZO MP-29. SE REALIZA LA RESPECTIVA EXCAVACIÓN, CAMA Y ATRAGUE DE ARENA, Y RELLENO EN MATERIAL RESPECTO A LO INDICADO POR LOS DISEÑOS DEL PROYECTO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SOLEADO TODO EL DIA, NO SE PRESENTAN LLUVIAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias		0		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		OLLEADA LATACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	3	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	10	SI		TROMPO MEZCLADOR	1	
CELADOR	0	NO		CARRETILLAS	4	
TOPÓGRAFO	2	SI		PALAS Y PICOS	10	
CADENERO	2	SI		BARRAS METALICAS	3	
OTROS	3	SI		HERRAMIENTA MENOR	GLB.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
7.3.2.3 TUBERIA PVC. 15"	ML.	INSTALACION TUBERIA			
N.P. 7. SARDINEL Bajo Rampa	UN	INSTALACIÓN SARDINEL A-85			
N.P. 8. ARENA LAVADA DE RIO	M3	CAMA Y SENTADO SARDINELES			
4.1. SARDINEL A-10	ML.	INSTALACIÓN SARDINEL A-10			
7.3.1.1. TUBERIA PVC 12"	ML	INSTALACIÓN TUBERÍA SUMIDERO.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUA FIGURACIÓN DE ACERO PARA OBRAS GENERALES

* CONTINUA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 Y A-9S (BAJO RAMPA) EN SECTORES 2 Y 3 DEL PROYECTO, CON ESTO SE REALIZA EXCAVACIÓN, ALINEACIÓN, SENTADO CON ARENA Y ATRAQUE DE ELEMENTO DE SARDINEL.

* FINALIZA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 16" PVC CORRESPONDIENTE A LA RED PLUVIAL DEL SECTOR 3, EN DONDE SE UBICA LA PROYECCIÓN DE LA TUBERÍA HACIA EL BARRIO LA MARGARITA EN LA CALLE 79 SUR. EN CONEXIÓN A POZO MP-29, SE REALIZA LA RESPECTIVA EXCAVACIÓN, CAMA Y ATRAQUE DE ARENA, Y RELLENO EN MATERIAL SEGÚN LO INDICADO POR LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE SUMIDEROS A POZOS PLUVIALES EN TAMAÑOS DE 12" PVC, EN SECTOR 3 DEL PROYECTO EN CALLE 81 SUR CON CRA 43, DONDE SE REALIZA LA RESPECTIVA EXCAVACIÓN, ALINEACIÓN, CAMA Y ATRAQUE DE ARENA, Y RELLENOS. REMATES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SOLEADO TODO EL DIA, NO SE PRESENTARON LLUVIAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		EXCAVADORA HITACHI	1	
OFICIAL	7	SI		RETROEXCAV. VOLVO	1	
OPERARIO	3	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	10	SI		TROMPO MEZCLADOR	1	
CELADOR	0			CARROTILLAS	4	
TOPÓGRAFO	2	SI		PALAS Y PICAS	10	
CADENERO	2	SI		BARRAS MOCHAS	3	
OTROS VIAJISTAS	3	SI		HERRAMIENTA MENOR	GLB.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA I-1/2"	M3	APROXIMACION NIVEL PAVIMENTO. SECCION 2			
4.1. SARDINEL A-10	ML	INSTALACION SARDINEL A-10			
N.P.7. SARDINEL BAJO RAMPA	UND	INSTALACION SARDINEL A-95			
N.P.8. ARENA LAVADA DE RIO	M3	CAMA Y SENTADO DE SARDINELES			
5.3.5.2. CAJA DE INSPECCION CONCR.	UN.	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION SANITARIA.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	4	10	2024	7:00:00	16:30:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA DERECHA DEL PROYECTO. SE REALIZA SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE TAM MAX 1-1/2" PARA APROXIMACIÓN DE NIVEL DE PAVIMENTO EN SECTOR 2.

* CONTINUA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 Y A-85 (BAJO RAMPA) EN EL SECTOR 3 DEL PROYECTO TANTO EN CUNAS DE SEPARADOR COMO EN ZONA COMERCIAL ENTRE CALLES 80 SUR Y 79 SUR, SE REALIZA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, SENTADO Y ATRAQUE DE ELEMENTOS DE SARDINELES.

* SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN SANITARIAS EN SECTOR 3 DEL PROYECTO EN ZONA COMERCIAL ENTRE CALLES 81 SUR Y 82 SUR. SE REALIZO LA DEBIDA DISPOSICIÓN DE ACERO DE REFUERZO, FORMALETEADO Y CONCRETO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE REJILLAS-MARCO EN CAJAS SUMIDERO DEL SECTOR 2 CALZADA IZQUIERDA, SE VERIFICA EN CAMPO LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDOS MONTAJE Y NIVELACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE CONCRETO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	10	2024	07:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				EN LA MAÑANA SE PRESENTA CLIMA SOLEADO, SIN PRESENCIA DE LLUVIA.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		RETROEXCAV. HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAV. LLANTA	1	
OPERARIO	3	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	10	SI		TRAMPO METÁLICA	1	
CELADOR	0			COMPACTADOR	4	
TOPÓGRAFO	2	SI		PALAS Y PICOS	10	
CADENERO	2	SI		BARRAS MEDICIÓN	3	
OTROS VIALISTAS	3	SI		HERRAMIENTA MENOR	GLB.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M^3	APROXIMACIÓN N.U.P.I PAVIMENTO SECTOR 2			
4.1. SARDINEL A-10	ML	INSTALACIÓN SARDINEL SECTOR 3			
N.P.S. ARENA LAVADA RIO	M^3	CAMA Y ATRAQUE SARDINELES			
IMPLEMENTACION PMA.		RECOLECCION DE DESECHOS DE OBRA, MATERIAL CONTAMINADO. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	10	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA DERECHA DEL PROYECTO EN SECTOR 2 Y MEJORAMIENTO DE NIVEL DE MATERIAL GRANULAR EN SECTOR 3 CALZADA IZQUIERDA PARA PERMITIR UN MEJOR TRANSITO VEHICULAR POR LA ZONA. SE REALIZA EL SUMINISTRO DE MATERIAL CORRESPONDIENTE Y SE DISPONE DE MAQUINARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA ADECUADA.

* CONTINUA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 EN EL SECTOR 3 DEL PROYECTO EN ZONA DE SEPARADOR, SE REALIZAN RETOQUES Y ADECUACIONES SOLICITADAS POR LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO.

* SE REALIZA JORNADA DE ASEO, RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS DE OBRA. DISPOSICIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO DE EXCAVACIONES, REVISION DE CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, SE VERIFICA QUE EXCAVACIONES ABIERTAS, POZOS DE INSPECCION Y SUMIDEROS ABIERTOS QUEDEN DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS PARA EVITAR RIESGOS A LA COMUNIDAD QUE POR SU TRANSITO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO RAI CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
bre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	10	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	10	2024	0:00:00	0:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRA POR SER DIA DOMINGO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		SE PRESENTA CIELO NUBLADO TODO EL DIA, SIN EMBARGO NO SE PRESENTAN LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		RETROEXCAV. HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAV. LLANTA	1	
OPERARIO	4	SI		MINI BOB CAT	1	
AYUDANTE	9	SI		VIBRO COMPACTADOR	1	
CELADOR	0			TROMPO MEZCLADOR	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		CARROTANQUE	4	
CADENERO	2	SI		HERRAMIENTA MENOR	GLB	
OTROS VIALISTAS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M³	APROXIMACION NIVEL PAVIMENTO SECTOR 2.			
3.1.2. EXCAVACION MATERIAL MEC.	M3	EXCAVACIÓN BOLACALLE CRA 83A CALL DER			
3.2.1. SUB-BASE TRITURADO 2"	M3	RELLENO BOLACALLE CLL 83A SUR CALL DER.			
5.3.9.1. DEMOLICION CONCRETO REF.	M3	DEMOLICIÓN TAPA POZO EXISTENTE			
5.3.9.2. DEMOLICION CONCRETO SIMPLE	M3	DEMOLICIÓN POZO EXISTENTE.			
4.1. SARDINEL A-10	ML	INSTALACION SARDINEL A-10 SECTOR 3			
N.P.8. ARENA LAVADA RIO	M3	CAMA Y SENTADO DE SARDINELES			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA DERECHA DEL SECTOR 2, DONDE SE REALIZA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE 1-1/2" PARA REALIZAR APROXIMACIÓN A NIVEL DE ASFALTO EN ESTA ZONA.

* CONTINUA LA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 EN SECTOR 3 DEL PROYECTO DONDE SE REALIZAN LAS CURVAS EN SARDINEL EN SEPARADOR DE CALLE 80 SUR, SE REALIZA DESGLOSADO DE JUNTAS, EXCAVACIÓN, SENTADO, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS.

* SE REALIZA LAS EXCAVACIONES CON EQUIPO MECÁNICO EN ZONA DE BOCACALLE DEL SECTOR 2 DEL PROYECTO DONDE SE CONFORMA LA CALLE 83A SUR Y 83B SUR, CON EL APOYO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO QUE NIVELÓ LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, DE IGUAL MANERA SE REALIZAN RELLENOS CON MATERIAL DE SUBBASE CORRESPONDIENTE.

* SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE POZO SANITARIO EXISTENTE UBICADO EN SECTOR 3 DEL PROYECTO EN CRA 81 SUR CON CRA 43, QUE CON LA ACTIVITACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO QUEDÓ LO SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	8	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		SE PRESENTARON LLUVIAS DESDE HORAS DE LA MADRUGADA HASTA LAS 10:00 Am LO QUE IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBRA POR ESPACIO DE TRES HORAS
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		TRES (3) HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVADORA LLANTAS	1	
OPERARIO	4	SI		MINIBOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		RODILLO COMPACTADOR	1	
CELADOR	0			RETROMPO MEZCLADOR	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		CARGADORES	5	
CADENERO	2	SI		HERRAMIENTA MENOR	GLB	
OTROS VIALISTAS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
PLACA RAIZ POZO INSPECCIÓN 1.50m	UNO	FIGURACIÓN DE ACERO PARA PLACA RAIZ POZO.			
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	APROXIMACIÓN NIVEL RANINEADO SECTOR 2			
7.33.1. SUMIDERO CONCRETO	UND.	CONSTRUCCION SUMIDERO SECTOR 2.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
REPARACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA COMERCIAL.	SE REALIZA REPARACIÓN A ACOMETIDA ELECTRICA AFECTADA DURANTE LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO CAMP 84 SUR.
	SE REALIZA CAMBIO DE TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/4" Y CABLE ELECTRICO DE ACOMETIDA BIFASICO.

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Se realiza figuración de acero para la construcción de parrilla de placa base de pozo de inspección de diam. int. 1,50 m y parrilla de acero de cajas tipo sumidero a construir.

* Continua el suministro de material de base triturado 1-1/2" para la aproximación de nivel de pavimento en sector 2 del proyecto.

* Se realizan actividades de construcción de pozo sumidero faltante en sector 2 del proyecto donde se realiza la excavación, instalación de parrilla de refuerzo y la vertida del solado correspondiente.

* Se realiza reparación a acometida electrica bifasica subterranea no identificada durante labores de excavación de bocacalle de calle 84 sur donde se ubicaba sumidero del proyecto.

* Se realiza las excavaciones con equipo mecánico en zona de bocacalle del sector 2 del proyecto donde se conforma la calle 84 sur, con el equipo de topografía se realiza la nivelación respectiva y de igual manera se realiza el relleno en material granular de subbase correspondiente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
re: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO		X	
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias		1,5 Horas	

OBSERVACIONES:

SE PRESENTAN LLUVIAS A PARTIR DE LAS 12:30 PM HASTA LA 3:00 PM SE DETIENEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE 1 HORA Y MEDIA.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SÍ	
OFICIAL	2	SÍ	
OPERARIO	4	SÍ	
AYUDANTE	9	SÍ	
CELADOR			
TOPÓGRAFO	1	SÍ	
CADENERO	2	SÍ	
OTROS VIALISTAS	3	SÍ	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ORUGA HITACHI	1	
RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
MINIBOBCAT	1	
VIBRO COMPACTADOR	1	
TROMPA MEZCLADORA	1	
CARROTULO	5	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2 BASE TRITURADA I-1/2"	M³	APROLIMACION NIVEL PAVIMENTO SECTOR 2			
7.1.1. CORTES DE PAVIMENTO	ML.	CORTE DE PAVIMENTO EN SECTOR 3			
4.33.1. SUMIDERO CONCRETO	UNI	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SECTOR 2			
4.1 SARDINEL A-10	ML	INSTALACIÓN DE SARDINEL			
M.P.8. DRENO DE RÓ	M²	CAMA Y ATRAGUE SENTADO SARDINEL.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE CAJA SUMIDERO CON LA VERTIDA DE CONCRETO EN SUMIDERO FALTANTE EN SECTOR 2 DEL PROYECTO. SE INSPECCIONA RELLENO Y VERTIDA DE CONCRETO RESPECTIVO.

* CONTINUA CON EL USO DE MAQUINARIA PESADA LA APROXIMACIÓN DE MATERIAL DE BASE EN CALZADA DERECHA SECTOR 2 DEL PROYECTO; CON EL APOYO DE EQUIPO TOPOGRAFICO SE REALIZA LA APROXIMACIÓN DE BASE A NIVEL DE PAVIMENTO.

* SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE CUNETA DE SARDINEL EN BOCACALLE DE CR 87A SUR CON LA INSTALACIÓN DE SARDINEL A-10. SE REALIZA LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, SENTADO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS.

* SE REALIZA CORTE DE PAVIMENTO EN SECTOR 3 DEL PROYECTO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE PORFIA PARA LA INSTALACIÓN FINAL DE TUBERIAS EN SECTOR DEJADO Y LA CONFORMACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN.

* POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN HORA DE LA TARDE SE PRESENTÓ ESTANCAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LAS CALZADAS EXISTENTES LO QUE DIFICULTO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES UNA VEZ MERMADA LA MISMA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO [illegible]ALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
[illegible]bre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA NOCHE Y LA MADRUGADA PRIOR AL INICIO DE LA JORNADA LABORAL.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias		0		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		ORUGA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	4	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		RODILLO COMPACTADOR	1	
CELADOR				TROMPO MEZCLADOR	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		CARROTANQUE	5	
CADENERO	2	SI		MEJORAMIENTO MEZCLA	610	
OTROS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.7.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	APROXIMACION NIVEL PAVIMENTO			
6.3.1.1. TUBERIA PVC 12"	ML	INSTALACION TUBERIA PLUVIAL SUMIDEROS			
6.3.5.1. SUMIDERO - REJILLA	ML	INSTALACION DE MARCO - REJILLA			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* SE PRESENTA DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE LA JORNADA ESTANCAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA ANTERIOR, LO CUAL REQUIRIÓ EL USO DE PERSONAL Y EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGÜAR DE MANERA ADECUADA, Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

* CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN DE MATERIAL DE BASE 1-1/2", CON EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR, EN EL SECTOR 2 CALZADA DERECHA COMO PARTE DE LA APROXIMACIÓN DE MATERIAL A NIVEL DE PAVIMENTO.

* SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE SUMIDEROS FALTANTES EN SECTOR PLUVIAL 2 SOBRE CALLE 84A SUR, DONDE SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y ATRAQUE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. 12" Y RELLENOS RESPECTIVOS.

* CONTINUAN LAS INSTALACIONES DE MARCO - REJILLA EN LOS SUMIDEROS DEL SECTOR 2 DEL PROYECTO, DONDE SE INSPECCIONAN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE LOS MARCOS METÁLICOS A INSTALAR CONFORME A LO REQUERIDO POR EL PROYECTO, SE VERIFICA NIVELACIÓN Y VERTIDA DE CONCRETO RESPECTIVA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO ALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	10	2024	07:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTA DIA SABADO, SIN PRESENCIA DE LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		EXCAVADORA HITACHI	1	MOTONIVELADORA 1
OFICIAL	2	SI		RETRO EXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	5	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		VIBRO COMPACTADOR	1	
CELADOR				TROMPO MEZCLADOR	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		CARRETILLAS	5	
CADENERO	2	SI		HERRAMIENTA MENOR	GLB	
OTROS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	SPRIDDO DE BASE CON MOTONIVELADORA.			
DEMOLICIÓN DE POZO	UND	REMOLICIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO			
4.1 SARDINEL A-10	ML	INSTALACION DE SARDINEL A-10			
6.3.5.1. ANDENES - BERMA	M2	INSTALACION DE MARCO BERMA.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	10	2024	7:00:00	16:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* SE REALIZAN LABORES DE SELLADO DE MATERIAL DE BASE CON USO DE EQUIPO MOTONIVELADOR Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA DE ASFALTO PREVIO A PAVIMENTACIÓN.

* EN HORAS DE LA MAÑANA EN ATENCIÓN A SOLICITUD DE COMUNIDAD SE REALIZA COMITÉ EN OBRA CON LA PRESENCIA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA, VEEDURIA DE TRANSPORTE PUBLICO, GERENTE TRANSPORTE PUBLICO, SEC. DE MOVILIDAD, JA.C. VILLA JULIANA, COMUNIDAD GENERAL Y CONTRATISTA DE OBRA. SE ATIENDEN REQUERIMIENTOS FRENTE A ACTIVIDADES DE AVANCE DE OBRA, INGRESO DE RUTA DE TRANSPORTE PUBLICO DEBIDO A CIERRE DE LA VIA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 43.

* SE REQUIERE REMUNERACION DE PAZ Y SALVO DE INSPECCIÓN PREDIAL Y SANITARIOS PRESENTES EN CALZADA DERECHA SECTOR 2 DEL PROYECTO PREVIO A LA ACTIVIDAD DE PAVIMENTACIÓN.

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE REJILLAS - MARCO DE CAJA TIPO SUMIDERO, PREVIO A ESTO SE VERIFICAN ESPECIFICACIONES DE MATERIAL, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA VERTIDA DE CONCRETO RESPECTIVA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldia de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	10	2024	07:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA SABADO, DURANTE LA JORNADA DE LA MAÑANA NO SE PRESENTARON LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	5	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		RODILLO COMPACTADOR	1	
CELADOR	0			MOTONIVELADORA	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		TROMPO MEZCLADOR	1	
CADENERO	2	SI		CARRETILLAS	5	
OTROS VIALISTAS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M³	SEGUIDO DE BASE CON MOTONIVELADORA			
11 REINSTALACIÓN DE POSTES	UND	REINSTALACION POSTES A NIVEL PAVIMENTO			
4.1. SALDINELES A-10		INSTALACION SARDINEL A-10 SECTOR 2			
6.3.5.1. SUMIDERO - REJILLA		INSTALACIÓN MARCO REJILLA.			
IMPLEMENTACION PMA.		PROTECCIÓN DE OBRAS DE OBRA, MATERIAL CONTAMINADO, ORDEN Y ASEO DE PUESTO DE TRABAJO.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	10	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LABORES DE SUBBASE DE MATERIAL DE BASE CON USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA ASFALTICA PREVIO A PAVIMENTACIÓN.

* SE REALIZA LA REINSTALACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN PLUVIALES Y SANITARIOS PRESENTE EN CALZADA DERECHA SECTOR 2 DEL PROYECTO, PREVIO A LA ACTIVIDAD DE PAVIMENTACIÓN.

* CONTINUAN LA INSTALACIÓN DE REJILLAS - MARCO DE CAJAS TIPO SUMIDERO, PREVIO A ESTO SE VERIFICA LA ESPECIFICACIONES DE (MATERIAL Y GEOMETRIA DE MARCOS A INSTALAR, ASI COMO LA NIVELACION CORRESPONDIENTE PARA LA VERTIDA DE CONCRETO RESPECTIVA.

* SE REALIZA JORNADA DE ASEO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS DE OBRA. DISPOSICIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO, SE REVISAN CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACION DE OBRA DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMO POZOS DE INSPECCIÓN. CAJAS SUMIDERO Y ESTRUCTURAS DE BOX COULVERT, QUEDAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS PARA EVITAR RIESGOS A LA COMUNIDAD QUE POR ALLÍ TRANSITAN.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	10	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				No se realizan actividades dto domingo
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	10	2024		

OBSERVACIONES GENERALES

No se Realizan ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINGO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE REALIZAN LABORES, DIA FESTIVO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE REALIZAN LABORES POR SER DÍA FESTIVO. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES DE OBRA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO AZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA SOLEADO, S/N PRESENCIA DE LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		ORUGADO HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVA. LLANTA	1	
OPERARIO	5	SI		MIN. BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		VIBRO COMPACTADOR	1	
CELADOR	0			MOTONIVELADORA	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		TRAMPO MEZCLADOR	1	
CADENERO	1	SI		CARROTANQUE	5	
OTROS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M³	SEGUNDO DE BASE CON MOTONIVELADORA.			
		RELLENO DE BOLOCALLAS EN BASE			
6.3.5.1. SUMIDERO - REJILLA	ML.	INSTALACION MARCO - REJILLA.			
4.1. SEÑALIZACION A-10		INSTALACION SEÑAL SECTOR 2.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE SELLADO DE MATERIAL DE BASE CON USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA ASFALTICA PREVIO A PAVIMENTACIÓN, SE REALIZA ADEMAS COMPACTACION REQUERIDO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR, LABORES REALIZADAS EN SECTOR 2 CALZADA DERECHA

* SE REALIZA RELLENO DE MATERIAL DE BASE EN BOCACALLE DE CALLE 83A Y 83B SUR DONDE SE APROXIMA MATERIAL A NIVEL DE PAVIMENTO.

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE MARCO - REJILLA EN ZONA DE SUMIDERO DE BOCACALLE DE SECTOR DOS CALZADA DERECHA, SE VERIFICA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN TECNICA DE MATERIAL, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIO A LA VERTIDA DE CONCRETO.

* SE REALIZA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 EN CURVAS DE BOCACALLE DE CALLE 84A SUR. CON LA RESPECTIVA ANDEJACIÓN, SENTADO Y SELLO DE JUNTA CONFORMANDO ASI LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ESTE PUNTO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
e: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado, Sin presencia de lluvias.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Omagua Hitachi	1	
OFICIAL	2	SI		Retroexcavadora Llanta	1	
OPERARIO	5	SI		Mini Bobcat	1	
AYUDANTE	9	SI		Vibro compactador	1	
CELADOR	0			Motoniveladora	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		Trompo mezclador	1	
CADENERO	2	SI		Carretillas	5	
OTROS Visita	3	SI		Planta Electrica	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. Base Triturada 1-1/2"	M3	Sellado de Base con Motoniveladora			
4.1. Sardineles A-10	ML	Instalación de Sardinel A-10			
6.3.5.1. Sumidero Rejilla	ML	Instalación Marco Rejilla.			
N.P.2 - Demolición de Placa.	UN.	Demolición de Pozo a nivel de Pavimento.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE SERVIDO DE MATERIAL DE BASE CON USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA Y EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA ASFÁLTICA PREVIO A PAVIMENTACIÓN. SE REALIZA COMPACTACIÓN REQUERIDO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR; LABORES REALIZADAS EN SECTOR 2 CALZADA DERECHA
* CONTINUAN ACTIVIDADES DE RELLENO DE MATERIAL DE BASE EN BOCA CALLE 93, DONDE SE REALIZA APROXIMACIÓN DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN RESPECTIVA.
* CONTINUAN LA INSTALACIÓN DE MURO-REJILLA DE SUMIDEROS EN SECTOR 2 DEL PROYECTO, SE INSPECCIONA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, GEOMETRÍA, Y NIVELACIÓN PREVIO A LA VERTIDA DE CONCRETO.
* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 EN CURVA DE BOCACALLE DE CALLE 93 SUR CON LA RESPECTIVA NIVELACIÓN, SENTADO, Y SELLO DE JUNTA CONFINANDO ASÍ LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ESTE PUNTO.
* CONTINUA LA REINSTALACIÓN DE POZOS SANITARIOS EXISTENTES SOBRE CALZADA DERECHA DEL SECTOR 2 DEL PROYECTO, EN ARAS DE DICANTAR EL NIVEL DE RASANTE DE PAVIMENTO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO [illegible]CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
[illegible]re: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:

DIA SOLEADO, SIN PRESENCIA DE LLUVIAS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
OTROS VIGILIA	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA HITACHI	1	
RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
MINI BOBCAT	1	
VIBRO COMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
TROMPO MEZCLADORA	1	
CARRETILLA	5	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	SUMINISTRO DE BASE CON MOTONIVELADORA			
6.3.5.1. SUMIDERO REJILLA	ML	INSTALACIÓN MARCO REJILLA			
N.P.2 RENIVELACIÓN DE POZOS	UN	RENIVELACION DE POZOS A NIVEL DE PAVIMENTO.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE SELLADO DE MATERIAL DE BASE CON USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA ASFALTICA, PREVIO A PAVIMENTACIÓN, SE REALIZA COMPACTACIÓN REQUERIDO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR. LABORES REALIZADAS EN SECTOR 2 CALZADA DERECHA.

* CONTINUA LA INSTALACIÓN DE MARCO-REJILLA DE SUMIDEROS EN SECTOR 2 DEL PROYECTO, SE INSPECCIONA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIA A LA VERTIDA DE CONCRETO.

* SE REALIZA LA RENIVELACIÓN DE POZO SANITARIO EXISTENTE SOBRE CALZADA DERECHA DEL SECTOR 2 DEL PROYECTO, EN ARAS DE ALCANZAR EL NIVEL DE RASANTE DE PAVIMENTO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO [illegible]CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
[illegible]re: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	10	2024	07:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO	X	X	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: DIA SOLEADO, SIN PRESENCIA DE LLUVIA.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		ORUGA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAV. LLANTA	1	
OPERARIO	5	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		VIBRO COMPACTADOR	1	
CELADOR	0			MOTONIVELADORA	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		TRUMPO MEZCLADORA	1	
CADENERO	2	SI		CARRETILLA	5	
OTROS VIALISTA	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	SEGUIDO DE BASE CON MOTONIVELADORA.			
N.P.7. SARDINEL BAJO RAMPA.	UN.	INSTALACIÓN SARDINEL A-85 SECCIÓN 2.			
6.3.5 1. SUMIDERO REJILLA.	Mi.	INSTALACION MARCO REJILLA.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	10	2024	7:00:00	16:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE SELLADO DE MATERIAL DE BASE EN SECTOR 2 CALZADA DERECHA CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA, EQUIPO TOPOGRAFICO. Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA ASFALTICA PREVIO A PAVIMENTACIÓN.

* SE REALIZA LA INSTALACION DE MURO - BERMA DE SUMIDERO EN SECTOR 2 DEL PROYECTO CALZADA IZQUIERDA, SE INSPECCIONA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIA A LA VERTIDA DE CONCRETO

* SE REALIZA LA INSTALACION DE SUMIDERO BAJO RAMPA (A-BJ) EN SECTOR 2 DEL PROYECTO DONDE SE REALIZA LA RESPECTIVA EXCAVACION, NIVELACIÓN, SENTADO Y ATRAQUE DE ARENA, E INSTALACIÓN DE ELEMENTO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO B. CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	10	2024	07:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA MADRUGADA PREVIO A LA JORNADA DE TRABAJO, SE PRESENTA EMPOZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	02	SI	
CADENERO	2	SI	
OTROS	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ORUGA HITACHI	1	
RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
MINI BOBCAT	1	
VIBRO COMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
TIEMPO MEZCLADORA	1	
CARRETILLA	5	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M³	SEGUIDA DE BASE CON MOTONIVELADORA			
6.3.5.1. SUMIDERO REJILLA	ML	INSTALACION MARCO REJILLA			
IMPLEMENTACIÓN DEL PMA.		RECOLECCION DE DESECHOS DE OBRA, MATERIAL CONTAMINADO, ORGANIZACION Y ASEO DE OBRA.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	10	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA DERECHA DEL PROYECTO SECTOR 2 PARA EL SECADO DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA ASFALTICA PREVIO A PAVIMENTACIÓN.

* CONTINUAN LA INSTALACIÓN DE MARCO REJILLAS DE SUMIDEROS DE SECTOR 2 CALZADA IZQUIERDA DEL PROYECTO, SE INSPECCIONA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIA A LA VERTIDA DE CONCRETO.

* SE REALIZA JORNADA DE ASEO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE OBRA, SE DISPONE DE MATERIAL CONTAMINADO PARA EL RETIRO. SE REVISAN CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIONES DE POZOS DE INSPECCIÓN Y CAJAS SUMIDEROS A LO LARGO DEL PROYECTO. SE INCLUYE SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE BOX CULVERT, DE MANERA QUE SE MITIGUEN LOS POSIBLES RIESGOS PARA LA COMUNIDAD QUE POR ALLÍ TRANSITAN.

* POR OTRA PARTE SE DISPONE DE MAQUINARIA, PERSONAL Y MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA MEJORANDO EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL POR LA ZONA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	10	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE REALIZAN LABORES DE OBRA POR SER DOMINGO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
[illegible]COS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	10	2024	0:00:00	0:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizan labores de obra por ser domingo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
bre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		DÍA CON CIELO NUBLADO, SIN EMBARGO NO SE PRESENTAN LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		ORUGA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	5	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		TRONPO MEZCLADOR	1	
CELADOR	0	NO		COMPACTADORA	5	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADORA	1	
OTROS VIALISTAS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M³	SEXTADO DE BASE CON MOTONIVELADORA			
7.3.3. SUMIDERO - REJILLA	ML	INSTALACIÓN DE MARCO REJILLA SECTOR 3			
4.1 SARDINEL A-10	ML	INSTALACIÓN DE SARDINEL A-10 SECTOR 3			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA DERECHA DEL PROYECTO SECTOR 2. PARA EL SEMBRADO DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR. PARA NIVELAR MATERIAL A REPLANTE DE CARPETA ASFALTICA PREVIA A PAVIMENTACION.

* CONTINUAN LA INSTALACIÓN DE MARCOS - REJILLAS DE SUMIDERO SECTOR 3 CALZADA DERECHA DEL PROYECTO. SE INSPECCIONA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIA A LA VERTIDA DE CONCRETO.

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE SARDINEL A-10 EN SECTOR 3 CALZADA DERECHA DEL PROYECTO EN ZONA COMERCIAL DE LA CALLE 81 SUR, DONDE SE DISPONE DE ELEMENTOS A-10. SE REALIZAN LAS EXCAVACIONES, NIVELACIÓN Y SENTADO ADECUADO SEGÚN LOS DISPUESTO POR EL PERFIL VIAL DEL PROYECTO.

* SE REALIZA MEJORAMIENTO A CARPETA DE RODADURO EN ZONA DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DONDE SE PRESENTARON AFECTACIÓN AL MATERIAL DEBIDO AL EMPOZAMIENTO DE AGUAS, CON EL USO DE MAQUINARIA PESADA ADECUADA PARA TAL FIN.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO [illegible]AZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO		X	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA PREVIO A LA JORNADA LABORAL, SE PRESENTAN EMPOZAMIENTOS DE AGUA.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	1	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0	NO	
TOPÓGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
OTROS VIGILANTE	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA HITACHI	1	
RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
MINI BOBCAT	1	
TROMPO MEZCLADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
CARROTANQUE	5	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA A-1 1/2"	M³	SECCION DE BASE CON MOTONIVELADORA			
2.3.3.1. SUMIDERO REJILLA	M1	INSTALACIÓN DE MARCO-REJILLA SECTOR 3			
4.1 SARDINEL A-10	M1	INSTALACIÓN DE SARDINEL A-10			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE SERRADO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA DERECHA SECTOR 2. PARA EL SERRADO DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA EQUIPO PAVIMENTADOR Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR, PARA NIVELAR MATERIAL A BASANTE DE CARPETA PREVIO A PAVIMENTACION.

* CONTINUAN LA INSTALACIÓN DE MARCOS-REJILLAS DE SUMIDEROS EN SECTOR 3 CALZADA DERECHA DEL PROYECTO, SE INSPECCIONA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIA A LA VERTIDA DE CONCRETO

* CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 EN SECTOR 3 CALZADA DERECHA DEL PROYECTO EN ZONA COMERCIAL DE LA CALLE 8 SUR, DONDE SE DISPONE DE ELEMENTOS, Y SE REALIZAN LAS EXCAVACIONES, NIVELACIÓN Y SENTADO ADECUADO, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL PERFIL VIAL DEL PROYECTO.

* EN AREAS DE HABILITAR EL INICIO DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZAN ENSAYOS DE COMPACTACIÓN AL MATERIAL DE BASE DISPUESTO CON EL USO DE EQUIPO DE LABORATORIO CONTRATADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y EN PRESENCIA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA. SE REALIZAN CUIDADOS AL MATERIAL CADA 50 METROS EN UNA CANTIDAD TOTAL DE CINCO (5) MUESTRAS. LOS RESULTADOS SERÁN ENVIADOS A LA INTERVENTORIA PARA SU VERIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE INICIO DE ASFALTADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATÓ INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA SOLEADO, SIN PRESENCIA DE LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	CUADRILLA PAVIMENTO 1	OLLADO HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	6	SI		MINIBOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		MOTONIVELADORA	1	
CELADOR	0			VIBROCOMPACTADOR	2	
TOPÓGRAFO	2	SI		RODILLO	1	
CADENERO	2	SI		FINISHER	1	
OTROS VIGILANTES	3	SI		TROMPO MEZCLADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	SEGUNDA CAPA DE BASE CON MOTONIVELADORA CAT. 120			
3.2.4. IMPRIMACIÓN ASFALTICA	M2	APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN ASFALTICA			
3.2.5 SUMINISTRO, EXT. COMP. MDC-19	M3	INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO.			
N.D.2. NIVELACIÓN DE POZOS	UN	NIVELACIÓN DE POZOS EXISTENTES			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* SE REALIZAN LAS LABORES DE SELLADO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA IZQUIERDA SECTOR 2, PARA EL SELLADO DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR, PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA PREVIO A PAVIMENTACIÓN

* SE VERIFICA CON INTERVENTORÍA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE COMPACTACIÓN REALIZADOS EL DIA ANTERIOR, SE CONSTATA EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN REQUERIDO RESPECTO AL ENSAYO PROCTOR STANDARD REALIZADO AL MATERIAL POR LABORATORIO, CON ESTO SE VIABILIZA LA INSTALACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE ASFALTO DE PROYECTO.

* SE REALIZA EN HORAS DE LA MAÑANA LA IMPRIMACIÓN ASFALTICA SOBRE CALZADA DERECHA DEL PROYECTO DESDE ABS K 0+295 HASTA ABS K 0+420, SE VERIFICA CORRECTA APLICACIÓN Y CUBRIMIENTO DE LA LIGA ASFALTICA PARA EL CORRECTO SELLO Y ADHERENCIA CON EL ASFALTO.

* EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA SOBRE CALZADA DERECHA DEL SECTOR 2 DEL PROYECTO. EN PRESENCIA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA, OBRA Y COORDINADOR DE PAVIMENTO SE VERIFICAN ESPESORES DE CAPA DE PAVIMENTO, TEMPERATURA DE CARGA ASFALTICA PREVIO AL VACIADO EN FINISHER Y CARACTERISTICAS DE MATERIAL A INSTALAR, SE VERIFICA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE CONTROL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

* SE REALIZA REINSTALACIÓN DE POZO SANITARIO EN SECTOR 2 CALZADA IZQ. DE MANERA TAL QUE SE NIVELA TAPA A RASANTE DE PAVIMENTO EN AREA DE LA ACTIVIDAD DE PAVIMENTO PROXIMA A REALIZAR.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	24	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LAS HORAS DE LA NOCHE Y MADRUGADA PREVIO A LA JORNADA DE TRABAJO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	CUADRILLA PAVIMENTO 1	RETROEXCAVADORA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCV. LLANTA	1	
OPERARIO	6	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		MOTONIVELADORA	1	
CELADOR	0			TREN DE RUEDA	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		FINISHER	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR	2	
OTROS VIALISTAS	3	SI		TROMPO MEZCLADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.22 BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	SUMINISTRO DE BASE CON MOTONIVELADORA SECTOR 2			
3.24. IMPRIMACION ASFALTICA	M2	APLICACIÓN DE IMPRIMACION ASFALTICA			
3.2.5. SUM. EXT. COMP. MDC-19	M3	INSTALACION DE PAVIMENTO ASFALTICO.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Continuan las labores de Señalización de Estructura de Pavimento sobre Calzada Izquierda Sector 2, para el Sellado del Material de Base con el uso de Equipo Motoniveladora, Equipo Topografico y Equipo Vibrocompactador para Nivelar Material a Base de Carpeta Previo a Pavimentación.

* Se Realiza en Horas de la Mañana la Imprimación Asfaltica sobre Calzada Derecha del Proyecto Desde ABS K0+420 Hasta ABS K0+495, se Verifica Correcta Aplicación y Cubrimiento del Area a Asfaltar por la Uña Asfaltica, para el Correcto Sello y Adherencia del Asfalto.

* En Horas de la Tarde se Realiza la Instalación de Carpeta Asfaltica Sobre Calzada Derecha del Sector 2 del Proyecto. En Presencia de Personal de Interventoria, Obra y Coordinador de Pavimento se Verifica Espesores de Capa de Pavimento, Temperatura de Capa Asfaltica Previo al Vaciado en Finisher y Caracteristicas de Material a Instalar, se Verifica Cumplimiento de Especificaciones de Control para la Correcta Ejecución de la Actividad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	25	10	2024	07:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado Sin Presencia de Lluvias.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	WADRILLA PAVIMENTO 1	RETROEXCAVADORA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAV. LLANTA	0	
OPERARIO	6	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		MOTONIVELADORA	1	
CELADOR	0	NO		VIBROCOMPACTADORA	2	
TOPÓGRAFO	2	SI		TREN DE SELLO	1	
CADENERO	2	SI		FINISHER	1	
OTROS VIALISTAS	3	SI		TRAMPA METALICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. RAST TRITURADO 1-1/2"	M^3				
3.2.4 IMPRIMACION ASFALTICA	M^2				
3.2.5. SUM, EXT. GRAD. MDC-19	M^3				
7.3.7.1. SUMIDERO REJILLA	M.				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	10	2024	7:00:00	16:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SELLADO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA IZQUIERDA SECTOR 2, PARA EL SELLADO DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA, EQUIPO TOPOGRAFICO, Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR. PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA PREVIO A PAVIMENTACIÓN.

* SE REALIZA EN HORAS DE LA MAÑANA IMPRIMACIÓN ASFALTICA SOBRE CALZADA DERECHA EN BOCACALLES DE CALLES 83SUR, 83A SUR, 83B SUR, 84 SUR, SE VERIFICA CORRECTA APLICACIÓN Y RECUBRIMIENTO DEL AREA A ASFALTAR POR LA UNA ASFALTICA PARA EL CORRECTO SELLO Y ADHERENCIA DEL ASFALTO.

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA SOBRE BOCACALLES DEL SECTOR 2 CALZADA DERECHA. CON PRESENCIA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA, OBRA Y COORDINADOR DE PAVIMENTO SE VERIFICA ESPESOR DE CAPAS DE PAVIMENTO, TEMPERATURA DE CARGA ASFALTICA PREVIO AL VACIADO EN FINISHER Y CARACTERISTICAS DE MATERIAL A INSTALAR. SE VERIFICA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE CONTROL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

* EN ZONAS DE VACIADO ASFALTO POR LA CALZADA IZQUIERDA DEL SECTOR 2 SE REALIZAN ENSAYOS DE COMPACTACIÓN AL MATERIAL DE BASE DISPUESTO, CON EL USO DE EQUIPO LABORATORIO CONTRATADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA, Y EN PRESENCIA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA, SE REALIZAN ENSAYOS AL MATERIAL CADA 50 METROS, SE TOMAN 4 MUESTRAS AL MATERIAL.

* CONTINUA LA INSTALACIÓN DE MARCOS REJILLAS DE SUMIDEROS EN SECTOR 3 CALZADA DERECHA DEL PROYECTO. SE INSPECCIONA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIA A LA VERTIDA DE CONCRETO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	10	2024	07:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1		CUADRILLA PAVIMENTO 1	RETROEXCAVADORA HITACHI	1	
OFICIAL	2			RETROEXCAVADORA CLARK	1	
OPERARIO	6			MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9			MOTONIVELADORA	1	
CELADOR	0			TREN DE SELLO	1	
TOPÓGRAFO	2			FINISHER	1	
CADENERO	2			V. PRO COMPACTADOR	2	
OTROS Visitas	3			TRAMPO METÁLICO	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA 1-1/2"	m^3	SUMINISTRO DE BASE CON MOTONIVELADORA			
3.2.4. IMPRIMACION ASFALTICA	m^2	APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN ASFALTICA			
3.2.5. SUM. EXT. COMP. MDC-19	m^2	INSTALACION DE PAVIMENTO ASFALTICO.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	10	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE SERRADO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA IZQUIERDA SECTOR 2, SE REALIZA EL SERRADO DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADOR, EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR. PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE CARPETA PREVIO A PAVIMENTACIÓN.

* SE REALIZA EN HORAS DE LA MAÑANA LA IMPRIMACION ASFALTICA SOBRE SECTOR 2 CALZADA IZQUIERDA DESDE ABSCISA K0+269 HASTA ABSCISA K0+400, SE VERIFICA CORRECTA APLICACION Y RENDIMIENTO DEL RIEGO A ASFALTAR POR LA LINEA ASFALTICA PARA EL CORRECTO SELLO Y ADHERENCIA DEL ASFALTO.

* EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA SOBRE CALZADA DERECHA DEL SECTOR 2 DEL PROYECTO. EN PRESENCIA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA, OBRA Y COORDINADOR DE PAVIMENTO SE VERIFICAN ESPESORES DE CAPA DE PAVIMENTO, TEMPERATURA DE CAPA ASFALTICA PREVIO AL VACIADO EN FINISHER Y CARACTERISTICAS DE MATERIAL A INSTALAR. SE VERIFICA CUMPLIMIENTO DE CONTROL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

* POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE LA INSTALACION DE PAVIMENTO SE VIO INTERRUMPIDA POR ESPACIO DE 1 HORA MIENTRAS LAS CONDICIONES DE CLIMA LO PERMITIAN, SE VERIFICÓ ESTADO DEL PAVIMENTO UNA VEZ SUPERADAS LAS LLUVIAS Y NO SE EVIDENCIÓ AFECTACIONES NI DAÑOS EN LA CARPETA INSTALADA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	10	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE REALIZAN LABORES DE OBRA POR DIA DOMINGO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	10	2024		

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE REALIZAN LABORES DE OBRA POR SER DIA DOMINGO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	28	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X		
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO		X	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: SE PRESENTA DIA SIN LLUVIA.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	6	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
OTROS VIALISTAS	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
CARGADOR HITACHI	1	
RETROEXCAV. LLANTA	1	
MINI BOBCAT	1	
MOTO NIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
CARRETILLAS	3	
TRAMPO METALICO	1	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.3. - SELLADO DE BORDE	M3	SELLADO DE BORDE CON MOTONIVELADORA			
5.3.9.2. DEMOLICION DE POZO EXIST.	UND.	DEMOLICION POZO EXISTENTE.			
4.1. SARDINELES A-10	ML	INSTALACION DE SARDINEL A-10			
4.3.3.1. SUMIDERO REJILLA	M1	INSTALACION DE MARCO REJILLA SUMIDEROS.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE SARDINEL DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA IZQUIERDA SECTOR 2, SE REALIZA EL SARDINEL DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADOR, EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR PARA NIVELAR MATERIAL A RASANTE DE ASFALTO DE CARPETA.

* SE REALIZA LA DEMOLICION DE POZO SANITARIO EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 82 SUR CON CRA 43.. CUAL UNA VEZ REALIZADA LA ACOMETIDA DE LA RED SANITARIA ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO.

* CONTINUAN LAS INSTALACIONES DE SARDINEL EN SECTOR 3 EN ZONAS COMERCIALES ALEDAÑAS A LA CALLE 81 SUR, DONDE SE REALIZAN LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, SENTADO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE URBANISMO.

* CONTINUAN LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE MARCO-REJILLAS DE SUMIDEROS EN SECTOR 3 DEL PROYECTO SE VERIFICA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICO, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		AL SE PRESENTAN LLUVIAS.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		CARGADOR HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXCAVADORA LLANTA	1	
OPERARIO	5	SI		MINI BOBCAT	1	
AYUDANTE	9	SI		MOTONIVELADORA	1	
CELADOR	0	NO		VIBROCOMPACTADOR	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		VOLQUETAS	7	
CADENERO	2	SI		TROMPO MEZCLADOR	1	
OTROS VIALISTAS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2. BASE TRITURADA H=17"	M3	PERIODO DE BASE CON MOTONIVELADORA.			
4.3.3.1 SUMIDERO DOBLE	UN	INSTALACION DE MARCO-REJILLA SUMIDERO			
2.1.2. DEMOLICIÓN PAVIM. ASF.	M3	DEMOLICIÓN DE ASFALTO EXISTENTE			
INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANT	ML	INSTALACIÓN DE TUBERIA SECTOR CONCEJO.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUA LAS LABORES DE FRESADO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SOBRE CALZADA IZQUIERDA SECTOR 2, SE REALIZA EL FRESADO DE MATERIAL DE BASE CON EL USO DE EQUIPO MOTONIVELADORA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPO VIBROCOMPACTADOR PARA NIVELAR MATERIAL D RASANTE DE ASFALTO.

* CONTINUA LA INSTALACIÓN DE REJILLAS SUMIDEROS DEL SECTOR 3 DEL PROYECTO. EN SUMIDEROS UBICADOS SOBRE CALLE 60 SUR, DONDE SE REALIZAN VERIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GEOMETRÍA Y NIVELACIÓN PREVIO A VACIADO DE CONCRETO.

* SE REALIZA DEMOLICION DE ASFALTO EXISTENTE EN ZONA DE PLUVIAL 3, SOBRE ZONA COMERCIAL DE PORFIA, EN AREA DE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE TUBERIAS. SE REALIZA LA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO CON EL USO DE VOLQUETAS.

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA PLUVIAL FALTANTE EN SECTOR 3 DEL PROYECTO ZONA CORRUGADO, DONDE CON EL USO DE MAQUINARIA PESADA SE REALIZO LA RESPECTIVA EXCAVACIÓN, RELLENO, ATRAQUE EN ARENA Y INSTALACIÓN DE TUBERIA PVL. CORRUGADO PLUVIAL.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO LAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	30	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				OFA SIN PRESENCIA DE LLUVIAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		EXCAVADORA HITACHI	1	
OFICIAL	2	SI		RETROEXC. FIJO	1	
OPERARIO	5	SI		MINI RETRO	1	
AYUDANTE	9	SI		MOTONIVELADORA	1	
CELADOR	0			VIBROCOMPACTADOR	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		CARROTANQUE	1	
CADENERO	2	SI		TRAMPO M27 CLASE	1	
OTROS VIALISTAS	3	SI		PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
2.5.3.1. SUMIDERO REJILLA	ML	INSTALACION DE MARCO - REJILLA.			
2.1.2. DEMOLICION PAVIMENTO	M3	DEMOLICIÓN DE ASFALTO EXISTENTE.			
INSTALACION TUBERIA PLUVIAL	ML	INSTALACIÓN TUBERIA Y DUCTOS CORRUGADO			
DEMOLICION PLACA CONCRETO	M3	DEMOLICION PLACA CONCRETO CAMARA COMBUSTIBLE			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE MARCOS - REJILLAS DE SUMIDEROS EN EL SECTOR 3 DEL PROYECTO, DONDE SE INSPECCIONA PREVIO A LA VERTIDA DE CONCRETO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, GEOMETRIA Y NIVELACIÓN.

* CONTINUA LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ZONA DEL PLUVIAL 3 SOBRE ZONA CONTIGUA DE PORFIA, EN ARAS DE REALIZAR LA INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL. SE REALIZA LA DISPOSICIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO CON EL USO DE VOLQUETAS.

* SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL FALTANTE EN SECTOR 3 DEL PROYECTO ZONA CONCLUIDO, DONDE CON EL USO DE MAQUINARIA PESADA SE REALIZÓ LA RESPECTIVA EXCAVACION, RELLENO, ATRAQUE EN ARENA E INSTALACIÓN DE TUBERIA PLUVIAL PVC.

* SE REALIZO LA DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO EXISTENTE EN ZONA DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PERMITIR LA INSTALACION DE SARDINEL DEL PERFIL VIAL DEL PROYECTO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	31	10	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Día sin lluvia
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1			Retroexcavadora Hitachi	1	
OFICIAL	2			Retroexcavadora Volvo	1	
OPERARIO	4			Mini Bobcat	1	
AYUDANTE	9			Vibrocompactadora	1	
CELADOR	0			Carretillas	5	
TOPÓGRAFO	2			Trompo de Concreto	1	
CADENERO	2			Planta Electrica	1	
OTROS Visitas	3			Herramienta Menor	GLB	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6. Manejo de aguas por Cuen.	MES.	Uso de Bombas en Fondo de Box Culvert.			
7.7.4. Manejo de Agua Sector 3	Día	Manejo de agua nivel freatico Sector 3			
2.1.2. Demolición Pavimento	ML	Demolicion asfalto existente			
Instalacion Tubería Pluvial	ML	Instalacion Tubería Sector Confinados.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	31	10	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Continua la demolición de pavimento asfaltico en zona de pluvial sector 3 sobre zona comercial de porfia, en area de realizar la instalación de tuberia pluviales, se realiza la disposición de material demolido con el uso de volquetas.

* Se realizo manejo de aguas en zona de estructura de box coulvert para reanudar labores de construccion, con lo que se realiza limpieza de elementos arrastrados por el afluente.

* Se realiza manejo de aguas en zona de sector pluvial 3 zona de porfia, puesto que la tuberia de 33" se encuentran llenas de agua por las lluvias presentadas en horas de la noche.

* Se realiza la instalación de tuberias pluviales del sector 3 del proyecto zona de porfia, donde se realiza la excavación, cama de arena, instalación de tuberia y rellenos respectivos de acuerdo a lo indicado por planos del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	11	2024	07:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	X	X	
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias		5	

OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA MAÑANA Y PARTE DE LA TARDE.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1		
OFICIAL	2		
OPERARIO	4		
AYUDANTE	9		
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	2		
CADENERO	2		
OTROS VIGILANTE	3		

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ORUGA HITACHI	1	
RETROEXCAV. LLANTA	1	
MINI BOBCAT	1	
VIBRO COMPACTADOR	1	
CARRETILLAS	4	
TRUMPO MEZCLADOR	1	
PLANTA ELECTRICA	1	
HERRAMIENTA MENOR	GLB.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
2.2.2. BASE TRITURADA FAM 1-1/2"	M3	MEJORAMIENTO DE RELLENO SECON CORCOVADO.			
4.1. SARDINEL A-10	ML.	INSTALACION DE SARDINEL A-10			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	11	2024	7:00:00	16:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* SE REALIZA MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE BASE NIVELADO EN ZONA DE TUBERIA PRINCIPAL PLUVIAL DEL SECTOR 3, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS Y TRANSEUNTES POR EL SECTOR.

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE SARDINELES A-10 EN SECTOR 3 ZONA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE, YA QUE UNA VEZ DEMOLIDA LA PLACA DE CONCRETO DE LOS ACCESOS A LA ESTACIÓN ES POSIBLE ADELANTAR LAS LABORES DE ADECUACIÓN DEL URBANISMO EN LA ZONA, SE REALIZA LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SENTADO, DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE SARDINEL.

* DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA JORNADA LABORAL NO FUE POSIBLE REALIZAR MAS ACTIVIDADES, SE PRESENTAN EMPOZAMIENTOS DE AGUA EN EXCAVACIONES ABIERTAS, CALZADAS DEL SECTOR 3 Y EXCAVACIONES PARA URBANISMO.

SE REINICIAN LABORES DE FIGURACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS COMO POZOS, SUMIDEROS Y OTROS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
ore: CAMILO ANDRES CABALLERO AZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	11	2024	07:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Día sin presencias de lluvias durante jornada laboral.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA	1	
OFICIAL	2	SI		MINICARGADOR	1	
OPERARIO	5	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
AYUDANTE	9	SI		MINICARGADOR	1	
CELADOR	0	NO		MINIRETRO	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		TRAMPA MP	1	
JENERO	2	SI		PLANTA ELECTRICA	1	
.OS VIALISTAS	3	SI		CARROTANQUE	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.2 BASE TRITURADA E=12"	M3	ALTERADO DE MATERIAL CON MOTONIVELADORA			
3.16. MONTAJE DE MEZCLA BOX CULVERT	MES	MONTAJE DE MEZCLA ZONA BOX CULVERT.			
M.P.2. SARDINEL BAJO RAMPA.	UNID.	INSTALACIÓN SARDINEL ALCANTARILLA SECTOR 2.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	11	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Continuan las labores de Segundo de Material de Base en Sección 2 Calzada Izq. del Proyecto. Se Realizan Trabajos con Equipo Motoniveladora, Vibrocompactador y Equipo Topografico.

* Se Realiza la instalación de Sardinel Bajo Rampa (D-81) en Bocacalle del Sector 2 Calzada Derecha para confinar el limite de la Estructura de Pavimento en las Aceras. Se Realiza la Excavación, Nivelado y Sentado de dicho Elemento.

* Continua el Manejo de Aguas en Zona de Box Coulvert para Realizar Labores de Limpieza de Material Arrastrado por el Aguacero y del Concreto Atrapado en el Acero de Refuerzo Expuesto, En Aras de Reiniciar las Labores de Construcción del Box Coulvert en su Fase 2.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
bre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	11	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE REALIZARON LABORES DE OBRA.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
[illegible]ENERO						
[illegible]OS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	11	2024		

OBSERVACIONES GENERALES

* NO SE REALIZARON LABORES DE OBRA POR SER DOMINGO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				No se realizaron labores de obra por ser festivo.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES DE OBRA PARA ESTE DIA. FESTIVO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
TROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.2.7. BASE TRITURADO A-1 1/2"	M³	APROXIMACIÓN SECTOR 3 CALZADA DERECHA.			
1.1.6. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES BOX	MES	BOMBEO PARA EVACUAR AGUAS EN ZONA DE BOX C			
4.1 SARDINEL A-10	ML	INSTALACIÓN SARDINEL A-10			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Se Realizan Trabajos de Aproximación de Material Granular en Sector 3 Calzada Derecha. Con uso de Equipo Motoniveladora, Vibrocompactador, Mini Bobcat y Topografía, se Realiza Limpieza y Recolección de Material Contaminado, Organización de Zona de Pozos y Sumideros. y Nivelación de Material para Acondicionar Futuros Trabajos de Sellado.

* En Zona de Box Culvert se Realiza Manejo de Aguas con Equipo de Mini Bombas de 4" y 2", Así como también se Realiza Achique y Encauce de Cauce en otra Dirección de Manera tal que Permita Adelantar Labores sobre el Lecho del Mismo.

* Se Realizan Trabajos de Instalación de Sardinel A-10 y Bajo Rampa en Sector 2 y 3. En Zonas de Cunetas de Urbanismo y Bolas Calles de Confinamiento Respectivamente. Se Realizan Excavaciones, Nivelado, Sentado de Elementos y Sello de Juntas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO [illegible]LCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-69176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Se realizan trabajos de aprovechamiento de material granular en sector 3 calzada derecha con uso de equipo motoniveladora, vibrocompactador y minicargador, bajo la supervisión de topografía en el control de niveles de rasante, continua la limpieza y recolección de material contaminado, y la adecuación de zona alrededor de pozos y sumideros.

* Continuando con trabajos de manejo de aguas y achique de aguante como grande para adelantar tareas de limpieza y remoción de material en el lecho de box para continuar labores de construcción de fase 2.

* Continúan las labores de instalación de sardinel bajo ramps en zona de bolardo de sector 2 calzada izquierda como confinamiento de la estructura de pavimento en todos accesos, además se conforman los accesos en bajo ramps a la estación de combustible. se realiza la respectiva nivelación, excavación y sesgado de elementos.

* Se presentan lluvias en horas de la tarde lo cual impide el desarrollo de actividades de obra debido a la intensidad presentada a partir de las 2:00 pm.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES A PARTIR DE LAS 2:00 PM LO QUE DETIENE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias		3		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI				
OFICIAL	2	SI				
OPERARIO	5	SI				
AYUDANTE	9	SI				
CELADOR	0					
TOPÓGRAFO	2	SI				
ADENERO	2	SI				
ROS VIGILISTAS	3	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1.2 BASE TRITURADA 1-1/2"	M3	MEJORAMIENTO Y CONFORMACION CAPA 3 - BASE.			
4.8.7. SARDINEL BAJO BOMBA	UND	INSTALACION DE SARDINEL A-85.			
1.1.6. MONTAJE DE OBRAS BOX (1)	MBL.	BOMBEO Y ACARREO DE AGUA PARA BOX CL.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITÁCORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	X	X	
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA NOCHE PREVIO A LA JORNADA LABORAL, SE PRESENTAN ENCHARCAMIENTOS DE AGUA EN VIA.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0	NO	
TOPÓGRAFO	2	SI	
DENERO	2	SI	
ROS	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
3.1.2. BASE TRITURADA H-17"	M3	MEJORAMIENTO Y TENDIDO DE BASE SECTOR 3			
N.P.933.1. SUMIDERO PEATIL	ML	CONSTRUCCION DE SUMIDERO SECTOR 1.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* SE PRESENTA EMPOZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN SECTOR 3 COSTADO DERECHO ENTRE CALLES 79 SUR Y 80 SUR DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS DIA ANTERIORES, SIN EMBARGO CON PERSONAL DE OBRA Y MAQUINARIA SE DISPONE A REALIZAR TRABAJOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS HACIA SUMIDERO DE CALLE 79 EXISTENTE DE RED ANTIGUA.

* POR OTRA PARTE SE REALIZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR EN ZONA DE COSTADO DERECHO SECTOR 3 ENTRE CALLES 80 SUR Y 81 SUR, SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN ZONAS DE LA CARPETA DE RODADURA EXISTENTE. SE USA EQUIPO MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, MINIBOBCAT Y PERSONAL DE OBRA.

* SE REALIZA LA EXCAVACIÓN Y RETIRO DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO CORRESPONDIENTE AL POZO MP-39, SE VERIFICA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO LOCALIZACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTIVA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
nbre: CAMILO ANDRES CABALLERO LCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	11	2024	07:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	/	X	
TORMENTA			
LLUVIOSO	X		
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias		X	

OBSERVACIONES: Se presentan lluvias durante las primeras horas de la jornada laboral. Se interrumpen actividades por tres (3) horas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	4	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	2	SI	
ADENERO	2	SI	
ROS Visitas	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Excavadora Hitachi	1	
Retroexc. Liebherr	1	
Mini Bobcat	1	
Carro compactador	1	
Pisonmet Apisonador	1	
Motoniveladora	1	
Camiones Mxl	4	
Planta Electrica	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6. Manejo de agua bajo Ox.	MES	Bombeo de agua zona box culvert			
209.3.3.1. Sumidero concreto	UN.	Construcción sumidero sector 1. MP 39.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldia de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	11	2024	7:00:00	15:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN LA CIUDAD QUE AFECTAN EL ACCESO DE PERSONAL A LA ZONA DE PLANTA Y VILLA JULIANA, LA OBRA PRESENTA ENCHARCAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE AGUA QUE CAYÓ DESDE TEMPRANAS HORAS DE LA MADRUGADA. LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE PUDIERON INICIAR HASTA LAS 10:00 AM

* NO ES POSIBLE REALIZAR MOVIMIENTOS DE MATERIAL GRANULAR DEBIDO AL ENCHARCAMIENTOS DE AGUA EN SECTOR 3 DONDE SE ESTABA TRABAJANDO. CON EQUIPO MENOR, SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS CON PERSONAL PARA AYUDAR A BOMBEAR LAS AGUAS ENCHARCADAS.

* SE REALIZAN TRABAJOS EN ZONA DE BOX CULVERT DE MANEJO DE AGUAS CON BOMBAS, SE PRESENTA AFECTACIÓN EN OBRAS DE CONTENCIÓN DE AGUA, EL NIVEL DE AGUA DEL AFLUENTE SOBREPASÓ EL TRASLAPO DE CONTENCIÓN POR LO CUAL TAMPOCO FUE POSIBLE ADELANTAR LABORES EN ESTA ZONA DEBIDO AL NIVEL DEL AGUA.

* SE REANUDAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO PERTENECIENTE AL POZO MP_39, SE REALIZA FORMALETEADO DE MURO Y INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y SE VERTIERON CON APROXIMADAMENTE MEDIOS DE CONCRETO.

* SE REANUDAN TRABAJOS DE FIGURACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. GENERAL.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO ALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	11	2024	07:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS DESDE LA MADRUGADA, SE INICIAN LABORES A LAS 9:00 AM UNA VEZ BAJADA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA.
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		1		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	2	SI	
ADENERO	2	SI	
TROS VIGILIA	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
CARGADOR VITOLI	1	
RETROEXC. LLANTA	1	
MINI BULDOZ	1	
MOTONIVELADORA	1	
TANQUERO MOTOBOMBA	1	
CARROTANQUE	4	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
L.L.C. MANEJO DE DESVIO	MET.	BOMBEO DE AGUA EN ZONA DE CUNETAS.			
PATO DE MIDECLIDA L.LON.	ML	CONSTRUCCION ANILLO FINDI MP-39			
IMPLEMENTACION DEL PMA.		REDUCCIÓN DE DERECHO DE OBRA, MANTENIMIENTO PASAVIAS DE TRANSITO, REMISION DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA GRAL			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	11	2024	7:00:00	11:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Se presentan lluvias en horas de la mañana lo cual demoro el inicio de actividades de obra.

* No se pueden realizar actividades de movimiento de material granular debido a los encharcamientos de agua estancada

* En zona de box coulvert el afluente no incrementa su nivel, en el contorno del día anterior se encontraba más bajo lo que permite reanudar nivelación de nivel de agua y continuar con la limpieza del lecho de box coulvert.

* Se realizan labores de construcción de anillo faltante en pozo mh-39 con el ventilo de concreto en formaleta previamente inspeccionada. Se verifica cumplimiento de especificaciones de diseño como diametro interno libre, espesor de muro y ubicación de pozo.

* Se realiza jornada de aseo y recolección de desechos de obra, organización de espacios de trabajo intervenidos durante la semana, verificación de puntos de contaminación y señalización de pozo de inspección. suministros y box coulvert. con el fin de mantener libres a la comunidad que por ahí circula

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
nbre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68178 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	11	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DE OBRA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
ADENERO						
ROS						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	11	2024		

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DOMINGO.

NOMBRE	CARGO	FIRMAS N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO ALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			Se Presenta Día Sábado. Sin Lluvias. Día Perfecto
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1			Motonivelador	1	
OFICIAL	2			Mini Back Cat	1	
OPERARIO	1					
AYUDANTE	3					
CELADOR	0					
TOPÓGRAFO	1					
ADENERO	1					
TROS	0					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6 Manejo de Aguas.	Mes.	Bombeo de Aguas Afluente Box Culvert.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* DIA FESTIVO.

* SE PROGRAMAN ACTIVIDADES DE OBRA ENFOCADAS EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE MANEJO DE AGUA EN ZONA DE BOX COULVERT. SE INSTALA TUBERIA DE 24" EN PVC Y SE REALIZAN TRINCHOS CON SACOS COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN Y CANALIZACIÓN DEL AFLUENTE PARA PODER HACER FRENTE A LAS CONSTANTES CRECIDAS DE AGUA DEL RIO EN ESTE DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO Y PODER REALIZAR DE MANERA MAS SEGURA Y SEGURA LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL BOX COULVERT.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 237218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68173 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan lluvias en horas de la tarde a partir de las 2:30 pm con alta intensidad
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI				
OFICIAL	2	SI				
OPERARIO	5	SI				
AYUDANTE	9	SI				
CELADOR	0					
TOPÓGRAFO	2	SI				
ADENERO	2	SI				
ROS	3	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6. Manejo de Obra, Seña Preventiva	M2	Cambio de área afectada Zona Box Culverts			
3-2.2. Base Triturado e-1/2"	M3	Mejoramiento y afirmado de material, Sector 3			
N.P.2.3.1.1. Tubería PVC 12"	ML	Instalación tubería pluvial suministro			
Excavación Manual	M3	Excavación manual para tubería pluvial sum.			
Arena de Río	M3	Arena para cama y atraque de tubería			
Relleno Mat Granular	M3	Relleno de excavación de tubería			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Se realizan trabajos de manejo de agua en todo el box colvert, se realiza limpieza de material almacenado por la creciente del afluente durante el fin de semana, se dispone material sedimentado sobre playa patio y se organizan los aceros existentes para continuar con los trabajos de construcción.

* Continuan las labores de mejoramiento y aproximación de material de base en sector 3 calzada derecha del proyecto con el uso de equipo motoniveladora, vibrocompactador y equipo topografico.

* Se realizan actividades de instalación de tubería pluvial de sumidero en sector 1 que contiene el pozo MP-39, se verifica con equipo topografico la nivelación requerida, alineamiento de tubería, atraque y cama de arena, y la debida instalación de tubería pluvial 12".

* Se presentan lluvias fuertes en el sector del proyecto lo que imposibilita continuar con las labores de obra, la intensidad de las lluvias fue tal que el nivel de agua del afluente crecio de manera inesperada y sobrepaso el terraplen de contención existente, se presentaron empozamiento de agua en sector 3 del proyecto. Las lluvias se presentaron a partir de las 2:30 pm de la tarde.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 337218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO ALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		NO SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA JORNADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	9	SI	
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	2	SI	
ADENERO	2	SI	
OS VIALETAS	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
CARGADOR HITACHI	1	
RETROEXC. MONTA	1	
VIBRO COMPACTADOR	1	
MINI BOBCAT	1	
MOTOBOMBA DOR	1	
BOMBA DE AGUA 4"	2	
TRANSPO MEZCLADOR	1	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6. MANEJO DE AGUA BOX CULVERT	M2J	BOMBEO DE AGUA SUPERFICIAL BOX CULVERT			
2.2.2 BASE TRITURADO 1-1/2"	M3	MEJORAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO DE BASE GRANULAR.			
3.3.3.1 SUMIDERO CONCRETO	ML	CONSTRUCCION SUMIDERO CONCRETO			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	11	2024	07:00	17:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Continuan las labores de manejo de aguas en zona de box culvert. Se realizan limpieza de material sedimentado en fondo de box culvert, se contratan deformaciones en acero de refuerzo y se dispone de material de derecho faltante en este punto.

* Se realiza el vertido de concreto en caja sumidero que corresponde al pozo MP-34. en sector 1.

* Continuan las labores de mejoramiento y aproximado de material de base en sector 3 costado derecho con el uso de equipo motoniveladora, vibrocompactador y equipo topografico

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO ALCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* Se presentó intento de robo a bodega principal de contratista de obra, no lograron cometer el hurto sin embargo se daño la anotación, rebuscaron cajas y intentaron forzar la puerta con herramientas.
* Se inicia labores de manejo de aguas en sector de box culvert para continuar con las labores de construcción fase 2.
* Se logra trabajar una hora en mejoramiento y aproximación de material granular en sector 3 con equipo motoniveladora, retrocompactador y topografía, sin embargo se presentan lluvias que impiden continuar con las labores.
* Se realizan labores de figurado y armado general de aceros de refuerzo para box culvert, losas y cajas sumideros.
* Se realiza en horas de la tarde la vertida de concreto en caja tipo sumidero del sector 1 donde se conforman los muros del mismo. Se verifican medidas internas y externas de acuerdo a lo indicado por planos y diseño.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 357218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO CAZAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 2520209370B CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS INTERMITENTE A LO LARGO DEL DIA.
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		4/		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO	5	SI	
AYUDANTE	4	SI	
CELADOR	0		
TOPÓGRAFO	2	SI	
ADENERO	2	SI	
ROS VIGILANTE	3	SI	

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
CARGADOR HIDRAL	1	
RETROEXC. LLANTA	1	
MINI RODILLO	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
MOTONIVELADORA	1	
TANQUE MEZCLADOR	1	
BOMBA DE AGUA 2"	1	
PLANTA ELECTRICA	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.1 MANEJO DE AGUA	MES	MANEJO DE AGUA AFLUENTE RIO CONEJOS			
3.2.2 BAJA TUBERIA 1-1/2"	M³	MEJ MOVIMIENTO Y APROPIACION DE BAJA SECCION 3"			
9.3.3.1. SUMIOBRO CONCRETO	M³	CONSTRUCCION DE SUMIDERO - MURO			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	11	2024	07:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	1822 de 2023	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL JULIANA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1823 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
OBJETO CONTRATO	"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DIECISEIS (16) MESES DIEZ (10) DIAS	FECHA DE INICIO	21 de Junio de 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			Dia Sin Presencia de lluvias
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta Untoma	1	
OFICIAL	2	SI		Retroexcavadora llanta	1	
OPERARIO	5	SI		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	9	SI		Mini cargador	1	
CELADOR	6	NO		Motoniveladora	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		Bomba de agua 4"	1	
CADENERO	2	SI				

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	11	2024	7:00:00	17:00:00

OBSERVACIONES GENERALES

* CONTINUAN LAS LABORES DE LIMPIEZA, MEJORAMIENTO Y APROXIMACION DE MATERIAL GRANULAR EN SECTOR 3 CALZADA DERECHA DEL PROYECTO DONDE SE DISPONE DE MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR Y MINIBOBCAT ASI COMO EQUIPO TOPOGRÁFICO.

* CONTINUAN LAS LABORES DE MANEJO DE AGUA EN ZONA DE BOX CULVERT CON EL USO DE EQUIPO DE BOMBEO NECESARIO Y LA ADECUACION DE ATAGUIA Y TRINCHO DE CONTENCION DE AGUA, DE ESTA MANERA SE PERMITEN AVANZAR CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DEL BOX CULVERT. SE PRESENTA DRENAJE DE ACERO CORRESPONDIENTE.

* SE REQUIERE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO DE RIO PARA LA CONFORMACION DE APROCHE DERECHO DE ZONA DE BOX CULVERT.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-385954 CND	
Nombre: FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 257218 CND	
Nombre: CAMILO ANDRES CABALLERO LCAZAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093709 CND	
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-68176 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

ANEXO 6. INFORMES DE ESPECIALISTAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1823 DE 2023

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META



PERIODO DEL INFORME

23 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

REVISIÓN Y APROBACIÓN


Objeto de Interventoría:	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"	
Título de Documento:	Informe SST de Interventoría Acta Parcial No. 03 (23 de julio de 2024 al 15 de noviembre de 2024).	
Documento No:	INFSST PAR-03	
APROBACIÓN		
	Nombre:	**FLOR ANGELA NARVÁEZ CASTRO PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	15-07-2025
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA**
Vo. Bo. representante legal:	Firma:	
	Fecha:	15-07-2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos específicos 5

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 6
3.1. Generalidades contrato de interventoría 6
3.2. Localización del proyecto y descripción. 7
3.3. Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo. 8
3.4. Estado inicial de la zona de trabajos 8

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA 8
4.1. Actividades desarrolladas por la interventoría. 8
4.2. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9
4.3. Instalaciones administrativas de la interventoría. 9
4.4. Personal de interventoría. 9
4.5. Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo. 11
4.6. Inspecciones realizadas por la interventoría. 12
4.7. Registro fotográfico 13

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA 15
5.1. Relación personal del contratista. 15
5.2. Seguimiento a compromisos laborales. 21
5.3. Exámenes médicos. 22
5.4. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT. 22
5.5. Certificado de accidentalidad de la ARL del contratista. 23

6. CONCLUSIONES 24

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un área multidisciplinaria y está relacionada no solo con la seguridad, también vincula la salud y la calidad en el ámbito de los trabajadores, su función es la de proteger a todo trabajador que se vea afectado por el ambiente ocupacional.

La Salud Ocupacional, se construye por medio de un ambiente psicosocial, físico, emocional, donde el trabajador pueda desarrollar una actividad con dignidad, con libre expresión, con ser respetado donde sus condiciones sean seguras y las más adecuadas, no solamente la salud ocupacional se encarga de la parte de salud física si no de la actividad o estado emocional en que se encuentre el trabajador, ya que ellos pueden llegar a presentar algún tipo de inconformidad, problema, y esto afectará el rendimiento en sus diferentes actividades laborales.

Tomando como base esto, este informe tiene como prioridad cumplir con la supervisión y seguimiento a las actividades ejecutadas, durante el periodo comprendido del 23 de julio de 2024 al 15 de noviembre de 2024, las cuales han sido planificadas y presentadas por el contratista y de esta forma velar por el cumplimiento de condiciones idóneas para los trabajadores, respaldados siempre con la normatividad vigente, garantizando siempre la divulgación y sensibilización de las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, por el contratista de obra en desarrollo de la interventoría, durante el periodo del presente informe.

2.2. Objetivos específicos

- Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante el periodo evaluado; las cuales se encuentran divididas por componentes y programas de acuerdo con lo establecido en el plan de acción SST de la interventoría y del Contratista, junto con lo establecido en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento a estas por parte de la interventoría.

- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.

- Propender porque durante el desarrollo del contrato se implementen las medidas de manejo de SST por parte del contratista.

- Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal de los contratistas y el contrato de interventoría.

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1. Generalidades contrato de interventoría

Tabla 1. Información general de interventoría.

PROCESO CONTRACTUAL:	CM-004-2023
CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
No. DEL CONTRATO:	1823 DE 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	25 DE MAYO DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($287.707.093) M/CTE.
ADICIÓN N°1:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($143,055,980,00) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS ($430.763.073,00) M/CTE.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA NIT: 9.658.796 de Yopal
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS:	26 DE MAYO DE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIÚN (21) DÍAS DE JUNIO DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DE PRORROGA No.1:	CUATRO (04) MESES.
PLAZO DE PRORROGA No.2:	CUATRO (04) MESES.

PLAZO DE PRORROGA No.3:	DOS (02) MESES.
PLAZO DE PRORROGA No.4:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
PLAZO DE PRORROGA No.5:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
PLAZO DE PRORROGA No.6:	DOS (02) MES.
PLAZO DE PRORROGA No.7:	UN (01) MES.
PLAZO DE PRORROGA No.8:	UN (01) MES.
PLAZO DE PRORROGA No.9:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
PLAZO DE PRORROGA No.10:	UN (01) MES.
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	VEINTIUN (21) MESES Y CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	14 DE AGOSTO DE 2025

3.2. Localización del proyecto y descripción.

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en carrera 43 desde la calle 79 sur hasta la 85 sur– barrio Villa Juliana, de la comuna nueve (09) y el domicilio contractual es en el municipio de Villavicencio.

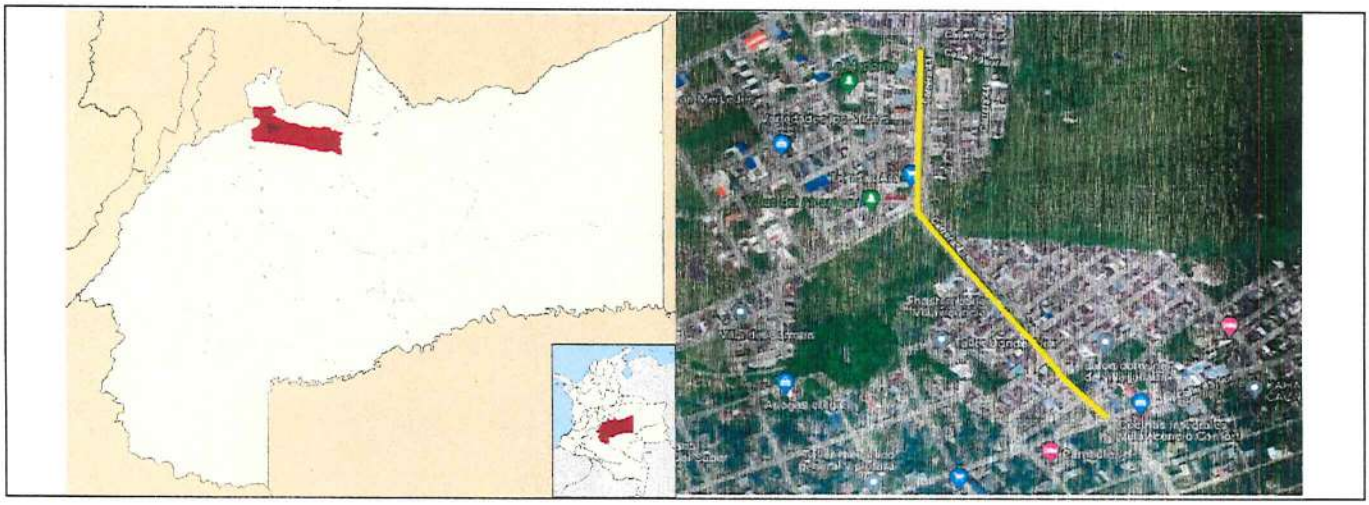


Ilustración 1. Ubicación General, Carrera 43 desde la calle 79 sur hasta la 85 sur– barrio Villa Juliana.

3.3. Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo.

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015), por lo anterior esta interventoría tiene como objetivo principal garantizar que los trabajadores que hacen parte del proyecto, desarrollen las actividades que han sido planeadas de manera segura y responsable siempre brindando al personal vinculado con el contrato las condiciones idóneas y seguras en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

3.4. Estado inicial de la zona de trabajos

El profesional en SST de la interventoría realiza la inspección a la zona de trabajo para verificar su estado, en ella encontramos un urbana que representa un alto riesgos de tránsito y locativo por la cantidad de vehículos, en el área de trabajo está lista para empezar a ser intervenida y se acondicionaron espacios para el área de seguridad y salud en el trabajo de interventoría.

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA

4.1. Actividades desarrolladas por la interventoría.

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el profesional SST, durante el periodo comprendido del 23 de julio de 2024 al 15 de noviembre de 2024, en cumplimiento de sus actividades de supervisión al contrato de obra No 1822 DE 2023 cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

La interventoría realiza un seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista en el área SST, este seguimiento se ha realizado dejando como evidencia un registro fotográfico, formatos de control, seguimiento y cumplimiento a los indicadores SST, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La interventoría, en su función de seguimiento a la aplicación del SG SST, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución del contrato de obra en el periodo del presente informe.

4.2. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los requisitos legales relacionados con el aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra incluido dentro del SGSST que fue entregado a la interventoría, en la fase preliminar. En el seguimiento realizado al SG SST, se evidencia que se cuenta con la matriz de requisitos legales ajustados a la ejecución de las actividades establecidas para el contrato.

4.3. Instalaciones administrativas de la interventoría.

Las instalaciones de la interventoría están ubicadas en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 Barrio el Caudal en el municipio de Villavicencio Meta. Allí se llevan a cabo todos los procesos administrativos por parte de la interventoría y se atenderá al público en general en caso de ser necesario.



Ilustración 2. Oficina de la interventoría.

4.4. Personal de interventoría.

Durante el periodo del presente informe la interventoría, realizó el acompañamiento de forma permanente con el profesional en salud ocupacional con sus debidas funciones de supervisar, verificar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de

seguridad y salud en el trabajo, por tanto, la interventoría ha velado por que se cumpla la normativa vigente legal, y se exigió al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo durante el desarrollo de los trabajos, con el fin de mitigar los riesgos presentes en obra y crear un ambiente de trabajo seguro, y adecuado para cada labor y así mismo evitar accidentes e incidentes de trabajo y/o enfermedades laborales futuras.

Para estas labores se relaciona el grupo de profesionales de interventoría que estuvieron ofertados para el periodo del cobro parcial N°3.

JULIO 2024

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1 de julio de 2024		a	31 de julio de 2024		
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CARGO Y/O OFICIO	ASIGNACIÓN SALARIAL	DIAS LABORADOS	% DE DEDICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA
PERSONAL OFERTADO										
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Director de interventoría	$ 5,225,967.67	30	24%	9470984510
Perez	Arias	Fabian Antonio	1.121.878.344	22/02/2024	N/A	Residente de interventoría	$ 4,202,854.15	30	50%	9471162319
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Especialista en vías	$ 4,712,224.77	30	20%	9470984510
Narváez	Castro	Flor Angela	1.121.891.768	1/09/2023	N/A	Profesional HSQ	$ 3,177,554.49	30	30%	9471162319

AGOSTO 2024

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1 de agosto de 2024		a	31 de agosto de 2024		
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CARGO Y/O OFICIO	ASIGNACIÓN SALARIAL	DIAS LABORADOS	% DE DEDICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA
PERSONAL OFERTADO										
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Director de interventoría	$ 5,225,967.67	30	24%	9472694956
Pérez	Arias	Fabián Antonio	1.121.878.344	01/06/2024	N/A	Residente de interventoría	$ 2,102.,000.00	30	50%	9472693167
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Especialista o Asesor en Transporte y Vías	$ 5,225,967.67	30	20%	9472694956
Narváez	Castro	Flor Angela	1.121.891.768	1/09/2023	N/A	Profesional HSQ	$ 3,177,554.49	30	30%	9472693167

SEPTIEMBRE 2024

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1 de septiembre de 2024		a	30 de septiembre de 2024		
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CARGO Y/O OFICIO	ASIGNACIÓN SALARIAL	DIAS LABORADOS	% DE DEDICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA
PERSONAL OFERTADO										
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Director de interventoría	$ 5,225,967.67	30	24%	9474770191
Pérez	Arias	Fabián Antonio	1.121.878.344	01/06/2024	N/A	Residente de interventoría	$ 2,102.,000.00	30	50%	9474781971
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Especialista o Asesor en Transporte y Vías	$ 5,225,967.67	30	20%	9474770191
Narváez	Castro	Flor Angela	1.121.891.768	1/09/2023	N/A	Profesional HSQ	$ 3,177,554.49	30	30%	9474781971

OCTUBRE 2024

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1 de octubre de 2024		a	31 de octubre de 2024		
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CARGO Y/O OFICIO	ASIGNACIÓN SALARIAL	DIAS LABORADOS	% DE DEDICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA
PERSONAL OFERTADO										
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Director de interventoría	$ 5,225,967.67	30	24%	9477029275

Pérez	Arias	Fabián Antonio	1.121.878.344	01/06/2024	N/A	Residente de interventoría	$ 2,102.,000.00	30	50%	9476894346
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Especialista o Asesor en Transporte y Vías	$ 5,225,967.67	30	20%	9477029275
Narváez	Castro	Flor Angela	1.121.891.768	1/09/2023	N/A	Profesional HSQ	$ 3,177,554.49	30	30%	9476894346

NOVIEMBRE 2024

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1 de noviembre de 2024		a	30 de noviembre de 2024		
PRIMER APELLIDO	**SEGUNDO APELLIDO**	**NOMBRES**	**CEDULA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**CARGO Y/O OFICIO**	**ASIGNACIÓN SALARIAL**	**DIAS LABORADOS**	**% DE DEDICACIÓN**	**NUMERO DE PLANILLA**
PERSONAL OFERTADO										
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Director de interventoria	$ 5,225,967.67	30	24%	9478120489
Pérez	Arias	Fabián Antonio	1.121.878.344	01/06/2024	N/A	Residente de interventoría	$ 2,102.,000.00	30	50%	9478123755
Rodríguez	Reina	Jorge Augusto	9.658.796	21/06/2023	N/A	Especialista o Asesor en Transporte y Vías	$ 5,225,967.67	30	20%	9478120489
Narváez	Castro	Flor Angela	1.121.891.768	1/09/2023	N/A	Profesional HSQ	$ 3,177,554.49	30	30%	9478123755

Las planillas de seguridad social se entregan como anexo en el informe técnico para el acta parcial N°3 de interventoría con su respectiva hoja de control de seguridad social.

4.5. Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo.

La Interventoría ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista de manera permanente y se ha realizado un seguimiento a las actividades realizadas por medio de un registro fotográfico y formatos de control y seguimiento.
Para cumplir de manera idónea la interventoría le solicitó al contratista la siguiente documentación:

- ✓ Documentación del SG.SST de la empresa en cumplimiento de la Resolución 1072 del 2015 y la Resolución 0312 2019.
- ✓ Plan de trabajo SST anual.
- ✓ Certificado de funcionamiento de la IPS donde se realizan los exámenes médicos ocupacionales.
- ✓ Hoja de vida de los trabajadores
- ✓ Cedula del trabajador
- ✓ Inducción al cargo.
- ✓ Constancia de Afiliación ARL.
- ✓ Constancia de fondo de pensión y Caja de Compensación Familiar.
- ✓ Constancia de afiliación de EPS con número de radicado (No Adres).
- ✓ Formato entrega de dotación.
- ✓ Formato inducción al cargo.
- ✓ Contrato laboral.
- ✓ Examen médico ocupacional de ingreso.
- ✓ Planillas de seguridad social.

- ✓ Certificado de accidentalidad emitido por la ARL
- ✓ Carta de Idoneidad (para actividades de alto riesgo)
- ✓ Paz y salvos de personal retirado.
- ✓ Informes de SST. Con evidencia fotográfica.
- ✓ Inspecciones a los siguientes formatos:
- ✓ Formato Entrega de EPP
- ✓ Formato Asistencia diaria - charlas pre operacionales
- ✓ Formato capacitaciones programadas
- ✓ Formato inspección herramienta y equipos
- ✓ Formato de Inspección punto ecológico, punto sanitario.
- ✓ Formato de inspección locativa.
- ✓ Formato ATS.
- ✓ Formato inspección camilla y extintores.
- ✓ Formato inspección de botiquín acondicionado de acuerdo con la cantidad de trabajadores.

4.6. Inspecciones realizadas por la interventoría.

INSPECCIONES GENERALES DE SST	PERIODO	FECHA
Inspección de Botiquín de interventoría.	Mensual	14/08/2023
Entrega e inspección de botiquín	Mensual	25/08/2023
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	04/09/2023
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	10/10/2023
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	30/11/2023
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	27/12/2023
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	24/01/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	28/02/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	19/03/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	15/04/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	15/05/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	17/06/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	20/07/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	23/08/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	18/09/2024
Inspección de botiquín Interventoría	Mensual	24/10/2024

4.7. Registro fotográfico



Ilustración 3. Inspección de extintor 22/07/2024.



Ilustración 4. Inspección de camilla de emergencia 23/08/2024.



Ilustración 5. Inspección de extintor de obra 11/09/2024.

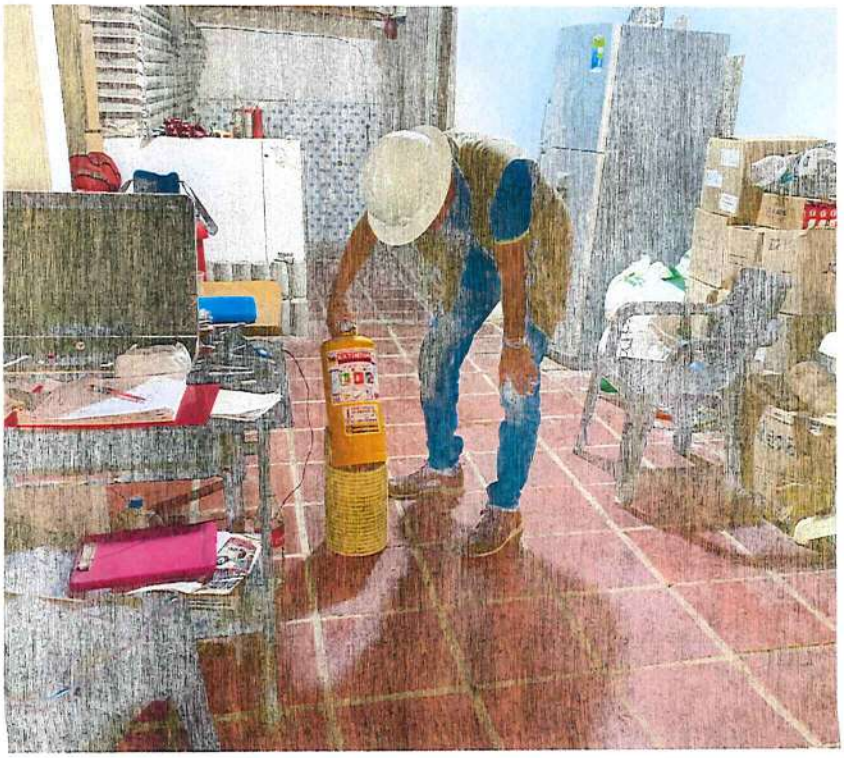


Ilustración 6. Inspección de extintor 18/09/2024.



Ilustración 7. Verificación de provisión de dotaciones y EPPS en obra 29/09/2024.

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA

5.1. Relación personal del contratista.

JULIO 2024

NOMBRE	Cargo y/o oficio	CEDULA
ADMINISTRATIVOS		
CAMILO ANDRES CABALLERO	DIRECTOR DE OBRA	86.056.834
YONATAN CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	1.120.378.851
INGRID IZQUIERDO	ING ESTRUCTURAL	1.121.934.806
LUIS ALEJANDRO DIAZ	ING VIAS	1.121.943.698
MARIA DEL PILAR AREVALO	ING AMBIENTAL	1.020.713.089
HECTOR HERRERA TORRES	ING HIDRAULICO	79.865.133
JULIETH ALEXANDRA VARGAS CENDALES	HS E	1.121.848.831
FRANZ IRWIN TOLOZA PRADA	TOPOGRAFO	13.541.546

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION
1	FERNANDO SERRANO BARRERO	93.129.456	MAESTRO	DEPENDIENTE
2	CESAR ALEJANDRO ALDANA CORTES	1.121.899.400	ALMACENISTA	DEPENDIENTE
3	HERNANDO AVILA	6.567.658	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
4	GIOVANNI LUGO	P.T. 938.347	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
5	FRANKLIN TOVAR	1.127.387.384	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
6	SIMON ALMARIO FIGUEROA	17.641.681	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
7	WILLIAM BELTRAN	1.121.909.406	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
8	WILLIAM CALDERON	1.121.858.304	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
9	YULI MILENA PRADA LOZANO	1.121.908.253	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
10	MARIA GARZÓN	1.121.905.718	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
11	DIEGO ARMANDO ALDANA CORTE	1.121.927.586	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
12	DUMAR YESID ROJAS VELASQUEZ	1.234.790.884	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
13	MAXIMILIANO CONTRERAS FAJARDO	1.148.216.450	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
14	YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN	1.125.476.543	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
15	JOSE FERNANDO GUZMAN	1.002.063.963	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
16	ANGIE KATIKZA VARGAS CENDALES	1.121.863.849	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
17	MARTIN FORTUNATO	80.369.607	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
18	LUIS COCHERO	1.152.461.751	OFICIAL	DEPENDIENTE
19	CRISTIAN GUERRERO	1.006.820.021	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
20	ISIDRO BUSTOS	79.500.257	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
21	LIDERMAN CRUZ	17.331.221	OPERADOR	DEPENDIENTE
22	JONNIS ANTONIO PEREZ SALGADO	85.471.034	OPERADOR	DEPENDIENTE
23	JOSE LUIS TERNERA CAMARGO	77.000.328	OPERADOR	DEPENDIENTE
24	LAURA GOMEZ	1.121.899.859	AUXILIAR HSE	DEPENDIENTE
	TOPOGRAFIA			

25	LUIS UNEIMAR RAMOS AMADO	86,064,589	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
26	DANIEL FELIPE MESA CLAVIJO	1.010.123.532	CADENERO	INDEPENDIENTE
27	AMELIA SANABRIA	28.548.347	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
28	JHOAN ENRIQUE LADINO	1.122.506.548	CADENERO	INDEPENDIENTE

AGOSTO 2024

NOMBRE	Cargo y/o oficio	CEDULA
INDEPENDIENTES		
CAMILO ANDRES CABALLERO	DIRECTOR DE OBRA	86.056.834
YONATAN CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	1.120.378.851
INGRID IZQUIERDO	ING ESTRUCTURAL	1.121.934.806
LUIS ALEJANDRO DIAZ	ING VIAS	1.121.943.698
MARIA DEL PILAR AREVALO	ING AMBIENTAL	1.020.713.089
HECTOR HERRERA TORRES	ING HIDRAULICO	79.865.133
JULIETH ALEXANDRA VARGAS CENDALES	HS E	1.121.848.831
FRANZ IRWIN TOLOZA PRADA	TOPOGRAFO	13.541.546

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION
1	FERNANDO SERRANO BARRERO	93.129.456	MAESTRO	DEPENDIENTE
2	CESAR ALEJANDRO ALDANA CORTES	1.121.899.400	ALMACENISTA	DEPENDIENTE
3	HERNANDO AVILA	6.567.658	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
4	GIOVANNI LUGO	P.T. 938.347	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
5	FRANKLIN TOVAR	1.127.387.384	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
6	SIMON ALMARIO FIGUEROA	17.641.681	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
7	WILLIAM BELTRAN	1.121.909.406	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
8	WILLIAM CALDERON	1.121.858.304	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
9	YULI MILENA PRADA LOZANO	1.121.908.253	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE

10	MARIA GARZÓN	1.121.905.718	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
11	DUMAR YESID ROJAS VELASQUEZ	1.234.790.884	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
12	MAXIMILIANO CONTRERAS FAJARDO	1.148.216.450	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
13	YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN	1.125.476.543	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
14	JOSE FERNANDO GUZMAN	1.002.063.963	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
15	ANGIE KATIKZA VARGAS CENDALES	1.121.863.849	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
16	MARTIN FORTUNATO	80.369.607	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
17	LUIS COCHERO	1.152.461.751	OFICIAL	DEPENDIENTE
18	CRISTIAN GUERRERO	1.006.820.021	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
19	ISIDRO BUSTOS	79.500.257	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
20	LIDERMAN CRUZ	17.331.221	OPERADOR	DEPENDIENTE
21	JONNIS ANTONIO PEREZ SALGADO	85.471.034	OPERADOR	DEPENDIENTE
22	JOSE LUIS TERNERA CAMARGO	77.000.328	OPERADOR	DEPENDIENTE
	TOPOGRAFIA			
23	LUIS UNEIMAR RAMOS AMADO	86,064,589	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
24	DANIEL FELIPE MESA CLAVIJO	1.010.123.532	CADENERO	INDEPENDIENTE
25	AMELIA SANABRIA	28.548.347	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
26	JHOAN ENRIQUE LADINO	1.122.506.548	CADENERO	INDEPENDIENTE

SEPTIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No TARJETA PROFESIONAL
CAMILO ANDRES CABALLERO	DIRECTOR DE OBRA	17202-118844
YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	25202-385954
INGRID SULEY IZQUIERDO SARAY	INGENIERO ESTRUCTURAL	25202-387287
MARIA DEL PILAR AREVALO	INGENIERA AMBIENTAL	25238-219647
LUIS ALEJANDRO DIAZ BERNAL	ESPECIALISTA EN VIAS	25202-385923
HECTOR HERRERA TORRES	INGENIERO HIDRAULICO	25202- 198443
JULIETH ALEXANDRA VARGAS CENDALES	HSE	5406 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION
1	FERNANDO SERRANO BARRERO	93.129.456	MAESTRO	DEPENDIENTE
2	CESAR ALEJANDRO ALDANA CORTES	1.121.899.400	ALMACENISTA	DEPENDIENTE
3	HERNANDO AVILA	6.567.658	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE

4	GIOVANNI LUGO	P.T. 938.347	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
5	FRANKLIN TOVAR	1.127.387.384	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
6	SIMON ALMARIO FIGUEROA	17.641.681	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
7	WILLIAM BELTRAN	1.121.909.406	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
8	WILLIAM CALDERON	1.121.858.304	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
9	YULI MILENA PRADA LOZANO	1.121.908.253	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
10	MARIA GARZÓN	1.121.905.718	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
11	DUMAR YESID ROJAS VELASQUEZ	1.234.790.884	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
12	MAXIMILIANO CONTRERAS FAJARDO	1.148.216.450	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
13	YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN	1.125.476.543	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
14	JOSE FERNANDO GUZMAN	1.002.063.963	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
15	ANGIE KATIKZA VARGAS CENDALES	1.121.863.849	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
16	MARTIN FORTUNATO	80.369.607	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
17	LUIS COCHERO	1.152.461.751	OFICIAL	DEPENDIENTE
18	CRISTIAN GUERRERO	1.006.820.021	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
19	ISIDRO BUSTOS	79.500.257	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
20	LIDERMAN CRUZ	17.331.221	OPERADOR	DEPENDIENTE
21	JONNIS ANTONIO PEREZ SALGADO	85.471.034	OPERADOR	DEPENDIENTE
22	JOSE LUIS TERNERA CAMARGO	77.000.328	OPERADOR	DEPENDIENTE
23	CARLOS ALCANTARA	1.193.360.797	AYUDANTE	DEPENDIENTE
24	LUIS PAEZ	1.234.790.074	AYUDANTE	DEPENDIENTE
25	MANUEL PEREZ	19.773.921	AYUDANTE	DEPENDIENTE
	TOPOGRAFIA			
25	LUIS UNEIMAR RAMOS AMADO	86,064,589	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
26	DANIEL FELIPE MESA CLAVIJO	1.010.123.532	CADENERO	INDEPENDIENTE
27	AMELIA SANABRIA	28.548.347	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
28	GILDARDO SANCHEZ GALEANO	7.818.268	CADENERO	INDEPENDIENTE

OCTUBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No TARJETA PROFESIONAL
CAMILO ANDRES CABALLERO	DIRECTOR DE OBRA	17202-118844
YONATAN SNEYDER CASTRO CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	25202-385954
INGRID SULEY IZQUIERDO SARAY	INGENIERO ESTRUCTURAL	25202-387287
MARIA DEL PILAR AREVALO	INGENIERA AMBIENTAL	25238-219647
LUIS ALEJANDRO DIAZ BERNAL	ESPECIALISTA EN VIAS	25202-385923
HECTOR HERRERA TORRES	INGENIERO HIDRAULICO	25202- 198443
JULIETH ALEXANDRA VARGAS CENDALES	HSE	5406 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION
1	FERNANDO SERRANO BARRERO	93.129.456	MAESTRO	DEPENDIENTE
2	CESAR ALEJANDRO ALDANA CORTES	1.121.899.400	ALMACENISTA	DEPENDIENTE
3	HERNANDO AVILA	6.567.658	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE

4	GIOVANNI LUGO	P.T. 938.347	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
5	FRANKLIN TOVAR	1.127.387.384	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
6	SIMON ALMARIO FIGUEROA	17.641.681	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
7	YULI MILENA PRADA LOZANO	1.121.908.253	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
8	MARIA GARZÓN	1.121.905.718	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
9	DUMAR YESID ROJAS VELASQUEZ	1.234.790.884	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
10	MAXIMILIANO CONTRERAS FAJARDO	1.148.216.450	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
11	LUIS PAEZ	1.234.790.074	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
12	JOSE FERNANDO GUZMAN	1.002.063.963	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
13	ANGIE KATIKZA VARGAS CENDALES	1.121.863.849	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
14	CRISTIAN GUERRERO	1.006.820.021	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
15	ISIDRO BUSTOS	79.500.257	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
16	LIDERMAN CRUZ	17.331.221	OPERADOR	DEPENDIENTE
17	JOSE LUIS TERNERA CAMARGO	77.000.328	OPERADOR	DEPENDIENTE
	TOPOGRAFIA			
18	LUIS UNEIMAR RAMOS AMADO	86,064,589	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
19	DANIEL FELIPE MESA CLAVIJO	1.010.123.532	CADENERO	INDEPENDIENTE
20	AMELIA SANABRIA	28.548.347	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
21	GILDARDO SANCHEZ GALEANO	7.818.268	CADENERO	INDEPENDIENTE

NOVIEMBRE 2024

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION
1	FERNANDO SERRANO BARRERO	93.129.456	MAESTRO	DEPENDIENTE
2	CESAR ALEJANDRO ALDANA CORTES	1.121.899.400	ALMACENISTA	DEPENDIENTE
3	HERNANDO AVILA	6.567.658	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
4	GIOVANNI LUGO	P.T. 938.347	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
5	FRANKLIN TOVAR	1.127.387.384	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
6	SIMON ALMARIO FIGUEROA	17.641.681	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
7	YULI MILENA PRADA LOZANO	1.121.908.253	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
8	MARIA GARZÓN	1.121.905.718	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
9	LUIS PAEZ	1.234.790.074	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
10	JOSE FERNANDO GUZMAN	1.002.063.963	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
11	ANGIE KATIKZA VARGAS CENDALES	1.121.863.849	CONTROLADORA VIAL	DEPENDIENTE
12	ISIDRO BUSTOS	79.500.257	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE
13	LIDERMAN CRUZ	17.331.221	OPERADOR	DEPENDIENTE
14	JOSE LUIS TERNERA CAMARGO	77.000.328	OPERADOR	DEPENDIENTE
	TOPOGRAFIA			
15	LUIS UNEIMAR RAMOS AMADO	86,064,589	TOPOGRAFO	INDEPENDIENTE
16	DANIEL FELIPE MESA CLAVIJO	1.010.123.532	CADENERO	INDEPENDIENTE

5.2. Seguimiento a compromisos laborales.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	1ª Quincena		2ª Quincena		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		El contratista ha cumplido con los requerimientos.
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos:	X		X		El contratista ha cumplido con los requerimientos.
· SOAT					
· Seguro de automóviles contra todo riesgo					
· Tarjeta de propiedad					
· Licencia de conducción de la persona responsable					
El contratista ha entregado a la interventoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		X		El contratista ha cumplido con los requerimientos.
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		El contratista ha cumplido con los requerimientos.
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		El contratista no ha allegado la documentación para verificación de requerimientos.
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X		El contratista no ha allegado la documentación para verificación de requerimientos.

5.3. Exámenes médicos.

Los soportes de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso se entregan en físico como anexo en cada informe mensual de obra.

5.4. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT.

Durante el presente periodo del informe, la interventoría en sus funciones de control y supervisión al contratista, en la implementación de cada uno de los ítems relacionados, verifica los indicadores de SST.

ESTADO				
DESCRIPCIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
Dotación completa	X			La mayoría cuenta y usa debidamente su dotación.
Buen estado		X		El estado de la dotación por desgaste es regular.
Uso según zona de trabajo		X		La dotación varía únicamente en casos muy específicos como la interacción con pozos.
DOTACIÓN LOCATIVA				
Dotación completa	X			La locación cuenta con los elementos mínimos para operación.
Buen estado		X		La locación cuenta con un estado regular de los elementos por desgaste
Fácil acceso y operación	X			Los elementos son ergonómicos y fáciles de usar
Uso según zona de trabajo	X			La locación está distribuida por zonas de trabajo.
Existencia de elementos primeros auxilios	X			Existen elementos de primeros auxilios.
MAQUINARIA - EQUIPO				
Estado del equipo	X			Los equipos se encuentran funcionales.

Regularidad del mantenimiento		X		Se realizan mantenimientos correctivos y no preventivos.
Vibraciones /Ruidos			X	No se control de este ítem.
Protecciones / Guardas / Frenos			X	No se control de este ítem.
Idoneidad operarios		X		No se control de este ítem.
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN.				
Uso permanente	X			Se evidencia uso permanente de señalización y demarcación
Uso según zona de trabajo	X			Se evidencia la demarcación idónea según la zona de trabajo
VIGILANCIA				
Personal suficiente			X	No hay evidencia de cumplimiento
Diurna			X	No hay evidencia de cumplimiento
Nocturna			X	No hay evidencia de cumplimiento
CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia	N/A	N/A	N/A	No aplica
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARL	X			Se evidencian afiliaciones al sistema de seguridad social.

5.5. Certificado de accidentalidad de la ARL del contratista.

No se realiza entrega a la interventoría por parte del contratista.

6. CONCLUSIONES

En este informe se profundiza en la ejecución de las labores por parte del personal de interventoría, enmarcando su papel en la supervisión y control de todas las actividades relacionadas con el proyecto. Se subraya la importancia de su presencia activa en el terreno, lo cual permite monitorear de cerca el desarrollo de las tareas y asegurar su correcta ejecución de acuerdo con los estándares establecidos.

El informe describe las labores de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) que la interventoría lleva a cabo en el cumplimiento de sus funciones. También, a través de la documentación de los puntos de inspección y supervisión. Esta labor se realiza en total concordancia con las normativas colombianas pertinentes, garantizando así el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y calidad en el proyecto.

Además, se identifican áreas específicas donde se han observado oportunidades de mejora para el contratista. Entre estas se incluye la necesidad de una entrega completa y oportuna de la documentación del personal, asegurando la adecuada afiliación a la seguridad social y la provisión puntual de Equipos de Protección Personal (EPP). Asimismo, se destaca la importancia de una correcta implementación de la señalización en el sitio de trabajo, así como el cumplimiento riguroso de los pagos de seguridad social, lo cual contribuirá a fortalecer la ejecución eficiente del proyecto y a garantizar un entorno laboral seguro y conforme a las regulaciones establecidas.

Durante el periodo del presente informe comprendido entre el 23 de julio de 2024 y el 15 de noviembre de 2024, el contratista de obra ha cumplido con el pago de seguridad social y parafiscales y ha cumplido con su plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1823 DE 2023

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META



PERIODO DEL INFORME

23 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.	
Título de Documento:	Informe de Especialista en Transporte y Vías Parcial No. 3 (23 de julio de 2024 al 15 de noviembre de 2024).	
Documento No:	INFVÍAS PAR-03	
APROBACIÓN		
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA** **Especialista en Vías y Transporte**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	15-07-2025
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA**
Vo. Bo. representante legal:	Firma:	
		15-07-2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 4
2.1. Localización del proyecto y descripción 4
2.2. Descripción del proyecto 5

3. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA 5

4. DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 9

5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 10
5.1. Información Preliminar 10
5.2. Información actual del proyecto 11

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 12
6.1. Registro fotográfico actividades de obra ..... ¡Error! Marcador no definido.
6.2. Registro fotográfico actividades de Interventoría 12

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento evidencia la gestión realizada por parte de la interventoría referente al componente vial del proyecto, al igual que permite diagnosticar el correcto desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 23 de julio de 2024 al 15 de noviembre de 2024. Lo anterior con el fin de procurar el MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. Este informe es el resultado del seguimiento y control del corredor vial intervenido, y tiene como objetivo fundamental mediante un criterio técnico, efectuar una evaluación del corredor tanto en la parte de diseño como en la parte de comportamiento funcional.

Con este proyecto la Administración Municipal pretende mejorar la transitabilidad, de este importante eje vial, beneficiando alrededor de 486 familias en pro de mejorar su calidad de vida. Se proyecta pavimentar la Cra. 43 en doble calzada en una longitud de 669 ml. con una estructura de pavimento con subbase granular de 30 Cm; base granular de 25 Cm. y una capa de concreto asfáltico de 10 cm. Se vio la necesidad de rehabilitar esta vía, para mejorar la infraestructura vial del sector y las condiciones de sus pobladores.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto y descripción

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en carrera 43 desde la calle 79 sur hasta la 85 sur– barrio Villa Juliana, de la comuna nueve (09) y el domicilio contractual es en el municipio de Villavicencio.

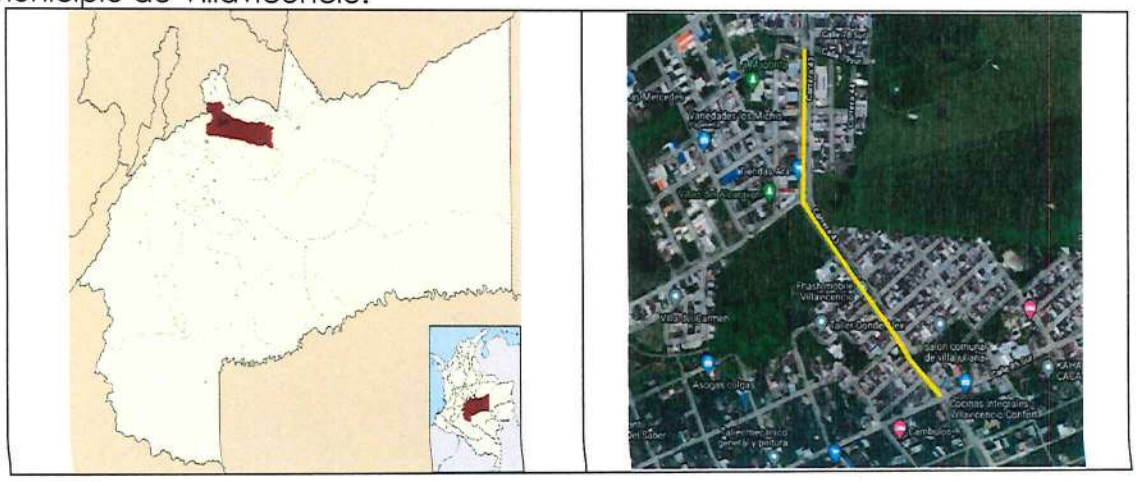


Ilustración 1. Carrera 43 desde la calle 79 sur hasta la 85 sur– Barrio Villa Juliana.

2.2. Descripción del proyecto

El proyecto tiene por objetivo realizar el mejoramiento vial de la carrera 43 entre calle 82 sur hasta la calle 85 sur, sector Villa Juliana, en el municipio de Villavicencio, meta. Para la carrera 43 se proyecta una doble calzada en pavimento asfaltico, separador central con ciclo ruta, el ancho de cada calzada se fija en 8.3m, este sector debe estar provisto de servicios públicos como energía eléctrica, redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial.

3. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA

El municipio de Villavicencio se encuentra localizado al Nor-oriente del departamento del Meta. El presente estudio corresponde se localizado en la parte oriental del casco urbano del municipio de Villavicencio. El cual posee una longitud aproximada de 669 mts aproximadamente, en la actualidad esta vía se encuentra en material afirmado. Así mismo el punto de inicio del proyecto K0+000, se encuentra localizado delante de al calle 78 sur cruce de la vía que da acceso al barrio Villa Juliana y finaliza en el K0+669 mts, metros delante de la calle 85 sur en colindancia con el Barrio Cambulos.

El proyecto comprende la construcción de una vía colectora, la cual se compone basicamente de dos calzadas de ancho 8.30 m con dos carriles de 4.15m divididas paralelo con un separador de 5.1m y zonas laterales blandas y duras de 3.30 m y 3.30 m respectivamente.

El Diseño Geométrico de las vías adyacentes e internas del proyecto, fue ajustado con el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras 2008, del Ministerio de Transporte INVIAS. Adicionalmente, al verificación de parámetros de diseño se apoyó en la norma "GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STRETS" 201 of the American Association of State Highway and Transportation Officials. (AASTHO 201).

Resumen de parámetros de diseño:


Parámetro	Unidad	Zona Urbana
Velocidad de diseño	Km/h	40
Categoría de la vía	-	Urbana
Tipo de terreno	-	Plano
Radio mínimo de curvatura	m	47
Long. Mínima curva circular	m	33,33
Entre-tangencia mínima	m	80
Peralte máximo	%	4
Bombeo	%	2

Pendiente relativa máxima (peraltes)	%	0,96
Pendiente relativa mínima (peraltes)	%	0,375
Implementación puntos de quiebre horizontal	-	Delta < 1 grado
Pendiente longitud máxima	%	7
Pendiente longitud mínima	%	0,30
Longitud mín. curva vertical	m	24
Longitud mín. tangente vertical	m	80
K (curva cóncava)	Adimensional	9
K (curva convexa)	Adimensional	4
K máximo	Adimensional	50
Distancia de visibilidad de parada	m	50
Puntos de quiebre vertical	-	A < 1%

Sección transversal:

Para el diseño geométrico se estableció que la vía en estudio definida por el área de Planeación, tendrá una calzada de 8.30 m para las vías secundarias (V-4) con carril de 4.150m, un andén de 3.3m, cuenta con separador intermedio de un ancho de 5.10m en el cual cuenta con una cicloruta con servicio para el transporte de bicicletas, peatones y personas en condición de discapacidad.

Calzada Norte (Izq)



Calzada Sur (Der)




Ilustración 2. Sección transversal calzada de vía.

Planta vía:

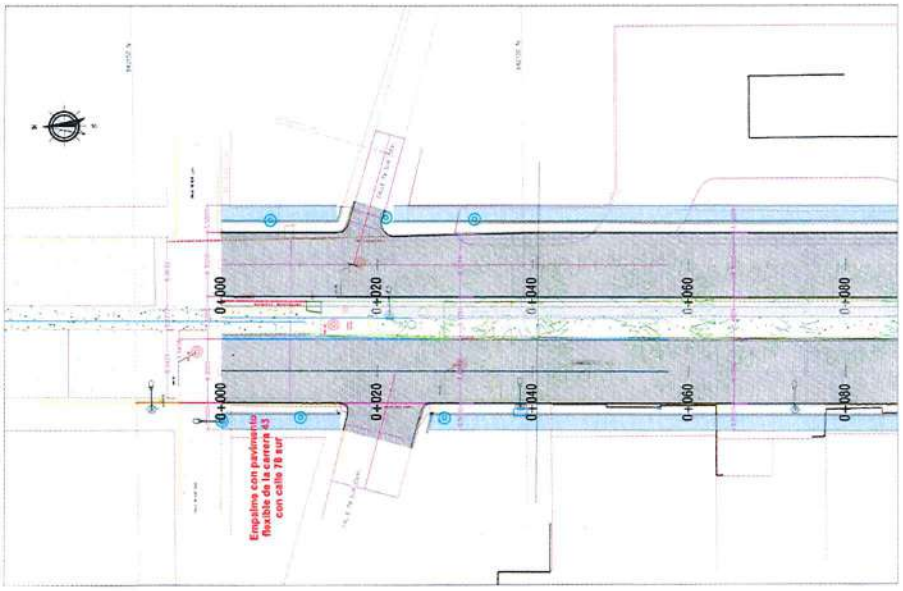


Ilustración 3. Empalme con perfil vial existente, vista en planta abscisas K0+000 a K0+080.

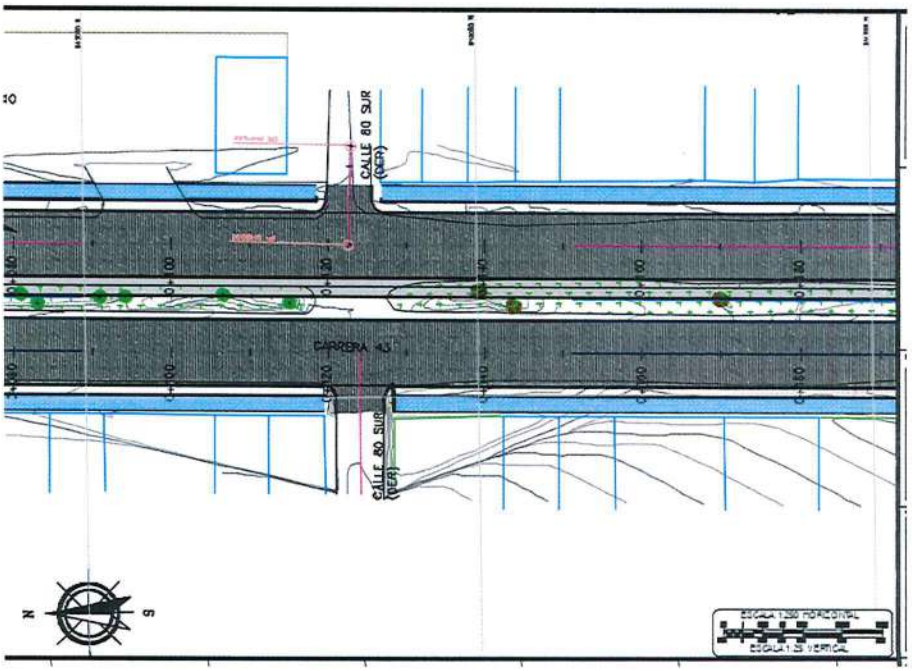


Ilustración 4. Vista en planta abscisas K0+080 a K0+190.

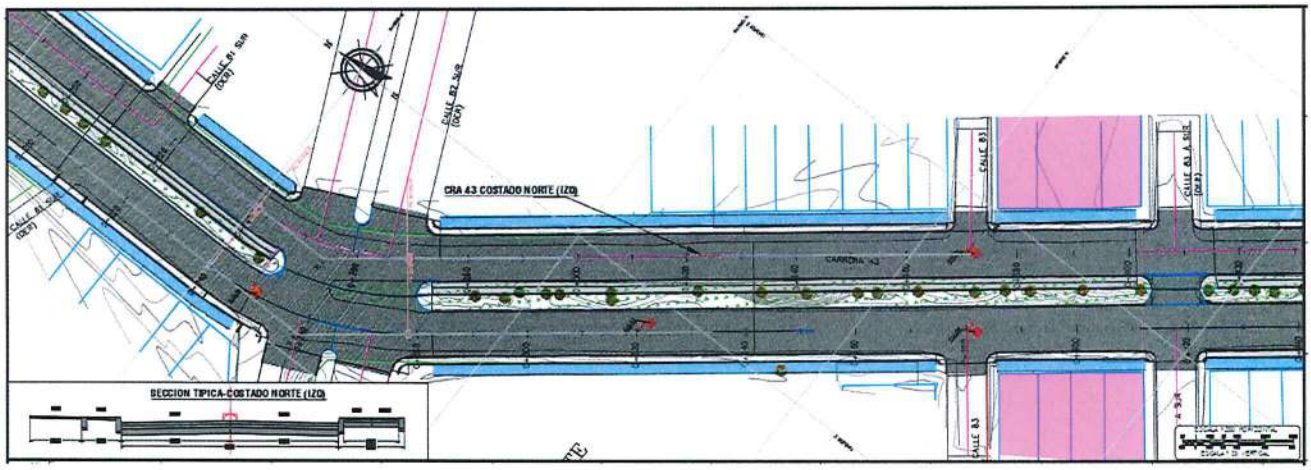


Ilustración 5. Vista en planta abscisas K0+190 a K0+440.

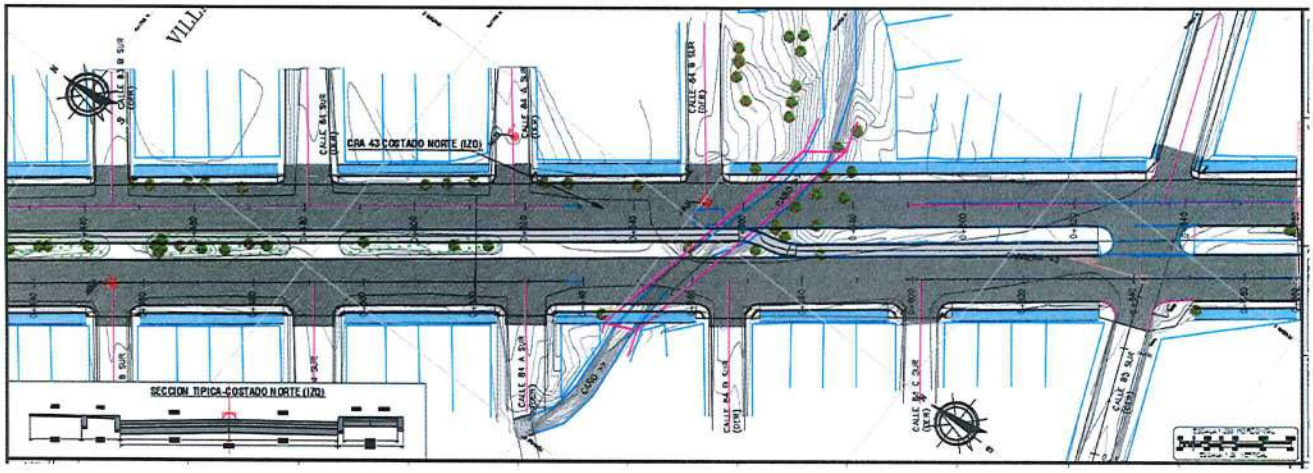


Ilustración 6. Vista en planta abscisas K0+440 a K0+669.

4. DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Para el diseño de la estructura de pavimento a construir fue utilizada la metodología por el método AASHTO y se tuvieron en cuenta los siguientes parametros de diseño:

- Radio de carga, a = 10.8 cm = 0.108 m
- Presión de contacto, p=5.6 Kg/cm2 =549 KPa
- Separación entre ejes, s = 32.40 cm = 0.324
- Nivel de confianza para calcular εzadm = 85% (Según criterio de la Shell)
- Velocidad de operación: 40 Km/h
- Tipo de Carretera: Urbana
- TMAP = 25.6 °C
- Periodo de Diseño=10 años
- Tránsito de diseño= 3.21x106 ejes equivalentes de 8.2 Ton en el carril de diseño durante el periodo de diseño. (*El estudio de tránsito fue suministro por la entidad contratante*)
- Nivel de confianza = 80%
- Desviación normal estándar = -0.841
- Serviciabilidad inicial = 4.2
- Serviciabilidad final = 2.0
- Error normal combinado So= 0.45
- CBR SBR =4.6 %
- CBR SBG = 30% Especificación INVIAS-22
- CBR BG= 80% Especificación INVIAS-22

(Los datos de estudio de suelos que emite la capacidad portante del terreno fueron tomados por los estudios entregados por la firma CIVIL CONTROL SAS).

De acuerdo al Manual de Diseño de Pavimentos Asfalticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito, Invias 2015, y el Estudio de Transito elaborado para el proyecto se designa un transito T3.

De acuerdo al Manual de Diseño de Pavimentos Asfalticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito, Invias 2015, y el Estudio Geotécnico y de suelos para el proyecto la categoría de la subrasante corresponde a S3.

Con los datos anteriores se realiza el diseño de la estructura de pavimento flexible por el método AASHTO 93, obteniendo la siguiente estructura:

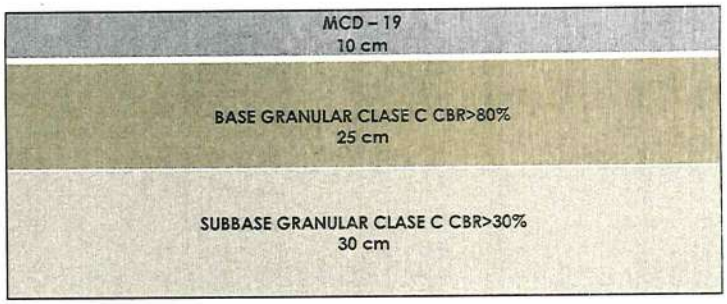


Ilustración 7. Perfil estructura de vía en pavimento flexible a construir.

5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Las especificaciones técnicas de construcción del pavimento deben cumplir con lo establecido en las especificaciones generales de carreteras del Instituto Nacional de Vías del año 2022. Resolución 1524 del 6 de Mayo de 2022.

5.1. Información Preliminar

Para la construcción de la vía contemplada dentro del CONTRATO DE OBRA No. 1822 DE 2023 se realiza como primera medida actividades preliminares que contemplan la topografía incluyendo la localización y replanteo de la vía.

Posteriormente se ejecutan labores de excavaciones y descapote en los puntos que corresponda la ejecución de cada actividad, realizando también una renivelación y conformación de la rasante existente, estas actividades con el fin de generar una superficie homogénea como soporte de la estructura del pavimento.

La estructura de la vía se realiza de la siguiente forma:

Se procede a realizar la colocación de los materiales que harán parte de la capa de afirmado, sub base granular y base granular, realizando para cada capa los debidos procesos de compactación, nivelación y comprobación de su determinada densidad y verificando las cotas, de forma tal que se cumpla con los diseños establecidos.

Luego de ello se procede a aplicar la imprimación asfáltica, sobre la capa de la base y finalmente se procederá a la colocación de la capa de rodadura, siguiendo los procesos constructivos adecuados de manera que se garantice la calidad del pavimento y los espesores de diseño.

5.2. Información actual del proyecto

Interferencia con gasoducto de alta presión de TGI S.A. ESP abscisa K0+260:
Es importante resaltar el inconveniente que se se presenta en la abscisa K0+260, en la cual se evidenció que existe una interferencia con un gasoducto de alta presión de la empresa transportadora de gas TGI S.A. ESP, la cual cruce la vía a pavimentar y se encuentra a una profundidad de aproximadamente 90cm, lo cual impide realizar cualquier intervención sobre la franja donde se encuentra la tubería. De acuerdo a la modificatoria N°4 del contrato de obra suscrita el 31 de octubre de 2024, el tramo de interferencia con TGI fue excluido del alcance del proyecto y la entidad contratante lo pavimentará en un futuro nuevo proceso contractual.

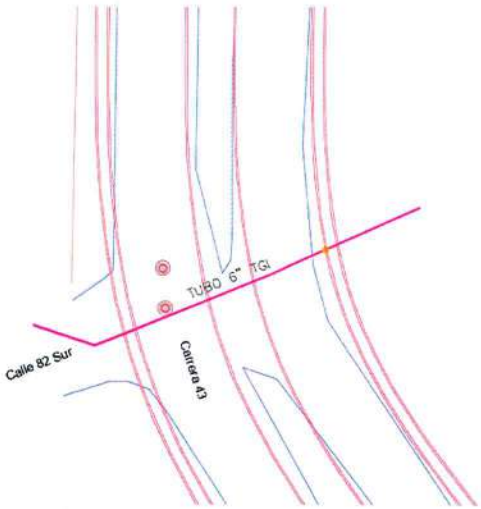


Ilustración 7. Vista en planta de punto de interferencia con gasoducto de 6" de empresa TGI SA ESP.

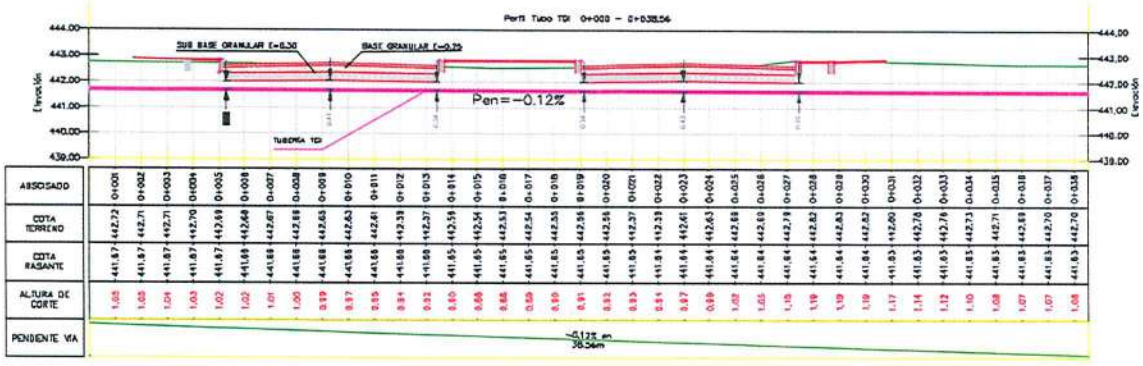


Ilustración 8. Detalle sección transversal de la vía en punto de interferencia con tubería de TGI.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó acompañamiento permanente durante la instalación de capas granulares de la estructura de pavimento, la imprimación e instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en algunos tramos de la vía.

6.1. Registro fotográfico actividades de Interventoría

	
CONTROL DE NIVELES DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA DE INTERVENTORÍA 27/09/2024.	VERIFICACIÓN DE ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE EXCAVACIONES ABIERTAS 12/09/2024.
	
ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA PARA INSTALACIÓN DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 27/09/2024.	SEGUIMIENTO, VIGILENCIA Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA 23/08/2024.

	
MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE MEZCLA ASFÁLTICA PREVIO INSTALACIÓN EN OBRA 23/10/2024.	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE ESPECIALISTAS DELEGADOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO (ENTIDAD CONTRATANTE) 23/10/2024.
	
ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DURANTE INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN MDC-19, CALZADA DERECHA SECTOR 3 24/10/2024.	

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente informe se analiza la información entregada por parte de la entidad contratante concluyendo que, el diseño geométrico y el diseño de la estructura de pavimento flexible se ajusta a las condiciones del entorno, al estudio de tránsito, condiciones del terreno natural, nivel de servicio y cumplen con la metodología de diseño y normativa INVIAS.

Durante el periodo del presente informe el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: comisión topográfica permanente para implantación y control de niveles durante la instalación de sardineles, cajeo e instalación de capas granulares para la vía, la excavación mecánica para el cajeo de la vía, la instalación de capa de subbase granular y capa de base granular en los tramos de vía donde se realizó el cajeo, el sobre acarreo para el transporte del material desde la cantera hasta la obra, el relleno con material de río para mejorar la subrasante donde se evidenciaron fallos, la instalación de sardineles para delimitar las calzadas de la vía y confinar las capas granulares de la estructura de pavimento flexible, y la arena lavada para cama y nivelación de los sardineles, la nivelación de pozos inspección en el sector 2 y la imprimación e instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en el tramo de vía del pluvial sector 2, abscisas K0+270 – k0+550.

Para mejorar la seguridad vial de los peatones que cruzaran sobre la estructura del Box Coulvert en el caño Quebrada Grande, la interventoría nuevamente recomienda la instalación de barandas metálicas sobre los guarda ruedas del Box. Igualmente, se recomienda a la entidad contratante realizar la señalización horizontal y vertical tan pronto la vía se entregue a la entidad y se ponga en funcionamiento.

El contratista de obra CONSORCIO VIAL JULIANA parcialmente ha dado cumplimiento con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito PMT.

ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA
