Contrato de Obra No. 1757 DE 2020 **Contratista:**

Contrato de Interventoría No. 1832 DE 2020 **Interventoría:** x

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

INFORME MENSUAL No. 31 septiembre

No.	CONTENIDO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	6
1	**INTRODUCCIÓN**	10
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**	11
2.1	Localización	11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto	11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía	12
2.4	Características técnicas del proyecto	14
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**	20
3.1	Información general del contrato	20
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	23
3.3	Seguimiento Ítems no previstos	96
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	97
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**	100
4.1	Informe Semanal	100
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	100
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	100
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	100
4.5	Estado General del Tiempo	100
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	100
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	100
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	100
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	100 101
	• Seguimiento Programa de Obra	101
	• Seguimiento Programa de Inversiones	101 101
	• Actas de Comité de Obra	101
	• Actas de Reunión	101
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	102
5.1	Información general del contrato	102
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	104
5.3	Informes especialistas y profesionales	104
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC	105
5.5	Informe matriz de riesgos.	105
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría	106
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	106

6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	108
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	108
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	108
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	108
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	108
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	108
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	108
		108
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	108
	• Seguimiento al Plan de Cargas	108
7	**Conclusiones y recomendaciones**	109
8	**Anexos**	110
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo	111
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras	120
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas	122
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente	137
	*	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.
El enlace para el video de avance de las obras está relacionado en página 107

Firma:

Nombre:YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 121 de fecha 21/01/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA- REGIÓN PACÍFICO"

CONSORCIO VIAL ODISEO

MÓDULO 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1832 DE 2020

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA- REGIÓN PACÍFICO"

Corredor Quibdó Pereira

(Ruta 5002, 5003 y 50RS01)

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°31

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** ago-23

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ

PLAZO INICIAL: 18 MESES
FECHA DE INICIO: 19/03/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2023
PLAZO ACUMULADO: 32,5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 134.000.109.999,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 71.694.257.130,40
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 205.694.367.129,40
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 59.980.756.869,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 38.026.473.979,18

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1832 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	8,59
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	KM	4,8
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		KM	220
Otros (Especificar cuales)	Repotenciación y recuperación del puente limones	UND	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0	7,9
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	KM	0	3,8
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		KM	220	220
Otros (Especificar cuales)	Repotenciación y recuperación del puente limones	UND	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 158.763.198.726,40	$ 1.160.192.606,08	$ 159.923.391.332,48
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 11.971.162.647,00	$ 87.481.574,30	$ 12.058.644.221,30
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 440.000.000,00	$ 3.215.384,62	$ 443.215.384,62
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.376.234.074,00	$ 831.484.474,00	$ 5.207.718.548,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 324.000.000,00		$ 324.000.000,00
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 27.737.397.643,00		$ 27.737.397.643,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 203.611.993.090,40	$ 2.082.374.038,99	$ 205.694.367.129,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.631.338.875,50	33844399	4.665.183.274,50
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 114.207.308,00	$ 834.592,00	$ 115.041.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.745.546.183,50	$ 34.678.991,00	$ 4.780.225.174,50

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2023 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	156.821.765.839
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	166.230.785.407
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		106%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	27
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	249
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1380
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**276**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	PAGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
1	05 de octubre de 2023		Versión Inicial	X	
Elaborado por: **Director de Interventoría:** Ing. Héctor Adolfo Posso Moncada			Revisado por: **Director de Interventoría:** Ing. Héctor Adolfo Posso Moncada		

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA No.	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	INVIAS	05/10/2023
2	ARCHIVO CONSORCIO	05/10/2023

CONSORCIO VIAL ODISEO MODULO N°1

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 4
1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 16
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 16
3. 2 DESCRIPCIÓN RESUMIDAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES 19
1. INVERSION A LA FECHA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.3 SEGUIMIENTO A LOS ÍTEMS NO PREVISTOS 41
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 42
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 45
4.1 Informe semanal 45
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 45
4.3 Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 45
4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 45
4.5 Estado general del tiempo 45
4.6 Resumen ensayos de laboratorio 45
4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 45
4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de obra 45
4.9 Otros documentos seguimiento mensual: 45
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47
5.1 Información general del contrato 47
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 49
5.3 Informe especialistas y Profesionales 49

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 50
5.5 Informe Matriz de Riesgos. 50
6.1 Equipo contrato de interventoría 53
6.2 Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 53
6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 53
6.4 Seguimiento a garantías contrato de interventoría 53
6.5 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 53
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 54
8.0 ANEXOS 55

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del proceso de licitación pública LP-DT-050-2020 y número ID del Secop CO1.NTC.1492708, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato de obra No 1757 del 2020, con el Consorcio Mega vías chocó para la ejecución del Contrato de Obra que tiene por objeto: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA, " CONCLUIR, CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES "

Mediante oficio DO-GPE 13491, expedido por el Coordinador grupo de Gerencia de Proyectos Estratégicos de INVIAS, se impartió orden de iniciación al contrato de Obra con fecha 19 de marzo de 2021.

Por otra parte, mediante el proceso de Concurso de méritos CMA-DT-174-2020 y número ID del Secop CO1.NTC.1538381, se adjudicó el contrato de Interventoría N°1832 del 2020, al Consorcio Vial Odiseo para ejercer la INTERVENTORÍA sobre el contrato No.1757/2020 que tiene por objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA,CHOCO Y RISARALDA-REGION PACIFICO. Mediante oficio DO – GPE 13492, por el Coordinador grupo de Gerencia de Proyectos Estratégicos de INVIAS, se impartió orden de iniciación al contrato de Interventoría con fecha 19 de marzo de 2020. La Supervisión del Contrato es ejercida por el Ingeniero YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA, mediante resolución No. 121 de fecha 21 de enero de 2021, funcionario de la Dirección Territorial de INVIAS CHOCÓ. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el Ingeniero RUDY VERDOOREN RUIZ, mediante oficio DEO 8895 del 21 de febrero de 2023. INVIAS-Bogotá. La gestión ambiental es ejercida por la ingeniera LINA ALEJANDRA RODRIGUEZ, la gestión social por el doctor EDGAR ENRIQUE GARCÍA, la gestión predial es ejercida, la parte jurídica por la abogada MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ, asignados mediante memorando No SMA 15646 de fecha 08 de marzo de 2021, la gestión predial es ejercida, la parte valuatorio por el ingeniero CRISTIAN CAMILO JIMÉNEZ ÁVILA mediante oficio SS272 del 04 de enero de 2022. La gestión de sostenibilidad ambiental por el ingeniero JHEISON MELO y la gestión de sostenibilidad social por la trabajadora social CATALINA BELTRÁN asignados mediante memorando No SMA 17033 del 12 de marzo de 2021.

El presente informe mensual de Interventoría N°31 describe las actividades realizadas en el periodo de septiembre de 2023, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión 1 del 2022.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

La oficina del Consorcio Mega Vías Chocó se encuentra ubicada en la cabecera municipal de Pueblo Rico, en cuanto las fuentes de materiales utilizadas actualmente se tienen: Planta en el PR55+400 de la ruta 5002 en Gingarabá, Triturados y concretos en el PR16+000 hacia la Virginia de la ruta 50RS01. Tal y como se muestra en la ilustración 1.

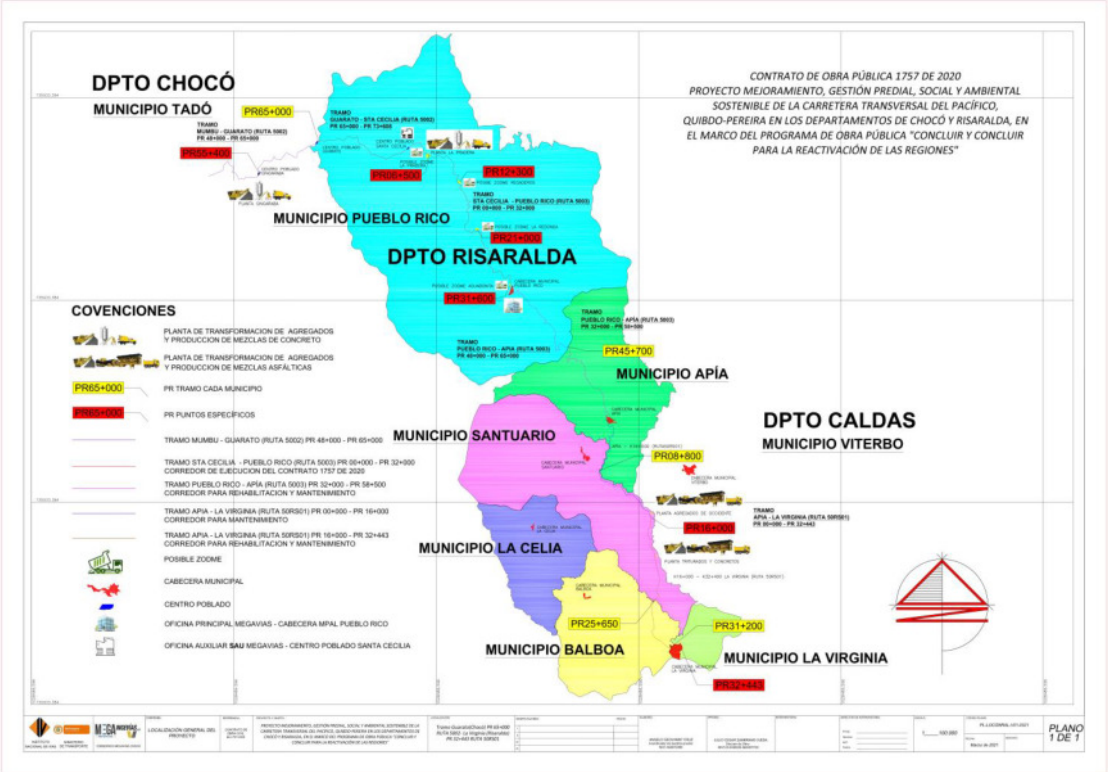


Ilustración 1. Ubicación oficinas y fuentes de materiales Cto 1757 de 2020.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El corredor está conformado por las rutas 1307, 5002, 5003, 50RS01, 2507 y 29RS01, la cual permite la comunicación entre los departamentos de Choco y Risaralda a través de los municipios de Pereira, La Virginia, Apía, Pueblo Rico, Guarató, Mumbú, Playa de Oro, Tadó, Las Ánimas y Quibdó ubicados en las Regiones del Eje Cafetero y Pacífica, al Centro oriente del Departamento del Chocó y al occidente del Departamento de Risaralda.

El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la(s) vía(s) objeto de atención.

En la anterior imagen se registra el corredor objeto de intervención con la ejecución del proyecto.

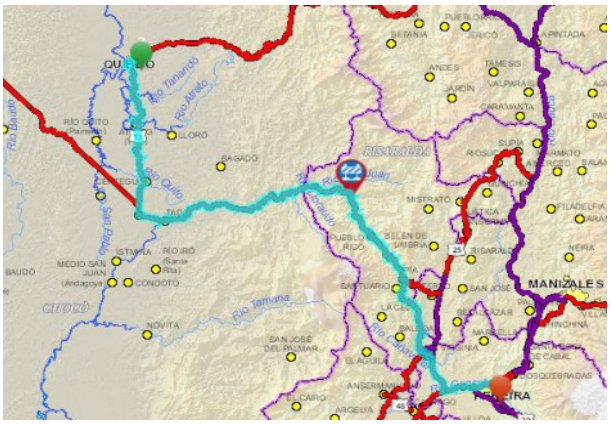


Ilustración 2. Localización del proyecto

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se relacionan fotografías de avance del presente periodo, para el mejoramiento a través del desarrollo de actividades constructivas de 9.70 Km para construcción de pavimento, rehabilitación de 4.47 Km de sectores priorizados, recuperación y repotenciación del Puente Limones y las actividades de mantenimiento en los 220 Km del corredor vial, garantizando la transitabilidad y seguridad de los usuarios.

Adicional a los tramos antes descritos para pavimentación, rehabilitación o construcción de puentes, se ejecutarán dos sitios críticos priorizados ubicados en los PPR41+050 - R41+050 - PR44+300 – PR44+430, de la RN5003.



INSTALACION DE FORMALETA PARA MR45 PR14+250/325 RUTA 5003



INSTALACION DE MR45 PR14+250/325 RUTA 5003



INSTALACION DE MR45 PR14+250/325 RUTA 5003



EXCAVACION DE ZANJAS DE CORONACION PR41+100 RUTA 5003



EXCAVACION DE ZANJAS DE CORONACION PR41+100 RUTA 5003



EXCAVACION DE ZANJAS DE CORONACION PR41+100 RUTA 5003



PERFORACIONES PARA ANCLAJES PR14+950 RUTA 5003



PERFORACIONES PARA ANCLAJES PR14+950 RUTA 5003



PERFORACIONES PARA ANCLAJES PR14+950 RUTA 5003



CONCRETO LANZADO TALUD DE ANCLAJES PR41+100 RUTA 5003



CONCRETO LANZADO TALUD DE ANCLAJES PR41+100 RUTA 5003



CONCRETO LANZADO TALUD DE ANCLAJES PR41+100 RUTA 5003




INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003

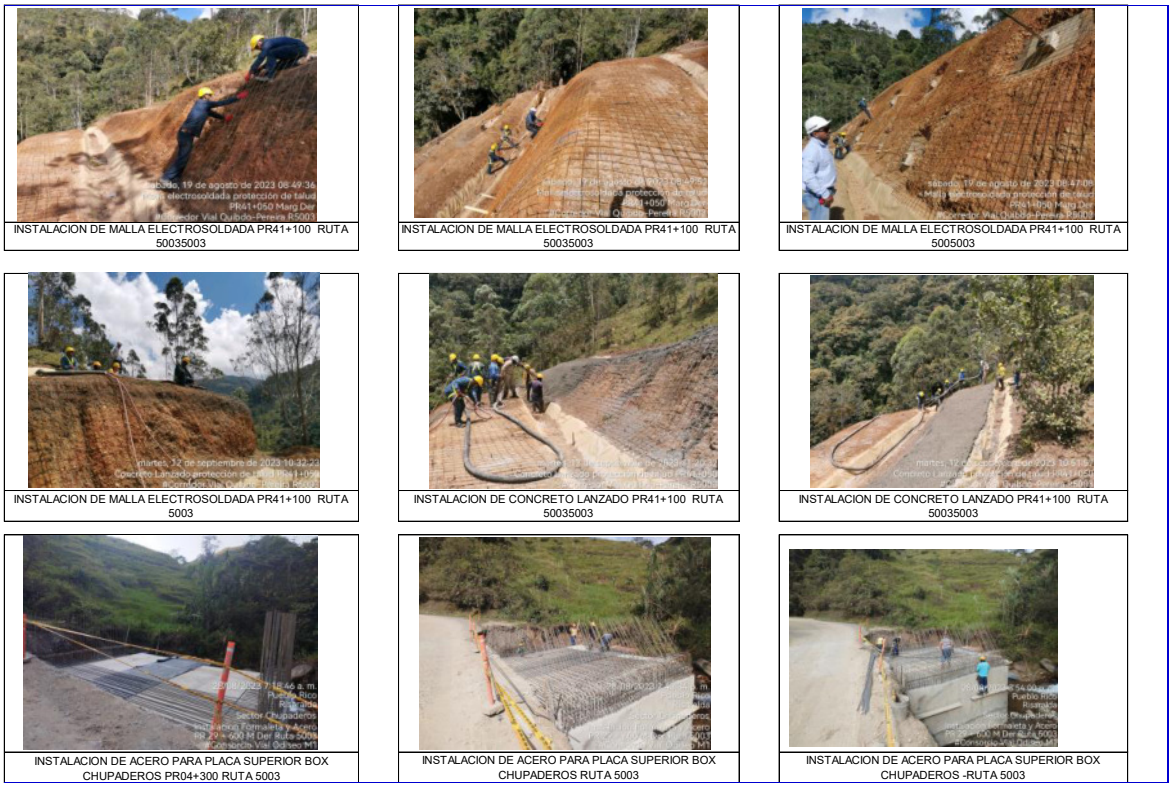

Registro fotográfico de las actividades del mes.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Una vez culminada la etapa de Estudios y diseños, en cumplimiento del pliego de condiciones con respecto a las actividades a ejecutar y alcance, luego de armonizadas y definidas las metas físicas con los otros contratos del corredor, se determinó para el contrato 1757 de 2020 las siguientes principales actividades priorizadas u obras a ejecutar:

- Las actividades de mantenimiento el contratista de obra las realiza en los 220 Km del corredor vial, garantizando la transitabilidad y seguridad de los usuarios con actividades de atención de derrumbes, mejoramiento de pasos críticos y respectiva señalización.
- Mejoramiento a través del desarrollo de actividades constructivas de 9.70 Km para construcción de pavimento.

ACTUALIZACION META FISICA CON LOS RECURSOS VIGENTES				
RUTA	**TIPO DE PAVIMENTO**	**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**LONGITUD KM**
1307	CERTEGUI	K55+745,00	K55+865,00	0,19
5002	RIGIDO MR45	PR60+949,00	PR61+134,00	0,19
5002	RIGIDO MR45	PR61+571,00	PR61+676,00	0,10
5002	SEMIVIADUCTO	K61+100,00	K61+214,00	0,11
5002	VIGA VOLADIZO	K67+543,10	K67+905,10	0,11
5002	RIGIDO MR45	K71+997,64	K73+154,00	1,14
5003	RIGIDO MR45	K04+350,00	K04+500,00	0,15
5003	RIGIDO MR45	K12+731,70	K14+270,00	1,54
5003	RIGIDO MR45	K15+340,00	K16+000,00	0,66
5003	RIGIDO MR45	K16+090,00	K16+587,00	0,54
5003	RIGIDO MR45	K17+930,00	K18+445,00	0,52
5003	RIGIDO MR45	K18+820,00	K18+973,00	0,15
5003	RIGIDO MR45	K19+150,00	K19+220,00	0,07
5003	RIGIDO MR45	K19+910,00	K20+275,00	0,31
5003	RIGIDO MR45	K20+323,00	K20+490,00	0,17
5003	RIGIDO MR45	K20+640,00	K22+600,00	1,91
5003	RIGIDO MR45	K23+470,00	K23+890,00	0,42
5003	RIGIDO MR45	K29+405,00	K29+500,00	0,10
50RS01	FLEXIBLE (LIMONES)	K10+200,00	K10+310,00	0,11
50RS01	FLEXIBLE (LOS ANGELES)	K10+590,00	K10+710,00	0,12
TOTAL A PAVIMENTAR				**8,59**
PUNTOS DE REHABILITACION				
5003	FLEXIBLE	K54+500,00	K56+500,00	2,00
5003	FLEXIBLE	K56+580,00	K57+510,00	0,93
5003	FLEXIBLE	K38+400,00	K40+190,00	1,79
5003	FLEXIBLE (EL CRISTO)	K44+450,00	K44+570,00	0,12
TOTAL A PAVIMENTAR				**4,84**

Tabla 1. Características técnicas del proyecto

En cuanto a la estructura de pavimento se tienen estructuras para un periodo de diseño de 20 años, el cual fueron aprobadas, para ser implementadas en los diferentes sectores como se muestra a continuación:

FRENTE PR72+000 AL PR73+200 SANTA CECILIA – PUEBLO RICO.

Para el primer kilómetro a intervenir que es del PR72+000 al PR73+200, sector 1 Tadó – Santa Cecilia, se contempla estructura general de pavimento aprobada por esta interventoría para las actividades constructivas de dicho frente.

Losa MR 4.5 MPa (INV Art. 500-13) espesor = 25 cm
Subbase Granular (INV Art. 320-13) espesor = 15 cm
Material drenante (INV Art. 673-1P) Espesor: 25 cm
Material granular existente con k=49.4 MPa7m

Ilustración 2 Estructura de pavimento aprobada para el sector PR72+000 al PR73+200

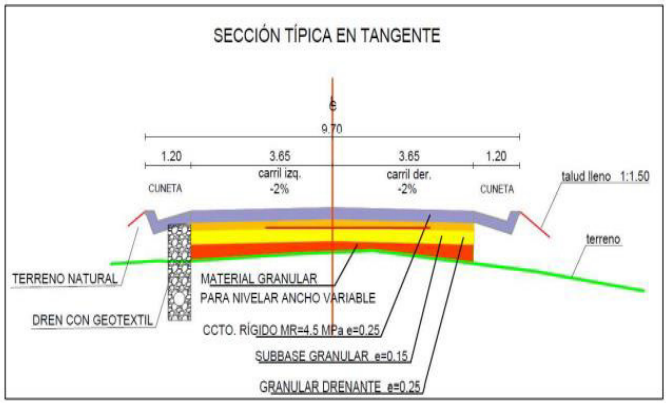


Ilustración 3 Sección trasversal típica para el sector PR72+000 al PR73+200

Una vez revisada la presentación de las premisas y parámetros de diseño por parte del especialista en materia esta interventoría, considera apropiado realizar la aceptación del diseño de espesores

y proceder a su implementación en obra en dicho sector, buscando atender los requerimientos que se presenten de especificación de materiales que hagan parte del alcance contractual.

FRENTE PR12+700 AL PR14+050 SANTA CECILIA – PUEBLO RICO.

Para el segundo frente PR12+700 al PR14+050 Santa Cecilia – Pueblo rico, se contempla estructura general de pavimento, el cual fue aprobada por parte de esta interventoría para ser implementada en el desarrollo de los trabajos de este sector.

Losa MR 4.5 MPa (INV Art. 500-13) espesor = 26 cm
Subbase Granular SBG-50 (INV Art. 320-13) espesor = 15 cm
Material drenante (INV Art. 673-1P) Espesor: 25 cm
Material granular existente con k=43.9 MPa/m

Ilustración 5 Estructura de diseño para pavimento rígido para alternativa vía Santa Cecilia – Pueblo Rico PR12+700 – PR14+050

FRENTE PR14+050 AL PR17+100 SANTA CECILIA – PUEBLO RICO.

Para este tramo PR14+050 AL PR17+100 Santa Cecilia – Pueblo Rico, el consorcio Mega vías chocó presento la siguiente estructura:

Losa MR 4.5 MPa (INV Art. 500-13) espesor = 26 cm
Subbase Granular SBG-50 (INV Art. 320-13) espesor = 15 cm
Material drenante (INV Art. 673-1P) Espesor: 25 cm
Material granular existente k=43.7 MPa/m para tramo 1 (PR14+050-RP16+0300) k=48.7 MPa/m para tramo 2 (PR16+0300-PR17+0100)

Ilustración 6. Estructura presentada para PR12+700 al PR14+050 de la ruta 5003.

Para el FRENTE- Reemplazo PR15+785 ENTRE (PR15+600 AL PR16+600) SANTA CECILIA – PUEBLO RICO. El consorcio mega vías chocó presento la siguiente estructura:



Ilustración 7. Estructura de diseño para pavimento rígido para alternativa vía Santa Cecilia – Pueblo Rico. Sector con reemplazo cerca del PR15+785, máximo entre PR15+600 y PR16+000.

Para las ventanas que se tienen identificadas en los PR3+255-PR3+573, PR4+240-PR4+443, PR10+050-PR10+550, PR10+850-PR10+950, y PR12+160-PR12+310. El consorcio mega vías chocó presento la siguiente estructura:

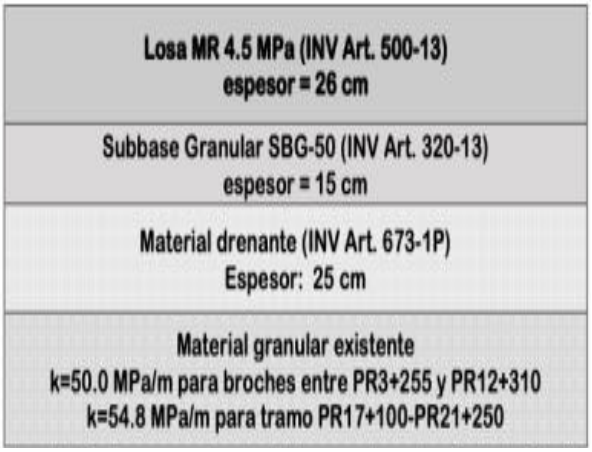


Ilustración 8. Estructura de diseño para pavimento rígido para alternativa vía Santa Cecilia – Pueblo Rico sectores PR3+255-PR3+573, PR4+240-PR4+443, PR10+050-PR10+550, PR10+850-PR10+950, y PR12+160-PR12+310.

Dependiendo de necesidades específicas de algunos sectores, se recomendarán alternativas de recuperación que garanticen el buen comportamiento de la estructura. Estas tres estructuras presentadas en las ilustraciones 5,6 y 7 por parte del consorcio mega vías chocó, fueron aprobadas para implementarlas en estos sectores descriptos.

- Rehabilitación de 8 Km de sectores priorizados.

Se tienen priorizados dentro del proyecto 8 kilómetros entre el casco urbano del municipio de Pueblo Rico y el casco urbano del municipio de Apia, con el fin de realizar la rehabilitación del pavimento flexible existente.

RUTA	FRENTE	TIPO	PR Inicial	PR Final	LONGITUD (Km)
5003	Frente 18	Rehabilitación	PR54+500	PR56+500	2
5003	Frente 28	Rehabilitación	PR56+500	PR58+000	1.5
5003	Frente 29	Rehabilitación	PR34+000	PR38+500	4.5
			TOTAL, REHABILITAR		**8**

Tabla 2. Tramos de rehabilitación del proyecto

- Puente Limones: Localizado en el PR10+200 de la ruta 50RS01 entre el corregimiento de La Marina (municipio de Santuario) y el municipio de La Virginia del departamento de Risaralda, en donde se está realizando la repotenciación de la súper estructura del puente que corresponde a una estructura metálica comprendida por 4 vigas (de alma llena) y elementos de arriostramiento (perfiles UPN dobles), con un peso calculado de 227.000 Kg. La estructura presenta una deflexión vertical máxima de 477 mm, la cual se proyecta recuperar para habilitar el paso de vehículos, con una longitud total del puente de 55 metros entre los ejes de apoyo y un ancho total del puente de 9.20 metros, con un ancho de calzada de 8.50 metros y dos barreras de 0.35 metros a ambos lados.
- Atención puntos críticos: A lo largo del corredor Quibdó – Pereira se han identificado varios sitios que presentan afectación comprometiendo la banca de la carretera, los cuales se han priorizado conjuntamente entre el Contratista de Obra, esta Interventoría y la administración vial delegada por el INVIAS para este sector. El contratista de obra dentro de su adición contempló recursos para la realización de los diseños y para la ejecución de varios de estos sitios, a la fecha se tienen priorizados 15 puntos críticos de intervención así:

i. PR 34+020, Ruta 5003.

ii. PR 35+870, Ruta 5003.

iii. PR 36+890, Ruta 5003.

iv. PR 38+180, Ruta 5003.

v. PR 40+300, Ruta 5003.

vi. PR 40+370, Ruta 5003.

vii. PR 40+430, Ruta 5003.

viii. PR 42+720, Ruta 5003.

ix. PR 44+840, Ruta 5003.

x. PR 45+085, Ruta 5003.

xi. PR 45+910, Ruta 5003.

xii. PR 47+450, Ruta 5003.

xiii. PR 49+660, Ruta 5003.

xiv. PR 49+820, Ruta 5003.

xv. PR 57+600, Ruta 5003.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 3. Información general contrato de obra

Numero Proceso	: LP-DT-050-2020
Número ID Secop	: CO1.NTC.1492708
Contrato No:	:1757 de 2020
Fecha Suscripción	: 16 DE DICIEMBRE DE 2020
	: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA

	CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
Contratista	: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ
NIT	: 901.441.905-0
Representante legal	: JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO
C.C. No	: 98.669.937
Integrante 1	: INGENIERÍA Y VÍAS S.A.S - 50%
NIT:	: 800.029.899-2,
Integrante 2	: MEGA PROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S – 50%
NIT:	: 811.038.634-6
Valor inicial del Contrato	: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($134.000.109.999) M/CTE., INCLUIDO IVA.
Valor Adición N°1	: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($45.894.257.130,40) M/CTE., INCLUIDO IVA.
Valor Adición No 2	: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES ($25.800.000.000,00) M/CTE., INCLUIDO IVA.
Valor Total Acumulado	: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 205.694.367.129,40) M/CTE., INCLUIDO IVA.

Modificaciones	: MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2021 del 12 de octubre de 2021. MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (2) DE 2021 del 11 de noviembre de 2021. MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2021 del 22 de diciembre de 2021. MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO (04) DE 2022 del 20 de mayo de 2022. MODIFICACIÓN NÚMERO CINCO (05) DE 2022 del 16 de agosto de 2022. MODIFICACIÓN NÚMERO SEIS (06) DE 2022 del 15 de septiembre de 2022. MODIFICACIÓN NÚMERO SIETE (07) DE 2022 del 02 de noviembre de 2022. MODIFICACIÓN NÚMERO OCHO (08) DE 2023 del 24 de marzo de 2023. MODIFICACIÓN NÚMERO NUEVE (09) DE 2023 del 30 de marzo de 2023. MODIFICACIÓN NÚMERO DIEZ (10) DE 2023 del 26 de junio de 2023. MODIFICACIÓN NUMERO ONCE (11) DE 2023 Del 29 de julio de 2023.
Plazo Inicial	: (18) Meses
Prórroga 1	: (3.5) Meses
Prórroga 2	: (3.0) Meses
Fecha de inicio	: 19 marzo 2021
Fecha de terminación	: 30 noviembre 2023
Dirección	: Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado Medellín, Antioquia / PBX (4) 448-5587
Contacto	: 3116628

3. 2 DESCRIPCIÓN RESUMIDAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL MES

Área técnica

Semana No 129 del 01 al 07 de septiembre de 2023.

ZODME LAS VILLAS - PR09+500 RUTA 5003

En el PR09+300: En la margen izquierda de la vía, se continua con la conformación de terrazas con materiales provenientes excavaciones y derrumbes.

FRENTE #2 - PR12+731-PR14+118 RUTA 5003

PR13+686 PUENTE PIUNDA: A margen derecha, se continua con el figurado de acero de los jerséis del puente.

FRENTE # 9 - PR14+118- PR15+000 RUTA 5003

PR14+302 al PR14+372: a margen derecha se instala formaleta y se funde losa en concreto hidráulico MR-45

PR 14+190: a margen izquierda, se continua con la construcción del canal disipador.

PR14+500 al PR14+600: a margen derecha, se realiza liberación de material granular tipo sub base.

PR14+721,5 al PR14+790: a margen derecha, se instala losa en concreto hidráulico MR-45.

PR14+790 al PR14+879: a margen izquierda, se libera formaleta en losa para concreto MR-45.

PR14+990: a margen derecha, se inicia con la perforación de anclajes activos de talud.

FRENTE #4 - PR15+000-PR16+000 RUTA 50037

PR15+015: se realiza instalación de concreto de 28 Mpa, en guarda ruedas de los box-culvert y se avanza en la construcción de disipadores a margen izquierda.

R15+180: a margen izquierda se avanza en la construcción de canal disipador.

PR15+240: a margen izquierda, se funde guarda ruedas en concreto de 28 Mpa.

PR15+652 al PR15+715: a margen derecha de realiza instalación de concreto hidráulico MR-45

FRENTE # 8 - PR18+600-PR19+400 RUTA 5003

En el PR19+000, Se continua con las actividades de corte de talud para terrazas y remoción de material en la zona del derrumbe presentado el 18-03-2023. El paso de vehículos está restringido a un solo carril.

PR19+217,5 al PR19+339 RUTA 5003: a margen derecha, se instala formaleta y se funde losa en concreto hidráulico en MR-45.

PR20+250 al PR20+277: En el carril derecho de vía, se instala formaleta y se funde losa en concreto hidráulico Mr-45.

FRENTE #17 - PR22+030- PR23+900 RUTA 5003

PR22+040: En el costado derecho, se continua con la construcción de sección de canal disipador, muros laterales en concreto de 28 MPa.

FRENTE #22 – PR29+415- PR29+500 RUTA 5003

PR29+600: En el sector “Chupaderos”, en el carril derecho se funde en concreto de 28 Mpa, losa superior y se procede a construir los muros laterales de la poceta de encole del Box-Culvert.

FRENTE #29 - PR34+000- PR41+100 RUTA 5003

PR38+380 al PR38+500: a margen izquierdo del tamo de asfalto, se continua con la construcción de cunetas en concreto de 28 MPa.

En PR41+050: a margen derecha de vía, se continua con la perforación e instalación de anclajes. También se avanza en la excavación de zanjas de coronación e instalación de geomembrana y se instala de malla electrosoldada en el talud.

PR58+425 al PR58+475 RUTA 5002 5002 PEÑAS DEL OLVIDÓ

En PR61+100: se continúa instalando formaleta y acero para losa del semi viaducto, pero el día 05-09-23 no se registra actividad por inconvenientes con la comunidad y el INVIAS.

A margen izquierda de la vía, se finaliza excavación mecánica de Coulvert, pero se suspende actividades desde 31-08-2023.

FRENTE #25 - PUENTE LOS ANGELES - PR10+590-PR10+710 – RUTA 50RS01

Se realiza conformación de material de sub base en los aproches del puente

FRENTE #26 – PUENTE CERTEGUI PR55+745-PR55+865 RUTA 1307

PR56+700: En el sector de “Certegui”, se instala estructura metálica para el puente, y se procede a realizar soldadura en riostras metálicas entre vigas.

PROYECTOS SOCIALES

PR55+100 RUTA 5002, Puesto de salud de Gingaraba: Se realizan labores de instalación de cerámica en pisos y baños del puesto de salud.

Se realiza adecuación de rampa de acceso al puesto de salud.

Se continua la excavación para la instalación del tanque para el pozo séptico.

PR55+100 RUTA 5002, Comedor comunitario Gingaraba:

Se realiza etapa documenta para inicio del proyecto de mejoras de áreas comunes del sector de Gingaraba, que incluye el comedor comunitario

PR 01+100 RUTA 5003, Piedras Bachichi: Cancha de Futbol en grama natural:

Se continua con el suministro y extendido de material seleccionado producto de la excavación para la realización de llenos de acuerdo a los diseños topográficos.

PR01+080 RUTA 5003, Cancha multifuncional Piedras Bachichí: Se encuentra pendiente realizar acceso en losas de concreto rígido, el cual será construido cuando se termine la cancha de futbol de la misma comunidad.

En la Escuela la Cabaña; se termina con la instalación de estuco y de los pisos en baldosas, se encuentran pendientes el suministro e instalación de puertas y ventanas.

PR21+700 en la ruta 5003: se está ejecutando la construcción de obra hidráulica dentro del predio del sr. Hincapié, para subsanar afectación a solicitud del propietario.

Semana No 130 del 08 al 14 de septiembre de 2023.

PR04+250 RUTA 5003: En el carril derecho, se hace mejoramiento de la estructura y en los dos (2) carriles se procede a conformar y realizar céreo de material granular de lecho drenante y subbase.

ZODME LAS VILLAS - PR09+500 RUTA 5003

En el PR09+300: En la margen izquierda de la vía, se continua con la conformación de terrazas con materiales provenientes excavaciones y derrumbes.
A margen izquierda del zodme, se realiza excavación y solado para instalación de tubería de 36" para el manejo de aguas.

FRENTE #2 - PR12+731-PR14+118 RUTA 5003
PR13+686 PUENTE PIUNDA: A margen derecha, se continua con la instalación de acero y formaleta para jersey del puente.
PR13+620 al PR13+667: en la calzada, se realiza conformación de subbase granular.

FRENTE # 9 - PR14+118- PR15+000 RUTA 5003
PR14+372 al PR14+429: en el carril derecho, se funde losa en concreto hidráulico MR-45
PR14+429 al PR14+506: a margen derecha, se continua con la instalación de concreto MR-45
PR14+990: a margen derecha, se realiza chequeo con topografía y se proceder a realizar corte en el talud, formando terrazas para la instalación de anclajes activos.

FRENTE #4 - PR15+000-PR16+000 RUTA 50037
PR15+015: está pendiente la construcción de la pasa ganados, solicitada por el dueño del predio a margen izquierda de la vía

FRENTE # 8 - PR18+600-PR19+400 RUTA 5003
PR20+250 al PR20+277: en el carril derecho de vía, se instala formaleta y se funde losa en concreto hidráulico Mr-45.
PR20+310 al PR20+323,5: En el carril derecho, se instala concreto en MR-45 en losa de aproximación, reforzada en el puente Taibá.

FRENTE #17 - PR22+030- PR23+900 RUTA 5003
PR22+040: En el costado derecho, ya está finalizado la construcción de sección de canal disipador, muros laterales en concreto de 28 MPa.
PR21+985 al PR21+057: En el carril derecho de vía, se realiza instalación de formaleta y se funde losa en concreto MR-45.

FRENTE #22 – PR29+415- PR29+500 RUTA 5003
PR29+600: En el sector "Chupaderos", en el carril derecho en la poceta de encole del Box-Culvert, se instala el solado de limpieza para muro lateral izquierdo y se desencofra formaleta de solera fundida en concreto de 28 Mpa.

FRENTE #29 - PR34+000- PR41+100 RUTA 5003

PR39+820: a margen derecha, se avanza con la construcción de sección de canal disipador
En PR41+050: a margen derecha de vía, se continua con la perforación e instalación de anclajes. También se avanza en la excavación de zanjas de coronación

FRENTE #23 – PR44+412- PR44+480 RUTA 5003
En la margen derecha de la vía, se avanza en la construcción de caja de encole de alcantarilla y pozos de abatimiento en el sector de CRISTO.
PR58+425 al PR58+475 RUTA 5002 5002 PEÑAS DEL OLVIDÓ

En PR58+470 al PR58+620: Continua inactivas las actividades de instalando formaleta y acero para losa del semi viaducto, desde el día 05-09-23 no se registra actividad por inconvenientes con la comunidad y el INVIAS.

FRENTE #26 – PUENTE CERTEGUI PR55+745-PR55+865 RUTA 1307

PR56+700: En el sector de “Certegui”, se realiza conformación para losas de aproximación del puente, pero el 11-09-2023 quedan suspendida aparentemente porque el proveedor de servicios manifiesta no tener las garantías de seguridad.

COMPENSACION AMBIENTAL

Se realiza visita de parte de la CARDER con acompañamiento de los profesionales forestales del contratista, interventoría, los ingenieros ambientales de contratista e interventoría para verificación de los establecimientos y mantenimientos forestales.

PROYECTOS SOCIALES

PR55+100 RUTA 5002, Puesto de salud de Gingaraba: continúan labores de instalación de cerámica en pisos y baños del puesto de salud, se inicia la instalación de estuco y pintura.

Se realiza adecuación de rampa de acceso al puesto de salud.

Se continua la excavación para la instalación del tanque para el pozo séptico.

PR55+100 RUTA 5002, Comedor comunitario Gingaraba:

Se continua con la revisión documental para inicio del proyecto de mejoras de áreas comunes del sector de Gingaraba, que incluye el comedor comunitario

PR 01+100 RUTA 5003, Piedras Bachichi: Cancha de Futbol en grama natural:

Se termina con el suministro y extendido de material seleccionado producto de la excavación para la realización de llenos de acuerdo a los diseños topográficos.

PR01+080 RUTA 5003, Cancha multifuncional Piedras Bachichi: Se encuentra pendiente realizar acceso en losas de concreto rígido, el cual será construido cuando se termine la cancha de futbol de la misma comunidad.

Escuela la Cabaña; se encuentran pendientes el suministro e instalación de puertas y ventanas.

PR21+700 en la ruta 5003: se continúa ejecutando la construcción de obra hidráulica dentro del predio del sr. Hincapié, para subsanar afectación a solicitud del propietario.

Semana 131 del 15 al 21 de septiembre de 2023.

ZODME LAS VILLAS - PR09+500 RUTA 5003

En el PR09+300: están suspendidas las actividades desde (16-09-23) y se retoman (18-09-23) a margen izquierda de la vía, en la conformación de terrazas con materiales provenientes excavaciones y derrumbes.

Se suspende actividades el (12-09-23), a margen izquierda del zodme en la excavación y solado para instalación de tubería de 36” para el manejo de aguas.

FRENTE #2 - PR12+731-PR14+118 RUTA 5003

PR13+686 PUENTE PIUNDA: A margen derecha se con el céreo de material granular y realizan densidades en las losas de aproximación del puente.

FRENTE # 9 - PR14+118- PR15+000 RUTA 5003

PR14+251 al PR14+355: se continua con la instalación de concreto MR-45

PR14+506 al PR14+618,5: a margen derecha, se continua con la instalación de concreto MR-45 en losa.

PR14+730 al PR14+750: a margen izquierda, se realiza conformación de subbase para berma cuneta.

PR14+817 al PR14+832: a margen derecho e izquierdo, se instala concreto MR-45, en berma cuneta.

PR14+990: margen derecha, se continua con el corte de talud, formando terrazas para la instalación de anclajes activos.

FRENTE #4 - PR15+000-PR16+000 RUTA 50037

PR15+015: Se realiza en el descole del Box-Culvert, construcción de la pasa ganados.

FRENTE # 8 - PR18+600-PR19+400 RUTA 5003

PR18+900, se avanza en la construcción de canal disipador a margen izquierda de la vía.

PR19+217,5 al PR19+255: a margen derecha, se realiza instalación de concreto MR-45 en berma cuneta.

FRENTE #22 – PR29+415- PR29+500 RUTA 5003

PR29+600: En el sector “Chupaderos”, en el carril derecho en la poceta de encole del Box-Culvert, se instala acero y formaleta en el muro lateral derecho para fundida en concreto de 28 Mpa.

FRENTE #29 - PR34+000- PR41+100 RUTA 5003

En PR41+050: a margen derecha de vía, se avanza en la excavación de zanjas de coronación y se realizan actividades de concreto lanzado para la protección del talud.

FRENTE #23 – PR44+412- PR44+480 RUTA 5003

En la margen derecha de la vía, se avanza en la construcción de pozos de abatimiento en el sector de CRISTO.

PR58+425 al PR58+475 RUTA 5002 5002 PEÑAS DEL OLVIDÓ

En PR58+470 al PR58+620: se instaló concreto en 28 Mpa con adición en fibra en losa del semi viaducto, iniciando con la conformación en material granular en las losas de aproximación del semi viaducto.

FRENTE #26 – PUENTE CERTEGUI PR55+745-PR55+865 RUTA 1307

PR56+700: Se realiza la instalación de concreto en losa de aproximación en el estribo No.2 del “Puente Certegui”.

COMPENSACION AMBIENTAL

El contratista se encuentra adelantando las actividades de ejecución y mantenimiento de las compensaciones forestales establecidas, igualmente se encuentra realizando el proceso de contratación con un proveedor de servicios para la georreferenciación para verificación de las cantidades de árboles establecidos.

PROYECTOS SOCIALES

PR55+100 RUTA 5002, Puesto de salud de Gingaraba: continúan labores de instalación de cerámica en pisos y baños del puesto de salud, se continua con la instalación de estuco y pintura en muros interiores, exteriores y se inicia la instalación de perfiles para cielo raso del puesto de salud.

Se termina la excavación para la instalación del tanque para el pozo séptico.

PR55+100 RUTA 5002, Comedor comunitario Gingaraba:

El contratista de obra se encuentra adelantando la documentación contractual con el proveedor de servicios que tiene contemplado ejecutar las actividades.

PR 01+100 RUTA 5003, Piedras Bachichi: Cancha de Futbol en grama natural:

Se termina con el suministro y extendido de material seleccionado producto de la excavación para la realización de llenos y se inicia con las excavaciones para los filtros según los diseños contemplados.

PR01+080 RUTA 5003, Cancha multifuncional Piedras Bachichi: Se encuentra pendiente realizar acceso en pavimento rígido del costado izquierdo, el cual será construido cuando se termine la cancha de futbol de la misma comunidad.

Escuela la Cabaña; se encuentran pendientes el suministro e instalación de puertas y ventanas.

PR21+700 en la ruta 5003: se continúa ejecutando la construcción de obra hidráulica dentro del predio del sr. Hincapié, para subsanar afectación a solicitud del propietario.

Semana 132 del 22 al 30 de septiembre de 2023.

FRENTE #12 - PR04+250 RUTA 5003:

Se realiza instalación de formaleta y se funde losas de transición del puente en concreto hidráulico MR-45 (21-09-23).

ZODME LAS VILLAS - PR09+500 RUTA 5003

en la conformación de terrazas con materiales provenientes excavaciones y derrumbes.

FRENTE #2 - PR12+731-PR14+118 RUTA 5003

PR13+686 PUENTE PIUNDA: A margen derecha se realizan instalación en concreto hidráulico MR-45 en losa de aproximación al puente y se funde anden en concreto de 28 Mpa.

Se instala formaleta de jersey del puente.

FRENTE # 9 - PR14+118- PR15+000 RUTA 5003

PR14+355 al PR14+445: a margen derecha, se realiza instalación de concreto en MR 45, en berma cuneta.

PR 14+520 al PR14+620: a margen derecha, se imprima en emulsión asfáltica y se instala formaleta para berma cuneta.

PR14+990: margen derecha, se continua con el corte de talud, formando terrazas y se inyecta concreto en las perforaciones de los anclajes activos.

FRENTE # 8 - PR18+600-PR19+400 RUTA 5003

PR18+900, se avanza en la construcción de canal disipador a margen izquierda de la vía.

PR21+978 al PR22+054,8: a margen derecha, se realiza instalación de concreto hidráulico MR-45 en berma cuneta.

FRENTE #22 – PR29+415- PR29+500 RUTA 5003

PR29+600: En el sector “Chupaderos”, en el carril izquierdo se realiza demolición de pontón existente y en el carril derecho, se instala concreto de 28 Mpa, en los muros del box-culvert 4x4

En el PR24+450, se continua con la instalación de filtro y lleno estructural.

FRENTE #29 - PR34+000- PR41+100 RUTA 5003

En el PR40+255 al PR40+280: en el carril derecho, se instala primera capa en mezcla asfáltica MDC-19.

Del PR40+239 al PR40+280; en el carril derecho, segunda capa en mezcla asfáltica MDC-19.

En el PR44+445 al PR44+858; en el carril izquierdo se instala primera y segunda capa de mezcla asfáltica MSC-25

En PR41+050: a margen derecha de vía, se avanza en la excavación de zanjas de coronación y se realizan actividades de concreto lanzado para la protección del talud.

FRENTE #23 – PR44+412- PR44+480 RUTA 5003

En la margen derecha de la vía, se avanza en la construcción de pozos de abatimiento en el sector de CRISTO.

En el PR44+460 a PR44+580 RUTA 5003: en el carril derecho, se realiza actividades de conformación.

PR58+620 RUTA 5002:

PR58+620: a margen izquierda, se instala concreto de 28 Mpa en losa inferior del Box-culvert (1,5x1,5).

FRENTE #26 – PUENTE CERTEGUI PR55+745-PR55+865 RUTA 1307

PR56+700: Se realiza conformación en losa de aproximación en el estribo No.1 del “Puente Certegui”.

PROYECTOS SOCIALES

PR55+100 RUTA 5002, Puesto de salud de Gingaraba: Se termina con las labores de instalación de cerámica en pisos y baños del puesto de salud, se continua con la instalación de estuco y pintura en muros interiores, exteriores y se continua con la instalación de perfiles y laminas para cielo raso del puesto de salud.

PR55+100 RUTA 5002, Comedor comunitario Gingaraba:

El contratista de obra se encuentra adelantando la documentación contractual con el proveedor de servicios que tiene contemplado ejecutar las actividades.

PR 01+100 RUTA 5003, Piedras Bachichi: Cancha de Futbol en grama natural:

Se continua con las excavaciones para los filtros según los diseños contemplados.

Instalación de material de filtro, tubería y geotextil para los filtros de la cancha de futbol

PR01+080 RUTA 5003, Cancha multifuncional Piedras Bachichi: Se encuentra pendiente realizar acceso en pavimento rígido del costado izquierdo, el cual será construido cuando se termine la cancha de futbol de la misma comunidad.

Escuela la Cabaña; se encuentran pendientes el suministro e instalación de puertas y ventanas.

PR21+700 en la ruta 5003: se continúa ejecutando la construcción de obra hidráulica dentro del predio del sr. Hincapié, para subsanar afectación a solicitud del propietario.

INFORME DE SEPTIEMBRE 2023 GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL,

SST: Gestión Social:

El presente informe contiene la descripción general de las diferentes actividades ejecutadas por la Gestión Social del proyecto, acorde con las fichas sociales propuestas para el área, a ejecutarse durante el periodo 01 al 30 de septiembre de 2023, las cuales estuvieron orientadas a prevenir, mitigar o minimizar los impactos sociales generados por la ejecución del proyecto dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

Es importante resaltar que, durante este período, se continuó brindando atención a las comunidades ubicadas en el corredor vial Quibdó-Pereira; todo lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo E del pliego de condiciones del proyecto y demás directrices inherentes al contrato 1757 de 2020.

1. PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Con el fin de brindar información clara y oportuna a la comunidad vecina al proyecto, el Consorcio Megavias Chocó cuenta con canales de información y atención, tal como se relacionan a continuación:

Puntos de información a la comunidad: Cartelera y Buzón

- Vereda Cinto: corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico (Ruta 5003)
- Vereda Taibá: municipio de Pueblo Rico (Ruta 5003)
- Vereda La Bretaña sector La Marina: municipio de Santuario (Ruta 50RS01)

Nota: En agosto de 2023, se retiró el punto de información ubicado Vereda Itauri a solicitud del propietario del predio donde se encontraba ubicado: corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico (Ruta 5003)

Los anteriores se revisan cada 15 días y la cartelera se actualiza de acuerdo a avance de obra.

En el período del presente informe se realizó la actualización de las carteleras informativas instaladas en los diferentes puntos.

Oficina física de Atención a la comunidad:

Cabecera municipal de Pueblo Rico, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 pm y de 02:00 a 05:00 pm, y los sábados de 08:00 am a 12:00 pm.

Otros medios de comunicación son:

Correo electrónico: sau_risaralda@ingevia.com y línea telefónica: 3116481411

En septiembre de la presente anualidad, no se registraron PQRS por afectaciones de obra; de igual manera en el período del informe, se realizó el cierre de 1 PQRS de período anterior (PQRS 051 a nombre del señor Juan Pablo Piedrahita); quedando pendiente 5 PQRS para cierre de las 105 interpuestas a la fecha. Se anexa copia del formato y registro de cierre PQRS.





Fotografía 1. Atención al usuario en la instalación de la oficina SAU del Consorcio Megavias Chocó

Tabla 1. Proyecto Atención a la Comunidad

NOMBRE DEL PROYECTO: **1. PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**								**IDENTIFICACIÓN** **PGS-6.1-18**	
OBJETIVO DEL PROYECTO									
✓ Crear un sistema de recepción y atención de las manifestaciones de la comunidad, que garantice la atención oportuna y eficiente a los requerimientos de la población del área de influencia del proyecto.									
TIPO DE MEDIDA									
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Corrección		Compensación	
IMPACTO A MANEJAR									
✓ Conflictos sociales con comunidad e instituciones ✓ Desinformación ✓ Afectación a la movilidad									
ACCIONES EJECUTADAS									

Con el fin de dar cumplimiento a este proyecto, generando espacios de acercamiento y diálogo con las comunidades, entidades e instituciones presentes en el área de influencia directa; se desarrollaron las siguientes actividades:

- Servicio de atención al Usuario - SAU

ACTIVIDAD	DETALLE	EVIDENCIAS	INDICADOR
• Servicio de Atención al Usuario SAU	• Se realizó atención a las manifestaciones ciudadanas, en los diferentes puntos de atención y se recepcionaron 8 hojas de vida de la comunidad.	• Consolidado de manifestaciones ciudadanas. • Copia de solicitudes cerradas.	0 solicitudes presentadas período 0 solicitudes cerradas del período X = 0%

NOMBRE DEL PROYECTO: 1. PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD			**IDENTIFICACIÓN PGS-6.1-18**
• Atención de PQRS	• Se recibió 0 manifestaciones ciudadanas • Se realizó cierre de 1 PQRS recibidas en el periodo anterior	• Base de datos relación hojas de vida • Registros fotográficos	105 solicitudes presentadas 100 solicitudes cerradas 95%

2. PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

El día 11 de septiembre de 2023, con la participación de la Interventoría, se realizó reunión con líderes de las comunidades de Guarato, Gingaraba, Mumbú con el fin de informar el estado actual del PR 61+100- Ruta 5002, sector denominado Peñas del Olvido, municipio de Tadó, departamento del Chocó; la actividad tuvo como objetivo informar sobre el estado a la fecha del proyecto en el sector de la referencia, lo anterior en ocasión, a las vías de hecho empleadas por la comunidad, consistente en no permitir que se continuara con las obras desde el pasado 02 de septiembre de los corrientes, alegando incumplimientos de compromisos por parte del INVIAS.

Los compromisos referidos por la comunidad, consisten en la participación de INVIAS en una reunión en las localidades arriba citadas donde se informe posibles beneficiarios de reconocimiento económico ante las reclamaciones realizadas por presuntas afectaciones de contratos anteriores al 1757 de 2020, compromiso establecido por el Instituto el pasado mes de junio de 2023 en reunión con las comunidades de Mumbú, Gingarabá y Guarato. Se anexa acta de reunión.



Fotografía 2. Reunión lideres comunidad Guarato, Gingarabá y Mumbú

Tabla 2. Proyecto de información y divulgación

NOMBRE DEL PROYECTO: **2. PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN**										**IDENTIFICACIÓN** **PGS-6.2-19**
OBJETIVOS DEL PROYECTO										
• Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Acción comunal y Líderes comunitarios. • Mantener informados a todas las autoridades del área de influencia del proyecto. • Mantener un adecuado relacionamiento con la comunidad y las autoridades locales y municipales, relacionado con la información correspondiente los diferentes componentes del proyecto: técnico, predial, ambiental y social.										
TIPO DE MEDIDA										
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		Corrección		
IMPACTO A MANEJAR										
✓ Conflictos sociales con comunidad e instituciones ✓ Generación de malentendidos										
ACCIONES EJECUTADAS										
El proyecto de Información y Divulgación comprende las actividades requeridas para mantener informada a la comunidad sobre los aspectos más relevantes del desarrollo del proyecto. Estas actividades comprenden: realización de reuniones, elaboración y distribución de piezas comunicativas y definición de textos para cuñas y pasacalles.										

NOMBRE DEL PROYECTO: 2. PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			**IDENTIFICACIÓN PGS-6.2-19**
ACTIVIDAD	DETALLE	EVIDENCIAS	INDICADOR
• Reuniones informativas	(0) reunión informativa	No aplica	(0) reuniones informativas realizadas _____ (0) reuniones informativas programadas X 100= 0%
• Entrega de piezas comunicativas	(0) Entrega de volantes		(0) reuniones extraordinarias realizada _____ (0) reuniones de extraordinarias programadas X 100= 100%
• Reuniones comité de Participación Comunitaria	En este periodo no se realizó reunión de comité de participación ciudadana.		0 reuniones de avance realizada _____ <u>0 reuniones de avance programadas</u> X 100= 0%
			0 volantes entregados _____ 0 volantes programados X 100= 0%

3. PROYECTO DE MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

No se adelantaron actividades en este proyecto.

Tabla 3. Proyecto para el manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

NOMBRE DEL PROYECTO: 3. PROYECTO PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS								**IDENTIFICACIÓN FICHA: PGS-6.3-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO								
✓ Establecer la condición y características de la infraestructura de los predios vecinos al proyecto para determinar al final del proceso constructivo, las afectaciones imputables al proyecto. ✓ Identificar las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto con el propósito de evitar conflictos con las comunidades.								
TIPO DE MEDIDA								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		Corrección

NOMBRE DEL PROYECTO: **3. PROYECTO PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS**	**IDENTIFICACIÓN** **FICHA: PGS-6.3-20**
IMPACTO A MANEJAR	
✓ Conflictos sociales con comunidad e instituciones ✓ Afectación de la infraestructura de Servicios Públicos ✓ Afectación a la infraestructura aledaña al corredor	
ACCIONES EJECUTADAS	

ACTIVIDAD	DETALLE	EVIDENCIAS	INDICADOR
• Levantamiento de Actas de Vecindad	No se realzó levantamiento de actas de vecindad	• Consolidado de actas de vecindad levantadas	0 predios con Acta de Vecindad _____ 0 predios identificados. X 100= 0%
• Levantamiento de Actas de Compromiso	No se levantaron actas de compromiso en este periodo.		0 actas de Compromiso firmadas. _____ 0 predios requeridos temporalmente X 100= 0%

4. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

En el Contrato 1757 de 2020, este proyecto no aplica.

Tabla 4. Recuperación del derecho de vía

NOMBRE DEL PROYECTO: **4. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA**										**IDENTIFICACIÓN** **FICHA: PGS-6.4-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO										
Acompañar el proceso de recuperación de las franjas de uso público (derecho de vía), apropiadas indebidamente										
TIPO DE MEDIDA										
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	X	Corrección		
IMPACTO A MANEJAR										
Generación de conflictos con las unidades sociales asociadas a la ocupación del derecho de vía										
ACCIONES EJECUTADAS										

ACTIVIDAD	DETALLE	EVIDENCIAS	INDICADOR
• Reconocimiento de las zonas de uso público - derecho de vía sobre el corredor del proyecto	No se han identificado ventas informales en el derecho de vía que puedan ser afectados por las obras de construcción.	N/A	N/A

NOMBRE DEL PROYECTO: 4. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA			**IDENTIFICACIÓN FICHA: PGS-6.4-21**
• Identificación de las zonas indebidamente apropiadas	N/A	N/A	N/A
• Elaboración del diagnóstico socioeconómico de las unidades sociales relacionadas	N/A	N/A	N/A
• Determinación de acciones a adelantar	N/A	N/A	N/A
• Implementación de medidas	N/A	N/A	N/A

5. PROYECTO DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el período del informe no se realizaron actividades en el proyecto.

Tabla 5. Cultura vial y participación comunitaria

NOMBRE DEL PROYECTO: 5: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA										IDENTIFICACIÓN FICHA: PGS-6.5-22
OBJETIVO DEL PROYECTO										
✓ Contribuir crear un sentido de pertenencia de la vía, por parte de la comunidad, a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y con el comité de Participación Comunitaria ✓ Fomentar la toma de conciencia sobre la atención de la señalización vial y uso adecuado de las vías.										
TIPO DE MEDIDA										
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		Corrección		
IMPACTO A MANEJAR										
✓ Generación de conflictos sociales con comunidad e instituciones ✓ Generación de accidentes										
ACCIONES EJECUTADAS										

ACTIVIDAD	DETALLE	EVIDENCIAS	INDICADOR
1. Talleres Pedagógicos de Sostenibilidad	• No se realizaron talleres	• No aplica	0 talleres realizados ———————— 0 talleres programados con comunidades educativas
2. Talleres programados con Comités de	• No se realizaron taller con el comité de		

	Participación Comunitaria	Participación ciudadana.		X 100= 0% 0 talleres realizados _____ 0 talleres programados con Comités de Participación Comunitaria X 100= 0%	

6. PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

En septiembre de 2023, por parte del contratista hubo 11 ingresos de personal de obra de los cuales, 8 correspondieron a la mano de obra no calificada equivalente al 75% al área de influencia directa del proyecto.

Tabla 6. Proyecto de contratación de mano de obra

NOMBRE DEL PROYECTO: **PROYECTO 6: PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA**										**IDENTIFICACIÓN** **FICHA: PGS-6.6-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO										
✓ Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los Corregimientos, veredas, y Centros Poblados que componen el área de Influencia Directa del proyecto a través de la vinculación laboral de personal no calificado. ✓ Evitar la migración laboral dando prioridad al potencial laboral del área de influencia directa										
TIPO DE MEDIDA										
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		Corrección		
IMPACTO A MANEJAR										
✓ Generar ingresos en los hogares de la comunidad del AID ✓ Evitar la generación de conflictos con la comunidad ✓ Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto.										
ACCIONES EJECUTADAS										
ACTIVIDAD		DETALLE		EVIDENCIAS		INDICADOR				
1. Recepción de hojas de vida de la comunidad y vinculación mano de obra		Se recibió un total de 0 hojas de vida en el mes de septiembre de 2023. Durante el mes de septiembre de 2023 se vincularon 8 personas, en MONC de las cuales 6 pertenecen al área de influencia del proyecto.		• Base de datos de hojas de vida de la comunidad • base de datos de personal vinculado mes septiembre 2023		6 trabajadores no calificados contratados de la zona. _____ 8 trabajadores no calificados en obra X 75%				

7. PROYECTOS PRODUCTIVOS – PROYECTO OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA





Fotografía 3. Reunión administración municipal Pueblo Rico-Zonas Comunes Taibá

- El 05 de septiembre de 2023, mediante el oficio 20231150-2095, se radicó ante la Interventoría el proyecto denominado Mejoramiento de la Escuela Regaderos de la vereda del mismo nombre, municipio de Pueblo Rico.

- El 14 de septiembre de 2023, en mesa de trabajo desarrollada entre el Contratista y la Interventoría se realizó revisión a las subsanaciones de las observaciones realizadas por la Interventoría al Proyecto Mejoramiento de la Escuela Regaderos; en esta oportunidad se concluye que el proyecto se deberá radicar con las subsanaciones ya presentadas y demás trámites. Se anexa copia del acta.

- El 18 de septiembre de 2023, se realizó reunión donde se brindó información a la administración municipal de Pueblo Rico, acerca del estado de la gestión predial y social adelantada por el proyecto para la reconstrucción de la cancha de la vereda Taibá, equipamiento social (recreativo) que fue afectado para la el mejoramiento de la vía en la citada localidad. En la reunión, se hizo entrega de la copia del avalúo comercial, información radicada mediante oficio 202311502133 del 16 de septiembre de 2023. Así mismo, se informó que, desde la gestión social -Proyecto Obras con Participación Comunitaria, se asignarán recursos para la construcción de la Cancha, ya que el avalúo de la misma se estimó en $ 38 millones de pesos, y el valor de la reconstrucción se estima en un monto superior, este proyecto se suma al proyecto *Construcción de un Aula Digna para el Bachillerato en Bienestar Rural* de la Comunidad. Se anexa acta de reunión.

- Con el objeto de complementar los estudios y diseños iniciados para las obras sociales de la comunidad de Mumbú, denominadas *Construcción de Senderos Ecológico (peatonal), Construcción de Kioskos, Reposición de Tubería de Acueducto*, *Construcción de Cancha de Futbol,* el 22 de septiembre de 2023, se realizó recorrido en las zonas designadas por la citada comunidad para el desarrollo de los proyectos antes relacionados; es importante indicar que, en la actividad se contó con la participación de la Corporación Autónoma Regional del Chocó-CODECHOCÓ, líderes comunitarios, los componentes ambiental, social y técnico de la Interventoría y el Consorcio Mega Vías Chocó. Se anexa acta de reunión.

  De igual manera, se realizó recorrido en el sector donde la comunidad propone la construcción de un muro a riberas del río San Juan; a la fecha se está a la espera del concepto técnico que emita la Autoridad Ambiental. Se anexa acta de reunión.

  Nota: La comunidad de Mumbú solicitó al Contratista realizar intervención en un cauce cercano a la iglesia (capilla), al respecto la CODECHOCÓ manifestó que es la comunidad quien debe realizar la solicitud a la entidad. Se anexa acta.

- El 30 de septiembre de 2023, se realizó reunión de socialización a representantes del Consejo Comunitario Local de Gingaraba, del proyecto denominado *Adecuación Zonas comunes de la citada Localidad.* En la actividad participaron 8 personas.



Fotografía 4. Reunión Comunidad de Mumbú, CODECHOCÓ, Interventoría y Contratista



Fotografía 5. Reunión lideres Veredas Gingarabá-socialización obra social zonas comunes

Se anexa relación de obras sociales (OPC, Pasivos, y Reclamaciones)

Tabla 7. Proyectos Productivos-Obras con Participación Comunitaria

NOMBRE DEL PROYECTO: 7: PROYECTOS PRODUCTIVOS-OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	**IDENTIFICACIÓN FICHA: PGS-6.7-24**

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- ✓ Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión de grupos asociativos de producción y/o comercialización, asociados con el área de influencia del proyecto, con el objeto de favorecer la utilización sostenible de la vía.
- ✓ Fomentar la participación comunitaria en la ejecución de obras de interés colectivo.
- ✓ Ejecutar los proyectos productivos formulados y aprobados para el proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control		Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	X	Corrección	

IMPACTO A MANEJAR

- ✓ Mejoramiento de condiciones de vida
- ✓ Acompañamiento a grupos organizados en la gestión de proyectos

ACCIONES EJECUTADAS

ACTIVIDAD	DETALLE	EVIDENCIAS	INDICADOR
Proyectos productivos apoyados	No se apoyaron proyectos productivos en este periodo.	N/A	N/A
Proyectos de participación apoyados	Se cuenta con la aprobación de 7 OPC	Oficios radicados ante la interventoría con presupuestos y diseños de OPC Y oficios de aprobación de OPC	6 OPC en ejecución _____ 10 OPC proyectadas =70%

8. PROYECTO PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

En el período, se continuó realizando la actividad de monitoreo en diferentes frentes de obra en cumplimiento de lo indicado en la Resolución ICNAH No. 0118 del 30 de enero de 2023, "Por la cual se aprueba y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para prevención en el manejo arqueológico.

Tabla 8. Proyecto de protección al patrimonio arqueológico: divulgación pública y educación al personal de labor

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO 8: PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN PUBLICA Y EDUCACIÓN AL PERSONAL DE LABOR	**IDENTIFICACIÓN FICHA: PGS-6.8-25**

OBJETIVO DEL PROYECTO

- ✓ Informar y Educar al personal que intervine en la obra sobre la importancia de la conservación y sobre el manejo de hallazgos

NOMBRE DEL PROYECTO: **PROYECTO 8: PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN PUBLICA Y EDUCACIÓN AL PERSONAL DE LABOR**	**IDENTIFICACIÓN** **FICHA: PGS-6.8-25**
✓ Evitar la alteración y destrucción de sitios arqueológicos presentes en inmediaciones del corredor vial o directamente sobre el mismo.	

TIPO DE MEDIDA									
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación		Corrección	

IMPACTO A MANEJAR
✓ Destrucción del Patrimonio Arqueológico
✓ Alteración del registro Histórico consignado en las capas superficiales del suelo

ACCIONES EJECUTADAS

ACTIVIDAD	DETALLE	EVIDENCIAS	INDICADOR
• Inducción arqueológica a empleados de obra	No se realizaron charlas al personal de obra en arqueología preventiva	• Registros de asistencia • Registro fotográfico	0 charla o inducciones realizadas _____ 0 charla o inducciones programadas 0%
• Salvamentos realizados / Total hallazgos reportados	No se presentaron hallazgos en este periodo.	N/A	N/A

9. PROYECTO DE GESTIÓN SOCIO PREDIAL

A continuación, se relaciona los beneficiarios de compensaciones sociales por enajenación de predios requeridos para avance de obras, bien sea por diseño geométrico o por riesgo.

Tabla 9. Relación de beneficiarios FCS a la fecha

INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO					TITULAR DEL PREDIO			
No.	DIRECCIÓN DEL PREDIO	SECTOR	RUTA	MUNICIPIO	TITULAR DEL PREDIO-UNS	CÉDULA	RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL	FACTORES CONTEMPLADOS
1	PR 20+466 - 20+484	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	Sigifredo García Quintero	12.531.529	Sigifredo García Quintero	UMV-TDO-ARRTO
2	PR 20+342 - 20+372	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	María Olinda López Agudelo	26.398.073	María Olinda López Agudelo	UMV-TDO-ARRTO
3	PR 20+342 - 20+372	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	María Eugenia Cano López	25.001.550	María Eugenia Cano López	UMV-TDO-ARRTO
4	PR 20+314 - 20+333	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	Lilia del Carmen Cano Londoño	25.193.618	Pablo Antonio Vega Porras	TDO-ARRTO
5	PR20+221 - 20+228	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	María Luzmila Zabala Román	25.007.747	María Luzmila Zabala Román	UMV-TDO-ARRTO
6	PR20+228 - 20+235	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	Julio César Gómez Zabala	1.093.534.451	Julio César Gómez Zabala	UMV-TDO-ARRTO
7	PR 20+200 - 20+ 215	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	José Reinaldo Domínguez Arteaga	1.093.533.604	José Reinaldo Domínguez Arteaga	UMV-TDO-ARRTO
8	PR20+00 - 20+245	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	Luis Albeiro Lenis Orozco	18.602.592	Luis Albeiro Lenis Orozco	UMV-TDO-ARRTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO					TITULAR DEL PREDIO			
9	PR20+150 - 20+164	Vereda Taibá	5003	Pueblo Rico	María de Los Santos Mosquera Palomeque	25.001.632	María de Los Santos Mosquera Palomeque	UMV-TDO-ARRTO
10	PR 17+230	Vereda La Cabaña	5003	Pueblo Rico	José Olmedo Bernal Bedoya	4.527.627	José Olmedo Bernal Bedoya	UMV-TDO-ARRTO
11	PR 17+230	Vereda La Cabaña	5003	Pueblo Rico	José Aldair Bernal Franco	1.088.038.684	José Aldair Bernal Franco	UMV-TDO-ARRTO
12	PR 17+750	Vereda La Cabaña	5003	Pueblo Rico	Edilberto Martínez Gómez	10.139.234	Edilberto Martínez Gómez	UMV-TDO-ARRTO-UME
13	PR 19+100	Vereda La Cabaña	5003	Pueblo Rico	Luis Eduardo Cifuentes Ledezma	18.602.634	Luis Eduardo Cifuentes Ledezma	TDO-ARRTO-UME
14	PR 19+300	Vereda La Cabaña	5003	Pueblo Rico	Bertha Oliva Restrepo Zapata	29.924.874	Bertha Oliva Restrepo Zapata	UMV-TDO-ARRTO-UME

Fuente: Consorcio Megavias Chocó

Tabla 10. Gestión Socio Predial

NOMBRE DEL PROYECTO: 9. GESTION SOCIO PREDIAL										**IDENTIFICACIÓN PGS-6.9-26**
OBJETIVO DEL PROYECTO										
✓ Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la determinación de compensaciones sociales por afectación predial.										
TIPO DE MEDIDA										
Control		Prevención		Mitigación		Compensación	X	Corrección		
IMPACTO A MANEJAR										
✓ Generación de conflictos por afectación predial										
ACCIONES EJECUTADAS										
	ACTIVIDAD		DETALLE		EVIDENCIAS		INDICADOR			
	Reconocimiento de predios requeridos		No se reconocieron predios requeridos para la obra.		• Diagnóstico socio-predial • Matriz factores de compensación social		N/A			
	Identificación de Unidades sociales a desplazar y reubicar.		No se identificaron nuevas Unidad sociales a desplazar y reubicar.				N/A			

10. Otras actividades adelantadas en el periodo del informe

El 13 de septiembre de 2023, se participó en comité de seguimiento a la gestión social, realizado por la Interventoría. Se anexa copia del acta.

10.1. Oficios remitidos

Durante el periodo del informe, el Consorcio Megavias Chocó emitió las siguientes comunicaciones.

Tabla 11. Correspondencia enviada septiembre de 2023

Enviado A	Asunto	Hipervinculo
CONSORCIO VIAL ODISEO	REMISION DE INFORME GESTIÓN SOCIAL AGOSTO 2023	ENVIADA SEP 2023\202311502091.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	REMISIÓN PAZ Y SALVO OBRAS CORREGIMIENTO DE GUARATO. ACTA DE REUNIÓN INVIAS N°151	ENVIADA SEP 2023\202311502092.pdf

Enviado A	Asunto	Hipervinculo
CONSORCIO VIAL ODISEO	IMPEDIMIENTO PARA TRABAJAR EN EL SECTOR DE PEÑAS DEL OLVIDO PR 61+100 RUTA 5002, POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE MUMBÚ, GINGARABA Y GUARATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	ENVIADA SEP 2023\202311502093.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA REGADEROS, DE LA VEREDA DE REGADEROS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	ENVIADA SEP 2023\202311502095.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	RESPUESTA A SU OFICIO CVODM1-2198-2023 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL Y CIERRE PQR CONTACTUALES	ENVIADA SEP 2023\202311502097.pdf
CONSEJO LOCAL DE GUARATO	INVITACIÓN REUNIÓN INFORMATIVA	ENVIADA SEP 2023\202311502105.pdf
CONSEJO LOCAL DE GINGARABA	INVITACIÓN REUNIÓN INFORMATIVA	ENVIADA SEP 2023\202311502106.pdf
CONSEJO LOCAL DE MUMBÚ	INVITACIÓN REUNIÓN INFORMATIVA	ENVIADA SEP 2023\202311502107.pdf
CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO SAN JUAN - ASOCASAN	INVITACIÓN REUNIÓN INFORMATIVA (ENVIADO POR WHATSAPP)	ENVIADA SEP 2023\202311502108.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	INVITACIÓN REUNIÓN INFORMATIVA	ENVIADA SEP 2023\202311502109.pdf
SEC. DESPACHO FUNCIÓN DE PLANEACIÓN ALCALDIA DE PUEBLO RICO	SOLICITUD VALOR DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO - VISP EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	ENVIADA SEP 2023\202311502119.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	RESPUESTA AL COMUNICADO CVODM1-2203-2023 SOLICITUD DE ATENCIÓN A LA OBJECIÓN A FICHA TECNICO SOCIAL DE JESUS ANTONIO CASTILLO "EN ATENCIÓN A LOS COMPROMISOS INVIASADQUIRIDOS EN REUNIÓN DEL 14 DE JULIO DE 2023". COMUNICADO SS 41180 DE FECGA 18 DE JULIO DE 2023, COMPROMISOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE PUEBLO RICÓ".	ENVIADA SEP 2023\202311502122.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	SOLICITUD MESA DE TRABAJO PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA SANTA CLARA DE REGADEROS (OPC) RESPUESTA A COMUNCIADO CVODM1-2230-2023"	ENVIADA SEP 2023\202311502125.pdf

Enviado A	Asunto	Hipervinculo
CONSEJO COMUNITARIO PIEDRAS BACHICHI	SOLICITUD INFORMACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCE - SECTOR ESCUELA BACHICHI	ENVIADA SEP 2023\202311502126.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	INFORMACIÓN DE REACTIVACIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS EN EL SECTOR DE PEÑAS DEL OLVIDO PR 61+100 RUTA 5002 (ABCISA 58+400) EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	ENVIADA SEP 2023\202311502127.pdf
ALCALDIA DE PUEBLO RICO	SOLICITUD DE AGENDA SOCIALIZACION GESTIÓN SOCIOPREDIAL CANCHA TAIBA	ENVIADA SEP 2023\202311502128.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	SOLICITUD MESA DE TRABAJO PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO AULA BACHILLERATO RURAL DE LA VEREDA DE TAIBA-PUEBLO RICO, RISARALDA (OPC) RESPUESTA A COMUNICADO CVODM1-2229-2023"	ENVIADA SEP 2023\202311502129.pdf
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE PUEBLO RICO CCCNPR	RESPUESTA A SU COMUNICADO FECHADO 11 DE AGOSTO DE 2023, DEL ASUNTO LISTADO PQR FALTANTES	ENVIADA SEP 2023\202311502131.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	RESPUESTA OFICIO CVODM1-2193-2023 SOLICITUD ACTUALIZACIÓN FORMATO ACTA RADICACIÓN Y ACTA SOCIAL DE PROYECTOS MASPSMN1-IN-3-FR-1	ENVIADA SEP 2023\202311502138.pdf
CONSEJO COMUNITARIO PIEDRAS BACHICHI	SOLICITUD DE SOPORTES FALTANTES PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	ENVIADA SEP 2023\202311502139.pdf
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	RESPUESTA AL OFICIO SS 49216 FECHADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2023, A TRAVÉS DE LA CUAL LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD SE ABSTIENE DE EMITIR CONCEPTO DE NO OBJECIÓN EN EL TRASLADO DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL AL RUBRO DE OBRA DEL CONTATO DE OBRA EN REFERENCIA	ENVIADA SEP 2023\202311502141.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	REMISIÓN DE ACTAS DE CIERRE DE L PY Y OPC ACCESO PIEDRAS BACHICHI	ENVIADA SEP 2023\202311502142.pdf

Enviado A	Asunto	Hipervinculo
CONSORCIO VIAL ODISEO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE REGADEROS, DE LA VEREDA DE REGADEROS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	ENVIADA SEP 2023\202311502144.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	ENTREGA PROYECTO CANCHA DE FUTBOL DE PIEDRAS BACHICHI	ENVIADA SEP 2023\202311502145.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	SOLICITUD MESAS DE TRABAJO: VERIFICACIÓN DE CIERRE DOCUMENTAL OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNTARIA Y OTROS	ENVIADA SEP 2023\202311502156.pdf
JUAN PABLO PIEDRAHITA	ADECUACIÓN ACCESO PR 15+900 RUTA 5003, VEREDA REGADEROS CIERRE PQR N°051	ENVIADA SEP 2023\202311502161.pdf
PERSONERIA DE PUEBLO RICO	RESPUESTA QUEJA SEÑOR ULISES COLORADO RAMIREZ - RECLAMACIÓN POR PAGO CONSTRUCCIÓN OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA - ACCESO PIEDRAS BACHICHI	ENVIADA SEP 2023\202311502168.pdf
CONSORCIO VIAL ODISEO	ENTREGA PROYECTO RECONSTRUCCIÓN IGLESIA CORREGIMIENTO MUMBU	ENVIADA SEP 2023\202311502171.pdf
CODECHOCO	SOLICITUD CONCEPTO PARA LA REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y CONEXIÓN BOCATOMA MUMBÚ	ENVIADA SEP 2023\202311502188.pdf

Fuente: Consorcio Megavias Chocó

Gestión ambiental:

- **PRINCIPALES ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

- **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO**

- **Plan de ajuste a la Guía Ambiental PAGA:**

A la fecha se encuentra con concepto favorable dado por el INVIAS para el componente social y ambiental.

Asunto	Comunicación /correo electrónico	Fecha
REMISIÓN INICIAL PAGA V1 AL INVIAS	CVODM1-216-2021	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON RADICADO 87662.
PAGA V2 radicado a interventoría con ajustes y observaciones	202311501537 202311501569	6 de enero de 2022. 18 de enero de 2022.
REMISIÓN PAGA V2 AL INVIAS.	CVODM1-1607-2023	19 de enero de 2023
REMISION PAGA V2 COMPONENTE SOCIAL.	CVODM1-1694-2023	15 de febrero de 2023

El INVIAS mediante entrada del **SMA 55262**, emite concepto al PAGA manifestando que desde el componente ambiental se evidencia el cumplimiento de la obligación contractual.

El lunes 6 de marzo de 2023, se recibe correspondencia del INVIAS mediante entrada SS11670 en la cual conceptúan en el cumplimiento de la obligación de entrega del documento PAGA en su versión 2 del componente ambiental

El lunes 24 de abril se recibe entrada del INVIAS SS 2104 del 14 de abril de 2023, en donde conceptúan favorablemente del PAGA V2 del componente social, quedando así aprobado en su totalidad el PAGA en su versión 2.

A la fecha continua vigente al PAGA en su versión 2.

- **Plan de Inversión Ambiental:**

Dada la no objeción del plan de inversión en su versión 2 mediante SS 35469 de INVIAS del 22 de junio de 2023, la interventoria realiza la aprobación del plan de inversión 2 mediante comunicación oficio CVODM1-2039-2023.

El 13 de julio de 2023, se recibe mediante correo electrónico memorando INVIAS SS 52853, la especialista ambiental de interventoria recibe y responde el memorando de la gestora ambiental del INVIAS, frente al reconocimiento de los ítems de compensación, mediante correo electrónico del día 14 de julio de 2023, se explica la importancia de sustentar y revisar a detalle los ítems a reconocer, así mismo se emite comunicación al respecto CVODM1-2070-2023 del 14 de julio de 2023.

En conclusión, hasta tanto el contratista no entregue los soportes suficientes que manifestó la interventoria en la comunicación CVODM1-2090-2023 radicada el 18 de julio de 2023, para la revisiones y aprobaciones pertinentes a las pre-actas ambientales, se verá reflejado en la agilidad de los pagos.

EL 28 de julio de 2023, la interventoría emite al contratista el Apremio N°1 por el posible incumplimiento al Contrato de obra CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – Actividades compensación ambiental, el contratista da respuesta mediante oficio 202311502033 del 1 de agosto de 2023.

- **Fuentes de materiales:**

La empresa INGEVIAS SAS, social del CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO cuenta con una planta trituradora y dosificadora de cemento la cual cuenta con el nuevo permiso de emisiones, dado el traslado de la planta al PR 30+800.
Se cuenta con la resolución 1837 del 15 de junio de 2023, por la cual se otorga un nuevo permiso de emisiones atmosféricas y se dictan otras disposiciones, este permiso es para la nueva ubicación de la planta de trituración y concreto ubicada en el PR30+800, es importante mencionar que se encuentra en trámite de cierre la resolución 1764 de 2021, permiso de emisiones para la antigua planta PR6+500.

PLANTA /PROVEEDOR	Cantidad suministrada en agosto	OBSERVACIONES
I.A.E. constructores S.A.S. zomac (Planta)	781,58	Se cuenta con la resolución 1837 del 15 de junio de 2023, por la cual se otorga un nuevo permiso de emisiones atmosféricas y se dictan otras disposiciones. - El contratista realizó entrega del certificado mensual.
Agregados de occidente	0	Licencia ambiental con resolución 1266 y certificado de registro minero y contrato de concesión 20341 y RUCOM.

Triturados y concretos	N/A	Cuenta con título minero FCI-112 y licencia ambiental N°150 de 2014.
José Aristarco Mosquera Mosquera	N/A	A la fecha el material se encuentra acopiado en el predio Giabra, este corresponde al suministrado por un sector de minería de hecho, cuyo titular es ubicada en TADÓ radicada con el No. OE7-14571 en la Agencia Nacional Minera y se cuenta con la certificación de la Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó – CODECHOCÓ DE Licencia Ambiental Temporal.

Solicitud de Permiso fuente de materiales:

El 27 de julio de 2023, el contratista radica a la Interventoría mediante oficio 202311502022 la respuesta a la solicitud de cierre a la consulta previa para la explotación de materiales Rio San Juan autorización temporal No 501691, en el cual manifiesta.

(…) que la DANCP analizará la información presentada y de acuerdo a esto realizará el acto administrativo de resolución de cierre del proceso administrativo de consulta previa con radicado interno PROY-02140…

Aún se está a la espera de la respuesta del ministerio de medio ambiente a las solicitudes de cierre informado a la interventoría mediante correo electrónico del 3 de mayo de 2023, el contratista remitió los soportes de las solicitudes al ministerio del medio ambiente y la CARDER para el desistimiento al trámite de licencia ambiental para autorización temporal para explotación de materiales en el rio san juan.

- **Permisos Ambientales:**

Tipo de permiso	Resolución	Vigencia	Observaciones
Aprovechamiento Forestal	Resolución 2403 del 2021	2 de noviembre de 2022	Autorizado por CARDER
Aprovechamiento Forestal	Resolución 1658 del 2022	25 de abril de 2023	Autorizado por CARDER
Ocupación de Cauce	Resolución No.3933 del 2022 PIUNDA PR 13+700	Julio del 2024	Autorizado por CARDER
Ocupación de cauce	PR10+300 Resolución 3032 del 9 de junio del 2022 PUENTE LIMONES.	9 junio 2024	Autorizado por CARDER

Ocupación de cauce	Resolución 2465 del 02 de agosto de 2023 PR 38+170 Ciatocito. PR 36+670 PR 29+400 Chupaderos	02 agosto 2025	Autorizado por CARDER
Ocupación de cauce	Resolución 0672 del 28 de marzo de 2023. Autorizado por CARDER PR 19+365, sin nombre, PR 19+165, sin nombre, PR12+790, La Quiebra, PR10+050, La Trinidad.	28 de marzo de 2025.	Autorizado por CARDER
Ocupación de cauce	PR67+700 auto de inicio 0606 del 24 de mayo del 2022		Con concepto de viabilidad N°2672. Con oficio 22470, el cual solicita certificación ministerio de interior de consulta previa, en gestiones por parte del contratista para dar respuesta. Se emitió suspensión del trámite en el mes de diciembre 2022.
Ocupación de cauce	PR55+800		Certificado 098 del 5 de julio de 2022.Codechoco
Concesión de Agua Superficial	Resolución 2494 del 12 de noviembre 2021	12 de noviembre 2023.	Autorizado dos puntos de captación
ZODME INGEVIAS	Resolución No 2366 de 2017 Resolución 598 del 11 de 22 de marzo de 2023		Autorización de dos sitios ubicados en el PR 72 Ruta 5002 y PR 37 Ruta 5003. Autorizada resolución 598 2023 para zodme 37+400.
ZODME Giabra	Resolución 2329 del 27 de octubre de 2021	27 de octubre 2023	Autorizado por CARDER
ZODME PR 16+200	Resolución 520	11 de marzo de 2023	Autorizado por CARDER
ZODME PR9+500	Resolución 2902 del 05 de septiembre del 2023	5 de septiembre de 2023	Autorizado por CARDER
ZODME LA BUFALERA	En trámite		Mediante Radicado CARDER 19748-2023 se solicita a aprobación del zodme, el dia 23-09-2023 se realizó visita

			con funcionario de la CARDER para evaluar el predio.
Permiso de emisiones atmosféricas	Resolución 1764 del 3 de sep. De 2021. (se desistió del permiso) Resolución 1837 del 15 de junio de 2023.	15 de junio de 2023.	Auto de inicio 512 del 16 de mayo de 2023.

Permisos ambientales que ya no son objetos de tramite ambiental:

Ubicación- descripción	observaciones
PR57+600 Agua linda	Por alcance del proyecto no se ejecutarán actividades
PR61+100 semiviaducto	No se realizarán actividades sobre el cauce
Licencia ambiental para autorización temporal No. 50169	Se realiza ddesistimiento en CARDER con radicado 6678 el 11 de abril de 2023 y el 3 de mayo de 2023, se solicita el desistimiento o cesación del trámite sustracción de reserva.
Concesión de aguas superficiales Pr 6+500	Se cuenta con resolución de desistimiento del trámite.0033 del 16 de enero de 2023.
ZODME Agua bonita En el PR 31+000 ruta nacional 5003	Denegado, mediante resolución 4605 del 10 de septiembre de 2022.
PR 68+00 Ruta Nacional 5002 Ocupación de Cauce Rio San juan	Mediante resolución 0503 del 10 de marzo de 2023 la CARDER decreta desestimento tácito y archivo de un trámite ambiental.

Concesión de aguas: La CARDER emitió la Resolución No. 2494 del 12 de noviembre por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se aprueba un programa de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA. Y se dictan otras disposiciones.

A la fecha está pendiente la radicación del informe de caudales a la carder del segundo trimestre del 2023.

Ocupación de cauce: Resolución No.3032 por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones, del 9 de junio de 2022, el cual corresponde a Puente Limones, se está pendiente la realización de actividades de adecuación del sitio para solicitar el cierre del expediente.

- Se cuenta con la Resolución No.3933 del 27 de julio de 2022 por la cual se otorga un permiso de Ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones, Quebrada Piúnda, a la fecha se continua en ejecución de actividades en este sitio.

- Se cuenta con la resolución 672 del 28 de marzo de 2023, por la cual se otorga un permiso de Ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones para los PR 19+365, sin nombre, PR 19+165, sin nombre, PR12+790, La Quiebra, PR10+050, La Trinidad.

Para este periodo el dia 22-09-2023 se realizó visita al corregimiento de Mumbú para la atención a la comunidad en cuanto al concepto de viabilidad de construcción de muro de contención en la margen derecha del Rio Mumbú, esta atención se realizó en compañía con el área ambiental de la interventoría y funcionario de la autoridad ambiental CODECHOCO.

Aprovechamiento Forestal: Se cuentan con las siguientes resoluciones: Resolución No. 2403 del 2 de noviembre de 2021 y la Resolución No. 1658 del 25 de abril de 2022.

- El 12 de julio de 2023, se recibe el concepto técnico N° 2417, donde la carder realiza el proceso de recibo del establecimiento de la compensación forestal a partir del mes de mayo de 2022, ya que cumplió con la siembra de la plantación forestal como lo establece la **Resolución No. 1658 del 02 de noviembre de 2021**.
- Del 13 al 15 de septiembre se realizó visita de seguimiento a las compensaciones forestales interpuesta por la CARDER en los permisos de Aprovechamiento forestal otorgados para la ejecución del Contrato.
- Durante este periodo se viene culminando el segundo mantenimiento de la compensación forestal para ambas resoluciones, así mismo se culminó el tercer mantenimiento de rescate de epifitas para lo cual se contó con una cantidad de 3.000 ejemplares.
- Para este periodo el Contratista presenta a la CARDER y la Interventoría informe de afectaciones por ganadería a las siembras e interpuso demanda ante las entidades secretaria de medio ambiente, inspección de policía y Fiscalía del Municipio de la Virginia.
- El 22-09-2023 se atiende solicitud de la comunidad de Mumbú ruta 5002 con respecto a la construcción de una cancha y unos senderos peatonales ecológicos para lo cual se establecieron unos criterios ambientales esta visita se realizó entre Contratista, Interventoría y CODECHOCO

ZODME: La CARDER emitió la Resolución No. 2329 del 27 de octubre 2021 por la cual se aprueban la demarcación de zonas de retiro o fajas de protectoras de corrientes hídricas, se autoriza la disposición final de escombros y/o material sobrante de descapote y excavación, se otorga un permiso de ocupación de cauce, se autoriza un aprovechamiento forestal único, Zodme Giabra PR6+500.

- Se cuenta con resolución 0520 del 11 de marzo de 2023, en la cual autorizan la disposición final en el Zodme ubicado en el PR16+200.

- **Zodme PR 9+500:** el 5 de septiembre de 2023, la CARDER emitió la Resolución 2902 por la Cual, se otorga un permiso de ocupación de Cauce, se autoriza la disposición final de material sobrante de descapote y excavación se aprueba la demarcación de zonas de retiro o fajas protectoras de corrientes hídricas y se dictan otras disposiciones.

- **Zodme la Bufalera PR 13+700**. El día 23 de septiembre de 2023, se realizó visita con funcionario de la CARDER con el objeto de evaluar el predio y poder continuar con el tramite para obtener el permiso.

Planta de Concreto y triturado:

Se cuenta con la nueva resolución 1837 del 15 de junio de 2023, por la cual se otorga un nuevo permiso de emisiones atmosféricas por el traslado de la planta de concreto y trituración. En cuanto a la Resolución 1764 del 3 septiembre de 2021 por la cual se otorgó un permiso de emisiones atmosféricas; se encuentra en proceso de cierre, ya que se desistió, se está a la espera del cierre de este expediente, la visita fue efectuada por la carder el 25 de mayo de 2023.

- El lunes 24 de julio la carder da respuesta satisfactoria mediante No de Oficio 17874 Respondiendo al Radicado No.14803 "...NOTIFICACION INICIO DE ACTIVIDADES PLANTA TRITURADORA Y DOSIFICADORA DE CONCRETO RESOLUCION 1837 DEL 15 DE JUNIO DE 2023, mediante oficio N° 202311502002.

- **Permiso concesión aguas y vertimientos predio Giabra:** Mediante oficio 23649 del 21 de septiembre de 2022, la CARDER da respuesta a la solicitud de prórroga realizada por el contratista mediante oficio C17572020 con radicado 16651-2022 del 29 de agosto de 2022, asociado al Auto de Inicio N°00657 del 13 de junio de 2022 para atender el requerimiento al Permiso concesión aguas y vertimientos predio Giabra, otorgando prórroga de 30 días para su respuesta.

- A la fecha se cuenta con acto resolutivo de desistimiento del trámite, dado mediante resolución 0033 del 16 de enero de 2023, por medio de la cual decreta el **desistimiento** del trámite de concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos, programa de uso eficiente y ahorro del agua PUAA y permiso de ocupación de cauce.
- Para este periodo el contratista entregó a la CARDER el informe del PUEAA con el objeto de dar cumplimiento a la obligación establecida en la resolución del permiso de concesión de aguas.
- El 26-09-2023, se presentó un incidente ambiental por un derrame de aceites en el PR 41+050 el cual el contratista de manera inmediata entendió el incidente e implemento las medidas necesarias para atender el cual no ocasiono ninguna afectación a un cuerpo de agua.

➢ **Recorridos en obra y actas de reunión:**

El día 23 de septiembre de 2023, se realizó visita con funcionario de la CARDER al sitio de la Bufalera que el objeto de hacerle una evaluación al predio para continuar con el tramite de la obtención del permiso para usarlo como zodme.

El 22 de septiembre de 2023, se realizó visita con funcionario de CODECHOCO por solicitud de la comunidad para conceptos ambientales sobre la construcción de un muro de contención, de unos senderos ecológicos, una iglesia y una cancha esto fue una actividad complementaria.

➢ **Informes Trimestrales De interventoría:**

El próximo informe trimestral sería el N° 10 correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2023 el cual será entregado en el mes de octubre de 2023 a la SS. El cual ya se inició con su elaboración.

➢ **Registro Fotográfico: ver anexo**

➢ **Seguimiento Ambiental:**

Con el fin de realizar seguimiento y control se realizan las siguientes actividades por parte de Interventoría:

- ✓ Revisión de documentación ambiental de proveedores y planta.
- ✓ Seguimiento a la implementación de la señalización en obra.
- ✓ Recorridos verificación de tramos a intervenir y obras hidráulicas a construir
- ✓ Revisión y seguimiento de actos administrativos generador por la CARDER
- ✓ Toma de registro fotográfico ambiental.
- ✓ Revisión informe mensual ambiental

- ✓ Revisión de requerimientos realizados por la CARDER.
- ✓ Revisión PIA, actualizado a los ítems no previstos.
- ✓ Realización de comité o reuniones socio ambiéntales y con la entidad
- ✓ Revisión de tecno mecánico de las volquetas que suministran el material.
- ✓ Recorridos en obra verificando medidas de manejo ambiental.
- ✓ Seguimiento a las solicitudes de tramites ambientales referente a la ocupación de cauce.
- ✓ Recorridos de verificación a las compensaciones forestales.
- ✓ Reuniones con el especialista forestal en informes técnicos y visitas de seguimiento.
- ✓ Seguimiento a las medidas establecidas en el PAGA V2 aprobado por la Interventoría.
- ✓ Actualización del PIA V3 y APUS de cerramiento por estacones de Guaduas.

Gestión predial:

INFORME CONSOLIDADO MENSUAL PREDIAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CONTRATO DE OBRA	1757 DEL 2020, MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1832 DE 2020, "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA REGION PACIFICO"		
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1		
DEPARTAMENTO	RISSARALDA	**FECHA INICIO**	19/03/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCO	**FECHA TERM.**	30/11/2023
VALOR BOLSA PREDIAL	$2 .698.483.266,00	**No INFORME**	31
VALOR EJECUTADO	$ 239.855.143,00	**MES INFORME**	SEPTIEMBRE
VALOR POR EJECUTAR	$ 2.458.628.123,00	**AÑO**	2023
GESTOR TÉCNICO PREDIAL	Ing. Geovanny Andrés Casanova Diaz		
GESTOR JURIDÍCO PREDIAL	Dra. Natalia Leonor Rivera Gómez		
GESTOR VALUATORIO	Ing. Cristian Camilo Jiménez Ávila		

3. ACTIVIDADES Y AVANCES PREDIALES

Durante el mes de septiembre del 2023, se realizaron las siguientes actividades en el componente predial:

- Socialización de Avalúo de cancha deportiva y socialización de gestión socio - predial al alcalde del Municipio de Pueblo Rico – Risaralda.
- Ajuste de estudios de títulos respecto de las áreas a adquirir, linderos específicos y linderos de áreas residuales y remisión para aprobación.
- Remisión de estudios de títulos de las fichas prediales 100-I-T10-CTCP, 221-I-T13-CTCP Y 260-D-T15-CTCP.
- Obtención de resultado positivo del registro de escritura pública de compraventa parcial del pasivo correspondiente a la ficha predial 045-D-T2-CTCP, con generación de nueva matrícula inmobiliaria a nombre de Invias por el área de terreno adquirida.
- Asistencia a comités virtuales con interventoría.
- Atención al público – propietarios de predios a intervenir por el proyecto.
- Aprobación de 7 avalúos y continua uno revisión por alcance de la ficha predial.
- Solicitud a la lonja de elaboración de 14 avalúos
- Remisión de 5 avalúos para revisión por parte de la interventoría
- Desafectación y envío de informe técnico a la interventoría del proceso de Amparo González
- Oficio al Sr. Teobario Mosquera solicitándole requisitos para reconocimiento de mejoras
- Respuesta al Sr. Carlos Cruz con respecto a afectación por parte del proyecto
- Solicitud a la interventoría en apoyo a la gestión de los procesos prediales del proyecto
- Se realiza el presente informe mensual
- Con respecto al avance de los procesos prediales se relaciona la siguiente tabla:

Tabla 2. ESTADO DE LOS PROCESOS PREDIALES

PROCESOS PREDIALES	PREDIOS	FICHAS APROBADAS	FICHAS EN REVISION	FICHAS CON ALCANCE	ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	ESTUDIOS JURIDICOS EN REVISION	AVALÚOS APROBADOS	AVALUO EN REVISION	OFERTAS APROBADAS	PAGOS
FICHAS PREDIOS	18	13	4	1	9	2	4	5	4	0
FICHAS MEJORAS	19	19	0	0	6	1	8	9	8	0
TOTAL	**37**	**32**	**4**	**1**	**15**	**3**	**12**	**14**	**12**	**0**

Tabla 3. LISTADO FINAL DE PREDIOS AFECTADOS Y MEJORAS

N°	FICHA	PROPIETARIO/MEJORATARIO	PROPIETARIO	MEJORATARIO
1	100-I-T10-CTCP	GLORIA AMPARO PINO MOSQUERA	0	1
2	221-I-T13-CTCP	JAIME CASTAÑO Y OTRO	1	0
3	222-I-T13-CTCP	PEDRO PABLO PIEDRAHITA Y OTRO	1	0
4	224-D-T13-CTCP	JORGE IVAN CASTAÑEDA	1	0
5	224-A-I-M-T1-CTCP	EDILBERTO MARTINEZ GOMEZ	0	1
6	224-B-D-M-T13-CTCP	JOSE OLMEDO BERNAL	0	1
7	224-C-D-M-T13-CTCP	ALDAIR BERNAL FRANCO	0	1
8	227-D-T13-CTCP	JAVIER DE JESUS OSORIO BEDOYA Y OTRO	1	0
9	228-D-T13-CTCP	MONICA ALEJANDRA VARGAS SERNA	1	0
10	229-D-T13-CTCP	LUIS EDUARDO CIFUENTES LEDESMA	1	0
11	230-D-T13-CTCP	ANA MARCY RAMOS DE PIEDRAHITA	1	0
12	230-A-D-M-T13-CTCP	BERTA OLIVIA RESTREPO	0	1
13	230-B-I-M-T13-CTCP	MARIA RUBIELA CARMONA TASCON	0	1
14	236-DI-T14-CTCP	LUIS ALBEIRO LENIS OROZCO	1	0
15	236-A-I-M-T14-CTCP	MARIA DE LOS SANTOS MOSQUERA PALOMEQUE	0	1
16	236-B-I-M-T14-CTCP	JOSE REINALDO DOMINGUEZ VALENCIA	0	1
17	236-C-D-M-T14-CTCP	JOSÉ DE JESUS BERRIO	0	1
18	239-I-T14-CTCP	MARÍA LUZMILA ZABALA Y OTRO	0	1
19	239-A-I-M-T14-CTCP	JULIO CÉSAR GÓMEZ	0	1
20	242-I-T14-CTCP	MARÍA OLINDA LÓPEZ AGUDELO	0	1
21	242-A-I-M-T14-CTCP	MARIA EUGENIA CANO LOPEZ	0	1
22	239-A-I-M-T14-CTCP	LILIA DEL CARMEN CANO	0	1
23	243-I-T14-CTCP	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO (CANCHA TAIBA)	1	0
24	244-I-T14-CTCP	MARIA IDALY PENAGOS	1	0
25	245-I-T14-CTCP	ALBEIRO DE JESÚS QUICENO	0	1
26	245-A-I-M-T14-CTCP	SIGIFREDO GARCÍA	0	1
27	246-A-D-M-T14-CTCP	DANIEL BERRIO CARDONA	0	1
28	247-I-T14-CTCP	ROUFIANYT GUTIERREZ PÉREZ	1	0
29	260-D-T15-CTCP	VICTOR MARIA LOPEZ BERNA	1	0
30	263-D-T15-CTCP	SAMUEL SORIANO	1	0
31	263-B-D-M-T15-CTCP	OSCAR VALENCIA	0	1
32	264-D-T15-CTCP	ALBERTO OMAR VALDERRAMA	1	0
33	265-D-T15-CTCP	GUSTAVO ADOLFO ECHEVERRY CASTAÑO	1	0
34	265-A-I-M-T15-CTCP	RUBIELA PELAEZ GOMEZ	0	1
35	271-D-T16-CTCP	GABRIEL SANCHEZ LOTERO	1	0
36	272-I-T16-CTCP	NORBERTO SALAZAR	1	0
37	273-D-T16-CTCP	JOSÉ HECTOR ALZATE GALAVIZ	1	0
TOTALES			**18**	**19**

4. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Los niveles de cumplimiento serán medidos de acuerdo a la cantidad de predios proyectados en la meta física del proyecto.

Tabla 4. PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% SEPT 2023
INFORME DEL SECTOR	1	100,00%
DIAGNOSTICO PREDIAL	1	100,00%
FICHAS APROBADAS PREDIOS	32	86.48%
ESTUDIO DE TITULOS DIADNOSTICOS JURIDICOS	15	40.54%
AVALÚOS APROBADOS	12	32.43%
PAGOS	0	0,00%
% PROMEDIO TOTAL		51.90%

En la medida en que la gestión predial avance con respecto a la aprobación de los procesos prediales por parte de la interventoría y el INVIAS, para el mes de octubre del 2023, los porcentajes de avance reflejaran su progreso.

5. INVERSION A LA FECHA

La inversión a la fecha es la siguiente:

Tabla 5. INVERSION A LA FECHA

DESCRIPCIÓN	ACTA 06 - AGO-2021	ACTA 07 - SEP-2021	ACTA 28 - JUN-2023
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00	$ 231.000,00	$ 143.290.500,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 7.500.000,00	$ 30.106.164,00	$ 67.336.196,00
OTROS (2,5%)	$ 187.500,00	$ 752.654,00	$ 1.683.405,00
IVA	$ 35.625,00	$ 186.894,00	$ 27.545.042,00
VR. TOTAL ACUMULADO	$ 7.723.125,00	$ 31.276.712,00	$ 239.855.143,00

Esta inversión es sobre el pago de pasivos prediales del contrato 532 de 2012, y no sobre procesos nuevos del proyecto.

6. PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN PREDIAL

El costo total del presupuesto inicial del componente predial de contrato se puede revisar en la siguiente tabla resumen:

Tabla 6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO PREDIAL APROBADO EN EL DIGANOSTICO

N°	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1	SUBTOTAL DE AREA ADQUIRIR	728.309.600
2	SUBTOTAL LUCRO CESANTE	49.095.172
3	SUBTOTAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIONES	749.466.656
4	SUBTOTAL DEL COSTO DE LAS ESPECIES	358.198.588
5	SUBTOTAL PASIVOS PREDIALES	415.290.779
6	SUBTOTAL DE GESTION PREDIAL (IVA INC.)	307.790.287
7	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE LOS DESEMBOLSOS PREDIALES	68.435.734
TOTAL DE GESTION PREDIAL PARA FACTURAR		**2.676.575.749**

Sin embargo, con los ajustes al alcance del contrato este presupuesto deberá cambiar, pero hasta tanto no se tenga certeza de los alcances físicos del contrato se dejará este mismo presupuesto y bolsa predial en el balance del contrato.

Con las adiciones realizadas al contrato, la bolsa predial del contrato es de $ 2.944.984.332 y el valor del presupuesto aprobado en el diagnostico predial corresponde a $2.676.575.749, dejando un remanente de $268.408.583; sin embargo como ya se mencionó en el presente informe (numeral 3.0), se hace necesario actualizar las afectaciones prediales con base en las observaciones presentadas en el numeral, y por lo tanto este remanente soportaría económicamente esas áreas o afectaciones adicionales que están surgiendo en el proceso de la gestión predial del proyecto.

Sobre el párrafo anterior, es importante aclarar que hasta tanto dicho cambio en el plan de inversión predial este aprobado, no se incluirán oficialmente los valores en el presente informe y solo se presentaran los que están aprobados.

Tabla 6. RESUMEN DE LOS VALORES DEL PROYECTO Y LA GESTION PREDIAL

VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	134.000.109.999
VR. ANTICIPO 1:	24.481.941.579
VR. ANTICIPO 2:	35.498.815.290
VR. TOTAL ANTICIPO:	59.980.756.869
VR. ADICIÓN No 1:	45.894.257.130,40
VR. ADICIÓN No 2:	25.800.000.000
VR. TOTAL ADICIONES:	**71.694.257.130,40**
VR. TOTAL ACUMULADO:	**205.694.367.129,40**
VR BOLSA PREDIAL INICIAL	2.103.549.454,00
VR BOLSA PREDIAL FINAL	**2.944.984.332,00**
VR PRESUPUESTO PREDIAL	**2.676.575.749,00**
REMANENTE	**268.408.583,00**

Actividades SST:

RECORRIDOS DE INTERVENTORIA

RECORRIDOS REALIZADOS POR EL AREA SST DE INTERVENTORIA.

En el recorrido realizado por el área SST de interventoría a los frentes de obra en la vía que comunica Pueblo Rico – santa Cecilia - Quibdó, y hacia Apia se realizan las siguientes observaciones:

- Se le hacen las siguientes observaciones al contratista mediante comunicados.
    - CVODM1-2234-2023, Solicitud de toma de medidas adecuadas para trabajos de riesgo en el PR 41 de la ruta 5003.





    - CVODM1-2235-2023, Reiteración solicitud seguridad social y documentos de personal de las “OPC” Obras de Participación Ciudadana.
    - CVODM1-2238-2023, solicitud de respuesta sobre derecho de petición del señor ONNY CESAR MANYONA, trabajador de LRC CONSTRUCCIONES y CONSTRUCCIONES IBARGUEN.

CVODM1-2242-2023, Solicitud de toma de medidas adecuadas para trabajos con riesgo de caída PR 44+480, sector el Cristo y reiteración



Foto. 1 Estado actual de los trabajos en el PR44+480

- CVODM1-2242-2023, Solicitud de toma de medidas adecuadas para trabajos con riesgo de caída PR
- CVODM1-2242-2023, Solicitud de toma de medidas adecuadas para trabajos con riesgo de caída PR
- CVODM1-2242-2023, Solicitud de toma de medidas adecuadas para trabajos con riesgo de caída PR

1. Se evidencia un poco más de compromiso en la instalación de señalización en diferentes puntos del corredor vial.






22/09/2023 8:55:54 a. m.
Sector la Union
Liberacion Formaleta Concreto MR 45
PR 4 + 240 / 270 M Der Ruta 5003
#Consorcio Vial Odiseo M1


26/09/2023 3:43:30 p. m.
Pueblo Rico
Risaralda
Sector Chupadero
Demolición Box Exixtente
PR 29 + 600 M Izq Ruta 5003
#Consorcio Vial Odiseo M1


jueves, 28 de septiembre de 2023 11:45:50
Instalación de concreto en cuneta PR38+800/880 Carril Der
#Corredor Vial Quibdo-Pereira R5003


jueves, 28 de septiembre de 2023 08:58:16
Liberación Base en aproches Puente Los Angeles PR10+710


14/09/2023 09:31

2. Se evidencia que en los recorridos realizados, el personal cuenta con los EPP y las medidas mínimas de seguridad para sus labores constructivas.













3. Se evidencian puntos de control de tráfico con buena señalización







2) GESTIÓN DOCUMENTAL Y FOTOGRAFICA DE INTERVENTORÍA

A. Ingreso e inducciones de personal nuevo. "Se adjunta en medio magnético y físico"

Para este periodo no se realizaron inducciones de personal nuevo para la interventoría.

B. Capacitación y/o Charlas. "Se adjunta en medio magnético y físico"

En este periodo se realizaron las siguientes charlas y capacitaciones al personal:

1) DICTADAS POR ARL SURA "VIRTUALES "Se adjunta en medio magnético y físico"

- Capacitación, SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO “RIESGO QUIMICO” – 15/09/2023 - Todo el personal de interventoría.

- Capacitación, CONTROL Y MANEJO DE INCENDIOS – 19/09/2023 – Brigada de emergencia.

- Capacitación, HABILIDADES SALUDABLES – 25/09/2023 – Todo el personal de interventoría.

- Capacitación, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COPASST – 28/09/2023 - Vigías.

2) DICTADAS POR SST PRESENCIALES. “Se adjunta en medio magnético y físico”

- Capacitación, PREVENCION DE ACCIDENTES EN LA VIA “MANEJO DEFENSIVO - 29/09/2023 - Conductores.

3) CURSOS POR PLATAFORMA ARL SURA. “Se adjunta en medio magnético y físico”

- Curso, MANEJO DEFENSIVO VEHICULO LIVIANO – **Agosto 2023**– Conductores de interventoría.

C. Entrega De EPP Y Dotación “Se adjunta documentación en medio físico y magnético “

Se realiza la entrega EPP y dotación al personal de interventoría en el mes de septiembre de 2023, algunos de ellos que se encontraban pendientes desde su ingreso desde inicio de año 2023 y las dotaciones del personal antiguo y que devenguen entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes.

D. Inspecciones “Se adjunta en medio magnético y físico”

Se anexan soportes de entrega de las inspecciones realizadas, durante el mes de septiembre de 2023.

E. Pre operacional y recorrido de vehículos "Se adjunta en medio magnético y físico"

Se envía el pre operacional de:

1) Camioneta QHU 781
2) Camioneta FRY 418
3) Camioneta Vann KOP 719

F. Seguimiento y control de vehículos "Se adjunta en medio magnético y físico"

Se adjunta los respectivos formatos de seguimiento de los vehículos:

4) Camioneta QHU 781
5) Camioneta FRY 418
6) Camioneta Vann KOP 719

G. Accidentalidad "Se adjunta en medio magnético y físico"

Para este periodo no se reportan accidentes ni incidentes laborales.

H. Ausentismo "Se adjunta en medio magnético y físico las evidencias respectivas"

Para el mes de septiembre de 2023 se presentó ausencias por parte del personal de interventoría, la cual es relacionada a continuación:

- La srita Vanessa Cardona, que se encuentra en licencia de maternidad aun.
- La srita Stefany Berrio, inicia incapacidad por licencia de maternidad a partir del 02/09/2023 y finaliza dicha incapacidad el 05/01/2024
- El señor Deimer Salcedo solicita permiso para asistir a una cita médica el día 04/09/2023, todo el día ya que la cita es en la ciudad de Pereira.

I. Cartelera Informativa


Se mantiene la información del tablero informativo, la ubicación del mismo y se realiza la actualización del COPASST para que el personal conozca quienes son los nuevos cambios de dicho comité.






J. REGISTRO FOTOGRÁFICO


1) SST

I. Se mantiene la señalización y ubicación de señales y elementos para Atención de emergencias.

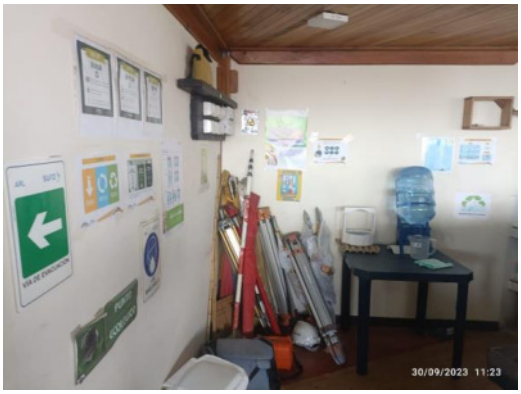

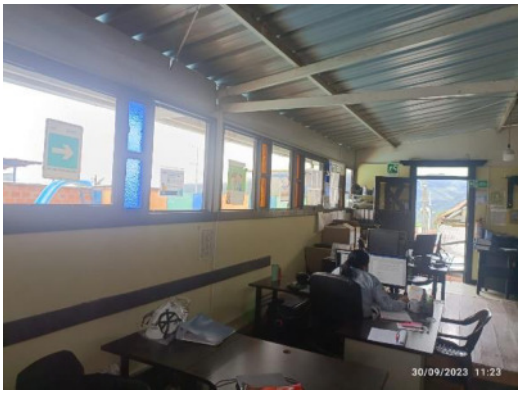

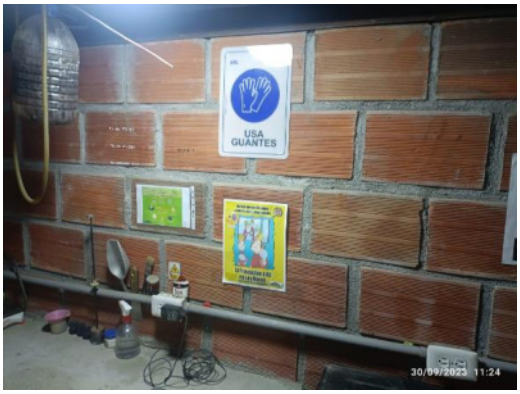

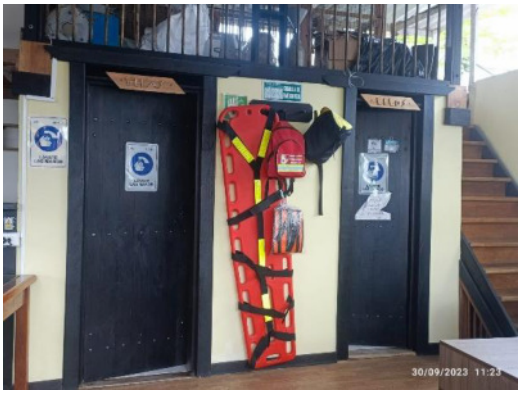
II. Extintores en la oficina y laboratorio de interventoría.




III. Inspección de botiquín.




IV. Inspección de kit de derrame de sustancias peligrosas.



V. Se realiza la entrega de detalles enviados por la SRL SURA al personal de interventoría.



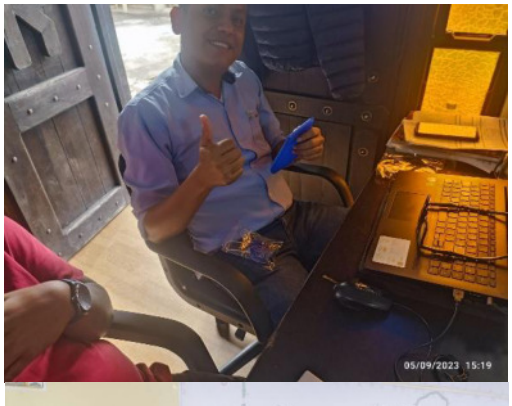


05/09/2023 15:19



05/09/2023 15:20


05/09/2023 15:20


05/09/2023 15:21


05/09/2023 15:22



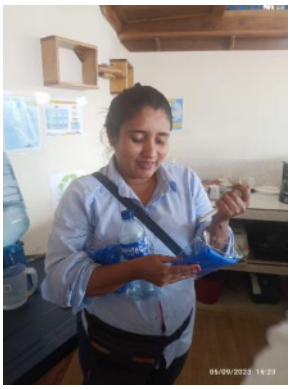

Contrato obra: **1757 DE 2020**

Objeto: **MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDO-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA**

PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES.

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL ODISEO MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ

Contrato de obra: **1832 DE 2020**

Objeto: **INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA REGION PACIFICO**

INFORME No. 30 SST

SEPTIEMBRE 30

GESTIÓN SST MENSUAL INFORME

GESTIÓN SST MENSUAL INFORME

1) RECORRIDOS DE OBRA

Se realizo acompañamieto el PR 10 + 700 RUTA 50RSO1





Se realizo acompañamiento en el PR 10+ 300 PUENTE LIMONES



Se realizo acompañamiento en el PR 42 + 100 en lanzado de talud







Se realizó acompañamiento en el riego de asfalto del PR 44 pavimentación asfáltica









Se realizó acompañamiento en el vaciado de anillo de pozo en el PR 44




Se realizó acompañamiento en actividades realizadas en la planta del PR 38 + 800





Se realizó acompañamiento en la limpieza del carril en el PR 48



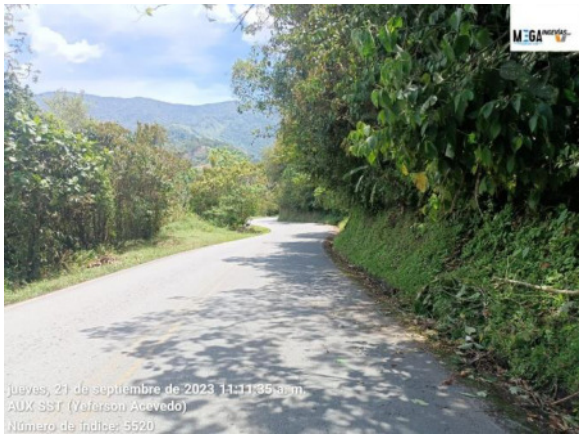

Se realizó acompañamiento en el céreo del PR 34 + 010





Se realizó acompañamiento en actividades realizadas en la planta PR 30 + 200











Se realizó acompañamiento en el vaceo de MR En El PR 13 + 700







2) GESTIÓN DOCUMENTAL Y FOTOGRAFICA

A. RELACION PERSONAL POR CARGOS EN OBRA:

CARGO	CANTIDAD
ADMINISTRADORA	1
AUX. ADMINISTRATIVOS	2
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE CIVIL	5
ABOGADO PREDIAL	1
RESIDENTE AMBIENTAL	1

AUXILIAR AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
AUXILIAR SOCIAL	2
INGENIERO DE PLANTA	1
JEFE DE TIENDA	1
ANALISTA DE COSTOS	1
RESIDENTE DE COSTOS	1
PROFESIONAL DE APOYO SOCIAL	1
PROFESIONAL DE APOYO PREDIAL	1
COORDINADOR HSEQ	1
ARQUITECTOS DE APOYO	1
TECNICO PREDIAL	1
ALMACENISTA	2
AUX ALMACEN	1
AUX CONTROL COMBUSTIBLE	1
LABORATORISTA	2
AUX LABORATORIO	4
INSPECTOR SST	2
PROFESIONAL SST	1
INSPECTOR	1
AUX ARQUEOLOGIA	1
AUX SST Y HS	3
TOPOGRAFOS	3
CADENERO #1	5
CADENERO	1
APUNTADORES	3
RESIDENTE MECANICO	1
MECANICO	3
OPERADORES EQUIPOS MENORES Y MAQUINARIA	37
CONDUCTORES	31
MAESTRO	1
INSPECTOR DE OBRA	1
COORDINADOR	1
ENCARGADO DE OBRA	9
SOLDADORES	5

RASTRILLEROS	3
TORNILLERO	1
IMPRIMADOR	1
CONTROLADORES	15
RONDERO	2
OFICIALES	16
APOYO LOGISTICO	1
SUPERVISOR	1
AYUDANTES DE OBRA- TOPOGRAFIA Y PRACTICO	82
TOTAL, PERSONAL EN OBRA	265

A la fecha de corte del presente informe, se cuenta con un total de 265 personas vinculadas al proyecto, todas debidamente afiliadas al sistema general de seguridad social y parafiscal

B. INDUCCIONES

Se adjunta el personal que recibió inducción durante el mes en cuestión"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA
YEINS SEBASTIAN CANO RODRIGUEZ	115198490	01/09/2023	RCC
OSCAR GONZALES CARRASCO	1093533720	04/09/2023	CIVILES MESA
YESID MOSQUERA ROA	1133719739	04/09/2023	CIVILES MESA
BAYRON ALEXANDER DELGADO GARCIA	87551602	17/08/2023	VILLALOBOS
CARLOS ANDRES ARCINIEGAS LEYTON	1087421075	18/07/2023	VILLALOBOS
DANNY RAFAEL DIAZ VASQUEZ	1146822	11/09/2023	VILLALOBOS
JHON ALEXANDER ESCOBAR SANTANDER	1004592652	18/08/2023	VILLALOBOS
JOSE ALEJANDRO VILLALOBOS ORTIZ	1085339854	17/08/2023	VILLALOBOS
MARIO LAUREANO SANTANDER GUANGUA	87550791	31/08/2023	VILLALOBOS
SANTIAGO DARIO BENAVIDES NARVAEZ	87061603	11/09/2023	VILLALOBOS
YENER YECID GUANGUA NASTACUAS	1087076124	23/08/2023	VILLALOBOS
JENIFFER MORENO VALENCIA	1036948235	20/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO
ANDRES ENRRIQUE DIAZ MUÑOZ	1232589716	16/09/2023	VILLALOBOS
BRANDON DIAZ MUÑOZ	1232589714	16/09/2023	VILLALOBOS
EDILSON MORALES	1093540311	16/09/2023	VILLALOBOS
JHON ALEJANDRO HOYOS HENAO	10049944022	16/09/2023	VILLALOBOS

RODRIGO SANTANDER CELSO	87551087	20/09/2023	VILLALOBOS
OMAR CASTRO MONDRAGON	1111756563	06/09/2023	DARIO QUINTERO
JHON SEBASTIAN YANDAR SANTACRUZ	1004543035	21/09/2023	VILLALOBOS
JOSE DANILO SANTACRUZ PEREZ	1085319938	21/09/2023	VILLALOBOS

C. RETIROS

Se adjunta el personal que se retiró durante el mes en cuestión

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA
JONH JAIRO PRECIADO NAÑEZ	98238962	08/09/2023	B&A
ANGIE ANAMARIA RODRIGUEZ	1118124998	08/09/2023	B&A
ANCIZAR ECHEVERRY CARRASCAL	1006440939	08/09/2023	B&A
EPIFANEO MEZA MEZA	5226304	08/09/2023	B&A
JESUS MARIA ARRIETA OLIVARES	1104010376	08/09/2023	B&A
DIEGO FERNANDO AUSIQUE	1007531204	08/09/2023	B&A
JOSE LEONIDAS GARCIA PABON	1118123754	08/09/2023	B&A
JOSE LUIS PARADAS BARAJAS	1006531600	08/09/2023	B&A
JORGE CUESTA	1118200642	08/09/2023	B&A
DIEGO ALEJANDRO GOMEZ VEGA	1118121428	08/09/2023	B&A
WILMAR ERNEY CABEZAS LEMIS	1058324343	08/09/2023	B&A
MIGEL ANGUEL CRUZ	1004280857	08/09/2023	B&A
BLADIMIR ANTONIO ANGEL	12694000	08/09/2023	B&A
WILMER SISA	1118124918	08/09/2023	B&A
DIANA CAROLINA AGUIRRE BENAVUDES	1118123956	08/09/2023	B&A
BAYRON ALEXANDER DELGADO GARCIA	87551602	08/09/2023	B&A
JAMES ANTONIO SIAGAMA RESTREPO	1007629929	02/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO
JAVIER DE JESUS CARDONA AGUDELO	10198834	05/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO
YENNY MAGALY ANTE MUÑOZ	34315693	09/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO
GILBERTO BERDUGO ARENAS	91112188	10/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO
OMAR CASTRO MONDRAGON	11117556563	04/09/2023	RODRIGUEZ CABARCAS
JORGE ANDRES VARGAS GRISALES	10032285	19/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO
LEONARDO FAVIO MARTINEZ	92553796	15/09/2023	RODRIGUEZ CABARCAS
GERMAN ANTONIO OSPINA MORA	14241498	19/09/2023	ADEX LOGISTICA
JAIBER OSOSRIO VALLEJO	18387915	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
GABRIEL RAMIRO IMBACHI SAMBOM	76334691	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
YONATHAN GOMEZ DEVIA	1080295566	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
CARLOS ARMANDO DUSSAN	83235308	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
CARLOS ANDRES VALENCIA	18611044	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
HERNAN DARIO GOMEZ DEVIA	1080290042	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
HERMIDES DIAZ ALDANA	4924369	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
MARLON OSMAR CARRERO MARQUEZ	1221594	07/09/2023	ADEX LOGISTICA


LUIS ANDRES VELEZ BECERRA	1192924328	07/09/2023	ADEX LOGISTICA
ANTONY JOSUE BARAZARTE ARAUJO	PT6712796	15/09/2023	DARIO QUINTERO
WILSON MARIONO DIAZ MUÑOZ	1193238805	15/09/2023	VILLALOBOS
BRANDO DIAZ MUÑOZ	1232589714	16/09/2023	VILLALOBOS
NELSON DANIEL TASCON	1004994054	30/09/2023	MEGAVIAS
JAIRO ANTONIO SOSSA	8151261	30/09/2023	INGEVIAS
JORGE ELIECER PATIÑO	1032246704	30/09/2023	INGEVIAS
EDISON MALDONADO ORREGO	1001892663	30/09/2023	INGEVIAS

D. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES "Se adjunta en medio magnético y físico"

Charlas y/o capacitaciones dictado por (ARL O SST)

CAPACITACIONES SEPTIEMBRE	FECHA	ASISTENCIA
CONTACTO CON TABLAS Y CLAVOS	12/09/2023	50
ABORDAJE TRABAJO ALTURAS Y RESCATE	18/09/2023	32
RESCATE EN PLANOS INCLINADOS	18/09/2023	33
PLANEACION LEVANTAMIENTO DE CARGAS	25/09/2023	16
ATRAPAMIENTOS	29/09/2023	16
RIESGO MECANICO	01/092023	6
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	01/09/2023	5
USO DE LINEA DE VIDA	02/09/2023	3
USO DE EPP Y DOTACION	04/09/2023	7
TRABAJO EN CALIENTE	04/09/2023	4
RIESGO QUIMICO	06/09/2023	7
SOCIALIZACION DE ATS	08/09/2023	8

E. CHARLAS E INDUCCIONES PRESENCIALES EN OBRA

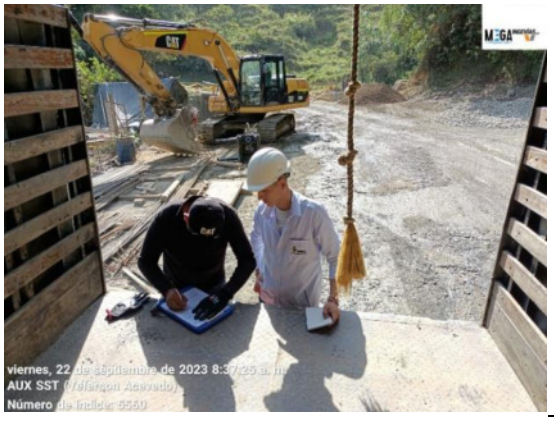




lunes, 18 de septiembre de 2023 9:09:04 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5500


lunes, 18 de septiembre de 2023 9:06:11 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5495


lunes, 18 de septiembre de 2023 8:46:41 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5478


lunes, 18 de septiembre de 2023 8:28:20 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5470


lunes, 18 de septiembre de 2023 7:41:54 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5465

F. Entrega De EPP Y Dotación

Entrega de EPP y dotación durante el mes de junio.














viernes, 15 de septiembre de 2023 8:44:46 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5454


viernes, 15 de septiembre de 2023 8:36:49 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5451


L-300
PROTECTORES AUDITIVOS TIPO CONCHA
Libus
jueves, 14 de septiembre de 2023 10:37:47 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5433


martes, 5 de septiembre de 2023 9:13:11 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5410


CONDOR
lunes, 4 de septiembre de 2023 3:03:10 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5406


martes, 5 de septiembre de 2023 7:47:02 a. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5408





H. Entrega de hidratación







I. Preoperacionales de vehículos

- Relacionar los vehículos de los cuales se envía dichos preoperacionales realizados durante el mes, y enviar los soportes adjuntos en el informe.

TIPO DE VEHICULO	PLACA O NUMERO DE SERIE	MARCA	CONTRATISTA
TURBO	SYN - 426	CHEVROLET NHR	RCC
TURBO	LFX - 351	JAC JHR	VILLALOBOS
CAMIONETA	FKN - 331	FORD RANGER	B&A INGENIERIA
TURBO	TZK - 570	JAC	OGC CONSTRUCCIONES
TURBO	WOW - 306	FOTON	CONSTRUCTORA CIVIL MESA

J. Accidentalidad

En el mes de SEPTIEMBRE del 2023 se presentaron DOS accidentes laborales.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANIA	DIAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	FECHA DE ACCIDENTES
EDWIN ANDRES URREA	1093533713		Se encontraba en el km 19 limpiando la vía con la máquina y cayeron piedras del talud rompiendo el panorámico de la maquina cayéndole vidrios en la cara y partes del cuerpo, afectándole el ojo derecho.	01/09/2023

K. Ausentismo "se anexa carpeta con las respetivas incapacidades del mes.

Justificadas

- Por enfermedad general

Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Días de Incapacidad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	DIAGNOSTICO
KENNER GRANADA EUSSE	1004994010	3 DIAS	31/08/2023	03/09/2023	TRAUMATISMO DE LA PIERNA, CONTUSION DEL CODO
KENNER GRANADA EUSSE	1004994010	4 DIAS	05/09/2023	08/09/2023	MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION

JOSE ABELARDO CHAVARRIA	98541539	6 DIAS	11/09/2023	16/09/2023	PACIENTE CON TRAUMA OCULAR IZQUIERDO

Permisos No justificados:

En el mes de SEPTIEMBRE no se presentó ausentismo laboral injustificado por parte del personal vinculado al Consorcio Megavias Choco

L. REGISTRO FOTOGRÁFICO VARIOS DE SST

1. Señalización y demarcación de obra y zonas de riesgo.

Señalización PR 10 + 700 RUTA 50RSO1
Puente los ángeles



Señalización PR 10 + 700 RUTA 50RSO1
Puente los ángeles











Señalización PR 49



Señalización PR 49



Señalización PR 44



Señalización PR 44







Señalización PR 38



Señalización PR 38







Señalización PR 23 + 750



Señalización PR 23 + 350





Señalización PR 22 + 450



Señalización PR 22 + 450



3.3 SEGUIMIENTO A LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto a medida que se ha ejecutado, se ha requerido los siguientes Ítems no previstos que se relacionan en las siguientes tablas:

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _1__ DE FECHA ____11/11/2021___

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN N° DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
70	4	Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de h = 2.30m a 3.20m - Capacidad de Carga = 24 Ton/Unidad	Un	8	$ 14.542.813,00	$ 116.342.504,00	2 DE 11/11/21	8
71	4	Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de H = 4.20m a 4.50m - Capacidad de Carga = 24 Ton/Unidad	Un	16	$ 16.716.248,00	$ 267.459.968,00	2 DE 11/11/21	16
72	4	Nivelación de Estructura, Soltado y Retorqueado de Pernos, Reparación y Rellenos de Soldaduras	Kg	227.000	$ 4.698,00	$ 1.066.446.000,00	2 DE 11/11/21	227.000
73	4	Realineamiento Estrucutral del Puente - Sistema de Vigas Principales y Arriostramiento (Incluye Reparación, Reposición	Kg	27.473	$ 28.396,00	$ 780.123.308,00	2 DE 11/11/21	12.578
74	4	Reparación, Recosntrucción y Realineamiento Conexiones de Vigas Principales (Incluye Trabajos de Soldadura de 76 Conexiones en	Kg	72	$ 6.478.934,00	$ 466.483.248,00	2 DE 11/11/21	72
75	4	Limpieza General y Puntura de Protección Estructura de Arriostramiento	m2	1.525	$ 215.358,00	$ 328.420.950,00	2 DE 11/11/21	1.230

Ítem no previstos fijados para puente limones según Acta de fijación No 1.

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
642,1P	5	Apoyo de neopreno anclado compuesto por bloque elastomérico de 400X600X66 mm Dureza 60 Con 4 Laminas Internas A36 de E=4 mm	Un
650,20	4	Fabricación de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W)	Kg
650,30	3	Transporte de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W)	Kg
650,40	4	Montaje de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W)	Kg
700,1P	7	Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para líneas de demarcación	ml
700,3P	7	Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para marcas viales	m2
233,10	7	Estabilización de suelos de subrasante y refuerzo de capas granulares con geomalla biaxial (con resistencia última a la tensión de 20 KN/m o su equivalente)	m2
233.1P	7	Refuerzo de capas de pavimento asfaltico con geomalla estructural (con resistencia última a la tensión de 100 KN/m o equivalente)	m2
683,1P	7	Geotextil Tr-4000 o Equivalente para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2
683,2P	5	Muros y Estructuras de Suelo Ensacado Proveniente de los cortes y excavaciones (Geobolsa tipo PROPYBAG o equivalente de capacidad = 0.030m3)	m3
811.1P	5	Protección de Taludes de Cortes y Terraplén mediante Refuerzo con telas orgánicas o sintéticas tipo biomanto TRM 50 3.50 x 50 m de largo o Equivalente	m2
673,3P	7	Geodren Planar para Filtros en Muros de suelos Reforzados y Estructuras (Ancho 0.50m o su equivalente)	ml
6P	5	Mortero fluido autonivelante de alta resistencia tipo grouting	m2

Ítems no previstos según necesidades del proyecto – Acta de fijación No 2.

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
450.4P	7-11603	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-25	m3	3.080,00	$ 1.103.385,00	$ 3.398.425.800,00
201.12.1P	5	Tala de árbol tipo V h menor a 5 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	Und	200,00	$ 140.154,00	$ 28.030.800,00
201.12.2P	5	Tala de árbol tipo IV h mayor igual a 5 y menor a 10 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	Und	2.000,00	$ 309.460,00	$ 618.920.000,00
201.12.3P	5	Tala de árbol tipo III h mayor igual a 10 y menor a 20 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	Und	1.700,00	$ 763.632,00	$ 1.298.174.400,00
201.12.4P	5	Tala de árbol tipo I, h mayor igual a 20 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)	Und	100,00	$ 1.661.882,00	$ 166.188.200,00

Ítems no previstos según necesidades del proyecto – Acta de fijación No 3.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo del mes de septiembre de 2023, se destaca lo siguiente:

EL mes de septiembre se tiene un porcentaje programado acumulado de obra 118,12%, versus un avance ejecutado de 125,59%, para un adelanto de 7.47% según reprogramación No 11, con fecha de terminación del contrato del 30 de noviembre de 2023.

Mediante comunicado CVODM1-2208-2023 Remisión del Concepto Técnico de visita de Campo realizado por el Especialista Forestal de la Interventoría. VISITA DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE LAS PLANTACIONES POR COMPENSACIÓN EN LOS PREDIOS YARUMAL Y EL RECUERDO, RESOLUCIONES 1658 DE 2022 Y 2403 DE 2021.

Mediante comunicado CVODM1-2211-2023 Solicitud concepto de NO objeción de (10) diez ofertas de compra y formatos de inscripción de oferta. Dando cumplimiento de los términos de referencia, así como de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública No. 1757-2021, del contrato de Interventoría No 1832 de 2020, correspondientes a los requerimientos de la Subdirección de Sostenibilidad y en particular a la gestión predial del contrato de obra, se envía para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Mediante comunicado CVODM1-2217-2023 Solicitud informe técnico para ficha predial 265-D-T15-CTCP. Una vez revisada la información recibida bajo el comunicado No. 20231150 2044 de fecha cuatro (4) de septiembre de 2023, correspondiente a los documentos de ocho (8) procesos prediales, de los cuales se identifica el proceso: 265-D-T15-CTCP y cuyo propietario del predio es el señor Gustavo Adolfo Echeverry Castaño, del cual se solicita al contratista de obra justificar técnicamente en el informe el requerimiento para el proyecto de adquirir el área de terreno (marcada en el plano predial con el #6), localizada en la parte posterior de un área de terreno adquirida a nombre del INVIAS en un contrato anterior al contrato de obra 1757 de 2020 y con lo cual se ampliaría la zona ya adquirida. De lo anterior nos permitimos informar que sin ese insumo soporte no se podrá aprobar dicha ficha predial y de igual manera no se podrá continuar con el resto de la gestión predial para dicho predio.

Mediante comunicado CVODM1-2221-2023 Solicitud al contratista de obra, atención a la correspondencia del INVIAS 2023S-VBOG-002286 del (06) seis de septiembre de 2023 y reiteración al comunicado de interventoría CVODM1-2161-2023 del 14 de agosto de 2023.

Mediante comunicado CVODM1-2227-2023 Informe del estado de los compromisos realizados en el acta de reunión No. 151 del 2 y 3 de junio del 2023, con la comunidad del corregimiento de Guarato.

El 04-09-2023 se realizó visita a la CARDER con el objeto de gestionar el permiso del zodme de la Bufalera ubicado en el PR 14+000 RUTA 5003.

El 05-09-2023 se realizó un recorrido para el seguimiento de las actividades del zodme del PR 37+400.

Por medio de comunicado CVODM1-2208-2023 del o5-09-2023, se remitió al Contratista el concepto técnico de visita de campo realizada por el Especialista Forestal de la Interventoría.

Por medio de comunicado CVODM1-2210-2023 del 05-09-2023 se da respuesta al comunicado SS 48945 del 24-08-2023, pre acta ambiental N° 29.

Mediante oficio CVODM1-2234-2003 Solicitud de toma de medidas adecuadas para trabajos de riesgo en el PR 41 de la ruta 5003. De acuerdo al seguimiento y control desde la interventoría al desarrollo de las actividades diarias de obra, se evidencia que los trabajadores que realizan actividades de concreto lanzado en el PR 41+000 de la ruta 5003, están expuestos a un riesgo de caída de acuerdo a las pendientes y altura de las zonas de trabajo, se recomienda al contratista de

obra implementar acciones de seguridad como el anclado y/o línea de vida, estableciendo que esta actividad es de alto riesgo, ante las condiciones de talud y el proceso constructivo.

Mediante comunicado CVODM1-2235-2023 Reiteración solicitud seguridad social y documentos de personal de las “OPC” Obras de Participación Ciudadana. De acuerdo a la revisión realizada de la información entregada por el área SST del CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO, referente al informe mensual del mes de agosto del 2023, no se evidencia la documentación restante ni las planillas de seguridad social del personal ejecutor de las diferentes OPC” Obras de Participación Ciudadana, ejecutadas a lo largo del corredor vial.

Mediante comunicado CVODM1-2237-2023 Remisión de solicitud realizada por parte de las comunidades de Mumbú, Gingarabá y Guarato (ASOCASAN), de la programación de reunión presencial en territorio para el día 22 de septiembre de 2023. Como es de su conocimiento, se ha registrado afectaciones directas al avance del proyecto por la problemática social, como se informó por parte de la interventoría bajo comunicado CVODM1-2213-2023 del seis (06) de septiembre de 2023, en remisión del comunicado del consorcio contratista No. 202311502093 del cinco (05) de septiembre de 2023, mediante los cuales se evidencia el impidiendo por parte de los lideres de Mumbú, Gingarabá y Guarato del avance de las obras que se encuentran en ejecución en el PR 61+100 de la ruta 5002 con la construcción del semiviaducto. Se logra demostrar que la no conformidad de la comunidad se deriva del no cumplimiento de los compromisos por parte del INVIAS y de la reprogramación de las reuniones en territorio.

Mediante comunicado CVODM1-2247-2023 Remisión concepto de la especialista hidráulica de la interventoría al volumen VII. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación puente La Quiebra y Santísima Trinidad. Radicado 202311502154 del 20 de septiembre de 2023, y solicitando el reenvió de la información con las firmas de los profesionales aprobados por parte de la interventoría.

Mediante comunicado CVODM1-2140-2023 Entrega del Informe Trimestral Gestión Social No 9 Modulo 1, los Informes presentados por el contratista Megavías Choco cumplen con la estructura y contenido exigido por INVIAS para el componente Social, por lo tanto, son aprobados por Interventoría y remitidos a INVIAS.

Mediante comunicado CVODM1-2250-2023 Remisión de concepto de no objeción de fichas prediales. En correo remitido por el gestor técnico predial del INVIAS fechado el día 20 de septiembre, dicho profesional mediante este correo emite concepto de NO objeción a cuatro (4)

fichas prediales y deja observaciones a tres más de ellas para complementar información por parte del contratista de obra.

Mediate comunicado CVODM1-2252-2023 En atención al radicado INVIAS 2023S-VBOG-000763 del 28 de agosto de 2023, se remite los formatos sociales ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS MASPSMN1-IN-3-FR-1; y BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO MASPSMN1-IN-3-FR-2, anexos al informe trimestral #9.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe semanal
En el periodo correspondiente a este informe se realizaron informes semanales relacionados en el Anexo 06. MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra
Se presenta en el Anexo 07 MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3 Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
Se presenta en el Anexo 08 MEPI-MN1-IN15-FR-6 aportes del mes anterior.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra
Se presenta en el Anexo 09 MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 Estado general del tiempo
Se presenta en el Anexo 10 MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 Resumen ensayos de laboratorio
Se presenta en el Anexo 11 MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
Se presenta en el Anexo 12 MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de obra
Se presenta en el anexo 13. MEPI-MN1-IN-15-FR-14. formato de seguimiento al plan de calidad de obra.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

✓ Seguimiento a la inversión del anticipo:

Se presenta el Anexo 14 MEPI-MN1-IN-2-FR-1, Plan de inversión del anticipo.

Se presenta el Anexo 15 MEPI-MN1-IN-2-FR-2M, informe de inversión y buen manejo del anticipo contrato de obra.

Se presenta los siguientes soportes de los rendimientos generados: Documento de integro al tesoro nacional y extracto bancario correspondiente al mes de junio por parte del consorcio MEGA VÍAS CHOCÓ.

✓ **Seguimiento al programa de obra:**

Se presenta el Anexo 16. Programa de obra.

✓ **Seguimiento al programa de inversiones.**

Se presenta el Anexo 17 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Programa de inversiones.

Se presenta el Anexo 18 Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento programa de inversión.

✓ **Actas de comité de obra:**

En el periodo correspondiente a este informe se realizaron las siguientes actas de comités:

Relacionadas en el Anexo 19. formato (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1)

✓ **Actas de reunión**:

En el periodo correspondiente a este informe se realizaron las siguientes actas de reunión:

- Acta de reunión N°182 del 14 septiembre del 2023

- Acta de reunión N°185 del 13 de septiembre del 2023

- Acta de reunión N°186 del 21 de septiembre del 2023

- Acta de reunión N°187 del 28 de septiembre del 2023

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de interventoría.

Tabla 1. Información general del contrato interventoría

Número de Proceso	: CMA-DT-174-2020
Número de ID Secop	: CO1.NTC.1538381
Contrato No:	:1832 de 2020
Fecha de suscripción	: 22 DICIEMBRE DE 2020
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA- REGIÓN PACÍFICO"
Contratista	: CONSORCIO VIAL ODISEO
NIT	: 901442943 - 5
Representante legal	: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No	: 88.197.628 expedida en Cúcuta
Integrante 1	: GRUPO POSSO SAS - 40%
NIT:	: 800.007.208-9
Integrante 2	: D & B INGENIEROS CIVILES S.A.S – 25 %
NIT:	: 830.027.712.-4
Integrante 3	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S. – 5%
NIT:	: 900.378.119-5
Integrante 4	ABIF INGENIEROS SAS – 10%
NIT:	: 901.140.337-5

Integrante 5	ANTONIO JOSÉ PEDRAZA JIMÉNEZ – 20%
NIT:	: 6.768.550
Valor Inicial del Contrato	: CATORCE MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($14.614.742.722) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
Valor Adición No 1 Valor Adición No 2	: TRES MIL VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($ 3.024.000.000,00) : TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($3.264'142.000,00)
Valor actual del contrato	VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE DOS PESOS ($ 20.902.742.884.722) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA.
Modificaciones	: ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DEL 26 DE FEBRERO 2021.
Plazo Inicial	: (18) Meses
Plazo actualizado	: (32,5) Meses
Fecha de inicio	: 19 marzo 2021
Fecha de terminación	: 30 noviembre 2023
Dirección	Avenida suba transversal 60 # 115-58 Torre B oficina 601- Bogotá D.C – Colombia
Contacto	: +57 (1) 6216395 Ext 102

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Actividades

Durante el mes de septiembre, se realizaron las siguientes actividades:

- Inspección continua de los diferentes sitios críticos del corredor para alertar la oportuna atención al contratista de obra, en especial los puntos donde se presentaron derrumbes que pobocaron el cierre total y parcial de la via.
- Supervision y acompañamiento a remoción de derrumbes presentados en el corredor vial.
- Supervisión a levantamiento topográfico y localización y replanteo del corredor víal.
- Inspección instalación de materiales granulares en los frentes de obra.
- Inspección de toma de ensayos de laboratorios (granulometria, limites de resisitencia, densidades, resistencia de concretos, compactación de asfalto, en cada uno de los frentes de obra).
- Se hizo seguimiento, verificación y solicitud de documentos técnicos, administrativos, financieros, legal y ambiental del contrato N°1757 de 2020.
- Verificación de maquinaria dispuesta en obra para atención de emergencias.
- verificacion de las actividades sociales, prediales y ambientales con contrato N° 1757 de 2020.
- Implementación y seguimiento a otros programas según documentación contractual.
- Acompañamiento a recorridos para definir gestiones sociales como: atención a pasivos, PQR, diligenciamiento de actas de vecindad y demás.
- Acompañamiento en la gestión ambiental para la obtención de licencias y permisos ante la corporación ambiental CARDER y cumplimiento del PAGA (Plan de adapatción de la guia ambiental). Asi mismo seguimiento y control de la gestión ambiental en cumplimiento del apendice E y demas documentos inherentes al mismo.
- Acompañamiento y verificación de la gestión predial en cumplimiento del apendice F y demás documentación contratual.
- Verificación de implementación de protocolo de bioseguridad para mitigación del covid 19, mediante normatividad vigente del gobierno nacional.

5.3 Informe especialistas y Profesionales

Durante el periodo de elaboración de este informe, se tiene concepto de especialista Ambiental, Geotecnia, Hidráulico, de Sostenibilidad, líder de integración, Abogado, profesional de calidad, valuatorio, especialista estructural e informe de profesional forestal.

Se presentan los informes de especialistas correspondientes en el anexo 21.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

En el anexo 22 se presenta el programa anual de caja – PAC, actualizado a las actas de obra y de costos del último mes facturado.

5.5 Informe Matriz de Riesgos.

Según el monitoreo y seguimiento a los tratamientos y controles de los riesgos previstos en la matriz de riesgos del proyecto, se continua con la identificación de dos riesgos de alto impacto:

1. Tipo de riesgo social
2. Riesgos operacional.

Por lo anterior, se describen las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias que pueden llegar a afectar la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia.

Monitoreo y Revisión Matriz de Riesgos											
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDO-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES											
No.	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A QUIEN SE ASIGNA		Tratamiento/control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Actividades de seguimiento al tratamiento y control por parte de la interventoria	Mejoras propuestas por la interventoria a los tratamientos y controles definidos
				INVIAS	CONTRATISTA						
1	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público**: Posibles paros por pasivos de las fases anteriores (fase I, II y III) que se vienen presentando en el desarrollo del contrato, afectando el orden público, el cual se sitúan en la zona de influencia de las obras de mejoramiento vía.	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores de las obras de mejoramiento bien sea de manera temporal o definitiva.	x	x	El contratista de obra, interventoría e INVIAS realizan reuniones, visitas de campo y mesas de trabajo con la comunidad de dichos presuntos pasivos, para gestionar sus requerimientos.	contratista de obras, INVIAS e interventor.	Al inicio del contrato	En gestión	Realiza acompañamiento al contratista de obra, a las visitas de campo de las posibles afectaciones manifestadas por la comunidad. Hace inspección de la documentación de soporte para tramitar viabilidad a la compensación del posible afectado. Realizar informes de seguimiento y avance de las gestiones adelantadas para informar al instituto. Solicita recursos adicionales en la provisión de la Gestión Social, Predial y Ambiental para atender las actividades requeridas de los citados pasivos.	Interventoría desde el análisis técnico, jurídico, socio ambiental, predial y financiero de forma integral, evalúa estas compensaciones. Sin embargo dado que corresponden a pasivos de contratos anteriores para mejorar y agilizar el proceso ha solicitado al instituto el aval de dichas compensaciones.
8	Riesgo Operacional	**Inestabilidad Geológica e Hidrogeológica.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del mejoramiento de la vía intervenida, se manifiesten riesgos asociados a la inestabilidad de terrenos no previstos en los Estudios y Diseños dada las características de la topografía montañosa .	Demoras, reprocesos y mayores cantidades de obra necesarios.		x	Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	contratista de obras, interventor.	Con el Acta de Inicio	A la terminación de la ejecución del contrato 18/09/2022	Realiza Visitas y recomendaciones de Especialistas. Realiza, Reuniones, Comités Técnicos, para seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación. Efectúa Informes respectivos, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por parte del contratista de obra. De requerirse solicita recursos adicionales y tiempo para la atención de estas emergencias.	Interventoría para mejorar el proceso de atención de dichos puntos críticos, realiza Inspección continua de los diferentes puntos a lo largo del corredor vial, para alertar de manera oportuna al contratista de obra.

Ilustración 4. Seguimiento matriz de riesgos.

5.6 Información otros programas y aplicativos

Cifra: Se actualiza el avance del proyecto en la plataforma de control de proyectos de infraestructura vial "CIFRA" dando un estado de proceso terminado para todos los reportes entregados a la fecha.

SIG: El 27 de julio de 2022, se emite certificación SPI 43040 por parte de LA SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA donde consta que los Planos de diseño son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) exigido por el INVIAS, en cuanto a Formato de Entrega, Sistema de Coordenadas, Coordenadas, Cotas, Precisión, Topología y Medio de entrega, de conformidad con lo establecido en el capítulo 8.4 Facultades y Obligaciones Específicas de la Interventoría, numeral 39. PLANOS RECORD O PLANOS ASBUILT del Manual de Interventoría de Obra Pública vigente del INVIAS.

Veedurías Ciudadanas: Se cuenta con la participación e inscripción de tres veedurías ciudadanas para el contrato 1757 de 2002 conformadas por:

- La comunidad de Santa Cecilia, mediante la resolución 18-2020 del 24 de septiembre de 2020.
- Habitantes de las veredas Taiba, Itauri y la cabaña, mediante la resolución 022 del 12 de julio de 2021.
- Comunidad de la Marina - Santuario, mediante resolución N° 082 del 25 de noviembre de 2021.

Programa Cívicos Guardavías

La interventoría continúa ejecutando el Programa Cívico Guardavías, con el objetivo de garantizar la participación comunitaria y posibilitar el seguimiento al cumplimiento del avance de obra del contrato 1757 de 2020.

Programa rodando en la vía

Para dar cumplimiento al numeral 1.8 del pliego de condiciones se informa que esta interventoría creó el canal en YouTube, cuyo nombre es: "RODANDO LA VÍA CONSORCIO VIAL ODISEO M1", para mantener informada a la comunidad en lo referente al avance de obra y actividades socio-ambientales, entre otras. Adicionalmente las direcciones URL de los videos han sido enviados al correo electrónico: comunicaciones@presidencia.gov.co,

A continuación, se relacionan los links para visualizar los videos de avance de los diferentes meses:

- Abril 2021: https://youtu.be/9ywLWy4iQhA
- Mayo 2021: https://youtu.be/Q6b9Mpd7lxA

- Junio 2021: https://youtu.be/h2geSSCe7a4
- Julio 2021: https://youtu.be/X8JFE69s7EQ
- Agosto 2021: https://youtu.be/vpoBtdUpbUs
- Septiembre 2021: https://youtu.be/isVGmhKV7rY
- Octubre 2021: https://youtu.be/agyy2x-RnyI
- Noviembre 2021: https://youtu.be/wR1KHzYF1tI
- Diciembre 2021: https://youtu.be/aMu20npmSrk
- Enero 2022: https://youtu.be/qoOE_ogMFvM
- Febrero 2022: https://youtu.be/sHWq6EDsCMs
- Marzo 2022: https://youtu.be/PAfRVGWupKA
- Abril 2022: https://youtu.be/VqD7EWGM73I
- Mayo 2022: https://youtu.be/BqVYKfE7bM0
- Junio 2022: https://youtu.be/bTxs4aA9-ro
- Julio 2022: https://youtu.be/s9YACRAah20
- Agosto 2022: https://youtu.be/XPCrPywVXN4
- Septiembre 2022: https://youtu.be/t8uY3w6t008
- octubre de 2022: https://www.youtube.com/watch?v=nXpcYrpmnkI
- noviembre 2022: https://youtu.be/1k63pRNo-1Q
- Diciembre 2022: https://youtu.be/ogVgivejPKM
- Enero 2023: https://youtu.be/x4bJi7zysBU
- Febrero 2023: https://youtu.be/4sEo-Ru0YY8
- Marzo 2023: https://youtu.be/TeZidtTypbc
- Abril 2023: https://www.youtube.com/watch?v=r_gpmYA-jLo
- Mayo 2023: https://youtu.be/XOxFrSRb940
- Junio 2023: https://youtu.be/1ngf-PFGXU0
- Julio de 2023: https://youtu.be/NqUymPZw6GU
- Agosto 2023: https://youtu.be/-iyX1AbzqwU
- Septiembre 2023: https://youtu.be/txTtWVmZjTQ

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría
Ver Anexo 23 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2 Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
Ver Anexo 24 FORMATO MEPIMN1-IN-15-FR-7.

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
Ver Anexo 25 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9

6.4 Seguimiento a garantías contrato de interventoría
Ver Anexo 26 FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría
Se presenta en el anexo 27. MEPI-MN1-IN-15-FR-15M formato de seguimiento al plan de calidad del mes de septiembre y los formatos actualizados de acuerdo al nuevo Manual de interventoría.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

Seguimiento al anticipo

Ver Anexo 28 Plan de inversión del anticipo V3 formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

Ver Anexo 29 Informe seguimiento inversión del anticipo V2 formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2

Plan de cargas o Reprogramación aprobado.

Ver Anexo 30. Plan de cargas MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La interventoría continúa realizando el seguimiento y verificación para garantizar que el contratista de obra realice las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones y normas establecidas en los lineamientos determinados por instituto nacional de vías, para certificar la buena calidad y estabilidad de la obra.

- En cuanto a las gestiones sociales, ambientales y prediales, del contrato 1757 de 2020 de manera general continúan realizando las actividades de cumplimiento de acuerdo con los apéndices E, D, F y documentación contractual inherentes al mismo.

- La interventoría hace seguimiento y gestión para el desarrollo de las obras con participación comunitaria-OPC, afectaciones y reparaciones y se reitera al contratista la entrega de información de manera oportuna para la revisión de los demás proyectos que se encuentran dentro de los compromisos con la comunidad para dar pronto inicio a las actividades que se encuentran pendientes.

- Por parte de interventoría se continúa realizando control y seguimiento al Consorcio Mega Vías Chocó para la ejecución de las actividades y en especial atención de los puntos críticos para mitigar los cierres viales que se presentan debido a los derrumbes que se presentan con regularidad sobre la vía.

- Se realizaron actas de reunión No 182, No 185, No 186, No 187, para realizar Control, seguimiento de obra y revisión de compromisos pactados en reuniones anteriores y verificación de los estados de avance de los proyectos de participación comunitaria y posibles afectaciones de propietarios

- Se recomienda al contratista mostrar avances significativos en los compromisos adquiridos dentro de los comités, que permitan mejorar la transitabilidad de dichos sectores intervenidos.

8.0 ANEXOS

ANEXO 1

GRUPO POSSO S.A.S

CORRESPONDENCIA ENVIADA

VERSIÓN	5
FECHA	7/02/2022
PÀGINA	1 DE 1

PROYECTO Y/O PROCESO: CONSORCIO VIAL ODISEO M1

TOMO	NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A	NÚMERO RADICACIÓN	FECHA RADICACIÓN	REQUIERE RESPUESTA	FECHA DE LA RESPUESTA	CONSECUTIVO DE RESPUESTA	ASUNTO / REFERENCIA	OBSERVACIONES
	CVODM1-2203-2023	viernes, 1 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE ATENCION A LA OBJECION A LA FICHA TECNCIO SOCIAL DE JESUS ANTONIO CASTILLO * EN ATENCION A LOS COMPROMISOS INVIAS EN REUNION DEL 14 DE JULIO DE 2023 COMUNICADO SS41180 COMPROMISOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 1 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2204-2023	viernes, 1 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION DE LAS NOVEDADES EN EL PROCESOS DE LAS RECLAMACIONES INDIVIDUALES DE CONTRATOS ANTERIORES AL No 1757-2020 POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	viernes, 1 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2206-2023	viernes, 1 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE PROPUESTA PARA LA ATENCION A POSIBLE AFECTACION DEL PREDIO FINCA ZUMARRGA - LOS BUFALOS LOCALIZADA EN INMEDACIONES AL PR14+000 DE LA RUTA 5003 CORREDOR QUIBDO	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	sábado, 2 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2207-2023	viernes, 1 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	EN ATENCION AL OFICIO SS49216 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2023 A TRAVES DEL CUAL LA SUBDIRECCON DE SOSTENIBILIDAD SE ABSTIENE DE EMITIR CONCEPTO NO OBJECION EN EL TRASLADO DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA GESTION SOCIAL- PREDIAL Y AMBIENTAL - AL RUBRO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023E-VUVRAZ-005193	viernes, 1 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2208-2023	miércoles, 6 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMISION DEL CONCEPTO TECNCIO DE VISITA DE CAMPO REALIZADO POR EL ESPECALISTA FORESTAL DE LA INTERVENTORIA	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 6 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2209-2023	miércoles, 6 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMISION CORREO ELECTRONICO CON OBSERVACIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA RADICADAS BAJO COMUNICADO 20231150-2084	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 6 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2210-2023	martes, 5 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RESPUESTA A CORRESPONDENCIA DE INVIAS SS48945 PREACTA AMBIENTAL No 29	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	martes, 5 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2211-2023	miércoles, 6 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD DE NO OBJECION DE (10) OFERTAS DE COMPRA Y FORMATOS DE INSPECCION DE OFERTA	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023E-VUVRAZ-006256	miércoles, 6 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2212-2023	miércoles, 6 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION COMUNICADO DEL CONTRATISTA NO 20231150-2088 DANDO ALERTA POR AFECTACION EN LA BANCA DE LA CARRETERA EL PR12+700 DE LA RUTA 5002	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	SIN RADICADO	miércoles, 6 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2213-2023	jueves, 7 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMSIION COMUNICADO DEL CONTRATISTA DE OBRA No 20231150-2093 EN REFERENCIA A LAS AFECTACIONES DIRECTIVAS AL AVANCE DEL PROYECTO POR LA PROBLEMATIVA SOCIAL Y REITERACIONDE LA SOLICITUD DE APROPIACION PRESUPUESTAL DESDE LAS BOLSAS SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL SUBTOTAL DE OBRAS	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023E-VUVRAZ-006520	miércoles, 6 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2214-2023	jueves, 7 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION DE INFORME SEMANAL No 129 MD 1	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	NA	jueves, 7 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2215-2023	jueves, 7 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE ATENCION A LAS BSERVACIONES EMITIDAD POR PARTE DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL AL VOL VIII ESTUDIO Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LA REHABILITACION DEL PUENTE REGADEROS RADICADO 20231150-2087	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 8 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2216-2023	jueves, 7 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	RESMISION DEL CONCEPTO HIDRAULICO DE LA INFORMACION RADICADO 20231150-1825 DEL 5 DE MAYO VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y SOCAVACION PUENTE PIUNDA	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 8 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2217-2023	viernes, 8 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE INFORME TECNICO PARA FICHAS PREDIAL 265 D-T15- CTCP	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 8 de septiembre de 2023	SI				

GRUPO POSSO S.A.S

CORRESPONDENCIA ENVIADA

VERSIÓN	5
FECHA	7/02/2022
PÀGINA	1 DE 1

PROYECTO Y/O PROCESO: CONSORCIO VIAL ODISEO M1

TOMO	NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A	NÚMERO RADICACIÓN	FECHA RADICACIÓN	REQUIERE RESPUESTA	FECHA DE LA RESPUESTA	CONSECUTIVO DE RESPUESTA	ASUNTO / REFERENCIA	OBSERVACIONES
	CVODM1-2218-2023	viernes, 8 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECION SE SIETE FICHAS PREDIALES	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	viernes, 8 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2219-2023	viernes, 8 de septiembre de 2023	VEEDURIA CIUDADANA	INVITACION REUNION VEEDURIA CIUDADANA	SR- JESUS ALBERTO AVILA REPRESENTANTE LEGAL- BALNCA SOLENA DE ROMERO- VICEPRESIDENTE- RUTH YENIFER DUQUE SECRETARIA	NA	ENVIARDO POR LAS SOCIALES -POE WHARSAPP	NO				
	CVODM1-2220-2023	sábado, 9 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	EN ATENCION AL COMUNICADO 20231150-2089 MEDIANTE LA CUAL SE PRESENTA LA HV DEL INGJUAN ANDRES DIAS COMO APOYO PROYECTOS SOCIALES	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	lunes, 11 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2221-2023	sábado, 9 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD AL CONTRATISTA DE OBRA ATENCION A LA CORRESPONDENCIA DE INVIAS 2023S-VBOG 002286 REITERACION DEL COMUNICADO CVODM-2161-2023 REFERENTE AL PLAN DE INVERSION PREDAL No 3	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	lunes, 11 de septiembre de 2023	si	miércoles, 6 de septiembre de 2023	2023S-VBOG-002286	SOLICITUD DE ACLARACION DEL TRASLADO PRESUPUESTAL DE LA BOLSA PREDIAL	
	CVODM1-2222-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD A LAS OBSERVACIONES EMITIDAD POR L ESPECIALISTA HIDRAULCA A LA INFORMACION RADICADO 20221150-1234	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2223-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLCITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES EITIDAD POR LA ESPECIALISTA HIDRAULICA A LA INFORMACION SEGU RADICADO 20231150-1826	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2224-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAD POR LOS ESPECIALISTA HIDRUALICA A LA INFORMACION RADICADA 20231150-1827	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2225-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMISION COMUICADO INVIAS 2023S-VBOG-003532 REFERENTE A LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS DE LA PREACTA AMBIENTAL No 29	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	SI	martes, 12 de septiembre de 2023	2023S-VBOG-003532	RESPUESTA AL RADICADO No 2023E-VUVRAZ-005918 PREACTA 29 INVERSION AMBIENTAL	
	CVODM1-2226-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDD POR LA ESPECIALISTA EN HIDRAULICA DE ACUERDO AL COMUNICADO 20231150-906 DEL 2022	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2227-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME DEL ESTAO DE LOS COMPROMISOS REALIZADOS EN EL ACTA DE REUNION No 151 DEL 2 Y 3 DE JUNIO CON LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE GUARATO	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	martes, 12 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2228-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RESPUESTA A COMUNICADO SS41482 OBSERVACIONES AL INFORME TRIMESTRAL No 8 DEL AREA DE SOSTENIBILIDAD	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	martes, 12 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2229-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	OBSERVACIONES GENERADOAS AL COMUNICADO No 20231150-2067 CON ESTUDIO Y DISEÑOS PROYECTO AULA BACHILLERATO RURAL DE LA VERDA DE TAIBA	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2230-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLCITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES GENERADAS No 20231150-2095 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON ASUNTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE REGADEROS DE LA VEREDAD DE REGADEROS	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2231-2023	martes, 12 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMISION DE PREACTA SOCIAL Y PREDIAL No 28	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	na	martes, 12 de septiembre de 2023	si	martes, 17 de octubre de 2023	2023S-VBOG-013037	RESPUESTA AL COMUNICADO CVODM1-2231-2023 CONCEPTO DE COMFORMIDAD REATA SOCIAL No 28 y PREACTA PREDIAL No 28	

GRUPO POSSO S.A.S

CORRESPONDENCIA ENVIADA

VERSIÓN	5
FECHA	7/02/2022
PÁGINA	1 DE 1

PROYECTO Y/O PROCESO: CONSORCIO VIAL ODISEO M1

TOMO	NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A	NÚMERO RADICACIÓN	FECHA RADICACIÓN	REQUIERE RESPUESTA	FECHA DE LA RESPUESTA	CONSECUTIVO DE RESPUESTA	ASUNTO / REFERENCIA	OBSERVACIONES
	CVODM1-2232-2023	miércoles, 13 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	APROBACION DE TREINTA (30) ACTAS DE VECINDAD DE INICIO CORRESPONDIENTES A PREDIS UBICADOS EN EL SECTOR DE LA CANCHA DE PIEDRAS DE BACHOCHI DEL MUNICIPIO PUEBLO RICO MEDIANTE OFICIO 202311502080	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2233-2023	jueves, 14 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION INFORME SEMANAL No 130 MD 1	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	NA	jueves, 14 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2234-2023	viernes, 15 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE TOMA DE MEDIDAS ADECUADAS PARA TRABAJOS DE RIESGO EN EL PR41 DE LA RUTA 5003	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 15 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2235-2023	jueves, 14 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REITERACION SOLICITUD SEGURIDAD SOCIAL Y DOCUMENTOS DE PERSONAL DE LAS OPC	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 15 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2236-2023	jueves, 14 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RESPUESTA A CORRESPONDENCIA DE INVAS 2023-VBOG-002286 REFERENTE A LA GESTION PREDIAL	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023E-VUVRAZ-009939	jueves, 14 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2237-2023	lunes, 18 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMSION DE SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE MUMBU GINGARABA Y GUARATO (ASOCASAN)	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023E-VUVRAZ-010051	martes, 19 de septiembre de 2023	SI	lunes, 23 de octubre de 2023	2023S-VBOG-014289	REFERENTE A REUNIONES DEL 22 DE SEPTIEMBRE ASOCASAN EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
	CVODM1-2238-2023	lunes, 18 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE RESPUESTA SOBRE DERECHO DE PETICION DEL SEÑOR ONNY CESAR MANYOMA- TRABAJADORES DE LRC CONSTRUCCIONES IBARGUEN	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	martes, 19 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2239-2023	martes, 19 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMIISION ACTA DE COSTOS No 30 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO MD1	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	SIN RADICADO	martes, 19 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2240-2023	miércoles, 20 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION OFICIO 20231150-2136 APOYO EN LOS PROCESOS PRDIALES POR PARTE DEL INSTITUTO CON EL FIN DE HACER EL CIERRE PREDIAL	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	miércoles, 20 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2241-2023	miércoles, 20 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS (APU NP)	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	SIN RADICADO	miércoles, 20 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2242-2023	miércoles, 20 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	SOLICITUD DE TOMA DE MEDIDAS ADECUADAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE CAIDA PR44+480	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	miércoles, 20 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2243-2023	martes, 19 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION DE LA DEVOLUCION DE LA FICHA TECNICO SOCIAL JESUS ANTONIO CASTILLO - DE SANTA CECILIA	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	martes, 19 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2244-2023	jueves, 21 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION INFORME SEMANAL No 131MODULO 1	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	NA	jueves, 21 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2245-2023	miércoles, 20 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION ACTA D EAJUSTE DEFINITIVA No 29 CTO 1757- JULIO 2023	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	2023E-VUVRAZ-011099	miércoles, 20 de septiembre de 2023	SI				

GRUPO POSSO S.A.S

CORRESPONDENCIA ENVIADA

VERSIÓN	5
FECHA	7/02/2022
PÁGINA	1 DE 1

PROYECTO Y/O PROCESO: CONSORCIO VIAL ODISEO M1

TOMO	NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A	NÚMERO RADICACIÓN	FECHA RADICACIÓN	REQUIERE RESPUESTA	FECHA DE LA RESPUESTA	CONSECUTIVO DE RESPUESTA	ASUNTO / REFERENCIA	OBSERVACIONES
	CVODM1-2246-2023	miércoles, 20 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	EN ATENCION AL COMUNICADO 20231150-2135 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No 30	ING. JUAN SEBASTIAN RIVERA	na	viernes, 22 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2247-2023	jueves, 21 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMISION CONCEPTO DE LA ESPECIALISTA HIDRAULICA DE LA INTERVENTORIA AL VOLUMEN VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA - HIDRAULICA Y SOCAVACION PUENTE LA QUIEBRA Y SANTISIMA TRINIDAD SEGÚN RADICADO 20231150-2154	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 22 de septiembre de 2023	SI				
d	CVODM1-2248-2023	viernes, 22 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	EN ATENCION AL COMUNICADO 20231150-2134 REVISION HOJA DE VIDA INGENIERIA NENIFER MORENO VALENCIA - PARA EL CARGO DE PROFESIONAL AMBIENTAL	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 22 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2249-2023	viernes, 22 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMISION DE CONCEPTO DE NO OBJECION DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS JURIDICOS	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	sábado, 23 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2250-2023	viernes, 22 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMIISION CONCEPTO DE NO OBJECION DE FICHAS PREDIALES	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	sábado, 23 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2251-2023	sábado, 23 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMIISON COMUNICADO CVOD-204-2023 DONDE SE INFORMA LA SUSPENSION EN LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA A PARTIR DEL LUNES 25 SEPTIEMBRE 2023	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	SIN RADICADO	sábado, 23 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2251-2023	sábado, 23 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMIISON COMUNICADO CVOD-204-2023 DONDE SE INFORMA LA SUSPENSION EN LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA A PARTIR DEL LUNES 25 SEPTIEMBRE 2023	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	sábado, 23 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2252-2023	martes, 26 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	EN ATENCION AL RADICADO INVIAS 2023S- VBOG-000763 SE REMITE LOS FORMATOS SOCIALES ACTA DE RADICACION Y ACTUALIZACION SOCIAL DE PROYECTOS MASPSMN- IN 3-FR1 Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO MASPSMN1-ON-3- FR-2 ANEXOS INOFRME TRIMESTRAL No 9	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023E-VUVRAZ-012661	martes, 26 de septiembre de 2023	SI	lunes, 23 de octubre de 2023	2023S-VBOG-014291	CONCEPTO DE CONFORMIDAD INFORME TRISMESTRASL No 9 social	
	CVODM1-2253-2023	jueves, 28 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION INFORME SEMANAL No 132 MODULO 1	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	NA	jueves, 28 de septiembre de 2023	NO				
	CVODM1-2254-2023	jueves, 28 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEMORANDO INDIVIDUAL No 2023I-VBOG-000589 DEL OFICIO SS48196 REMISION DOCUMENTOS RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE APREMIO DE MULTA POR EL PRESUNTO INCUMOLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA DEREIVADAS DE LA GESTIONSOCIAL - ESTUDIOS Y DISEÑOS OPC	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO		jueves, 28 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2255-2023	jueves, 28 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECION DE UNA FICHA 1 PREDIAL	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023-VUVRAZ-017619	jueves, 28 de septiembre de 2023	SI	jueves, 5 de octubre de 2023	2023S-VBOG-013253	RESPUESTA A COMUNICADO CVODM1-2255-2023 VISTO DE NO OBJECION FICHA PREDIAL -222-DI-T13-CTCP	
	CVODM1-2256-2023	jueves, 28 de septiembre de 2023	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO	REMIISON CONCEPTO DE LA ESPECIALISTA HIDRAULICA DE LA INTERVENTORIA AL VOL VII ESTUDIOO DE HIDROLOGIA Y SOCAVACION TRAMOS K3+250- K3+525- K4+500- PR10+0050 A PR10+0550 - PR10+0850 A PR10+090- PR12+0160 A PR12+0310- K24+669 A K24+775 K24+875 A K25+004- K25+155 A K25+608 RADICADO 20231150-2153	RAUL OSWALDO ARDILA URREGO DIRECTOR DE OBRA	NA	viernes, 29 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2258-2023	viernes, 29 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	COMUNICADO 20231150-2150 NOTIFICACION DE RETIRO DE MAQUINARIA Y PERSONAL DE OBRA DEL PR51+100 DE LA RUTA 5002 PEÑAS OLVIDO	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	2023E-VUVRAZ-014043	viernes, 29 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2259-2023	viernes, 29 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 2023S-VBOG-003532 Y REMISION DE PREACTA AMBIENTAL No 30	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	lunes, 2 de octubre de 2023	si				

GRUPO POSSO S.A.S	**CORRESPONDENCIA ENVIADA**	VERSIÓN: 5 FECHA: 7/02/2022 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO Y/O PROCESO: CONSORCIO VIAL ODISEO M1

TOMO	NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A	NÚMERO RADICACIÓN	FECHA RADICACIÓN	REQUIERE RESPUESTA	FECHA DE LA RESPUESTA	CONSECUTIVO DE RESPUESTA	ASUNTO / REFERENCIA	OBSERVACIONES
	CVODM1-2260-2023	viernes, 29 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PREACTA SOCIAL No 30	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	SIN RADICADO	viernes, 29 de septiembre de 2023	SI	lunes, 30 de octubre de 2023	2023S-VBOG-016124	CONFORMIDAD PREACTA No 30 SOCIAL CONTRATO 1757	
	CVODM1-2261-2023	viernes, 29 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ACTA PARCIAL DE OBRA No 30 DE AGOSTO 2023 CONTRATO No 1757-2020	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO	SIN RADICADO	viernes, 29 de septiembre de 2023	SI				
	CVODM1-2262-2023	viernes, 29 de septiembre de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBEJCION DE UNA (1) FICHA PREDIAL 265 D-T15-CTCP	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL	2023-VUVRAZ-014119	sábado, 30 de septiembre de 2023	SI				

	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2086	viernes, 1 de septiembre de 2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVODM1-2202-2023 REFERENTE A LA SOLICITUD DE COMITÉ PARA EL MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2089	sábado, 2 de septiembre de 2023	HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE APOYO A ESTRUCTURACION DE PROYECTOS SOCIALES-JUAN ANDRES DIAZ	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2087	viernes, 1 de septiembre de 2023	ENTREGA DE ESTUIDOS Y DISEÑOS DEL SECTOR REGADEROS 16+000 RUTA 5003 SE TIENE VOLUMEN V ESTUDIO D EESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES DEL SITIO CRITICO EL VOLUMEN VIII ESTUDIO YU DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LA REHABILITACION DEL PUENTE REGADERO CON SU RESPECTIVA MEMORIA DE CALCULO	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2044	martes, 5 de septiembre de 2023	RADICACION DE 8 PROCESOS PREDIALES FINALES AJUSTADOS CON FORME LO SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2088	martes, 5 de septiembre de 2023	ALERTA POR AFECTACIONES EN EL SECTOR PR12+700 RUTA 5002	Archivo fisico				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2090	martes, 5 de septiembre de 2023	CONSULTA ACERCA DEL ESTADO DE VISTO BUENO DE NO OBJECION DE LA MINUTA DE ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PASAIVO PREDIAL DE LA FICHAS 054-D-T2-CTP Y ASI MISMO DE LA INTENCION DE SANEAMIENTO AUTOMATICO PARA EL MISMO EXPEDIENTE	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2091	lunes, 4 de septiembre de 2023	REMISION DE IFNORME GESTION SOCIAL AGOSTO 2023	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2092	lunes, 4 de septiembre de 2023	REMISION PAZ Y SALVO OBRAS CORREGIMIENTO DE GUARATO ACTA DE REUNION INVIAS No 151	Archivo fisico				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2093	martes, 5 de septiembre de 2023	IMPEDIMENTO PARA TRABAJAR EN EL SECTOR DE PEÑAS DEL OLVIDO PR61+100 RUTA 5002 POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE MUMBU - GINGARABA Y GUARATO	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2095	martes, 5 de septiembre de 2023	MEJORAMIENTO DE LA ESCUAL DE REGADEROS DE LA VEREDA DE REGADEROS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2096	martes, 5 de septiembre de 2023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL SG-SST- No 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2097	martes, 5 de septiembre de 2023	RESPUESTA A S OFICIO CVODM1-2198 2023 SOLICITUD DE INFORMAICON DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL Y CIERRE PQR CONTRACTUALES	Archivo fisico				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2098	martes, 5 de septiembre de 2023	REMISION DE OFERTAS FORMALES DE COMPRA E INSCRIPCION DE OFERTA AJUSTADA SEGÚN OBSERVACIONES DEL OFICIO CVODM1-2209-2023	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2099	martes, 5 de septiembre de 2023	SE ENTREGA VOLUMEN III GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA PUENTE CERTEGI PR56+400 RUTA 5002	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2100	miércoles, 6 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-1860-2023 CON ASUNTO REMISIÓN CONCEPTO EN GEOTECNICA PARA EL BOX CHUPADERO LOCALIZADO EN EL PR 29+455 DE LA RUTA 5003 SE ENTREGA VL IV ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES BOX CULVER CHUPADERO PR29+455- DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2101	miércoles, 6 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-1872-2023 ASUNTO REMISION CONCEPTO GEOTENCICO PARA LOS PONTONES DEL PR K19+135 Y K19+365 DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2102	miércoles, 6 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIN CVODM1-1872-2023 REMISION CONCEPTO GEOTENCICO PARA LOS PONTONES PR K19+135 Y K19+365 SE ENTREGA VOLUMNE IV ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FUNDICIONES DE PUENTES OBRAS DE DREANJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION PONTONES	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2104	miércoles, 6 de septiembre de 2023	INFORME DE GESTION DE CALIDAD MES AGOSTO 2023	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2109	miércoles, 6 de septiembre de 2023	INVITACION A REUNION INFORMATIVA	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2110	miércoles, 6 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN REMISION DE CONCEPTO GEOTECNICO PARA SEMIVIADUCTO DEL PR61+100 (K58+400) SE ENTREGA VOLUMEN III GEOLOGIA PARA INGENIEIRA Y GEOTENCIA SEMIAVIADUCTO PEÑAS DEL OLVIDO PR61+(58+400) RUTA 5002 DOCUMENTOS FIRMADOAS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2111	miércoles, 6 de septiembre de 2023	ATECNION A COMUNICACIÓN REMISION DEL CONCEPTO GEOTENCICO PARA SEMIVIADUCTO DEL PR61+100 (K58+400) RUTA 5002 SE ENTREGA VOLUMEN IV ESTUDIO DE SEULOS ARA EL DISEÑO DE FUNDICIONES DE PUENTE OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTURCTURAS DE CONTENCION - SEMIVIADUCTO PEÑAS DEL OLVIDO PR61+ (58+400) DOCUMENTOS FIMRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2113	jueves, 7 de septiembre de 2023	ENTREGA DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA 70% AVANCE D EOBRA	Archivo fisico				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2114	jueves, 7 de septiembre de 2023	ATENCION AL COMUNICADO CVODM1-1172-2023 REMISION DE LA APROBACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL BOX CULVERT CHUPADEROS RADICADO 20221150-1251 ENTREGA VOL VIII ESTUDUIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS BOX CULVER CHUPADERO PR29+455	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2115	jueves, 7 de septiembre de 2023	ATENCION AL COMUNICADO CVODM1-1604-2023 REMISION CONCEPTO ESTRUCTURAL AL DISEÑO DE LOS PUNTOS CRITICOS PRIORIZADOS RUTA 5003 ADICION NO 2 (MONTO AGOTABLE) RADICADO 20231150-1551 ENTREGA VOLUMEN VIII ESTUDUI Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS SITIOS CRITIOCS PR57+870- PR50+350, PR48+400 PR45+450, PR47+550, PR44+430 Y PR42+210 DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2117	viernes, 8 de septiembre de 2023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 30 AGOSTO 2023	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2118	sábado, 9 de septiembre de 2023	RADICADO PROCESO INCLUSION APUS ITEMS NO PREVISTOS No 5	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2120	lunes, 11 de septiembre de 2023	ENTREGA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2127	viernes, 15 de septiembre de 2023	INFORMACION DE REACTIVACION TEMPORAL DE TRABAJO EN EL SECTOR DE PEÑAS DEL OLVIDO PR 61+100 RUTA 5002	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2130	viernes, 15 de septiembre de 2023	ENTREGA ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 29 JULIO 2023	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2134	lunes, 18 de septiembre de 2023	HOJA DE VIDA INGENIERIA AMBIENTAL JENNIFER MARENO	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2135	lunes, 18 de septiembre de 2023	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 30 AGOSTO 2023	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2136	lunes, 18 de septiembre de 2023	APOYO ENLOS PROCESOS PREDIALES POR PARTE DEL INSITUTO CON EL FIN DE HACER EL CIERRE PREDIAL DEL CONTRATO CON MIRAS A LA FINALIZACION DEL MISMO EL 30 DE NOV	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2137	lunes, 18 de septiembre de 2023	REMISON DE PROCESOS PREDIALES DEL CENTRO POBLADO DE GUARATO EL MARCO DEL OFICIO SS44956	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2138	lunes, 18 de septiembre de 2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVODM1-2193-2023 SOLICITUD ACTUALIZACION FORMATO ACTA D ERADICACION Y ACTUALIZACION SOCIAL PROYECTOS MASPSMN1-IN-3-FR1	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2142	martes, 19 de septiembre de 2023	REMISION DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE PROYECTO OPC CONSTRUCCION DEL ACCESOS EN PIEDRAS BACHICHI	Archivo fisico				

	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2144	martes, 19 de septiembre de 2023	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA D REGADEROS DE LA VEREDA DE REGADEROS					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2145	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ENTREA PROYECTO CANCHA DE FUTBOL DE PIDRAS BACHICHI	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2147	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-770-2022 CON ASNTO REMISION DE APROBACION DISEÑO ESTRUCTURALES PR13+600 PUENTE PIUNDA PR13+600 RUTA 5003 DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2148	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ATENCIONA COMUNICACION CVODM1-2179-2023 CON ASUSNTO REMISIN CONCEPTO ESTRUCTURAL DEK AJUSTE AL DISEÑO PR61+100 DE LA RUTA 5002 SEMIVIADUCTO SEGÚN INFORMACION DE LOS RADICADOS 20231150-2031 Y 20231150-2059 ENTREGA DE VOL VIII ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS SEMIVIADUCTO DEL OLVIDO PR61+100 RUTA 5002 DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2149	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACION CVODM1-1431-2022 CON ASNTO REMISION DE LA PAROBACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT TIPO PARA EL CORREDOR VIAL SOLICITUD DE FIRMAS Y VERIFICACION DE LOS ARCHIVOS Y ANEXOS DEL DISEÑO PARA EL ARCHIVO - ENTREGA VL VIII ESTUDIO Y DISEÑOS ESTRUCTURAS COBERTURAS O BOX CULVERT TIPO PARA EL CORREDOR VIAL	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2150	miércoles, 20 de septiembre de 2023	NOTIFICACION DE RETIRO DE MAQUINARIA Y PERSONAL PR61+100 RUTA 5002 SECTOR PEÑAS DEL OLVIDO POR SITUACION DE ORDEN PUBLICO	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2151	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-1037-2022 5 DE AGOSTO APROBACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PARA LA CONSTRUCCION EN EL CORREDOR PEREIRA CHOCO Y SOLICITUD DE LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS ENTREGA VOL VIII ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS OBRAS HIDRAULICAS QUE CORRESPONDIEN A ENCOLE Y DESCOLES TIPO PARA EL CORREDOR VIAL - DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2152	miércoles, 20 de septiembre de 2023	SE REMITE ENTREGA VOLUMEN VIII ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUTURAS BOX CULVERT 4X4 PR 15+675 RUTA 5003 DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2153	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-2224-2023 CON ASUNTO SOLICITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAD POR LA ESPECIALISTA HIDRAULICA A LA INFORMACION RADICADO No 20231150-1827	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2154	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ATENCION A SU COMUNICACIÓN CVODM1-223-2023 SOLICITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIAS POR ESPECIALISTA HIDRAULICA A LA INFORMACION RADICADO 20231150-1826 CORRESPONDE AL PUENTE SANTISIMA TRINIDAS Y LA QUIEBRA PR10+550 Y PR12+160	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2157	viernes, 22 de septiembre de 2023	COPIA DEL OFICIO RADICADO A AMPARO GONZALEZ: NOTIFICACION DE DESACFECTACION DEL PROCESO DE PREDIAL DEL PREDIO EL JARDIN VEREDA JAMARRAYA Y PAGO DE ARRENDAMIENTOS	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2158	viernes, 22 de septiembre de 2023	COPIA DEL OFICIO RADICADO A : DANILO MEJIA ARCILA . NOTIFICACION DE DESAFECTACION DEL PROECESO PREDIAL DEL PREDIO EL JARDIN VEREDA JAMARRAYA Y PAGO DE ARRENDAMIENTOS					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2159	viernes, 22 de septiembre de 2023	REMISION DEL INFORME DE DESAFECTACION PREDIAL DE LA SRA AMPRAO GONZALEZ MOSQUERA	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2164	viernes, 22 de septiembre de 2023	ATENCION A SU COMUNICACIÓN CVDOM1-1863-2023 DEL 21 DE ABRIL DEL 2023 CON AUSNTO SOLICITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES DEL CONCEPTO GEOTECNICO PARA LOSA EN VOLADIZO PR67+700 RUTA 5002	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2166	sábado, 23 de septiembre de 2023	COPIA DE COMUNICADO A LA LONJA DE PROEFESIONALES AVALUADORES LONPA . TERCER REQUIERIMIENTO POR GESTION DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION DE AVALUOS COMERCIALES No CMCH-09-2021 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO Y LONJA DE PROFRSIONALES AVALUDADORES LONPA					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2167	sábado, 23 de septiembre de 2023	COPIA DEL COMUNICADO RADICADO AL ING YEZID ALBERTO CHAMAT - TRASLADO DE COMUNICADO CVOD-204-2023 DONDE SE INFORMA DE LA SUSPENSION EN LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA A PARTIR DEL LUNES 25 SEPTIEMBRE 2025					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2170	lunes, 25 de septiembre de 2023	SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 1757-2020					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2171	lunes, 25 de septiembre de 2023	ENTREGA PORYECTO RECONSTRUCCION IGLESIA CORREGIMIENTO DE MUMBU	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2172	martes, 26 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVIDM1-2216 REMISION CONCEPTO HIDRAULICO VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA - HIDRAULICA RADICADO 20231150-1825 VOL VII PUNETE PIUNDA ENTREGA VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA - HIDRAULICA - Y SOCAVACION - PR13-+680 RUTA 5003 (DOCUMENTOS FIRMADOS)	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2173	martes, 26 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-1786-2023 DEL 22 DE MARZO DE 2022 CON ASUNTO REMISION HIDRAULICO RAD 20221150-1464 DEL 25 DE NOV ENTREGA DE VOLUMEN VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y SOCAVACION - BROCHERS PR13+680 AL PR 23 +812 RUTA 5003 (DOCUMENTOS FIRMADOS)	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2174	martes, 26 de septiembre de 2023	REMISION CONCEPTO DE LA ESPECIALISTA HIDRAULICA DE LA INTERVENTORIA AL VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA - HIDRAULICA Y SOCAVACION PUENTE LA QUIEBRA Y SANTISIMA TRINIDAD - RADICADO 20231150-2154 PUENTE SANTISIMA TRINIDAD PR10-400 (DOCUMENTOS FIRMADOS)					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2175	martes, 26 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVIDM1-2247 REMISION CONCEPTO HIDRAULICO VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA - HIDRAULICA VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA - HIDRAULICA -PUENTE LA QUIEBRA Y SANTISIMA TRINIDAD RADICADO 20231150-2154	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2176	martes, 26 de septiembre de 2023	ENTREGA DE VOLUMEN VI ESTUDIO DE HIDROLOGIA - HIDRAULICA Y SOCAVACION- BROCHE PR 10+679 PR 10+882 RUTA 5003 DOCUMENTOS FIRMADOS	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2177	martes, 26 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-2247-2023 REMISION CONCEPTO ESPECIALISTA HIDRAULICO AROBACION PUENTE CERTEGUI PR56+400 RUTA 1307 (DOCUMENTOS FIRMADOS)	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2178	martes, 26 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-2146-2023 DEL 8 DE AGOSTO DE 2023 CON ASUNTO SOLICITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES DE LA INFORMACION RADICADA BAJO COMUNICADO 20221150-1082 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL VOLUMEN HIDROLOGIA E HIDRAULICA SECTOR DESE DEL PR54 Y PR59 DE LA RUTA 5003	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2179	martes, 26 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-1540-2022 ASUNTO REMISION CONCEPTO DE APROBACION DEL ESPECIALISTA HIDRAULICO DE LA LOSA VOLADIZO DEL PR67+700 DE LRA RUTA 5002 RAD 20221150-1503 ENTREGA VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA HIDRAULICA Y SOCAVACION BROCHE 67+680 LOSA EN VOLADIZO RUTA 5002	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2181	martes, 26 de septiembre de 2023	ENTREGA DE PARCIAL DE DOCUMENTOS FALTANTES SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA AREA SST	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2182	martes, 26 de septiembre de 2023	REMISION DE 3 AVALUOS COMERCIALES PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2187	martes, 26 de septiembre de 2023	AJUSTE FICHA PREDIAL 222-DI-T13 -CTCP PEDRO PABLO PIEDRAHITA Y OTRO RESPUESTA AL COMUNICADO CVODM1-2250-2023	Archivo fisico				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2188	miércoles, 27 de septiembre de 2023	SOLICITUD CONCEPTO PARA REPOSICION E INSTALACION DE LA TUBERIA Y CONEXIÓN A BOCATOMA	NA				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2189	miércoles, 27 de septiembre de 2023	REMISION DE 2 AVALOS COMERCIALES PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	Archivo digital				

	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2193	jueves, 28 de septiembre de 2023	REMISION DE 2 AVALOS COMERCIALES PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	Archivo digital				
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2194	jueves, 28 de septiembre de 2023	ATENCION A COMUNICACIÓN CVODM1-1865-2023 REMSION DEL CONCEPTO GEOTECNICO PARA EL CORREDOR VIAL PR12+732- PR23+812 TRAMO 5003 SANTA CECILIA - ENTREGA DEL VOL III ESTUDIO GEOLOGIA PARA INGENIEIRA Y GEOTENCIA TRAMO 5003 PR12+732- PR23-812 (DOCUMENTOS FIRMADOS)					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2195	jueves, 28 de septiembre de 2023	ENTREGA VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDICONES DE PUENTES OBRAS DE DRAIANJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION -TRAMO PR12+732- PR23-812 RUTA 5003 (DOCUMENTOS FIRMADOS)					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2197	viernes, 29 de septiembre de 2023	APOYO EN LOS PROCESOS PREDIALES POR PARTE DEL INSTITUTO CON EL FIN DE HACER EL CIERRE PREDIAL DEL CONTRATO . CON MIRAS A LA FINALIZACION DEL CONTRATO EL 30 DE NOVIEMBRE					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2198	viernes, 29 de septiembre de 2023	RESPUESTA CARMELINO MANYOMA HURTADO					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2199	viernes, 29 de septiembre de 2023	RESPUESTA ONNY CESAR MANYOMA MURILLO					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2200	viernes, 29 de septiembre de 2023	REMISION CONCEPTO DE LA ESPECIALISTA HIDRAULICA DE LA INTERVENTORIA AL VOLUMEN VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2202	viernes, 29 de septiembre de 2023	EN ATENCION A SU COMUNICADO CVODM1-2185-2023 SOLICITUD DE ATENCION A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ESPECIALISTAEN GEOTECNIA EN LA INTERVENTORIA					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2203	viernes, 29 de septiembre de 2023	ACTA D EOBRA No 30 AGOSTO 2023					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2204	sábado, 30 de septiembre de 2023	REMISION DE 1 AVALUO COMERICIAL PARA REVISION PR PARTE DE LA INTERVENTORIA					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2205	sábado, 30 de septiembre de 2023	ENTREGA DE PROTOCOLO DE LA PRUEBA DE CARGA ESTATICA SOBRE EL PUENTE LOS ANGELES PR10+300 RUTA 50RS1					
	CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA DIRECTOR DE OBRA		20231150-2207	sábado, 30 de septiembre de 2023	REMISION DE ESTUDIOS DE TITULOS SEGÚN APROBACION Y VISTO BUENO DE NO OBJECION DE LAS FICHAS PREDIALES OFICIO CVODM1-2250-2023	Archivo digital				
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS JAIRO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD		2023S-VBOG-002286	miércoles, 6 de septiembre de 2023	RESPUESTA AL COMUNICADO CVODM1-2207-2023 REFERENTE A LA NO OBJECION DE TRASLADO DE RECURSOS EMITIDA MEDIANTE OFICIO SS49216	NA	lunes, 11 de septiembre de 2023	CVODM1-2221-2023	SOLICITUD AL CONTRATISTA DE OBRA ATENCION A LA CORRESPONDENCIA DE INVIAS 2023S-VBOG 002286 REITERACION DEL COMUNICADO CVODM-2161-2023 REFERENTE AL PLAN DE INVERSION PREDAL No 3	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS JAIRO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD		2023S-VBOG-003532	martes, 12 de septiembre de 2023	EN RESPUESTA A LA PREACTA AMBIENTAL No 29	NA	miércoles, 13 de septiembre de 2023	CVODM1-2225-2023	REMISION COMUICADO INVIAS 2023S-VBOG-003532 REFERENTE A LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS DE LA PREACTA AMBIENTAL No 29	
	DANILO MEJIA ARCILA PERSONERO MUNICIPAL PUEBLO RICO RISARALDA		QUEJA RECIBDA POR CORREO	miércoles, 6 de septiembre de 2023	QUEJA - SRA AMPARO GONZALEZ- JAVIER OSORIO	Archivo fisico				
	ICNEA ABOGADOS		DERECHO DE PETICION	lunes, 18 de septiembre de 2023	DERECHO DE PETICION LRC CONSTRUCCIONS SAS- ONNY CESAR MANYOMA MURILLO	Archivo fisico				
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS JAIRO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD		2023S-VBOG-005560	miércoles, 20 de septiembre de 2023	CONCEPTO DE NO OBJECION 4 ESTUDIOS TITULOS Y DIAGNOSTICOS JURIDICOS	NA				
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ALVARO ARANGO - SECRETARIO INVIAS		ENTREGA DE CAJAS	miércoles, 20 de septiembre de 2023	CERTIFICADO DE RECIBIDO 15CAJAS DE ARCHIVO TERRITORIAL INVIAS	15 CAJAS				
	JUZGADO PENAL DIECISEIS CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE MEDELIN		NOTIFICACIONDE TUTELA RAD 2023-00384	jueves, 28 de septiembre de 2023	NOTIFICACION DE TUTELA INSTAURADA POR EL SR CARMELINO MANYOMA HURTADO-(DE LA EMRESA LRC CONSTRUCCIONES)	Archivo fisico				

ANEXO 2



INSTALACION DE FORMALETA PARA MR45 PR14+250/325 RUTA 5003



INSTALACION DE MR45 PR14+250/325 RUTA 5003



INSTALACION DE MR45 PR14+250/325 RUTA 5003



EXCAVACION DE ZANJAS DE CORONACION PR41+100 RUTA 5003



EXCAVACION DE ZANJAS DE CORONACION PR41+100 RUTA 5003



EXCAVACION DE ZANJAS DE CORONACION PR41+100 RUTA 5003



PERFORACIONES PARA ANCLAJES PR14+950 RUTA 5003




PERFORACIONES PARA ANCLAJES PR14+950 RUTA 5003



PERFORACIONES PARA ANCLAJES PR14+950 RUTA 5003



CONCRETO LANZADO TALUD DE ANCLAJES PR41+100 RUTA 5003

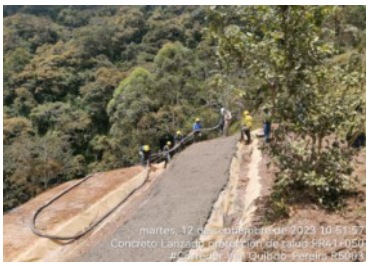

CONCRETO LANZADO TALUD DE ANCLAJES PR41+100 RUTA 5003



CONCRETO LANZADO TALUD DE ANCLAJES PR41+100 RUTA 5003



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003

ANEXO 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	8

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Capacitación ARL



Descripción: Capacitación ARL



Descripción: Recorrido visita comunidad Mumbú muro de contecnión y senderos ecologicos



Descripción: Recorrido visita de compensación interventoría, contratista, ingebiomas y especialistas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Instalación Planta PR 30+700 trituradora ruta 5003



Descripción: Instalación Planta PR 30+700 planta concretadora ruta 5003



Descripción: Planta PR 30+700 materiales ruta 5003



Descripción: Planta PR 30+700 materiales ruta 5003

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Señalizacion frentes de obra ruta 5003



Descripción: Señalizacion frentes de obra ruta 5003



Descripción: Señalizacion frentes de obra ruta 5003



Descripción: Señalizacion frentes de obra ruta 5003

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Conformación en el Zodme de Giabra PR 6+500 ruta 5003



Descripción: Conformación en el Zodme de Giabra PR 6+500 ruta 5003



Descripción: Prolongación alcanatrilla PR 9+500 ruta 5003



Descripción: Conformación en el Zodme del PR 9+500 ruta 5003

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Descapote Zodme PR 16+200 ruta 5003



Descripción: Descapote Zodme PR 16+200 ruta 5003



Descripción: Camaras de inspección en el Zodme PR 37 ruta 5003



Descripción: Conformación en el Zodme PR 37 ruta 5003

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Puntos ecologicos en obra



Descripción: Recolección de residuos sólidos en obra



Descripción: Limpieza de carreteras



Descripción: Se realiza pozo de lavado de mixer PR 37 + 400 Ruta 5003

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Riego de puntos criticos en obra ruta 5003 puente Chupaderos



Descripción: Riego de puntos criticos en obra Taiba



Descripción: Abastecimiento de agua en puntos de obra



Descripción: Mantenimiento de unidades sanitarias portatiles en obrra PR 24+000 Ruta 5003

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Instalación carpeta asfaltica PR 39+400



Descripción: Cereo PR 10+700



Descripción: Excavación prolongación de alcantarilla zodme PR 9+500



Descripción: Excavación terraza zodme PR 9+500

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	8	DE	8
		FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1757 DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL ODISEO	**CONTRATO N°**	CONTRATO 1832 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DELPACIFICO QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA #CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				



Descripción: Inspección compensación La Virginia



Descripción: Inspección compensación La Virginia individuos arboreos a sembrar



Descripción: Mantenimiento de epifitas.



Descripción: Acondicionamiento de cerreamiento.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.


jueves, 21 de septiembre de 2023 2:39:12 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5533


jueves, 21 de septiembre de 2023 2:30:38 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5530


sábado, 23 de septiembre de 2023 12:36:10 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5609


24/09/2023 9:23:03 a. m.
AUX. AMBIENTAL (Santiago Patiño)
consorcio megavias choco


24/09/2023 9:21:05 a. m.
AUX. AMBIENTAL (Santiago Patiño)
consorcio megavias choco


28/09/2023 12:31:45 p. m.
AUX. AMBIENTAL (Santiago Patiño)
consorcio megavias choco

Señalización PR 13 + 700



señalización PR 13 + 700







Señalización PR 4 + 00



Señalización PR 3 + 00



Señalización PEÑAS DEL OLVIDO



Señalización PEÑAS DEL OLVIDO











2. Instalación de señalización de obligación














jueves, 14 de septiembre de 2023 3:05:54 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5446


jueves, 14 de septiembre de 2023 2:51:10 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5440


jueves, 14 de septiembre de 2023 3:01:37 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5444


viernes, 15 de septiembre de 2023 5:13:08 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5461


jueves, 14 de septiembre de 2023 2:40:18 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5438


jueves, 14 de septiembre de 2023 2:38:38 p. m.
AUX SST (Yeferson Acevedo)
Número de índice: 5436

ANEXO 4

01 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en regulares condiciones. A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- Se realizan actividades de conformación de material sub6 en aproches de puente Los Ángeles en el PR10+730, ruta 5013D y se liberan niveles por topografía.
- PR10+270: no se ejecutaron labores en canales disipadores de puente Limones porque el proveedor de servicios no dispone de personal en obra. Adicionalmente, se observa que las actividades ejecutadas presentan acabados deficientes.
- PR44+480, ruta 5003: no se ejecutan actividades en pozos de abalimiento y caja de entrada en alcantarilla, sector El Cristo, porque el proveedor de servicios no dispone de personal en obra.
- PR41+050: continuan las labores de excavación en zanjas de conformación de talud. A la fecha se tiene la totalidad de los anclajes tensionados (246 anclajes). Fallas en los equipos de bombeo de concreto impiden realizar las pruebas de lanzados.
- PR38+380 al PR38+670, margen izquierdo: continuan las actividades de construcción de cunetas en concreto.

02 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR58+425, ruta 5002: continua la instalación de madera para formaleta y acero, losa en el semiviaducto de Peñas del Olvido.
- PR58+620: no se presentan actividades por parte del proveedor de servicios en box culvert, margen izquierdo, peñas del Olvido.
- PR09+300, ruta 5003: continua la conformación de material producto del corte en 20DME, margen izquierdo.
- PR14+305|400: se realiza liberación de formaleta para losa en concreto MR-45, margen derecho.
- PR14+500|600: continua la conformación de material granular tipo subbase granular para estructura losa en concreto MR-45, margen derecho.
- PR14+990: se observa llegada de maquinaria para retomar con la perforación de talud para anclajes y drenajes en el margen derecho.
- PR19+000: continua la remoción de material del corte de talud, margen derecho.
- PR20+250|277: se observa formaleta y acero losa de aproximación al puente Taibá quedando liberada para su instalación en margen derecho.
- PR29+600: se realizó el día anterior la instalación de concreto de 28 MPA en losa superior box culvert, sector Chapaderos, margen derecho.
- PR15+015: se realiza visita para actividades sociales quedando pendiente aprobación para actividades en zona ganado.

03 - 09 - 2023

Domingo: no se realizan actividades

04 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra.

- PR58+425, ruta 5002: continua la instalación de formaleta y acero para losa en semiviaducto con poco personal por parte del proveedor de servicios.
- PR58+620: excavación para box culvert finalizada: Sin iniciar la construcción por parte del contratista.
- PR09+300, ruta 5003: continua la conformación de material producto de la remoción del corte PR19+000 en 20DME margen izquierdo.
- PR14+305|372: continua la instalación de concreto MR-45 en losa, margen derecho.
- PR14+500|600: se realiza liberación de material granular tipo subbase, margen derecho.
- PR14+790|860: se libera formaleta para concreto MR-45 por parte de topografía, margen izquierdo.
- PR15+015 y 25+240: se realiza instalación de concreto de 28 MPA en guarda ruedas de box culvert y disipador, margen izquierdo.
- PR19+000: continua la remoción de material acopiado a un lado de la vía producto del corte de talud.

Powered by CamScanner

- PR20+250|277: se observa losa en concreto MR-45, instalado el día sábado en horas de la tarde, margen derecho.
- PR29+600: se observa al área de topografía realizando chequeo de niveles para aletas de box culvert.

05-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR58+470, ruta 5002: no se observa actividad en la instalación de formaleta y acero para losa faltante en semiviaducto por inconvenientes con la comunidad inconforme por incumplimientos por parte del INVIAS.
- PR58+620: excavación terminado sin iniciar actividades por parte del contratista en la construcción de box culvert, margen izquierdo.
- PR9+300: ruta 5003, sin actividad por parte del contratista en ZODME, margen izquierdo.
- PR13+686: se inicia con el armado de acero para new jersées en puente Piundó, margen derecho.
- PR14+790|860: se realiza la instalación de concreto MR-45 en losa, margen derecho.
- PR14+990: se observa perforadora en talud, margen derecho, para retomar la actividad de perforación para anclajes activos.
- PR19+000: continua la remoción de material que se encontraba acopiado a un costado de la vía producto del corte de talud, margen derecho.
- PR21+700: el contratista realiza actividad de obra social en predio del señor Gustavo Hincapié.
- PR29+450: inicia la excavación y llenos para aletas en box culvert, sector Chupaderos, margen derecho.

06-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR58+470 y 620, ruta 5002: continua la inactividad en obras de semiviaductos de Peñas del Olvido por inconvenientes con la comunidad por incumplimientos.
- PR04+250, ruta 5003: se realiza cajeo para mejoramiento, margen derecho iniciando con la conformación de material granular para llegar a un nivel de lecho drenante.
- PR9+300: sin actividad en el ZODME por la no llegada de material para su conformación.
- PR13+686: se observa al contratista iniciar con la instalación de acero para new jersies del puente Piundó, margen derecho.
- PR14+990: se realiza chequeo por parte de topografía para continuar con el corte de talud, margen derecho para la instalación de anclajes.
- PR20+250|277: se realiza instalación de berma con un ancho inferior al diseño, margen derecho.
- PR20+310|323,5: se instala concreto MR-45 en losa de aproximación reforzado para puente Taibá, margen derecho.
- PR21+985|22+057: se inicia con la instalación de formaleta para losa en concreto MR-45, margen derecho.
- PR29+600: se observa instalación de solado de limpieza y excavación para aleta izquierda de box culvert, en el sector Chupaderos, sin iniciar con el armado de acero.

07-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR58+470 y 620, ruta 5002: continua la inactividad de las obras en semiviaducto Peñas del Olvido por inconvenientes con la comunidad por incumplimientos.
- PR4+250, ruta 5003: se realiza conformación de material granular tipo lecho drenante en ambos costados.
- PR9+300: inicia la excavación para instalación de tubería para manejo de aguas en ZODME, margen izquierdo.
- PR13+686: inicia la instalación de formaleta para new jersies en el puente Piundó.
- PR14+372|429: continua la instalación de concreto MR-45 en losa

Powered by CamScanner

margen derecho:
- PR14+990: se inicia con el corte de talud para continuar con la perforación e instalación de anclajes activos en margen derecho.
- PR21+985|22+057: se realiza liberación por parte de topografía de formaleta para concreto MR-45, losa margen derecho.
- PR29+600: se realiza liberación de niveles y acero solera, aleta izquierda del box culvert de Chupaderos instalando el concreto 28 MPA en solera izquierda.

08-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR58+470 y 620, ruta 5002: inactividad en losa del semiviaducto y del box culvert. La comunidad del sector realiza paro por los incumplimientos de los acuerdos pactados con el INVIAS.
- PR04+250, ruta 5003: se observa la conformación de subbase granular, realizando la liberación por parte de topografía, margen derecho.
- PR9+300: continua la excavación e instalación de tubería y solado para manejo de aguas en 2DDME, margen izquierdo, sector Itauri.
- PR13+686: se realiza instalación de concreto 28 MPA en new jersies, margen derecho del puente Piundó, realizando conformación de subbase granular en aproches.
- PR14+429|506: continua la instalación de concreto MR-45 en losa, margen derecho.
- PR14+990: continua el corte y perforación de terraza para anclajes, realizando la marcación por parte de topografía para iniciar con la perforación del talud, margen derecho.
- PR21+990|22+057: se observa desencofrado de formaleta en losa instalada el día de ayer, en buen estado debido al paso restringido de vehiculo pesado.

09-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR58+470 y 620, ruta 5002: continua la inactividad en obras del semiviaducto Peñas del Olvido por inconvenientes con la comunidad por incumplimiento de los compromisos pactados.
- PR04+250, ruta 5003: se realiza conformación de material granular tipo subbase granular en ambos carriles.
- PR9+300: continua la excavación para instalación de tubería de 36" para manejo de aguas, realizando instalación de solado.
- PR13+686: se observa instalación de formaleta para new jersies, margen derecho del puente Piundó, se programa la instalación del concreto para el día de mañana.
- PR14+480|520: se realiza liberación de formaleta para losa en concreto MR-45, margen derecho.
- PR14+990: continua el corte de talud para terraza de anclajes activos, margen derecho, realizando acopio de material a un lado de la vía con paso provisional a un solo carril.
- PR21+985|22+057: se realiza instalación de concreto MR-45 en losa margen derecho, la cual se deja en observación. El sector queda con paso restringido para vehiculos pesados.
- PR29+600: se realiza desencofrado de solera, continuando con la figuración de acero para continuar con la construcción de box culvert, margen derecho, sector Chupaderos.

10-09-2023

Domingo: no se realizan actividades.

11-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- Ruta 1307: se tenia programado visita al sector Cértegui, no obstante, la visita no se lleva a cabo porque el contratista informa cese de actividades debido a grupos al margen de la ley.

Powered by CamScanner

- Ruta 5002, PR58+470|620: continua la inactividad en obras en semiviaducto debido a paro de la comunidad del sector por incumplimientos de los compromisos pactados.
- PR04+250, ruta 5003: no se realizan actividades en aproches, puente de La Unión.
- PR9+300: continuan las actividades en ZODME, margen izquierdo, conformación de material, excavación e instalación de tubería para manejo de aguas.
- PR13+620|731: continua la conformación de material granular en aproches del puente Piundá, iniciando con el desencofrado de new jersies, margen derecho.
- PR14+320|620: se realiza liberación de formaleta para concreto MR-45 en losa del margen derecho, por parte de topografía.
- PR14+990: se retoma la perforación de talud para anclajes, realizando la remoción de material producto del corte con destino al ZODME.
- PR18+900: se inicia excavación manual para canal disipador del descole en la alcantarilla del margen izquierdo.
- PR29+600: se observa armado de acero longitudinal e instalación de formaleta para aleta izquierda del box culvert, sector Chupaderos.

12-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR58+470, ruta 5002: continua la instalación de formaleta para losa del semiviaducto Peñas del Olvido, quedando pendiente la liberación para concreto en sección 1, losa.
- PR1+300, ruta 5003: se realiza la conformación para lleno en obra social de la cancha de Piedras Bachichi.
- PR04+250: sin actividad en aproches del puente La Unión.
- PR13+686: se inicia con la instalación de formaleta para andén del margen izquierdo en el puente Piundá.
- PR13+693|731: se realiza liberación de material granular tipo subbase granular costado derecho en el aproche del puente Piundá.
- PR14+730|750: se observa conformación de subbase para terraplen cuneta, margen izquierdo.
- PR14+990: continua el corte de talud y perforación para anclajes activos en margen derecho.
- PR18+900: continua la excavación y conformación de terreno para canal disipador, descole del margen izquierdo.
- PR29+600: se realiza chequeo de formaleta para sección de aleta en margen izquierdo, realizando instalación de concreto 28 MPA.

13-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR58+470 ruta 5002: se realiza liberación de tramo de losa de semiviaducto, iniciando con la instalación de concreto de 28 MPA con adición de fibra en losa, margen derecho.
- PR01+300, ruta 5003: se observa llegada de material para lleno en cancha de obra social.
- PR4+250: sin actividad en aproches del puente La Unión.
- PR9+300: no se realiza actividad en conformación, ni en cajas de inspección en ZODME, se observa el cargue de material del ZODME para el lleno en obra social de Piedras Bachichi.
- PR13+620|667: continua la conformación de subbase granular en aproche, margen derecho del puente Piundá, continuando con la instalación de formaleta del andén, margen izquierdo.
- PR14+990: continua la perforación y corte en talud, margen derecho, para los anclajes activos.
- PR18+900: se observa excavación para canal disipador, margen izquierdo en caja de descole terminada. A la espera para instalar concreto en solado.
- PR29+600: se observa formaleta en realce de la aleta izquierda en box culvert, margen derecho, del sector Chupaderos.

Powered by CamScanner

14 - 09 - 2023

Clima durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR58 + 470, ruta 5002: se realizó instalación de concreto 28 MPA con adición de fibra en losa del semiviaducto, iniciando la conformación de subbase en aproche del semiviaducto.
- PR01 + 300, ruta 5003: continua la actividad de conformación de material para estructura de obra social de la cancha de futbol de Piedras Bachichi.
- PR4 + 250: sin actividad en aproches en puente de La Unión.
- PR9 + 300: no se realiza actividad en 2DME en conformación, ni excavación para cajas de inspección de tubería para manejo de aguas.
- PR13 + 620 | 670: se realiza liberación de subbase granular en aproche del puente Piundá, por topografía y se realiza la toma de densidades en margen derecho.
- PR13 + 686: se observa formaleta para andén en puente Piundá, margen izquierdo.
- PR14 + 506 | 618,5: continua la instalación de concreto MR-45 en losa, margen derecho.
- PR14 + 990: continua con el corte de talud, perforación e instalación de forones en el margen derecho.
- PR18 + 990: sin actividad en canal disipador del descole, margen izquierdo.
- PR29 + 450: se observa el descencofrado de realce de aleta izquierda, iniciando con la excavación para solera de la aleta, margen derecho, continua la demolición de roca existente en box culvert del sector Chupaderos.

15 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado; con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR44 + 480, ruta 5003, sector El Cristo: se reanudan las actividades de excavación en pozos de estabilimento.
- PR45 + 050: continuan las labores de excavación en zanjas de coronación en talud, se inician las actividades de excavación de canal disipador, también se realizan labores de lanzado de concreto para protección de talud, margen derecho.
- PR29 + 450, ruta 5003: se instala acero de refuerzo en losa solera y aleta derecha del box culvert, sector Chupaderos.

16 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR56 + 700, ruta 1303: se realiza instalación de concreto en losa de aproximación en puente Cértegui, estribo # 2.
- PR58 + 470, ruta 5002: continua la conformación de material granular en aproche de semiviaducto en Peñas del Olvido, margen derecho. Sin actividad en box culvert, margen izquierdo.
- PR04 + 250, ruta 5003: sin actividad en aproches del puente Piundá por parte del contratista.
- PR9 + 300: sin actividad en obras y conformación del 2DME, margen izquierdo.
- PR13 + 686: aproches en puente Piundá ya liberados se encuentran sin actividad. Formaleta para andén puente liberada, a la espera de que Concreaceros instale los tornillos para los barandas aguas abajo, margen izquierdo.
- PR14 + 251 | 335 y PR14 + 817 | 832: continua la instalación de concreto MR-45 en berma cuneta margen derecho e izquierdo.
- PR14 + 990: continua la perforación para anclajes y remoción de material producto del corte con destino al 2DME.
- PR18 + 900: sin actividad en canal disipador en caja de descole de alcantarilla, margen izquierdo.
- PR29 + 450: se observa instalación de acero y formaleta para solera de aleta derecha en box culvert, en el sector Chupaderos, continuando con la demolición de la roca.

Powered by CamScanner

17-09-2023

Domingo: no se realizan actividades

18-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta una mañana soleada, mientras en la tarde estuvo nublado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR01+300: se observa a la comisión de topografía realizando marcación de niveles para los filtros de la cancha de Piedras Bachechi.
- PR4+250: sin actividad en aproches de puente La Unión.
- PR9+300: se retoma, por parte del contratista, la conformación de material en 200ME, margen izquierdo.
- PR13+686: sin actividad en el puente Piundaí.
- PR14+990: no se realiza actividad ni corte, ni perforación para anclajes en talud, margen derecho.
- PR15+015: se inicia con la conformación para canal disipador de descole en box culvert 4x4 y obra social de pasa-guardado.
- PR18+900: sin actividad en canal disipador para caja de descole en alcantarilla, margen izquierdo.
- PR19+217,5|255: se realiza instalación de concreto MR-45 en berma cuneta, margen derecho.
- PR21+900: el contratista realiza instalación de concreto en solado del canal disipador para obra social del predio del señor Gustavo Hinscapié.
- PR29+600: se realizó la instalación de solera en concreto 28 MPA, iniciando con la instalación de formaleta para muro de la aleta derecha del box culvert, sector Chupaderos.

19-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR58+451,26|475,70, ruta 5002: se realiza la instalación de concreto 28 MPA con adición de fibra en losa semiviaducto del sector Peñas del Diudo.

- PR58+620: se realiza instalación de concreto 28 MPA en losa inferior del box culvert de 1,5 x 1,5 en el margen izquierdo del semiviaducto.
- PR4+250, ruta 5003: sin actividad en aproches del puente La Unión.
- PR9+300: sin actividad en 200ME, sin llegada de material en el sector Itaroi.
- PR13+693|731: se realiza liberación de formaleta para aproches en puente Piundaí, margen derecho, sin actividades en andén y new jersies del puente.
- PR15+015: se realiza actividad en cajas de encole y descole del box culvert 4x4.
- PR21+900: continua la actividad en el predio del señor Gustavo Hinscapié (obra social).
- PR29+450: inicia la instalación de filtro y lleno estructural, continuando con la instalación de formaleta para muro lateral, margen derecho, box culvert 4x4.

20-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR1+300; ruta 5003: continua la conformación de material para cancha en Piedras Bachechi.
- PR4+250: sin actividad en aproches en puente La Unión.
- PR9+300: no se realiza actividad en conformación de material producto de cortes y derrumbes en 200ME, margen izquierdo.
- PR13+620|667: inicia la instalación de formaleta para concreto MR-45 en losa de aproche, aguas abajo del puente Piundaí.
- PR13+693,4|730,8: se realiza instalación de concreto MR-45 en losa del aproche puente Piundaí.
- PR15+015: continuan las actividades en canal de cajas de encole y descole para box culvert 4x4.
- PR29+450: se realizó instalación de concreto 28 MPA, en muro aleta derecha del box culvert, sector Chupaderos. Continua el lleno e instalación de filtro.

Powered by CamScanner

21 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR01+300: ruta 5003: se inicia con la excavación e instalación de filtro en obra social de la concha de Piedras Bachichi, margen izquierdo.
- PR4+250: se realiza la instalación de formaleta para losa en concreto MR-45 en aproche del puente La Unión, margen derecho.
- PR9+300: sin actividad en el ZODME, margen izquierdo.
- PR13+620|667: continua la instalación de formaleta y amarre de acero en losa aproche del puente Piundá, margen derecho.
- PR15+015: sin actividad en canal en encole y descole del box culvert 4x4.
- PR18+900: se observa instalación de acero para canal disipador en descole, margen izquierdo, realizando la instalación de concreto 28 MPA de losa inferior.
- PR21+700: continua la construcción del canal en el predio del señor Gustavo Hurcapié. (obra social)
- PR29+450: el contratista continua con el lleno estructural e instalación del filtro en box culvert del sector Chupaderos.

22 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR01+300, ruta 5003: continua la excavación e instalación de filtro en concha Piedras Bachichi, obra social DPC, margen izquierdo.
- PR4+250: se realiza liberación de formaleta en aproche del puente La Unión, para instalación de concreto MR-45, margen derecho.
- PR9+300: no se realiza conformación en ZODME, margen izquierdo. Maquinaria en obra sin actividad.
- PR13+677,2|667,5: se realiza instalación de concreto MR-45 en losa de los aproches, puente Piundá, margen derecho.
- PR14+990: no se realiza actividad por parte del contratista, en anclajes a falta de inyección para realizar izaje de dovela.
- PR15+015: sin actividad en encole y descole en box culvert 4x4
- PR18+900: no se observa actividad en canal disipador descole de la alcantarilla, margen izquierdo.
- PR21+938|22+054,8: se realiza instalación de concreto MR-45, en berma cuneta, margen derecho.
- PR29+450: continua la instalación de filtro y lleno estructural en box culvert 4x4, sector Chupaderos.

23 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presento un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR44+460 al PR44+580, ruta 5003: se realizan actividades de conformación de capa de base granular.
- PR44+480, ruta 5003: continuan las labores de excavación en pozos de abatimiento, sector El Custo.
- Se realizan extracciones de núcleo en concreto asfáltico para toma de ensayos de densidades.
- PR41+050, ruta 5003: continuan las actividades de excavación en zanjas de coronación y canal disipador en el talud.
- PR41+050, ruta 5003: continuan las actividades de lanzado de concreto con malla electrosoldada para protección de talud.

24 - 09 - 2023

Domingo: no se realizan actividades en campo.

25 - 09 - 2023

Lunes: se realizan actividades en campo en todos los frentes activos de obra.

Powered by CamScanner

26 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR 1 + 300: continua la excavación e instalación de filtro en concha ubicada en Piedras Bachichi, OPC social.
- PR 4 + 250: se realizó instalación de concreto MR-45 en losa aproche del puente La Unión, margen derecho.
- PR 9 + 300: sin actividad en ZODME, sector Itauri; maquinaria en obra sin actividad.
- PR 13 + 686: se realizó la instalación de concreto 28 MPA en el andén del puente Piundá, iniciando con la instalación de formaleta para new jersey, margen izquierdo.
- PR 14 + 355 | 445: se realiza instalación de concreto MR-45 en berma cuneta, margen derecho.
- PR 14 + 520 | 620: se instala formaleta para berma y se realiza imprimación de material granular, margen derecho.
- PR 14 + 990: se realiza inyección de concreto en perforaciones para bulbo de anclajes de talud, margen derecho
- PR 29 + 450: se realiza demolición de portón existente para construcción de box culvert, sector Chupaderos, margen izquierdo.

27 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR 1 + 300: continua la excavación e instalación de filtro para obra social ubicada en Piedras Bachichi (concha).
- PR 4 + 280: se realiza conformación de subbase granular tipo subbase en aproches del puente Piundá.
- PR 9 + 300: sin actividad en ZODME, sector Itauri.
- PR 13 + 686: se realizó la instalación de concreto 28 MPA en andén y new jersey, margen izquierdo del puente Piundá.

- PR 14 + 520 | 618.5: se realiza instalación de concreto MR-45 en berma cuneta, margen derecho.
- PR 14 + 990: sin actividad en talud, no se realiza inyección en perforaciones para anclajes, margen derecho.
- PR 15 + 015: se realizó instalación de concreto de 14 MPA en encole y descole del box culvert 4x4. y paso ganado (obra social).
- 21 + 700: continua la construcción de canal para manejo de aguas, obra social en el predio del señor Gustavo Hincapié.
- PR 29 + 450: se observa remoción terminada para continuar con la construcción de box culvert, sector Chupaderos, margen izquierdo.

28 - 09 - 2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se menciona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:

- PR 10 + 710, ruta 50R501: se realiza chequeo de niveles y se libera por topografía capa base granular en aproches de puente Los Ángeles.
- PR 10 + 250, ruta 50R501: se retoma las actividades de construcción del canal disipador de puente Limones.
- PR 44 + 480, ruta 5003: continuan las actividades de excavación en pozos de alcantarillado en el sector El Cristo.
- PR 41 + 050, ruta 5003: se realizan labores de instalación de malla electrosoldada para actividades de concreto lanzado de protección de talud.
- Se instala concreto en cunetas desde el PR 38 + 800 al PR 38 + 880, margen derecho.
- PR 1 + 300: continua excavación e instalación de filtro en obra social de la concha, ubicada en Piedras Bachichi.
- PR 4 + 280: continua la conformación de subbase granular en aproche puente La Unión, aguas arriba, margen izquierdo.
- PR 9 + 300: sin actividad en el ZODME del sector Itauri, maquinaria en la obra sin actividad.
- PR 13 + 686: se realiza el desencofrado de new jersey, margen izquierdo del puente Piundá.

Powered by CamScanner

- PR 14 + 445 / 520: continua la instalación de concreto MR-45 en bermo cuneta, margen derecho.
- PR 14 + 990: sin actividad en talud. No se realiza inyección, ni perforación para anclajes, margen derecho.
- PR 15 + 015: continuan las actividades de encole y descole en box culvert 4x4.
- PR 29 + 450: continua la demolición y conformación para continuar con la construcción del box culvert, en el sector Chupaderos, margen izquierdo.

30-09-2023

Clima: durante la jornada laboral se presento un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se mencona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR 1 + 300: continua la excavación e instalación de filtro en obra acual de la concha de Piedras Bachichi.
- PR 4 + 280: se realiza liberación de material granular tipo subbase por parte de topografia para el inicio de instalación de concreto MR-45, losa margen izquierda.
- PR 4 + 280: se realiza liberación de material granular tipo subbase por parte de topografía para el inicio de instalación de concreto MR-45 losa margen izquierdo.
- PR 9 + 300: no se realiza actividad en 200ME
- PR 13 + 686: se observa puente Piunda ya terminado a falta de conformación de material granular en apioche, margen izquierdo.
- PR 14 + 750 / 820: se retoma la conformación de material granular, margen derecho
- PR 14 + 970: no se realiza actividad en talud, margen derecho.
- PR 15 + 015: continuan las actividades en encole y descole del box culvert 4x4, realizando instalación de concreto 14 MPA en encole del canal disipador.
- PR 29 + 450: se observa a la comisión de topografía realizando chequeo de niveles para instalación de solado, en construcción de box culvert del sector Chupaderos.
- Ruta 1307, PR 58 + 500: se realiza instalación de concreto 28 MPa en losa de aproximación, estribo 2, puente Certeguí.

01-10-2023

Domingo: no se realizan labores.

02-10-2023

Clima: durante la jornada laboral se presenta un día soleado, con un tráfico vehicular en buenas condiciones. A continuación, se mencona las actividades desarrolladas en los siguientes frentes de obra:
- PR 01 + 300: continua la instalación de filtro en OPC concha, ubicada en Piedras Bachichi.
- PR 4 + 250 / 290: sin actividad en aproches del puente la Unión, con tramos liberados por topografía.
- PR 9 + 300: sin actividad en 200ME del sector Itauri.
- PR 13 + 620 / 670: se observa al contratista continuar con la conformación de subbase para instalación de formaleta para bermo cuneta, margen derecho.
- PR 14 + 105: continua con el amarre de acero e instalación de
- PR 14 + 300 / 890: se observo conformación de material granular tipo subbase granular en el canil derecho.
- PR 14 + 990: sin actividad en perforación o inyección para anclajes en talud, margen derecho.
- PR 21 + 978,3 / 22 + 065: se realiza liberación por topografía y densidades de material granular y formaleta para concreto MR-45, realizando la instalación de concreto en losa, margen izquierdo.
- PR 29 + 450: se observa al contratista que realiza la instalación de solado para continuar con la construcción de box culvert, en el sector Chupaderos, margen izquierdo.

03-10-2023

Powered by CamScanner

ANEXO 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 25 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA No 1757 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 13958 **DE** 25-mar-21 ENTIDAD FINANCIERA: Fiduciaria Bancolombia S.A Sociedad Fiduciaria
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 17-000012-74 ahorros **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: 408 POBLADO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 49 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 59,980,756,869.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPERTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1 RUTA 2510, LOS LLANOS - TARAZÁ (PR0+0000- PR124+0705) RUTA 2511, TARAZÁ - CAUCASIA (PR0+0000- PR63+0996) RUTA 2512, Y LA PINTADA – MEDELLÍN (Autopista sur) PR64+0000 - PR 72+0084 RUTA 2509, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVIAS CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1832 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 14,655,787,676.00	$ 14,655,787,676.00		$ 14,655,787,676.00	$ -
2	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 743,775,947.50	$ 743,775,947.50		$ 743,775,947.50	$ -
3	TRANSPORTE	$ 32,838,687,215.00	$ 32,838,687,215.00		$ 32,838,687,215.00	$ -
4	COSTO DE PERSONAL	$ 11,742,506,030.30	$ 11,742,506,030.00		$ 11,742,506,030.00	$ 0.30
			$ -		$ -	$ -
	TOTALES	$ 59,980,756,868.80	$ 59,980,756,868.50		$ 59,980,756,868.50	$ 0.30

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (__05___) : $ 1,424.76
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 147,755,403.47
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 12,529,111.10		5	31/05/2021	$ 12,529,111.10
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 14,956,503.60		6	30/06/2021	$ 27,485,614.70
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 13,915,638.53		7	31/07/2021	$ 41,401,253.23
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 10,130,857.07		8	31/08/2021	$ 51,532,110.30
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 9,069,541.12		9	30/09/2021	$ 60,601,651.42
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 8,826,320.26		10	31/10/2021	$ 69,427,971.68
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 7,725,205.39		11	30/11/2021	$ 77,153,177.07
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 6,440,539.49		12	31/12/2021	$ 83,593,716.56
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 5,571,809.65		1	31/01/2022	$ 89,165,526.21
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 4,809,208.10		2	28/02/2022	$ 93,974,734.31
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 3,359,026.49		3	31/03/2022	$ 97,333,760.80
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,757,820.73		4	30/04/2022	$ 99,091,581.53
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,879,270.14		5	31/05/2022	$ 100,970,851.67
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 10,931,892.49		6	30/06/2022	$ 111,902,744.16
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 13,390,411.23		7	31/07/2022	$ 125,293,155.39
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 8,511,076.00		8	31/08/2022	$ 133,804,231.39
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 4,997,116.66		9	30/09/2022	$ 138,801,348.05
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 4,171,962.14		10	31/10/2022	$ 142,973,310.19
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 2,014,766.74		11	30/11/2022	$ 144,988,076.93
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,691,682.92		12	31/12/2022	$ 146,679,759.85
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 558,089.89		1	31/01/2023	$ 147,237,849.74
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 459,804.54		2	28/02/2023	$ 147,697,654.28
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 54,945.18		3	31/03/2023	$ 147,752,599.46
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,379.25		4	30/04/2023	$ 147,753,978.71
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,424.76		5	31/05/2023	$ 147,755,403.47

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2023.06.13 11:10:15 -05'00'

Firma:
Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-57955 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** ago-23

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ

PLAZO INICIAL: 18 MESES
FECHA DE INICIO: 19/03/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2023
PLAZO ACUMULADO: 32,5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 134.000.109.999,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 71.694.257.130,40
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 205.694.367.129,40
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 59.980.756.869,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 38.026.473.979,18

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1832 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	8,59
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	KM	4,8
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		KM	220
Otros (Especificar cuales)	Repotenciación y recuperación del puente limones	UND	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	0	7,9
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	KM	0	3,8
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		KM	220	220
Otros (Especificar cuales)	Repotenciación y recuperación del puente limones	UND	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 158.763.198.726,40	$ 1.160.192.606,08	$ 159.923.391.332,48
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 11.971.162.647,00	$ 87.481.574,30	$ 12.058.644.221,30
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 440.000.000,00	$ 3.215.384,62	$ 443.215.384,62
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.376.234.074,00	$ 831.484.474,00	$ 5.207.718.548,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 324.000.000,00		$ 324.000.000,00
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 27.737.397.643,00		$ 27.737.397.643,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 203.611.993.090,40	$ 2.082.374.038,99	$ 205.694.367.129,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.631.338.875,50	33844399	4.665.183.274,50
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 114.207.308,00	$ 834.592,00	$ 115.041.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.745.546.183,50	$ 34.678.991,00	$ 4.780.225.174,50

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/09/2023 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	156.821.765.839
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	166.230.785.407
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		106%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	27
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	249
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1380
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**276**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION PR44+400 EL CRISTO RUTA 5003

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** QUIBDÓ -PEREIRA

CONTRATO No. 1757 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1832 DE 2020 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL ODISEO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD KG	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	VOLQUETA SXS 287	16500	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	VOLQUETA LLA 372	25000	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3	VOLQUETA SOO 023	16570	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	VOLQUETA SNS 372	18092	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5	VOLQUETA SNQ 826	16500	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6	VOLQUETA TJY 121	17450	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7	VOLQUETA TTU 128	16980	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R
8	VOLQUETA TDZ 655	10831	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9	VOLQUETA SOR 187		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	VOLQUETA TNH 289		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	VOLQUETA WLZ 176		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
12	VOLQUETA WLZ 177		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
13	VOLQUETA TTG 596		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
14	VOLQUETA SNO 426		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
15	VOLQUETA TLZ 355		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS02	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	VOLQUETA SRP 079 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	R	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	VOLQUETA UYU 346 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	VOLQUETA SRM 364 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	VOLQUETA SZP 045 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	VOLQUETA TSV 714 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	VOLQUETA TSV 705 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	VOLQUETA TFP 437 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	VOLQUETA WHX 655 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	VOLQUETA SSY 045 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
25	VOLQUETA SLH 325 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
26	VOLQUETA WLR 614 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
27	VOLQUETA FCE 069 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	VOLQUETA WHX 656 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	VOLQUETA XMD 106 ADEX		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS04	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
30	TURBO SYN 426		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
31	TURBO TZK 570		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
32	VOLQUETA TDM 126 CARRO TANQUE	54000	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
33	VOLQUETA EVW 500 CARRO TANQUE		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
34	BUSETA KGU 283	2300	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A
35	TURBO FOTON WOM 306 GADICA	2335	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
36	TURBO JYN 012 MEGAVIAS		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
37	CAMIONETA IRZ 279	5000	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
38	CARRO FQY 548 JORGE VARGAS AMBIENTAL	5000	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
39	CAMIONETA IRV 639	5000	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
40	RETROCARGADOR HYUNDAI H940C		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
41	BULLDOZER DGN	39795	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
42	MOTONIVELADORA 120K N2	12574	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
43	EXCAVADORA HYUNDAI 220N2	22250	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
44	VIBRO HAMM N3	12574	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
45	COMPRESOR DOOSAN #2	840	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

46	VIBRO HAMM #1	**12574**	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
47	MINICARGADOR CASSE #2		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
48	VIBRO CAT CS54	**12574**	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
49	PAJARITA JCB #2 INGEVIAS		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
50	VIBRO VOLVO SD70D	**12574**	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
51	MOTONIVELADORA 120K N1	**12574**	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
52	EXCAVADORA CAT 320 D	**20504**	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
53	RETROCARGADOR JCB #1		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
54	RETROCARGADOR JCB #2		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
55	EXCAVADORA R300LC-9S N°2		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
56	COMPRERSOR KAESER	**840**	RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
57	CARGADOR HYUNDA HL757		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
58	CARGADOR FRONTAL DOOSAN DL300A		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
59	EXCAVADORA HITACHI ZX130		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
60	BULLDOZER CATERPILLAR D6D		RUTAS 5002 - 5003 Y 50RS01	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			TOTAL ACTIVO	42	43	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	33	34	34	34	34	34	35	35	35	35	34	34	34	34
			TOTAL EN REPARACIÓN	9	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
			TOTAL INACTIVO	9	8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	35	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	6	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	22	0

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: PAULO SERGIO TABARES DORONSORO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202184511CLD

Firma
Nombre: EDNA BERMUDEZ BECERRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-254198 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 1757 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** QUIBDÓ -PEREIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1832 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombre	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FRANCISCO JAVIER PORTELA VERA	79.692.313	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	JORGE ANDRES VARGAS GRISALES	10.032.285	RESIDENTENTE AMBIENTAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	JUAN CRISTOBAL ESCUDERO DURAN	1.090.149.687	CADENERO #1	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	LUIS FERNANDO ALZATE MARIN	75.089.944	COORDINADOR HSEQ	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	PAULO SERGIO TABARES DORONSORO	75.101.676	RESIDENTE CIVIL #1	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	YOHAN STIVEN HOLGUIN TAGARIFE	1.087.551.866	LABORATORÍSTA	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	LEONARDO ROA VITOLA	1.120.753.601	TOPOGRAFO	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	NELSON AUGUSTO VERGARA VELASQUEZ	18.603.217	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	HENRY ANDRES MOLINA ROJAS	93.236.552	ABOGADO PREDIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	ALBEIRO RAMÍREZ CASTRILLÓN	4.598.154	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	ESTIGUAR MENA RENTERIA	1.088.273.889	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	RUBIEL DE JESUS MURILLO RENTERIA	18.603.405	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	ABSALON GONZALEZ FORERO	79.047.391	TOPOGRAFO	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	CESAR NACAVERA GUASIRUMA	18.602.339	AYUDANTES	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	EDWIN ANDRES URREA PINEDA	1.093.533.713	AYUDANTES	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	YERLY MARÍA BALOYE GAMBOA	1.077.436.203	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	DUYFARIS CARDONA GONZÁLEZ	1.093.538.571	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	GIOVANNA ANDREA VALENCIA PÉREZ	25.001.739	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	VIVIANA CORDOBA PALACIOS	1.005.020.943	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	JOSE JESÚS RUIZ HENAO	4.527.886	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	MARIA DEL CARMEN PEREA PINO	42.031.070	AUX. SOCIAL	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	DAILY JULIETH CONRADO MOSQUERA	1.093.534.478	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	LEYDI BIBIANA MATURANA HINESTROZA	1.148.691.467	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	GILBERTO BERDUGO ARENAS	91.112.188	APUNTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	ANGELO GEOVANNY CRUZ NAVAS	91.282.533	TECNICO PREDIAL	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	CESAR AUGUSTO PAREDES NARVAES	83.091.667	CADENERO #1	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	HELDERS ENRIQUE ROMERO AGUIRRE	1.112.767.280	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	MARIA CRISTINA GRAJALES GRISALES	42.716.595	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	GUILLERMO ARTURO VELEZ ARBOLEDA	3.517.826	ANOTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	LUIS FERNANDO LEIVA ABONCE	119 3380767	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	GLORIA LILIANA NACABERA NAYAZA	1.004.993.408	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	JAVIER SEPULVEDA CHICA	18.602.248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33	MAURICIO MURILLO QUIROGA	166.994.627	CADENERO #1	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
34	ALCIBIADES GUASIRUMA NACABERA	1.007.213.607	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	ANDERSON HERNANDEZ POSADA	1.000.291.381	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	HECTOR FABIO ESCOBAR GUATIQUI	1.007.214.418	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37	JOSE LUIS PALACIO CAMPAÑA	1.151.198.395	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38	WILSON ARANGO MUÑOZ	10.020.643	LABORATORISTA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39	WILLIAM ROJAS ROJAS	17.688.945	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	JAIRO ANTONIO ABELLO GIRALDO	15.927.734	ENCARGADO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41	JAMES ANTONIO SIAGAMA RESTREPO	1.007.629.929	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	JAVIER DE JESUS CARDONA AGUDELO	10.198.834	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
43	YULIAN ANDRES SANCHEZ TOBON	1.088.321.777	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
44	MARIA LONIS PALACIOS RIVAS	35.990.829	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
45	NIDIA LORENA BOTERO ARAGON	1.061.656.863	APOYO AMBIENTAL + ALTURAS	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
46	GLORIA ORFILIA RUIZ DIAZ	24.415.311	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
47	JORGE ALBERTO CASTRO MESA	94.411.902	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	LUZ MARY GOMEZ RAMIREZ	25.196.494	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49	MARIA ALEJANDRINA CASTAÑEDA AMAYA	30.400.385	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	YENSY YASMIN MENDEZ MORALES	20.750.142	ADMINISTRADORA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51	JUAN CAMILO SANCHEZ RANGEL	1.098.783.481	ARQUITECTO DE APOYO	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52	ANDRES JOHANNY ESCOBAR GUATIQUI	1.007.214.419	AUIDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
53	YENNY TRIVIÑO BELTRAN	24.586.565	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
54	EDUARD ANDRES GOMEZ LEIVA	1.143.962.233	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
55	JARRY JULIAN COPETE MINOTA	1.088.006.580	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	ANA ISABEL MONTOYA HINCAPIE	1.017.158.011	APUNTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
57	HECTOR FABIO MOSQUERA MATURANA	9.861.888	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
58	HECTOR GERMAN URREA PINEDA	1.007.214.330	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
59	GLORIA CRISTINA RAMIREZ MONCADA	25.001.053	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60	WISTON GAMBOA CHAVERRA	11.807.651	AUXILIAR DE ALMACEN	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
61	JAINOBER RUIZ VELASQUEZ	1.093.534.243	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
62	SANDRA PATRICIA CAICEDO TORRES	35.602.323	RESIDENTE SOCIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63	JESUS ALBEIRO ALCARAZ ARIAS	70.436.013	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
64	JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ	1.055.753.270	INGENIERO RESIDENTE DE DISEÑOS	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
65	HUMBERTO ANDRES MURILLO MOSQUERA	1.088.240.298	CADENERO 1	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
66	LUIS FERNANDO RENTERIA MACHADO	1.148.691.477	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
67	MARIA AIMERSA RENTERIA MENA	1.093.532.858	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
68	YEFERSON ACEVEDO VERGARA	1.093.539.725	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
69	ANDRES FELIPE QUINTERO GIRALDO	1.193.339.770	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70	OMAIRA GUASIRUMA NARIQUIA	1.093.534.533	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
71	NORIEL ANTONIO MOSQUERA BUENAÑOS	1.133.719.109	ENCARGADO OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72	JANS RENE LAITON CAICEDO	79.836.711	RESIDENTE DE COSTOS	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73	MARIOLA TIJARO BLANDON	25.220.668	AUXILIAR SST	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
74	MARIA GERSOMINA PEREA MOSQUERA	25.001.454	CONTROLADORA VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
75	LINCO PALOMEQUE PINILLA	1.078.179.489	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensión	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.197.660	$ 222.557	V	NUEVA EPS	65529978	$ 127.906	PORVENIR	65529978	$ 511.626	$ 127.906	$ 0	$ 0	Planillas de pago
2	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.915.500	$ 342.119	V	NUEVA EPS	65529978	$ 196.620	COLFONDOS	65529978	$ 835.635	$ 196.620	$ 0	$ 0	Planillas de pago
3	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.132.334	$ 148.410	V	NUEVA EPS	65529978	$ 85.293	PROTECCION	65529978	$ 341.173	$ 85.293	$ 0	$ 0	Planillas de pago
4	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.072.320	$ 283.433	V	SURA	65529978	$ 162.893	PROTECCION	65529978	$ 651.571	$ 162.893	$ 0	$ 0	Planillas de pago
5	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 5.311.000	$ 369.646	V	SURA	65529978	$ 212.440	PORVENIR	65529978	$ 849.760	$ 212.440	$ 0	$ 0	Planillas de pago
6	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.390.000	$ 235.944	V	SOS	65529978	$ 135.600	COLPENSIONES	65529978	$ 542.400	$ 135.600	$ 0	$ 0	Planillas de pago
7	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.967.872	$ 206.564	V	FAMISANAR	65529978	$ 118.715	PORVENIR	65529978	$ 474.860	$ 118.715	$ 0	$ 0	Planillas de pago
8	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.321.659	$ 91.987	V	ASMET SALUD	65529978	$ 52.866	PORVENIR	65529978	$ 211.465	$ 52.866	$ 0	$ 0	Planillas de pago
9	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.571.032	$ 248.544	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 142.841	PROTECCION	65529978	$ 571.365	$ 142.841	$ 0	$ 0	Planillas de pago
10	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.728.895	$ 120.331	V	NUEVA EPS	65529978	$ 69.156	PORVENIR	65529978	$ 276.623	$ 69.156	$ 0	$ 0	Planillas de pago
11	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.409.276	$ 98.086	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 56.371	PORVENIR	65529978	$ 225.484	$ 56.371	$ 0	$ 0	Planillas de pago
12	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.864.706	$ 199.384	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 114.588	PORVENIR	65529978	$ 458.353	$ 114.588	$ 0	$ 0	Planillas de pago
13	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.911.793	$ 202.661	V	FAMISANAR	65529978	$ 116.472	PORVENIR	65529978	$ 465.887	$ 116.472	$ 0	$ 0	Planillas de pago
14	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.526.508	$ 106.245	V	NUEVA EPS	65529978	$ 61.060	PROTECCION	65529978	$ 244.241	$ 61.060	$ 0	$ 0	Planillas de pago
15	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.790.227	$ 124.600	V	NUEVA EPS	65529978	$ 71.609	PORVENIR	65529978	$ 286.436	$ 71.609	$ 0	$ 0	Planillas de pago
16	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.811.574	$ 1.614.112	V	NUEVA EPS	65529978	$ 72.463	PORVENIR	65529978	$ 289.852	$ 72.463	$ 0	$ 0	Planillas de pago
17	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.739.998	$ 121.104	V	NUEVA EPS	65529978	$ 69.600	PORVENIR	65529978	$ 278.400	$ 69.600	$ 0	$ 0	Planillas de pago
18	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.709.313	$ 118.968	V	NUEVA EPS	65529978	$ 68.373	PORVENIR	65529978	$ 273.490	$ 68.373	$ 0	$ 0	Planillas de pago
19	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.991.744	$ 138.625	V	NUEVA EPS	65529978	$ 79.670	PORVENIR	65529978	$ 318.679	$ 79.670	$ 0	$ 0	Planillas de pago
20	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.160.000	$ 80.736	V	ASMET SALUD	65529978	$ 46.400	PORVENIR	65529978	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
21	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.808.000	$ 125.837	V	NUEVA EPS	65529978	$ 72.320	PORVENIR	65529978	$ 289.280	$ 72.320	$ 0	$ 0	Planillas de pago
22	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.858.469	$ 129.349	V	NUEVA EPS	65529978	$ 74.339	PORVENIR	65529978	$ 297.355	$ 74.339	$ 0	$ 0	Planillas de pago
23	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.169.873	$ 81.423	V	SURA	65529978	$ 46.795	PORVENIR	65529978	$ 187.180	$ 46.795	$ 0	$ 0	Planillas de pago
24	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.965.974	$ 136.832	V	NUEVA EPS	65529978	$ 78.639	COLPENSIONES	65529978	$ 314.556	$ 78.639	$ 0	$ 0	Planillas de pago
25	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.885.199	$ 340.010	V	SURA	65529978	$ 195.408	COLPENSIONES	65529978	$ 781.632	$ 195.408	$ 0	$ 0	Planillas de pago
26	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.149.163	$ 149.582	V	NUEVA EPS	65529978	$ 85.967	COLFONDOS	65529978	$ 343.866	$ 85.967	$ 0	$ 0	Planillas de pago
27	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.498.192	$ 243.474	V	SANITAS	65529978	$ 139.928	COLPENSIONES	65529978	$ 559.711	$ 139.928	$ 0	$ 0	Planillas de pago
28	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.803.899	$ 125.551	V	COMFENALCO VALLE	65529978	$ 72.156	PORVENIR	65529978	$ 288.624	$ 72.156	$ 0	$ 0	Planillas de pago
29	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.677.475	$ 116.752	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 67.099	-	65529978	$ 0	$ 67.099	$ 0	$ 0	Planillas de pago - PENSIONADO
30	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.278.220	$ 88.964	V	ASMET SALUD	65529978	$ 51.129	PORVENIR	65529978	$ 204.515	$ 51.129	$ 0	$ 0	Planillas de pago
31	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.767.766	$ 123.037	V	NUEVA EPS	65529978	$ 70.711	PROTECCION	65529978	$ 282.843	$ 70.711	$ 0	$ 0	Planillas de pago
32	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.809.175	$ 195.519	V	NUEVA EPS	65529978	$ 112.367	PORVENIR	65529978	$ 449.468	$ 112.367	$ 0	$ 0	Planillas de pago
33	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.135.548	$ 148.634	V	SURA	65529978	$ 85.422	PORVENIR	65529978	$ 341.688	$ 85.422	$ 0	$ 0	Planillas de pago
34	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.560.418	$ 178.205	V	PIJAO SALUD	65529978	$ 102.417	PORVENIR	65529978	$ 409.667	$ 102.417	$ 0	$ 0	Planillas de pago
35	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 958.850	$ 66.736	V	NUEVA EPS	65529978	$ 38.354	PORVENIR	65529978	$ 153.416	$ 38.354	$ 0	$ 0	Planillas de pago
36	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.012.299	$ 209.656	V	PIJAO SALUD	65529978	$ 120.492	PORVENIR	65529978	$ 481.968	$ 120.492	$ 0	$ 0	Planillas de pago
37	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.795.533	$ 124.969	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 71.821	PROTECCION	65529978	$ 287.285	$ 71.821	$ 0	$ 0	Planillas de pago
38	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.042.755	$ 281.376	V	NUEVA EPS	65529978	$ 161.710	COLPENSIONES	65529978	$ 646.841	$ 161.710	$ 0	$ 0	Planillas de pago
39	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.519.229	$ 244.938	V	NUEVA EPS	65529978	$ 140.769	COLFONDOS	65529978	$ 563.077	$ 140.769	$ 0	$ 0	Planillas de pago
40	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.354.498	$ 233.473	V	NUEVA EPS	65529978	$ 134.180	COLPENSIONES	65529978	$ 536.720	$ 134.180	$ 0	$ 0	Planillas de pago
41	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.999.889	$ 139.192	V	NUEVA EPS	65529978	$ 79.996	PORVENIR	65529978	$ 319.982	$ 79.996	$ 0	$ 0	Planillas de pago
42	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.960.468	$ 206.049	V	NUEVA EPS	65529978	$ 118.419	COLPENSIONES	65529978	$ 473.675	$ 118.419	$ 0	$ 0	Planillas de pago
43	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.930.852	$ 203.987	V	NUEVA EPS	65529978	$ 117.234	PORVENIR	65529978	$ 468.936	$ 117.234	$ 0	$ 0	Planillas de pago
44	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.846.333	$ 128.505	V	ASMET SALUD	65529978	$ 73.853	PORVENIR	65529978	$ 295.413	$ 73.853	$ 0	$ 0	Planillas de pago
45	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SANITAS	65529978	$ 100.000	COLFONDOS	65529978	$ 400.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
46	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.127.488	$ 148.073	V	NUEVA EPS	65529978	$ 85.100	PORVENIR	65529978	$ 340.398	$ 85.100	$ 0	$ 0	Planillas de pago
47	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.726.426	$ 120.159	V	NUEVA EPS	65529978	$ 69.057	COLFONDOS	65529978	$ 276.228	$ 69.057	$ 0	$ 0	Planillas de pago
48	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.215.105	$ 154.171	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 88.604	PORVENIR	65529978	$ 354.417	$ 88.604	$ 0	$ 0	Planillas de pago
49	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.017.042	$ 140.386	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 80.682	PORVENIR	65529978	$ 322.727	$ 80.682	$ 0	$ 0	Planillas de pago
50	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.390.000	$ 235.944	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 135.600	COLPENSIONES	65529978	$ 542.400	$ 135.600	$ 0	$ 0	Planillas de pago
51	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	65529978	$ 140.000	COLPENSIONES	65529978	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
52	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.809.175	$ 195.519	V	PIJAO SALUD	65529978	$ 112.367	PORVENIR	65529978	$ 449.468	$ 112.367	$ 0	$ 0	Planillas de pago
53	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	65529978	$ 140.000	PORVENIR	65529978	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
54	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.474.998	$ 172.260	V	NUEVA EPS	65529978	$ 99.000	COLPENSIONES	65529978	$ 396.000	$ 99.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
55	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.530.829	$ 106.546	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 61.233	PORVENIR	65529978	$ 244.933	$ 61.233	$ 0	$ 0	Planillas de pago
56	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.893.051	$ 131.756	V	NUEVA EPS	65529978	$ 75.722	PORVENIR	65529978	$ 302.888	$ 75.722	$ 0	$ 0	Planillas de pago
57	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.012.299	$ 209.656	V	NUEVA EPS	65529978	$ 120.492	COLPENSIONES	65529978	$ 481.968	$ 120.492	$ 0	$ 0	Planillas de pago
58	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.904.937	$ 202.184	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 116.197	PORVENIR	65529978	$ 464.790	$ 116.197	$ 0	$ 0	Planillas de pago
59	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.890.553	$ 131.582	V	NUEVA EPS	65529978	$ 75.622	PROTECCION	65529978	$ 302.488	$ 75.622	$ 0	$ 0	Planillas de pago
60	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.786.894	$ 124.368	V	SANITAS	65529978	$ 71.476	COLPENSIONES	65529978	$ 285.903	$ 71.476	$ 0	$ 0	Planillas de pago
61	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.809.723	$ 125.957	V	ASMET SALUD	65529978	$ 72.389	PORVENIR	65529978	$ 289.556	$ 72.389	$ 0	$ 0	Planillas de pago
62	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.800.000	$ 264.480	V	SANITAS	65529978	$ 152.000	PROTECCION	65529978	$ 608.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
63	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.571.253	$ 178.959	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 102.850	PROTECCION	65529978	$ 411.400	$ 102.850	$ 0	$ 0	Planillas de pago
64	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 6.500.000	$ 452.400	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 260.000	PORVENIR	65529978	$ 1.040.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
65	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.016.208	$ 140.328	V	NUEVA EPS	65529978	$ 80.648	PROTECCION	65529978	$ 322.593	$ 80.648	$ 0	$ 0	Planillas de pago
66	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.258.723	$ 87.607	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 50.349	PORVENIR	65529978	$ 201.396	$ 50.349	$ 0	$ 0	Planillas de pago
67	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.717.789	$ 119.558	V	ASMET SALUD	65529978	$ 68.712	COLPENSIONES	65529978	$ 274.846	$ 68.712	$ 0	$ 0	Planillas de pago
68	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.764.680	$ 122.822	V	NUEVA EPS	65529978	$ 70.587	PORVENIR	65529978	$ 282.349	$ 70.587	$ 0	$ 0	Planillas de pago
69	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.118.671	$ 217.060	V	NUEVA EPS	65529978	$ 124.747	PORVENIR	65529978	$ 498.987	$ 124.747	$ 0	$ 0	Planillas de pago
70	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.861.554	$ 129.564	V	COOSALUD	65529978	$ 74.462	PORVENIR	65529978	$ 297.849	$ 74.462	$ 0	$ 0	Planillas de pago
71	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.984.042	$ 207.689	V	NUEVA EPS	65529978	$ 119.362	PROTECCION	65529978	$ 477.447	$ 119.362	$ 0	$ 0	Planillas de pago
72	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.000.002	$ 278.400	V	FAMISANAR	65529978	$ 160.000	PORVENIR	65529978	$ 640.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
73	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.327.032	$ 231.561	V	NUEVA EPS	65529978	$ 133.081	PROTECCION	65529978	$ 532.325	$ 133.081	$ 0	$ 0	Planillas de pago
74	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65529978	$ 46.400	PORVENIR	65529978	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
75	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.371.637	$ 95.466	V	NUEVA EPS	65529978	$ 54.865	PROTECCION	65529978	$ 219.462	$ 54.865	$ 0	$ 0	Planillas de pago

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

76	EDWIN ALEXANDER ALFONSO DIAZ	1.022.944.551	ALMACENISTA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.028.373	$ 141.175	V	NUEVA EPS	65529978	$ 81.135	PROTECCION	65529978	$ 324.540	$ 81.135	$ 0	$ 0	Planillas de pago
77	JULIAN FELIPE TORO LOPEZ	1.093.534.016	AUX LABORATORIO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.470.977	$ 102.380	V	NUEVA EPS	65529978	$ 58.839	PORVENIR	65529978	$ 235.356	$ 58.839	$ 0	$ 0	Planillas de pago
78	DARIO GUASIRUMA NACAVERA	18.602.599	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.582.041	$ 110.110	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 63.282	PROTECCION	65529978	$ 253.127	$ 63.282	$ 0	$ 0	Planillas de pago
79	EDWIN ANDRES CARDONA GONZALEZ	1.093.536.884	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.371.020	$ 95.423	V	COOSALUD	65529978	$ 54.841	PORVENIR	65529978	$ 219.363	$ 54.841	$ 0	$ 0	Planillas de pago
80	JOSE ANDRES MOSQUERA VERGARA	1.093.533.961	AUX LABORATORIO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.741.235	$ 121.190	V	NUEVA EPS	65529978	$ 69.649	PORVENIR	65529978	$ 278.598	$ 69.649	$ 0	$ 0	Planillas de pago
81	MILTON SANCHEZ PEREZ	74.846.336	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.837.812	$ 127.912	V	NUEVA EPS	65529978	$ 73.512	PORVENIR	65529978	$ 294.050	$ 73.512	$ 0	$ 0	Planillas de pago
82	LEIDY YORLADY MENA RENTERIA	1.007.213.963	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.836.256	$ 127.803	V	ASMET SALUD	65529978	$ 73.450	PORVENIR	65529978	$ 293.801	$ 73.450	$ 0	$ 0	Planillas de pago
83	ESENOBER DE JESUS MORALES OCAMPO	18.533.275	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.411.813	$ 167.862	V	SALUD TOTAL	65529978	$ 96.473	PORVENIR	65529978	$ 385.890	$ 96.473	$ 0	$ 0	Planillas de pago
84	ANDRES BERMUDEZ RENTERIA	1.088.236.484	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.110.379	$ 146.882	V	NUEVA EPS	65529978	$ 84.415	PROTECCION	65529978	$ 337.661	$ 84.415	$ 0	$ 0	Planillas de pago
85	OSCAR ENRIQUE ACERO PERDOMO	7.546.576	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.151.596	$ 219.351	V	SURA	65529978	$ 126.064	COLPENSIONES	65529978	$ 504.255	$ 126.064	$ 0	$ 0	Planillas de pago
86	ELYAM HERNEY VALENCIA GOMEZ	1.093.534.834	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.930.852	$ 203.987	V	NUEVA EPS	65529978	$ 117.234	PORVENIR	65529978	$ 468.936	$ 117.234	$ 0	$ 0	Planillas de pago
87	LUIS ALFREDO MONTOYA TASCON	1.093.537.872	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 749.886	$ 52.192	V	NUEVA EPS	65529978	$ 29.995	PORVENIR	65529978	$ 119.982	$ 29.995	$ 0	$ 0	Planillas de pago
88	SANTIAGO RIVILLAS MEJIA	1.047.970.002	JEFE DE TIENDA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.426.841	$ 168.908	V	SAVIA SALUD	65529978	$ 97.074	COLFONDOS	65529978	$ 388.295	$ 97.074	$ 0	$ 0	Planillas de pago
89	LUIS ALBERTO PABON GUEVARA	1.032.400.803	OPERADOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.754.169	$ 122.090	V	SURA	65529978	$ 70.167	PROTECCION	65529978	$ 280.667	$ 70.167	$ 0	$ 0	Planillas de pago
90	LILY CRISTINA MENDOZA BATALLE	1.047.365.572	PROFESIONAL APOYO SOCIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.000.000	$ 208.800	V	MUTUAL SER	65529978	$ 120.000	PORVENIR	65529978	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
91	VICTOR DANIEL REYES PERDOMO	110.490.114	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 5.749.860	$ 400.190	V	SANITAS	65529978	$ 229.994	PROTECCION	65529978	$ 919.978	$ 229.994	$ 0	$ 0	Planillas de pago
92	PAULA ANDREA SERNA DEL RIO	1.044.433.902	PROFESIONAL APOYO PREDIAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SURA	65529978	$ 140.000	PROTECCION	65529978	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
93	LUIS ROBERTO FLOREZ LOTERO	18.601.657	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.425.319	$ 99.202	V	NUEVA EPS	65529978	$ 57.013	PORVENIR	65529978	$ 228.051	$ 57.013	$ 0	$ 0	Planillas de pago
94	ARNULFO DIAZ DORADO	1.087.487.13O	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.935.787	$ 204.331	V	ASMET SALUD	65529978	$ 117.431	PORVENIR	65529978	$ 469.726	$ 117.431	$ 0	$ 0	Planillas de pago
95	BRAYAN WALTERO OCAMPO	1.007.213.767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.775.115	$ 193.148	V	ALMAVID SALUD	65529978	$ 111.005	PROTECCION	65529978	$ 444.018	$ 111.005	$ 0	$ 0	Planillas de pago
96	JOAS DAVID ALVAREZ CHAVEZ	1.007.139.353	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.974.716	$ 137.440	V	ALMAVID SALUD	65529978	$ 78.989	PROTECCION	65529978	$ 315.955	$ 78.989	$ 0	$ 0	Planillas de pago
97	ADRIANA PATRICIA CADAVID MONA	30.415.119	APUNTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.131.916	$ 148.381	V	NUEVA EPS	65529978	$ 85.277	COLPENSIONES	65529978	$ 341.107	$ 85.277	$ 0	$ 0	Planillas de pago
98	EDWIN ALEJANDRO MEDINA CARMONA	1.093.539.277	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.412.481	$ 98.309	V	ASMET SALUD	65529978	$ 56.499	PORVENIR	65529978	$ 225.997	$ 56.499	$ 0	$ 0	Planillas de pago
99	JOSE LUIS ALDANA REY	1.019.110.392	MECANICO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.800.000	$ 194.880	V	SANITAS	65529978	$ 112.000	PORVENIR	65529978	$ 448.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
100	IVAN ANDRES DIAZ QUESADA	94.371.623	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 6.500.000	$ 452.400	V	SANITAS	65529978	$ 260.000	COLPENSIONES	65529978	$ 1.105.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
101	JHONIER FERNANDO MEDINA GUERRERO	1.093.532.013	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.787.638	$ 194.020	V	COOSALUD	65529978	$ 111.506	PORVENIR	65529978	$ 446.022	$ 111.506	$ 0	$ 0	Planillas de pago
102	JESUS ONEIDER CARMONA CARDONA	1.060.874.565	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.428.854	$ 99.448	V	NUEVA EPS	65529978	$ 57.154	PORVENIR	65529978	$ 228.617	$ 57.154	$ 0	$ 0	Planillas de pago
103	NELSON DANIEL TASCON HURTADO	1.004.994.054	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.311.244	$ 91.263	V	COOSALUD	65529978	$ 52.450	PROTECCION	65529978	$ 209.799	$ 52.450	$ 0	$ 0	Planillas de pago
104	DIEGO FERNANDO MENA MACHADO	1.093.534.406	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.623.327	$ 182.584	V	NUEVA EPS	65529978	$ 104.933	PROTECCION	65529978	$ 419.732	$ 104.933	$ 0	$ 0	Planillas de pago
105	GILDARDO ANTONIO HINCAPIE GONZALEZ	18.603.300	AYUDANTE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.997.490	$ 208.625	V	ASMET SALUD	65529978	$ 119.900	PORVENIR	65529978	$ 479.598	$ 119.900	$ 0	$ 0	Planillas de pago
106	KENNER GRANADA EUSSE	1.004.994.010	AYUDANTE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.890.554	$ 131.583	V	ASMET SALUD	65529978	$ 75.622	PORVENIR	65529978	$ 302.489	$ 75.622	$ 0	$ 0	Planillas de pago
107	MIGUEL ANGEL GONZALES ARANGO	1.193.604.306	RONDERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.590.009	$ 180.265	V	SURA	65529978	$ 103.600	PROTECCION	65529978	$ 414.401	$ 103.600	$ 0	$ 0	Planillas de pago
108	DAMARIS MACHADO MARTINEZ	1.093.538.324	CONTROLADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.861.552	$ 129.564	V	ASMET SALUD	65529978	$ 74.462	PORVENIR	65529978	$ 297.848	$ 74.462	$ 0	$ 0	Planillas de pago
109	ALVARO YULIAN CASTAÑO HERNANDEZ	18.514.645	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 2.302.971	$ 160.287	V	NUEVA EPS	65529978	$ 92.119	COLPENSIONES	65529978	$ 368.475	$ 92.119	$ 0	$ 0	Planillas de pago
110	MARIA RUPERTINA IBARGUEN MENA	35.587.290	CONTROLADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.861.552	$ 129.564	V	NUEVA EPS	65529978	$ 74.462	PROTECCION	65529978	$ 297.848	$ 74.462	$ 0	$ 0	Planillas de pago
111	RUBEN DARIO OSORIO VALENCIA	1.111.810.207	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.907.913	$ 132.791	V	NUEVA EPS	65529978	$ 76.317	PORVENIR	65529978	$ 305.266	$ 76.317	$ 0	$ 0	Planillas de pago
112	LEODANY GARCIA FLOREZ	1.007.214.055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 828.865	$ 57.689	V	NUEVA EPS	65529978	$ 33.155	PORVENIR	65529978	$ 132.618	$ 33.155	$ 0	$ 0	Planillas de pago
113	NELSON ANTONIO CUELLO PEREZ	98.622.694	MECANICO	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.000.424	$ 278.430	V	SURA	65529978	$ 160.017	COLPENSIONES	65529978	$ 640.068	$ 160.017	$ 0	$ 0	Planillas de pago
114	CRISTIAN STIVEN PATIÑO BARON	1.093.539.507	CONDUCTOR CAMIONETA IRV 639	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.930.782	$ 134.382	V	NUEVA EPS	65529978	$ 77.231	PORVENIR	65529978	$ 308.925	$ 77.231	$ 0	$ 0	Planillas de pago
115	YAIBER MENA ROMAÑA	1.003.853.990	APUNTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SURA	65529978	$ 46.400	PORVENIR	65529978	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
116	FHARITH STEVE MARIN EUSSE	1.004.993.605	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.371.020	$ 95.423	V	ASMET SALUD	65529978	$ 54.841	PROTECCION	65529978	$ 219.363	$ 54.841	$ 0	$ 0	Planillas de pago
117	JUAN JOSE MEJIA GIRALDO	1.193.551.655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.759.744	$ 122.478	V	COOSALUD	65529978	$ 70.390	PORVENIR	65529978	$ 281.559	$ 70.390	$ 0	$ 0	Planillas de pago
118	ANDRES GOMEZ ROBLES	1.106.777.579	ANALISTA DE COSTOS	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.000.000	$ 278.400	V	NUEVA EPS	65529978	$ 160.000	PROTECCION	65529978	$ 640.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
119	SANTIAGO PATIÑO VASQUEZ	1.093.539.195	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.741.233	$ 121.190	V	NUEVA EPS	65529978	$ 69.649	PORVENIR	65529978	$ 278.597	$ 69.649	$ 0	$ 0	Planillas de pago
120	YONIER ALEJANDRO TAPIERO GONZALEZ	1.110.232.394	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 1.243.667	$ 86.559	V	PIJAO SALUD	65529978	$ 49.747	PROTECCION	65529978	$ 198.987	$ 49.747	$ 0	$ 0	Planillas de pago
121	YENNY MAGALY ANTE MUÑOZ	34.315.693	ENCARGADO DE OBRA	$ 5.500.000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 4.950.000	$ 344.520	V	SANITAS	65529978	$ 198.000	PROTECCION	65529978	$ 792.000	$ 198.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
122	JENIFFER MORENO VALENCIA	1.036.948.235	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	$ 0	$ 0	V	SURA	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
123	LUIS ANDRES MELENDEZ BASTIDAS	79.550.421	AYUDANTE MR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27502132	$ 46.400	PORVENIR	27502132	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
124	LEONARDO MELENDEZ BAÑOS	18.935.748	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	27502132	$ 46.400	PROTECCION	27502132	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
125	ANDERSON MORALES OSPINA	1.093.535.938	CONDUCTOR CAMIONETA TSR 937	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27502132	$ 46.400	PORVENIR	27502132	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
126	CARLOS MARTINEZ SANABRIA	1.052.218.429	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	MUTUAL SER	27502132	$ 46.400	PORVENIR	27502132	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
127	HENRRY ANTONIO ARIAS MENA	10.031.393	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27502132	$ 46.400	PORVENIR	27502132	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
128	ALBERT STIVER MACHADO MOSQUERA	1.093.537.086	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27502132	$ 46.400	PROTECCION	27502132	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
129	LUIS EDUARDO MORENO MARTINEZ	1.052.216.579	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CONSTRUCTORES GMA	$ 386.667	$ 26.912	V	NUEVA EPS	27502132	$ 15.467	PORVENIR	27502132	$ 61.867	$ 15.467	$ 0	$ 0	Planillas de pago
130	JUAN CARLOS MUÑOZ GUAQUEZ	1.086.923.763	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CONSTRUCTORES GMA	$ 734.667	$ 51.133	V	MALLAMAS	27502132	$ 29.387	PROTECCION	27502132	$ 117.547	$ 29.387	$ 0	$ 0	Planillas de pago
131	ENDER MARTINEZ AGUDELO	1.002.465.526	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 270.667	$ 18.838	V	SALUD TOTAL	27502132	$ 10.827	PORVENIR	27502132	$ 43.307	$ 10.827	$ 0	$ 0	Planillas de pago
132	JOSE EDUARDO AGUDELO AMARIS	1.002.466.006	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORES GMA	$ 270.667	$ 18.838	V	SALUD TOTAL	27502132	$ 10.827	PROTECCION	27502132	$ 43.307	$ 10.827	$ 0	$ 0	Planillas de pago
133	LUIS DARIO MACHADO MATURANA	1.135.184.744	OFICIAL	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 300.000	$ 20.880	V	SANITAS	9456119806	$ 12.000	COLFONDOS	9456119806	$ 48.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
134	CARLOS ALBERTO ACEVEDO PINEDA	1.093.539.508	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.300.000	$ 90.480	V	ASMET SALUD	9456119806	$ 52.000	PORVENIR	9456119806	$ 208.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
135	ALBERTO MANUEL BENITEZ MARQUEZ	92.277.025	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.200.000	$ 83.520	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 48.000	COLPENSIONES	9456119806	$ 192.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
136	JAME GUASIRUMA NACAVERA	18.603.431	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	PIJAO SALUD	9456119806	$ 46.400	PORVENIR	9456119806	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
137	WILSON ARGELIO GAMERO MARTINEZ	8.776.841	OFICIAL	$ 1.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.500.000	$ 104.400	V	MEDIMAS	9456119806	$ 60.000	COLPENSIONES	9456119806	$ 240.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
138	JAIRO ANTONIO MATURANA MOSQUERA	18.601.783	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SANITAS	9456119806	$ 46.400	PROTECCION	9456119806	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
139	ZULMA PAOLA HURTADO PARRA	1.118.469.499	AUX SST	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.400.000	$ 97.440	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 56.000	PORVENIR	9456119806	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
140	LEONARDO FAVIO MARTINEZ VASQUEZ	92.553.796	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 46.400	PORVENIR	9456119806	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
141	EMILKAR RAFAEL CONTRERAS SUAREZ	92.554.831	OFICIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.550.000	$ 107.880	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 62.000	PORVENIR	9456119806	$ 248.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
142	HOOBER GUASIRUMA ZAMORA	18.603.246	AYUDANTE OBRA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 46.400	PROTECCION	9456119806	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
143	ROBERT ANTONIO RAMIREZ VILLADA	18.603.346	AYUDANTE OBRA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 46.400	PROTECCION	9456119806	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
144	OSCAR MURRI CORREA	1.149.434.751	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 928.000	$ 64.589	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 37.120	PORVENIR	9456119806	$ 148.480	$ 37.120	$ 0	$ 0	Planillas de pago
145	VIRGILIO SINTUA WAITOTO	1.076.380.145	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 116.000	$ 8.074	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 4.640	PORVENIR	9456119806	$ 18.560	$ 4.640	$ 0	$ 0	Planillas de pago
146	JAIME VARGAS LESMES	7.332.367	OFICUAL DE OBRA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 1.450.000	$ 100.920	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 58.000	PROTECCION	9456119806	$ 232.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
147	JOHN JAIRO MOLINA SANCHEZ	71.946.704	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 850.667	$ 59.206	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 34.027	COLFONDOS	9456119806	$ 136.107	$ 34.027	$ 0	$ 0	Planillas de pago
148	OMAR CASTRO MONDRAGON	1.111.756.563	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 734.667	$ 51.133	V	NUEVA EPS	9456119806	$ 29.387	PORVENIR	9456119806	$ 117.547	$ 29.387	$ 0	$ 0	Planillas de pago
149	YEINS SEBASTIAN CANO RODRIGUEZ	1.151.198.490	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RODRIGUEZ CABARCAS	$ 0	$ 0	V	ASMET SALUD	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
150	JOSE ELIBERTO RENDON AGUDELO	10.195.921	CONDUCTOR VOLQUETA SXS 287	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65025176	$ 46.400	PORVENIR	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
151	ANDRES FELIPE LOPEZ GIRALDO	75.075.991	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SURA	65025176	$ 46.400	COLPENSIONES	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
152	HAROLD ALEJANDRO VALENCIA TASCON	1.094.956.581	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ADEX LOGISTICA	$ 580.000	$ 40.368	V	SALUD TOTAL	65025176	$ 23.200	PORVENIR	65025176	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	Planillas de pago
153	ANDRES YOHANY PINEDA PINEDA	70.421.934	CONDUCTOR VOLQUETA TJY 121	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65025176	$ 46.400	COLPENSIONES	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
154	JOSE ELIECER ACEVEDO LATORRE	18.601.966	CONDUCTOR VOLQUETA TTU 128	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	PIJAO SALUD	65025176	$ 46.400	PROTECCION	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
155	GUSTAVO ADOLFO DAVILA VELEZ	4.528.246	CONDUCTOR VOLQUETA SNQ 826	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65025176	$ 46.400	PROTECCION	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

156	BEITMAR HERNEY MORENO QUICENO	1.093.534.651	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SANITAS	65025176	$ 46.400	PORVENIR	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
157	LUIS FERNEY MAYA FERNANDEZ	15.264.687	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SURA	65025176	$ 46.400	PROTECCION	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
158	JORGE AUGUSTO CANO MONTOYA	15.265.163	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65025176	$ 46.400	PORVENIR	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
159	CARLOS ANDRES VALENCIA FRANCO	18.611.044	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65025176	$ 46.400	PORVENIR	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
160	GADDI MAHIR GARRIDO BALLESTAS	73.198.586	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ADEX LOGISTICA	$ 38.667	#¡REF!	V	SALUD TOTAL	65025176	#¡REF!	PORVENIR	65025176	#¡REF!	#¡REF!	$ 0	$ 0	Planillas de pago
161	JULIAN DAVID DAVILA VELEZ	1.004.993.908	NDUCTOR VOLQUETA KENWORD TJY	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ADEX LOGISTICA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SANITAS	65025176	$ 46.400	PROTECCION	65025176	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
162	RODOLFO HERNANDEZ ZAPATA	70.927.455	RETROEXCAVADORA HYUNDAI 220	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.518.330	$ 175.276	V	SURA	65557849	$ 100.733	PORVENIR	65557849	$ 402.933	$ 100.733	$ 0	$ 0	Planillas de pago
163	LUIS EMILIO GARCIA TUBERQUIA	3.553.578	OPERADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 1.574.399	$ 109.578	V	SURA	65557849	$ 62.976	COLPENSIONES	65557849	$ 251.904	$ 62.976	$ 0	$ 0	Planillas de pago
164	RICARDO ALBERTO ALZATE LEDESMA	70.856.395	OPERADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.945.906	$ 205.035	V	NUEVA EPS	65557849	$ 117.836	PORVENIR	65557849	$ 471.345	$ 117.836	$ 0	$ 0	Planillas de pago
165	EDINSON ESTEBAN MALDONADO URREGO	1.001.892.665	OPERADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.523.222	$ 175.616	V	SALUD TOTAL	65557849	$ 100.929	PORVENIR	65557849	$ 403.716	$ 100.929	$ 0	$ 0	Planillas de pago
166	GERMAN EDUARDO USUGA LOPEZ	8.414.411	OPERADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.445.708	$ 170.221	V	NUEVA EPS	65557849	$ 97.828	COLPENSIONES	65557849	$ 391.313	$ 97.828	$ 0	$ 0	Planillas de pago
167	YOBAN ALBERTO FLOREZ VELEZ	98.659.480	OPERADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 3.003.165	$ 209.020	V	SURA	65557849	$ 120.127	COLPENSIONES	65557849	$ 480.506	$ 120.127	$ 0	$ 0	Planillas de pago
168	WILSON JAVIER RESTREPO CHALARCA	1.033.336.180	OPERADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 3.764.180	$ 261.987	V	SALUD TOTAL	65557849	$ 150.567	PROTECCION	65557849	$ 602.269	$ 150.567	$ 0	$ 0	Planillas de pago
169	JORGE ISAAC GARCIA MORENO	11.794.536	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 3.401.021	$ 236.711	V	SALUD TOTAL	65557849	$ 136.041	COLPENSIONES	65557849	$ 544.163	$ 136.041	$ 0	$ 0	Planillas de pago
170	JAIRO ANTONIO SOSA TORRES	8.151.261	ERADOR VIBROCOMPACTADOR Hamn	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 1.809.477	$ 125.940	V	SURA	65557849	$ 72.379	COLPENSIONES	65557849	$ 289.516	$ 72.379	$ 0	$ 0	Planillas de pago
171	JOHAN HEIBER HIGUITA GAVIRIA	71.224.968	OPERADOR MIXER	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 3.259.846	$ 226.885	V	NUEVA EPS	65557849	$ 130.394	PORVENIR	65557849	$ 521.575	$ 130.394	$ 0	$ 0	Planillas de pago
172	PABLO CHAVERRA ROBLEDO	4.807.759	OPERADOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.241.824	$ 156.031	V	SURA	65557849	$ 89.673	-	65557849	$ 358.692	$ 89.673	$ 0	$ 0	Planillas de pago - PENSIONAD
173	LIBARDO ANTONIO PERTUZ BERNAL	1.066.734.776	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.162.598	$ 150.517	V	SALUD TOTAL	65557849	$ 86.504	PORVENIR	65557849	$ 346.016	$ 86.504	$ 0	$ 0	Planillas de pago
174	RAFAEL ANTONIO SANDOVAL MONRROY	6.759.105	OPERADOR BULLDOZER DGN #1	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.724.888	$ 189.652	V	SALUD TOTAL	65557849	$ 108.996	COLPENSIONES	65557849	$ 435.982	$ 108.996	$ 0	$ 0	Planillas de pago
175	JOHANI ARLEY SIERRA TAMAYO	71.799.840	CONDUCTOR SUPERNUMERARIO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 2.395.529	$ 166.729	V	NUEVA EPS	65557849	$ 95.821	PORVENIR	65557849	$ 383.285	$ 95.821	$ 0	$ 0	Planillas de pago
176	VICTOR ALONSO VILLA GARCIA	98.463.658	OPERADOR COMPRESOR DOOSAN 18!	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 1.772.826	$ 123.389	V	SURA	65557849	$ 70.913	COLPENSIONES	65557849	$ 283.652	$ 70.913	$ 0	$ 0	Planillas de pago
177	NICANOR JESUS LOPEZ BELTRAN	10.777.140	MECANICO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 4.755.320	$ 330.970	V	SALUD TOTAL	65557849	$ 190.213	COLPENSIONES	65557849	$ 760.851	$ 190.213	$ 0	$ 0	Planillas de pago
178	JOSE ALDEMAR MONTES MORALES	98.595.922	OPERADOR VIBRO VOLVO SD70	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 1.728.099	$ 120.276	V	SALUD TOTAL	65557849	$ 69.124	COLPENSIONES	65557849	$ 276.496	$ 69.124	$ 0	$ 0	Planillas de pago
179	RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA	13.512.049	DIRECTOR DE OBRA	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INGEVIAS SAS	$ 6.862.614	$ 477.638	V	COOSALUD	65560520	$ 274.505	PROTECCION	65560520	$ 1.098.018	$ 274.505	$ 0	$ 0	Planillas de pago
180	GERMAN ANTONIO OSPINA MORA	14.241.498	CONDUCTOR VOLQUETA - SOO 023	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INVERSIONES Y TRANSPORTES JEX ZOMAC SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65046468	$ 46.400	COLPENSIONES	65046468	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
181	ANTONIO MARIA ZAPATA TORO	70.098.394	CONDUCTOR VOLQUETA - LLA 372	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		INVERSIONES Y TRANSPORTES JEX ZOMAC SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65046468	$ 46.400	COLPENSIONES	65046468	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
182	JOSE ROBINSON TAPASCO TAPASCO	9.910.950	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONCRECARGO SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	III	FAMISANAR	7894832039	$ 46.400	COLFONDOS	7894832039	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
183	ALEXANDER PACHON	79.702.699	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONCRECARGO SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	III	NUEVA EPS	7894832039	$ 46.400	PORVENIR	7894832039	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
184	JOSE MANUEL HERNANDEZ BONILLA	10.174.681	OPERADOR DE MIXER	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONCRECARGO SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	III	NUEVA EPS	7894832039	$ 46.400	COLFONDOS	7894832039	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
185	PAULA ANDREA VALENCIA OSORIO	25.102.621	SST	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.500.000	$ 104.400	V	SALUD TOTAL	27580012	$ 60.000	COLFONDOS	27580012	$ 240.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
186	ARIS ARIEL ACOSTA VERGARA	1.126.255.656	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.500.000	$ 104.400	V	SALUD TOTAL	27580012	$ 60.000	PORVENIR	27580012	$ 240.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
187	CARLOS ANDRES PEREZ DUARTE	1.040.382.256	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.400.000	$ 97.440	V	NUEVA EPS	27580012	$ 56.000	PORVENIR	27580012	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
188	WILSON MONTOYA TASCON	1.007.214.090	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 580.000	$ 40.368	V	NUEVA EPS	27580012	$ 23.200	PORVENIR	27580012	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	Planillas de pago
189	YELBI YOJANI CASTILLO OCAMPO	1.060.871.847	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.400.000	$ 97.440	V	NUEVA EPS	27580012	$ 56.000	PORVENIR	27580012	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
190	FRANCISCO NEQUITA BATEZA	1.135.184.712	PILERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	PIJAO SALUD	27580012	$ 46.400	PORVENIR	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
191	RICHARD JESUS MEDINA MEDINA	IPCPOL5773834	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	COOSALUD	27580012	$ 46.400	PORVENIR	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
192	ANTONY YOSUE BARAZARTE ARAUJO	PT6712796	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27580012	$ 46.400	PORVENIR	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
193	ALBARO LLOREDA MATURANA	10.134.853	AYUDANTE PRACTICO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27580012	$ 46.400	PORVENIR	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
194	EMILSON MATURANA MATURANA	1.093.535.487	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	COOSALUD	27580012	$ 46.400	PROTECCION	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
195	DOMINGO MORENO MENA	1.077.437.990	RONDERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27580012	$ 46.400	COLFONDOS	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
196	JULIO CESAR CASTRO VINASCO	1.007.444.287	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27580012	$ 46.400	PORVENIR	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
197	YEISON ARLEY COSSIO PEREA	1.041.086.175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 580.000	$ 40.368	V	SOS	27580012	$ 23.200	PORVENIR	27580012	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	Planillas de pago
198	LUIS EDUARDO ANTIVIA CORREA	1.076.380.446	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 899.334	$ 62.594	V	NUEVA EPS	27580012	$ 35.973	PROTECCION	27580012	$ 143.893	$ 35.973	$ 0	$ 0	Planillas de pago
199	JAIME PATAQUI SANAPI	11.955.335	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 899.334	$ 62.594	V	NUEVA EPS	27580012	$ 35.973	PORVENIR	27580012	$ 143.893	$ 35.973	$ 0	$ 0	Planillas de pago
200	AGUSTIN NIAZA DELGADO	1.093.535.673	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 657.334	$ 45.750	V	NUEVA EPS	27580012	$ 26.293	PROTECCION	27580012	$ 105.173	$ 26.293	$ 0	$ 0	Planillas de pago
201	SERGIO ARTURO MOSQUERA ASPRILLA	1.039.693.276	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	27580012	$ 46.400	PORVENIR	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
202	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	1.133.719.452	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.300.000	$ 90.480	V	NUEVA EPS	27580012	$ 52.000	PORVENIR	27580012	$ 208.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
203	WILLIAM ALBERTO MOSQUERA MOSQUERA	1.076.385.354	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	27580012	$ 46.400	PORVENIR	27580012	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
204	JOSE GERMAN LLOREDA RAMIREZ	9.735.343	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 1.400.000	$ 97.440	V	NUEVA EPS	27580012	$ 56.000	COLFONDOS	27580012	$ 224.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
205	EDUARDO ESCOBAR RODRIGUEZ	18.606.705	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 812.000	$ 56.515	V	NUEVA EPS	27580012	$ 32.480	PORVENIR	27580012	$ 129.920	$ 32.480	$ 0	$ 0	Planillas de pago
206	ALEJANDRO PATIÑO HIDALGO	10.011.693	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 77.334	$ 5.382	V	SALUD TOTAL	27580012	$ 3.093	COLPENSIONES	27580012	$ 12.373	$ 3.093	$ 0	$ 0	Planillas de pago
207	OMAR CASTRO MONDRAGON	1.111.756.563	CONDUCTOR	$ 1.160.000	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DARIO DE JESUS QUINTERO VASQUEZ	$ 0	$ 0	V	NUEVA EPS	-	$ 0	COLFONDOS	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
208	OMAR SEGUNDO GARCIA CIFUENTES	13.957.790	ENCARGADO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OGC.CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	8626750146	$ 46.400	PORVENIR	8626750146	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
209	YUSETH ANDRES HERNANDEZ	13.958.841	PILERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OGC.CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	8626750146	$ 46.400	PORVENIR	8626750146	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
210	FLAVIO ALBERTO ORREGO MURIEL	71.411.276	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OGC.CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	8626750146	$ 46.400	PORVENIR	8626750146	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
211	LUIS EDUARDO RUBIO REYNA	14.271.468	OFICIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OGC.CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	8626750146	$ 46.400	COLPENSIONES	8626750146	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
212	LUIS ANTONIO MARTINEZ OCAMPO	71.022.239	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-		OGC.CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 966.667	$ 67.280	V	NUEVA EPS	8626750146	$ 38.667	PROTECCION	8626750146	$ 154.667	$ 38.667	$ 0	$ 0	Planillas de pago
213	CRISTIAN DAVID ALVAREZ GOMEZ	1.110.089.367	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OGC.CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.736	V	ASMET SALUD	8626750146	$ 46.400	PORVENIR	8626750146	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
214	AZAEL ANTONIO HERRERA CAMACHO	1.127.665.354	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OGC.CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	8626750146	$ 46.400	PORVENIR	8626750146	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
215	DIOSEMEL CASTRO BARRERA	8.828.176	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SURA	65803794	$ 46.400	COLFONDOS	65803794	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
216	GABRIEL ARTURO GONZALES WAZORNA	1.093.533.822	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SURA	65803794	$ 46.400	PORVENIR	65803794	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
217	HECTOR ALONSO MESA RAMIREZ	716.992.926	ENCARGADO DE OBRA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 1.500.000	$ 104.400	V	SURA	65803794	$ 60.000	COLPENSIONES	65803794	$ 240.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
218	EDILSON DAVID GUISAO	8.338.332	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	65803794	$ 46.400	PORVENIR	65803794	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
219	JUAN DARIO LENES POLO	10.782.380	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	65803794	$ 46.400	COLPENSIONES	65803794	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
220	JOSE DANIEL SIAGAMA ARCE	1.007.214.326	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	65803794	$ 46.400	PORVENIR	65803794	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
221	MIGUEL MARINO VERGARA CUADRADO	1.040.378.324	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 116.000	$ 8.074	V	NUEVA EPS	65803794	$ 4.640	PORVENIR	65803794	$ 18.560	$ 4.640	$ 0	$ 0	Planillas de pago
222	WILMAR SIAGAMA RESTREPO	1.135.184.166	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 1.160.000	$ 80.736	V	PIJAO SALUD	65803794	$ 46.400	COLPENSIONES	65803794	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
223	HEIDER SIAGAMA ARCE	1.007.213.732	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 154.668	$ 10.765	V	PIJAO SALUD	65803794	$ 6.187	PORVENIR	65803794	$ 24.747	$ 6.187	$ 0	$ 0	Planillas de pago
224	OSCAR GONZALES CARRASCO	1.093.533.720	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 0	$ 0	V	PIJAO SALUD	-	$ 0	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
225	YECID MOSQUERA ROA	1.133.719.739	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCTORA CIVILES MESA	$ 0	$ 0	V	SALUD TOTAL	-	$ 0	PROTECCION	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
226	JHON JAIRO LOPEZ VALENCIA	10.265.116	OPERADOR CARGADOR Hyundai	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PO ARANGO GABRIEL JAIME - GJM MAQUINARIA - GJM	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SURA	65567739	$ 46.400	COLPENSIONES	65567739	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
227	LUIS FERNANDO BERRIO RODRIGUEZ	1.128.399.727	OPERADOR CARGADOR DOSSAN 300	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PO ARANGO GABRIEL JAIME - GJM MAQUINARIA - GJM	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	65567739	$ 46.400	COLPENSIONES	65567739	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
228	JORGE LUIS UPARELA CONTRERAS	15.679.160	OPERADOR RETRO EXCAVADODORA I	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PO ARANGO GABRIEL JAIME - GJM MAQUINARIA - GJM	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SURA	65567739	$ 46.400	PROTECCION	65567739	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
229	FERNAN ELIAS OROZCO MORENO	78.301.878	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PO ARANGO GABRIEL JAIME - GJM MAQUINARIA - GJM	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	65567739	$ 46.400	COLPENSIONES	65567739	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
230	YOBANY DE JESUS GRANDA MUÑOZ	70.541.131	OPERADOR RETROEXCAVADORA	$ 1.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JORGE ALBERTO PALACIO POSADA SAS	$ 1.700.000	$ 118.320	V	SALUD TOTAL	7897403392	$ 68.000	PROTECCION	7897403392	$ 272.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
231	NORBERTO RAMON CELESTINO CATAÑO	1.032.254.630	OPERADOR EXCAVADORA 416E	$ 1.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JORGE ALBERTO PALACIO POSADA SAS	$ 1.600.000	$ 111.360	V	NUEVA EPS	7897403392	$ 64.000	PORVENIR	7897403392	$ 256.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	planillas de pago
232	JAIME ALBERTO CORREA HERRERA	71.391.827	CONDUCTOR	$ 1.763.818	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ENGICO	$ 2.657.987	$ 184.996	V	SURA	65743731	$ 106.319	COLPENSIONES	65743731	$ 425.278	$ 106.319	$ 0	$ 0	Planillas de pago
233	RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA	71.393.522	CONDUCTOR	$ 1.763.818	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ENGICO	$ 3.142.720	$ 218.733	V	SURA	65743731	$ 125.709	COLPENSIONES	65743731	$ 502.835	$ 125.709	$ 0	$ 0	Planillas de pago
234	GHOVANNIS GONZALEZ MEZA	1.066.722.462	AUX LABORATORIO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		IAE	$ 3.981.971	$ 277.145	V	NUEVA EPS	65554804	$ 159.279	PORVENIR	65554804	$ 637.115	$ 159.279	$ 0	$ 0	Planillas de pago
235	LUIS ALFONSO GONZALEZ GALARCIO	11.105.779	AUX LABORATORIO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		IAE	$ 1.739.122	$ 121.043	V	NUEVA EPS	65554804	$ 69.565	COLPENSIONES	65554804	$ 278.260	$ 69.565	$ 0	$ 0	Planillas de pago
236	PABLO CESAR VALENCIA AGUDELO	97.290.092	INGENIERO DE PLANTA	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		IAE	$ 5.090.400	$ 354.292	V	NUEVA EPS	65554804	$ 203.616	PORVENIR	65554804	$ 814.464	$ 203.616	$ 0	$ 0	Planillas de pago
237	YEINS SEBASTIAN CANO RODRIGUEZ	1.151.198.490	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		IAE	$ 961.731	$ 66.936	V	ASMET SALUD	65554804	$ 38.469	PORVENIR	65554804	$ 153.877	$ 38.469	$ 0	$ 0	Planillas de pago
238	JAIME DE JESUS CAÑAS VELEZ	71.490.622	OPERADOR TRITURADORA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		IAE	$ 2.437.149	$ 169.626	V	NUEVA EPS	65554804	$ 97.486	COLPENSIONES	65554804	$ 389.944	$ 97.486	$ 0	$ 0	Planillas de pago
239	HAROLD HUMBERTO SALCEDO CUESTA	16.937.104	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		IAE	$ 1.663.511	$ 115.780	V	SOS	65554804	$ 66.540	PORVENIR	65554804	$ 266.162	$ 66.540	$ 0	$ 0	Planillas de pago
240	JOSE ABELARDO CHAVARRIA ECHAVARRIA	98.541.539	SOLDADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		IAE	$ 2.123.231	$ 147.777	V	SURA	65554804	$ 84.929	COLPENSIONES	65554804	$ 339.717	$ 84.929	$ 0	$ 0	Planillas de pago
241	ANCIZAR SERNA COSSIO	10.050.355	Operador	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.240.069	$ 86.309	V	NUEVA EPS	9455988569	$ 49.603	PROTECCION	9455988569	$ 198.411	$ 49.603	$ 0	$ 0	Planillas de pago
242	VANESSA MENA ASPRILLA	1.006.295.479	Inspector sst	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.250.000	$ 87.000	V	NUEVA EPS	9455988569	$ 50.000	PORVENIR	9455988569	$ 200.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
243	MANUEL ESPIRITU MOSQUERA	11.740.096	Rastrillero	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.324.035	$ 92.153	V	SOS	9455988569	$ 52.961	COLFONDOS	9455988569	$ 211.846	$ 52.961	$ 0	$ 0	Planillas de pago

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

244	JHON NEIDER AGUDELO S	1.112.786.058	Inspector de obra	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.443.000	$ 100.433	V	SOS	9455988569	$ 57.720	PORVENIR	9455988569	$ 230.880	$ 57.720	$ 0	$ 0	Planillas de pago
245	JOEL ORTA	1595976 #permiso	TOPOGRAFO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 2.449.410	$ 170.479	V	NUEVA EPS	9455988569	$ 97.976	PORVENIR	9455988569	$ 391.906	$ 97.976	$ 0	$ 0	Planillas de pago
246	RAMIRO GÓMEZ RUA	2.471.405	AYUDANTE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SOS	9455988569	$ 46.400	PORVENIR	9455988569	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
247	FERNANDO VALENCIA	10.175.936	OPERADOR COMPRESOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.283.342	$ 89.321	V	SOS	9455988569	$ 51.334	COLFONDOS	9455988569	$ 205.335	$ 51.334	$ 0	$ 0	Planillas de pago
248	LUIS ALBERTO URBANO GARCIA	1.118.549.929	TORNILLERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.443.364	$ 100.458	V	SANITAS	9455988569	$ 57.735	PORVENIR	9455988569	$ 230.938	$ 57.735	$ 0	$ 0	Planillas de pago
249	JOSÉ CAMILO MOSQUERA	16.231.947	RASTRILLERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.430.361	$ 99.553	V	SOS	9455988569	$ 57.214	PORVENIR	9455988569	$ 228.858	$ 57.214	$ 0	$ 0	Planillas de pago
250	DAVID STIVEN CASTAÑEDA VALENCIA	1.114.733.543	AYUDANTE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 2.100.000	$ 146.160	V	SURA	9455988569	$ 84.000	PROTECCION	9455988569	$ 336.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
251	DIÓGENES CANDELA	6.361.257	CONDUCTOR AGK 030	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.230.000	$ 85.608	V	SOS	9455988569	$ 49.200	PORVENIR	9455988569	$ 196.800	$ 49.200	$ 0	$ 0	Planillas de pago
252	CARLOS ARTURO RESTREPO	14.725.146	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.210.000	$ 84.216	V	SOS	9455988569	$ 48.400	PROTECCION	9455988569	$ 193.600	$ 48.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
253	ARLES DE JESÚS GRISALES	2.474.029	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 2.100.000	$ 146.160	V	COMPENSAR	9455988569	$ 84.000	COLFONDOS	9455988569	$ 336.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
254	GUSTAVO DE JESÚS GRISALES	6.119.280	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.410.046	$ 98.139	V	SOS	9455988569	$ 56.402	PROTECCION	9455988569	$ 225.607	$ 56.402	$ 0	$ 0	Planillas de pago
255	DIOMEDES HERNÁNDEZ	16.233.093	RASTRILLERO	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.324.035	$ 92.153	V	COOSALUD	9455988569	$ 52.961	PORVENIR	9455988569	$ 211.846	$ 52.961	$ 0	$ 0	Planillas de pago
256	RENE ALEXANDER CANO	6.239.846	OPERADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 2.100.000	$ 146.160	V	SOS	9455988569	$ 84.000	PROTECCION	9455988569	$ 336.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
257	DARWIN GUZMÁN	1.010.025.028	IMPRIMADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.257.124	$ 87.496	V	SOS	9455988569	$ 50.285	PORVENIR	9455988569	$ 201.140	$ 50.285	$ 0	$ 0	Planillas de pago
258	ALBER MOSQUERA	10.022.231	OPERADOR CARRO TANQUE WHH 29	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.210.000	$ 84.216	V	CRUZ BLANCA	9455988569	$ 48.400	COLPENSIONES	9455988569	$ 193.600	$ 48.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
259	MIGUEL RODRÍGUEZ HEREDIA	3692143#permiso	AYUDANTE OBRA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T Y C	$ 1.160.000	$ 80.736	V	CRUZ BLANCA	9455988569	$ 46.400	PORVENIR	9455988569	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
260	JONH JAIRO PRECIADO ÑAÑEZ	93.238.962	PROFESIONAL SST	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	9456166816	$ 46.400	PROTECCION	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
261	ANGIE ANAMARIA RODRIGUEZ FANDIÑO	1.118.124.998	AUXILIAR HSE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
262	JESUS MARIA ARRIETA OLIVARES	1.104.010.376	OPERADOR PERFORACIONES	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SANITAS	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
263	JOSE LUIS PARADA BARAJAS	1.006.531.600	GERENTE	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
264	DIEGO ALEJANDRO GOMEZ VEGA	1.118.121.428	AUX PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 580.000	$ 40.368	V	CAPRESOCA	9456166816	$ 23.200	PORVENIR	9456166816	$ 92.800	$ 23.200	$ 0	$ 0	Planillas de pago
265	ANCIZAR ECHEVERRY CARRASCAL	1.006.440.939	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SANITAS	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
266	EPIFANIO MEZA MEZA	5.226.304	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.500.000	$ 104.400	V	NUEVA EPS	9456166816	$ 60.000	PROTECCION	9456166816	$ 240.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	Planillas de pago
267	DIEGO FERNANDO AUSIQUE RUIZ	1.007.531.204	OPERADOR PERFORACIONES	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
268	JOSE LEONIDAS GARCIA PABON	1.118.123.754	OPERADOR PERFORACIONES	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	CAPRESOCA	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
269	JORGE MOISES CUESTA ZEA	1.118.200.642	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	CAPRESOCA	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
270	WILMAR ERNEY CABEZAS LESMES	1.058.324.343	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	CAPRESOCA	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
271	MIGUEL ANGEL CRUZ TRIVIÑOZ	1.004.280.857	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
272	BLADIMIR ANTONIO DE ANGEL HOLGUIN	12.694.000	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
273	WIMER ARMANDO SIZA MORA	1.118.124.918	AUX DE PERFORACION	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SANITAS	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
274	DIANA CAROLINA AGUIRRE BENAVIDES	1.118.123.956	AUX SST	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	CAPRESOCA	9456166816	$ 46.400	PORVENIR	9456166816	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
275	JESUS ALONSO CARDENAS BERDUGO	1.101.693.095	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CLAUDIA MARCELA MARTINEZ QUECANO	$ 0	$ 0	V	NUEVA EPS	-	$ 0	PROTECCION	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
276	JAIRSINIO POZO ROBLES	13.850.682	INSPECTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 1.160.000	$ 50.460	V	SANITAS	8626790900	$ 46.400	PORVENIR	8626790900	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
277	DIEGO ALEJANDRO CARDONA GRAJALES	1.093.539.715	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 1.160.000	$ 50.460	V	NUEVA EPS	8626790900	$ 46.400	PORVENIR	8626790900	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
278	WILINTON DE JESUS GUEVARA GRANADA	1.005.020.916	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 38.667	$ 1.682	V	NUEVA EPS	8626790900	$ 1.547	PROTECCION	8626790900	$ 6.187	$ 1.547	$ 0	$ 0	Planillas de pago
279	WILSON MARINO DIAZ MUÑOZ	1.193.238.805	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 1.160.000	$ 50.460	V	NUEVA EPS	8626790900	$ 46.400	PORVENIR	8626790900	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
280	YEISON RODRIGO CARDONA BERMUDEZ	1.093.532.107	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 1.160.000	$ 50.460	V	ASMET SALUD	8626790900	$ 46.400	COLPENSIONES	8626790900	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
281	GABRIEL ARNULFO PEÑA QUINTANILLA	1.101.201.182	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 1.160.000	$ 50.460	V	SANITAS	8626790900	$ 46.400	PORVENIR	8626790900	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
282	ANGGIE YULIETH BOLAÑOS LOPEZ	1.111.785.906	AUX SST	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 734.667	$ 31.958	V	COLPENSIONES	8626790900	$ 29.387	SALUD TOTAL	8626790900	$ 117.547	$ 29.387	$ 0	$ 0	Planillas de pago
283	ANGGIE YULIETH BOLAÑOS LOPEZ	1.111.785.906	AUX SST	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 734.667	$ 31.958	V	SALUD TOTAL	8626790900	$ 29.387	COLPENSIONES	8626790900	$ 117.547	$ 29.387	$ 0	$ 0	Planillas de pago
284	BAYRON ALEXANDER DELGADO GARCIA	87.551.602	OPERADOR	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 541.334	$ 23.548	V	EMS SANAR	8626790900	$ 21.653	PROTECCION	8626790900	$ 86.613	$ 21.653	$ 0	$ 0	Planillas de pago
285	CARLOS ANDRES ARCINIEGAS LEYTON	1.087.421.075	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 1.160.000	$ 50.460	V	SANITAS	8626790900	$ 46.400	PORVENIR	8626790900	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
286	JHON ALEXANDER ESCOBAR SANTADER	1.004.592.652	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 502.667	$ 21.866	V	EMS SANAR	8626790900	$ 20.107	PORVENIR	8626790900	$ 80.427	$ 20.107	$ 0	$ 0	Planillas de pago
287	JOSE ALEJANDRO VILLALOBOS ORTIZ	1.085.339.854	APOYO LOGISTICO	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 541.334	$ 23.548	V	SANITAS	8626790900	$ 21.653	COLPENSIONES	8626790900	$ 86.613	$ 21.653	$ 0	$ 0	Planillas de pago
288	MARIO LAUREANO SANTANDER GUANGA	87.550.791	OPERADOR	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 38.667	$ 1.682	V	SURA	8626790900	$ 1.547	COLPENSIONES	8626790900	$ 6.187	$ 1.547	$ 0	$ 0	Planillas de pago
289	YENER YECID GUANGA NASTACUAS	1.087.076.124	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 309.334	$ 13.456	V	MALLAMAS	8626790900	$ 12.373	PORVENIR	8626790900	$ 49.493	$ 12.373	$ 0	$ 0	Planillas de pago
290	RODRIGO SANTANDER CELSO	87.551.087	OPERADOR	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 502.667	$ 21.866	V	SANITAS	8626790900	$ 20.107	PORVENIR	8626790900	$ 80.427	$ 20.107	$ 0	$ 0	Planillas de pago
291	SANTIAGO DARIO BENAVIDES NARVAEZ	87.061.603	SUPERVISOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 1.160.000	$ 50.460	V	SANITAS	8626789626	$ 46.400	PORVENIR	8626789626	$ 185.600	$ 46.400	$ 0	$ 0	Planillas de pago
292	BAYRON ALEXANDER DELGADO GARCIA	87.551.602	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 541.334	$ 37.677	V	EMS SANAR	8626789626	$ 21.653	PROTECCION	8626789626	$ 86.613	$ 21.653	$ 0	$ 0	Planillas de pago
293	DANNY RAFAEL DIAZ VASQUEZ	1.146.822	MECANICO	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 0	$ 0	V	NUEVA EPS	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
294	EDINSON MORALES GIRALDO	1.093.540.311	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 0	$ 0	V	ASMET SALUD	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
295	ANDRES ENRIQUE DIAZ MUÑOZ	1.232.589.716	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 0	$ 0	V	NUEVA EPS	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
296	BRANDON DIAZ MUÑOZ	1.232.589.714	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 0	$ 0	V	NUEVA EPS	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
297	JHON ALEJANDRO HOYOS HENAO	1.004.994.022	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 0	$ 0	V	NUEVA EPS	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
298	JHON SEBASTIAN YANDAR SANTACRUZ	1.004.543.036	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 0	$ 0	V	NUEVA EPS	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion
299	JOSE DANILO SANTACRUZ PEREZ	1.085.319.938	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA	$ 0	$ 0	V	EMS SANAR	-	$ 0	PORVENIR	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Documentos de afiliacion

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ------------------------------ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAÚL OSWALDO ARDILA PINEDA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-103317 STD

Firma
Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 19/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 1757 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2023

PROYECTO: QUIIBDO - PEREIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1832 de 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal/ Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	
2021	222521	C-2401-0600-75-0-2401008-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 30.873.530.935,00	$ -	RP 222521 de marzo 09 de 2021
2021	222521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 3.826.579.064,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 4.209.019.452,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 555.432.881,00	$ 1.805.141.173,61	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401020-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 19.498.857.130,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401023-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 12.013.547.667,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401029-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 2.577.620.117,40		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401029-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 7.039.779.883,00		
2022	92022	C-2401-0600-75-0-2401008-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 84.303.874.400,00	$ -	RP 92022 de enero 25 de 2022
2022	92022	C-2401-0600-75-0-2401017-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 14.996.125.600,00		
2022	1066222	C-2401-0600-75-0-2401029-02	20	PROPIO	1757 DE 2020	$ 800.000.000,00	$ 22.779.723.288,36	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022
2022	1066222	C-2401-0600-75-0-2401029-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 25.000.000.000,00		
						$ 205.694.367.129,40	**$ 24.584.864.461,97**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 205.694.367.129,40**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	N° y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
									RP 222521 de marzo 09 de 2021	**34.700.109.999,00**						
	Anticipo	**abr-21**				**$ 3.826.579.064,00**		$ 3.826.579.064,00	**RP 222521 de marzo 09 de 2021**	**$ 30.873.530.935,00**			**33235 - 21/04/2021**	X		
								$ 3.826.579.064,00	**RP 222521 de marzo 09 de 2021**	**$ 30.873.530.935,00**			**33235 - 21/04/2021**			
	Anticipo					**$ 20.655.362.515,00**		$ 24.481.941.579,00	RP 222521 de marzo 09 de 2021	**$ 10.218.168.420,00**				X		
1	Obra	19/03/21 A 31/03/21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.481.941.579,00	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 10.218.168.420,00	$ -	$ 205.694.367.129,40	65642 DEL 28-07-2021			
2	Obra	Abril 2021	$ 147.354.552,00	$ 1.076.822,00	$ 148.431.374,00	-$ 29.470.910,40	$ 118.960.463,60	$ 24.452.470.668,60	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 10.099.207.956,40	$ 148.431.374,00	$ 205.545.935.755,40	65642 DEL 28-07-2021	X		
3	Obra	Mayo 2021	$ 317.638.151,80	$ 2.321.202,00	$ 319.959.353,80	-$ 63.527.630,36	$ 256.431.723,44	$ 24.388.943.038,24	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 9.842.776.232,96	$ 468.390.727,80	$ 205.225.976.401,60	60838 DEL 14-07-2021	X		
4	Obra	Junio 2021	$ 667.124.584,20	$ 4.875.141,00	$ 671.999.725,20	-$ 133.424.916,84	$ 538.574.808,36	$ 24.255.518.121,40	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 9.304.201.424,60	$ 1.140.390.453,00	$ 204.553.976.676,40	69831 DEL 6-8-2021	X		
5	Obra	Julio 2021	$ 1.196.141.153,20	$ 8.741.032,00	$ 1.204.882.185,20	-$ 239.228.230,64	$ 965.653.954,56	$ 24.016.289.890,76	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 8.338.547.470,04	$ 2.345.272.638,20	$ 203.349.094.491,20	77637 DEL 27-8-2021	X		
6	Obra	Agosto 2021	$ 2.631.271.182,20	$ 19.228.520,00	$ 2.650.499.702,20	-$ 526.254.236,44	$ 2.124.245.465,76	$ 23.490.035.654,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 6.214.302.004,28	$ 4.995.772.340,40	$ 200.698.594.789,00	88564 DEL 24-09-2021	X		
6	Social	Agosto 2021	$ 563.128.137,00	$ 4.607.413,20	$ 567.735.550,20	$ -	$ 567.735.550,20	$ 23.490.035.654,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.646.566.454,08	$ 5.563.507.890,60	$ 200.130.859.238,80	88564 DEL 24-09-2021	X		
6	Predial	Agosto 2021	$ 7.687.500,00	$ 35.625,00	$ 7.723.125,00	$ -	$ 7.723.125,00	$ 23.490.035.654,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.638.843.329,08	$ 5.571.231.015,60	$ 200.123.136.113,80	88564 DEL 24-09-2021	X		
6	TOTAL				$ 3.225.958.377,40											
						$ -	$ -		RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.638.843.329,08	$ 5.571.231.015,60	$ 200.123.136.113,80				
1	Ajustes	19/03/21 A 31/03/21	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 23.490.035.654,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.638.843.329,08	$ 5.571.231.015,60	$ 200.123.136.113,80	96681 DEL 15-10-2021	X		
2	Ajustes	Abril 2021	$ 1.373.380,40	$ 10.036,00	$ 1.383.416,40	-$ 274.676,08	$ 1.108.740,32	$ 23.489.760.978,24	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.637.734.588,76	$ 5.572.614.432,00	$ 200.121.752.697,40	96681 DEL 15-10-2021	X		
3	Ajustes	Mayo 2021	$ 4.779.092,56	$ 34.924,00	$ 4.814.016,56	-$ 955.818,51	$ 3.858.198,05	$ 23.488.805.159,73	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.633.876.390,71	$ 5.577.428.448,56	$ 200.116.938.680,84	96697 DEL 15-10-2021	X		
4	Ajustes	Junio 2021	$ 11.641.795,64	$ 85.075,00	$ 11.726.870,64	-$ 2.328.359,13	$ 9.398.511,51	$ 23.486.476.800,60	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.624.477.879,20	$ 5.589.155.319,20	$ 200.105.211.810,20	96703 DEL 15-10-2021	X		
5	Ajustes	Julio 2021	$ 23.336.172,44	$ 170.534,00	$ 23.506.706,44	-$ 4.667.234,49	$ 18.839.471,95	$ 23.481.809.566,11	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.605.638.407,25	$ 5.612.662.025,64	$ 200.081.705.103,76	96711 DEL 15-11-2021	X		
6	Ajustes	Agosto 2021	$ 60.796.572,24	$ 444.283,00	$ 61.240.855,24	-$ 12.159.314,45	$ 49.081.540,79	$ 23.469.650.251,66	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 5.556.556.866,46	$ 5.673.902.880,88	$ 200.020.464.248,52	112349 DEL 25-11-2021	X		
7	Obra	Septiembre 2021	$ 3.872.285.209,28	$ 28.297.469,00	$ 3.900.582.678,28	-$ 774.457.041,86	$ 3.126.125.636,42	$ 22.695.193.209,80	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 2.430.431.230,04	$ 9.574.485.559,16	$ 196.119.881.570,24	99485 DEL 25-10-2021	X		
7	Social	Septiembre 2021	$ 688.267.723,00	$ 5.631.282,80	$ 693.899.005,80	$ -	$ 693.899.005,80	$ 22.695.193.209,80	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 1.736.532.224,24	$ 10.268.384.564,96	$ 195.425.982.564,44	99485 DEL 25-10-2021	X		
7	Predial	Septiembre 2021	$ 23.402.318,00	$ 151.269,00	$ 23.553.587,00	$ -	$ 23.553.587,00	$ 22.695.193.209,80	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 1.712.978.637,24	$ 10.291.938.151,96	$ 195.402.428.977,44	99485 DEL 25-10-2021	X		
7	TOTAL				$ 4.618.035.271,08											
						$ -	$ -		RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 1.712.978.637,24	$ 10.291.938.151,96	$ 195.402.428.977,44				
7	Ajustes	Septiembre 2021	$ 99.171.467,58	$ 724.715,00	$ 99.896.182,58	-$ 19.834.293,52	$ 80.061.889,06	$ 22.675.358.916,28	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 1.632.916.748,18	$ 10.391.834.334,54	$ 195.302.532.794,86	115862 DEL 3-12-2021	X		
8	Obra	Octubre 2021	$ 4.587.709.852,72	$ 33.525.572,00	$ 4.621.235.424,72	-$ 4.000.000.000,00	$ 621.235.424,72	$ 18.675.358.916,28	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 1.011.681.323,46	$ 15.013.069.759,26	$ 190.681.297.370,14	124718 DEL 22-12-2021	X		
8	Social	Octubre 2021	$ 48.130.610,00	$ 393.796,00	$ 48.524.406,00	$ -	$ 48.524.406,00	$ 18.675.358.916,28	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 963.156.917,46	$ 15.061.594.165,26	$ 190.632.772.964,14	124718 DEL 22-12-2021	X		
8	TOTAL				$ 4.669.759.830,72											
						$ -	$ -		RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 963.156.917,46	$ 15.061.594.165,26	$ 190.632.772.964,14				
8	Ajustes Prov.	Octubre 2021	$ 113.315.269,82	$ 828.073,00	$ 114.143.342,82	-$ 22.663.053,96	$ 91.480.288,86	$ 18.652.695.862,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 871.676.628,60	$ 15.175.737.508,08	$ 190.518.629.621,32	116380 DEL 6-12-2021	X		
9	Obra	Noviembre 2021	$ 7.756.382.288,40	$ 56.681.255,00	$ 7.813.063.543,40	-$ 7.000.000.000,00	$ 813.063.543,40	$ 11.652.695.862,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 58.613.085,20	$ 22.988.801.051,48	$ 182.705.566.077,92	128354 DEL 31/12/2021	X		
8	Ajustes Def.	Octubre 2021	-$ 837.578,00	-$ 6.121,00	-$ 843.699,00	$ -	-$ 843.699,00	$ 11.652.695.862,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 59.456.784,20	$ 22.987.957.352,48	$ 182.706.409.776,92	127507 DEL 29-12-2021	X		
9	Ajustes Prov.	Noviembre 2021	$ 183.132.577,28	$ 1.338.277,00	$ 184.470.854,28	-$ 130.000.000,00	$ 54.470.854,28	$ 11.522.695.862,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ 4.985.929,92	$ 23.172.428.206,76	$ 182.521.938.922,64	127507 DEL 29-12-2021	X		
						$ -	$ -		**RP 1057521 de diciembre 22 de 2021**	**$ 45.894.257.130,40**	$ 23.172.428.206,76	$ 182.521.938.922,64		X		
10	Obra	Diciembre 2022	$ 12.758.984.620,60	$ 93.238.734,00	$ 4.985.929,92	$ -	$ 4.985.929,92	$ 11.522.695.862,32	RP 222521 de marzo 09 de 2021	$ -	$ 23.177.414.136,68	$ 182.516.952.992,72	1255583 DEL 23/12/2021	X		
					$ 12.847.237.424,68	-$ 2.900.000.000,00	$ 9.947.237.424,68	$ 8.622.695.862,32	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 35.947.019.705,72	$ 36.024.651.561,36	$ 169.669.715.568,04		X		
10	Ajustes Prov.	Diciembre 2022	$ 356.258.099,52	$ 2.603.425,00	$ 358.861.524,52	$ -	$ 358.861.524,52	$ 8.622.695.862,32	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 35.588.158.181,20	$ 36.383.513.085,88	$ 169.310.854.043,52	128370 DEL 31-12-21	X		
10	TOTAL				$ 13.211.084.879,12											
9	Ajustes Def.	Noviembre 2021	$ 4.827.715,00	$ 35.279,00	$ 4.862.994,00	$ -	$ 4.862.994,00	$ 8.622.695.862,32	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 35.583.295.187,20	$ 36.388.376.079,88	$ 169.305.991.049,52	128582 DEL 31-12-2021	X		
	Anticipo					**3.133.052.998,40**		$ 11.755.748.860,72	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	**32.450.242.188,80**	$ 36.388.376.079,88	$ 169.305.991.049,52	128743 DEL 31-12-21	X		
							$ -		**RP 92022 de enero 25 de 2022**	**99.300.000.000,00**	$ 36.388.376.079,88	$ 169.305.991.049,52				
11	Obra	Enero 2022	$ 6.679.969.763,60	$ 48.815.164,00	$ 6.644.305.030,40	-$ 1.400.000.000,00	$ 5.244.305.030,40	$ 10.355.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 94.055.694.969,60	$ 43.032.681.110,28	$ 162.661.686.019,12	27608 DEL 22-03-22	X		
					$ 84.479.897,20		$ 84.479.897,20	$ 10.355.748.860,72	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 32.365.762.291,60	$ 43.117.161.007,48	$ 162.577.206.121,92	27608 DEL 22-03-22	X		
11	Social	Enero 2022	$ 40.189.059,35	$ 328.819,66	$ 40.517.879,01	$ -	$ 40.517.879,01	$ 10.355.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 94.015.177.090,59	$ 43.157.678.886,49	$ 162.536.688.242,91		X		
11	TOTAL				$ 6.769.302.806,61											
						$ -	$ -			$ 94.015.177.090,59	$ 43.157.678.886,49	$ 162.536.688.242,91				
10	Ajustes Def.	Diciembre 2021	$ 54.065.229,00	$ 395.092,00	$ 54.460.321,00	$ -	$ 54.460.321,00	$ 10.355.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 93.960.716.769,59	$ 43.212.139.207,49	$ 162.482.227.921,91	42838 DEL 28-4-2022	X		
11	Ajustes Prov.	Enero 2022	$ 239.187.855,12	$ 1.747.911,00	$ 240.935.766,12	$ -	$ 240.935.766,12	$ 10.355.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 93.719.781.003,47	$ 43.453.074.973,61	$ 162.241.292.155,79	42008 DEL 27-4-2022	X		
12	Obra	Febrero 2022	$ 3.680.100.476,60	$ 26.893.041,90	3.706.993.518,50	-$ 740.000.000,00	$ 2.966.993.518,50	$ 9.615.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 90.752.787.484,97	$ 47.160.068.492,11	$ 158.534.298.637,29	32532 DEL 5-4-2022	X		
12	Ajustes Prov.	Febrero 2022	$ 141.704.310,72	$ 1.035.532,00	142.739.842,72	$ -	$ 142.739.842,72	$ 9.615.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 90.610.047.642,25	$ 47.302.808.334,83	$ 158.391.558.794,57	42013 DEL 9-6-2022	X		
13	Obra	Marzo 2022	$ 4.050.767.684,30	$ 29.601.763,80	4.080.369.448,10	-$ 811.000.000,00	$ 3.269.369.448,10	$ 8.804.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 87.340.678.194,15	$ 51.383.177.782,93	$ 154.311.189.346,47	45392 DEL 6-5-2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 1757 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2023

PROYECTO: QUIIBDO - PEREIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1832 de 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal/ Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	
2021	222521	C-2401-0600-75-0-2401008-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 30.873.530.935,00	$ -	RP 222521 de marzo 09 de 2021
2021	222521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 3.826.579.064,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 4.209.019.452,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 555.432.881,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401020-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 19.498.857.130,00	$ 1.805.141.173,61	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401023-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 12.013.547.667,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401029-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 2.577.620.117,40		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401029-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 7.039.779.883,00		
2022	92022	C-2401-0600-75-0-2401008-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 84.303.874.400,00	$ -	RP 92022 de enero 25 de 2022
2022	92022	C-2401-0600-75-0-2401017-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 14.996.125.600,00		
2022	1066222	C-2401-0600-75-0-2401029-02	20	PROPIO	1757 DE 2020	$ 800.000.000,00	$ 22.779.723.288,36	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022
2022	1066222	C-2401-0600-75-0-2401029-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 25.000.000.000,00		
						$ 205.694.367.129,40	**$ 24.584.864.461,97**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 205.694.367.129,40**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	N° y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
13	Bioseguridad	Marzo 2022	$ 1.214.225,85	$ 5.627,00	1.219.852,85	$ -	$ 1.219.852,85	$ 8.804.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 87.339.458.341,30	$ 51.384.397.635,78	$ 154.309.969.493,62	45392 DEL 6-5-2022	X		
13	TOTAL				$ 4.081.589.300,95											
						$ -	$ -			$ 87.339.458.341,30	$ 51.384.397.635,78	$ 154.309.969.493,62				
13	Ajustes Prov.	Marzo 2022	$ 151.802.215,56	$ 1.109.324,00	152.911.539,56	$ -	$ 152.911.539,56	$ 8.804.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 87.186.546.801,74	$ 51.537.309.175,34	$ 154.157.057.954,06	62700 DEL 15-6-22	X		
14	Obra	Abril 2022	$ 3.188.720.061,20	$ 23.302.185,10	3.212.022.246,30	-$ 640.000.000,00	$ 2.572.022.246,30	$ 8.164.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 84.614.524.555,44	$ 54.749.331.421,64	$ 150.945.035.707,76	60902 DEL 10-6-2022	X		
14	Ajustes Prov.	Abril 2022	$ 98.535.117,04	$ 720.064,00	99.255.181,04	$ -	$ 99.255.181,04	$ 8.164.748.860,72	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 84.515.269.374,40	$ 54.848.586.602,68	$ 150.845.780.526,72	62706 DEL 15-6-2022	X		
15	Obra	Mayo 2022	$ 8.904.565.249,90	$ 65.071.823,00	8.969.637.072,90	-$ 445.228.262,50	$ 8.524.408.810,40	$ 7.719.520.598,22	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 23.841.353.481,20	$ 63.818.223.675,58	$ 141.876.143.453,82	66825 DEL 28-6-22	X		
15	Social	Mayo 2022	$ 4.065.050.000,00	$ 33.259.500,00	4.098.309.500,00	$ -	$ 4.098.309.500,00	$ 7.719.520.598,22	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 19.743.043.981,20	$ 67.916.533.175,58	$ 137.777.833.953,82	66825 DEL 28-6-22	X		
15	Estudios y Diseños	Mayo 2022	$ 601.200.000,00	$ 114.228.000,00	715.428.000,00	$ -	$ 715.428.000,00	$ 7.719.520.598,22	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 19.027.615.981,20	$ 68.631.961.175,58	$ 137.062.405.953,82	66825 DEL 28-6-22	X		
15	Sitios Críticos E&D	Mayo 2022	$ 670.545.913,50	$ 127.403.724,00	797.949.637,50	$ -	$ 797.949.637,50	$ 7.719.520.598,22	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 18.229.666.343,70	$ 69.429.910.813,08	$ 136.264.456.316,32	66825 DEL 28-6-22	X		
15	TOTAL				$ 14.581.324.210,40											
	Anticipo					**32.365.762.291,60**		$ 40.085.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	**52.149.507.082,80**	$ 69.429.910.813,08	$ 136.264.456.316,32	128743 DEL 31-12-21	X		
15	Ajustes Prov.	Mayo 2022	$ 238.926.897,08	$ 1.746.004,00	240.672.901,08		$ 240.672.901,08	$ 40.085.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 17.988.993.442,62	$ 69.670.583.714,16	$ 132.900.299.506,74	89514 DEL 24-8-22	X		
16	Obra	Junio 2022	$ 3.100.824.040,50	$ 22.659.868,00	3.123.483.908,50	-$ 1.458.000.000,00	$ 1.665.483.908,50	$ 38.627.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 16.323.509.534,12	$ 72.794.067.622,66	$ 132.900.299.506,74	84842 DEL 10-8-22	X		
16	Ajustes Prov.	Junio 2022	$ 67.531.498,53	$ 493.499,00	68.024.997,53		$ 68.024.997,53	$ 38.627.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 16.255.484.536,59	$ 72.862.092.620,19	$ 132.832.274.509,21	89587 DEL 24-8-22	X		
17	Obra	Julio 2022	$ 6.400.253.816,20	$ 46.771.085,60	6.447.024.901,80	-$ 3.010.000.000,00	$ 3.437.024.901,80	$ 35.617.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 12.818.459.634,79	$ 79.309.117.521,99	$ 126.385.249.607,41	93314 DEL 2-9-2022	X		
17	Ajustes Prov.	Julio 2022	$ 235.484.371,41	$ 1.720.847,00	237.205.218,41		$ 237.205.218,41	$ 35.617.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 12.581.254.416,38	$ 79.546.322.740,40	$ 126.148.044.389,00	96711 de 15/10/2021	X		
18	Obra	Agosto 2022	$ 6.533.066.743,50	$ 47.741.641,60	6.580.808.385,10	-$ 2.352.000.000,00	$ 4.228.808.385,10	$ 33.265.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 8.352.446.031,28	$ 86.127.131.125,50	$ 119.567.236.003,90	102274 DEL 21-9-22	X		
18	Ajustes Prov.	Agosto 2022	$ 200.596.925,16	$ 1.465.901,00	202.062.826,16		$ 202.062.826,16	$ 33.265.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 8.150.383.205,12	$ 86.329.193.951,66	$ 119.365.173.177,74	112349 de 25/11/2021	X		
19	Obra	Septiembre 2022	$ 4.211.567.364,40	$ 30.776.838,40	4.242.344.202,80	-$ 1.180.000.000,00	$ 3.062.344.202,80	$ 32.085.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 5.088.039.002,32	$ 90.571.538.154,46	$ 115.122.828.974,94	114928 de 24/10/2022	X		
19	Sitios Críticos E&D	Septiembre 2022	$ 1.743.419.374,00	$ 331.249.681,00	2.074.669.055,00		$ 2.074.669.055,00	$ 32.085.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 3.013.369.947,32	$ 92.646.207.209,46	$ 113.048.159.919,94	114928 de 24/10/2022	X		
19	Ajustes Prov.	Septiembre 2022	$ 137.709.411,63	$ 1.006.338,00	138.715.749,63		$ 138.715.749,63	$ 32.085.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 2.874.654.197,69	$ 92.784.922.959,09	$ 112.909.444.170,31	114928 de 24/10/2022	X		
20	Obra	Octubre 2022	$ 2.779.578.930,80	$ 20.312.307,60	2.799.891.238,40	-$ 1.185.000.000,00	$ 1.614.891.238,40	$ 30.900.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 1.259.762.959,29	$ 95.584.814.197,49	$ 110.109.552.931,91	131434 de 02/12/2022	X		
20	Estudios y Diseños	Octubre 2022	$ 66.800.000,00	$ 12.692.000,00	79.492.000,00		$ 79.492.000,00	$ 30.900.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 1.180.270.959,29	$ 95.664.306.197,49	$ 110.030.060.931,91	131434 de 02/12/2022	X		
20	Social	Octubre 2022	-$ 705.375.000,00	-$ 5.771.250,00	-711.146.250,00		-$ 711.146.250,00	$ 30.900.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 1.891.417.209,29	$ 94.953.159.947,49	$ 110.741.207.181,91	131434 de 02/12/2022	X		
20	Ajustes Prov.	Octubre 2022	$ 83.664.882,04	$ 611.397,00	84.276.279,04		$ 84.276.279,04	$ 30.900.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 1.807.140.930,25	$ 95.037.436.226,53	$ 110.656.930.902,87	133195 de 06/12/2022	X		
21	Obra	Noviembre 2022	$ 2.526.676.995,60	$ 18.464.178,00	2.545.141.173,60	-$ 740.000.000,00	$ 1.805.141.173,60	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 50.344.365.909,20	$ 97.582.577.400,13	$ 108.111.789.729,27	36164	X		
11	Ajustes Def.	Enero 2022	$ 131.919.824,56	$ 964.029,00	1.999.756,64		$ 1.999.756,64	$ 30.160.282.889,82	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021	$ 1.805.141.173,61	$ 97.584.577.156,77	$ 108.109.789.972,63	139728 de 19/12/2022		X	
					130.884.096,92		$ 130.884.096,92	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 50.213.481.812,28	$ 97.715.461.253,69	$ 107.978.905.875,71		X		
12	Ajustes Def.	Febrero 2022	$ 114.702.431,05	$ 838.210,00	115.540.641,05		$ 115.540.641,05	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 50.097.941.171,23	$ 97.831.001.894,74	$ 107.863.365.234,66	139729 DE 19/12/2022	X		
13	Ajustes Def.	Marzo 2022	$ 199.884.047,87	$ 1.460.691,00	201.344.738,87		$ 201.344.738,87	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 49.896.596.432,36	$ 98.032.346.633,61	$ 107.662.020.495,79	139730 de 19/12/2022	X		
14	Ajustes Def.	Abril 2022	$ 180.341.783,95	$ 1.317.882,00	181.659.665,95		$ 181.659.665,95	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 49.714.936.766,41	$ 98.214.006.299,56	$ 107.480.360.829,84	139732 de 19/12/2022	X		
15	Ajustes Def.	Mayo 2022	$ 478.058.989,58	$ 3.493.508,00	481.552.497,58		$ 481.552.497,58	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 49.233.384.268,83	$ 98.695.558.797,14	$ 106.998.808.332,26	138332 de 15/12/2022	X		
16	Ajustes Def.	Junio 2022	$ 293.603.887,82	$ 2.145.567,00	295.749.454,82		$ 295.749.454,82	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 48.937.634.814,01	$ 98.991.308.251,96	$ 106.703.058.877,44	142916 de 26/12/2022	X		
17	Ajustes Def.	Julio 2022	$ 982.459.200,16	$ 7.179.510,00	989.638.710,16		$ 989.638.710,16	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 47.947.996.103,85	$ 99.980.946.962,12	$ 105.713.420.167,28	139706 de 19/12/2022	X		
18	Ajustes Def.	Agosto 2022	$ 785.692.027,88	$ 5.741.596,00	791.433.623,88		$ 791.433.623,88	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 47.156.562.479,97	$ 100.772.380.586,00	$ 104.921.986.543,40	138726 de 17/12/2022	X		
19	Ajustes Def.	Septiembre 2022	$ 455.005.320,75	$ 3.325.039,00	458.330.359,75		$ 458.330.359,75	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 46.698.232.120,22	$ 101.230.710.945,75	$ 104.463.656.183,65	138762 de 17/12/2022	X		
20	Ajustes Def.	Octubre 2022	$ 348.830.528,30	$ 2.549.146,00	351.379.674,30		$ 351.379.674,30	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 46.346.852.445,92	$ 101.582.090.620,05	$ 104.112.276.509,35	138733 de 17/12/2022	X		
21	Ajustes Prov.	Noviembre 2022	$ 356.393.288,15	$ 2.604.412,00	358.997.700,15		$ 358.997.700,15	$ 30.160.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 45.987.854.745,77	$ 101.941.088.320,20	$ 103.753.278.809,20	138692 de 17/12/2022	X		
22	Obra	Diciembre 2022	$ 22.682.977.671,50	$ 165.760.221,40	22.848.737.892,90	-$ 6.594.000.000,00	$ 16.254.737.892,90	$ 23.566.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 29.733.116.852,87	$ 124.789.826.213,10	$ 80.904.540.916,30	36172	X		
22	Social	Diciembre 2022	-$ 1.384.625.000,00	-$ 11.328.750,00	-1.395.953.750,00		-$ 1.395.953.750,00	$ 23.566.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 31.129.070.602,87	$ 123.393.872.463,10	$ 82.300.494.666,30				
22	Ajustes Prov.	Diciembre 2022	$ 4.299.383.173,90	$ 31.418.569,00	4.330.801.742,90		$ 4.330.801.742,90	$ 23.566.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 26.798.268.859,97	$ 127.724.674.206,00	$ 77.969.692.923,40	144197 de 30/12/2022	X		
23	Obra	Enero 2023	$ 2.934.246.881,90	$ 21.442.573,40	2.955.689.455,30	-$ 887.000.000,00	$ 2.068.689.455,30	$ 22.679.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 24.729.579.404,67	$ 130.680.363.661,30	$ 75.014.003.468,10	20963 DE 3/03/2023	X		
21	Ajustes Def.	Noviembre 2022	$ 1.576.102,52	$ 11.518,00	1.587.620,52		$ 1.587.620,52	$ 22.679.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 24.727.991.784,15	$ 130.681.951.281,82	$ 75.012.415.847,58	42107 DE 28/04/2023	X		
22	Ajustes Def.	Diciembre 2022	-$ 35.050.023,10	-$ 256.135,00	-35.306.158,10		-$ 35.306.158,10	$ 22.679.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 24.763.297.942,25	$ 130.646.645.123,72	$ 75.047.722.005,68	39963	X		
23	Ajustes Def.	Enero 2023	$ 363.469.632,81	$ 2.656.124,00	366.125.756,81		$ 366.125.756,81	$ 22.679.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 24.397.172.185,44	$ 131.012.770.880,53	$ 74.681.596.248,87				
24	Obra	Febrero 2023	$ 2.388.359.229,80	$ 17.453.394,40	2.405.812.624,20	-$ 725.000.000,00	$ 1.680.812.624,20	$ 21.954.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 22.716.359.561,24	$ 133.418.583.504,73	$ 72.275.783.624,67	27185 de 21-03-2023	X		
24	Ajustes Def.	Febrero 2023	$ 446.986.852,23	$ 3.266.442,00	450.253.294,23		$ 450.253.294,23	$ 21.954.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 22.266.106.267,01	$ 133.868.836.798,96	$ 71.825.530.330,44	42115 DE 28-04-2023	X		
25	Obra	Marzo 2023	$ 11.281.979.134,60	$ 82.445.232,10	11.364.424.366,70	-$ 3.450.000.000,00	$ 7.914.424.366,70	$ 18.504.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 14.351.681.900,31	$ 145.233.261.165,66	$ 60.461.105.963,74	64475 DE 04-07-2023	X		
25	Social	Marzo 2023	-$ 3.314.765.532,11	-$ 27.120.808,90	-3.341.886.341,01		-$ 3.341.886.341,01	$ 18.504.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 17.693.568.241,32	$ 141.891.374.824,65	$ 63.802.992.304,75		X		
26	Obra	Abril 2023	$ 2.165.502.407,80	$ 15.824.825,30	2.181.327.233,10	-$ 635.000.000,00	$ 1.546.327.233,10	$ 17.869.282.889,82	**RP 92022 de enero 25 de 2022**	$ 16.147.241.008,22	$ 144.072.702.057,75	$ 61.621.665.071,65	62739 de 27-06-2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 1757 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2023

PROYECTO: QUIBDO - PEREIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1832 de 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal/ Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior	
2021	222521	C-2401-0600-75-0-2401008-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 30.873.530.935,00	$ -	RP 222521 de marzo 09 de 2021
2021	222521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 3.826.579.064,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 4.209.019.452,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401017-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 555.432.881,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401020-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 19.498.857.130,00	$ 1.805.141.173,61	RP 1057521 de diciembre 22 de 2021
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401023-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 12.013.547.667,00		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401029-02	54	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 2.577.620.117,40		
2021	1057521	C-2401-0600-75-0-2401029-02	20	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 7.039.779.883,00		
2022	92022	C-2401-0600-75-0-2401008-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 84.303.874.400,00	$ -	RP 92022 de enero 25 de 2022
2022	92022	C-2401-0600-75-0-2401017-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 14.996.125.600,00		
2022	1066222	C-2401-0600-75-0-2401029-02	20	PROPIO	1757 DE 2020	$ 800.000.000,00	$ 22.779.723.288,36	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022
2022	1066222	C-2401-0600-75-0-2401029-02	11	NACIÓN	1757 DE 2020	$ 25.000.000.000,00		
						$ 205.694.367.129,40	**$ 24.584.864.461,97**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 205.694.367.129,40**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	N° y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
27	Obra	Mayo 2023	$ 2.060.913.643,00	$ 15.060.522,80	2.075.974.165,80	-$ 605.000.000,00	$ 1.470.974.165,80	$ 17.264.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 14.676.266.842,42	$ 146.148.676.223,55	$ 59.545.690.905,85	63815 DE 31-05-2023	X		
25	Ajustes Def.	Marzo 2023	$ 2.385.408.579,66	$ 17.431.832,00	2.402.840.411,66		$ 2.402.840.411,66	$ 17.264.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 12.273.426.430,76	$ 148.551.516.635,21	$ 57.142.850.494,19	80360 DEL 17-08-2023	X		
26	Ajustes Def.	Abril 2023	$ 404.023.581,98	$ 2.952.480,00	406.976.061,98		$ 406.976.061,98	$ 17.264.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 11.866.450.368,78	$ 148.958.492.697,19	$ 56.735.874.432,21	80623 DE 24-08-2023	X		
27	Ajustes Def.	Mayo 2023	$ 380.652.921,43	$ 2.781.694,00	383.434.615,43		$ 383.434.615,43	$ 17.264.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 11.483.015.753,35	$ 149.341.927.312,62	$ 56.352.439.816,78	78753 de 14/08/2023	X		
28	Obra	Junio 2023	$ 1.942.730.971,90	$ 14.196.880,00	1.956.927.851,90	-$ 610.000.000,00	$ 1.346.927.851,90	$ 16.654.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 10.136.087.901,45	$ 151.298.855.164,52	$ 54.395.511.964,88		X		
28	Social	Junio 2023	$ 952.631.113,00	$ 6.378.498,00	959.009.611,00		$ 959.009.611,00	$ 16.654.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 9.177.078.290,45	$ 152.257.864.775,52	$ 53.436.502.353,88	78759 de 14/08/2023	X		
28	Predial	Junio 2023	$ 181.220.283,00	$ 27.358.148,00	208.578.431,00		$ 208.578.431,00	$ 16.654.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 8.968.499.859,45	$ 152.466.443.206,52	$ 53.227.923.922,88		X		
28	Ajustes Def.	Junio 2023	$ 429.702.205,20	$ 3.140.131,00	432.842.336,20		$ 432.842.336,20	$ 16.654.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 8.535.657.523,25	$ 152.899.285.542,72	$ 52.795.081.586,68	80364 de 17/08/2023	X		
29	Obra	Julio 2023	$ 4.350.719.845,60	$ 31.793.722,00	4.382.513.567,60	-$ 4.700.000.000,00	-$ 317.486.432,40	$ 11.954.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 8.853.143.955,65	$ 157.281.799.110,32	$ 48.412.568.019,08			X	
29	Sitios Críticos E&D	Julio 2023	$ 952.687.535,30	$ 181.010.632,00	1.133.698.167,30		$ 1.133.698.167,30	$ 11.954.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ 7.719.445.788,35	$ 158.415.497.277,62	$ 47.278.869.851,78			X	
29	Ambiental	Julio 2023	$ 7.758.590.735,00	$ 56.697.394,00	7.719.445.788,35		$ 7.719.445.788,35	$ 11.954.282.889,82	RP 92022 de enero 25 de 2022	$ -	$ 166.134.943.065,97	$ 39.559.424.063,43			X	
					95.842.340,65		$ 95.842.340,65	$ 11.954.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ 704.157.659,35	$ 166.230.785.406,62	$ 39.463.581.722,78			X	
29	Ajustes Def.	Julio 2023	$ 798.259.075,12	$ 5.833.432,00	804.092.507,12	-$ 240.000.000,00	$ 564.092.507,12	$ 11.714.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ 140.065.152,23	$ 167.034.877.913,74	$ 38.659.489.215,66			X	
30	Obra	Agosto 2023	$ 2.876.188.641,80	$ 21.018.302,00	2.897.206.943,80	-$ 950.000.000,00	$ 140.065.152,23	$ 10.764.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ -	$ 169.932.084.857,54	$ 35.762.282.271,86			X	
							$ 1.807.141.791,57	$ 10.764.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ 23.192.858.208,43	$ 169.932.084.857,54	$ 35.762.282.271,86	83013 DEL 13-10-2023		X	
30	Social	Agosto 2023	$ 285.623.667,00	$ 2.077.855,00	287.701.522,00		$ 287.701.522,00	$ 10.764.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ 22.905.156.686,43	$ 170.219.786.379,54	$ 35.474.580.749,86			X	
30	Ajustes Def.	Agosto 2023	$ 422.347.016,07	$ 3.086.382,00	425.433.398,07	-$ 300.000.000,00	$ 125.433.398,07	$ 10.464.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ 22.779.723.288,36	$ 170.645.219.777,61	$ 35.049.147.351,79			X	
31	Obra	Septiembre 2023	$ 4.631.338.875,50	$ 33.844.399,00	4.665.183.274,50	-$ 4.160.000.000,00	$ 505.183.274,50	$ 6.304.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ 22.274.540.013,86	$ 175.310.403.052,11	$ 30.383.964.077,29			X	
31	Social	Septiembre 2023	$ 114.207.308,00	$ 834.592,00	115.041.900,00		$ 115.041.900,00	$ 6.304.282.889,82	RP 1066222 de septiembre 29 de 2022	$ 22.159.498.113,86	$ 175.425.444.952,11	$ 30.268.922.177,29			X	
	TOTALES		**$ 173.395.823.719,95**	**$ 2.029.621.232,16**	**$ 175.425.444.952,11**	**-$ 53.676.473.979,18**	**$ 121.748.970.972,93**	**$ 6.304.282.889,82**		**$ 22.159.498.113,86**	**$ 175.425.444.952,11**	**$ 30.268.922.177,29**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO OBRAS	$ 143.305.940.024,40	$ 1.047.235.716,40	$ 144.353.175.740,80
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 16.730.653.725,66	$ 122.262.468,00	$ 16.852.916.193,66
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 160.036.593.750,06	$ 1.169.498.184,40	$ 161.206.091.934,46
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 668.000.000,00	$ 126.920.000,00	$ 794.920.000,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 1.214.225,85	$ 5.627,00	$ 1.219.852,85
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 7.758.590.735,00	$ 56.697.394,00	$ 7.815.288.129,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 212.310.101,00	$ 27.545.042,00	$ 239.855.143,00
GESTIÓN SOCIAL	$ 1.352.462.088,00	$ 9.290.945,00	$ 1.361.753.033,00
PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE)	$ 3.366.652.822,80	$ 639.664.037,00	$ 4.006.316.859,80
	$ 173.395.823.722,71	$ 2.029.621.229,40	$ 175.425.444.952,11

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA
Director de Obra
Matrícula No.: 682021-03317STD

Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA
Director de Interventoría
Matrícula N°. 25202143142CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 1757 **CONTRATISTA:** Consorcio Megavias choco

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** TRANSVERSAL DEL PACIFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1832 **INTERVENTOR:** Consorcio vial Odiseo

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	13	24	20	14	21	21	22	24	24	22	20	10	24	18	19	24	24	20	24	24	22	24	24	24	24	24	21	16	24	24	639
Lluvias moderadas	11	0	4	10	3	3	2	0	0	2	4	14	0	6	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	3	5	0	0	73
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: PAULO SERGIO TABARES DORONSORO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202184511CLD

Firma
Nombre: EDNA BERMUDEZ BECERRA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-254198 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA SUR-OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL QUIBDÓ - PEREIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3/08/2023	GRANULOMETRIA	INV E-123-213-013	PLANTA GIABRA	13	ART. 630 - ART. 500	SI	SI	ARENA -CONCRETO
2	3/08/2023	LIMITES DE CONSISTENCIA Y HUMEDAD	INV E-125-126-013	PLANTA GIABRA	13	N.P	N.P	SI	ARENA -CONCRETO
3	2/08/2023	MATERIA ORGANICA	INV E-212-013	PLANTA GIABRA	4	≤ 2	2%	SI	ARENA -CONCRETO
4	8/08/2023	EQUIVALENTE DE ARENA	INV E-133-013	PLANTA GIABRA	4	>= 60%	67%- 69%- 71%- 71%	SI	ARENA -CONCRETO
5	4/08/2023	SANIDAD DE LOS AGREGADOS	INV -E 220-013	PLANTA GIABRA	1	10- 18 % MAX	AGR. FINO 1,9%	SI	ARENA -CONCRETO
6	10/08/2023	PARTICULAS LIVIANAS	INV -E 221-013	PLANTA GIABRA	3	05 % MAX	0,4%	SI	ARENA -CONCRETO
7	4/08/2023	PARTICULAS DELEZNABLES	INV -E 211-013	PLANTA GIABRA	3	3 % MAX	AGR. FINO 0,5%	SI	ARENA -CONCRETO
8	2/08/2023	GRANULOMETRIA	INV -E 211-013	PLANTA GIABRA	13	ART. 630 - ART. 500		SI	TRITURADO -CONCRETO
9	5/08/2023	CARAS FRACTURADAS	INV -E 227-013	PLANTA GIABRA	4	ART. 500 - MIN 60	71,9- 78,2-78,9- 79,7 %	SI	TRITURADO -CONCRETO
10	3/08/2023	APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO	INV -E 230-013	PLANTA GIABRA	4	ART. 630 - MAX 25	24,4- 23,4-24,9, 22,1 %	SI	TRITURADO -CONCRETO
11	11/08/2023	SOLIDEZ	INV -E 220-013	PLANTA GIABRA	1	ART. 500 - MAX 18	1,70%	SI	TRITURADO -CONCRETO
12	14/08/2023	DESGASTE	INV E-219-013	PLANTA GIABRA	1	ART 320	19%	SI	TRITURADO -CONCRETO
13	3/08/2023	CONCRETO ESTRUCTURAL	INV -E 410-013	PLANTA GIABRA	178	28 MPA	100,00%	SI	CONCRETO CILINDROS
14	15/08/2023	GRANULOMETRIA	INV E-123-013	PLANTA GIABRA	4	ART 320		SI	PIEDRA FILTRO
15	9/08/2023	DESGASTE	INV E-219-013	PLANTA GIABRA	1	ART 320	19%	SI	PIEDRA FILTRO
16	8/08/2023	SOLIDEZ	INV E-220-013	PLANTA GIABRA	1	ART 320	Gr: 1,5 Fino: 1,9	SI	PIEDRA FILTRO
17	12/08/2023	DISEÑO MARSHALL	INV E-450-013	PLANTA TRITURADOS Y CONCRETOS	10	ART 450-10	3.0 a 6.0	SI	TRITTURADO Y CONCRETO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Raul Oswaldo Ardilla Pineda
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-103317 STD

Firma

Nombre: Hector Adolfo Rosso Moncada
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
	VERSIÓN	1
	PAGINA	

FECHA 5/09/2023

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA SUR-OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL QUIBDÓ - PEREIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

1	16/08/2023	DETERMINACION DE TERRONES	INV -E 211-013	PLANTA PR 30+800	4	<=2	Gr: 0,06% Fino: 0,10%	SI	SUB-BASE GRANULAR
2	14/08/2023	SANIDAD DE LOS AGREGADOS	INV E-220-013	PLANTA PR 30+800	1	18% MAX.	Gr: 1,5 Fino: 1,9	SI	SUB-BASE GRANULAR
3	15/08/2023	PROCTOR MODIFICADO	INV E-142-013	PLANTA PR 30+800	1	N / A	2,338 - 2,286	SI	SUB-BASE GRANULAR
4	14/08/2023	MITES DE CONSISTENCIA Y HUMEDA	INV E-125-126-013	PLANTA PR 30+800	7	LL25% MAX IPL 6	LL NP IP NP	SI	SUB-BASE GRANULAR
5	20/08/2023	GRANULOMETRIA	INV E-123-213-013	PLANTA PR 30+800	7	ART. 320		SI	SUB-BASE GRANULAR
6	16/08/2023	EQUIVALENTE DE ARENA	INV E-133-013	PLANTA PR 30+800	4	> 25%	42%- 31%- 40%- 41%-40%	SI	SUB-BASE GRANULAR
7	22/08/2023	CBR DE LABORATORIO	INV E-148-013	PLANTA PR 30+800	1	40% Min	86%	SI	SUB-BASE GRANULAR
8	2/08/2023	DENSIDADES	INV-E161-013	PLANTA PR 30+800	67	95%	100%	SI	SUB-BASE GRANULAR
9	4/08/2023	GRANULOMETRIA	IP- 600	PLANTA PR 30+800	7	N / A	SI	SI	CAPA FILTRANTE
10	18/08/2023	DESGASTE	IP- 600	PLANTA PR 30+800	1	50% MAX.	24%	SI	CAPA FILTRANTE
11	24/08/2023	SOLIDEZ	IP- 600	PLANTA PR 30+800	1	18% MAX.	5,6% - 4,2%	SI	CAPA FILTRANTE
12	20/08/2023	SELLO DE ARENA	INV -E 411-013	PLANTA PR 30+800	3	60% Min	60,1% - 60,9% - 71,3% -	SI	EMULSION
13	9/08/2023	FLEXION DE VIGAS DE CONCRETO	INV -E 414-013	PLANTA PR 30+800	224	4,5 Mpa	SI	SI	CONCRETO HIDRÁULICO
14	16/08/2023	GRANULOMETRIA	INV -E 330-013	PLANTA PR 30+800	224	4,5 Mpa	SI	SI	CONCRETO HIDRÁULICO
15	16/08/2023	CARAS FRACTURADAS	INV -E 330-013	PLANTA PR 30+800	1	ART. 330	SI	SI	BASE GRANULAR
16	16/08/2023	LIMITES DE CONSISTENCIA	INV -E 330-013	PLANTA PR 30+800	1	LL25% MAX IPL 0	SI	SI	BASE GRANULAR
17	16/08/2023	CBR DE LABORATORIO	INV -E 330-013	PLANTA PR 30+800	1	40% Min	SI	SI	BASE GRANULAR
18	16/08/2023	PROCTOR MODIFICADO	INV -E 330-013	PLANTA PR 30+800	1	N / A	SI	SI	BASE GRANULAR

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

17

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: RAUL OSWALDO ARDILA PINEDA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-103317 STD

Firma
Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-143142 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA SUR-OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL QUIBDÓ - PEREIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
209	1/08/2023	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTEPARA PAVIMENTOS	INV-E–732-13	PR 38+745	1	4.9% - 5.5%	5,10%	SI	MDC-19
209	1/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 38+745	1	ART 450 TABLA 450-6 MDC-19	-	SI	MDC-19
209	1/08/2023	GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS	INV E-735-13	PR 38+745	1	CARACTERIZACIÓN	2,476	N/A	MDC-19
209	1/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (ESTABILIDAD)	INVE–748-13	PR 38+745	1	> 9000 (N)	12146,3	SI	MDC-19
209	1/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (FLUJO)	INVE–748-13	PR 38+745	1	2.0 mm - 3.5 mm	3,3	SI	MDC-19
209	1/08/2023	PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS	INVE–736-13	PR 38+745	1	4.0 % - 6.0%	5,3	SI	MDC-19
209	1/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS LLENOS DE ASFALTO)	INVE–799-13	PR 38+745	1	65 % - 75%	65,3	SI	MDC-19
209	1/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS EN LOS AGREGADOS MINERALES)	INVE–799-13	PR 38+745	1	> 15%	15,1	SI	MDC-19
209	1/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (RELACION ESTABILIDAD/FLUJO)	INVE–748-13	PR 38+745	1	3.0 A 6.0 KN/mm	3,7	SI	MDC-19
209	1/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (RELACION LLENANTE/LIGANTE)	INVE–799-13	PR 38+745	1	0.8 - 1.2	1,17	SI	MDC-19

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

	FECHA	5/09/2023 (Día / Mes / Año)

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
210	2/08/2023	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTEPARA PAVIMENTOS	INV-E–732-13	PR 38+710	1	4.9% - 5.5%	5,12%	SI	MDC-19
210	2/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 38+710	1	ART 450 TABLA 450-6 MDC-19	-	SI	MDC-19
210	2/08/2023	GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS	INV E-735-13	PR 38+710	1	CARACTERIZACIÓN	2,470	N/A	MDC-19
210	2/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (ESTABILIDAD)	INVE–748-13	PR 38+710	1	> 9000 (N)	12581,8	SI	MDC-19
210	2/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (FLUJO)	INVE–748-13	PR 38+710	1	2.0 mm - 3.5 mm	3,2	SI	MDC-19
210	2/08/2023	PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS	INVE–736-13	PR 38+710	1	4.0 % - 6.0%	5,0	SI	MDC-19
210	2/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS LLENOS DE ASFALTO)	INVE–799-13	PR 38+710	1	65 % - 75%	67,1	SI	MDC-19
210	2/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS EN LOS AGREGADOS MINERALES)	INVE–799-13	PR 38+710	1	> 15%	15,2	SI	MDC-19
210	2/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (RELACION ESTABILIDAD/FLUJO)	INVE–748-13	PR 38+710	1	3.0 A 6.0 KN/mm	4,0	SI	MDC-19
210	2/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (RELACION LLENANTE/LIGANTE)	INVE–799-13	PR 38+710	1	0.8 - 1.2	1,15	SI	MDC-19
211	4/08/2023	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTEPARA PAVIMENTOS	INV-E–732-13	PR 39+190	1	4.9% - 5.5%	5,12%	SI	MDC-19
211	4/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 39+190	1	ART 450 TABLA 450-6 MDC-19	-	SI	MDC-19
211	4/08/2023	GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS	INV E-735-13	PR 39+190	1	CARACTERIZACIÓN	2,470	N/A	MDC-19

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

								FECHA	5/09/2023 (Día / Mes / Año)
211	4/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (ESTABILIDAD)	INVE–748-13	PR 39+190	1	> 9000 (N)	13657,6	SI	MDC-19

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
211	4/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (FLUJO)	INVE–748-13	PR 39+190	1	2.0 mm - 3.5 mm	3,4	SI	MDC-19
211	4/08/2023	PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS	INVE–736-13	PR 39+190	1	4.0 % - 6.0%	5,2	SI	MDC-19
211	4/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS LLENOS DE ASFALTO)	INVE–799-13	PR 39+190	1	65 % - 75%	66,3	SI	MDC-19
211	4/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS EN LOS AGREGADOS MINERALES)	INVE–799-13	PR 39+190	1	> 15%	15,4	SI	MDC-19
211	4/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (RELACION ESTABILIDAD/FLUJO)	INVE–748-13	PR 39+190	1	3.0 A 6.0 KN/mm	4,0	SI	MDC-19
211	4/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (RELACION LLENANTE/LIGANTE)	INVE–799-13	PR 39+190	1	0.8 - 1.2	1,01	SI	MDC-19
212	5/08/2023	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTEPARA PAVIMENTOS	INV-E–732-13	PR 39+224	1	4.9% - 5.5%	5,22%	SI	MDC-19
212	5/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 39+224	1	ART 450 TABLA 450-6 MDC-19	-	SI	MDC-19
212	5/08/2023	GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS	INV E-735-13	PR 39+224	1	CARACTERIZACIÓN	2,468	N/A	MDC-19
212	5/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (ESTABILIDAD)	INVE–748-13	PR 39+224	1	> 9000 (N)	13113,9	SI	MDC-19
212	5/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (FLUJO)	INVE–748-13	PR 39+224	1	2.0 mm - 3.5 mm	3,4	SI	MDC-19

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	5/09/2023 (Día / Mes / Año)

212	5/08/2023	PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS	INVE–736-13	PR 39+224	1	4.0 % - 6.0%	5,1	SI	MDC-19
212	5/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS LLENOS DE ASFALTO)	INVE–799-13	PR 39+224	1	65 % - 75%	66,8	SI	MDC-19
No. Consecutivo del Ensayo	**Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)**	**Descripción/Ensayo**	**Norma**	**Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)**	**No. De Muestras**	**Rango Cumplimiento del Ensayo**	**Resultado del Ensayo**	**Cumple SI o NO**	**Observación / Acciones**
212	5/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (VACIOS EN LOS AGREGADOS MINERALES)	INVE–799-13	PR 39+224	1	> 15%	15,4	SI	MDC-19
212	5/08/2023	RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL (RELACION ESTABILIDAD/FLUJO)	INVE–748-13	PR 39+224	1	3.0 A 6.0 KN/mm	3,9	SI	MDC-19
212	5/08/2023	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE (RELACION LLENANTE/LIGANTE)	INVE–799-13	PR 39+224	1	0.8 - 1.2	1.05	SI	MDC-19
213	8/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 30+800	1	ART 630 TABLA 630-2	-	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
213	8/08/2023	LIMITES LIQUIDO, MAXIMO	INV-E 125- 13	PR 30+800	1	0,0%	0,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
213	8/08/2023	INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO	INV-E-126-13	PR 30+800	1	0,0%	0,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
213	8/08/2023	ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA.	INV-E-133-13	PR 30+800	1	60,0%	67,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
214	8/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 30+800	1	ART 630 TABLA 630-4	-	SI	AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO
215	8/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 22+320	1	ART 320 TABLA 320-3 SBG-50	-	SI	SUB BASE GRANULAR
215	8/08/2023	LIMITES LIQUIDO, MAXIMO	INV-E 125- 13	PR 22+320	1	25,0%	0,0%	SI	SUB BASE GRANULAR
215	8/08/2023	INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO	INV-E-126-13	PR 22+320	1	6,0%	0,0%	SI	SUB BASE GRANULAR
215	8/08/2023	ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA.	INV-E-133-13	PR 22+320	1	25,0%	32,0%	SI	SUB BASE GRANULAR
216	10/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 22+630	1	ESP. PARTICULAR	-	SI	CAPA FILTRANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	5/09/2023 (Día / Mes / Año)

216	10/08/2023	LIMITES LIQUIDO, MAXIMO	INV-E 125- 13	PR 22+630	1	0,0%	0,0%	SI	CAPA FILTRANTE
216	10/08/2023	INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO	INV-E-126-13	PR 22+630	1	0,0%	0,0%	SI	CAPA FILTRANTE
217	15/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 30+800	1	ART 630 TABLA 630-4	-	SI	AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO
218	21/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 30+800	1	ART 630 TABLA 630-2	-	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
No. Consecutivo del Ensayo	**Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)**	**Descripción/Ensayo**	**Norma**	**Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)**	**No. De Muestras**	**Rango Cumplimiento del Ensayo**	**Resultado del Ensayo**	**Cumple SI o NO**	**Observación / Acciones**
218	21/08/2023	LIMITES LIQUIDO, MAXIMO	INV-E 125- 13	PR 30+800	1	0,0%	0,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
218	21/08/2023	INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO	INV-E-126-13	PR 30+800	1	0,0%	0,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
218	21/08/2023	ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA.	INV-E-133-13	PR 30+800	1	60,0%	66,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
219	24/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 14+450	1	ART 320 TABLA 320-3 SBG-50	-	SI	SUB BASE GRANULAR
219	24/08/2023	LIMITES LIQUIDO, MAXIMO	INV-E 125- 13	PR 14+450	1	25,0%	0,0%	SI	SUB BASE GRANULAR
219	24/08/2023	INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO	INV-E-126-13	PR 14+450	1	6,0%	0,0%	SI	SUB BASE GRANULAR
219	24/08/2023	ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA.	INV-E-133-13	PR 14+450	1	25,0%	30,0%	SI	SUB BASE GRANULAR
220	28/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 30+800	1	ART 630 TABLA 630-4	-	SI	AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO
221	29/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 22+630	1	ESP. PARTICULAR	-	SI	CAPA FILTRANTE
221	29/08/2023	LIMITES LIQUIDO, MAXIMO	INV-E 125- 13	PR 22+630	1	0,0%	0,0%	SI	CAPA FILTRANTE
221	29/08/2023	INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO	INV-E-126-13	PR 22+630	1	0,0%	0,0%	SI	CAPA FILTRANTE
222	30/08/2023	GRANULOMETRIA CLASIFICACION	INV-E-123-213-13	PR 30+800	1	ART 630 TABLA 630-2	-	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
222	30/08/2023	LIMITES LIQUIDO, MAXIMO	INV-E 125- 13	PR 30+800	1	0,0%	0,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
222	30/08/2023	INDICE DE PLASTICIDAD, MAXIMO	INV-E-126-13	PR 30+800	1	0,0%	0,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO
222	30/08/2023	ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA.	INV-E-133-13	PR 30+800	1	60,0%	63,0%	SI	AGREGADO FINO PARA CONCRETO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

							FECHA		5/09/2023 (Día / Mes / Año)
131-A	2/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 14+720	1	100,0%	102,56%	SI	CONCRETO
131-B	2/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 14+720	1	100,0%	104,63%	SI	CONCRETO
132-A	10/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 20+450	1	100,0%	104,36%	SI	CONCRETO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 5/09/2023
(Día / Mes / Año)

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
132-B	10/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 20+450	1	100,0%	102,89%	SI	CONCRETO
133-A	11/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 37+370	1	100,0%	105,54%	SI	CONCRETO
133-B	11/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 37+370	1	100,0%	107,50%	SI	CONCRETO
134-A	14/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 15+095	1	100,0%	103,86%	SI	CONCRETO
134-B	14/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 15+095	1	100,0%	103,72%	SI	CONCRETO
135-A	19/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 21+290	1	100,0%	102,47%	SI	CONCRETO
135-B	19/08/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E–410–13	PR 21+290	1	100,0%	103,35%	SI	CONCRETO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Raul Oswaldo Ardilla Pineda
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68205-103317 STD

Firma
Nombre: Hector Adolfo Posso Moncada
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 23 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 1757 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

FECHA DE INICIO: 19/03/2021

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-nov-23
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 134.000.109.999,00

VALOR ACUMULADO: $ 205.694.367.129,40
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 794.920.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.191.798.548,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1832 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 13.400.010.999,90	19	3	21	19	3	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 24.481.941.579,00	19	3	21	19	3	23
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 26.800.021.999,80	19	3	21	19	9	25
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 238.476.000,00	19	9	22	19	9	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 40.200.032.999,70	19	9	22	19	9	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100130458

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 7 No. certificado 14625242 de fecha 21 de mayo de 2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/06/2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	10%	$ 6.700.005.499,95	17	3	21	19	10	22
Patronal	10%	$ 6.700.005.499,95	17	3	21	19	10	22
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 6.700.005.499,95	17	3	21	19	10	22
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 6.700.005.499,95	17	3	21	19	10	22

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M–100023136 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 5 no. Certificado 14617560 de fecha 19 de abril de 2021, que ampara Orden de Inicio DO-GPE 13492 de fecha 19 de marzo de 2021.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 3/06/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 23 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 17.989.436.712,94	24	12	21	19	3	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 24.481.941.579,00	24	12	21	19	3	23
Prestaciones sociales	20%	$ 35.978.873.425,88	24	12	21	19	9	25
Calidad del servicio	30%	$ 238.476.000,00	19	9	22	19	9	27
Estabilidad de la Obra	30%	$ 53.968.310.138,82	19	9	22	19	9	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100130458

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 10 Certificado 14679100 del 27/12/2021 y 16 del 24/02/2022 certificado 14696754
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11-abr-22

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	10%	$ 8.994.718.356,47	17	3	21	19	10	22
Patronal	10%	$ 8.994.718.356,47	17	3	21	19	10	22
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 8.994.718.356,47	17	3	21	19	10	22
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 8.994.718.356,47	17	3	21	19	10	22

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M–100023136 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. RCE No.M100023136, Anexo 8 Certificado 14679103 del 27/12/2021 y 10 del 29/03/2022 certificado 14704613
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11-abr-22

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	23 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 4 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.569.436.712,90	19	9	22	30	6	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 59.980.756.869,00	19	9	22	30	6	23
Prestaciones sociales	20%	$ 41.138.873.425,80	19	9	22	31	12	25
Calidad del servicio	30%	$ 1.562.315.564,00	31	12	22	31	12	27
Estabilidad de la Obra	30%	$ 61.708.310.138,70	31	12	22	31	12	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100130458

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 17 Certificado 14753307 del 05/10/2022
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31-oct-22

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 4 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	12	22
Patronal	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	12	22
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	12	22
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	12	22

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M–100023136 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. RCE No.M100023136, Anexo11 del 05/10/2022 certificado 14753315
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31-oct-22

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	23 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: - **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** - **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.569.436.712,90	30	6	23	30	9	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 59.980.756.869,00	30	6	23	30	9	23
Prestaciones sociales	20%	$ 41.138.873.425,80	31	12	25	31	3	26
Calidad del servicio	30%	$ 1.562.315.564,00	31	3	23	31	12	27
Estabilidad de la Obra	30%	$ 61.708.310.138,70	31	3	23	31	12	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100130458

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 18 Certificado 14771601 del 27/12/2022

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8-feb-23

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: - **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** - **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	3	23
Patronal	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	3	23
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	3	23
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	31	3	23

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M–100023136 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. RCE No.M100023136, Anexo 12 del 27/12/2022 certificado 14794435

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8-feb-23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	23 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: - **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** - **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.569.436.712,90	31	3	2023	30	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 59.980.756.869,00	31	3	2023	30	9	2024
Prestaciones sociales	20%	$ 41.138.873.425,80	31	3	2023	30	11	2026
Calidad del servicio	30%	$ 1.562.315.564,00	30	11	2023	30	11	2028
Estabilidad de la Obra	30%	$ 61.708.310.138,70	30	11	2023	30	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M–100130458

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 19 Certificado 100130458 del 18/04/2023

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Por confirmar

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: - **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** - **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	30	11	23
Patronal	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	30	11	23
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	30	11	23
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 10.284.718.356,45	17	3	21	30	11	23

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M–100023136 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. RCE No.M100023136, Anexo 13 del 18/04/2023, CERTIFICADO No 14794436

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8-feb-23


OBSERVACIONES:

Pólizas que amparan la PRORROGA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Contrato 1757/2020.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 1757 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

FECHA DE INICIO: 19/03/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1832 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI X NO APROBADO: SI X NO VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: 2/05/2021

OBSERVACIONES: Se presenta a la interventoría el Plan de Calidad V.2, el 2/05/2021, se recibe por parte de la interventoría el día 27/05/2021 la solicitud de ajuste al plan de calidad con el oficio CV1-101-2021.
El día 30 de Julio se envía a la interventoría el oficio **20211150248** Atención Observaciones varias al Plan de Calidad (Plan de calidad Revisión V:02) (Oficios: CVODM1 -037-2021 y CVODM1 -101-2021.
Se aprueba el Plan de Calidad desde el 1 de Septiembre de 2021 con el radicado **CVODM1 -195-2021**

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 2

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: jul-23
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: na

OBSERVACIONES:
Auditorías programadas para el 40% y 70% de avance de la obra. El consorcio envió auditoría de julio del 2022 con comunicado en abril de 2023 para el 40% y en espera del informe de auditoria interna realizado en junio-julio del 2023.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI **X** NO APROBADO: SI **X** NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 307 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 154

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO **X**

OBSERVACIONES:
Ver anexo de Ensayos.
Se presentan ensayos de Base granular y MSC-25 que seran cobrados en el siguiente informe por lo que no aparecen en el aseguramiento.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 8
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 6
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 156
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 121
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 35

OBSERVACIONES:
En los meses posteriores se realizaran comites con el fin de realizar un consolidado de estas para un cierre o acciones pertinentes sobre estas.
Ver anexo de No Conformidades,

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 1
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 24
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 4
No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 20

OBSERVACIONES:
Para el mes de agosto no se recibieron PQR, que son basicamente situaciones con los propietarios y las comunidades que intervienen en la ejecucion de la obra, a las cuales se les dara tratamiaento y posterior cierre.
El 30 de agosto de 2023 según el oficio CVODM1-2198-2023 se deja constacia que las PQR faltantes se encuentran en proceso de cierre.
Ver anexo de quejas

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**110%**	**Cumplimiento en ejecución de inversión:** $Ejecutado / $Programado * 100
IG2: Índice de gestión 2 =	**NA**	**Satisfacción del cliente:** No. De encuestas sobresalientes y adecuadas / No. Encuestas efectuadas *100
IG3: Índice de gestión 3 =	**100%**	**Cumplimiento en el avance de obra física:** Cantidad de obra ejecutada / Total de obra programada * 100
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

El Contratista no ha presenteado evidencia de la obtención de retroalimentación del cliente y medición de su indicador de satisfacción del cliente.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	MÁQUINA DE ENSAYOS MULTIUSOS	PINZUAR	262	26/01/2023	F-28213-002 R0	26/01/2024	
2	BAÑO MARIA	PINZUAR	NP	27/01/2023	T-28213-012 R0	27/01/2024	
3	HORNO	PINZUAR	163	27/01/2023	T-28213-001 R0	27/01/2024	
4	MÁQUINA DE LOS ANGELES	PINZUAR	1380	27/01/2023	NA-28213-008 R0	27/01/2024	
5	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	OHAUS	8342056538	26/01/2023	M-28213-010 R0	26/01/2024	
6	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	BBG	2101000000036	27/01/2023	M-28213-007 R0	27/01/2024	
7	MÁQUINA HIDRAÚLICA DOBLE RANGO	PINZUAR	365	25/01/2023	F-28213-005 R0	25/01/2024	
8	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	OHAUS	C101871174	27/01/2023	M-28213-006 R0	27/01/2024	
9	MÁQUINA HIDRAÚLICA DOBLE RANGO PARA ENSAYOS A COMPRESIÓN	PINZUAR	265	25/01/2023	F-28213-004 R0	25/01/2024	
10	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	OHAUS	8342056495	26/01/2023	M-28213-009 R0	26/01/2024	
11	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	OHAUS	8342056533	27/01/2023	M-28213-011 R0	27/01/2024	
12	ESTACION TOTAL	CYGNUS	HV5305	24/05/2023	1691	23/11/2023	
13	ESTACION TOTAL	TOPCON	UL3181	26/05/2023	1339	26/11/2023	
14	ESTACION TOTAL	TOPCON	V10677	13/06/2023	1714	12/12/2023	
15	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	WP 039271	3/02/2023	1670	2/08/2023	
16	NIVEL AUTOMATICO	SOUTH	1131502	3/02/2023	1671	2/08/2023	
17	ESTACION TOTAL	SOKKIA	1Z013121	13/03/2023	4949-2023	12/09/2023	
18	ESTACION TOTAL	GEOMAX	2831732	3/02/2023	1669	3/08/2023	

OBSERVACIONES:

En el mes de agosto no se presentaron los certificados de calibración de los equipos de topografía y laboratorio, se envían los certificados enviados anteriormente ya que aún no se vence su última calibración.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RAUL OSWALDO ARDILLA PINEDA
Director de la Obra
Matrícula No.:68205-103317 STD

Firma
Nombre: MAURCIO CARDENAS ROJAS
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.: 25202-57271 CND

Firma
Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-143142 CND

Firma
Nombre: DIANA MARIA MONTAÑO ORTIZ
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 7620282844VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 14

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 — CHOCÓ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1757 DE 2020 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGAVIAS CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1832 de 2020 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ODISEO

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo a la dinámica del proyecto y a las situaciones cambiantes en la ejecución, se hace indispensable realizar una modificación en los rubros del anticipo para continuar atendiendo las necesidades del contrato de obra.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO	VALOR UTILIZADO OCTUBRE 2022	SALDO	VALOR NOVIEMBRE	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 13,155,787,676.00	$ 11,288,807,814.00	$ 1,866,979,862.00	$ 3,366,979,862.00	$ 14,655,787,676.00	24.43%
2	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 1,243,775,947.50	$ 680,088,145.50	$ 563,687,802.00	$ 63,687,802.00	$ 743,775,947.50	1.24%
3	TRANSPORTE	$ 31,838,687,215.00	$ 31,559,501,674.00	$ 279,185,541.00	$ 1,279,185,541.00	$ 32,838,687,215.00	54.75%
4	COSTOS DE PERSONAL	$ 13,742,506,030.30	$ 9,962,024,530.00	$ 3,780,481,500.30	$ 1,780,481,500.30	$ 11,742,506,030.30	19.58%
			$ -	$ -			
	TOTAL	$ 59,980,756,868.80	$ 53,490,422,163.50	$ 6,490,334,705.30	$ 6,490,334,705.30	$ 59,980,756,868.80	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista CONSORCIO MEGAVIAS CHOCÓ
Matrícula Profesional No.: 05202 106304 ANT

Firma:
Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor: CONSORCIO VIAL ODISEO
Matrícula Profesional No.: 54205-57955 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 25 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA No 1757 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 13958 **DE** 25-mar-21 ENTIDAD FINANCIERA: Fiduciaria Bancolombia S.A Sociedad Fiduciaria
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 17-000012-74 ahorros **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: 408 POBLADO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 49 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 59,980,756,869.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPERTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1 RUTA 2510, LOS LLANOS - TARAZÁ (PR0+0000- PR124+0705) RUTA 2511, TARAZÁ - CAUCASIA (PR0+0000- PR63+0996) RUTA 2512, Y LA PINTADA – MEDELLÍN (Autopista sur) PR64+0000 - PR 72+0084 RUTA 2509, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVIAS CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1832 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 14,655,787,676.00	$ 14,655,787,676.00		$ 14,655,787,676.00	$ -
2	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 743,775,947.50	$ 743,775,947.50		$ 743,775,947.50	$ -
3	TRANSPORTE	$ 32,838,687,215.00	$ 32,838,687,215.00		$ 32,838,687,215.00	$ -
4	COSTO DE PERSONAL	$ 11,742,506,030.30	$ 11,742,506,030.00		$ 11,742,506,030.00	$ 0.30
			$ -		$ -	$ -
	TOTALES	$ 59,980,756,868.80	$ 59,980,756,868.50		$ 59,980,756,868.50	$ 0.30

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (__05___) : $ 1,424.76
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 147,755,403.47
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 12,529,111.10		5	31/05/2021	$ 12,529,111.10
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 14,956,503.60		6	30/06/2021	$ 27,485,614.70
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 13,915,638.53		7	31/07/2021	$ 41,401,253.23
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 10,130,857.07		8	31/08/2021	$ 51,532,110.30
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 9,069,541.12		9	30/09/2021	$ 60,601,651.42
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 8,826,320.26		10	31/10/2021	$ 69,427,971.68
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 7,725,205.39		11	30/11/2021	$ 77,153,177.07
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 6,440,539.49		12	31/12/2021	$ 83,593,716.56
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 5,571,809.65		1	31/01/2022	$ 89,165,526.21
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 4,809,208.10		2	28/02/2022	$ 93,974,734.31
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 3,359,026.49		3	31/03/2022	$ 97,333,760.80
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,757,820.73		4	30/04/2022	$ 99,091,581.53
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,879,270.14		5	31/05/2022	$ 100,970,851.67
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 10,931,892.49		6	30/06/2022	$ 111,902,744.16
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 13,390,411.23		7	31/07/2022	$ 125,293,155.39
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 8,511,076.00		8	31/08/2022	$ 133,804,231.39
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 4,997,116.66		9	30/09/2022	$ 138,801,348.05
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 4,171,962.14		10	31/10/2022	$ 142,973,310.19
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 2,014,766.74		11	30/11/2022	$ 144,988,076.93
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,691,682.92		12	31/12/2022	$ 146,679,759.85
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 558,089.89		1	31/01/2023	$ 147,237,849.74
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 459,804.54		2	28/02/2023	$ 147,697,654.28
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 54,945.18		3	31/03/2023	$ 147,752,599.46
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,379.25		4	30/04/2023	$ 147,753,978.71
P.A ANTICIPO CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO 41.500.13958.185	$ 1,424.76		5	31/05/2023	$ 147,755,403.47

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2023.06.13 11:10:15 -05'00'


Firma:
Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-57955 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16

6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
0		**Programación Frentes de Obra (2021-2022)**	**7884 días**	**vie 31/05/02**	**dom 31/12/23**		
1		**CRONOGRAMA DETALLADO DE PROYECTO (Estudios & Diseños + Ejecución Obras)**	**987 días**	**vie 19/03/21**	**jue 30/11/23**		**1477**
2		inicio	0 días	vie 19/03/21	vie 19/03/21		
3		**Frente de Obra #1 - PR72+000 - PR73+200 Ruta 5002 (L = 1142 m)**	**646.78 días**	**jue 25/03/21**	**sáb 31/12/22**		**637CC**
4		**2.1. FASE DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**462.78 días**	**jue 25/03/21**	**jue 30/06/22**		**639CC**
5		**A). Diseño Geométrico Manual de Diseño INVIAS 2015**	**43 días**	**jue 25/03/21**	**vie 7/05/21**		
6		1). Levantamiento Topográfico de Detalle para Diseño Geométrico	21 días	jue 25/03/21	jue 15/04/21		7;10CC+8 días;11CC+3 días;641CC+11.43 días
7		2) Elaboración Documentos para Diseño Geométrico	11 días	jue 15/04/21	lun 26/04/21	6	8FC+2 días
8		3) Localización y Replanteo Diseño Geométrico Aprobado	9 días	mié 28/04/21	vie 7/05/21	7FC+2 días	640CC+11.43 días
9		**B). Actualización Diseño de Pavimentos (Estudios de Geotecnia / Transito)**	**53 días**	**dom 28/03/21**	**jue 20/05/21**		**643CC+1.14 días;644CC+1.14 días;645CC+9.14 días**
10		1) Actualización Estudio de Transito	16 días	vie 2/04/21	dom 18/04/21	6CC+8 días	55CC+2 días
11		2) Evaluación Geotécnica de Campo	19 días	dom 28/03/21	vie 16/04/21	6CC+3 días	12FC-9 días;56CC+3 días
12		3) Evaluación Geotécnica de Laboratorio	26 días	mié 7/04/21	lun 3/05/21	11FC-9 días	13FC-9 días
13		4) Elaboración Documentos Diseño de Pavimento Rígido	26 días	sáb 24/04/21	jue 20/05/21	12FC-9 días	14FC-9 días;17FC-4 días
14		C). Actualización Otros Estudios y Diseños Previos INVIAS	151 días	mar 11/05/21	sáb 9/10/21	13FC-9 días	646
15		**2.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS**	**646.78 días**	**jue 25/03/21**	**sáb 31/12/22**		**647FC+45.71 días;650CC+1.14 días**
16		**A). CAPITULO EXPLANACIONES Y MOV. TIERRAS**	**52 días**	**dom 16/05/21**	**mié 7/07/21**		
17		1) Actividades Preliminares (Desmonte / Demolición / Ren	43 días	dom 16/05/21	lun 28/06/21	13FC-4 días	18FC-1 día
18		2) Movimiento Tierra (Excav. en roca / Excav. Material Común / Terraplenes / Trtes)	10 días	dom 27/06/21	mié 7/07/21	17FC-1 día	19CC+1 día
19		3) Remoción de Derrumbes / Transporte Derrumbes	6 días	lun 28/06/21	dom 4/07/21	18CC+1 día	20CC+2 días;651CC+4.57 días
20		4). Mejoramiento Subrasante / Aportes Material / Geotextil	6 días	mié 30/06/21	mar 6/07/21	19CC+2 días	22CC+8 días;652CC+1.14 días
21		**B). CAPITULO BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**	**99 días**	**jue 8/07/21**	**jue 14/10/21**		**653CC+3.43 días**
22		1) Conformación de la calzada existente / Afirmado	26 días	jue 8/07/21	lun 2/08/21	20CC+8 días	23CC+22 días;24CC+23 días;654FC+2.29 días
23		2) Material Lecho Drenante	46 días	vie 30/07/21	lun 13/09/21	22CC+22 días	656CC+0.2 días
24		3) Subbase Granular Tipo A	76 días	sáb 31/07/21	jue 14/10/21	22CC+23 días	26CC+2 días;29CC+5 días
25		**C). CAPITULO PAVIMENTOS RÍGIDOS Y ASFALTICOS**	**78 días**	**lun 2/08/21**	**lun 18/10/21**		**657CC+5 días**
26		1) Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	76 días	lun 2/08/21	sáb 16/10/21	24CC+2 días	27CC+2 días;658CC+5 días
27		2) Pavimento de concreto Hidráulico Mr - 45	76 días	mié 4/08/21	lun 18/10/21	26CC+2 días	42FC+30 días;43FC+30 días;44FC+30 días;45FC
28		**D) CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES - OBRAS VARIAS**	**249.78 días**	**jue 25/03/21**	**lun 29/11/21**		**660CC+7 días**
29		1) Excavaciones varias (Mat. Común / Roca / Bajo agua)	26 días	jue 5/08/21	lun 30/08/21	24CC+5 días	30CC+1 día;31CC+2 días;32CC+3 días;33CC+15
30		2) Rellenos para estructuras (Mat. Del Sitio / Tipo Subbas	26 días	vie 6/08/21	mar 31/08/21	29CC+1 día	
31		7) Concretos para Muros (Cimentaciones / Zapatas / Vástagos / Vigas - 28MPa)	91 días	sáb 7/08/21	vie 5/11/21	29CC+2 días	34CC-3 días;663FC-10 días;664FC-7 días
32		9) Concretos Simple para estructuras 14MPa	89 días	dom 8/08/21	jue 4/11/21	29CC+3 días	
33		11) Barrera new jersey - 28MPa	89 días	vie 20/08/21	mar 16/11/21	29CC+15 días	665
34		13) Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	95 días	mié 4/08/21	sáb 6/11/21	31CC-3 días	666CC+1 día

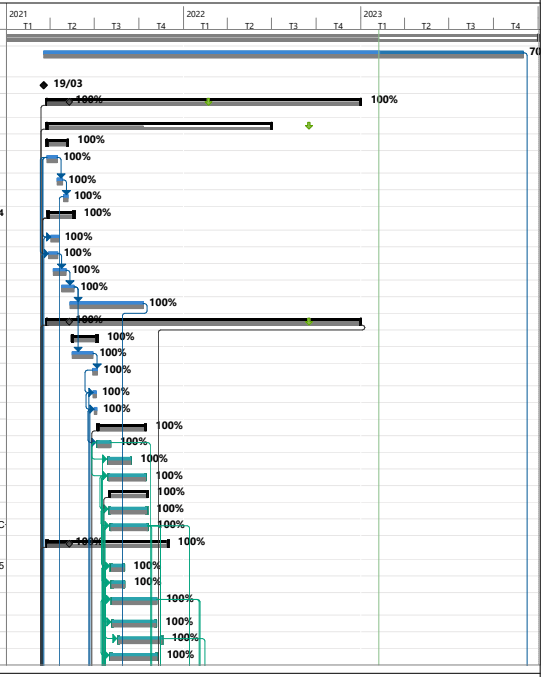

Hito de línea base
Tarea manual
Resumen manual
Atraso
Resumen de línea base
solo el comienzo
Resumen del proyecto
Retrasada
Tareas críticas
solo fin
Tareas externas
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
División crítica
solo duración
Hito externo
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Progreso de tarea crítica
División de la línea base
Tarea inactiva
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tarea
Hito
Hito inactivo
Línea base
División
Progreso del resumen
Resumen inactivo
Progreso de tarea
Resumen
Fecha límite

6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
35		19) Disipadores de Energía y sedimentadores en gaviones	90 días	sáb 7/08/21	jue 4/11/21	29CC+2 días	667
36		20) Costrucción de Bordillo en Concreto - F´c = 20 Mpa	74 días	lun 9/08/21	jue 21/10/21	27CC+5 días	668
37		21) Filtro Frances (Geotextil Tipo II-NT / Material drenante / Mat. Cobertura / Tubo. 4")	90 días	vie 6/08/21	mié 3/11/21	29CC+1 día	38CC+75 días;669CC+1 día
38		22) Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	41 días	mié 20/10/21	lun 29/11/21	37CC+75 días	670CC+1 día
39		23) Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	9 días	jue 25/03/21	sáb 3/04/21		40CC+1 día;671CC+1 día;675FC+1 día
40		24) Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 90	45 días	vie 26/03/21	lun 10/05/21	39CC+1 día	673CC+2 días;678CC+1 día
41		**E) CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	**646.78 día**	**jue 25/03/21**	**sáb 31/12/22**		
42		1) Pintura en frío acrílica pura base agua para líneas y marcas viales	328 días	jue 18/11/21	mar 11/10/22	27FC+30 días	674CC+4 días
43		2) Señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) / Tachas Reflectivas	328 días	jue 18/11/21	mar 11/10/22	27FC+30 días	681FC+10 días
44		3) Defensa Metálica / Sección final / Captafaros	385 días	jue 18/11/21	mié 7/12/22	27FC+30 días	676CC+1 día
45		4) Postes de Referencia	257 días	lun 17/01/22	vie 30/09/22	27FC+90 días	677CC+1 día
46		5) Construcción de Andenes, Bordillos y Rampas de acceso	424 días	sáb 9/10/21	mar 6/12/22	27FC-10 días	
47		Fin Frente #1	0 días	sáb 31/12/22	sáb 31/12/22		51CC+37 días;679CC+3 días
48		**Frente de Obra #2 - PR12+732 - PR14+118 Ruta 5002 (L = 1386 m)**	**671.78 días**	**mié 31/03/21**	**mar 31/01/23**		
49		**2.1. FASE DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**671.78 día**	**mié 31/03/21**	**mar 31/01/23**		
50		**A). Diseño Geométrico Manual de Diseño INVIAS 2015**	**425.78 día**	**sáb 1/05/21**	**jue 30/06/22**		**682CC;683CC-8 días;684CC-15 días**
51		1). Levantamiento Topográfico de Detalle para Diseño Geométrico	213.78 días	sáb 1/05/21	mar 30/11/21	47CC+37 días	52CC+61 días;141CC+10 días;194CC+10 días
52		2) Elaboración Documentos para Diseño Geométrico Defir	184.78 día	jue 1/07/21	sáb 1/01/22	51CC+61 días	53CC+5 días
53		3) Localización y Replanteo Diseño Geométrico Definitivo	184.78 día	mar 6/07/21	jue 6/01/22	52CC+5 días	105CC
54		**B). Actualización Diseño de Pavimentos (Estudios de Geotecnia / Transito)**	**456.78 días**	**mié 31/03/21**	**jue 30/06/22**		
55		1) Actualización Estudio de Transito	334.78 día	dom 4/04/21	vie 4/03/22	10CC+2 días	145CC+14 días;198CC+14 días
56		2) Evaluación Geotécnica de Campo	260.78 día	mié 31/03/21	jue 16/12/21	11CC+3 días	57FC+11 días;146CC+15 días;199CC+15 días
57		3) Evaluación Geotécnica de Laboratorio	92.78 días	jue 27/05/21	vie 28/01/22	56FC+11 días	58FC-3 días
58		4) Elaboración Documentos Diseño de Pavimento Rígido	115.78 días	sáb 24/07/21	sáb 26/02/22	57FC-3 días	59CC+8 días;61CC+8 días
59		C). Actualización de Estudios de Geología para Ingeniería y Geotecnia	50.78 días	dom 1/08/21	lun 20/09/21	58CC+8 días	60CC
60		D). Actualización Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones de Puentes, Obras de Drenaje y Otras	137.78 días	dom 1/08/21	jue 16/12/21	59CC	
61		E). Actualización Estudio de Estabilidad y Estabilización de T	137.78 día	dom 1/08/21	jue 16/12/21	58CC+8 días	62CC
62		F). Actualización Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavac	137.78 día	dom 1/08/21	jue 16/12/21	61CC	63CC+8 días
63		G). Actualización Estudio y Diseños de Estructuras	129.78 día	lun 9/08/21	jue 16/12/21	62CC+8 días	64CC+10 días
64		H). Actualización Estudio y Diseños de Urbanismo y Paisajis	77.78 días	jue 19/08/21	jue 4/11/21	63CC+10 días	65CC
65		I). Actualización Otros Estudio y Diseños Previos del Proyect	119.78 día	jue 19/08/21	jue 16/12/21	64CC	
66		**PUENTE PIUNDA KM 13+700 RUTA 5003**	**877.78 día**	**mar 6/07/21**	**jue 30/11/23**		
67		**PRELIMINARES**	**94 días?**	**jue 12/05/22**	**sáb 13/08/22**		
68		Excavaciones varias en material común	32 días?	jue 12/05/22	dom 12/06/22		69;72;80CC;81CC;82CC

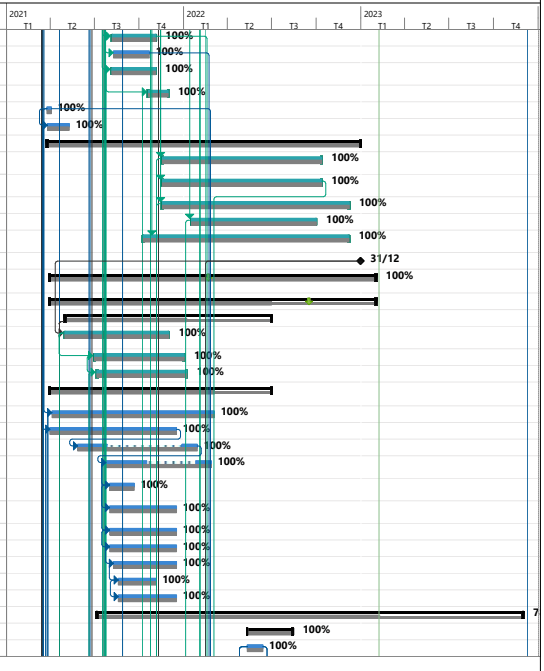

Hito de línea base
Tarea manual
Resumen manual
Atraso
Resumen de línea base
solo el comienzo
Resumen del proyecto
Retrasada
Tareas críticas
solo fin
Tareas externas
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
División crítica
solo duración
Hito externo
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Progreso de tarea crítica
División de la línea base
Tarea inactiva
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tarea
Hito
Hito inactivo
Línea base
División
Progreso del resumen
Resumen inactivo
Progreso de tarea
Resumen
Fecha límite


6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
69		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	62 días?	lun 13/06/22	sáb 13/08/22	68	
70		**SUBESTRUCTURA**	**203 días?**	**jue 12/05/22**	**mié 30/11/22**		
71		**Cimentación pilotes**	184 días?	jue 12/05/22	vie 11/11/22		
72		Pilotes tipo caisson preexcavados en concreto clase 28 Mpa, excavados a hasta una profundidad maxima 25 ; incluye la excavación - anillo de encamisado y formaleta (no incluye el acero de refuerzo ni del pilote ni de los anillos)	159 días?	lun 13/06/22	vie 18/11/22	68	73CC
73		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa pilotes	159 días?	lun 13/06/22	vie 18/11/22	72CC	
74		**Cimentación estribos**	568 días?	jue 12/05/22	**jue 30/11/23**		
75		Concreto f´c= 28 Mpa Estribos /cargaderos / cabezales	203 días?	jue 12/05/22	mié 30/11/22		
76		Concreto f´c= 28 Mpa Losa de aproximación	210 días?	jue 12/05/22	mié 7/12/22		
77		Concreto f´c = 14 Mpa Solado Limpieza	217 días?	jue 12/05/22	mié 14/12/22		
78		Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa - Infraestructura	217 días?	jue 12/05/22	mié 14/12/22		
79		**Filtros**	568 días?	jue 12/05/22	jue 30/11/23		
80		Material granular drenante	244 días?	jue 12/05/22	mar 10/01/23	68CC	
81		Geotextil tipo II no tejido	251 días?	jue 12/05/22	mar 17/01/23	68CC	
82		Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	251 días?	jue 12/05/22	mar 17/01/23	68CC	
83		**SUPERESTRUCTURA**	**568 días?**	**jue 12/05/22**	**jue 30/11/23**		
84		**Tableros**	568 días?	jue 12/05/22	jue 30/11/23		
85		Concreto f´c = 28 MPa Losa Tablero	293 días?	jue 12/05/22	mar 28/02/23		88CC;89CC;90CC
86		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa Tableros	321 días?	jue 12/05/22	mar 28/03/23		
87		**Aceros especiales**	550 días?	jue 12/05/22	dom 12/11/23		
88		Fabricación de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W)	300 días?	jue 12/05/22	mar 7/03/23	85CC	
89		Transporte de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W)	307 días?	jue 12/05/22	mar 14/03/23	85CC	
90		Montaje de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W)	314 días?	jue 12/05/22	mar 21/03/23	85CC	93CC;92CC
91		**Barandas y barreras**	568 días?	jue 12/05/22	jue 30/11/23		
92		Barrera new jersey perfil unibidireccional norma ntc 4083 en concreto 28 MPa (no incluye acero)	321 días?	jue 12/05/22	mar 28/03/23	90CC	
93		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa barrera	328 días?	jue 12/05/22	mar 4/04/23	90CC	95CC;97CC
94		**Baranda peatonal**	568 días?	jue 12/05/22	jue 30/11/23		
95		Baranda metalica	558 días?	jue 12/05/22	lun 20/11/23	93CC	
96		**Apoyos y juntas**	568 días?	jue 12/05/22	jue 30/11/23		

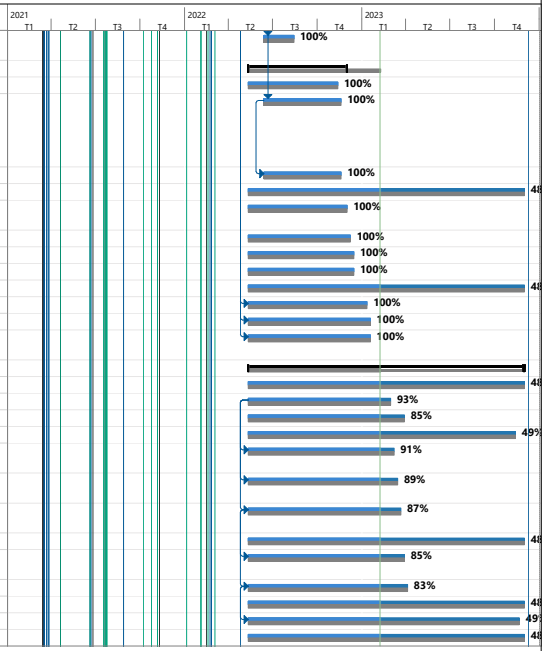

Hito de línea base	Tarea manual	Resumen manual	Atraso	
Resumen de línea base	solo el comienzo	Resumen del proyecto	Retrasada	
Tareas críticas	solo fin	Tareas externas	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	
División crítica	solo duración	Hito externo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	
Progreso de tarea crítica	División de la línea base	Tarea inactiva	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	
Tarea	Hito	Hito inactivo	Línea base	
División	Progreso del resumen	Resumen inactivo		
Progreso de tarea	Resumen	Fecha límite		


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
97		Apoyo de neopreno Anclado compuesto por bloque elastomerico de 400x600x66 mm dureza 60 con 4 laminas internas A36 de E=4 mm (incluye 2 placas externas A36 sin vulcanizar de 800x500x25mm con perforaciones elongadas según detalle de diseño incluye pernos de	349 días?	jue 12/05/22	mar 25/04/23	93CC	98CC
98		Sello para juntas para puentes	391 días?	jue 12/05/22	mar 6/06/23	97CC	
99		Prueba de Carga estática y dinámica	398 días?	jue 12/05/22	mar 13/06/23		101CC
100		**Pavimentos**	405 días?	jue 12/05/22	mar 20/06/23		
101		Riego de imprimación con emulsión asfástica CRL-1	440 días?	jue 12/05/22	mar 25/07/23	99CC	102CC
102		Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19	447 días?	jue 12/05/22	mar 1/08/23	101CC	
103		**2.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS**	**543.78 día**	**mar 6/07/21**	**sáb 31/12/22**		
104		**A). CAPITULO EXPLANACIONES Y MOV. TIERRAS**	**118 días**	**mar 6/07/21**	**lun 1/11/21**		
105		1) Actividades Preliminares (Desmonte / Demolición / Remoción)	92.78 días	mar 6/07/21	mié 6/10/21	53CC	106CC+1 día;128CC+3 días
106		2) Movimiento Tierra (Excav.. En roca / Excav.. Material Común / Terraplenes / Trtes)	91 días	mié 7/07/21	mié 6/10/21	105CC+1 día	107CC+3 días;108CC+3 días
107		3) Remoción de Derrumbes / Transporte Derrumbes	114 días	sáb 10/07/21	lun 1/11/21	106CC+3 días	
108		4). Mejoramiento Subrasante / Aportes Material / Geotextil	76 días	sáb 10/07/21	vie 24/09/21	106CC+3 días	110CC;111CC+1 día
109		**B). CAPITULO BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**	**134 días**	**sáb 10/07/21**	**dom 21/11/21**		
110		1) Conformación de la calzada existente / Afirmado	76 días	sáb 10/07/21	vie 24/09/21	108CC	
111		2) Material Lecho Drenante	113 días	dom 11/07/21	lun 1/11/21	108CC+1 día	112CC+3 días
112		3) Subbase Granular Tipo A	130 días	mié 14/07/21	dom 21/11/21	111CC+3 días	114CC+1 día;117CC+1 día
113		**C). CAPITULO PAVIMENTOS RÍGIDOS Y ASFALTICOS**	**138 días**	**jue 15/07/21**	**mar 30/11/21**		
114		1) Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	130 días	jue 15/07/21	lun 22/11/21	112CC+1 día	115CC+1 día
115		2) Pavimento de concreto Hidráulico Mr - 45	137 días	vie 16/07/21	mar 30/11/21	114CC+1 día	125CC+4 días;127CC+15 días;130FC+20 días;13
116		**D) CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES - OBRAS VARIAS**	**248.78 días**	**vie 9/07/21**	**lun 14/03/22**		
117		1) Excavaciones varias (Mat. Común / Roca / Bajo agua)	148 días	dom 25/07/21	dom 19/12/21	112CC+1 día	118CC+1 día;119CC+1 día;123CC;126CC
118		2) Rellenos para estructuras (Mat. Del Sitio / Tipo Subbas	148 días	lun 26/07/21	lun 20/12/21	117CC+1 día	
119		7) Concretos para Muros (Cimentaciones / Zapatas / Vástagos / Vigas - 28MPa)	160 días	lun 26/07/21	sáb 1/01/22	117CC+1 día	120CC-1 día;121CC;122CC-3 días
120		9) Concreto Simple para Estructuras 14MPa	160 días	dom 25/07/21	vie 31/12/21	119CC-1 día	
121		11) Barrera new jersey - 28MPa	160 días	lun 26/07/21	sáb 1/01/22	119CC	
122		13) Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	160 días	vie 23/07/21	mié 29/12/21	119CC-3 días	
123		17) Alcantarillas 36" (Tubo. Concreto Ref. CLASE III / Tubo. Plástico PVC - NTC 5070)	90 días	dom 25/07/21	vie 22/10/21	117CC	124CC+1 día
124		19) Disipadores de Energía y sedimentadores en gaviones	161 días	mié 4/08/21	mar 11/01/22	123CC+1 día	129FC+1 día
125		20) Costrucción de Bordillo en Concreto - F´c = 20 Mpa	137 días	mar 20/07/21	sáb 4/12/21	115CC+4 días	
126		21) Filtro Frances (Geotextil Tipo II-NT / Material drenante / Mat. Cobertura / Tubo. 4")	135 días	dom 25/07/21	lun 6/12/21	117CC	
127		22) Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	90 días	mié 15/12/21	lun 14/03/22	115CC+15 días	

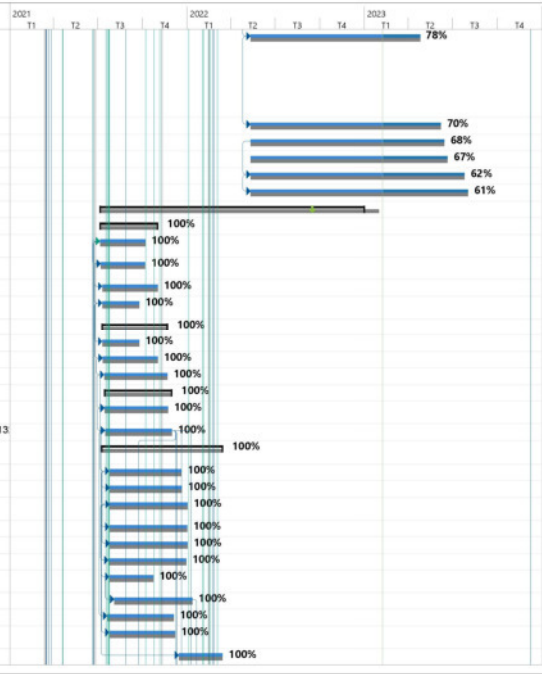

Hito de línea base
Resumen de línea base
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
División de la línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
Atraso
Retrasada
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Línea base

6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
128		23) Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	30 días	vie 9/07/21	dom 8/08/21	105CC+3 días	
129		24) Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 90	31 días	jue 13/01/22	sáb 12/02/22	124FC+1 día	
130		25) Protección de Taludes con Bloques de Césped	75 días	lun 20/12/21	sáb 5/03/22	115FC+20 días	
131		**E) CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	**479 días**	**vie 8/10/21**	**mar 31/01/23**		
132		1) Pintura en frío acrílica pura base agua para líneas y marcas viales	211.78 días	dom 9/01/22	lun 8/08/22	115FC+40 días	
133		2) Señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) / Tachas Reflectivas	242.78 días	dom 9/01/22	jue 8/09/22	115FC+40 días	
134		3) Defensa Metálica / Sección final / Captafaros	242.78 días	vie 8/10/21	jue 8/09/22	115FC+40 días	
135		4) Postes de Referencia	304 días	mié 8/12/21	mié 9/11/22	115FC+40 días	
136		5) Construcción de Andenes, Bordillos y Rampas de Acceso	333.78 días	vie 10/12/21	mar 8/11/22	115FC+10 días	
137		**Fin Frente #2**	**0 días**	**mar 31/01/23**	**mar 31/01/23**		
138		**Frente de Obra #3 (P16+000 - PR17+100) Ruta 5003**	**799 días**	**jue 25/03/21**	**jue 1/06/23**		
139		**2.1. FASE DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**441.78 días**	**jue 15/04/21**	**jue 30/06/22**		
140		**A). Diseño Geométrico Manual de Diseño INVIAS 2015**	**245 días**	**dom 16/05/21**	**sáb 15/01/22**		
141		1). Levantamiento Topográfico de Detalle para Diseño Geométrico	212 días	dom 16/05/21	lun 13/12/21	51CC+10 días	142CC+60 días;143CC+60 días
142		2) Elaboración Documentos para Diseño Geométrico Defi	184 días	vie 16/07/21	sáb 15/01/22	141CC+60 días	
143		3) Localización y Replanteo Diseño Geométrico Definitivo	184 días	vie 16/07/21	sáb 15/01/22	141CC+60 días	149CC+17 días;150CC+17 días;151CC+17 días;1
144		**B). Actualización Diseño de Pavimentos (Estudios de Geotecnia / Transito)**	**351.78 días**	**jue 15/04/21**	**vie 1/04/22**		
145		1) Actualización Estudio de Transito	183 días	lun 19/04/21	lun 18/10/21	55CC+14 días	
146		2) Evaluación Geotécnica de Campo	138.78 días	jue 15/04/21	mar 31/08/21	56CC+15 días	147CC+45 días
147		3) Evaluación Geotécnica de Laboratorio	167 días	lun 31/05/21	sáb 13/11/21	146CC+45 días	148CC+45 días
148		4) Elaboración Documentos Diseño de Pavimento Rígido	176 días	sáb 24/07/21	sáb 15/01/22	147CC+45 días	
149		C). Actualización de Estudios de Geología para Ingeniería y (	168 días	lun 2/08/21	dom 16/01/22	143CC+17 días	
150		D). Actualización Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones de Puentes, Obras de Drenaje y Otras	199 días	lun 2/08/21	mié 16/02/22	143CC+17 días	
151		E). Actualización Estudio de Estabilidad y Estabilización de T	199 días	lun 2/08/21	mié 16/02/22	143CC+17 días	
152		F). Actualización Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavac	199 días	lun 2/08/21	mié 16/02/22	143CC+17 días	
153		G). Actualización Estudio y Diseños de Estructuras	191 días	lun 9/08/21	mar 15/02/22	143CC+23 días	
154		H). Actualización Estudio y Diseños de Urbanismo y Paisajis	209 días	jue 19/08/21	mar 15/03/22	143CC+34 días	
155		I). Actualización Otros Estudio y Diseños Previos del Proyect	209 días	jue 19/08/21	mar 15/03/22	143CC+34 días	
156		**2.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS**	**647 días**	**jue 25/03/21**	**sáb 31/12/22**		
157		**A). CAPITULO EXPLANACIONES Y MOV. TIERRAS**	**210 días**	**vie 16/07/21**	**jue 10/02/22**		
158		1) Actividades Preliminares (Desmonte / Demolición / Ren	152 días	vie 16/07/21	mar 14/12/21	143CC	181CC+1 día
159		2) Movimiento Tierra (Excav. en roca / Excav. Material Común / Terraplenes / Trtes)	183 días	sáb 17/07/21	sáb 15/01/22	143CC+1 día	
160		3) Remoción de Derrumbes / Transporte Derrumbes	206 días	mar 20/07/21	jue 10/02/22	143CC+4 días	
161		4). Mejoramiento Sbrsante / Aportes Material / Geotextil	168 días	mar 20/07/21	lun 3/01/22	143CC+4 días	163CC;164CC+1 día
162		**B). CAPITULO BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**	**224 días**	**mar 20/07/21**	**lun 28/02/22**		
163		1) Conformación de la calzada existente / Afirmado	168 días	mar 20/07/21	lun 3/01/22	161CC	

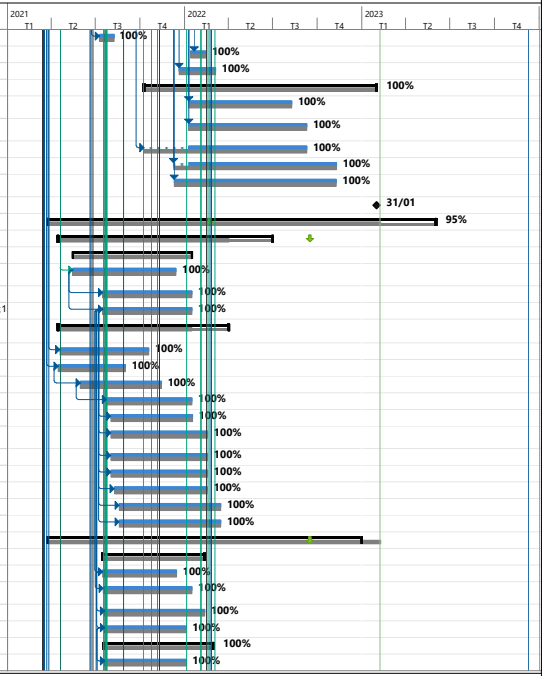

Hito de línea base
Tarea manual
Resumen manual
Atraso
Resumen de línea base
solo el comienzo
Resumen del proyecto
Retrasada
Tareas críticas
solo fin
Tareas externas
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
División crítica
solo duración
Hito externo
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Progreso de tarea crítica
División de la línea base
Tarea inactiva
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tarea
Hito
Hito inactivo
Línea base
División
Progreso del resumen
Resumen inactivo
Progreso de tarea
Resumen
Fecha límite

6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
164		2) Material Lecho Drenante	205 días	mié 21/07/21	jue 10/02/22	161CC+1 día	165CC+3 días
165		3) Subbase Granular Tipo A	220 días	sáb 24/07/21	lun 28/02/22	164CC+3 días	167CC+1 día;170CC+2 días;179CC+2 días
166		**C). CAPITULO PAVIMENTOS RÍGIDOS Y ASFALTICOS**	**474 días**	**dom 25/07/21**	**jue 10/11/22**		
167		1) Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	607 días	dom 25/07/21	jue 23/03/23	165CC+1 día	168CC+1 día
168		2) Pavimento de concreto Hidráulico Mr - 45	613 días	lun 26/07/21	jue 30/03/23	167CC+1 día	178CC+8 días;180FC-15 días;183FC-5 días;189C
169		**D) CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES - OBRAS VARIAS**	**683 días**	**lun 19/07/21**	**jue 1/06/23**		
170		1) Excavaciones varias (Mat. Común / Roca / Bajo agua)	477 días	lun 26/07/21	lun 14/11/22	165CC+2 días	171CC+1 día;172CC+1 día;173CC+1 día;176CC+1 día
171		2) Rellenos para estructuras (Mat. Del Sitio / Tipo Subbase)	476 días	mar 27/07/21	lun 14/11/22	170CC+1 día	
172		7) Concretos para Muros (Cimentaciones / Zapatas / Vástagos / Vigas - 28MPa)	476 días	mar 27/07/21	lun 14/11/22	170CC+1 día	174CC;175CC-3 días
173		9) Concreto Simple para Estructuras 14MPa	476 días	mar 27/07/21	lun 14/11/22	170CC+1 día	
174		11) Barrera new jersey - 28MPa	476 días	mar 27/07/21	lun 14/11/22	172CC	
175		13) Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	479 días	sáb 24/07/21	lun 14/11/22	172CC-3 días	
176		17) Alcantarillas 36" (Tubo. Concreto Ref. CLASE III / Tubo. Plástico PVC - NTC 5070)	504 días	mar 27/07/21	lun 12/12/22	170CC+1 día	177CC+15 días
177		19) Disipadores de Energía y sedimentadores en gaviones	486 días	sáb 14/08/21	lun 12/12/22	176CC+15 días	182CC-5 días
178		20) Costrucción de Bordillo en Concreto - F´c = 20 Mpa	502 días	jue 29/07/21	lun 12/12/22	168CC+8 días	
179		21) Filtro Frances (Geotextil Tipo II-NT / Material drenante / Mat. Cobertura / Tubo. 4")	505 días	lun 26/07/21	lun 12/12/22	165CC+2 días	
180		22) Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	101 días	sáb 25/12/21	lun 1/05/23	168FC-15 días	
181		23) Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	550 días	lun 19/07/21	jue 19/01/23	158CC+1 día	
182		24) Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	370 días	dom 23/01/22	vie 27/01/23	177CC-5 días	
183		25) Protección de Taludes con Bloques de Césped	113 días	jue 30/12/21	jue 1/06/23	168FC-5 días	
184		**E) CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	**533 días**	**mié 15/12/21**	**mié 31/05/23**		
185		1) Pintura en frio acrílica pura base agua para líneas y marcas viales	335 días	mié 19/01/22	vie 28/04/23	168CC	
186		2) Señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) / Tachas Reflectivas	340 días	mié 19/01/22	mié 3/05/23	168CC	
187		3) Defensa Metálica / Sección final / Captafaros	337 días	mié 19/01/22	dom 30/04/23	168CC	
188		4) Postes de Referencia	352 días	mié 19/01/22	lun 15/05/23	168CC	
189		5) Construcción de Andenes, Bordillos y Rampas de Acceso	525 días	mié 15/12/21	mar 23/05/23	168CC+5 días	
190		Fin Frente de Obra #3	0 días	mié 31/05/23	mié 31/05/23		
191		**Frente de Obra #4 (PR15+000 - PR16+000) Ruta 5003**	**1011.78 dí**	**jue 25/03/21**	**dom 31/12/23**		
192		**2.1. FASE DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**441 días**	**vie 16/04/21**	**jue 30/06/22**		
193		**A). Diseño Geométrico Manual de Diseño INVIAS 2015**	**245 días**	**dom 16/05/21**	**sáb 15/01/22**		
194		1). Levantamiento Topográfico de Detalle para Diseño Geométrico	212 días	dom 16/05/21	lun 13/12/21	51CC+10 días	247FC-1 día;195CC+60 días;196CC+60 días
195		2) Elaboración Documentos para Diseño Geométrico Defi	184 días	vie 16/07/21	sáb 15/01/22	194CC+60 días	
196		3) Localización y Replanteo Diseño Geométrico Definitivo	184 días	vie 16/07/21	sáb 15/01/22	194CC+60 días	200CC+45 días;201CC+45 días;202CC+17 días;2

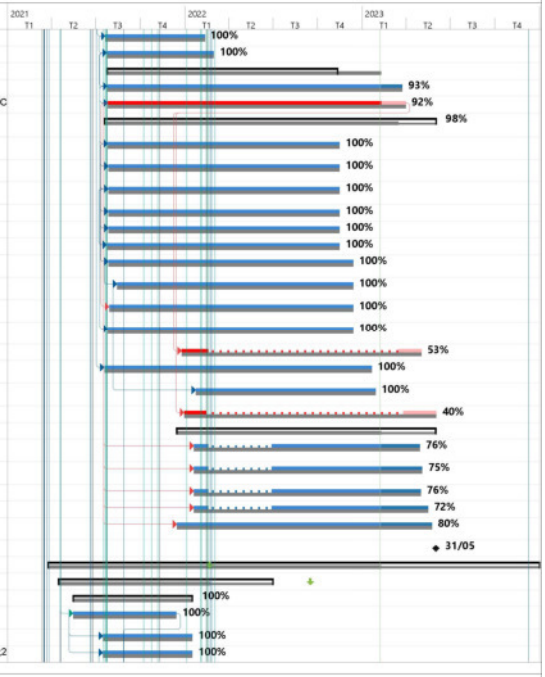

Hito de línea base
Resumen de línea base
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
División de la línea base
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
Atraso
Retrasada
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Línea base


6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
197		**B). Actualización Diseño de Pavimentos (Estudios de Geotecnia / Transito)**	**312 días**	**vie 16/04/21**	**lun 21/02/22**		
198		1) Actualización Estudio de Transito	183 días	lun 19/04/21	lun 18/10/21	55CC+14 días	
199		2) Evaluación Geotécnica de Campo	112 días	vie 16/04/21	jue 5/08/21	56CC+15 días	
200		3) Evaluación Geotécnica de Laboratorio	167 días	lun 30/08/21	sáb 12/02/22	196CC+45 días	
201		4) Elaboración Documentos Diseño de Pavimento Rígido	176 días	lun 30/08/21	lun 21/02/22	196CC+45 días	
202		C). Actualización de Estudios de Geología para Ingeniería y (	168 días	lun 2/08/21	dom 16/01/22	196CC+17 días	
203		D). Actualización Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones de Puentes, Obras de Drenaje y Otras	199 días	lun 2/08/21	mié 16/02/22	196CC+17 días	
204		E). Actualización Estudio de Estabilidad y Estabilización de T	199 días	lun 2/08/21	mié 16/02/22	196CC+17 días	
205		F). Actualización Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavac	199 días	lun 2/08/21	mié 16/02/22	196CC+17 días	
206		G). Actualización Estudio y Diseños de Estructuras	191 días	lun 9/08/21	mar 15/02/22	196CC+23 días	
207		H). Actualización Estudio y Diseños de Urbanismo y Paisajis	181 días	jue 19/08/21	mar 15/02/22	196CC+34 días	
208		I). Actualización Otros Estudio y Diseños Previos del Proyect	181 días	jue 19/08/21	mar 15/02/22	196CC+34 días	
209		**2.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS**	**646.78 día**	**jue 25/03/21**	**sáb 31/12/22**		
210		**A). CAPITULO EXPLANACIONES Y MOV. TIERRAS**	**153 días**	**dom 1/08/21**	**vie 31/12/21**		
211		1) Actividades Preliminares (Desmonte / Demolición / Ren	426 días	dom 1/08/21	vie 30/09/22	196CC+16 días	212CC+1 día;213CC+3 días;214CC+4 días;234C
212		2) Movimiento Tierra (Excav. en roca / Excav. Material Común / Terraplenes / Ttes)	455 días	lun 2/08/21	dom 30/10/22	211CC+1 día	
213		3) Remoción de Derrumbes / Transporte Derrumbes	453 días	mié 4/08/21	dom 30/10/22	211CC+3 días	
214		4). Mejoramiento Sbrsante / Aportes Material / Geotextil	483 días	jue 5/08/21	mié 30/11/22	211CC+4 días	216CC+1 día
215		**B). CAPITULO BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**	**513 días**	**vie 6/08/21**	**sáb 31/12/22**		
216		1) Conformación de la calzada existente / Afirmado	479 días	vie 6/08/21	dom 27/11/22	214CC+1 día	217CC+1 día
217		2) Material Lecho Drenante	480 días	sáb 7/08/21	mar 29/11/22	216CC+1 día	218CC+2 días
218		3) Subbase Granular Tipo A	479 días	lun 9/08/21	mié 30/11/22	217CC+2 días	220CC+1 día;223CC+1 día;232CC+1 día
219		**C). CAPITULO PAVIMENTOS RÍGIDOS Y ASFALTICOS**	**509 días**	**mar 10/08/21**	**sáb 31/12/22**		
220		1) Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	498 días	mar 10/08/21	mar 20/12/22	218CC+1 día	221CC+1 día
221		2) Pavimento de concreto Hidráulico Mr - 45	504 días	mié 11/08/21	mar 27/12/22	220CC+1 día	231CC+3 días;233CC+15 días;236FC-15 días;238
222		**D) CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES - OBRAS VARIAS**	**881 días**	**mar 3/08/21**	**dom 31/12/23**		
223		1) Excavaciones varias (Mat. Común / Roca / Bajo agua)	782 días	mar 10/08/21	sáb 30/09/23	218CC+1 día	224CC+1 día;225CC+3 días;226CC+2 días;229CC+1 día
224		2) Rellenos para estructuras (Mat. Del Sitio / Tipo Subbase)	788 días	mié 11/08/21	sáb 7/10/23	223CC+1 día	
225		7) Concretos para Muros (Cimentaciones / Zapatas / Vástagos / Vigas - 28MPa)	731 días	vie 13/08/21	dom 13/08/23	223CC+3 días	227CC+1 día;228CC-3 días
226		9) Concretos Simple para Estructuras 14MPa	731 días	jue 12/08/21	sáb 12/08/23	223CC+2 días	
227		11) Barrera new jersey - 28MPa	779 días	sáb 14/08/21	dom 1/10/23	225CC+1 día	
228		13) Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	786 días	mar 10/08/21	mié 4/10/23	225CC-3 días	
229		17) Alcantarillas 36" (Tubo. Concreto Ref. CLASE III / Tubo. Plástico PVC - NTC 5070)	796 días	mié 11/08/21	dom 15/10/23	223CC+1 día	230CC+15 días;235CC+15 días
230		19) Disipadores de Energía y sedimentadores en gaviones	793 días	lun 30/08/21	mar 31/10/23	229CC+15 días	

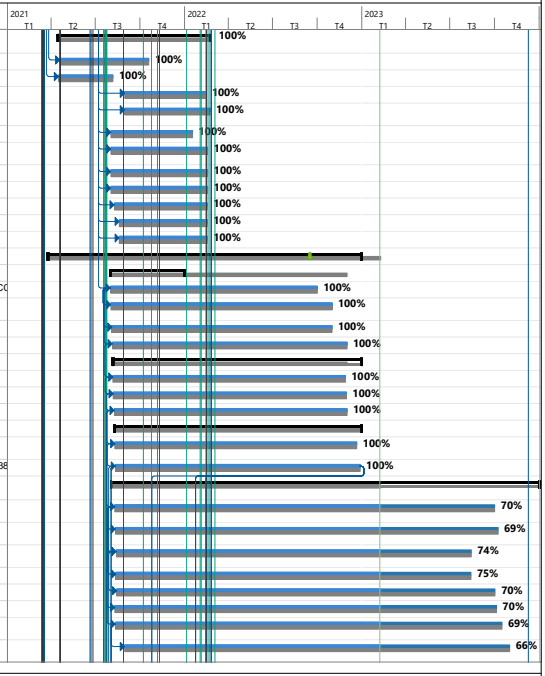

Hito de línea base
Tarea manual
Resumen manual
Atraso
Resumen de línea base
solo el comienzo
Resumen del proyecto
Retrasada
Tareas críticas
solo fin
Tareas externas
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
División crítica
solo duración
Hito externo
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Progreso de tarea crítica
División de la línea base
Tarea inactiva
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tarea
Hito
Hito inactivo
Línea base
División
Progreso del resumen
Resumen inactivo
Progreso de tarea
Resumen
Fecha límite


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
231		20) Costrucción de Bordillo en Concreto - F´c = 20 Mpa	809 días	sáb 14/08/21	mar 31/10/23	221CC+3 días	
232		21) Filtro Frances (Geotextil Tipo II-NT / Material drenante / Mat. Cobertura / Tubo. 4")	813 días	mar 10/08/21	mar 31/10/23	218CC+1 día	
233		22) Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	715 días	mar 14/12/21	mié 29/11/23	221CC+15 días	
234		23) Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	850 días	mar 3/08/21	jue 30/11/23	211CC+1 día	
235		24) Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	720 días	mar 23/11/21	dom 12/11/23	229CC+15 días	
236		25) Protección de Taludes con Bloques de Césped	349 días	jue 11/11/21	dom 26/11/23	221FC-15 días	
237		**E) CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	695 días	mié 5/01/22	jue 30/11/23		
238		1) Pintura en frio acrílica pura base agua para líneas y marcas viales	309 días	mié 9/02/22	mié 1/11/23	221FC+30 días	
239		2) Señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) / Tachas Reflectivas	329 días	mié 9/02/22	lun 6/11/23	221FC+15 días	
240		3) Defensa Metálica / Sección final / Captafaros	354 días	mié 9/02/22	mié 22/11/23	221FC+15 días	
241		4) Postes de Referencia	290 días	mié 2/03/22	sáb 25/11/23	221FC+60 días	
242		5) Construcción de Andenes, Bordillos y Rampas de Acce	693 días	mié 5/01/22	mar 28/11/23	221CC+15 días	
243		Fin Frente de Obra #4	0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23		
244		**Frente de Obra #5 (PR20+600 - PR22+000) Ruta 5003**	677 días	lun 31/05/21	vie 7/04/23		
245		**2.1. FASE DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	291 días	lun 13/09/21	jue 30/06/22		
246		**A). Diseño Geométrico Manual de Diseño INVIAS 2015**	69 días	lun 13/09/21	sáb 20/11/21		
247		1). Levantamiento Topográfico de Detalle para Diseño Geométrico	8 días	lun 13/09/21	lun 20/09/21	194FC-1 día	248;251CC+7 días;302FC-1 día
248		2) Elaboración Documentos para Diseño Geométrico Definitivo	15 días	mar 21/09/21	mar 5/10/21	247	249
249		3) Localización y Replanteo Diseño Geométrico Definitivo	0 días	sáb 20/11/21	sáb 20/11/21	248	
250		**B). Actualización Diseño de Pavimentos (Estudios de Geotecnia / Transito)**	284 días	lun 20/09/21	jue 30/06/22		
251		1) Actualización Estudio de Transito	69 días	lun 20/09/21	sáb 27/11/21	247CC+7 días	252
252		2) Evaluación Geotécnica de Campo	29 días	mar 5/10/21	mar 2/11/21	251	253FC+2 días
253		3) Evaluación Geotécnica de Laboratorio	15 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	252FC+2 días	254FC-11 días
254		4) Elaboración Documentos Diseño de Pavimento Rigido	26 días	mar 9/11/21	sáb 4/12/21	253FC-11 días	255CC+1 día
255		C). Actualización de Estudios de Geologia para Ingeniería y	30 días	mié 10/11/21	jue 9/12/21	254CC+1 día	256CC
256		D). Actualización Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones de Puentes, Obras de Drenaje y Otras Estructuras de Contención	37 días	mié 10/11/21	jue 16/12/21	255CC	257CC
257		E). Actualización Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	37 días	mié 10/11/21	jue 16/12/21	256CC	258CC
258		F). Actualización Estudio de Hidrologia, Hidráulica y Socavación	37 días	mié 10/11/21	jue 16/12/21	257CC	259CC
259		G). Actualización Estudio y Diseños de Estructuras	37 días	mié 10/11/21	jue 16/12/21	258CC	260CC;278FC+4 días
260		H). Actualización Estudio y Diseños de Urbanismo y Paisajismo	37 días	mié 10/11/21	jue 16/12/21	259CC	261CC
261		I). Actualización Otros Estudio y Diseños Previos del Proyecto	37 días	mié 10/11/21	jue 16/12/21	260CC	

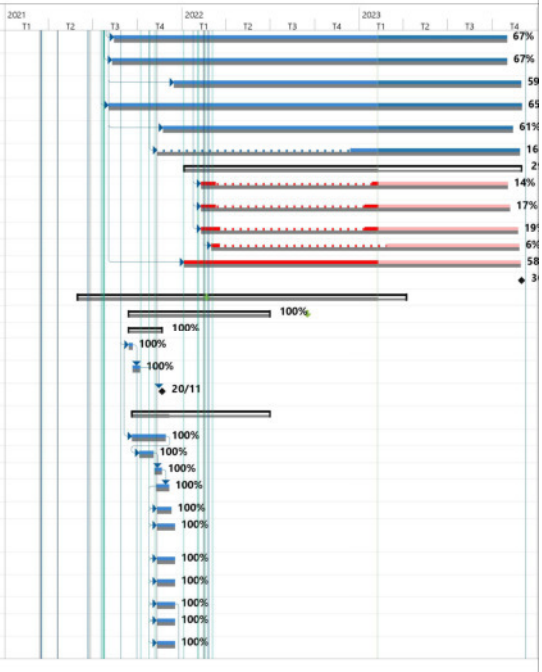

Hito de línea base
Resumen de línea base
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
División de la línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
Atraso
Retrasada
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Línea base

6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
262		**2.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS**	**646.78 días**	**jue 25/03/21**	**sáb 31/12/22**		
263		**A). CAPITULO EXPLANACIONES Y MOV. TIERRAS**	**492.78 días**	**jue 25/03/21**	**sáb 30/07/22**		
264		1) Actividades Preliminares (Desmonte / Demolición / Remoción)	466.78 días	jue 25/03/21	lun 4/07/22		265FC-1 día;289CC;391CC+14 días
265		2) Movimiento Tierra (Excav. en roca / Excav. Material Común / Terraplenes / Trtes)	139.78 días	jue 15/04/21	lun 4/07/22	264FC-1 día	267CC+3 días;270CC+7 días;266CC;291FC+2 días
266		3) Remoción de Derrumbes / Transporte Derrumbes	487.78 días	vie 31/05/02	lun 15/08/22	265CC	
267		4). Mejoramiento Sbrsante / Aportes Material / Geotextil	519.78 días	dom 18/04/21	lun 19/09/22	265CC+3 días	269CC
268		**B). CAPITULO BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**	**539.78 días**	**dom 18/04/21**	**dom 9/10/22**		
269		1) Conformación de la calzada existente / Afirmado	504.78 días	dom 18/04/21	dom 4/09/22	267CC	
270		2) Material Lecho Drenante	509.78 días	jue 22/04/21	mar 13/09/22	265CC+7 días	271CC+1 día
271		3) Subbase Granular Tipo A	534.78 días	vie 23/04/21	dom 9/10/22	270CC+1 día	273CC+1 día;276CC+2 días
272		**C). CAPITULO PAVIMENTOS RÍGIDOS Y ASFALTICOS**	**580.78 días**	**sáb 24/04/21**	**vie 25/11/22**		
273		1) Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	579.78 días	sáb 24/04/21	jue 24/11/22	271CC+1 día	274CC+1 día
274		2) Pavimento de concreto Hidráulico Mr - 45	579.78 días	dom 25/04/21	vie 25/11/22	273CC+1 día	286CC+7 días;293;294;295;296;297
275		**D) CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES - OBRAS VARIAS**	**761.78 días**	**jue 25/03/21**	**mar 25/04/23**		
276		1) Excavaciones varias (Mat. Común / Roca / Bajo agua)	589.78 días	dom 25/04/21	lun 5/12/22	271CC+2 días	277CC+1 día;279CC+2 días;280CC+2 días;283CC+3 días;284CC+2 días;285CC+2
277		2) Rellenos para estructuras (Mat. Del Sitio / Tipo Subbase)	605.78 días	lun 26/04/21	jue 22/12/22	276CC+1 día	
278		3) Pilotes tipo Caissons preexcavadas en concreto clase 28 MPA	401 días	lun 13/12/21	mar 17/01/23	259FC+4 días	
279		7) Concretos para Muros (Cimentaciones / Zapatas / Vástagos / Vigas - 28MPa)	656.78 días	mar 27/04/21	dom 12/02/23	276CC+2 días	281CC+5 días;282CC-2 días
280		9) Concretos Simple para Estructuras 14MPa	662.78 días	mar 27/04/21	sáb 18/02/23	276CC+2 días	
281		11) Barrera new jersey - 28MPa	661.78 días	dom 2/05/21	mié 22/02/23	279CC+5 días	
282		13) Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	694.78 días	dom 25/04/21	lun 20/03/23	279CC-2 días	
283		17) Alcantarillas 36" (Tubo. Concreto Ref. CLASE III / Tubo. Plástico PVC - NTC 5070)	719.78 días	mié 28/04/21	lun 17/04/23	276CC+3 días	
284		18) Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 318 mm, D=12"	724.78 días	mar 27/04/21	vie 21/04/23	276CC+2 días	
285		19) Disipadores de Energía y sedimentadores en gaviones	693.78 días	mar 27/04/21	mar 21/03/23	276CC+2 días	
286		20) Cuneta Concreto 21MPa vaciada in situ / Bordillos en concreto vaciado in situ.	700.78 días	dom 2/05/21	dom 2/04/23	274CC+7 días	
287		21) Filtro Frances (Geotextil Tipo II-NT / Material drenante / Mat. Cobertura / Tubo. 4")	724.78 días	mar 27/04/21	vie 21/04/23	276CC+2 días	
288		22) Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	710.78 días	lun 10/05/21	jue 20/04/23	276CC+15 días	
289		23) Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	761.78 días	jue 25/03/21	mar 25/04/23	264CC	
290		24) Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	711.78 días	vie 30/04/21	mar 11/04/23	276CC+5 días	
291		25) Protección de Taludes con bloques de césped	387.22 días	mié 2/06/21	mar 24/01/23	265FC+2 días	
292		**E) CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	**888.78 días**	**vie 25/06/21**	**jue 30/11/23**		

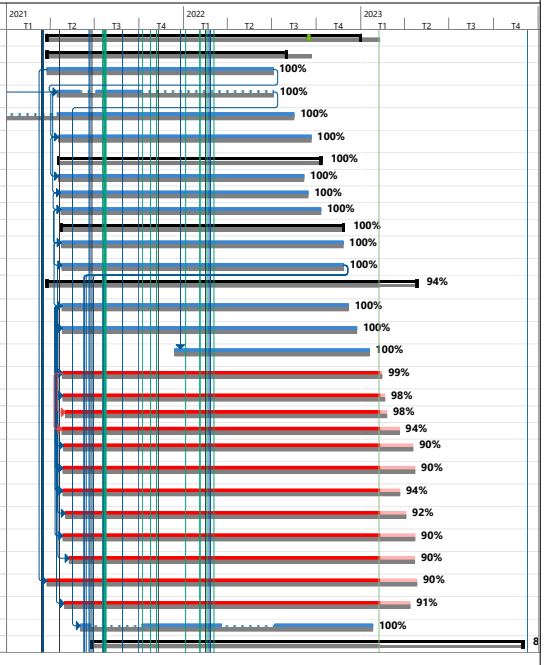

Hito de línea base
Tarea manual
Resumen manual
Atraso
Resumen de línea base
solo el comienzo
Resumen del proyecto
Retrasada
Tareas críticas
solo fin
Tareas externas
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
División crítica
solo duración
Hito externo
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Progreso de tarea crítica
División de la línea base
Tarea inactiva
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tarea
Hito
Hito inactivo
Línea base
División
Progreso del resumen
Resumen inactivo
Progreso de tarea
Resumen
Fecha límite

6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
293		1) Pintura en frio acrilica pura base agua para lineas y marcas viales	361.78 dias	vie 25/06/21	lun 7/08/23	274	
294		2) Señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) / Tachas Reflectivas	451.78 dias	dom 27/06/21	jue 16/02/23	274	
295		3) Defensa Metálica / Sección final / Captafaros	478.78 dias	mié 30/06/21	sáb 18/03/23	274	
296		4) Postes de Referencia	490 días	jue 15/07/21	jue 27/04/23	274	
297		5) Construcción de Andenes, Bordillos y Rampas de Acceso	379.22 dias	mié 4/08/21	dom 28/05/23	274	
298		Fin Frente de Obra #5	0 días	sáb 31/12/22	jue 30/11/23		
299		**Frente de Obra #6 (PR19+400 - PR20+400) Ruta 5003**	**815 días?**	**lun 7/06/21**	**jue 31/08/23**		
300		**2.1. FASE DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**284 días?**	**lun 20/09/21**	**jue 30/06/22**		
301		**A). Diseño Geométrico Manual de Diseño INVIAS 2015**	**388 días**	**lun 7/06/21**	**jue 30/06/22**		
302		1). Levantamiento Topográfico de Detalle para Diseño Geométrico	99 días	lun 20/09/21	sáb 11/06/22	247FC-1 dia	303;306CC+7 dias
303		2) Elaboración Documentos para Diseño Geométrico Definitivo	34 días	mar 28/09/21	jue 30/06/22	302	304
304		3) Localización y Replanteo Diseño Geométrico Definitivo	0 días	lun 7/06/21	jue 30/06/22	303	
305		**B). Actualización Diseño de Pavimentos (Estudios de Geotecnia / Transito)**	**239 días**	**lun 27/09/21**	**lun 23/05/22**		
306		1) Actualización Estudio de Transito	107 días	lun 27/09/21	mar 11/01/22	302CC+7 dias	307
307		2) Evaluación Geotécnica de Campo	123 días	mar 12/10/21	mié 13/04/22	306	308FC+2 dias
308		3) Evaluación Geotécnica de Laboratorio	53 días	dom 14/11/21	lun 23/05/22	307FC+2 dias	309CC+7 dias
309		4) Elaboración Documentos Diseño de Pavimento Rigido	117 días	dom 21/11/21	jue 17/03/22	308CC+7 dias	310CC+8 dias
310		C). Actualización de Estudios de Geologia para Ingenieria y (	121 días	lun 29/11/21	mar 29/03/22	309CC+8 dias	311CC
311		D). Actualización Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones de Puentes, Obras de Drenaje y Otras	131 días	lun 29/11/21	vie 8/04/22	310CC	312CC+14 dias
312		E). Actualización Estudio de Estabilidad y Estabilización de T	100 días	lun 13/12/21	mar 22/03/22	311CC+14 dias	313CC
313		F). Actualización Estudio de Hidrologia, Hidráulica y Socavac	100 días	lun 13/12/21	mar 22/03/22	312CC	314CC+8 dias
314		G). Actualización Estudio y Diseños de Estructuras	98 días	mar 21/12/21	lun 28/03/22	313CC+8 dias	315CC+2 dias;405FC+4 dias
315		H). Actualización Estudio y Diseños de Urbanismo y Paisajis	96 días	jue 23/12/21	lun 28/03/22	314CC+2 dias	316CC
316		I). Actualización Otros Estudio y Diseños Previos del Proyect	96 días	jue 23/12/21	lun 28/03/22	315CC	
317		**PONTÓN PR 19+135 RUTA 5003**	**1006.78 d**	**jue 25/03/21**	**mar 26/12/23**		
318		**PRELIMINARES**	**555.78 di**	**jue 25/03/21**	**sáb 1/10/22**		
319		Excavaciones varias en material común	1 día?	jue 25/03/21	vie 26/03/21		320;323;331;332;333
320		Relleno para estructuras con material granular tipo SBC	1 día?	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	319	
321		**SUBESTRUCTURA**	**144 días?**	**vie 30/09/22**	**lun 20/02/23**		
322		**Cimentación pilotes**	**32 días?**	**vie 30/09/22**	**lun 31/10/22**		
323		Pilotes tipo caisson preexcavados en concreto clase	1 día?	mié 30/11/22	mié 30/11/22	319	324;326;327;328;329
324		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa pilotes	1 día?	jue 1/12/22	jue 1/12/22	323	
325		**Cimentación estribos**	**46 días?**	**vie 30/09/22**	**lun 14/11/22**		
326		Concreto f´c= 28 Mpa Estribos /cargaderos / cabezal	1 día?	dom 1/01/23	dom 1/01/23	323	
327		Concreto f´c= 28 Mpa Losa de aproximación	1 día?	lun 9/01/23	lun 9/01/23	323	

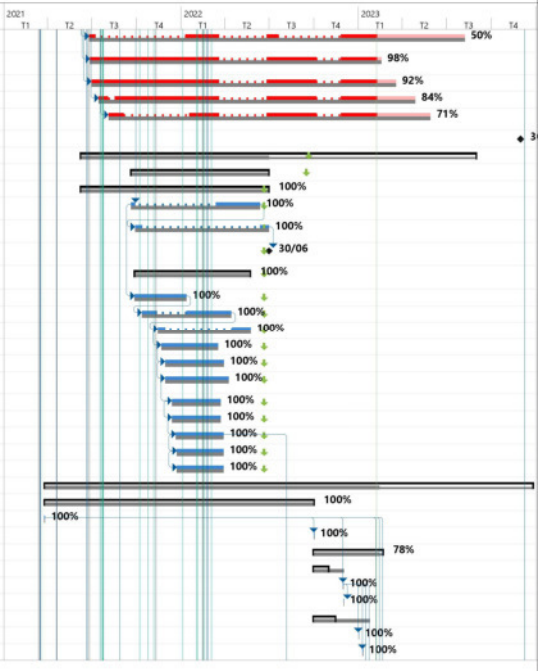

Hito de línea base
Resumen de línea base
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
División de la línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
Atraso
Retrasada
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Línea base

6. CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA POR FRENTES (30-11

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
328		Concreto f´c = 14 Mpa Solado Limpieza	1 día?	lun 16/01/23	lun 16/01/23	323	
329		Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa - Infraestructura	1 día?	lun 23/01/23	lun 23/01/23	323	
330		**Filtros**	**53 días?**	**vie 30/09/22**	**lun 21/11/22**		
331		Material granular drenante	1 día?	lun 6/02/23	lun 6/02/23	319	
332		Geotextil tipo II no tejido	1 día?	lun 13/02/23	lun 13/02/23	319	
333		Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	1 día?	lun 20/02/23	lun 20/02/23	319	
334		**SUPERESTRUCTURA**	**453 días?**	**vie 30/09/22**	**mar 26/12/23**		
335		**Tableros**	**60 días?**	**vie 30/09/22**	**lun 28/11/22**		
336		Concreto f´c = 28 MPa Losa Tablero	1 día?	lun 27/02/23	lun 27/02/23		
337		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa Tableros	1 día?	lun 6/03/23	lun 6/03/23		339;340;341
338		**Aceros especiales**	**432 días?**	**vie 30/09/22**	**mar 5/12/23**		
339		Fabricación de estructura de acero metálica para vig	1 día?	mar 7/03/23	mar 7/03/23	337	
340		Transporte de estructura de acero metálica para vig	1 día?	mar 7/03/23	mar 7/03/23	337	
341		Montaje de estructura de acero metálica para vigas y	1 día?	mar 7/03/23	mar 7/03/23	337	343;344
342		**Barandas y barreras**	**439 días?**	**vie 30/09/22**	**mar 12/12/23**		
343		Barrera new jersey perfil unibidireccional norma ntc 4	1 día?	mié 8/03/23	mié 8/03/23	341	
344		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa barrera	1 día?	mié 8/03/23	mié 8/03/23	341	
345		**Apoyos y juntas**	**446 días?**	**vie 30/09/22**	**mar 19/12/23**		
346		Apoyo de neopreno Anclado compuesto por bloque e	1 día?	lun 19/06/23	lun 19/06/23		
347		Sello para juntas para puentes	1 día?	lun 19/06/23	lun 19/06/23		
348		Prueba de Carga estática y dinámica	1 día?	lun 19/06/23	lun 19/06/23		
349		**Pavimentos**	**453 días?**	**vie 30/09/22**	**mar 26/12/23**		
350		Riego de imprimación con emulsión asfástica CRL-1	1 día?	jue 24/08/23	jue 24/08/23		
351		Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19	1 día?	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23		
352		**fin**	0 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23		
353		**PONTÓN PR 19+365 RUTA 5003**	**376 días?**	**mié 3/08/22**	**dom 13/08/23**		
354		**PRELIMINARES**	**8 días?**	**vie 30/09/22**	**vie 7/10/22**		
355		Excavaciones varias en material común	1 día?	vie 7/10/22	vie 7/10/22		356;359;360;367;368;369
356		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	1 día?	mar 8/11/22	mar 8/11/22	355	
357		**SUBESTRUCTURA**	**315 días?**	**vie 30/09/22**	**jue 10/08/23**		
358		**Cimentación pilotes**	**326 días?**	**vie 30/09/22**	**lun 21/08/23**		
359		Pilotes tipo caisson preexcavados en concreto clase 28 Mpa, excavados a hasta una profundidad maxima 25 ; incluye la excavación - anillo de encamisado y formaleta (no incluye el acero de refuerzo ni del pilote ni de los anillos)	1 día?	lun 21/11/22	lun 21/11/22	355	362;363;364;365
360		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa pilotes	1 día?	jue 24/11/22	jue 24/11/22	355	

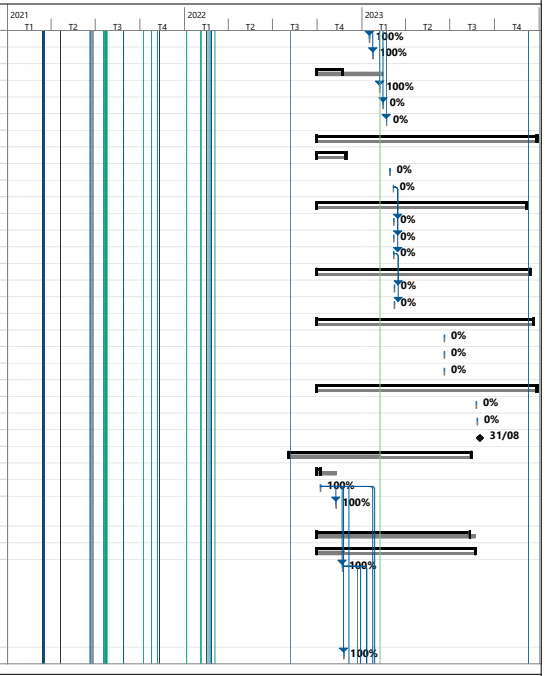

Hito de línea base
Resumen de línea base
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
División de la línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
Atraso
Retrasada
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Línea base
