	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: feb-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 45 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 961.051.825

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/03/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	06/03/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. RAUL FRANCO		Falta de documentación del área de calidad y seguridad social.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/03/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17/03/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17/03/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSÉ BURBANO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	19/03/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSÉ BURBANO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19/03/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20-03-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - JEFE UNIDAD EJECUTORA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 939.243.341,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 45 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** feb-25 (Indicar el período del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 19/03/25
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 19/03/25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 20/03/25
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Firma
Nombre: ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No. 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __8__		Última Acta de fecha ENERO/2025		OBRA EJECUTADA			
																PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																			
1	E	1			201-13		Demolición de Estructuras	m3	3,724.00	$ 113,387.00	$ 422,253,188.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	2,979.00	$ 337,779,873.00	74.90	$ 8,492,686.00	1,710.22	$ 193,916,395.00		
1,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	559.00	$ 63,383,333.00		$ -		$ -		
1,3	E	1-14101	1	14,101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	186.00	$ 21,089,982.00		$ -		$ -		
2	E	1			201-13		Remoción de alcantarillas	m	5,644.00	$ 69,636.00	$ 393,025,584.00	-	$ -		$ -		$ -		
2,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	4,515.00	$ 314,406,540.00	6.00	$ 417,816.00	295.45	$ 20,573,956.00		
2,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	1,129.00	$ 78,619,044.00		$ -		$ -		
3	E	1			201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220,599.00	$ 4,475.00	$ 987,180,525.00	-	$ -		$ -		$ -		
3,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	130,000.00	$ 581,750,000.00		$ -	205.00	$ 917,375.00		
3,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	30,000.00	$ 134,250,000.00		$ -		$ -		
4	E	1			210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,139,426.00	$ 10,216.00	$ 11,640,376,016.00	1,960.51	$ 20,028,570.00		$ -	1,960.51	$ 20,028,570.00		
4,1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	454,197.00	$ 4,640,076,552.00	355.83	$ 3,635,159.00	89,133.57	$ 910,588,580.00		
4,2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	75,700.49	$ 773,356,206.00		$ -		$ -		
5	E	1			210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74,655.00	$ 60,376.00	$ 4,507,370,280.00	-	$ -		$ -		$ -		
5,1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	36,394.00	$ 2,197,324,144.00	40.85	$ 2,466,360.00	19,442.54	$ 1,173,862,966.00		
5,2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	6,065.00	$ 366,180,440.00		$ -		$ -		
6	E	1			211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126,989.00	$ 9,747.00	$ 1,237,761,783.00	18,070.68	$ 176,134,918.00		$ -	18,070.68	$ 176,134,918.00		
6,1	E	1-11601	1	11,601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9,747.00	$ -	213,918.32	$ 2,085,061,865.00	-196.00	-$ 1,910,412.00	170,595.59	$ 1,662,795,177.00		
7	E	1			220-1		Terraplenes	m3	680,805.00	$ 12,594.00	$ 8,574,058,170.00	-	$ -		$ -		$ -		
7,1	E	1-11601	1	11,601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	160,000.00	$ 2,015,040,000.00		$ -		$ -		
7,2	E	1-11701	1	11,701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	40,000.00	$ 503,760,000.00		$ -		$ -		
8	E	1				230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550,000.00	$ 10,300.00	$ 5,665,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
8,1	E	1-11601	1	11,601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10,300.00	$ -	300,000.00	$ 3,090,000,000.00		$ -		$ -		
9	E	1			231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467,519.00	$ 7,521.00	$ 3,516,210,399.00	-	$ -		$ -		$ -		
9,1	E	1-11601	1	11,601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	240,000.00	$ 1,805,040,000.00		$ -	6,637.19	$ 49,918,306.00		
9,2	E	1-11701	1	11,701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	60,001.00	$ 451,267,521.00		$ -		$ -		
10	E	1					Conformación de taludes existentes	m2	261,070.00	$ 1,332.00	$ 347,745,240.00	-	$ -		$ -		$ -		
10,1	E	1-11606	1	11,606			Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1,332.00	$ -	261,070.00	$ 347,745,240.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 37,290,981,185.00**		**$ 23,421,049,844.00**		**$ 13,101,609.00**		**$ 4,208,736,243.00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
11	S	2			310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,100,000.00	$ 927.00	$ 1,019,700,000.00	401,211.66	$ 371,923,209.00		$ -	401,211.66	$ 371,923,209.00		
11,1	S	2-11602	2	11,602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	959,031.00	$ 889,021,737.00		$ -	621,142.18	$ 575,798,801.00		
11,2	S	2-11702	2	11,702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	139,757.34	$ 129,555,054.00		$ -	1,750.50	$ 1,622,714.00		
12	S	2			320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,000.00	$ 145,000.00	$ 23,780,000,000.00	1,504.26	$ 218,117,700.00		$ -	1,504.26	$ 218,117,700.00		
12,1	S	2-11602	2	11,602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	145,236.00	$ 21,059,220,000.00		$ -	76,964.26	$ 11,159,817,410.00		
12,2	S	2-11702	2	11,702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	36,308.74	$ 5,264,767,300.00		$ -	115.90	$ 16,805,500.00		
13	S	2					Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12,300.00	$ 180,245.00	$ 2,217,013,500.00	-	$ -		$ -		$ -		
13,1	S	2-11602	2	11,602			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	9,840.00	$ 1,773,610,800.00		$ -	304.73	$ 54,926,059.00		
13,2	S	2-11702	2	11,702			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	2,460.00	$ 443,402,700.00		$ -	142.80	$ 25,738,986.00		
14	B	2			330-13		Base granular clase A	m3	186,000.00	$ 155,000.00	$ 28,830,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
14,1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	155,100.00	$ 24,040,500,000.00		$ -	45,123.63	$ 6,994,162,650.00		
14,2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	38,775.00	$ 6,010,125,000.00		$ -		$ -		
15	B	2			330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7,140.00	$ 190,385.00	$ 1,359,348,900.00	-	$ -		$ -		$ -		
15,1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	5,712.00	$ 1,087,479,120.00		$ -	15.30	$ 2,912,891.00		
15,2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	1,428.00	$ 271,869,780.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 57,206,062,400.00**		**$ 61,559,592,400.00**		**$ -**		**$ 19,421,825,920.00**		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
16	P	8			421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1,100,000.00	$ 1,849.00	$ 2,033,900,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
16,1	P	8-11603	8	11,603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	911,324.00	$ 1,685,038,076.00		$ -	312,438.74	$ 577,699,239.00		
16,2	P	8-11703	8	11,703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	170,873.00	$ 315,944,177.00		$ -		$ -		
16,3	P	8-14104	8	14,104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	56,958.00	$ 105,315,342.00		$ -		$ -		
17	P	8				450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99,000.00	$ 775,000.00	$ 76,725,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
17,1	P	8-11603	8	11,603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	52,594.21	$ 40,760,515,308.00		$ -		$ -		
17,2	P	8-11703	8	11,703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,000.00	$ 9,300,000,000.00		$ -		$ -		
17,3	P	8-14104	8	14,104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,000.00	$ 3,100,000,000.00		$ -		$ -		
18	P	8				450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86,028.00	$ 775,000.00	$ 66,671,700,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
18,1	P	8-11603	8	11,603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	68,885.00	$ 53,385,875,000.00		$ -	20,088.91	$ 15,568,905,645.00		
18,2	P	8-11703	8	11,703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,916.00	$ 10,009,900,000.00		$ -		$ -		
18,3	P	8-14104	8	14,104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,305.00	$ 3,336,375,000.00		$ -		$ -		
19	P	8				450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,808.00	$ 856,527.00	$ 3,261,654,816.00	-	$ -		$ -		$ -		
19,1	P	8-11603	8	11,603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	3,046.00	$ 2,608,981,242.00		$ -	22.77	$ 19,503,120.00		
19,2	P	8-11703	8	11,703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	762.00	$ 652,673,574.00		$ -		$ -		
20	P	8				460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4,284.00	$ 72,822.00	$ 311,969,448.00	-	$ -		$ -		$ -		
20,1	P	8-11603	8	11,603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	3,427.00	$ 249,560,994.00		$ -		$ -		
20,2	P	8-11703	8	11,703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	857.00	$ 62,408,454.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 149,004,224,264.00**		**$ 125,572,587,167.00**		**$ -**		**$ 16,166,108,004.00**		

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
21	OA	6			600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	$ 32,667.00	$ 260,519,325.00	-	$ -		$ -		$	-
21,1	OA	6-11604	6	11,604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	39,460.00	$ 1,289,039,820.00	1,004.29	$ 32,807,141.00	26,196.90	$	855,774,147.00
21,2	OA	6-11705	6	11,705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	6,836.00	$ 223,311,612.00		$ -		$	-
21,3	OA	6-14102	6	14,102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	2,279.00	$ 74,448,093.00		$ -		$	-
22	OA	6			600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	$ 81,882.00	$ 1,896,059,592.00	-	$ -		$ -		$	-
22,1	OA	6-11604	6	11,604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	18,525.00	$ 1,516,864,050.00	23.64	$ 1,935,690.00	83.50	$	6,837,147.00
22,2	OA	6-11705	6	11,705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	3,473.00	$ 284,376,186.00		$ -		$	-
22,3	OA	6-14102	6	14,102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	1,158.00	$ 94,819,356.00		$ -		$	-
23	OA	6			610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36,173.00	$ 93,098.00	$ 3,367,633,954.00	-	$ -		$ -		$	-
23,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	20,000.00	$ 1,861,960,000.00	67.95	$ 6,326,009.00	207.32	$	19,301,077.00
23,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	5,000.00	$ 465,490,000.00		$ -		$	-
23,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	1,500.00	$ 139,647,000.00		$ -		$	-
24	OA	6			610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38,609.00	$ 176,922.00	$ 6,830,781,498.00	-	$ -		$ -		$	-
24,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	30,887.00	$ 5,464,589,814.00		$ -	2,946.46	$	521,292,973.00
24,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	5,791.00	$ 1,024,555,302.00		$ -	511.54	$	90,502,680.00
24,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	1,931.00	$ 341,636,382.00		$ -		$	-
25	OA	6			610-13		Rellenos con gravilla	m3	326.00	$ 151,702.00	$ 49,454,852.00	-	$ -		$ -		$	-
25,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	661.00	$ 100,275,022.00		$ -	165.16	$	25,055,102.00
25,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	124.00	$ 18,811,048.00		$ -		$	-
25,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	41.00	$ 6,219,782.00		$ -		$	-
26	OA	6				621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	$ 2,286,822.00	$ 2,805,930,594.00	-	$ -		$ -		$	-
26,1	OA	6-11604	6	11,604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	556.00	$ 1,271,473,032.00		$ -	542.00	$	1,239,457,524.00
26,2	OA	6-14101	6	14,101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	371.00	$ 848,410,962.00		$ -		$	-
27	OA	6			630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	$ 1,232,450.00	$ 5,263,793,950.00	-	$ -		$ -		$	-
27,1	OA	6-14103	6	14,103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1,232,450.00	$ -	2,602.00	$ 3,206,834,900.00		$ -	116.00	$	142,964,200.00
28	OA	6			630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	$ 996,330.00	$ 8,745,784,740.00	-	$ -		$ -		$	-
28,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	3,822.00	$ 3,807,973,260.00	248.17	$ 247,259,216.00	1,435.66	$	1,430,394,632.00
28,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	717.00	$ 714,368,610.00		$ -		$	-
28,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	239.00	$ 238,122,870.00		$ -		$	-
29	OA	6				630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2,703.00	$ 1,086,707.00	$ 2,937,369,021.00	-	$ -		$ -		$	-
29,1	OA	6-14104	6	14,104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1,086,707.00	$ -	1,703.00	$ 1,850,662,021.00		$ -		$	-
30	OA	6			630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	$ 687,013.00	$ 9,594,136,545.00	-	$ -		$ -		$	-
30,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	10,000.00	$ 6,870,130,000.00	5.33	$ 3,661,779.00	67.96	$	46,689,403.00
30,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	1,900.00	$ 1,305,324,700.00		$ -		$	-
30,3	OA	6-14103	6	14,103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	698.00	$ 479,535,074.00		$ -		$	-
31	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	$ 473,683.00	$ 1,631,364,252.00	-	$ -		$ -		$	-
31,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	2,755.00	$ 1,304,996,665.00	37.28	$ 17,658,902.00	688.03	$	325,908,250.00
31,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	517.00	$ 244,894,111.00		$ -		$	-
31,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	172.00	$ 81,473,476.00		$ -		$	-
32	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6,348.00	$ 439,711.00	$ 2,791,285,428.00	-	$ -		$ -		$	-
32,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	4,500.00	$ 1,978,699,500.00	15.76	$ 6,929,845.00	619.89	$	272,572,452.00
32,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	900.00	$ 395,739,900.00		$ -		$	-
32,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	300.00	$ 131,913,300.00		$ -		$	-
33	OA	4			640-13	632.1P	Baranda Metalica	m	1,319.00	$ 544,754.00	$ 718,530,526.00	-	$ -		$ -		$	-
33,1	OA	4-14104	4	14,104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544,754.00	$ -	1,319.00	$ 718,530,526.00		$ -		$	-
34	OA	4			640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,759,885.00	$ 5,378.00	$ 9,464,661,530.00	-	$ -		$ -		$	-
34,1	OA	4-11604	4	11,604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	1,055,931.00	$ 5,678,796,918.00	24,949.89	$ 134,180,508.00	287,657.33	$	1,547,021,143.00
34,2	OA	4-11705	4	11,705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	351,977.00	$ 1,892,932,306.00		$ -		$	-
34,3	OA	4-14101	4	14,101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,4	OA	4-14103	4	14,103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,5	OA	4-14104	4	14,104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,995.00	$ 473,237,110.00		$ -		$	-
34,6	OA	4-11606	4	11,606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -	41,534.68	$	223,373,509.00
35	OA	4			641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111,740.00	$ 2,237.00	$ 249,962,380.00	-	$ -		$ -		$	-
35,1	OA	4-14103	4	14,103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,237.00	$ -	111,740.00	$ 249,962,380.00		$ -		$	-
36	OA	6				642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	$ 1,583,123.00	$ 134,565,455.00	-	$ -		$ -		$	-
36,1	OA	6-14104	6	14,104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1,583,123.00	$ -	85.00	$ 134,565,455.00		$ -		$	-
37	OA	6			661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	$ 617,637.00	$ 177,261,819.00	-	$ -		$ -		$	-
37,1	OA	6-11604	6	11,604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	2,630.00	$ 1,624,385,310.00	53.50	$ 33,043,580.00	619.40	$	382,564,358.00
37,2	OA	6-11705	6	11,705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	657.00	$ 405,787,509.00		$ -		$	-
38	OA	6				670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	$ 758,317.00	$ 515,655,560.00	-	$ -		$ -		$	-
38,1	OA	6-11604	6	11,604		670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	544.00	$ 412,524,448.00		$ -		$	-
38,2	OA	6-11705	6	11,705		670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	136.00	$ 103,131,112.00		$ -		$	-
39	OA	6			671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	$ 673,653.00	$ 6,467,068,800.00	-	$ -		$ -		$	-
39,1	OA	6-11604	6	11,604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	6,000.00	$ 4,041,918,000.00	141.12	$ 95,065,911.00	3,866.70	$	2,604,814,055.00
39,2	OA	6-11705	6	11,705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	1,500.00	$ 1,010,479,500.00		$ -	13.58	$	9,148,208.00
40	OA	8			673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	$ 7,720.00	$ 453,936,000.00	-	$ -		$ -		$	-
40,1	OA	8-11604	8	11,604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	47,040.00	$ 363,148,800.00		$ -	47,040.00	$	363,148,800.00
40,2	OA	8-11705	8	11,705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	8,820.00	$ 68,090,400.00		$ -	8,820.00	$	68,090,400.00
40,3	OA	8-14105	8	14,105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	14,792.00	$ 114,194,240.00		$ -	7,226.42	$	55,787,962.00
41	OA	6			673-13		Material granular drenante	m3	8,032.00	$ 136,094.00	$ 1,093,107,008.00	-	$ -		$ -		$	-
41,1	OA	6-11604	6	11,604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	16,426.00	$ 2,235,480,044.00		$ -	10,723.68	$	1,459,429,023.00
41,2	OA	6-11705	6	11,705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	1,205.00	$ 163,993,270.00		$ -		$	-
41,3	OA	6-14105	6	14,105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	401.00	$ 54,573,694.00		$ -		$	-
42	OA	6			681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	$ 237,444.00	$ 2,638,477,728.00	-	$ -		$ -		$	-
42,1	OA	6-11604	6	11,604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	8,890.00	$ 2,110,877,160.00		$ -	1,140.50	$	270,804,882.00
42,2	OA	6-11705	6	11,705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	1,667.00	$ 395,819,148.00		$ -		$	-
42,3	OA	6-14105	6	14,105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	555.00	$ 131,781,420.00		$ -		$	-
Subtotal									**-**		**$ 68,087,340,557.00**		**$ 61,440,499,794.00**		**$ 578,868,581.00**		**$**	**11,960,931,927.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 9,885,528,230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409,452,964,666.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
43	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	$ 1,794.00	$ 394,680,000.00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	526,000.00	$ 943,644,000.00		$ -	166,458.91	$ 298,627,285.00
43,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	83,000.00	$ 148,902,000.00		$ -	33,000.00	$ 59,202,000.00
43,3	SCT	8-14104	8	14,104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	13,000.00	$ 23,322,000.00		$ -	464.00	$ 832,416.00
44	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	$ 22,076.00	$ 2,428,360,000.00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	80,000.00	$ 1,766,080,000.00		$ -	482.41	$ 10,649,683.00
44,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	16,500.00	$ 364,254,000.00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	8	14,104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	5,500.00	$ 121,418,000.00		$ -		$ -
45	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	$ 396,630.00	$ 148,736,250.00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	400.00	$ 158,652,000.00		$ -	6.00	$ 2,379,780.00
45,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	90.00	$ 35,696,700.00		$ -		$ -
46	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	$ 503,621.00	$ 111,803,862.00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	178.00	$ 89,644,538.00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	44.00	$ 22,159,324.00		$ -		$ -
47	SCT	4			720-13		Poste de referencia	u	3,500.00	$ 253,536.00	$ 887,376,000.00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	4	11,607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	2,300.00	$ 583,132,800.00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	4	11,710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	700.00	$ 177,475,200.00		$ -		$ -
48	SCT	4			730-13		Defensa metalica	m	8,000.00	$ 230,532.00	$ 1,844,256,000.00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	4	11,607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	6,400.00	$ 1,475,404,800.00		$ -	748.96	$ 172,659,247.00
48,2	SCT	4-11710	4	11,710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	1,600.00	$ 368,851,200.00		$ -		$ -
Subtotal											**$ 5,815,212,112.00**		**$ 6,278,636,562.00**		**$ -**		**$ 544,350,411.00**
OBRAS VARIAS																			
49	OV	6			800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	$ 17,838.00	$ 1,739,205,000.00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	6	11,605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17,838.00	$ -	97,500.00	$ 1,739,205,000.00		$ -	261.21	$ 4,659,464.00
50	OV	6			810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	$ 18,835.00	$ 517,962,500.00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	6	11,606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,835.00	$ -	27,500.00	$ 517,962,500.00		$ -	19,666.11	$ 370,411,182.00
Subtotal											**$ 2,257,167,500.00**		**$ 2,257,167,500.00**		**$ -**		**$ 375,070,646.00**
TRANSPORTES																			
51	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	$ 1,057.00	$ 1,251,201,553.00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	843,198.549	$ 891,260,866.00		$ -	15,572.61	$ 16,460,249.00
51,2	T	3-14102	3	14,102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	210,799.00	$ 222,814,543.00		$ -		$ -
52	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	$ 1,000.00	$ 11,837,290,000.00	27,496.20	$ 27,496,200		$ -	27,496.20	$ 27,496,200.00
52,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	7,426,510.54	$ 7,426,510,540.00	3,011.37	$ 3,011,370.00	354,593.89	$ 354,593,887.00
52,2	T	3-14102	3	14,102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	1,857,838.23	$ 1,857,838,230.00		$ -		$ -
53	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	$ 1,175.00	$ 1,939,756,975.00	112,459.00	$ 132,139,325.00		$ -	112,458.30	$ 132,138,503.00
53,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1,175.00	$ -	1,538,386.92	$ 1,807,604,632.00		$ -	631,579.16	$ 742,105,513.00
Subtotal											**$ 15,028,248,528.00**		**$ 12,365,664,336.00**		**$ 3,011,370.00**		**$ 1,272,794,352.00**
ÍTEMS NO PREVISTOS																			
54	NP	3				NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608	3	11,608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		1,734,750.00	$ 2,038,331,250.00	3,421.16	$ 4,019,863.00	850,942.82	$ 999,857,814.00
55	NP	8				NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603	8	11,603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		11,120.00	$ 5,814,748,080.00		$ -	4,408.82	$ 2,305,411,657.00
55,2	NP	8-11703	8	11,703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		2,280.00	$ 1,192,232,520.00		$ -	833.72	$ 435,959,691.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

56	NP	1				NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00							
56,1	NP	1-11601	1	11,601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00	42,000.00	$ 4,973,850,000.00		$ -	11,715.55	$ 1,387,414,009.00
56,2	NP	1-11701	1	11,701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00	10,500.00	$ 1,243,462,500.00		$ -		$ -
57	NP	2				NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00	-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602	2	11,602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00	42,000.00	$ 3,314,010,000.00	271.98	$ 21,460,582.00	9,885.12	$ 779,985,008.00
57,2	NP	2-11702	2	11,702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00	10,500.00	$ 828,502,500.00		$ -		$ -
58	NP	2				NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00	-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602	2	11,602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00	4,200.00	$ 418,084,800.00		$ -	4,145.56	$ 412,665,625.00
58,2	NP	2-11702	2	11,702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00	8,050.00	$ 801,329,200.00	534.56	$ 53,212,241.00	1,196.52	$ 119,106,387.00
59	NP	1				NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00	-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601	1	11,601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00	300,800.00	$ 3,399,942,400.00		$ -	78,045.76	$ 882,151,225.00
59,2	NP	1-11701	1	11,701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00	75,200.00	$ 849,985,600.00		$ -	1,905.76	$ 21,540,760.00
60	NP	1				NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00	-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601	1	11,601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00	4,864.00	$ 731,219,712.00		$ -	21.08	$ 3,169,020.00
60,2	NP	1-11701	1	11,701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00	1,216.00	$ 182,804,928.00		$ -		$ -
61	NP	8				NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00	-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603	8	11,603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00	85,000.00	$ 1,522,945,000.00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703	8	11,703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00	20,000.00	$ 358,340,000.00		$ -		$ -
62	NP	8				NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00	-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602	8	11,602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00	170,000.00	$ 3,557,930,000.00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702	8	11,702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00	46,000.00	$ 962,734,000.00		$ -		$ -
63	NP	6				NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00	-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604	6	11,604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00	1,152.00	$ 105,765,120.00	9.86	$ 905,247.00	425.11	$ 39,029,349.00
63,2	NP	6-11705	6	11,705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00	216.00	$ 19,830,960.00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105	6	14,105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00	72.00	$ 6,610,320.00		$ -		$ -
64	NP	2				NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00	-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602	2	11,602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00	7,219.00	$ 1,575,337,399.00		$ -	893.33	$ 194,943,366.00
65	NP	8				NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00	-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603	8	11,603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00	7,440.00	$ 325,284,240.00		$ -	2,864.77	$ 125,250,609.00
66	NP	8				NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00	-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603	8	11,603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00	268.00	$ 21,432,764.00		$ -	124.05	$ 9,920,651.00
67	NP	8				NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00	-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603	8	11,603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00	2,073.00	$ 96,504,369.00		$ -	247.44	$ 11,519,074.00
68	NP	8				NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00	-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604	8	11,604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00	181.00	$ 22,167,432.00		$ -	150.60	$ 18,444,283.00
69	NP	8				NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00	-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603	8	11,603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00	1,166.00	$ 38,877,938.00		$ -	1,085.00	$ 36,177,155.00
70	NP	8				NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00	-	$ -		$ -		$ -
70,1	NP	8-11606	8	11,606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00	12,590.00	$ 531,398,720.00		$ -	517.79	$ 21,854,880.00
71	NP	6				NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34,210.00	-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604	6	11,604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34,210.00	47,000.00	$ 1,607,870,000.00		$ -	16,702.89	$ 571,405,867.00

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

72	NP	4				NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4,808,941.00		-	$ -		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606	4	11,606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4,808,941.00		313.87	$ 1,509,382,312.00	-202.22	-$ 972,464,049.00	101.18	$ 486,568,650.00
73	NP	6				NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4,719,466.00		-	$ -		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604	6	11,604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4,719,466.00		45.00	$ 212,375,970.00		$ -		$ -
74	NP	6				NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1,104,266.00		-	$ -		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604	6	11,604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1,104,266.00		80.75	$ 89,169,480.00	-61.20	-$ 67,581,079.00	19.55	$ 21,588,400.00
75	NP	6				NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344,857.00		-	$ -		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604	6	11,604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344,857.00		3,070.00	$ 1,058,710,990.00		$ -	1,570.00	$ 541,425,490.00
76	NP	6				NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5,166,106.00		-	$ -		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604	6	11,604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5,166,106.00		39.00	$ 201,478,134.00		$ -		$ -
77	NP	4				NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2,869,478.00		-	$ -		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606	4	11,606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2,869,478.00		78.00	$ 223,819,284.00		$ -		$ -
78	NP	6				NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1,596,514.00		-	$ -		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604	6	11,604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1,596,514.00		110.00	$ 175,616,540.00		$ -	33.54	$ 53,541,380.00
79	NP	6				NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129,077.00		-	$ -		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604	6	11,604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129,077.00		150.00	$ 19,361,550.00	6.90	$ 890,631.00	107.14	$ 13,829,310.00
80	NP	6				NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192,063.00		-	$ -		$ -		$ -
80,1	NP	6-11604	6	11,604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192,063.00		30.00	$ 5,761,890.00		$ -		$ -
81	NP	8				NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77,947.00		-	$ -		$ -		$ -
81,1	NP	8-11603	8	11,603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77,947.00		350.00	$ 27,281,450.00	14.40	$ 1,122,437.00	232.47	$ 18,120,339.00
82	NP	8				NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11,267.00		-	$ -		$ -		$ -
82,1	NP	8-11607	8	11,607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11,267.00		12,500.00	$ 140,837,500.00		$ -		$ -
82,2	NP	8-11710	8	11,710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11,267.00		1,250.00	$ 14,083,750.00		$ -		$ -
82,3	NP	8-14104	8	14,104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11,267.00		1,250.00	$ 14,083,750.00		$ -		$ -
83	NP	8				NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41,960.00		-	$ -		$ -		$ -
83,1	NP	8-11606	8	11,606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41,960.00		8,625.35	$ 361,919,686.00		$ -	7,299.47	$ 306,285,761.00
84	NP	6				NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491,499.00		-	$ -		$ -		$ -
84,1	NP	6-11606	6	11,606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491,499.00		5,195.00	$ 2,553,337,305.00	405.00	$ 199,057,095.00	3,750.00	$ 1,843,121,250.00
85	NP	6				NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113,342.00		-	$ -		$ -		$ -
85,1	NP	6-11606	6	11,606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113,342.00		1,650.00	$ 187,014,300.00		$ -		$ -
86	NP	6				NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18,784.00		-	$ -		$ -		$ -
86,1	NP	6-11606	6	11,606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18,784.00		1,650.00	$ 30,993,600.00		$ -		$ -
87	NP	6				NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43,129.00		-	$ -		$ -		$ -
87,1	NP	6-11604	6	11,604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43,129.00		2,742.66	$ 118,288,097.00		$ -	591.30	$ 25,502,178.00
88	NP	6				NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8,420.00		-	$ -		$ -		$ -
88,1	NP	6-11603	6	11,603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8,420.00		14,534.00	$ 122,376,280.00		$ -	7,196.09	$ 60,591,078.00
89	NP	6				NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14,855.00		-	$ -		$ -		$ -
89,1	NP	6-11606	6	11,606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14,855.00		8,625.35	$ 128,129,574.00		$ -	5,998.73	$ 89,111,134.00
90	NP	6				NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137,777.00		-	$ -		$ -		$ -
90,1	NP	6-11601	6	11,601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137,777.00		32.00	$ 4,408,864.00		$ -	31.00	$ 4,271,087.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

91	NP	6				NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208,545.00		-	$ -		$ -		$ -
91,1	NP	6-11601	6	11,601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208,545.00		261.00	$ 54,430,245.00		$ -	212.00	$ 44,211,540.00
92	NP	6				NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318,587.00		-	$ -		$ -		$ -
92,1	NP	6-11601	6	11,601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318,587.00		117.00	$ 37,274,679.00		$ -	91.00	$ 28,991,417.00
93	NP	6				NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803,536.00		-	$ -		$ -		$ -
93,1	NP	6-11601	6	11,601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803,536.00		19.00	$ 15,267,184.00		$ -	11.00	$ 8,838,896.00
94	NP	6				NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273,084.00		-	$ -		$ -		$ -
94.1	NP	6-11606	6	11,606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273,084.00		1,701.50	$ 464,652,426.00		$ -		$ -
95	NP	6				NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36,500.00		-	$ -		$ -		$ -
95.1	NP	6-11606	6	11,606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36,500.00		500.00	$ 18,250,000.00		$ -		$ -
96	NP	4				NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3,080,562.00		-	$ -		$ -		$ -
96.1	NP	4-11607	4	11,607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3,080,562.00		30.00	$ 92,416,860.00		$ -		$ -
97	NP	4				NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12,559.00		-	$ -		$ -		$ -
97.1	NP	4-11607	4	11,607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12,559.00		487.00	$ 6,116,233.00		$ -		$ -
98	NP	8				NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266,961.00		-	$ -		$ -		$ -
98.1	NP	8-11607	8	11,607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266,961.00		242.00	$ 64,604,562.00		$ -		$ -
99	NP	8				NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280,940.00		-	$ -		$ -		$ -
99.1	NP	8-11607	8	11,607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280,940.00		860.00	$ 241,608,400.00		$ -		$ -
100	NP	8				NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234,413.00		-	$ -		$ -		$ -
100.1	NP	8-11607	8	11,607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234,413.00		526.00	$ 123,301,238.00		$ -		$ -
101	NP	8				NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380,449.00		-	$ -		$ -		$ -
101.1	NP	8-11607	8	11,607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380,449.00		102.00	$ 38,805,798.00		$ -		$ -
102	NP	8				NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351,875.00		-	$ -		$ -		$ -
102.1	NP	8-11607	8	11,607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351,875.00		178.00	$ 62,633,750.00		$ -		$ -
103	NP	8				NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705,649.00		-	$ -		$ -		$ -
103.1	NP	8-11607	8	11,607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705,649.00		72.00	$ 50,806,728.00		$ -		$ -
104	NP	6				NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42,916.00		-	$ -		$ -		$ -
104.1	NP	6-11601	6	11,601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42,916.00		196.00	$ 8,411,536.00	196.00	$ 8,411,536.00	196.00	$ 8,411,536.00
105	NP	6				NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1,463,405.00		-	$ -		$ -		$ -
105.1	NP	6-11604	6	11,604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1,463,405.00		44.35	$ 64,902,012.00		$ -		$ -
106	NP	4				NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5,104,114.00		-	$ -		$ -		$ -
106.1	NP	4-11606	4	11,606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5,104,114.00		114.00	$ 581,868,996.00	112.22	$ 572,783,673.00	112.22	$ 572,783,673.00
107	NP	6				NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8,932,080.00		-	$ -		$ -		$ -
107.1	NP	6-14104	6	14,104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8,932,080.00		17.60	$ 157,204,608.00		$ -		$ -
108	NP	6				NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10,480,633.00		-	$ -		$ -		$ -
108.1	NP	6-14104	6	14,104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10,480,633.00		17.60	$ 184,459,141.00		$ -		$ -
109	NP	6				NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128,791.00		-	$ -		$ -		$ -
109.1	NP	6-14104	6	14,104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128,791.00		17.60	$ 2,266,722.00		$ -		$ -
110	NP	6				NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21,616.00		-	$ -		$ -		$ -

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 9,885,528,230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409,452,964,666.00

110.1	NP	6-11604	6	11,604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21,616.00		150.00	$ 3,242,400.00	150.00	$ 3,242,400.00	150.00	$ 3,242,400.00
111	NP	6				NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22,571.00		-	$ -		$ -		$ -
111.1	NP	6-11604	6	11,604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22,571.00		150.00	$ 3,385,650.00		$ -		$ -
112	NP	4				NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4,808,941.00		-	$ -		$ -		$ -
112.1	NP	4-11606	4	11,606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4,808,941.00		90.00	$ 432,804,690.00	90.00	$ 432,804,690.00	90.00	$ 432,804,690.00
113	NP	6				NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1,104,266.00		-	$ -		$ -		$ -
113.1	NP	6-11604	6	11,604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1,104,266.00		61.20	$ 67,581,079.00	61.20	$ 67,581,079.00	61.20	$ 67,581,079.00
114	NP	6				NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56,957.00		-	$ -		$ -		$ -
114.1	NP	6-11604	6	11,604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56,957.00		377.12	$ 21,479,624.00	56.53	$ 3,219,779.00	56.53	$ 3,219,779.00
115	NP	6				NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1,278,774.00		-	$ -		$ -		$ -
115.1	NP	6-11604	6	11,604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1,278,774.00		30.24	$ 38,670,126.00	29.25	$ 37,404,140.00	29.25	$ 37,404,140.00
116	NP	6				NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$ 122,176.00		-	$ -		$ -		$ -
116.1	NP	6-11604	6	11,604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$ 122,176.00		36.00	$ 4,398,336.00		$ -		$ -
117	NP	8				NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79,514.00		-	$ -		$ -		$ -
117.1	NP	8-11603	8	11,603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79,514.00		68.40	$ 5,438.758.00		$ -		$ -
Subtotal											$ -		$ 46,586,243,839.00		$ 366,070,265.00		$ 13,047,251,637.00
Ajuste al peso																	$ (4.00)

(A)	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	$ 334,689,236,546.00	$ 339,481,441,442.00	$ 961,051,825.00	$ 66,997,069,136.00
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 49,343,566,111.00	$ 50,604,522,138.00	$ -	$ 14,785,140,580.00
	AJUSTE POR REDONDEO	$ -		$ -	
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 800,000,000.00	$ 800,000,000.00	$ -	$ -
(D)	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	$ 384,832,802,657.00	$ 390,885,963,580.00	$ 961,051,825.00	$ 81,782,209,716.00
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2,812,239,712.00	$ 2,856,474,349.00	$ 7,023,071.00	$ 597,639,225.00
(F)	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)**	$ 387,645,042,369.00	$ 393,742,437,929.00	$ 968,074,896.00	$ 82,379,848,941.00
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1,845,000,000.00	$ 1,845,000,000.00	$ -	$ 1,660,500,000.00
(H)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 350,550,000.00	$ 350,550,000.00	$ -	$ 315,495,000.00
(I)	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$ 2,195,550,000.00	$ 2,195,550,000.00	$ -	$ 1,975,995,000.00
(J)	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)**		$ 3,183,304,765.00	$ -	$ 1,169,394,950.00
(K)	**IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)**		$ 604,827,905.00	$ -	$ 222,185,041.00
(L)	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	$ -	$ 3,788,132,670.00	$ -	$ 1,391,579,991.00
(M)	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	$ 9,226,844,067.00	$ 9,226,844,067.00	$ -	$ 337,345,759.00
(N)	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00		$ 9,908,676.00
(O)	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	$ 399,567,436,436.00	$ 409,452,964,666.00	$ 968,074,896.00	$ 86,094,678,367.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$	9,885,528,230.00	3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	28,831,555.00	0.29%
Valor Amortizado Acumulado	$	1,792,277,984.00	18.13%
Valor Saldo por Amortizar	$	8,093,250,246.00	81.87%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 961,051,825.00	$ 7,023,071.00	$ 968,074,896.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 961,051,825.00**	**$ 7,023,071.00**	**$ 968,074,896.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 13,101,609.00	$ 4,208,736,243.00
SB	$ -	$ 12,424,750,379.00
B	$ -	$ 6,997,075,541.00
P	$ -	$ 16,166,108,004.00
OA	$ 578,868,581.00	$ 11,960,931,927.00
SCT	$ -	$ 544,350,411.00
OV	$ -	$ 375,070,646.00
T	$ 3,011,370.00	$ 1,272,794,352.00
NP	$ 366,070,265.00	$ 13,047,251,637.00
AJUSTE AL PESO		$ (4.00)
TOTAL	**$ 961,051,825.00**	**$ 66,997,069,136.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 13,101,609.00	$ 4,208,736,243.00
2 Sub-bases y bases	$ 74,672,823.00	$ 19,421,825,920.00
3 Transporte de materiales	$ 7,031,233.00	$ 1,272,794,352.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 167,304,822.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 697,818,901.00	$ 25,927,604,621.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 1,122,437.00	$ 16,166,108,004.00
AJUSTE AL PESO		$ (4.00)
TOTAL	**$ 961,051,825.00**	**$ 66,997,069,136.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	7

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 961,051,825.00 **MES** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 961,051,825.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 932,220,270.00

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 21,513,145.00	$ 6,380,031,485.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 21,460,582.00	$ 20,175,211,810.00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 1,122,437.00	$ 18,733,098,567.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 624,530,778.00	$ 12,767,278,623.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 4,659,464.00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 232,181,409.00	$ 4,346,314,729.00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 484,315,995.00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 7,031,233.00	$ 2,113,017,463.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21,540,760.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ 53,212,241.00	$ 163,273,587.00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435,959,691.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 167,741,288.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59,202,000.00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ -
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ -
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 142,964,200.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 832,416.00
Puentes Drenajes 14105	$ -	$ 55,787,962.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 961,051,825.00**	**$ 66,997,069,136.00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 939,243,341.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. /Subdirección Financiera\.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	45	feb-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 536,080,117.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 403,163,224.00
						TOTAL ACTA	$ 939,243,341.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **45** Valor basico **$ 961,051,825.00** Período: feb-25

Valor incluido el Iva: **$ 968,074,896.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 415,538,955.00		$ -	**$ 415,538,955.00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ -		$ -	**$ -**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 229,951,134.00		$ -	**$ 229,951,134.00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 322,584,807.00		$ -	**$ 322,584,807.00**
TOTALES			**$ 968,074,896.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 968,074,896.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 415,538,955.00	$ 412,524,354.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 415,538,955.00**	**$ 412,524,354.00**
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 69,245,450.00	$ 68,743,097.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 160,705,684.00	$ 159,539,816.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ 33,367,949.00	$ 33,125,875.00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 289,216,858.00	$ 287,118,683.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 552,535,941.00**	**$ 548,527,471.00**
TOTAL			**$ 968,074,896.00**	**$ 961,051,825.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: feb-25

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 218,395,061.00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1,330,844,908.00	$ 980,456,827.00
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401008-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 18,106,315,587.00	$ 15,802,526,786.00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6,074,377,314.00	$ 4,994,383,636.00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1,901,548,611.00	$ 1,876,912,134.00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135,185,186.00	$ -
		TOTAL				$ 27,766,666,667.00	$ 23,654,279,383.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **409,452,964,666.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X	X	
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X	X	
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X	X	
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X	X	
3	OBRA	ago-21	$ 25,633,813.00	$ 187,324.00	$ 25,821,137.00	$ -	$ 25,821,134	$ -	$ 10,858,281,969.00	$ 399,541,615,299.00		X	X	
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,858,281,969.00	$ 399,541,615,299.00		X	X	
4	OBRA	sep-21	$ 290,414,527.00	$ 35,828,991.00	$ 326,243,518.00	$ -	$ 326,243,518	$ -	$ 10,532,038,451.00	$ 399,215,371,781.00		X	X	
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,532,038,451.00	$ 399,215,371,781.00		X	X	
5	OBRA	oct-21	$ 151,421,024.00	$ 1,106,538.00	$ 152,527,562.00	$ -	$ 152,527,562	$ -	$ 10,379,510,889.00	$ 399,062,844,219.00		X	X	
5	AJUSTES	oct-21	$ 2,076,560.00	$ 15,175.00	$ 2,091,735.00	$ -	$ 2,091,735	$ -	$ 10,377,419,154.00	$ 399,060,752,484.00		X	X	
6	OBRA	nov-21	$ 373,938,181.00	$ 2,732,625.00	$ 376,670,806.00	$ -	$ 376,670,806	$ -	$ 10,000,748,348.00	$ 398,684,081,678.00		X	X	
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,748,348.00	$ 398,684,081,678.00		X	X	
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9,885,528,230.00	$ 10,000,748,348.00	$ 408,569,609,908.00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288,931,557.00	$ 2,111,423.00	$ 291,042,980.00	$ -	$ 291,042,980	$ 9,885,528,230.00	$ 9,709,705,368.00	$ 408,278,566,928.00		X	X	
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,885,528,230.00	$ 9,709,705,368.00	$ 408,278,566,928.00		X	X	
8	OBRA	ene-22	$ 162,319,214.00	$ 1,186,179.00	$ 163,505,393.00	$ -	$ 163,505,393	$ 9,885,528,230.00	$ 23,379,533,308.00	$ 408,115,061,535.00		X	X	
8	AJUSTES	ene-22	$ 2,725,546.00	$ 19,917.00	$ 2,745,463.00	$ -	$ 2,745,463	$ 9,885,528,230.00	$ 23,376,787,845.00	$ 408,112,316,072.00		X	X	
9	OBRA	feb-22	$ 95,030,846.00	$ 1,319,010.00	$ 96,349,856.00	$ 2,402,243.00	$ 93,947,613.00	$ 9,883,125,987.00	$ 23,282,840,232.00	$ 408,015,966,216.00		X	X	
10	OBRA	mar-22	$ 815,420,772.00	$ 141,316,899.00	$ 956,737,671.00	$ 23,853,865.00	$ 932,883,806.00	$ 9,859,272,122.00	$ 22,349,956,426.00	$ 407,059,228,545.00		X	X	
11	OBRA	abr-22	$ 315,412,481.00	$ 2,302,160.00	$ 317,714,641.00	$ 7,921,421.00	$ 309,793,220.00	$ 9,851,350,701.00	$ 22,040,163,206.00	$ 406,741,513,904.00		X	X	
12	OBRA	may-22	$ 1,319,446,250.00	$ 95,874,977.00	$ 1,415,321,227.00	$ 35,287,500.00	$ 1,380,033,727.00	$ 9,816,063,201.00	$ 20,660,129,479.00	$ 405,326,192,677.00		X	X	
13	OBRA	jun-22	$ 991,701,814.00	$ 7,243,636.00	$ 998,945,450.00	$ 24,906,210.00	$ 974,039,240.00	$ 9,791,156,991.00	$ 19,686,090,239.00	$ 404,327,247,227.00		X	X	
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9,791,156,991.00	$ 19,686,090,239.00	$ 404,327,247,227.00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2,175,716,720.00	$ 15,895,811.00	$ 2,191,612,531.00	$ 54,642,385.00	$ 2,136,970,149.00	$ 9,736,514,606.00	$ 17,549,120,090.00	$ 402,135,634,696.00		X	X	
15	OBRA	ago-22	$ 1,402,740,283.00	$ 24,188,336.00	$ 1,426,928,619.00	$ 35,576,902.00	$ 1,391,351,717.00	$ 9,700,937,704.00	$ 16,157,768,373.00	$ 400,708,706,077.00		X	X	
16	OBRA	sep-22	$ 1,571,877,792.00	$ 11,486,799.00	$ 1,583,364,591.00	$ 39,584,115.00	$ 1,543,780,476.00	$ 9,661,353,589.00	$ 14,613,987,897.00	$ 399,125,341,486.00		X	X	
17	OBRA	oct-22	$ 1,222,379,281.00	$ 8,932,772.00	$ 1,231,312,053.00	$ 30,782,801.00	$ 1,200,529,252.00	$ 9,630,570,788.00	$ 13,413,458,645.00	$ 397,894,029,433.00		X	X	
9	AJUSTES	feb-22	$ 1,460,286.00	$ 10,671.00	$ 1,470,957.00	$ -	$ 1,470,957	$ 9,630,570,788.00	$ 13,411,987,688.00	$ 397,892,558,476.00		X	X	
10	AJUSTES	mar-22	$ 1,282,119.00	$ 9,369.00	$ 1,291,488.00	$ -	$ 1,291,488	$ 9,630,570,788.00	$ 13,410,696,200.00	$ 397,891,266,988.00		X	X	
11	AJUSTES	abr-22	$ 6,390,786.00	$ 46,702.00	$ 6,437,488.00	$ -	$ 6,437,488	$ 9,630,570,788.00	$ 13,404,258,712.00	$ 397,884,829,500.00		X	X	
12	AJUSTES	may-22	$ 16,753,129.00	$ 122,427.00	$ 16,875,556.00	$ -	$ 16,875,556	$ 9,630,570,788.00	$ 13,387,383,156.00	$ 397,867,953,944.00		X	X	
13	AJUSTES	jun-22	$ 25,396,818.00	$ 185,592.00	$ 25,582,410.00	$ -	$ 25,582,410	$ 9,630,570,788.00	$ 13,361,800,746.00	$ 397,842,371,534.00		X	X	
14	AJUSTES	jul-22	$ 170,598,773.00	$ 1,246,683.00	$ 171,845,456.00	$ -	$ 171,845,456	$ 9,630,570,788.00	$ 13,189,955,290.00	$ 397,670,526,078.00		X	X	
15	AJUSTES	ago-22	$ 158,438,396.00	$ 1,157,819.00	$ 159,596,215.00	$ -	$ 159,596,215	$ 9,630,570,788.00	$ 13,030,359,075.00	$ 397,510,929,863.00		X	X	
16	AJUSTES	sep-22	$ 225,473,832.00	$ 1,647,693.00	$ 227,121,525.00	$ -	$ 227,121,525	$ 9,630,570,788.00	$ 12,803,237,550.00	$ 397,283,808,338.00		X	X	
17	AJUSTES	oct-22	$ 174,274,743.00	$ 1,273,546.00	$ 175,548,289.00	$ -	$ 175,548,289	$ 9,630,570,788.00	$ 12,627,689,261.00	$ 397,108,260,049.00		X	X	
18	OBRA	nov-22	$ 1,175,667,282.00	$ 8,591,415.00	$ 1,184,258,697.00	$ 29,606,467.00	$ 1,154,652,230.00	$ 9,600,964,321.00	$ 11,473,037,031.00	$ 395,924,001,352.00		X	X	
18	AJUSTES	nov-22	$ 225,165,931.00	$ 1,645,443.00	$ 226,811,374.00	$ -	$ 226,811,374	$ 9,600,964,321.00	$ 11,246,225,657.00	$ 395,697,189,978.00		X	X	
19	OBRA	dic-22	$ 1,447,896,167.00	$ 10,580,780.00	$ 1,458,476,947.00	$ 36,461,924.00	$ 1,422,015,023.00	$ 9,564,502,397.00	$ 9,824,210,634.00	$ 394,238,713,031.00		X	X	
19	AJUSTES	dic-22	$ 207,314,232.00	$ 1,514,989.00	$ 208,829,221.00	$ -	$ 208,829,221	$ 9,564,502,397.00	$ 9,615,381,413.00	$ 394,029,883,810.00		X	X	
20	OBRA	ene-23	$ 1,786,280,408.00	$ 13,053,588.00	$ 1,799,333,996.00	$ 44,983,350.00	$ 1,754,350,646.00	$ 9,519,519,047.00	$ 35,627,697,434.00	$ 392,230,549,814.00	#29625 27/03/2023	X	X	
20	AJUSTES	ene-23	$ 222,048,195.00	$ 1,622,660.00	$ 223,670,855.00	$ -	$ 223,670,855	$ 9,519,519,047.00	$ 35,404,026,579.00	$ 392,006,878,959.00	#29633 27/03/2023	X	X	
21	OBRA	feb-23	$ 2,389,391,653.00	$ 17,460,939.00	$ 2,406,852,592.00	$ 60,171,315.00	$ 2,346,681,277.00	$ 9,459,347,732.00	$ 33,057,345,302.00	$ 389,600,026,367.00		X	X	
21	AJUSTES	feb-23	$ 482,061,048.00	$ 3,522,754.00	$ 485,583,802.00	$ -	$ 485,583,802	$ 9,459,347,732.00	$ 32,571,761,500.00	$ 389,114,442,565.00		X	X	
22	OBRA	mar-23	$ 2,790,796,275.00	$ 20,394,280.00	$ 2,811,190,555.00	$ 70,279,764.00	$ 2,740,910,791	$ 9,389,067,968.00	$ 29,830,850,709.00	$ 386,303,252,010.00	#52058 26/05/2023	X	X	
22	AJUSTES	mar-23	$ 413,857,639.00	$ 3,024,344.00	$ 416,881,983.00	$ -	$ 416,881,983	$ 9,389,067,968.00	$ 29,413,968,726.00	$ 385,886,370,027.00		X	X	
23	OBRA	abr-23	$ 2,969,914,739.00	$ 21,703,223.00	$ 2,991,617,962.00	$ 74,790,449.00	$ 2,916,827,513	$ 9,314,277,519.00	$ 26,497,141,213.00	$ 382,894,752,065.00	64557 de 04/07/2023	X	X	
23	AJUSTES	abr-23	$ 671,859,839.00	$ 4,909,745.00	$ 676,769,584.00	$ -	$ 676,769,584	$ 9,314,277,519.00	$ 25,820,371,629.00	$ 382,217,982,481.00	59956 de 20/06/2023	X	X	
24	OBRA	may-23	$ 3,807,359,585.00	$ 27,823,012.00	$ 3,835,182,597.00	$ 95,879,565.00	$ 3,739,303,032	$ 9,218,397,954.00	$ 22,081,068,597.00	$ 378,382,799,884.00	68310 de 13/07/2023	X	X	
24	AJUSTES	may-23	$ 987,969,357.00	$ 7,219,776.00	$ 995,189,133.00	$ -	$ 995,189,133	$ 9,218,397,954.00	$ 21,085,879,464.00	$ 377,387,610,751.00	75773 de 04/08/2023	X	X	
25	OBRA	jun-23	$ 2,929,238,304.00	$ 21,405,972.00	$ 2,950,644,276.00	$ 73,766,107.00	$ 2,876,878,169.00	$ 9,144,631,847.00	$ 18,209,001,295.00	$ 374,436,966,475.00	79946 de 16/08/2023	X	X	
26	OBRA	jul-23	$ 3,620,505,517.00	$ 26,457,540.00	$ 3,646,963,057.00	$ 91,174,076.00	$ 3,555,788,981.00	$ 9,053,457,771.00	$ 14,653,212,314.00	$ 370,790,003,418.00	80982 de 31/08/2023	X	X	
25	AJUSTES	jun-23	$ 726,653,150.00	$ 5,310,158.00	$ 731,963,308.00	$ -	$ 731,963,308	$ 9,053,457,771.00	$ 13,921,249,006.00	$ 370,058,040,110.00	81718 de 19/09/2023	X	X	
26	AJUSTES	jul-23	$ 974,606,520.00	$ 7,122,125.00	$ 981,728,645.00	$ -	$ 981,728,645	$ 9,053,457,771.00	$ 12,939,520,361.00	$ 369,076,311,465.00	83012 de 13/10/2023	X	X	
27	OBRA	ago-23	$ 2,932,713,891.00	$ 21,431,371.00	$ 2,954,145,262.00	$ 73,853,632.00	$ 2,880,291,630	$ 8,979,604,139.00	$ 10,059,228,731.00	$ 366,122,166,203.00	82483 de 02/10/2023	X	X	
27	AJUSTES	ago-23	$ 862,011,163.00	$ 6,299,312.00	$ 868,310,475.00	$ -	$ 868,310,475	$ 8,979,604,139.00	$ 9,190,918,256.00	$ 365,253,855,728.00	84301 de 07/11/2023	X	X	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 2	
	FECHA	5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: feb-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

28	OBRA	sep-23	$ 2,706,088,522	$ 19,743,244	$ 2,725,831,766.00	$ 68,145,794.00	$ 2,657,685,972	$ 8,911,458,345.00	$ 6,533,232,284.00	$ 362,528,023,962.00	84780 de 14/11/2023	X	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1,973,566,210.00	$ 14,422,215.00	$ 1,987,988,425.00	$ 49,699,711.00	$ 1,938,288,714.00	$ 8,861,758,634.00	$ 4,594,943,570.00	$ 360,540,035,537.00	86080 de 29/11/2023	X			
28	AJUSTES	sep-23	$ 606,161,703.00	$ 4,429,643.00	$ 610,591,346.00	$ -	$ 610,591,346	$ 8,861,758,634.00	$ 3,984,352,224.00	$ 359,929,444,191.00	86399 de 04/12/2023				
29	AJUSTES	oct-23	$ 505,693,569.00	$ 3,695,453.00	$ 509,389,022.00	$ -	$ 509,389,022	$ 8,861,758,634.00	$ 3,474,963,202.00	$ 359,420,055,169.00	87308 de 11/12/2023				
30	OBRA	nov-23	$ 1,341,894,886.00	$ 9,806,155.00	$ 1,351,701,041.00	$ 33,792,526	$ 1,317,908,515	$ 8,827,966,108.00	$ 2,157,054,687.00	$ 358,068,354,128.00					
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347,394,511.00	$ 2,538,652.00	$ 349,933,163.00		$ 349,933,163	$ 8,827,966,108.00	$ 1,807,121,524.00	$ 357,718,420,965.00					
31	OBRA	dic-23	$ 996,672,111.00	$ 7,283,373.00	$ 1,003,955,484.00	$ 25,098,887.00	$ 978,856,597	$ 8,802,867,221.00	$ 828,264,927.00	$ 356,714,465,481.00					
31	AJUSTES	dic-23	$ 283,880,483.00	$ 2,074,512.00	$ 285,954,995.00	$ -	$ 285,954,995	$ 8,802,867,221.00	$ 542,309,932.00	$ 356,428,510,486.00					
32	OBRA	ene-24	$ 1,567,939,894.00	$ 69,860,222.00	$ 1,637,800,116.00	$ 40,945,003	$ 1,596,855,113	$ 8,761,922,218.00	$ 26,712,121,486.00	$ 354,790,710,370.00					
33	OBRA	feb-24	$ 1,377,852,860.00	$ 10,068,925.00	$ 1,387,921,785.00	$ 34,698,045	$ 1,353,223,740	$ 8,727,224,173.00	$ 25,358,897,746.00	$ 353,402,788,585.00					
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3,305,147.00	$ 24,153.00	$ 3,329,300.00		$ 3,329,300.00	$ 8,727,224,173.00	$ 25,355,568,446.00	$ 353,399,459,285.00					
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1,822,783.00	$ 13,320.00	$ 1,836,103.00		$ 1,836,103.00	$ 8,727,224,173.00	$ 25,353,732,340.66	$ 353,397,623,182.00					
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328,022,246.00	$ 2,397,086.00	$ 330,419,332.00		$ 330,419,332.00	$ 8,727,224,173.00	$ 25,023,313,008.66	$ 353,067,203,850.00					
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475,850,522.00	$ 3,477,369.00	$ 479,327,891.00		$ 479,327,891	$ 8,727,224,173.00	$ 24,543,985,117.66	$ 352,587,875,959.00					
34	OBRA	mar-24	$ 2,102,620,456.00	$ 15,365,303.00	$ 2,117,985,759.00	$ 52,949,644	$ 2,065,036,115	$ 8,674,274,529.00	$ 22,478,949,002.66	$ 350,469,890,200.00					
35	OBRA	abr-24	$ 2,440,745,157.00	$ 17,836,215.00	$ 2,458,581,372.00	$ 63,459,374	$ 2,395,121,998	$ 8,610,815,155.00	$ 20,083,827,004.66	$ 348,011,308,828.00					
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661,244,553.00	$ 4,832,172.00	$ 666,076,725.00		$ 666,076,725	$ 8,610,815,155.00	$ 19,417,750,279.66	$ 347,345,232,103.00					
36	OBRA	may-24	$ 2,275,185,600.00	$ 38,968,164.00	$ 2,314,153,764.00	$ 64,586,808	$ 2,249,566,956	$ 8,546,228,347.00	$ 17,168,183,323.66	$ 345,031,078,339.00					
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748,434,632.00	$ 5,469,330.00	$ 753,903,962.00		$ 753,903,962	$ 8,546,228,347.00	$ 16,414,279,361.66	$ 344,277,174,377.00					
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628,970,127.00	$ 4,596,320.00	$ 633,566,447.00		$ 633,566,447	$ 8,546,228,347.00	$ 15,780,712,914.66	$ 343,643,607,930.00					
37	OBRA	jun-24	$ 2,160,141,566.00	$ 68,026,296.00	$ 2,228,167,862.00	$ 56,225,783	$ 2,171,942,079	$ 8,490,002,564.00	$ 13,608,770,835.66	$ 341,415,440,068.00					
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576,148,866.00	$ 4,210,319.00	$ 580,359,185.00		$ 580,359,185	$ 8,490,002,564.00	$ 13,028,411,650.66	$ 340,835,080,883.00					
38	OBRA	jul-24	$ 3,189,948,164.00	$ 23,311,160.00	$ 3,213,259,324.00	$ 95,698,445	$ 3,117,560,879	$ 8,394,304,119.00	$ 9,910,850,771.66	$ 337,621,821,559.00					
39	OBRA	ago-24	$ 2,453,722,811.00	$ 43,824,946.00	$ 2,497,547,757.00	$ 69,359,634	$ 2,428,188,123	$ 8,324,944,485.00	$ 6,482,662,648.66	$ 335,124,273,802.00					
40	OBRA	sep-24	$ 2,232,069,298.00	$ 16,283,263.00	$ 2,248,352,561.00	$ 66,647,753	$ 2,181,704,808	$ 8,258,296,732.00	$ 4,300,957,841.66	$ 332,875,921,241.00					
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880,571,775.00	$ 6,434,948.00	$ 887,006,723.00		$ 887,006,723	$ 8,258,296,732.00	$ 3,413,951,118.66	$ 331,988,914,518.00					
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577,306,253.00	$ 4,218,776.00	$ 581,525,029.00		$ 581,525,029	$ 8,258,296,732.00	$ 2,832,426,089.66	$ 331,407,389,489.00					
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462,130,018.00	$ 3,377,104.00	$ 465,507,122.00		$ 465,507,122	$ 8,258,296,732.00	$ 2,366,918,967.66	$ 330,941,882,367.00					
41	OBRA	oct-24	$ 1,155,576,481.00	$ 8,444,597.00	$ 1,164,021,078.00	$ 34,667,294	$ 1,129,353,784	$ 8,223,629,438.00	$ 1,237,565,183.66	$ 329,777,861,289.00					
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243,514,888.00	$ 1,779,532.00	$ 245,294,420.00		$ 245,294,420	$ 8,223,629,438.00	$ 992,270,763.66	$ 329,532,566,869.00					
42	OBRA	nov-24	$ 522,421,192.00	$ 3,817,693.00	$ 526,238,885.00	$ 15,672,636	$ 510,566,249	$ 8,207,956,802.00	$ 481,704,514.66	$ 329,006,327,984.00					
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101,373,197.00	$ 740,804.00	$ 102,114,001.00		$ 102,114,001	$ 8,207,956,802.00	$ 379,590,513.66	$ 328,904,213,983.00					
43	OBRA	dic-24	$ 320,275,243.00	$ 2,340,473.00	$ 322,615,716.00	$ 9,608,257	$ 313,007,459	$ 8,198,348,545.00	$ 66,583,055.00	$ 328,581,598,267.00					
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66,100,015.00	$ 483,039.00	$ 66,583,054.00		$ 66,583,054	$ 8,198,348,545.00	$ 1.00	$ 328,515,015,213.00					
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2,857,487.00	$ 20,882.00	$ 2,878,369.00		$ 2,878,369	$ 8,198,348,545.00	$ 27,763,788,299.00	$ 328,512,136,844.00					
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1,085,862.00	$ 7,935.00	$ 1,093,797.00		$ 1,093,797	$ 8,198,348,545.00	$ 27,762,694,502.00	$ 328,511,043,047.00					
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1,534,868.00	$ 11,216.00	$ 1,546,084.00		$ 1,546,084	$ 8,198,348,545.00	$ 27,761,148,418.00	$ 328,509,496,963.00					
44	OBRA	ene-25	$ 3,341,233,663.00	$ 113,297,310.00	$ 3,454,530,973.00	$ 76,266,744	$ 3,378,264,229	$ 8,122,081,801.00	$ 24,382,884,189.00	$ 325,054,965,990.00					
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723,319,012.00	$ 5,285,793.00	$ 728,604,805.00		$ 728,604,805	$ 8,122,081,801.00	$ 23,654,279,384.00	$ 324,326,361,185.00					
45	OBRA	feb-25	$ 961,051,825.00	$ 7,023,071.00	$ 968,074,896.00	$ 28,831,555	$ 939,243,341	$ 8,093,250,246.00	$ 22,715,036,043.00	$ 323,358,286,289.00					
TOTALES			**$ 84,956,294,886.00**	**$ 1,138,383,481.00**	**$ 86,094,678,367.00**	**$ 1,792,277,984.00**	**$ 84,302,400,393.00**	**$ 8,093,250,246.00**	**$ 22,715,036,043.00**	**$ 323,358,286,289.00**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 66,997,069,136.00	$ 489,593,967.00	**$ 67,486,663,103.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 14,785,140,580.00	$ 108,045,258.00	**$ 14,893,185,838.00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,660,500,000.00	$ 315,495,000.00	**$ 1,975,995,000.00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 1,169,394,950	$ 222,185,041.00	**$ 1,391,579,991.00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 22,453,511.00	$ 104,052.00	**$ 22,557,563.00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 312,504,510	$ 2,283,686	**$ 314,788,196.00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9,232,199.00	$ 676,477.00	**$ 9,908,676.00**
VALOR TOTAL	**$ 84,956,294,886.00**	**$ 1,138,383,481.00**	**$ 86,094,678,367.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-138605 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	2	2025
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No:	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**9,885,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**409,452,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE		$ -	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		$ -	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		$ -	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ -	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		$ -	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL		$ -	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ -	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)		$ -	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ -	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		$ -	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		$ -	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ -	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO		$ -	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		$ -	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		$ -	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		$ -	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		$ -	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		$ -	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ -	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		$ -	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		$ -	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		$ -	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ -	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		$ -	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		$ -	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ -	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ -	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		$ -	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ -	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ -	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ -	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		$ -	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ -	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28	2	2025
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**-**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	92.519.730	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-44184 CND
Representante Legal [X]		Apoderado [ ]	Representante Legal [X]		Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

FECHA: 28 / 2 / 2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 45

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 6503			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ -

NOTAS:

QUIEN ENTREGA:

Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciaal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato orinciaal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409.452.964,666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin susensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las susensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P				0,038%	0,059%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,02%	
				$ P				$125.847,816	$198.987,503	$986.997,558	$791.819,175	$48.894,195	$61.734,389	$74.135,263	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.920,0	$29.484,269	$31.021,576	
				% E			0,006%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,009%	0,009%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P						0,008%	1,492%	0,025%	0,031%	0,037%	
				$ P						$27.455,799	$4.995.052,197	$83.581,224	$104.476,531	$125.371,837	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ E				$39.265,901	$95.291,892	$177.088,487	$278.395	$78.921,7	$54.320,049	$35.241,527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,099%	
				$ P							$6.862.143,091	$217.873,261	$272.341,576	$326.809,891	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P						0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%
				$ P						$261.487,362	$405.632,657	$243.379,594	$20.094,358	$25.117,947	$140.491,208
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ E										$4.260,084	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P							0,023%	0,014%	0,001%	0,002%	0,002%
				$ P							$78.093,897	$46.856,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P							0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%
				$ P							$60.775,067	$36.465,040	$3.010,684	$3.763,368	$4.516,042
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,32%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
				$ P				$306.031,109	$306.031,109	$382.538,886	$376.730,982	$18.950,331	$23.687,914	$28.425,497	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ E			$9.000,265	$29.154,793	$22.754,978	$20.894,968	$7.849	$11.977,5	$7.907,915	$3.015,962	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P											
				$ P											
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,527	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 14.785.140,580	29,217%
	$ 50.604.522,138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 597.639,225	20,922%
	$ 2.856.474,349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.169.394,950	36,735%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 222.185,041	36,735%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año) **L**

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961,051,825.00

SEGUIMIENTO No. 45
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	6,34%
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,031%	0,037%	0,044%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$102.965,643	$123.558,771	$148.270,525	$44.659,002	$48.213,860	$72.473,688	$53.995,580	$50.141,100	$191.881,395	$35.780,843	
				$ E	$27.163,766	$108.552,447	$74.541,918	$45.723,501	$20.780,030	$21.783,166	$30.768,135	$50.204,943	$46.912,847	$34.212,244	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,125%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,512%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$174.127,551	$208.953,061	$250.743,673	$434.185,000	$8.064,900	$761.814,900	$955.229,324	$680.529,578	$1.730.282,233	$86.689,992	
				$ E	$249.068,641	$498.252,059	$403.662,802	$710.545,918	$695.904,666	$801.150,795	$311.217,811	$71.529,629	$586.616,152	$947.750,429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,136%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$453.902,626	$544.683,151	$653.619,782		$805.693,400	$193.396.000	$960.410.200	$1.372.872.040	$1.115.127.000	$210.702,203	
				$ E	$30.746,620	$59.637,392			$263.328,682	$502.762,971	$343.021,414	$290.213,284	$239.446,702	$191.692,410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,044%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$195.126,678	$234.152,013	$280.982,416	$93.507,625	$186.794,610	$319.640,634	$206.291,210	$206.721,210	$837.044,197	$95.391,551	
				$ E	$4.609,710	$68.258,236	$287.504,999	$271.314,068	$250.690,973	$142.263,664	$158.286,430	$86.604,632	$135.819,677	$198.666,644	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	3,96%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%		0,019%				0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$11.897,126	$13.840,992	$19.268,956	$184.265,200		$60.012,780				$8.238,774	
				$ E			$186.473,092	$70.460,578	$1.076,400					$286.340,340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$6.272,280	$7.526,736	$9.032,083							$3.197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$39.479,857	$47.375,829	$56.850,994	$16.094,000	$18.317,500	$19.095,000	$18.662,500	$18.432,500	$36.271,500	$19.543,739	
				$ E	$2.784,747	$25.547,762	$38.241,527	$41.652,063	$14.663,860	$2.237,260	$39.180,992	$9.028,400	$3.761,327	$12.606,834	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,012%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P				$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$489.784,880	$36.747,581	
				$ E				$1.034.472,679	$80.005,963	$101.679,846	$289.904,499	$378.089,694	$435.839,462	$115.612,507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,29%	0,35%	0,42%	0,30%	0,39%	0,50%	0,73%	0,77%	1,31%	0,15%
	VALOR (Miles de Pesos)	$983.241,761	$1.179.890,113	$1.415.868,135	$1.018.203,267	$1.311.976,710	$1.671.325,442	$2.439.911,254	$2.573.612,868	$4.400.391,205	$486.292,553
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,70%	6,05%	6,48%	2,49%	2,88%	3,38%	4,11%	4,88%	6,19%	6,34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$19.077.760,710	$20.257.650,822	$21.673.518,958	$8.321.082,274	$9.633.058,984	$11.304.384,426	$13.744.295,680	$16.317.908,548	$20.718.299,753	$21.204.592,306
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,09%	0,25%	0,30%	0,65%	0,40%	0,47%	0,37%	0,35%	0,43%	0,53%
	VALOR (Miles de Pesos)	$314.373,484	$846.248,896	$990.424,338	$2.174.348,807	$1.326.450,583	$1.571.877,792	$1.222.379,281	$1.175.667,282	$1.447.896,167	$1.786.280,408
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,47%	0,73%	1,02%	1,67%	2,07%	2,54%	2,90%	3,26%	3,69%	4,22%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.587.683,062	$2.433.931,958	$3.424.356,296	$5.598.705,103	$6.925.155,686	$8.497.033,478	$9.719.412,759	$10.895.080,041	$12.342.976,208	$14.129.256,616

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA (Día / Mes / Año)	5	3	2025

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato orinicial)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$35.780,844	$89.452,111	$79.330,258	$126.928,412	$126.928,412	$158.660,515	$158.660,515	$174.526,567	$174.526,567	$220.124,423	
				$ E	$56.212,566	$270.270,815	$280.264,052	$21.458,412	$267.238,294	$134.900,540	$298.853,507	$114.835,245	$200.700,367	$196.228,001	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,006%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$86.689,992	$216.724,981	$218.038,320	$348.861,312	$348.861,312	$436.076,641	$436.076,641	$479.684,305	$479.684,805	$610.507,297	
				$ E	$848.693,374	$1.344.247,560	$838.331,136	$1.038.014,650	$670.760,250	$1.034.476,050	$849.151,900	$1.047.102,350	$406.681,800	$203.931,850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,063%	0,157%	0,150%	0,240%	0,240%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$210.702,204	$526.755,511	$502.023,263	$803.237,221	$803.237,221	$1.004.046,526	$1.004.046,526	$1.104.451,179	$1.104.451,179	$1.405.665,137	
				$ E	$1.013.630,239	$803.527,723	$1.287.210,053	$1.024.341,294	$628.657,799	$950.343,614	$1.227.170,425	$359.398,662	$554.813,398	$368.519,919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,166%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$85.391,552	$213.478,879	$217.292,430	$347.667,888	$347.667,888	$434.584,860	$434.584,860	$478.043,346	$478.043,346	$608.418,804	
				$ E	$233.049,478	$142.915,537	$226.674,790	$639.292,969	$495.949,750	$497.350,015	$245.163,274	$548.542,978	$301.612,826	$120.474,226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$8.238,775	$20.596,938	$22.238,344	$35.581,350	$35.581,350	$44.476,687	$44.476,687	$48.924,356	$48.924,356	$62.267,362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$3.197,870	$7.994,675	$7.994,676	$12.791,482	$12.791,482	$15.989,353	$15.989,353	$17.588,288	$17.588,288	$22.385,094	
				$ E			$143.267,129	$99.224,982	$47.265,314		$18.475,767			$130.529,752	
				% E			0,048%	0,018%	0,014%		0,006%			0,039%	
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$19.543,739	$48.859,346	$43.798,037	$70.076,859	$70.076,859	$87.596,074	$87.596,074	$96.355,681	$96.355,681	$122.634,503	
				$ E	$8.775,690	$31.923,656	$64.436,110	$40.744,763	$29.679,400	$13.308,000	$107.175,749	$47.412,622	$26.616,360	$7.491,460	
				% E	0,003%	0,010%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$36.747,595	$91.868,954	$125.016,069	$200.025,711	$200.025,711	$250.032,139	$250.032,139	$275.035,353	$275.035,353	$350.044,994	
				$ E	$6.086,536	$119.918,900	$129.299,488	$56.292,553	$28.482,692	$69.132,538	$145.221,903	$67.646,942	$81.140,564	$311.229,478	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente Ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.292,557	$1.215.731,395	$1.215.731,397	$1.945.170,235	$1.945.170,235	$2.431.462,795	$2.431.462,795	$2.674.609,075	$2.674.609,075	$3.404.047,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	8,37%	9,10%	9,82%	10,62%	11,42%	12,44%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.690.884,863	$22.906.616,258	$24.122.347,655	$26.067.517,890	$28.012.688,125	$30.444.150,920	$32.875.613,715	$35.550.222,790	$38.224.831,865	$41.628.879,777	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	0,88%	1,08%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.389.391,653	$2.790.796,275	$2.969.914,739	$3.807.359,585	$2.929.238,304	$3.620.505,517	$2.932.713,891	$2.694.112,555	$1.973.566,210	$1.341.894,886	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4,94%	5,77%	6,66%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$16.518.648,269	$19.309.444,544	$22.279.359,282	$26.086.718,867	$29.015.957,171	$32.636.462,685	$35.569.176,576	$38.263.289,131	$40.236.855,341	$41.578.750,227	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL – VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	5	3	2025
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 45 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,100%	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$122.124,722	$31.374,726	$31.374,726	$78.436,816	$78.436,816	$125.498,906	$125.498,906	$156.873,633	$156.873,633	$335.010,996	
				$ E	$43.824,332	$94.429,339	$67.724,970	$19.083,817	$28.527,237	$28.230,869	$109.059,744	$228.877,262	$249.277,817	$149.724,073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,069%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$186.377,591	$86.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	$431.165,415	$474.281,956	
				$ E	$342.192,950	$184.206,100	$56.941,500	$763.701,035	$692.567,875	$665.105,500	$291.434,150	$980.319,300	$166.296,000	$213.362,393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,187%	0,057%	0,057%	0,143%	0,229%	0,064%	0,064%	0,141%	0,141%	0,087%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$625.665,138	$191.508,820	$191.508,820	$478.772,049	$478.772,049	$766.035,279	$429.525,580	$471.034,400	$471.034,400	$291.137,833	
				$ E	$392.405,470	$322.304,453	$705.409,401	$839.614,618	$804.259,477	$575.887,022	$668.149,590	$668.888,923	$403.531,760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,200%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$213.418,805	$85.938,087	$85.938,087	$214.845,218	$214.845,218	$343.752,348	$343.752,348	$429.690,435	$429.690,435	$472.659,479	
				$ E	$78.874,225	$439.025,569	$268.801,459	$210.678,346	$572.212,449	$634.109,239	$389.353,830	$723.177,346	$826.726,267	$831.406,091	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$62.267,363	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,888	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,635	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$7.961,560	$10.425,172		$5.438,606		$130.529,752	$3.034,422	
				% E			0,012%	0,001%	0,003%		0,002%		0,039%	0,001%	
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$122.634,503	$17.321,897	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	$86.609,487	$95.270,436	
				$ E	$6.698,440	$81.725,740	$14.578,720	$10.268,550	$6.309,790	$11.200,400	$23.222,108	$143.192,849	$119.859,186	$64.210,020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$130.041,994	$51.214,216	$51.214,216	$128.035,543	$128.035,543	$204.856,869	$204.856,869	$742.580,781	$742.580,787	$768.187,895	
				$ E	$72.[illegible],094	$126.573,493	$224.430,824	$256.722,530	$326.443,155	$238.360,570	$387.534,738	$445.551,914	$676.826,533	$959.854,755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,44%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,57%**	**0,42%**	**0,71%**	**0,71%**	**0,75%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.484.918,210**	**$475.547,837**	**$475.547,838**	**$1.188.869,603**	**$1.188.869,604**	**$1.902.191,366**	**$1.415.681,667**	**$2.377.739,205**	**$2.377.739,212**	**$2.502.312,154**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12,88%**	**13,02%**	**13,17%**	**13,52%**	**13,88%**	**14,44%**	**14,87%**	**15,58%**	**16,29%**	**17,04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$43.113.797,987**	**$43.589.345,824**	**$44.064.893,662**	**$45.253.763,265**	**$46.442.632,869**	**$48.344.824,235**	**$49.760.505,902**	**$52.138.245,107**	**$54.515.984,319**	**$57.018.296,473**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,30%**	**0,37%**	**0,41%**	**0,63%**	**0,73%**	**0,64%**	**0,56%**	**0,95%**	**0,69%**	**0,66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$996.672,111**	**$1.248.264,694**	**$1.377.852,860**	**$2.102.620,456**	**$2.440.745,156**	**$2.152.893,600**	**$1.874.192,766**	**$3.189.948,164**	**$2.311.987,811**	**$2.221.591,754**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**12,72%**	**13,09%**	**13,51%**	**14,13%**	**14,86%**	**15,51%**	**16,07%**	**17,02%**	**17,71%**	**18,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.575.422,338**	**$43.823.687,032**	**$45.201.539,892**	**$47.304.160,348**	**$49.744.905,505**	**$51.897.799,105**	**$53.771.991,868**	**$56.961.940,032**	**$59.273.927,842**	**$61.495.519,592**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B)	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	5	3	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,060%	22,25%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$335.010,996	$297.518,866	$135.068,866	$76.048,476	$76.048,476	$123.110,566	$123.110,566	$170.172,656	$170.172,656	$201.547,383	
				$ E	$180.896,550	$9.687,559	$18.861,115	$158.634,142	$13.101,609						
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%						
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$474.281,956	$453.631,581	$453.631,582	$186.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	
				$ E	$100.035,351	$8.343,000		$641.706,750							
				% E	0,030%	0,002%		0,192%							
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,060%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$246.199,011	$209.388,167	$244.323,218	$159.172,333	$191.508,820	$274.085,331	$274.085,331	$285.697,584	$285.697,584	$201.555,429	
				$ E				$397.194,691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,086%	0,065%	0,067%	0,103%	0,103%	0,129%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$472.659,479	$515.518,563	$451.566,609	$297.546,420	$287.546,420	$216.496,551	$224.699,037	$345.360,681	$345.360,681	$431.298,768	
				$ E	$359.375,351	$258.350,971	$67.523,279	$663.143,982	$578.866,004						
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,198%	0,173%						19,64%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$48.373,355	$46.566,089	$46.566,089	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$17.390,709	$17.132,986	$17.132,986	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	
				$ E	$1.025,685	$599,357		$42.786,904							
				% E	0,000%	0,000%		0,013%							
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$95.270,436	$96.253,282	$96.251,029	$17.321,924	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	
				$ E	$46.291,800	$340,600	$9.017,039	$76.993,183	$3.011,570						
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%						
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,124%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$838.777,694	$855.599,019	$855.599,019	$435.957,729	$403.621,922	$380.443,248	$386.700,523	$463.521,849	$463.521,849	$414.736,067	
				$ E	$467.961,744	$245.091,705	$224.673,810	$561.896,151	$366.070,265						
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%						17,04%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,32%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,55%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.826.697,603**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,25%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.546.259,603**	**$62.037.868,156**	**$64.338.007,554**	**$65.522.244,527**	**$66.596.482,154**	**$67.879.354,827**	**$69.176.730,262**	**$70.903.530,996**	**$72.630.331,730**	**$74.457.029,332**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.651.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B)	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALCARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	5	3	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciola)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orónroaas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciola)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,060%	0,065%	0,065%	0,079%	0,079%	0,014%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$201.547,383	$217.234,746	$217.234,746	$264.296,837	$264.296,837	$46.732,326	$46.732,326	$116.830,818	$116.830,818	$186.929,308	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,129%	0,142%	0,142%	0,180%	0,150%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$431.165,415	$474.281,956	$474.281,956	$603.631,581	$503.631,582	$128.443,275	$128.443,275	$321.108,188	$321.108,188	$513.773,101	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,071%	0,101%	0,101%	0,095%	0,095%	0,085%	0,085%	0,213%	0,213%	0,341%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$235.999,973	$336.443,659	$336.443,659	$319.020,171	$319.020,171	$285.250,384	$285.250,384	$713.125,961	$713.125,961	$1.141.001,537	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,129%	0,142%	0,142%	0,120%	0,117%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$431.298,768	$474.267,812	$474.267,812	$403.174,942	$393.174,942	$128.003,881	$128.003,882	$320.009,705	$320.009,705	$512.015,528	
				$ E											
				% E											24,92%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,018%	0,018%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$43.975,778	$48.373,355	$48.373,355	$61.566,089	$61.566,089	$13.100,292	$13.100,292	$32.750,730	$32.750,730	$52.401,169	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	0,007%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$15.809,276	$17.390,203	$17.390,204	$22.132,986	$22.132,987	$4.709,549	$4.709,550	$11.773,875	$11.773,875	$18.838,201	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,026%	0,028%	0,028%	0,036%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$86.609,487	$95.270,436	$95.270,436	$121.253,282	$121.253,280	$25.800,785	$25.800,785	$64.501,963	$64.501,963	$103.203,140	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,124%	0,132%	0,107%	0,100%	0,100%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$414.736,067	$440.343,175	$357.950,105	$334.771,433	$334.771,434	$76.283,040	$76.283,041	$190.707,603	$190.707,603	$305.132,164	
				$ E											
				% E											22,25%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,56%**	**0,63%**	**0,60%**	**0,64%**	**0,60%**	**0,21%**	**0,21%**	**0,53%**	**0,53%**	**0,85%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.861.142,147**	**$2.103.605,342**	**$2.021.212,273**	**$2.129.847,321**	**$2.019.847,322**	**$708.323,532**	**$708.323,535**	**$1.770.808,843**	**$1.770.808,843**	**$2.833.294,148**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**22,80%**	**23,43%**	**24,04%**	**24,67%**	**25,27%**	**25,49%**	**25,70%**	**26,23%**	**26,76%**	**27,60%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$76.318.171,479**	**$78.421.776,821**	**$80.442.989,095**	**$82.572.836,415**	**$84.592.683,737**	**$85.301.007,269**	**$86.009.330,804**	**$87.780.139,647**	**$89.550.948,490**	**$92.384.242,638**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	5	3	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciual)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato orinciual)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórrogas sin susoensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	36,70%
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,098%	0,098%	0,012%	0,012%	0,031%	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$186.929,308	$233.661,636	$233.661,636	$257.027,800	$257.027,800	$327.126,288	$327.126,291	$41.604,390	$41.604,390	$104.010,976	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,211%	0,269%	0,269%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$513.773,101	$642.216,376	$642.216,376	$706.438,014	$706.438,014	$899.102,927	$899.102,927	$114.349,199	$114.349,199	$285.872,996	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,469%	0,597%	0,597%	0,076%	0,076%	0,190%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$1.141.001,537	$1.426.251,922	$1.426.251,922	$1.568.877,114	$1.568.877,114	$1.996.752,691	$1.996.752,689	$253.949,868	$253.949,868	$634.874,671	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,153%	0,191%	0,191%	0,210%	0,210%	0,268%	0,268%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$512.015,528	$640.019,410	$640.019,410	$704.021,350	$704.021,350	$896.027,173	$896.027,173	$113.958,020	$113.958,020	$284.895,050	
				$ E											
				% E											32,15%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$52.401,169	$65.501,461	$65.501,461	$72.051,607	$72.051,607	$91.702,045	$91.702,044	$11.662,796	$11.662,797	$29.156,994	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$18.838,201	$23.547,751	$23.547,751	$25.902,526	$25.902,526	$32.966,851	$32.966,851	$4.192,770	$4.192,770	$10.481,927	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$103.203,140	$129.003,925	$129.003,925	$141.904,318	$141.904,319	$180.605,495	$180.605,494	$22.969,666	$22.969,666	$57.424,164	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,125%	0,160%	0,160%	0,020%	0,020%	0,051%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$305.132,164	$381.415,206	$381.415,206	$419.556,726	$419.556,726	$533.981,289	$533.981,288	$67.912,505	$67.912,505	$169.781,263	
				$ E											
				% E											27,60%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,48%**	**1,48%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.895.779,456**	**$4.958.264,759**	**$4.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**28,45%**	**29,51%**	**30,57%**	**31,73%**	**32,89%**	**34,38%**	**35,86%**	**36,05%**	**36,23%**	**36,70%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$95.217.536,786**	**$98.759.154,473**	**$102.300.772,160**	**$106.196.551,615**	**$110.092.331,071**	**$115.050.595,830**	**$120.008.860,587**	**$120.639.459,801**	**$121.270.059,016**	**$122.846.557,057**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	5	3	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciaal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sussensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciaal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$104.010,976	$166.417,561	$166.417,561	$208.021,951	$208.021,951	$228.824,146	$228.824,146	$291.230,732	$291.230,733	$51.851,527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.745,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											41,11%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											36,70%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,47%**	**0,75%**	**0,75%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,04%**	**1,04%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.576.498,042**	**$2.522.396,866**	**$2.522.396,866**	**$3.152.996,084**	**$3.152.996,084**	**$3.468.295,692**	**$3.468.295,692**	**$4.414.194,520**	**$4.414.194,524**	**$785.915,434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**37,18%**	**37,93%**	**38,68%**	**39,63%**	**40,57%**	**41,60%**	**42,64%**	**43,96%**	**45,28%**	**45,51%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$124.423.055,099**	**$126.945.451,965**	**$129.467.848,831**	**$132.620.844,915**	**$135.773.840,999**	**$139.242.136,691**	**$142.710.432,383**	**$147.124.626,903**	**$151.538.821,427**	**$152.324.736,861**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año) L **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 961.051.825,00

SEGUIMIENTO No. 45
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orincioal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00 (Según contrato orincioal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórrogas sin susoensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	
				$ P	$51.851.527	$129.628,818	$129.628,818	$207.406,109	$207.406,109	$259.257,636	$259.257,636	$285.183,400	$285.183,400	$362.960,582	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
				$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
				$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
				$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ E											
				% E											50,44%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
				$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
				$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
				$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
				$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ E											
				% E											45,51%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**45,75%**	**46,33%**	**46,92%**	**47,86%**	**48,80%**	**49,97%**	**51,15%**	**52,44%**	**53,73%**	**55,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$153.110.652,296**	**$155.075.440,883**	**$157.040.229,470**	**$160.183.891,212**	**$163.327.552,954**	**$167.257.130,131**	**$171.186.707,308**	**$175.509.242,203**	**$179.831.777,098**	**$185.333.185,150**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	5	3	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciola)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórroaas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciola)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 / dic-28	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,053%	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	69,13%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,555	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											62,25%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$592.475,209	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											55,37%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**57,02%**	**57,42%**	**57,81%**	**58,81%**	**59,80%**	**61,39%**	**62,97%**	**64,96%**	**66,95%**	**69,13%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$190.834.593,200**	**$192.163.519,498**	**$193.492.445,797**	**$196.814.761,553**	**$200.137.077,310**	**$205.452.782,522**	**$210.768.487,734**	**$217.413.119,247**	**$224.057.750,760**	**$231.366.845,425**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B)	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
(Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11

FECHA: 5 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 **DE** feb-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 961.051.825,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orincioal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orincioal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981.185	11,142%	1,053%	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,234%	0,201%	0,251%	101,432%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.208.736,244	$ P	$482.224,555	$613.740,343	$713.740,343	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$783.324,738	$783.324,738	$672.562,068	$841.670,510	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,239%	0,239%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,732%	0,822%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$800.000,000	$800.000,000	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.484.418,515	$2.751.418,516	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,432%	0,447%	0,930%	0,893%	1,361%	1,429%	1,786%	1,725%	
	$125.572.587,167	37,519%	$16.166.108,004	$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$1.445.337,876	$1.495.337,876	$3.112.418,767	$2.988.344,691	$4.555.059,120	$4.781.351,506	$5.976.689,382	$5.774.866,424	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	2,993%	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,801%	0,747%	
	$61.440.499,793	18,357%	$11.960.931,922	$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.681.992,677	$2.498.598,712	
				$ E												
				% E												85,28%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,046%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$155.086,856	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,094%	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,032%	
	$2.257.167,500	0,674%	$375.070,645	$ P	$48.597,210	$61.850,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$108.676,532	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,319%	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,141%	
	$12.365.664,336	3,695%	$1.272.794,352	$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$472.143,074	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,265%	% P	0,235%	0,299%	0,365%	0,179%	0,179%	0,239%	0,488%	0,631%	0,631%	0,727%	0,763%	
	$46.586.243,839	13,919%	$13.047.251,638	$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$600.000,000	$600.000,000	$799.157,629	$1.633.450,207	$2.112.944,785	$2.112.944,785	$2.432.607,837	$2.552.607,837	
				$ E												
				% E												69,13%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**16,767%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 66.997.069,136**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**2,18%**	**2,78%**	**3,35%**	**1,40%**	**1,42%**	**2,29%**	**2,51%**	**3,67%**	**3,73%**	**4,44%**	**4,53%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$7.309.094,666**	**$9.302.484,122**	**$11.221.613,829**	**$4.701.954,726**	**$4.751.954,726**	**$7.654.789,103**	**$8.404.453,792**	**$12.271.127,968**	**$12.497.420,354**	**$14.844.634,270**	**$15.155.068,460**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**71,31%**	**74,09%**	**77,44%**	**78,85%**	**80,27%**	**82,56%**	**85,07%**	**88,73%**	**92,47%**	**96,90%**	**101,43%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$238.675.940,091**	**$247.978.424,213**	**$259.200.038,042**	**$263.901.992,768**	**$268.653.947,494**	**$276.308.736,597**	**$284.713.190,389**	**$296.984.318,357**	**$309.481.738,712**	**$324.326.372,982**	**$339.481.441,442**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,580	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 597.639,225	20,922%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.097.609,231	27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**	**$ 86.094.678,367**	**21,027%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ACEVEDO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de febrero de 2025.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los siete (7) días de marzo de 2025, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



Revisor fiscal
CC. 1.143.367.723
T.P. No. 239726
(Ver informe especial adjunto)

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S, identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de febrero 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de febrero 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de febrero 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S.A.S

7 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

7 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social por el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025 de los trabajadores de la compañía, preparado por la Administración de la Compañía y mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía el “Relación de nómina de febrero de 2025” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se encuentran asociados al contrato mantenido con la compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de Pago correspondientes al personal de la compañía por el periodo de febrero de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral anterior, por el periodo de febrero de 2025.

4. Comparé, de manera selectiva de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social.

5. Obtuve las planillas de pago de cesantías pagadas, correspondientes al año 2024.

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center Barranquilla, Colombia, Tel: (60-5) 3855111, Fax: (60-5) 3855111 Ext. 216, www.pwc.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

7 de marzo de 2025

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de febrero de 2025 de los trabajadores de la compañía, preparado por la administración y mencionados en el presente informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de febrero de 2025.

Para constancia se firma a los 6 días del mes de marzo de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

264CB187197779F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ANDRES DIAZ DE HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143367723 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 239726-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************* ** ***

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA			
		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE 5
		FECHA	28 / 2 / 2025 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1,075,220,227	CONSERJE	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1,115,953,038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X
3	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17,702,262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	1,075,244,845	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
5	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8,816,573	CONSERJE	$ 1,423,500	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	ANDRADE RIOS LONDREY	7,726,893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	$ 1,800,000	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80,082,913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6,397,798	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	1,076,903,778	ALMACENISTA	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1,003,820,143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2,700,000	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8,566,761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	AYA GULIMBO YARLEDIS	1,118,364,489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
12	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1,075,274,138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 1,900,000	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16,189,231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7,720,225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,774,830	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1,049,348,655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1,075,310,823	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96,332,427	OFICIAL DE OBRA	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1,081,154,948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	BUSTILLO RODRIGUEZ JAIDER ARTURO	10,822,904,112	PREDIAL	$ 6,470,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1,006,417,658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
21	CABARCA FLOREZ DONINO	11,051,242	OFICIAL DE OBRA	$ 1,737,085	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1,075,276,273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,017,260	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	CADENA DIAZ NELSON	7,719,307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13,069,675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5,000,000	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1,075,299,636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1,042,422,058	MECANICO C	$ 2,610,000	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	78,645,628	CONSERJE	$ 1,423,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1,115,944,447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO ALEJAND	1,096,645,846	TOPOGRAFO	$ 2,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1,006,517,075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3,828,340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 16,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83,248,558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40,077,088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1,003,828,405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	1,010,145,284	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2,017,242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	CUMACO PASCUAS MARCOS	14,014,052	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33,101,811	DIRECTOR JURIDICO	$ 10,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15,670,086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2,547,135	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	1,066,185,472	OPERADOR TRITURADORA	$ 1,300,000	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1,104,422,998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1,400,000	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	DURAN ROOSEVELTH	80,039,508	CONSERJE	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5,268,520	LABORATORISTA	$ 2,262,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1,116,923,581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
44	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96,356,264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1,113,516,378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	1,117,815,289	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1,075,236,534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	FLORES LARA MOISES	17,788,380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1,079,176,760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1,017,246,567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	1,115,943,767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 16,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
53	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	1,039,474,044	AUXILIAR OPERATIVO EQUIPOS	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	KMA 830.094.920-5	$ 1,973,500	$ 137,400	V	NUEVA E.P.S	9481436908	$ 79,000	PROTECCIÓN	9481436908	$ 315,800	$ 59,000	-	-	-
2	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	INCAPACIDAD MEDICA EL 22 AL 25 DE ENERO DE 2025 Y VACACIONES EL 27 DE ENERO DE 2025
3	KMA 830.094.920-5	$ 2,326,535	$ 162,000	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9481436908	$ 93,100	PORVENIR	9481436908	$ 372,300	$ 45,000	-	-	-
4	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 45,000	-	-	INCAPACITADA TODO EL MES
5	KMA 830.094.920-5	$ 1,920,917	$ 133,700	V	COOSALUD MOVILIDAD	9481436908	$ 76,900	PROTECCION	9481436908	$ 307,400	$ 76,900	-	-	VACACIONES DEL 30 DE DIC AL 3 DE ENERO Y 4 DE ENERO PERMISO MEDIA JORNADA
6	KMA 830.094.920-5	$ 1,923,649	$ 133,900	V	SANITAS	9481436908	$ 77,000	PORVENIR	9481436908	$ 307,800	$ 77,000	-	-	9 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO 2025
7	KMA 830.094.920-5	$ 4,619,733	$ 321,600	V	FAMISANAR	9481436908	$ 184,800	COLPENSIONES	9481436908	$ 739,200	$ 184,800	-	-	LICENCIA NO REMUNERADA DEL 23 AL 4 DE ENERO E INCAPACIDAD DEL 5 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025
8	KMA 830.094.920-5	$ 1,700,000	$ 118,400	V	SANITAS	9481436908	$ 68,000	COLPENSIONES	9481436908	$ 272,000	$ 68,000	-	-	-
9	KMA 830.094.920-5	$ 2,670,003	$ 185,900	V	SANITAS	9481436908	$ 106,900	COLPENSIONES	9481436908	$ 427,300	$ 106,900	-	-	4 DIAS NO REMUNERADOS DESDE EL 30, 2,3,4 DESCONTADOS EN ENERO
10	KMA 830.094.920-5	$ 1,573,500	$ 109,600	V	EPS MUTUAL SER	9481436908	$ 63,000	PROTECCION	9481436908	$ 251,800	$ 63,000	-	-	-
11	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	A.I.C.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	INCAPACIDAD POR UN DIA 16/01/2025 SE DESCONTARÁ EN FEBRERO
12	KMA 830.094.920-5	$ 1,900,001	$ 132,300	V	SANITAS	9481436908	$ 76,100	PROTECCION	9481436908	$ 304,100	$ 38,400	-	-	CUATRO DIAS DE VACACIONES DESDE 30 DICIEMBRE 2,3 Y 4 ENERO 2025
13	KMA 830.094.920-5	$ 1,477,655	$ 102,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 59,200	PORVENIR	9481436908	$ 236,500	$ 59,200	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
14	KMA 830.094.920-5	$ 1,778,915	$ 123,900	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 71,200	COLFONDOS	9481436908	$ 284,700	$ 71,200	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESCONTADAS EN ENERO, 1 DIA DE AUSENTISMO 7 DE ENERO
15	KMA 830.094.920-5	$ 1,661,713	$ 115,700	V	COOSALUD MOVILIDAD	9481436908	$ 66,500	PROTECCION	9481436908	$ 265,900	$ 66,500	-	-	14 DIAS DE VACACIONES DESDE 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4,7,8,9,10 Y 11 ENERO 2025 SERAN DESCONTADAS EN ENERO
16	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9481436908	$ 57,000	PROTECCION	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	14 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4,7, 8,9,10 Y 11 ENERO DESCONTADAS EN ENERO 2025
17	KMA 830.094.920-5	$ 1,819,208	$ 126,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 72,800	PORVENIR	9481436908	$ 291,100	$ 72,800	-	-	VACACIONES DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2025
18	KMA 830.094.920-5	$ 2,011,209	$ 140,000	V	SANITAS	9481436908	$ 80,500	PORVENIR	9481436908	$ 321,800	$ 80,500	-	-	CUATRO DIAS DE VACACIONES DESDE 30 DICIEMBRE 2,3 Y 4 ENERO 2025
19	KMA 830.094.920-5	$ 5,602,134	$ 390,000	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 224,100	PROTECCION	9481436908	$ 896,400	$ 101,900	-	-	-
20	KMA 830.094.920-5	$ 1,801,359	$ 125,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 72,100	PORVENIR	9481436908	$ 288,300	$ 72,100	-	-	AUSENTISMO EL 18 DE ENERO DE 2025 Y SUSPENSIÓN DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2025
21	KMA 830.094.920-5	$ 2,124,953	$ 147,900	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 85,000	PORVENIR	9481436908	$ 340,000	$ 85,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
22	KMA 830.094.920-5	$ 2,017,260	$ 140,500	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 80,700	PORVENIR	9481436908	$ 322,800	$ 80,700	-	-	5 DIAS CALAMIDAD DOMESTICA DESDE EL 30,31, 2,3,4
23	KMA 830.094.920-5	$ 2,004,010	$ 139,500	V	SANITAS	9481436908	$ 80,200	COLPENSIONES	9481436908	$ 320,700	$ 80,200	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS
24	KMA 830.094.920-5	$ 5,500,001	$ 382,900	V	NUEVA EPS	9481436908	$ 220,100	COLPENSIONES	9481436908	$ 880,100	$ 220,100	-	-	DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO PNR Y 4 DE ENERO PERMISO MEDIA JORNADA
25	KMA 830.094.920-5	$ 1,427,616	$ 99,400	V	FAMISANAR	9481436908	$ 57,200	PORVENIR	9481436908	$ 228,500	$ 48,000	-	-	AUSENTISMO 02-01-2025, 2 DIAS DE VACACIONES 17 Y 18, Y 15 DIAS DE VA CACIONES DESDE EL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO
26	KMA 830.094.920-5	$ 3,314,834	$ 230,800	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9481436908	$ 132,600	COLFONDOS	9481436908	$ 530,400	$ 13,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
27	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	INCAPACITADO TODO EL MES
28	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	COLFONDOS	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	LICENCIA DE MATERNIDAD DEL 1 AL 22 DE ENERO Y VACACIONES DEL 23 AL 30 DE ENERO
29	KMA 830.094.920-5	$ 2,600,000	$ 181,000	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 104,000	PORVENIR	9481436908	$ 416,000	$ 104,000	-	-	-
30	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 102,000	-	-	VACACIONES DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2025
31	KMA 830.094.920-5	$ 12,763,079	$ 888,400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	0	$ 510,600	COLPENSIONES	0	$ 2,042,100	$ 37,700	$ 255,262	$ 382,892	-
32	KMA 830.094.920-5	$ 1,816,957	$ 126,500	V	SANITAS	9481436908	$ 72,700	COLFONDOS	9481436908	$ 290,800	$ 72,700	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS
33	KMA 830.094.920-5	$ 4,311,112	$ 300,100	V	SANITAS	9481436908	$ 172,500	PORVENIR	9481436908	$ 689,800	$ 172,500	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 18 DE ENERO DE 2025
34	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	COLPENSIONES	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	9 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4 ENERO
35	KMA 830.094.920-5	$ 2,017,242	$ 140,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 80,700	PORVENIR	9481436908	$ 322,800	$ 554,400	-	-	-
36	KMA 830.094.920-5	$ 627,284	$ 43,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 25,100	PORVENIR	9481436908	$ 100,400	$ 111,300	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS
37	KMA 830.094.920-5	$ 8,050,000	$ 560,300	V	SANITAS	9481436908	$ 322,000	COLFONDOS	9481436908	$ 1,288,000	$ 322,000	-	-	-
38	KMA 830.094.920-5	$ 2,547,134	$ 177,300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9481436908	$ 101,900	COLPENSIONES	9481436908	$ 407,600	$ 101,900	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 8 DE ENERO DE 2025
39	KMA 830.094.920-5	$ 2,404,000	$ 167,400	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 96,200	PORVENIR	9481436908	$ 384,700	$ 96,200	-	-	9 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO 2025
40	KMA 830.094.920-5	$ 1,823,339	$ 127,000	V	MUTUAL SER	9481436908	$ 73,000	PROTECCION	9481436908	$ 291,800	$ 79,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
41	KMA 830.094.920-5	$ 1,931,434	$ 134,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 77,300	PROTECCION	9481436908	$ 309,100	$ 77,300	-	-	VACACIONES DEL 13 AL 27 DE ENERO DE 2025
42	KMA 830.094.920-5	$ 2,871,067	$ 199,900	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 114,900	PORVENIR	9481436908	$ 459,400	$ 45,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 18 DE ENERO DE 2025
43	KMA 830.094.920-5	$ 1,500,000	$ 104,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 60,000	PORVENIR	9481436908	$ 240,000	$ 60,000	-	-	VACACIONES EL 28 DE ENERO DE 2025
44	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2025
45	KMA 830.094.920-5	$ 1,694,274	$ 118,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 67,800	COLPENSIONES	9481436908	$ 271,100	$ 67,800	-	-	-
46	KMA 830.094.920-5	$ 706,281	$ 49,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 28,300	PORVENIR	9481436908	$ 113,100	$ 28,300	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025 PRESENTÓ RENUNCIA AL CARGO EL 14 DE ENERO DE 2025
47	KMA 830.094.920-5	$ 2,023,286	$ 140,900	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 81,000	PORVENIR	9481436908	$ 323,800	$ 81,000	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
48	KMA 830.094.920-5	$ 1,697,370	$ 118,200	V	SANITAS	9481436908	$ 67,900	PORVENIR	9481436908	$ 271,600	$ 67,900	-	-	-
49	KMA 830.094.920-5	$ 1,427,616	$ 99,400	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,200	COLFONDOS	9481436908	$ 228,500	$ 57,200	-	-	-
50	KMA 830.094.920-5	$ 3,504,446	$ 244,000	V	SAVIA SALUD	9481436908	$ 140,200	PORVENIR	9481436908	$ 560,800	$ 140,200	-	-	-
51	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA DEL 1 AL 4 DE ENERO Y VACACIONES DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2025
52	KMA 830.094.920-5	$ 12,953,850	$ 901,600	V	SANITAS	9481436908	$ 518,200	COLPENSIONES	9481436908	$ 2,072,700	$ 518,200	$ 259,077	$ 388,616	-
53	KMA 830.094.920-5	$ 2,604,667	$ 181,300	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 104,200	COLPENSIONES	9481436908	$ 416,800	$ 57,000	-	-	7 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 13 AL 20 DE ENERO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 5
		FECHA	28 / 2 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

54	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96,353,628	CONSERJE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,973,500	$ 137,400	V	SANITAS	9481436908	$ 79,000	PORVENIR	9481436908	$ 315,800	$ 79,000	-	-	-
55	GARIBELLO REYES OVIDIO	96,361,025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,103,008	$ 146,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 84,200	PORVENIR	9481436908	$ 336,500	$ 54,600	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2025 LICENCIA REMUNERADA 21 DE ENERO
56	GARIZAO SEHUANES CANDELARIO DE JESUS	8,373,253	OFICIAL DE OBRA	$ 1,800,000	- - - - X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,586,271	$ 110,500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9481436908	$ 63,500	PROTECCION	9481436908	$ 253,900	$ 63,500	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO TRASLADADO EL 16 DE ENERO DE 2025
57	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	1,003,804,882	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	9 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4 ENERO
58	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	1,069,476,370	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SAVIA SALUD	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	9 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO 2025
59	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1,119,211,470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,583,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,584,230	$ 110,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 63,400	PORVENIR	9481436908	$ 253,500	$ 23,100	-	-	-
60	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	93,405,904	COORDINADOR TECNICO EQUIPO	$ 8,212,000	X - - - X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 8,212,001	$ 571,600	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9481436908	$ 328,500	COLPENSIONES	9481436908	$ 1,314,000	$ 328,500	-	-	8 DIAS DE VACACIONES DESDE 30 DICIEMBRE Y 2,3,4,7,8,9,10 Y11 ENERO SERAN DESCONTADAS EN ENERO , INCAPACIDAD DE 3 DIAS DESDE EL 30 AL 01 DE FEBRERO
61	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1,115,945,030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,442,841	$ 100,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 57,800	PORVENIR	9481436908	$ 230,900	$ 57,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 11 DE ENERO DE 2025
62	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1,193,560,376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,884,117	$ 131,200	V	FAMISANAR	9481436908	$ 75,400	PORVENIR	9481436908	$ 301,500	$ 75,400	-	-	INCAPACIDAD POR UN DIA 13-01-2025
63	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	7,726,324	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,005,013	$ 139,600	V	SANITAS	9481436908	$ 80,300	PORVENIR	9481436908	$ 320,900	$ 80,300	-	-	CINCO DIAS DE VACACIONES DESDE 23,24,26,27,28 DICIEMBRE DESCONTADAS EN ENERO
64	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	1,069,154,123	OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA	$ 2,610,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,310,000	$ 230,400	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 132,400	PROTECCION	9481436908	$ 529,600	$ 132,400	-	-	-
65	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1,115,943,538	OPERADOR CARGADOR	$ 2,000,000	- - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,030,436	$ 141,400	V	SANITAS	9481436908	$ 81,300	PORVENIR	9481436908	$ 324,900	$ 68,400	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 9 DE ENERO DE 2025
66	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1,193,560,376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X V X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,482,999	$ 103,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 59,400	PORVENIR	9481436908	$ 237,300	$ 59,400	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025 Y VACACIONES 27 DE ENERO DE 2025
67	LASSO VANEGAS JACOBO	1,075,264,501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,508,601	$ 105,000	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 60,400	PORVENIR	9481436908	$ 241,400	$ 60,400	-	-	5 DIAS DE VACACIONES DESDE 23 AL 28 DE DICIEMBRE SERAN DESCONTADAS EN ENERO 2025
68	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	1,193,562,921	CADENERO I B	$ 1,400,000	X - - - X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,721,701	$ 119,900	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9481436908	$ 68,900	PORVENIR	9481436908	$ 275,500	$ 68,900	-	-	11DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30,2,3,4,7 Y 8 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
69	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7,686,580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X - - - X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,923,134	$ 133,900	V	SANITAS	9481436908	$ 77,000	COLPENSIONES	9481436908	$ 307,800	$ 77,000	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO, 2 DIAS DE INCAPACIDAD 7 Y 8 DE ENERO 2025
70	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	1,013,651,721	PROFESIONAL GESTION DE LA CALIDAD	$ 3,500,000	X X X X X X X X X - - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,994,816	$ 278,100	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 159,800	PROTECCION	9481436908	$ 639,200	$ 159,800	-	-	VACACIONES EL 10 DE ENERO Y LICENCIA NO REMUNERADA EL 11 Y 13 DE ENERO DE 2025
71	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1,075,287,618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,942,350	$ 135,200	V	A.I.C.	9481436908	$ 77,700	PORVENIR	9481436908	$ 310,800	$ 77,700	-	-	INCAPACIDAD POR 3 DIAS DESDE EL 20-01-2025 AL 22-01-2025
72	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1,075,263,595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,446,709	$ 100,700	V	SANITAS	9481436908	$ 57,900	PORVENIR	9481436908	$ 231,500	$ 57,900	-	-	-
73	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17,784,055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,654,045	$ 115,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 66,200	PORVENIR	9481436908	$ 264,700	$ 66,200	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 18 DE ENERO DE 2025
74	MEDINA RUGE KEYTHEN	1,015,421,843	ALMACENISTA	$ 2,281,925	- - - - X X X X X X X X X X X - - - - - - X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,685,926	$ 187,000	V	SANITAS	9481436908	$ 107,500	PORVENIR	9481436908	$ 429,800	$ 107,500	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025 Y VACACIONES DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2025
75	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	1,075,321,077	MECANICO D	$ 2,300,000	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,804,722	$ 195,300	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 112,200	PORVENIR	9481436908	$ 448,800	$ 112,200	-	-	CUATRO DIAS DE VACACIONES DESDE 30 DICIEMBRE 2,3 Y 4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
76	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1,116,915,406	SOLDADOR B	$ 2,100,000	- - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,531,723	$ 176,300	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 101,300	PORVENIR	9481436908	$ 405,100	$ 101,300	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
77	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30,521,589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,281,150	$ 89,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 51,300	PORVENIR	9481436908	$ 205,000	$ 51,300	-	-	CUATRO DIAS DE VACACIONES DESDE 30 DICIEMBRE 2,3 Y 4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
78	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	83,250,241	ELECTROMECANICO A	$ 2,100,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,100,000	$ 146,200	V	SANITAS	9481436908	$ 84,000	PORVENIR	9481436908	$ 336,000	$ 56,000	-	-	-
79	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17,340,722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2,610,000	- -	KMA 830.094.920-5	$ 4,254,802	$ 296,200	V	COMPENSAR	9481436908	$ 170,200	COLPENSIONES	9481436908	$ 680,800	$ 170,200	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2025
80	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	1,010,009,651	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - X X X X X X X X X X - X X X X X X - - - - - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,066,078	$ 74,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 42,700	PORVENIR	9481436908	$ 170,600	$ 42,700	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025 Y VACACIONES EL 15 DE ENERO DE 2025, AUSENTISMO 20 Y 21 DE ENERO Y RENUNCIA EL 21 DE ENERO
81	NAVARRO LASCARRO JAIME	77,141,771	CONSERJE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,973,500	$ 137,400	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 79,000	COLFONDOS	9481436908	$ 315,800	$ 79,000	-	-	-
82	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1,003,895,516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	9 DIAS DE VCACIONES 23,24,26,27,28,30,2,3 Y4 DESCONTADAS EN ENERO
83	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	92,523,148	INGENIERO RESIDENTE	$ 4,000,000	- - - - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,866,682	$ 269,200	V	SANITAS	9481436908	$ 154,700	COLPENSIONES	9481436908	$ 618,700	$ 154,700	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025 E INCAPACIDAD DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2025
84	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76,312,909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,241,380	- - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,241,381	$ 156,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 89,700	COLPENSIONES	9481436908	$ 358,700	$ 89,700	-	-	VACACIONES DEL 30 DE DIC AL 3 DE ENERO Y 4 DE ENERO PERMISO MEDIA JORNADA
85	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1,115,951,372	CADENERO II	$ 1,423,500	- - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,435,105	$ 99,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 57,500	PORVENIR	9481436908	$ 229,700	$ 57,500	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
86	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7,710,403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	14 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23,24,26,27,28,30 DICIEMBRE Y 2,3,4,7, 8,9,10 Y 11 ENERO DESCONTADAS EN ENERO 2025
87	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1,003,811,247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	2 DIAS DE VACACIONES DESDE 9 Y 10 DE DICIEMBRE DESCONTADAS EN DICIEMBRE. 4 DIAS DE VACACIONES DESDE 30 DICIEMBRE 2,3 Y 4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
88	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1,094,907,938	TOPÓGRAFO	$ 2.400.000	- X X X X X X X X	KMA 830.094.920-6	$ 676,667	$ 47,100	V	SANITAS	9481436908	$ 27,100	PROTECCION	9481436908	$ 108,300	$ 27,100	-	-	INGRESO A LABORAR EL 24 DE ENERO DE 2025
89	OSSA CARLOS ANDRES	7,710,026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X - - - X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,585,192	$ 110,400	V	A.I.C.	9481436908	$ 63,500	PORVENIR	9481436908	$ 253,700	$ 56,000	-	-	6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 23 AL 30 DE DICIEMBRE, SERA DESCONTADO EN ENERO Y 3 DIAS NO REMUNERADOS DESDE EL 2 A 4 DE ENERO 2025 Y UN DIA DE INCAPACIDAD 14 DE ENERO
90	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1,115,949,137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1,423,500	- - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,038,964	$ 142,000	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 81,600	PORVENIR	9481436908	$ 326,300	$ 6,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 10 DE ENERO DE 2025
91	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7,733,534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
92	PERDOMO JOHAN CAMILO	1,003,802,175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 59,400	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
93	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1,003,807,675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,587,460	$ 110,500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9481436908	$ 63,500	PROTECCION	9481436908	$ 254,000	$ 63,500	-	-	-
94	PERDOMO VARGAS YAIR	7,697,593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,008,516	$ 139,800	V	SANITAS	9481436908	$ 80,400	COLPENSIONES	9481436908	$ 321,400	$ 80,400	-	-	5 DIAS DE VACACIONES DESDE 23 AL 28 DE DICIEMBRE SERAN DESCONTADAS EN ENERO 2025
95	PERILLA JUAN FRANCISCO	74,363,378	OFICIAL DE OBRA	$ 1,849,139	- - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,852,267	$ 129,000	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 74,100	PORVENIR	9481436908	$ 296,400	$ 58,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 11 DE ENERO DE 2025
96	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12,992,663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,400,240	$ 236,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 136,100	COLFONDOS	9481436908	$ 544,100	$ 136,100	-	-	9 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 26.27.28.30 DICIEMBRE 2,3,4,7 Y 8 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
97	POLANIA NARVAEZ DANEL ESTEBAN	1,003,953,459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 60,000	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
98	PRADA TIQUE GUILLERMO	93,445,007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,505,652	$ 174,400	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 100,300	PORVENIR	9481436908	$ 401,000	$ 100,300	-	-	-
99	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1,075,271,209	MECANICO C	$ 2,610,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,610,000	$ 181,700	V	SANITAS	9481436908	$ 104,400	PORVENIR	9481436908	$ 417,600	$ 104,400	-	-	-
100	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1,075,240,735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,585,192	$ 110,400	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 63,500	PROTECCION	9481436908	$ 253,700	$ 63,500	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	28	2	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

101	PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN	1,001,051,678	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,534,905	$ 106,900	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 61,400	PROTECCION	9481436908	$ 245,600	$ 61,400	-	-	-
102	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	1,075,223,790	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,534,905	$ 106,900	V	SALUD TOTAL	9481436908	$ 61,400	PORVENIR	9481436908	$ 245,600	$ 61,400	-	-	INCAPACIDAD POR UN DIA 10-01-2025
103	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	1,083,011,807	PALETERO	$ 1,423,500	- - - - X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,561,709	$ 108,700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9481436908	$ 62,500	COLPENSIONES	9481436908	$ 249,900	$ 62,500	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025 Y LICENCIA NO REMUNERADA DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2025
104	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10,784,198	OFICIAL DE OBRA	$ 1,774,830	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,207,664	$ 153,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 88,400	COLFONDOS	9481436908	$ 353,300	$ 88,400	-	-	-
105	RAMOS LARA JUAN PABLO	1,076,904,011	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	-
106	RAMOS MANA YINA PAOLA	1,081,153,136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS	9481436908	$ 57,000	PROTECCION	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	-
107	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1,003,804,392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	INCAPACIDAD DE DOS DIAS DESDE EL 27 Y 28 DE DICIEMBRE SERAN DESCONTADAS EN ENERO
108	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7,162,225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4,371,200	- - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4,880,089	$ 339,700	V	FOSYGA	9481436908	$ 195,300	PROTECCION	9481436908	$ 780,900	$ 195,300	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2025
109	RINCON GARCIA JOHN FREDY	1,075,667,586	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,010,808	$ 140,000	V	SANITAS	9481436908	$ 80,500	PORVENIR	9481436908	$ 321,800	$ 89,100	-	-	5 CINCO DIAS DE VACACIONES 23,24,26,27,28 DESCONTADAS EN ENERO
110	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	17,690,560	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,369,861	$ 95,400	V	SANITAS	9481436908	$ 54,800	PORVENIR	9481436908	$ 219,200	$ 41,600	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025 Y AUSENTISMO EL 18 DE ENERO DE 2025
111	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1,075,279,696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,862,155	$ 129,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 74,500	PORVENIR	9481436908	$ 298,000	$ 106,700	-	-	INCAPACIDAD DE DOS DIAS DESDE EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE SERAN DESCONTADAS EN ENERO
112	ROA CULMA JESSICA	1,075,304,142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,500,000	$ 104,400	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 60,000	PORVENIR	9481436908	$ 240,000	$ 60,000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 16 DE DICIEMBRE Y DOS DIAS DE VACACIONES 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2025 SERAN COBRADAS EN ENERO 2025
113	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	5,490,088	MECANICO E	$ 2,000,000	- - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,386,449	$ 235,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 135,500	PORVENIR	9481436908	$ 541,900	$ 135,500	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 5 DE ENERO DE 2025
114	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	1,117,836,504	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 74,674	$ 5,200	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 3,000	PORVENIR	9481436908	$ 12,000	$ 3,000	-	-	-
115	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80,189,153	INGENIERO RESIDENTE	$ 5,464,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 6,264,000	$ 436,000	V	COMPENSAR	9481436908	$ 250,600	PORVENIR	9481436908	$ 1,002,300	$ 250,600	-	-	-
116	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17,688,437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,911,957	$ 202,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 116,500	PROTECCION	9481436908	$ 466,000	$ 116,500	-	-	-
117	ROJAS CORDOBA ILDER	17,788,159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	V V V V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,035,132	$ 72,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 41,500	COLPENSIONES	9481436908	$ 165,700	$ 41,500	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
118	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1,075,311,208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X V X V X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 19,20,21 DICIEMBRE SERAN DESCONTADAS EN ENERO, 5 CINCO DIAS DE VACACIONES 23,24,26,27,28 DESCONTADAS EN ENERO, 2 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 25 AL 27 DE ENERO PARA DESCONTAR EN FEBRERO
119	ROMERO FIERRO ANIBAL	1,115,952,530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
120	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79,870,481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,799,403	$ 125,300	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 72,000	COLPENSIONES	9481436908	$ 288,000	$ 72,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 11 DE ENERO DE 2025
121	SANCHEZ ROJAS GERMAN	1,075,217,137	CONSERJE	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-6	$ 1,973,500	$ 137,400	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 79,000	COLFONDOS	9481436908	$ 315,800	$ 53,900	-	-	-
122	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1,075,284,836	INSPECTOR SST	$ 2,600,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,600,000	$ 181,000	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 104,000	COLFONDOS	9481436908	$ 416,000	$ 104,000	-	-	-
123	SERRATO ARIAS LORENA	1,075,251,677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I	KMA 830.094.920-5	$ 1,446,709	$ 100,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 57,900	PORVENIR	9481436908	$ 231,500	$ 57,900	-	-	CINCO DIAS DE VACACIONES DESDE 23,24,26,27,28 DICIEMBRE DESCONTADAS EN ENERO, INCAPACIDAD POR DOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DESCONTADAS EN FEBRERO
124	SILVA CASTRO JHON FREDY	17,659,417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,509,199	$ 244,300	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 140,400	COLPENSIONES	9481436908	$ 561,500	$ 140,400	-	-	CUATRO DIAS DE VACACIONES DESDE 30 DICIEMBRE 2,3 Y 4 ENERO 2025
125	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	8,779,943	OPERADOR CARGADOR	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,304,837	$ 160,500	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 92,200	COLPENSIONES	9481436908	$ 368,800	$ 40,800	-	-	12DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30, 2,3,4,7,8,9,10,11,13,14 Y 15 ENERO DESCONTADOS EN ENERO
126	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1,118,125,103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,100,000	$ 146,200	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 84,000	PORVENIR	9481436908	$ 336,000	$ 23,400	-	-	-
127	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	1,032,467,155	AUXILIAR TECNICO PREDIAL	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,000,000	$ 208,800	V	CAJACOPI	9481436908	$ 120,000	COLPENSIONES	9481436908	$ 480,000	$ 120,000	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
128	TORRES TORRES YEISON	1,116,920,064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,180,870	$ 151,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 87,300	PORVENIR	9481436908	$ 349,000	$ 87,300	-	-	-
129	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1,076,501,415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30 DICIEMBRE, 2,3,4 ENERO 2025 DESCONTADAS EN ENERO
130	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93,378,861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,500,001	$ 243,700	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 140,100	PORVENIR	9481436908	$ 560,100	$ 140,100	-	-	CINCO DIAS DE VACACIONES DESDE 23,24,26,27,28 DICIEMBRE DESCONTADAS EN ENERO
131	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79,572,976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	- - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,794,634	$ 194,600	V	SANITAS	9481436908	$ 111,800	COLPENSIONES	9481436908	$ 447,200	$ 111,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
132	VALENCIA ALEXANDER	83,228,996	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,186,794	$ 152,300	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 87,500	COLFONDOS	9481436908	$ 349,900	$ 87,500	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 8 DE ENERO DE 2025
133	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1,117,549,203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,500,000	$ 174,000	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 100,000	PORVENIR	9481436908	$ 400,000	$ 33,600	-	-	-
134	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1,006,417,527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2025
135	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1,115,942,870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,423,500	$ 99,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9481436908	$ 57,000	PORVENIR	9481436908	$ 227,800	$ 57,000	-	-	-
136	VARGAS NOVOA ORLANDO	1,118,123,310	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	- - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,687,580	$ 187,100	V	NUEVA E.P.S.	9481436908	$ 107,600	PORVENIR	9481436908	$ 430,100	$ 36,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 11 DE ENERO DE 2025
137	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	4,514,556	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4,400,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 5,371,200	$ 373,900	V	SANITAS	9481436908	$ 214,900	COOLPENSIONES	9481436908	$ 859,400	$ 214,900	-	-	-
138	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1,049,609,463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 6,775,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 5,645,832	$ 393,000	V	COMPENSAR	9481436908	$ 225,900	COLFONDOS	9481436908	$ 903,400	$ 225,900	-	-	-
139	MONTES MENESES JAMER ALDAIR	1,103,217,616	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- X X X X X X X X X X X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 474,500	$ 33,100	V	NUEVA EPS	84133850	$ 19,000	PORVENIR	84133850	$ 76,000	$ 19,000	-	-	INGRESO EL 20 DE ENERO DE 2025
140	BOHORQUEZ MONCADA YESID	88,222,193	OFICIAL DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	84133850	$ 57,000	PORVENIR	84133850	$ 227,800	$ 57,000	-	-	-
141	MARTINEZ POLO JOHN JAMER	10,677,718,209	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - -	ADV CONSTRUCCIONES	$ 47,450	$ 3,400	V	NUEVA EPS	84133850	$ 1,900	COLFONDOS	84133850	$ 7,600	$ 74,000	-	-	LABORO SOLO POR EL 21 DE ENERO DE 2025
142	TORRES JULIO CESAR AUGUSTO	1,091,667,229	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - -	ADV CONSTRUCCIONES	$ 474,500	$ 33,100	V	NUEVA EPS	84133850	$ 19,000	PORVENIR	84133850	$ 76,000	$ 19,000	-	-	INGRESO EL 21 DE ENERO DE 2025
143	BOHORQUEZ MONCAJA JUAN CARLOS	88,219,553	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	9481412393	$ 57,000	PORVENIR	9481412393	$ 227,800	$ 57,000	-	-	-
144	DOMINGUEZ GUERRERO ALEXANDER	1,102,385,551	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS	9481412393	$ 57,000	PORVENIR	9481412393	$ 227,800	$ 70,300	-	-	-
145	OSPINA RUBIO ORLANDO	5,997,126	OFICIAL DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1,043,900	$ 72,700	V	NUEVA EPS	9481412393	$ 41,800	PORVENIR	9481412393	$ 167,100	$ 41,800	-	-	INGRESO EL 09 DE ENERO DE 2025
146	NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS	1,049,347,801	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1,043,900	$ 72,700	V	NUEVA EPS	9481412393	$ 41,800	PROTECCIÓN	9481412393	$ 167,100	$ 41,800	-	-	INGRESO EL 09 DE ENERO DE 2025
147	GAMBA CASTILLO MAKY STEYVER	1,122,238,761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1,043,900	$ 72,700	V	NUEVA EPS	9481412393	$ 41,800	PORVENIR	9481412393	$ 167,100	$ 41,800	-	-	INGRESO EL 09 DE ENERO DE 2025
148	GARCIA CRISTIAN EDUARDO	1,115,950,732	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	- X 0 0	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 142,350	$ 10,000	V	NUEVA EPS	9481412393	$ 5,700	PORVENIR	9481412393	$ 22,800	$ 5,700	-	-	INGRESO EL 28 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de enero de 2025

El contratista adjunta la certificación de fecha .... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
Director de Obra
Matricula No.: 17202-72235 CLD

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

KMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,268,042,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (133 Afiliados)						**$294,928,716**	**$47,215,600**			**$294,928,716**	**$12,647,300**			**$278,867,138**	**$11,166,800**			**$294,928,716**	**$15,820,200**		**$12,953,850**	**$647,800**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (104 Afiliados)						**$67,709,218**	**$10,605,500**			**$67,709,218**	**$2,452,300**			**$45,229,229**	**$1,816,000**			**$67,709,218**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (18 Afiliados)						**$16,579,335**	**$2,528,800**			**$16,579,335**	**$538,700**			**$11,219,058**	**$450,900**			**$16,579,335**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,366	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
2	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,277	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
3	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$189,822	$7,600	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
4	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	3	$186,834	$29,900	ESSC24	3	$186,834	$7,500	CCF13	3	$188,183	$7,600	14-7	3	$186,834	$0	3	$0	$0
5	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	5	$311,389	$49,900	ESSC24	5	$311,389	$12,500	CCF13	5	$313,639	$12,600	14-7	5	$311,389	$0	5	$0	$0
6	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	6	$373,667	$59,800	ESSC24	6	$373,667	$15,000	CCF13	6	$376,367	$15,100	14-7	6	$373,667	$0	6	$0	$0
7	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	1	$62,278	$10,000	ESSC24	1	$62,278	$2,500	CCF13	1	$62,728	$2,600	14-7	1	$62,278	$0	1	$0	$0
8	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
9	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
10	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF13	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
11	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
12	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	3	$209,650	$33,600	EPS037	3	$209,650	$8,400	CCF13	3	$203,709	$8,200	14-7	3	$209,650	$0	3	$0	$0
13	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	5	$349,416	$56,000	EPS037	5	$349,416	$14,000	CCF13	5	$334,514	$13,400	14-7	5	$349,416	$0	5	$0	$0
14	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	3	$209,650	$33,600	EPS037	3	$209,650	$8,400	CCF13	3	$195,709	$7,900	14-7	3	$209,650	$0	3	$0	$0
15	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF13	22	$0	$0	14-7	22	$1,043,900	$0	22	$0	$0
16	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$143,076	$5,800	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
17	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$190,768	$7,700	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
18	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	1	$60,622	$9,700	ESSC07	1	$60,622	$2,500	CCF13	1	$60,789	$2,500	14-7	1	$60,622	$0	1	$0	$0
19	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	3	$254,714	$40,800	EPS010	3	$254,714	$10,200	CCF13	3	$254,745	$10,200	14-7	3	$254,714	$0	3	$0	$0
20	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	2	$169,809	$27,200	EPS010	2	$169,809	$6,800	CCF13	2	$169,830	$6,800	14-7	2	$169,809	$0	2	$0	$0
21	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	6	$509,427	$81,600	EPS010	6	$509,427	$20,400	CCF13	6	$509,491	$20,400	14-7	6	$509,427	$0	6	$0	$0
22	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	1	$132,038	$21,200	EPS002	1	$132,038	$5,300	CCF13	1	$133,333	$5,400	14-7	1	$132,038	$0	1	$0	$0
23	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	1	$132,038	$15,900	EPS002	1	$132,038	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$132,038	$0	1	$0	$0
24	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	1	$132,037	$15,900	EPS002	1	$132,037	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$132,037	$0	1	$0	$0
25	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	1	$132,038	$21,200	EPS002	1	$132,038	$5,300	CCF13	1	$131,667	$5,300	14-7	1	$132,038	$0	1	$0	$0
26	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	3	$269,526	$43,200	EPS005	3	$269,526	$10,800	CCF13	3	$268,193	$10,800	14-7	3	$269,526	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	$89,842	$14,400	EPS005	1	$89,842	$3,600	CCF13	1	$88,064	$3,600	14-7	1	$89,842	$0	1	$0	$0
28	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	3	$269,526	$43,200	EPS005	3	$269,526	$10,800	CCF13	3	$262,859	$10,600	14-7	3	$269,526	$0	3	$0	$0
29	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	2	$179,684	$28,800	EPS005	2	$179,684	$7,200	CCF13	2	$172,573	$7,000	14-7	2	$179,684	$0	2	$0	$0
30	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	2	$170,390	$27,300	EPS037	2	$170,390	$6,900	CCF13	2	$168,684	$6,800	14-7	2	$170,390	$0	2	$0	$0
31	CC	92523148	OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS	25-14	2	$266,667	$42,700	EPS005	2	$266,667	$10,700	CCF13	2	$266,667	$10,700	14-7	2	$266,667	$0	2	$0	$0
32	CC	92523148	OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS	25-14	3	$266,681	$42,700	EPS005	3	$266,681	$10,700	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$266,681	$0	3	$0	$0
33	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	3	$186,254	$29,900	EPS037	3	$186,254	$7,500	CCF13	3	$184,914	$7,400	14-7	3	$186,254	$0	3	$0	$0
34	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	4	$248,339	$39,800	EPS037	4	$248,339	$10,000	CCF13	4	$246,552	$9,900	14-7	4	$248,339	$0	4	$0	$0
35	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	3	$488,787	$78,300	MIN001	3	$488,787	$19,600	CCF13	3	$487,120	$19,500	14-7	3	$488,787	$0	3	$0	$0
36	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	1	$162,929	$26,100	MIN001	1	$162,929	$6,600	CCF13	1	$160,707	$6,500	14-7	1	$162,929	$0	1	$0	$0
37	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	4	$651,716	$104,300	MIN001	4	$651,716	$26,100	CCF13	4	$640,604	$25,700	14-7	4	$651,716	$0	4	$0	$0
38	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	6	$977,574	$156,500	MIN001	6	$977,574	$39,200	CCF13	6	$947,573	$38,000	14-7	6	$977,574	$0	6	$0	$0
39	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	2	$325,858	$52,200	MIN001	2	$325,858	$13,100	CCF13	2	$309,191	$12,400	14-7	2	$325,858	$0	2	$0	$0
40	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	5	$494,964	$79,200	EPS037	5	$494,964	$19,800	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$494,964	$0	5	$0	$0
41	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	25	$2,891,485	$347,000	EPS037	25	$2,891,485	$0	CCF13	25	$0	$0	14-7	25	$2,891,485	$0	25	$0	$0
42	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	3	$170,944	$27,400	EPS037	3	$170,944	$6,900	CCF13	3	$157,350	$6,300	14-7	3	$170,944	$0	3	$0	$0
43	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	4	$227,925	$36,500	EPS037	4	$227,925	$9,200	CCF13	4	$207,800	$8,400	14-7	4	$227,925	$0	4	$0	$0
44	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	2	$220,286	$35,300	EPS005	2	$220,286	$8,900	CCF13	2	$180,409	$7,300	14-7	2	$220,286	$0	2	$0	$0
45	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	3	$232,956	$37,300	EPS037	3	$232,956	$9,400	CCF13	3	$200,373	$8,100	14-7	3	$232,956	$0	3	$0	$0
46	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	2	$155,304	$24,900	EPS037	2	$155,304	$6,300	CCF13	2	$133,582	$5,400	14-7	2	$155,304	$0	2	$0	$0
47	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	3	$232,956	$37,300	EPS037	3	$232,956	$9,400	CCF13	3	$200,373	$8,100	14-7	3	$232,956	$0	3	$0	$0
48	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	3	$232,956	$37,300	EPS037	3	$232,956	$9,400	CCF13	3	$200,373	$8,100	14-7	3	$232,956	$0	3	$0	$0
49	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	3	$274,924	$44,000	EPS037	3	$274,924	$11,000	CCF13	3	$260,000	$10,400	14-7	3	$274,924	$0	3	$0	$0
50	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	5	$458,207	$73,400	EPS037	5	$458,207	$18,400	CCF13	5	$426,667	$17,100	14-7	5	$458,207	$0	5	$0	$0
51	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	6	$549,848	$88,000	EPS037	6	$549,848	$22,000	CCF13	6	$498,667	$20,000	14-7	6	$549,848	$0	6	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (56 Afiliados)						**$28,023,291**	**$4,458,900**			**$28,023,291**	**$1,069,900**			**$21,507,153**	**$863,500**			**$28,023,291**	**$0**		**$0**	**$0**
52	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$0	$0	14-7	13	$616,850	$0	13	$0	$0
53	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
54	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$0	$0	14-7	10	$474,500	$0	10	$0	$0
55	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	3	$196,760	$31,500	EPS005	3	$196,760	$7,900	CCF32	3	$180,271	$7,300	14-7	3	$196,760	$0	3	$0	$0
56	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	5	$327,933	$52,500	EPS005	5	$327,933	$13,200	CCF32	5	$300,452	$12,100	14-7	5	$327,933	$0	5	$0	$0
57	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	1	$65,587	$10,500	EPS005	1	$65,587	$2,700	CCF32	1	$60,090	$2,500	14-7	1	$65,587	$0	1	$0	$0
58	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	$60,003	$9,700	EPS005	1	$60,003	$2,500	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$60,003	$0	1	$0	$0
59	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	3	$270,000	$32,400	EPS005	3	$270,000	$0	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$270,000	$0	3	$0	$0
60	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	$90,000	$10,800	EPS005	1	$90,000	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$90,000	$0	1	$0	$0
61	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	3	$190,000	$30,400	EPS005	3	$190,000	$7,600	CCF32	3	$190,000	$7,600	14-7	3	$190,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
62	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	$63,334	$10,200	EPS005	1	$63,334	$2,600	CCF32	1	$63,334	$2,600	14-7	1	$63,334	$0	1	$0	$0
63	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	3	$179,525	$28,800	EPS037	3	$179,525	$7,200	CCF32	3	$177,483	$7,100	14-7	3	$179,525	$0	3	$0	$0
64	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	$59,842	$9,600	EPS037	1	$59,842	$2,400	CCF32	1	$59,161	$2,400	14-7	1	$59,842	$0	1	$0	$0
65	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	$59,842	$7,200	EPS037	1	$59,842	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$59,842	$0	1	$0	$0
66	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	$59,842	$7,200	EPS037	1	$59,842	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$59,842	$0	1	$0	$0
67	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	3	$173,967	$27,900	ESSC24	3	$173,967	$7,000	CCF32	3	$159,350	$6,400	14-7	3	$173,967	$0	3	$0	$0
68	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	5	$289,945	$46,400	ESSC24	5	$289,945	$11,600	CCF32	5	$262,750	$10,600	14-7	5	$289,945	$0	5	$0	$0
69	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	6	$347,934	$55,700	ESSC24	6	$347,934	$14,000	CCF32	6	$309,633	$12,400	14-7	6	$347,934	$0	6	$0	$0
70	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
71	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
72	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
73	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	3	$208,406	$33,400	EPS005	3	$208,406	$8,400	CCF32	3	$200,012	$8,100	14-7	3	$208,406	$0	3	$0	$0
74	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	1	$69,469	$11,200	EPS005	1	$69,469	$2,800	CCF32	1	$66,671	$2,700	14-7	1	$69,469	$0	1	$0	$0
75	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	5	$336,210	$53,800	EPS037	5	$336,210	$13,500	CCF32	5	$336,210	$13,500	14-7	5	$336,210	$0	5	$0	$0
76	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	3	$203,008	$32,500	EPS005	3	$203,008	$8,200	CCF32	3	$200,012	$8,100	14-7	3	$203,008	$0	3	$0	$0
77	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	$67,670	$10,900	EPS005	1	$67,670	$2,800	CCF32	1	$66,671	$2,700	14-7	1	$67,670	$0	1	$0	$0
78	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	$47,450	$5,700	EPS017	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
79	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	$51,566	$6,200	EPS017	1	$51,566	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$51,566	$0	1	$0	$0
80	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
81	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
82	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
83	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
84	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
85	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	3	$185,381	$29,700	EPS005	3	$185,381	$7,500	CCF32	3	$180,000	$7,200	14-7	3	$185,381	$0	3	$0	$0
86	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	1	$61,794	$9,900	EPS005	1	$61,794	$2,500	CCF32	1	$60,000	$2,400	14-7	1	$61,794	$0	1	$0	$0
87	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
88	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
89	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
90	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	1	$90,790	$14,600	EPS037	1	$90,790	$3,700	CCF32	1	$86,667	$3,500	14-7	1	$90,790	$0	1	$0	$0
91	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	3	$272,370	$43,600	EPS037	3	$272,370	$10,900	CCF32	3	$258,667	$10,400	14-7	3	$272,370	$0	3	$0	$0
92	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	1	$90,790	$10,900	EPS037	1	$90,790	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$90,790	$0	1	$0	$0
93	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	3	$241,334	$38,700	EPS037	3	$241,334	$9,700	CCF32	3	$240,000	$9,600	14-7	3	$241,334	$0	3	$0	$0
94	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	5	$402,223	$64,400	EPS037	5	$402,223	$16,100	CCF32	5	$393,333	$15,800	14-7	5	$402,223	$0	5	$0	$0
95	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	1	$80,445	$12,900	EPS037	1	$80,445	$3,300	CCF32	1	$76,444	$3,100	14-7	1	$80,445	$0	1	$0	$0
96	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	3	$209,312	$33,500	EPS037	3	$209,312	$8,400	CCF32	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$209,312	$0	3	$0	$0
97	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	$69,771	$11,200	EPS037	1	$69,771	$2,800	CCF32	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$69,771	$0	1	$0	$0
98	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,448	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
99	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,414	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
100	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,483	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
101	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
102	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	1	$51,566	$6,200	EPS037	1	$51,566	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$51,566	$0	1	$0	$0
103	CC	1039474044	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	25-14	6	$524,000	$83,900	EPS002	6	$524,000	$21,000	CCF32	6	$520,000	$20,800	14-7	6	$524,000	$0	6	$0	$0
104	CC	1039474044	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	25-14	1	$87,334	$14,000	EPS002	1	$87,334	$3,500	CCF32	1	$82,667	$3,400	14-7	1	$87,334	$0	1	$0	$0
105	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
106	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
107	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
108	CC	1069476370	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
109	CC	1069476370	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	25-14	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
110	CC	1069476370	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
111	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	3	$821,200	$139,800	EPS005	3	$821,200	$32,900	CCF32	3	$821,200	$32,900	14-7	3	$821,200	$0	3	$0	$0
112	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	5	$1,368,667	$232,800	EPS005	5	$1,368,667	$54,800	CCF32	5	$1,368,667	$54,800	14-7	5	$1,368,667	$0	5	$0	$0
113	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	1	$273,734	$46,600	EPS005	1	$273,734	$11,000	CCF32	1	$273,734	$11,000	14-7	1	$273,734	$0	1	$0	$0
114	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
115	CC	7726324	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	230301	5	$338,346	$54,200	EPS005	5	$338,346	$13,600	CCF32	5	$333,334	$13,400	14-7	5	$338,346	$0	5	$0	$0
116	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
117	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	3	$171,001	$27,400	EPS010	3	$171,001	$6,900	CCF32	3	$172,350	$6,900	14-7	3	$171,001	$0	3	$0	$0
118	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	1	$57,001	$9,200	EPS010	1	$57,001	$2,300	CCF32	1	$56,450	$2,300	14-7	1	$57,001	$0	1	$0	$0
119	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	3	$200,000	$32,000	EPS005	3	$200,000	$8,000	CCF32	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$200,000	$0	3	$0	$0
120	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$2,700	CCF32	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$66,667	$0	1	$0	$0
121	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
122	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
123	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
124	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
125	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	3	$283,542	$45,400	EPS037	3	$283,542	$11,400	CCF32	3	$280,000	$11,200	14-7	3	$283,542	$0	3	$0	$0
126	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	1	$94,514	$15,200	EPS037	1	$94,514	$3,800	CCF32	1	$91,111	$3,700	14-7	1	$94,514	$0	1	$0	$0
127	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
128	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
129	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,663	$5,800	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
130	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,772	$9,600	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
131	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,554	$2,000	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
132	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
134	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
135	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
136	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
137	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
138	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	3	$142,350	$17,100	EPS002	3	$142,350	$0	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
139	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
140	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
141	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
142	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
143	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
144	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$48,584	$5,900	EPS041	1	$48,584	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$48,584	$0	1	$0	$0
145	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$48,584	$5,900	EPS041	1	$48,584	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$48,584	$0	1	$0	$0
146	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	5	$336,172	$53,800	EPS005	5	$336,172	$13,500	CCF32	5	$333,375	$13,400	14-7	5	$336,172	$0	5	$0	$0
147	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	5	$336,172	$53,800	EPS005	5	$336,172	$13,500	CCF32	5	$333,375	$13,400	14-7	5	$336,172	$0	5	$0	$0
148	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	5	$336,172	$53,800	EPS005	5	$336,172	$13,500	CCF32	5	$333,375	$13,400	14-7	5	$336,172	$0	5	$0	$0
149	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	3	$282,001	$45,200	EPS037	3	$282,001	$11,300	CCF32	3	$280,000	$11,200	14-7	3	$282,001	$0	3	$0	$0
150	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	2	$188,001	$30,100	EPS037	2	$188,001	$7,600	CCF32	2	$182,667	$7,400	14-7	2	$188,001	$0	2	$0	$0
151	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	3	$282,001	$45,200	EPS037	3	$282,001	$11,300	CCF32	3	$270,000	$10,800	14-7	3	$282,001	$0	3	$0	$0
152	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	1	$94,001	$15,100	EPS037	1	$94,001	$3,800	CCF32	1	$88,000	$3,600	14-7	1	$94,001	$0	1	$0	$0
153	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
154	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
155	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	5	$422,319	$67,600	EPS002	5	$422,319	$16,900	CCF32	5	$416,667	$16,700	14-7	5	$422,319	$0	5	$0	$0
156	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
157	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
158	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
159	CC	1075223790	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
160	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	3	$225,087	$36,100	EPS037	3	$225,087	$9,100	CCF32	3	$217,483	$8,700	14-7	3	$225,087	$0	3	$0	$0
161	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	4	$198,474	$31,800	EPS037	4	$198,474	$8,000	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$198,474	$0	4	$0	$0
162	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	1	$75,029	$12,100	EPS037	1	$75,029	$3,100	CCF32	1	$69,383	$2,800	14-7	1	$75,029	$0	1	$0	$0
163	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	6	$450,173	$72,100	EPS037	6	$450,173	$18,100	CCF32	6	$413,633	$16,600	14-7	6	$450,173	$0	6	$0	$0
164	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	1	$75,029	$12,100	EPS037	1	$75,029	$3,100	CCF32	1	$66,272	$2,700	14-7	1	$75,029	$0	1	$0	$0
165	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
166	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	14	$938,406	$150,200	EPS005	14	$938,406	$37,600	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$938,406	$0	14	$0	$0
167	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	2	$134,290	$21,500	EPS005	2	$134,290	$5,400	CCF32	2	$133,383	$5,400	14-7	2	$134,290	$0	2	$0	$0
168	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	4	$268,579	$43,000	EPS005	4	$268,579	$10,800	CCF32	4	$266,766	$10,700	14-7	4	$268,579	$0	4	$0	$0
169	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	1	$67,145	$10,800	EPS005	1	$67,145	$2,700	CCF32	1	$66,691	$2,700	14-7	1	$67,145	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
170	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	3	$201,434	$32,300	EPS005	3	$201,434	$8,100	CCF32	3	$200,074	$8,100	14-7	3	$201,434	$0	3	$0	$0
171	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	2	$134,290	$21,500	EPS005	2	$134,290	$5,400	CCF32	2	$133,383	$5,400	14-7	2	$134,290	$0	2	$0	$0
172	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
173	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CCF32	1	$50,000	$2,000	14-7	1	$50,000	$0	1	$0	$0
174	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	2	$100,000	$16,000	EPS037	2	$100,000	$4,000	CCF32	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	$0	2	$0	$0
175	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
176	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$240,017	$9,700	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
177	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
178	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	3	$356,899	$57,200	EPS037	3	$356,899	$14,300	CCF32	3	$350,000	$14,000	14-7	3	$356,899	$0	3	$0	$0
179	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	1	$118,967	$19,100	EPS037	1	$118,967	$4,800	CCF32	1	$114,333	$4,600	14-7	1	$118,967	$0	1	$0	$0
180	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	3	$231,037	$37,000	EPS037	3	$231,037	$9,300	CCF32	3	$230,000	$9,200	14-7	3	$231,037	$0	3	$0	$0
181	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	5	$385,061	$61,700	EPS037	5	$385,061	$15,500	CCF32	5	$378,333	$15,200	14-7	5	$385,061	$0	5	$0	$0
182	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	3	$231,037	$37,000	EPS037	3	$231,037	$9,300	CCF32	3	$222,000	$8,900	14-7	3	$231,037	$0	3	$0	$0
183	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	1	$77,013	$12,400	EPS037	1	$77,013	$3,100	CCF32	1	$72,667	$3,000	14-7	1	$77,013	$0	1	$0	$0
184	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	1	$77,013	$9,300	EPS037	1	$77,013	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$77,013	$0	1	$0	$0
185	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	1	$77,012	$9,300	EPS037	1	$77,012	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$77,012	$0	1	$0	$0
186	CC	1032467155	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	25-14	3	$300,000	$48,000	EPS037	3	$300,000	$12,000	CCF32	3	$300,000	$12,000	14-7	3	$300,000	$0	3	$0	$0
187	CC	1032467155	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	25-14	1	$100,000	$16,000	EPS037	1	$100,000	$4,000	CCF32	1	$100,000	$4,000	14-7	1	$100,000	$0	1	$0	$0
188	CC	1032467155	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	25-14	1	$100,000	$12,000	EPS037	1	$100,000	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$100,000	$0	1	$0	$0
189	CC	1032467155	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	25-14	1	$100,000	$12,000	EPS037	1	$100,000	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$100,000	$0	1	$0	$0
190	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
191	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
192	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	5	$583,334	$93,400	EPS037	5	$583,334	$23,400	CCF32	5	$583,334	$23,400	14-7	5	$583,334	$0	5	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (23 Afiliados)						**$20,069,157**	**$3,147,400**			**$20,069,157**	**$738,400**			**$9,987,727**	**$400,900**			**$20,069,157**	**$0**		**$0**	**$0**
193	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	2	$177,259	$28,400	EPS041	2	$177,259	$7,100	CCF13	2	$134,299	$5,400	14-7	2	$177,259	$0	2	$0	$0
194	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	15	$2,132,707	$341,300	EPS017	15	$2,132,707	$85,400	CCF13	15	$0	$0	14-7	15	$2,132,707	$0	15	$0	$0
195	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	11	$1,563,985	$250,300	EPS017	11	$1,563,985	$62,600	CCF13	11	$0	$0	14-7	11	$1,563,985	$0	11	$0	$0
196	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	3	$693,114	$83,200	EPS017	3	$693,114	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$693,114	$0	3	$0	$0
197	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	5	$319,208	$51,100	EPS037	5	$319,208	$12,800	CCF13	5	$300,000	$12,000	14-7	5	$319,208	$0	5	$0	$0
198	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$60,272	$7,300	ESSC62	1	$60,272	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,272	$0	1	$0	$0
199	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$60,272	$7,300	ESSC62	1	$60,272	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,272	$0	1	$0	$0
200	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	3	$180,815	$21,700	ESSC62	3	$180,815	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$180,815	$0	3	$0	$0
201	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	3	$550,001	$66,100	EPS037	3	$550,001	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$550,001	$0	3	$0	$0
202	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	2	$225,501	$36,100	EPS010	2	$225,501	$9,100	CCF13	2	$220,667	$8,900	14-7	2	$225,501	$0	2	$0	$0
203	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	3	$431,667	$69,100	EPS005	3	$431,667	$17,300	CCF13	3	$430,000	$17,200	14-7	3	$431,667	$0	3	$0	$0
204	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	5	$719,445	$115,200	EPS005	5	$719,445	$28,800	CCF13	5	$708,333	$28,400	14-7	5	$719,445	$0	5	$0	$0
205	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	6	$863,334	$138,200	EPS005	6	$863,334	$34,600	CCF13	6	$833,333	$33,400	14-7	6	$863,334	$0	6	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
206	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	1	$143,889	$23,100	EPS005	1	$143,889	$5,800	CCF13	1	$132,222	$5,300	14-7	1	$143,889	$0	1	$0	$0
207	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	5	$719,445	$115,200	EPS005	5	$719,445	$28,800	CCF13	5	$675,000	$27,000	14-7	5	$719,445	$0	5	$0	$0
208	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	3	$201,725	$32,300	ESSC62	3	$201,725	$8,100	CCF13	3	$201,725	$8,100	14-7	3	$201,725	$0	3	$0	$0
209	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	5	$336,207	$53,800	ESSC62	5	$336,207	$13,500	CCF13	5	$336,207	$13,500	14-7	5	$336,207	$0	5	$0	$0
210	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	6	$403,449	$64,600	ESSC62	6	$403,449	$16,200	CCF13	6	$403,449	$16,200	14-7	6	$403,449	$0	6	$0	$0
211	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	1	$67,242	$10,800	ESSC62	1	$67,242	$2,700	CCF13	1	$67,242	$2,700	14-7	1	$67,242	$0	1	$0	$0
212	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	6	$373,667	$59,800	ESSC62	6	$373,667	$15,000	CCF13	6	$373,922	$15,000	14-7	6	$373,667	$0	6	$0	$0
213	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	6	$373,667	$59,800	ESSC62	6	$373,667	$15,000	CCF13	6	$373,922	$15,000	14-7	6	$373,667	$0	6	$0	$0
214	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	2	$192,160	$30,800	EPS037	2	$192,160	$7,700	CCF13	2	$190,827	$7,700	14-7	2	$192,160	$0	2	$0	$0
215	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	3	$288,240	$46,200	EPS037	3	$288,240	$11,600	CCF13	3	$282,240	$11,300	14-7	3	$288,240	$0	3	$0	$0
216	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	5	$480,400	$76,900	EPS037	5	$480,400	$19,300	CCF13	5	$460,400	$18,500	14-7	5	$480,400	$0	5	$0	$0
217	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	3	$288,240	$46,200	EPS037	3	$288,240	$11,600	CCF13	3	$266,240	$10,700	14-7	3	$288,240	$0	3	$0	$0
218	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,366	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
219	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,277	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
220	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$94,911	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
221	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	3	$353,334	$56,600	EPS041	3	$353,334	$14,200	CCF13	3	$250,000	$10,000	14-7	3	$353,334	$0	3	$0	$0
222	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	1	$117,778	$18,900	EPS041	1	$117,778	$4,800	CCF13	1	$83,334	$3,400	14-7	1	$117,778	$0	1	$0	$0
223	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
224	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
225	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	2	$135,406	$21,700	ESSC62	2	$135,406	$5,500	CCF13	2	$133,334	$5,400	14-7	2	$135,406	$0	2	$0	$0
226	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	3	$203,109	$32,500	ESSC62	3	$203,109	$8,200	CCF13	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$203,109	$0	3	$0	$0
227	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	1	$53,996	$8,700	ESSC62	1	$53,996	$2,200	CCF13	1	$52,845	$2,200	14-7	1	$53,996	$0	1	$0	$0
228	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
229	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
230	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF13	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
231	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	3	$213,044	$34,100	EPS005	3	$213,044	$8,600	CCF13	3	$201,263	$8,100	14-7	3	$213,044	$0	3	$0	$0
232	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	2	$142,029	$22,800	EPS005	2	$142,029	$5,700	CCF13	2	$134,175	$5,400	14-7	2	$142,029	$0	2	$0	$0
233	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	2	$142,029	$22,800	EPS005	2	$142,029	$5,700	CCF13	2	$134,175	$5,400	14-7	2	$142,029	$0	2	$0	$0
234	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	18	$2,548,395	$407,800	EPS002	18	$2,548,395	$102,000	CCF13	18	$0	$0	14-7	18	$2,548,395	$0	18	$0	$0
235	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	12	$1,706,407	$273,100	EPS002	12	$1,706,407	$68,300	CCF13	12	$0	$0	14-7	12	$1,706,407	$0	12	$0	$0
236	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	2	$149,426	$24,000	EPS037	2	$149,426	$6,000	CCF13	2	$149,426	$6,000	14-7	2	$149,426	$0	2	$0	$0
237	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	1	$74,713	$12,000	EPS037	1	$74,713	$3,000	CCF13	1	$74,713	$3,000	14-7	1	$74,713	$0	1	$0	$0
238	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	3	$180,700	$29,000	EPS037	3	$180,700	$7,300	CCF13	3	$143,109	$5,800	14-7	3	$180,700	$0	3	$0	$0
239	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	3	$180,700	$29,000	EPS037	3	$180,700	$7,300	CCF13	3	$143,109	$5,800	14-7	3	$180,700	$0	3	$0	$0
240	CC	17690560	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	230301	2	$109,540	$17,600	EPS005	2	$109,540	$4,400	CCF13	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$109,540	$0	2	$0	$0
241	CC	17690560	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	230301	1	$54,770	$6,600	EPS005	1	$54,770	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$54,770	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
242	CC	17690560	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	230301	1	$54,770	$6,600	EPS005	1	$54,770	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$54,770	$0	1	$0	$0
243	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,512	$5,800	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
244	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (7 Afiliados)						**$3,037,435**	**$470,400**			**$3,037,435**	**$105,300**			**$2,515,291**	**$100,700**			**$3,037,435**	**$0**		**$0**	**$0**
245	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	4	$189,800	$30,400	ESSC62	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$189,822	$7,600	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
246	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
247	CC	1117815289	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	230301	2	$97,099	$15,600	ESSC62	2	$97,099	$3,900	CCF13	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$97,099	$0	2	$0	$0
248	CC	1117815289	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	230301	1	$48,550	$5,900	ESSC62	1	$48,550	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$48,550	$0	1	$0	$0
249	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	3	$157,225	$25,200	ESSC62	3	$157,225	$6,300	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$157,225	$0	3	$0	$0
250	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	5	$262,041	$42,000	ESSC62	5	$262,041	$10,500	CCF13	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$262,041	$0	5	$0	$0
251	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	4	$209,633	$33,600	ESSC62	4	$209,633	$8,400	CCF13	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$209,633	$0	4	$0	$0
252	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
253	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
254	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
255	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$94,981	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
256	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,491	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
257	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	2	$94,900	$11,400	ESSC62	2	$94,900	$0	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
258	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	3	$159,533	$25,600	EPS041	3	$159,533	$6,400	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$159,533	$0	3	$0	$0
259	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	5	$265,888	$32,000	EPS041	5	$265,888	$0	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$265,888	$0	5	$0	$0
260	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	6	$319,066	$51,100	EPS041	6	$319,066	$12,800	CCF13	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$319,066	$0	6	$0	$0
261	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,449	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
262	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,415	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
263	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,483	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (130 Afiliados)						**$227,219,498**	**$36,610,100**			**$227,219,498**	**$10,195,000**			**$233,637,909**	**$9,350,800**			**$227,219,498**	**$15,820,200**		**$12,953,850**	**$647,800**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (21 Afiliados)						**$47,379,976**	**$7,711,300**			**$47,379,976**	**$2,997,300**			**$48,422,191**	**$1,937,900**			**$47,379,976**	**$3,298,600**		**$12,953,850**	**$647,800**
264	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF13	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
265	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	15	$986,749	$157,900	ESSC24	15	$986,749	$39,500	CCF13	15	$986,750	$39,500	14-7	15	$986,749	$68,700	15	$0	$0
266	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	15	$765,905	$122,600	ESSC62	15	$765,905	$30,700	CCF13	15	$765,905	$30,700	14-7	15	$765,905	$53,400	15	$0	$0
267	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	19	$1,356,237	$217,000	EPS037	19	$1,356,237	$54,300	CCF13	19	$1,356,239	$54,300	14-7	19	$1,356,237	$94,400	19	$0	$0
268	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$1,089,656	$43,600	14-7	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
269	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	29	$1,762,717	$282,100	ESSC07	29	$1,762,717	$70,600	CCF13	29	$1,762,717	$70,600	14-7	29	$1,762,717	$122,700	29	$0	$0
270	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	19	$1,613,184	$258,200	EPS010	19	$1,613,184	$64,600	CCF13	19	$1,613,186	$64,600	14-7	19	$1,613,184	$112,300	19	$0	$0
271	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,694,274	$271,100	ESSC62	30	$1,694,274	$67,800	CCF13	30	$1,694,274	$67,800	14-7	30	$1,694,274	$118,000	30	$0	$0
272	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,697,370	$271,600	EPS005	30	$1,697,370	$67,900	CCF13	30	$1,697,370	$67,900	14-7	30	$1,697,370	$118,200	30	$0	$0
273	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF13	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
274	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS005	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
275	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	26	$3,466,665	$554,700	EPS002	26	$3,466,665	$138,700	CCF13	26	$3,466,666	$138,700	14-7	26	$3,466,665	$241,300	26	$0	$0
276	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	21	$1,877,348	$300,400	EPS005	21	$1,877,348	$75,100	CCF13	21	$1,877,348	$75,100	14-7	21	$1,877,348	$130,700	21	$0	$0
277	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	28	$2,361,333	$377,900	EPS037	28	$2,361,333	$94,500	CCF13	28	$2,361,333	$94,500	14-7	28	$2,361,333	$164,400	28	$0	$0
278	CC	92523148	OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS	25-14	25	$3,333,334	$533,400	EPS005	25	$3,333,334	$133,400	CCF13	25	$3,333,334	$133,400	14-7	25	$3,333,334	$232,100	25	$0	$0
279	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	23	$1,417,674	$226,900	EPS037	23	$1,417,674	$56,800	CCF13	23	$1,417,674	$56,800	14-7	23	$1,417,674	$98,700	23	$0	$0
280	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	14	$2,273,225	$363,800	MIN001	14	$2,273,225	$91,000	CCF13	14	$2,273,226	$91,000	14-7	14	$2,273,225	$158,300	14	$0	$0
281	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	23	$1,400,534	$224,100	EPS037	23	$1,400,534	$56,100	CCF13	23	$1,400,534	$56,100	14-7	23	$1,400,534	$97,500	23	$0	$0
282	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	28	$2,574,348	$411,900	EPS005	28	$2,574,348	$103,000	CCF13	28	$2,574,348	$103,000	14-7	28	$2,574,348	$179,200	28	$0	$0
283	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	19	$1,565,578	$250,500	EPS037	19	$1,565,578	$62,700	CCF13	19	$1,565,580	$62,700	14-7	19	$1,565,578	$109,000	19	$0	$0
284	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	16	$1,404,601	$224,800	EPS037	16	$1,404,601	$56,200	CCF13	16	$1,404,601	$56,200	14-7	16	$1,404,601	$97,800	16	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (71 Afiliados)						**$118,519,773**	**$19,086,000**			**$118,519,773**	**$4,743,400**			**$122,081,191**	**$4,885,900**			**$118,519,773**	**$8,252,200**		**$0**	**$0**
285	CC	1075220227	ADRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
286	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$1,423,500	$57,000	14-7	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
287	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	21	$1,333,369	$213,400	EPS005	21	$1,333,369	$53,400	CCF32	21	$1,333,370	$53,400	14-7	21	$1,333,369	$92,900	21	$0	$0
288	CC	1076903778	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF32	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
289	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	25	$2,250,000	$360,000	EPS005	25	$2,250,000	$90,000	CCF32	25	$2,250,000	$90,000	14-7	25	$2,250,000	$156,600	25	$0	$0
290	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,573,500	$251,800	EPS048	30	$1,573,500	$63,000	CCF32	30	$1,573,500	$63,000	14-7	30	$1,573,500	$109,600	30	$0	$0
291	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
292	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	26	$1,646,667	$263,500	EPS005	26	$1,646,667	$65,900	CCF32	26	$1,646,667	$65,900	14-7	26	$1,646,667	$114,700	26	$0	$0
293	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	24	$1,419,864	$227,200	EPS037	24	$1,419,864	$56,800	CCF32	24	$1,419,864	$56,800	14-7	24	$1,419,864	$98,900	24	$0	$0
294	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	16	$849,867	$136,000	ESSC24	16	$849,867	$34,000	CCF32	16	$849,867	$34,000	14-7	16	$849,867	$59,200	16	$0	$0
295	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
296	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	26	$1,733,334	$277,400	EPS005	26	$1,733,334	$69,400	CCF32	26	$1,733,334	$69,400	14-7	26	$1,733,334	$120,700	26	$0	$0
297	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	25	$1,681,050	$269,000	EPS037	25	$1,681,050	$67,300	CCF32	25	$1,681,050	$67,300	14-7	25	$1,681,050	$117,100	25	$0	$0
298	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	26	$1,733,332	$277,400	EPS005	26	$1,733,332	$69,400	CCF32	26	$1,733,334	$69,400	14-7	26	$1,733,332	$120,700	26	$0	$0
299	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
300	CC	1096645846	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
301	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	26	$1,569,782	$251,200	EPS005	26	$1,569,782	$62,800	CCF32	26	$1,569,783	$62,800	14-7	26	$1,569,782	$109,300	26	$0	$0
302	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
303	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	2	$173,334	$27,800	EPS037	2	$173,334	$7,000	CCF32	2	$2,099,960	$84,000	14-7	2	$173,334	$12,100	2	$0	$0
304	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	21	$1,679,998	$268,800	EPS037	21	$1,679,998	$67,200	CCF32	21	$1,680,000	$67,200	14-7	21	$1,679,998	$117,000	21	$0	$0
305	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	26	$1,744,203	$279,100	EPS037	26	$1,744,203	$69,800	CCF32	26	$1,744,203	$69,800	14-7	26	$1,744,203	$121,400	26	$0	$0
306	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-7	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
307	CC	1039474044	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	25-14	23	$1,993,333	$319,000	EPS002	23	$1,993,333	$79,800	CCF32	23	$1,993,333	$79,800	14-7	23	$1,993,333	$138,800	23	$0	$0
308	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
309	CC	1069476370	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	25-14	21	$996,450	$159,500	ESSC07	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
310	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	21	$5,748,400	$977,400	EPS005	21	$5,748,400	$230,000	CCF32	21	$5,748,400	$230,000	14-7	21	$5,748,400	$400,100	21	$0	$0
311	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	29	$1,836,667	$293,900	EPS017	29	$1,836,667	$73,500	CCF32	29	$1,836,667	$73,500	14-7	29	$1,836,667	$127,900	29	$0	$0
312	CC	7726324	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	230301	25	$1,666,667	$266,700	EPS005	25	$1,666,667	$66,700	CCF32	25	$1,666,667	$66,700	14-7	25	$1,666,667	$116,100	25	$0	$0
313	CC	1069154123	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	230201	30	$3,310,000	$529,600	EPS002	30	$3,310,000	$132,400	CCF32	30	$3,310,000	$132,400	14-7	30	$3,310,000	$230,400	30	$0	$0
314	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	25	$1,271,351	$203,500	EPS037	25	$1,271,351	$50,900	CCF32	25	$1,271,351	$50,900	14-7	25	$1,271,351	$88,500	25	$0	$0
315	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	26	$1,493,699	$239,000	EPS010	26	$1,493,699	$59,800	CCF32	26	$1,493,700	$59,800	14-7	26	$1,493,699	$104,000	26	$0	$0
316	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	22	$1,466,667	$234,700	EPS005	22	$1,466,667	$58,700	CCF32	22	$1,466,667	$58,700	14-7	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0
317	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS002	27	$1,800,000	$72,000	CCF32	27	$1,800,000	$72,000	14-7	27	$1,800,000	$125,300	27	$0	$0
318	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	28	$1,351,809	$216,300	EPS005	28	$1,351,809	$54,100	CCF32	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,351,809	$94,100	28	$0	$0
319	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	26	$2,426,666	$388,300	EPS037	26	$2,426,666	$97,100	CCF32	26	$2,426,666	$97,100	14-7	26	$2,426,666	$168,900	26	$0	$0
320	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	26	$1,233,700	$197,400	ESSC62	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
321	CC	83250241	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
322	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
323	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
324	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
325	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
326	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	20	$1,110,692	$177,800	EPS002	20	$1,110,692	$44,500	CCF32	20	$1,110,692	$44,500	14-7	20	$1,110,692	$77,400	20	$0	$0
327	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
328	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
329	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	28	$1,490,292	$238,500	EPS041	28	$1,490,292	$59,700	CCF32	28	$1,490,292	$59,700	14-7	28	$1,490,292	$103,800	28	$0	$0
330	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$40,000	CCF32	15	$1,000,000	$40,000	14-7	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
331	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	21	$2,554,236	$408,700	EPS037	21	$2,554,236	$102,200	CCF32	21	$2,554,239	$102,200	14-7	21	$2,554,236	$177,800	21	$0	$0
332	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
333	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	25	$2,083,333	$333,400	EPS002	25	$2,083,333	$83,400	CCF32	25	$2,083,333	$83,400	14-7	25	$2,083,333	$145,000	25	$0	$0
334	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$2,610,000	$417,600	EPS005	30	$2,610,000	$104,400	CCF32	30	$2,610,000	$104,400	14-7	30	$2,610,000	$181,700	30	$0	$0
335	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	18	$1,015,792	$162,600	EPS037	18	$1,015,792	$40,700	CCF32	18	$1,015,792	$40,700	14-7	18	$1,015,792	$70,700	18	$0	$0
336	CC	1001051678	PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN	230201	30	$1,534,905	$245,600	EPS002	30	$1,534,905	$61,400	CCF32	30	$1,534,905	$61,400	14-7	30	$1,534,905	$106,900	30	$0	$0
337	CC	1075223790	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
338	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	15	$1,183,872	$189,500	EPS037	15	$1,183,872	$47,400	CCF32	15	$1,183,873	$47,400	14-7	15	$1,183,872	$82,400	15	$0	$0
339	CC	1076904011	RAMOS LARA JUAN PABLO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
340	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
341	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
342	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	4	$266,664	$42,700	EPS005	4	$266,664	$10,700	CCF32	4	$266,667	$10,700	14-7	4	$266,664	$18,600	4	$0	$0
343	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	28	$1,767,255	$282,800	EPS037	28	$1,767,255	$70,700	CCF32	28	$1,767,255	$70,700	14-7	28	$1,767,255	$123,100	28	$0	$0
344	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	27	$1,350,000	$216,000	EPS037	27	$1,350,000	$54,000	CCF32	27	$1,350,000	$54,000	14-7	27	$1,350,000	$94,000	27	$0	$0
345	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$6,264,000	$1,065,100	EPS008	30	$6,264,000	$250,600	CCF32	30	$6,264,000	$250,600	14-7	30	$6,264,000	$436,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
346	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF32	22	$1,183,483	$47,400	14-7	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
347	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
348	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
349	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	25	$1,209,459	$193,600	EPS037	25	$1,209,459	$48,400	CCF32	25	$1,209,459	$48,400	14-7	25	$1,209,459	$84,200	25	$0	$0
350	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	26	$3,033,333	$485,400	EPS037	26	$3,033,333	$121,400	CCF32	26	$3,033,334	$121,400	14-7	26	$3,033,333	$211,200	26	$0	$0
351	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	16	$1,226,664	$196,300	EPS037	16	$1,226,664	$49,100	CCF32	16	$1,226,667	$49,100	14-7	16	$1,226,664	$85,400	16	$0	$0
352	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
353	CC	1032467155	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	25-14	24	$2,400,000	$384,000	EPS037	24	$2,400,000	$96,000	CCF32	24	$2,400,000	$96,000	14-7	24	$2,400,000	$167,100	24	$0	$0
354	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$49,400	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
355	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	25	$2,916,667	$466,700	EPS037	25	$2,916,667	$116,700	CCF32	25	$2,916,667	$116,700	14-7	25	$2,916,667	$203,100	25	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (31 Afiliados)						**$55,000,390**	**$8,801,300**			**$55,000,390**	**$2,201,200**			**$56,626,839**	**$2,266,300**			**$55,000,390**	**$3,829,300**		**$0**	**$0**
356	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	28	$2,149,276	$343,900	EPS041	28	$2,149,276	$86,000	CCF13	28	$2,149,276	$86,000	14-7	28	$2,149,276	$149,600	28	$0	$0
357	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	$229,927	$36,800	EPS017	1	$229,927	$9,200	CCF13	1	$229,927	$9,200	14-7	1	$229,927	$16,100	1	$0	$0
358	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	25	$1,500,000	$240,000	EPS037	25	$1,500,000	$60,000	CCF13	25	$1,500,000	$60,000	14-7	25	$1,500,000	$104,400	25	$0	$0
359	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	25	$1,500,000	$240,000	ESSC62	25	$1,500,000	$60,000	CCF13	25	$1,500,000	$60,000	14-7	25	$1,500,000	$104,400	25	$0	$0
360	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	27	$4,950,000	$792,000	EPS037	27	$4,950,000	$198,000	CCF13	27	$4,950,000	$198,000	14-7	27	$4,950,000	$344,600	27	$0	$0
361	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	28	$3,089,333	$494,300	EPS010	28	$3,089,333	$123,600	CCF13	28	$3,089,333	$123,600	14-7	28	$3,089,333	$215,100	28	$0	$0
362	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	10	$1,433,332	$229,400	EPS005	10	$1,433,332	$57,400	CCF13	10	$1,433,334	$57,400	14-7	10	$1,433,332	$99,800	10	$0	$0
363	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	15	$1,008,619	$161,400	ESSC62	15	$1,008,619	$40,400	CCF13	15	$1,008,621	$40,400	14-7	15	$1,008,619	$70,200	15	$0	$0
364	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	18	$1,184,100	$189,500	ESSC62	18	$1,184,100	$47,400	CCF13	18	$1,184,100	$47,400	14-7	18	$1,184,100	$82,500	18	$0	$0
365	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	17	$1,622,027	$259,600	EPS037	17	$1,622,027	$64,900	CCF13	17	$1,622,027	$64,900	14-7	17	$1,622,027	$112,900	17	$0	$0
366	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC62	30	$1,500,000	$60,000	CCF13	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
367	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC62	20	$949,000	$38,000	CCF13	20	$949,000	$38,000	14-7	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
368	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	26	$3,033,334	$485,400	EPS041	26	$3,033,334	$121,400	CCF13	26	$3,033,334	$121,400	14-7	26	$3,033,334	$211,200	26	$0	$0
369	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF13	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
370	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	25	$1,764,493	$282,400	ESSC62	25	$1,764,493	$70,600	CCF13	25	$2,066,813	$82,700	14-7	25	$1,764,493	$122,900	25	$0	$0
371	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	29	$1,530,234	$244,900	ESSC62	29	$1,530,234	$61,300	CCF13	29	$1,530,234	$61,300	14-7	29	$1,530,234	$106,600	29	$0	$0
372	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	16	$778,541	$124,600	ESSC62	16	$778,541	$31,200	CCF13	16	$778,541	$31,200	14-7	16	$778,541	$54,200	16	$0	$0
373	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	23	$1,533,334	$245,400	EPS005	23	$1,533,334	$61,400	CCF13	23	$1,533,334	$61,400	14-7	23	$1,533,334	$106,800	23	$0	$0
374	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	27	$2,017,242	$322,800	EPS037	27	$2,017,242	$80,700	CCF13	27	$2,017,242	$80,700	14-7	27	$2,017,242	$140,500	27	$0	$0
375	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,435,105	$229,700	ESSC62	30	$1,435,105	$57,500	CCF13	30	$1,435,105	$57,500	14-7	30	$1,435,105	$99,900	30	$0	$0
376	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	7	$676,667	$108,300	EPS005	7	$676,667	$27,100	CCF13	7	$676,667	$27,100	14-7	7	$676,667	$47,100	7	$0	$0
377	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	24	$1,677,564	$268,500	EPS037	24	$1,677,564	$67,200	CCF13	24	$1,677,564	$67,200	14-7	24	$1,677,564	$116,800	24	$0	$0
378	CC	17690560	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	230301	26	$1,369,861	$219,200	EPS005	26	$1,369,861	$54,800	CCF13	26	$1,369,861	$54,800	14-7	26	$1,369,861	$95,400	26	$0	$0
379	CC	1117836504	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	230301	1	$74,674	$12,000	EPS037	1	$74,674	$3,000	CCF13	1	$1,398,799	$56,000	14-7	1	$74,674	$5,200	1	$0	$0
380	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$2,911,957	$466,000	EPS037	30	$2,911,957	$116,500	CCF13	30	$2,911,957	$116,500	14-7	30	$2,911,957	$202,700	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
381	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF13	27	$1,281,150	$51,300	14-7	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
382	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$2,180,870	$349,000	ESSC62	30	$2,180,870	$87,300	CCF13	30	$2,180,870	$87,300	14-7	30	$2,180,870	$151,800	30	$0	$0
383	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	28	$1,328,600	$212,600	ESSC62	28	$1,328,600	$53,200	CCF13	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
384	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	ESSC62	30	$2,500,000	$100,000	CCF13	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
385	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
386	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	$5,371,200	$859,400	EPS005	30	$5,371,200	$214,900	CCF13	30	$5,371,200	$214,900	14-7	30	$5,371,200	$373,900	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (7 Afiliados)						**$6,319,359**	**$1,011,500**			**$6,319,359**	**$253,100**			**$6,507,688**	**$260,700**			**$6,319,359**	**$440,100**		**$0**	**$0**
387	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	25	$1,186,250	$189,800	ESSC62	25	$1,186,250	$47,500	CCF13	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
388	CC	1117815289	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	230301	11	$560,632	$89,800	ESSC62	11	$560,632	$22,500	CCF13	11	$637,755	$25,600	14-7	11	$560,632	$39,100	11	$0	$0
389	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC62	18	$854,100	$34,200	CCF13	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
390	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	17	$1,037,195	$166,000	ESSC62	17	$1,037,195	$41,500	CCF13	17	$1,037,195	$41,500	14-7	17	$1,037,195	$72,200	17	$0	$0
391	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	16	$828,828	$132,700	ESSC62	16	$828,828	$33,200	CCF13	16	$940,033	$37,700	14-7	16	$828,828	$57,700	16	$0	$0
392	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	16	$817,222	$130,800	EPS041	16	$817,222	$32,700	CCF13	16	$817,223	$32,700	14-7	16	$817,222	$56,900	16	$0	$0
393	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	21	$1,035,132	$165,700	ESSC62	21	$1,035,132	$41,500	CCF13	21	$1,035,132	$41,500	14-7	21	$1,035,132	$72,100	21	$0	$0
Total			**Afiliados(133)**			**$294,928,716**	**$47,215,600**			**$294,928,716**	**$12,647,300**			**$278,867,138**	**$11,166,800**			**$294,928,716**	**$15,820,200**		**$12,953,850**	**$647,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,268,042,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$47,215,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$3,342,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$14,009,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$24,348,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$5,515,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$15,820,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	130	$15,820,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				130	$11,166,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	59	$5,417,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	71	$5,749,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				133	$12,647,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	22	$1,390,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$250,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$143,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$63,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$303,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$285,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$195,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$130,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	50	$3,932,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$459,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,071,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$4,421,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$259,100
TOTAL				133	$87,497,700

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ROBERTO MIGUEL CASTAÑO DIAZ identificado(a) con CC 3828340 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025-02-06							X		X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	3	16%	$1,493,001	$238,900
AFP	COLPENSIONES	3	16%	$1,493,001	$238,900
AFP	COLPENSIONES	24	16%	$12,763,079	$2,042,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	3		$1,493,001	$7,500
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	3		$1,493,001	$7,500
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	24		$12,763,079	$63,900
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	3		$1,493,001	$7,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	3		$1,493,001	$7,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	24		$12,763,079	$63,900
ARL	SEGUROS BOLIVAR	3	0%	$1,493,001	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	3	0%	$1,493,001	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	24	6.96%	$12,763,079	$888,400
CCF	COMPENSAR	3	4%	$2,150,550	$86,100
CCF	COMPENSAR	3	4%	$2,120,550	$84,900
CCF	COMPENSAR	24	4%	$12,763,080	$510,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	3	12.5%	$1,493,001	$186,700
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	3	12.5%	$1,493,001	$186,700
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	24	12.5%	$12,763,079	$1,595,400
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	3%	$2,150,550	$64,600
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	3%	$2,120,550	$63,700
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24	3%	$12,763,080	$382,900
PARAFISCALES	SENA	3	2%	$2,150,550	$43,100
PARAFISCALES	SENA	3	2%	$2,120,550	$42,500
PARAFISCALES	SENA	24	2%	$12,763,080	$255,300

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 02:20.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025-02-06													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	2	16%	$700,000	$112,000
AFP	COLPENSIONES	5	16%	$1,750,000	$280,000
AFP	COLPENSIONES	23	16%	$8,050,000	$1,288,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2		$700,000	$3,500
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	5		$1,750,000	$8,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	23		$8,050,000	$40,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2		$700,000	$3,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	5		$1,750,000	$8,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	23		$8,050,000	$40,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	2	0%	$700,000	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	5	0%	$1,750,000	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	23	0.522%	$8,050,000	$42,100
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	2	4%	$700,000	$28,000
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	5	4%	$1,750,000	$70,000
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	23	4%	$8,050,000	$322,000
EPS	SANITAS	2	4%	$700,000	$28,000
EPS	SANITAS	5	4%	$1,750,000	$70,000
EPS	SANITAS	23	4%	$8,050,000	$322,000

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 02:20.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CANDELARIO DE JESUS GARIZAO SEHUANES identificado(a) con CC 8373253 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025-02-06													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	3	16%	$186,016	$29,800
AFP	PROTECCION	1	16%	$62,006	$10,000
AFP	PROTECCION	26	16%	$1,586,271	$253,900
ARL	SEGUROS BOLIVAR	3	0%	$186,016	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$62,006	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	26	6.96%	$1,586,271	$110,500
CCF	COMFACA	3	4%	$183,032	$7,400
CCF	COMFACA	1	4%	$61,011	$2,500
CCF	COMFACA	26	4%	$1,586,273	$63,500
EPS	NUEVA E.P.S.	3	4%	$186,016	$7,500
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$62,006	$2,500
EPS	NUEVA E.P.S.	26	4%	$1,586,271	$63,500

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 02:20.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS identificado(a) con CC 59652037 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025-02-06									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	3	16%	$481,000	$77,000
AFP	PROTECCION	2	16%	$320,667	$51,400
AFP	PROTECCION	25	16%	$4,000,000	$640,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	3	0%	$481,000	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	2	0%	$320,667	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	25	6.96%	$4,000,000	$278,400
CCF	COMFABOY	3	4%	$480,000	$19,200
CCF	COMFABOY	2	4%	$318,000	$12,800
CCF	COMFABOY	25	4%	$4,000,000	$160,000
EPS	NUEVA E.P.S.	3	4%	$481,000	$19,300
EPS	NUEVA E.P.S.	2	4%	$320,667	$12,900
EPS	NUEVA E.P.S.	25	4%	$4,000,000	$160,000

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 02:20.

Certificados de Aportes

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025-02-06													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	4	16%	$903,334	$144,600
AFP	COLFONDOS	1	16%	$225,834	$36,200
AFP	COLFONDOS	25	16%	$5,645,832	$903,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	4		$903,334	$4,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1		$225,834	$1,200
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	25		$5,645,832	$28,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	4		$903,334	$4,600
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	1		$225,834	$1,200
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	25		$5,645,832	$28,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	4	0%	$903,334	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$225,834	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	25	0.522%	$5,645,832	$29,500
CCF	COMPENSAR	4	4%	$903,334	$36,200
CCF	COMPENSAR	1	4%	$225,834	$9,100
CCF	COMPENSAR	25	4%	$5,645,834	$225,900
EPS	COMPENSAR	4	4%	$903,334	$36,200
EPS	COMPENSAR	1	4%	$225,834	$9,100
EPS	COMPENSAR	25	4%	$5,645,832	$225,900

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 02:20.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIDER ARTURO RODRIGUEZ BUSTILLO identificado(a) con CC 1082904112 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025-02-06									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	1	16%	$216,578	$34,700
AFP	PROTECCION	3	16%	$649,734	$104,000
AFP	PROTECCION	26	16%	$5,602,134	$896,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1		$216,578	$1,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	3		$649,734	$3,300
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	26		$5,602,134	$28,100
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	1		$216,578	$1,100
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	3		$649,734	$3,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	26		$5,602,134	$28,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$216,578	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	3	0%	$649,734	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	26	6.96%	$5,602,134	$390,000
CCF	COMFANORTE	1	4%	$215,467	$8,700
CCF	COMFANORTE	3	4%	$643,067	$25,800
CCF	COMFANORTE	26	4%	$5,602,134	$224,100
EPS	SALUD TOTAL	1	4%	$216,578	$8,700
EPS	SALUD TOTAL	3	4%	$649,734	$26,000
EPS	SALUD TOTAL	26	4%	$5,602,134	$224,100

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 02:36.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
NEOTECNO INGENIERIA SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1247099167	9481412393	E	2025/02/11	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,896,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO I (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1102385551	DOMINGUEZ ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO FLORENCIA (5 Afiliados)						$4,697,550	$751,900			$4,697,550	$188,100			$4,697,550	$188,100			$4,697,550	$327,200		$0	$0
Centro de Trabajo: EL PAUJIL (5 Afiliados)						$4,697,550	$751,900			$4,697,550	$188,100			$4,697,550	$188,100			$4,697,550	$327,200		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						$4,697,550	$751,900			$4,697,550	$188,100			$4,697,550	$188,100			$4,697,550	$327,200		$0	$0
2	CC	88219553	BOHORQUEZ JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1122238761	GAMBA MAKY	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS041	22	$1,043,900	$41,800	CCF13	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
4	CC	1115950732	GARCIA CRISTIAN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
5	CC	1049347801	NOVOA ROBERTO	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF13	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
6	CC	5997126	OSPINA ORLANDO	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF13	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$6,121,050**	**$979,700**			**$6,121,050**	**$245,100**			**$6,121,050**	**$245,100**			**$6,121,050**	**$426,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1247099167	9481412393	E	2025/02/11	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,896,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$979,700	$0	$0	$979,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$812,600	$0	$0	$812,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$167,100	$0	$0	$167,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$426,300	$0	$0	$426,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$426,300	$0	$0	$426,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$245,100	$0	$0	$245,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	$188,100	$0	$0	$188,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$245,100	$0	$0	$245,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$146,300	$0	$0	$146,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$41,800	$0	$0	$41,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**6**	**$1,896,200**	**$0**	**$0**	**$1,896,200**

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
ADV CONSTRUCCIONES SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901768124-1	ADV CONSTRUCCIONES SAS	AVENIDA CARRERA 80 8 11	6014617216	advconstruccionesadmon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84133850	$752.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	19.000	0		0		0	5	100	0	19.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	5	200	0	57.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	20.900	0		0		0	5	100	0	21.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	379.800	0	0	0	0	5	1.300	0	381.100	3
231001	Colfondos	800227940-6	7.600	0	0	0	0	5	100	0	7.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	168.700				168.700	5	600	169.300			1.687	169.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	96.900	5	400	97.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	96.900	97.300
Pensión	2	387.400	388.800
Riesgos Laborales	1	168.700	169.300
CCF	1	96.900	97.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	749.900	752.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901768124-1	ADV CONSTRUCCIONES SAS		AVENIDA CARRERA 80 8 11	6014617216	advconstruccionesadmon@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84133850	$752.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1067718209	MARTINEZ POLO JOHN JAMER	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1091667229	TORRES JULIO CESAR AUGUSTO	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF22	474.500	19.000	0	0	0	0	0
3	CC	1103217616	MONTES MENESES JAMER ALDAIR	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS005	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF22	474.500	19.000	0	0	0	0	0
4	CC	88222193	BOHORQUEZ MONCADA YESID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de febrero de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los días 07 días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,



WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,635.32	74.90	1,710.22
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	289.45	6.00	295.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	205.00	0.00	205.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	88,777.74	355.83	89,133.57
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,401.69	40.85	19,442.54
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	170,791.59	-196.00	170,595.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	6,637.19	0.00	6,637.19
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	621,142.18	0.00	621,142.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	76,964.26	0.00	76,964.26
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	304.73	0.00	304.73
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	45,123.63	0.00	45,123.63
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	312,438.74	0.00	312,438.74
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	20,088.91	0.00	20,088.91
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	25,192.61	1,004.29	26,196.90
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	59.86	23.64	83.50
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	139.37	67.95	207.32
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,946.46	0.00	2,946.46
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	116.00	0.00	116.00
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,187.49	248.17	1,435.66
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	62.63	5.33	67.96
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	650.75	37.28	688.03
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	604.13	15.76	619.89
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	262,707.44	24,949.89	287,657.33
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	565.90	53.50	619.40
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,725.58	141.12	3,866.70
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	7,226.42	0.00	7,226.42
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	10,723.68	0.00	10,723.68
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,140.50	0.00	1,140.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	166,458.91	0.00	166,458.91
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	261.21	0.00	261.21
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	15,572.61	0.00	15,572.61
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	351,582.52	3,011.37	354,593.89
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0.00	0.00	0.00
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	631,579.16	0.00	631,579.16
ITEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	847,521.66	3,421.16	850,942.82
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	4,408.82	0.00	4,408.82
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	11,715.55	0.00	11,715.55
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	9,613.14	271.98	9,885.12
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,145.56	0.00	4,145.56
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	661.96	534.56	1,196.52
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	78,045.76	0.00	78,045.76
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	415.25	9.86	425.11
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	893.33	0.00	893.33
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	2,864.77	0.00	2,864.77
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	16,702.89	0.00	16,702.89
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	303.40	-202.22	101.18
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	80.75	-61.20	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	100.24	6.90	107.14
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	218.07	14.40	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	0.00	7,299.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	3,345.00	405.00	3,750.00
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	591.30	0.00	591.30
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,196.09	0.00	7,196.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	5,998.73	0.00	5,998.73
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	196.00	196.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	112.22	112.22
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	150.00	150.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	90.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	61.20	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	56.53	56.53
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	29.25	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201-13	Demolición de Estructuras	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descirpción		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Demolición de estructuras, aletas descole de alcantarilla, margen derecho. PR 16+253	Aleta (2)			1.20	1.95	0.26	2.30	1.19	
	Muro			0.20	2.00	0.30	0.40	0.12	
	Placa	3.75	1.40	2.58	2.00	0.25	5.15	1.29	
	Muro			1.10	2.00	0.30	1.88	0.56	
	Descole			0.25	3.00	0.30	0.75	0.23	
	Descole	1.35	1.55	1.45	1.26	0.30	1.83	0.55	
	Descole			1.26	2.00	0.30	1.89	0.57	
	Tubería				9.70		0.32	3.10	
Subtotal								**7.61**	
Demolición de estructuras, aletas descole de alcantarilla, margen derecho. PR 15+725	Guarda Rueda			2.20	0.40	0.30	0.88	0.26	
	Muro			1.40	1.45	0.30	1.08	0.32	
	Aletas (2)	1.60	1.00	1.30	1.80	0.35	2.34	0.82	
	Tubería			7.20			0.35	2.52	
	Descole			1.10	2.00	0.25	2.20	0.55	
	Guarda Rueda Encole			1.50	0.25	0.30	0.38	0.11	
	Muro Frontal			1.50	1.45	0.30	1.23	0.37	
	Muros Laterales (3)			1.50	1.45	0.25	2.18	1.63	
Subtotal								**6.58**	
Demolición de estructuras, aletas descole de alcantarilla, margen derecho. PR 16+013	Guarda Rueda			0.32	1.55	0.25	0.50	0.12	
	Muro			1.45	1.55	0.25	1.30	0.32	
	Aletas		1.45	1.45	2.80	0.25	4.03	2.01	
	Placa			8.00	1.60	0.25	12.80	3.20	
	Tubería				8.00		0.32	2.56	
Subtotal								**8.21**	
Demolición de estructuras, aletas descole de alcantarilla, margen derecho. PR 16+115	Tubería				6.00		0.32	1.92	
	Muro Descole			1.90	3.64	0.30	6.56	1.97	
Subtotal								**3.89**	

Demolición de estructuras, muro de confinamiento, margen derecho. PR 15+187	Muro			2.00	3.20	0.25	6.40	1.60	
Subtotal								**1.60**	
Demolición de estructuras, muro de confinamiento, margen derecho. PR 15+530	Muro	1.50	0.45	0.98	13.50	2.80	2.73	36.86	
	Guarda Rueda Encole			1.33	0.40	0.25	0.532	0.13	
	Muro Frontal Encole			1.33	1.30	0.25	0.78	0.19	
	Muro posterior Encole			3.50	1.30	0.25	4.55	1.14	
	Muros Laterales (2)			1.75	1.30	0.25	2.28	1.14	
	Placa Encole			1.60	0.20	2.02	0.32	0.65	
	Huellas Disipador (4)			1.70	0.20	0.70	0.34	0.95	
	Muros Disipador (2)			0.37	0.15	6.83	2.53	0.76	
	Contrahuellas Disipador (4)			0.17	0.70	0.20	0.03	0.10	
Subtotal								**41.92**	
TOTAL								**69.81**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoria
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	Excavación sin clasificar de la explanación y canales		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Via Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	longitud	Ancho	Carril	Area Corte	Volumen corte	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante PR 16+050 - PR 16+430	PR 16+050		0.00	7.65	Corona	2.30	0.00	0.00	
	PR 16+050	PR 16+060	10.00	7.76	Corona	2.33	23.10	23.10	
	PR 16+060	PR 16+070	10.00	7.74	Corona	2.32	23.23	46.33	
	PR 16+070	PR 16+080	10.00	7.50	Corona	2.25	22.86	69.19	
	PR 16+080	PR 16+090	10.00	7.36	Corona	2.21	22.30	91.49	
	PR 16+090	PR 16+100	10.00	7.36	Corona	2.21	22.08	113.57	
	PR 16+100	PR 16+110	10.00	7.36	Corona	2.21	22.08	135.65	
	PR 16+110	PR 16+120	10.00	7.43	Corona	2.21	22.08	157.73	
	PR 16+120	PR 16+130	10.00	7.43	Corona	2.21	22.08	179.81	
	PR 16+130	PR 16+140	10.00	7.43	Corona	2.21	22.08	201.89	
	PR 16+140	PR 16+150	10.00	7.43	Corona	2.21	22.08	223.97	
	PR 16+150	PR 16+160	10.00	7.43	Corona	2.21	22.08	246.05	
	PR 16+160	PR 16+170	10.00	7.43	Corona	2.21	22.08	268.13	
	PR 16+170	PR 16+180	10.00	4.58	Corona	2.40	23.00	291.13	
	PR 16+180	PR 16+190	10.00	0.00	Corona	2.64	24.92	316.05	
	PR 16+190	PR 16+200	10.00	8.83	Corona	2.64	25.93	341.98	
	PR 16+200	PR 16+210	10.00	8.83	Corona	2.67	26.08	368.06	
	PR 16+210	PR 16+220	10.00	8.83	Corona	2.67	26.19	394.25	
	PR 16+220	PR 16+230	10.00	8.83	Corona	2.67	26.18	420.43	
	PR 16+230	PR 16+240	10.00	8.83	Corona	2.67	26.16	446.59	
	PR 16+240	PR 16+250	10.00	8.83	Corona	2.66	26.15	472.74	
	PR 16+250	PR 16+260	10.00	8.62	Corona	2.59	25.92	498.66	
	PR 16+260	PR 16+270	10.00	7.95	Corona	2.38	24.74	523.40	
	PR 16+270	PR 16+280	10.00	7.36	Corona	2.21	22.94	546.34	
	PR 16+280	PR 16+290	10.00	7.36	Corona	2.21	22.09	568.43	
	PR 16+290	PR 16+300	10.00	7.63	Corona	2.29	22.49	590.92	
	PR 16+300	PR 16+310	10.00	7.91	Corona	2.37	23.25	614.17	
	PR 16+310	PR 16+320	10.00	8.60	Corona	2.57	24.55	638.72	
	PR 16+320	PR 16+330	10.00	8.46	Corona	2.54	25.30	664.02	
	PR 16+330	PR 16+340	10.00	8.46	Corona	2.54	25.14	689.16	
	PR 16+340	PR 16+350	10.00	8.46	Corona	2.54	25.13	714.29	
	PR 16+350	PR 16+360	10.00	0.00	Corona	2.53	25.09	739.38	
	PR 16+360	PR 16+370	10.00	8.53	Corona	2.55	25.15	764.53	
	PR 16+370	PR 16+380	10.00	8.53	Corona	2.56	25.30	789.83	
	PR 16+380	PR 16+390	10.00	8.53	Corona	2.55	25.38	815.21	
	PR 16+390	PR 16+400	10.00	7.94	Corona	2.38	24.61	839.82	
	PR 16+400	PR 16+410	10.00	7.45	Corona	2.24	23.07	862.89	
	PR 16+410	PR 16+420	10.00	7.43	Corona	2.23	22.32	885.21	
	PR 16+420	PR 16+430	10.00	7.43	Corona	2.23	21.60	906.81	
Subtotal								**906.81**	
Excavación Mecanica Conformación de Subrasante PR 16+130 - PR 16+430	PR 16+130		0.00	7.43	Corona	0.00	0.00	0.00	
	PR 16+130	PR 16+140	10.00	7.43	Corona	5.85	29.26	29.26	
	PR 16+140	PR 16+150	10.00	7.43	Corona	7.62	67.35	96.61	
	PR 16+150	PR 16+160	10.00	7.43	Corona	19.34	134.81	231.42	
	PR 16+160	PR 16+170	10.00	7.43	Corona	19.28	193.15	424.57	
	PR 16+170	PR 16+180	10.00	4.58	Corona	14.13	168.34	592.91	
	PR 16+180	PR 16+190	10.00	0.00	Corona	0.01	71.77	664.68	
	PR 16+190	PR 16+200	10.00	8.83	Corona	0.00	0.07	664.75	
	PR 16+200	PR 16+210	10.00	8.83	Corona	6.66	34.15	698.90	
	PR 16+210	PR 16+220	10.00	8.83	Corona	9.18	80.88	779.78	
	PR 16+220	PR 16+230	10.00	8.83	Corona	6.25	78.96	858.74	
	PR 16+230	PR 16+240	10.00	8.83	Corona	0.16	32.92	891.66	
	PR 16+240	PR 16+250	10.00	8.83	Corona	0.96	5.13	896.79	
	PR 16+250	PR 16+260	10.00	8.62	Corona	3.84	23.95	920.74	
	PR 16+260	PR 16+270	10.00	7.95	Corona	2.02	29.60	950.34	
	PR 16+270	PR 16+280	10.00	7.36	Corona	1.53	17.79	968.13	
	PR 16+280	PR 16+290	10.00	7.36	Corona	3.18	23.53	991.66	
	PR 16+290	PR 16+300	10.00	7.63	Corona	2.49	28.44	1020.10	
	PR 16+300	PR 16+310	10.00	7.91	Corona	1.76	21.52	1041.62	
	PR 16+310	PR 16+320	10.00	8.60	Corona	0.78	12.90	1054.52	
	PR 16+320	PR 16+330	10.00	8.46	Corona	1.49	11.39	1065.91	
	PR 16+330	PR 16+340	10.00	8.46	Corona	0.53	10.14	1076.05	
	PR 16+340	PR 16+350	10.00	8.46	Corona	1.41	9.64	1085.69	
	PR 16+350	PR 16+360	10.00	0.00	Corona	1.04	12.18	1097.87	
	PR 16+360	PR 16+370	10.00	8.53	Corona	1.16	10.93	1108.80	
	PR 16+370	PR 16+380	10.00	8.53	Corona	2.21	16.34	1125.14	
	PR 16+380	PR 16+390	10.00	8.53	Corona	2.99	25.43	1150.57	
	PR 16+390	PR 16+400	10.00	7.94	Corona	1.02	19.80	1170.37	
	PR 16+400	PR 16+410	10.00	7.45	Corona	0.51	7.61	1177.98	
	PR 16+410	PR 16+420	10.00	7.43	Corona	0.42	4.67	1182.65	
	PR 16+420	PR 16+430	10.00	7.43	Corona	0.01	2.15	1184.80	
Subtotal								**1184.80**	
	PR 15+550		0.00	Chaflan-Varia	Corona	1.39	0.00	0.00	
	PR 15+550	PR 15+560	10.00	Chaflan-Varia	Corona	4.88	33.41	33.41	
	PR 15+560	PR 15+570	10.00	Chaflan-Varia	Corona	4.22	48.68	82.09	
	PR 15+570	PR 15+580	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.54	30.83	112.92	
	PR 15+580	PR 15+590	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.69	17.26	130.18	
	PR 15+590	PR 15+600	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.66	12.39	142.57	
	PR 15+600	PR 15+610	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.07	3.68	146.25	
	PR 15+610	PR 15+620	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.33	146.58	
	PR 15+620	PR 15+630	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.71	8.17	154.75	
	PR 15+630	PR 15+640	10.00	Chaflan-Varia	Corona	7.43	45.22	199.97	
	PR 15+640	PR 15+650	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.35	44.47	244.44	
	PR 15+650	PR 15+660	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.39	8.87	253.31	
	PR 15+660	PR 15+670	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.87	6.01	259.32	
	PR 15+670	PR 15+680	10.00	Chaflan-Varia	Corona	6.94	36.71	296.03	
	PR 15+680	PR 15+690	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.29	48.08	344.11	
	PR 15+690	PR 15+700	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.02	29.73	373.84	

Excavación Mecanica
Conformación de Taludes en Corte
PR 15+550 - PR 16+430

PR 15+700	PR 15+710	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.45	25.80	399.64
PR 15+710	PR 15+720	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.49	18.63	418.27
PR 15+720	PR 15+730	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.25	13.15	431.42
PR 15+730	PR 15+740	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.52	8.67	440.09
PR 15+740	PR 15+750	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.45	4.83	444.92
PR 15+750	PR 15+760	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.39	4.27	449.19
PR 15+760	PR 15+770	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.75	5.93	455.12
PR 15+770	PR 15+780	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	3.99	459.11
PR 15+780	PR 15+790	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.03	0.18	459.29
PR 15+790	PR 15+800	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.18	459.47
PR 15+800	PR 15+810	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	459.47
PR 15+810	PR 15+820	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.14	0.72	460.19
PR 15+820	PR 15+830	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.46	3.03	463.22
PR 15+830	PR 15+840	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.40	14.32	477.54
PR 15+840	PR 15+850	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.81	25.70	503.24
PR 15+850	PR 15+860	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.87	31.86	535.10
PR 15+860	PR 15+870	10.00	Chaflan-Varia	Corona	4.67	39.10	574.20
PR 15+870	PR 15+880	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.87	33.72	607.92
PR 15+880	PR 15+890	10.00	Chaflan-Varia	Corona	4.62	33.83	641.75
PR 15+890	PR 15+900	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.45	36.54	678.29
PR 15+900	PR 15+910	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.25	21.75	700.04
PR 15+910	PR 15+920	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.80	9.86	709.90
PR 15+920	PR 15+930	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.85	8.16	718.06
PR 15+930	PR 15+940	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.65	7.42	725.48
PR 15+940	PR 15+950	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.40	4.98	730.46
PR 15+950	PR 15+960	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.32	3.24	733.70
PR 15+960	PR 15+970	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.02	1.49	735.19
PR 15+970	PR 15+980	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.03	0.25	735.44
PR 15+980	PR 15+990	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.14	0.76	736.20
PR 15+990	PR 16+000	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.37	2.25	738.45
PR 16+000	PR 16+010	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.42	3.66	742.11
PR 16+010	PR 16+020	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.69	5.35	747.46
PR 16+020	PR 16+030	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.26	4.74	752.20
PR 16+030	PR 16+040	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.41	3.36	755.56
PR 16+040	PR 16+050	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.11	12.31	767.87
PR 16+050	PR 16+060	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.14	15.66	783.53
PR 16+060	PR 16+070	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.36	7.22	790.75
PR 16+070	PR 16+080	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.20	2.79	793.54
PR 16+080	PR 16+090	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.39	3.00	796.54
PR 16+090	PR 16+100	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.31	3.50	800.04
PR 16+100	PR 16+110	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.17	2.41	802.45
PR 16+110	PR 16+120	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.02	0.93	803.38
PR 16+120	PR 16+130	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.23	1.22	804.60
PR 16+130	PR 16+140	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.53	3.79	808.39
PR 16+140	PR 16+150	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.35	9.40	817.79
PR 16+150	PR 16+160	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.62	19.83	837.62
PR 16+160	PR 16+170	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.66	26.71	864.33
PR 16+170	PR 16+180	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.37	20.89	885.22
PR 16+180	PR 16+190	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	7.40	892.62
PR 16+190	PR 16+200	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	892.62
PR 16+200	PR 16+210	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.16	0.89	893.51
PR 16+210	PR 16+220	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.90	894.41
PR 16+220	PR 16+230	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.13	0.71	895.12
PR 16+230	PR 16+240	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.70	895.82
PR 16+240	PR 16+250	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.01	895.83
PR 16+250	PR 16+260	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.13	0.69	896.52
PR 16+260	PR 16+270	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.01	0.73	897.25
PR 16+270	PR 16+280	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.04	0.24	897.49
PR 16+280	PR 16+290	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.42	2.26	899.75
PR 16+290	PR 16+300	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	2.11	901.86
PR 16+300	PR 16+310	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.01	901.87
PR 16+310	PR 16+320	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.01	0.03	901.90
PR 16+320	PR 16+330	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.01	0.09	901.99
PR 16+330	PR 16+340	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.01	0.11	902.10
PR 16+340	PR 16+350	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.01	0.12	902.22
PR 16+350	PR 16+360	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.08	902.30
PR 16+360	PR 16+370	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.30
PR 16+370	PR 16+380	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.30
PR 16+380	PR 16+390	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.30
PR 16+390	PR 16+400	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.30
PR 16+400	PR 16+410	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.30
PR 16+410	PR 16+420	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.04	0.20	902.50
PR 16+420	PR 16+430	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.20	902.70
PR 16+430	PR 16+440	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.70
PR 16+440	PR 16+450	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.70
PR 16+450	PR 16+460	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.70
PR 16+460	PR 16+470	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	902.70
PR 16+470	PR 16+480	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.01	0.03	902.73
PR 16+480	PR 16+490	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.03	902.76
PR 16+490	PR 16+500	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.02	902.78
PR 16+500	PR 16+510	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.66	3.61	906.39
PR 16+510	PR 16+520	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	3.60	909.99
PR 16+520	PR 16+530	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	909.99
PR 16+530	PR 16+540	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.21	1.14	911.13
PR 16+540	PR 16+550	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	1.14	912.27
PR 16+550	PR 16+560	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	912.27
PR 16+560	PR 16+570	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.27	1.35	913.62
PR 16+570	PR 16+580	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.04	1.54	915.16
PR 16+580	PR 16+590	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.26	1.46	916.62
PR 16+590	PR 16+600	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.04	6.61	923.23
PR 16+600	PR 16+610	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.65	8.78	932.01
PR 16+610	PR 16+620	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.48	16.43	948.44
PR 16+620	PR 16+630	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.06	13.11	961.55
PR 16+630	PR 16+640	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.96	10.26	971.81
PR 16+640	PR 16+650	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.66	17.89	989.70
PR 16+650	PR 16+660	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.40	9.28	998.98
PR 16+660	PR 16+670	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.07	1.86	1000.84
PR 16+670	PR 16+680	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.91	3.32	1004.16
PR 16+680	PR 16+690	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.33	4.07	1008.23
PR 16+690	PR 16+700	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.48	6.25	1014.48
PR 16+700	PR 16+710	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.12	6.42	1020.90
PR 16+710	PR 16+720	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.01	0.61	1021.51
PR 16+720	PR 16+730	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.05	1021.56
PR 16+730	PR 16+740	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.06	0.34	1021.90







	PR 16+740	PR 16+750	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.32	1022.22
	PR 16+750	PR 16+760	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	1022.22
	PR 16+760	PR 16+770	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	0.00	1022.22
	PR 16+770	PR 16+780	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.24	1.27	1023.49
	PR 16+780	PR 16+790	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.08	7.00	1030.49
	PR 16+790	PR 16+800	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.23	12.26	1042.75
	PR 16+800	PR 16+810	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.56	14.42	1057.17
	PR 16+810	PR 16+820	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.36	14.58	1071.75
	PR 16+820	PR 16+830	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.62	19.88	1091.63
	PR 16+830	PR 16+840	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.00	18.07	1109.70
	PR 16+840	PR 16+850	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.44	7.18	1116.88
	PR 16+850	PR 16+860	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.40	4.21	1121.09
	PR 16+860	PR 16+870	10.00	Chaflan-Varia	Corona	0.00	2.02	1123.11
Subtotal								**1123.11**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 15+960 - PR 15+974 Margen Izquierdo	PR 15+960		0.00	2.20	Izquierdo	1.21	0.00	0.00
	PR 15+960	PR 15+970	10.00	2.20	Izquierdo	1.21	12.10	12.10
	PR 15+970	PR 15+974	4.00	2.20	Izquierdo	1.21	4.84	16.94
Subtotal								**16.94**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 15+980 - PR 15+984 Margen Izquierdo	PR 15+980		0.00	2.00	Izquierdo	1.10	0.00	0.00
	PR 15+980	PR 15+984	3.50	2.00	Izquierdo	1.10	3.85	3.85
Subtotal								**3.85**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 15+980 - PR 16+000 Margen Izquierdo	PR 15+980		0.00	4.80	Izquierdo	0.58	0.00	0.00
	PR 15+980	PR 15+990	10.00	4.80	Izquierdo	0.58	5.76	5.76
	PR 15+990	PR 16+000	10.00	4.80	Izquierdo	0.58	5.76	11.52
Subtotal								**11.52**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+120 - PR 16+140 Margen Izquierdo	PR 16+120		0.00	3.70	Izquierdo	0.30	0.00	0.00
	PR 16+120	PR 16+130	10.00	3.70	Izquierdo	0.30	2.96	2.96
	PR 16+130	PR 16+140	10.00	3.70	Izquierdo	0.30	2.96	5.92
Subtotal								**5.92**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+370 - PR 16+410 Margen Izquierdo	PR 16+340		0.00	2.30	Izquierdo	1.15	0.00	0.00
	PR 16+340	PR 16+347	7.00	2.30	Izquierdo	1.15	8.05	8.05
	PR 16+347	PR 16+350	3.00	1.40	Izquierdo	0.70	2.78	10.83
	PR 16+350	PR 16+355	5.00	1.40	Izquierdo	0.70	3.50	14.33
Subtotal								**14.33**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+370 - PR 16+410 Margen Izquierdo	PR 16+370		0.00	4.50	Izquierdo	0.72	0.00	0.00
	PR 16+370	PR 16+380	10.00	4.50	Izquierdo	0.72	7.20	7.20
	PR 16+380	PR 16+390	10.00	4.50	Izquierdo	0.72	7.20	14.40
	PR 16+390	PR 16+400	10.00	4.50	Izquierdo	0.72	7.20	21.60
	PR 16+400	PR 16+410	10.00	4.50	Izquierdo	0.72	7.20	28.80
.								**28.80**
Subtotal Presente Acta								**3296.10**
Demolición en Roca Presente Acta								**-40.85**
No Conformidad Acta Nº 44 (Conformación de Taludes PR 15+545 - PR 16+000)								**-3053.14**
TOTAL								**202.11**







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)
			UNIDAD m3

Localización	Nº	ABCISA	Margen	DIMENSIONES			Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)
				Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
Demolición en Roca Conformación de Subrasante PR 16+160 - PR16+310	R37	PR 16+165	Derecho	1.10	1.04	0.85	0.94	0.97	0.97
	R36	PR 16+165	Eje	1.68	1.10	1.10	1.85	2.03	3.01
	R35	PR 16+163	Derecho	1.10	0.90	0.85	0.94	0.84	3.85
	R34	PR 16+167	Derecho	1.25	1.02	1.10	1.38	1.40	5.24
	R33	PR 16+168	Derecho	1.13	0.61	0.80	0.90	0.54	5.79
	R32	PR 16+171	Eje	1.00	0.58	0.75	0.75	0.43	6.22
	R31	PR 16+172	Derecho	1.50	1.50	1.05	1.58	2.36	8.58
	R30	PR 16+173	Eje	0.94	0.98	0.68	0.63	0.62	9.20
	R29	PR 16+173	Derecho	1.60	0.99	1.00	1.60	1.58	10.78
	R28	PR 16+174	Eje	1.65	0.89	1.33	2.19	1.95	12.72
	R27	PR 16+176	Eje	1.57	0.89	1.33	2.08	1.85	14.57
	R26	PR 16+176	Derecho	1.70	0.77	0.87	1.48	1.13	15.70
	R25	PR 16+177	Izquierdo	0.80	0.88	0.78	0.62	0.55	16.25
	R24	PR 16+177	Derecho	1.15	0.73	0.55	0.63	0.46	16.70
	R23	PR 16+178	Izquierdo	1.20	1.14	1.20	1.44	1.64	18.35
	R22	PR 16+179	Derecho	1.62	1.15	1.63	2.64	3.04	21.38
	R21	PR 16+181	Derecho	1.26	0.82	1.11	1.40	1.15	22.53
	R20	PR 16+184	Izquierdo	1.35	1.29	1.09	1.47	1.89	24.42
	R17	PR 16+185	Eje	1.45	0.90	1.60	2.32	2.09	26.51
	R16	PR 16+185	Derecho	1.70	1.28	0.93	1.57	2.00	28.52
	R15	PR 16+186	Eje	1.90	0.75	1.15	2.19	1.64	30.15
	R14	PR 16+192	Derecho	1.35	0.74	1.05	1.42	1.04	31.20
	R13	PR 16+195	Derecho	1.05	0.80	0.95	1.00	0.80	31.99
	R12	PR 16+201	Izquierdo	0.70	0.67	0.75	0.53	0.35	32.34
	R11	PR 16+203	Derecho	0.85	0.60	0.75	0.64	0.38	32.73
	R10	PR 16+205	Izquierdo	1.05	0.86	1.21	1.27	1.09	33.82
	R9	PR 16+214	Eje	0.80	1.16	0.90	0.72	0.83	34.65
	R8	PR 16+280	Derecho	1.10	0.90	0.93	1.02	0.92	35.57
	R7	PR 16+289	Derecho	0.82	0.64	0.94	0.77	0.49	36.06
	R6	PR 16+293	Eje	1.37	1.01	1.12	1.53	1.55	37.61
	R4	PR 16+298	Derecho	1.50	1.23	1.20	1.80	2.21	39.82
	R3	PR 16+301	Derecho	0.98	0.78	1.35	1.32	1.03	40.85
Subtotal									**40.85**
TOTAL									**40.85**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135) **UNIDAD** m3

Localización		ABCSA INICIAL	ABCSA FINAL	Margen	DIMENSIONES Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volúmen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción de Alcantarilla (Sesgada) Ancho Total PR 15+187 - PR 15+188	Solera Aletas de Encole	PR 15+188	PR 15+188	Izquierdo	5.57	5.90	3.42	19.05	112.39	
	Cuerpo de Tuberia	PR 15+187	PR 15+188	Calzada	10.00	1.86	1.60	16.00	29.76	
	Solera Aletas de Descole	PR 15+187	PR 15+187	Derecho	1.80	4.83	2.60	4.68	22.60	
	Canal de Descole Natural	PR 15+187	PR 15+187	Derecho	9.60	2.90	2.29	21.98	63.75	
Subtotal									**228.51**	
Construcción de Alcantarilla Ancho Total PR 16+013	Poceta Encole	PR 16+013	PR 16+013	Izquierdo	2.60	1.95	2.30	5.98	11.66	
	Cuerpo de Tuberia	PR 16+013	PR 15+139	Derecho	10.50	2.10	1.66	17.43	36.60	
	Solera Aletas de Descole	PR 16+013	PR 16+013	Calzada	1.80	4.68	2.50	4.50	21.06	
	Canal de Descole Natural	PR 16+013	PR 16+013	Derecho	8.50	1.47	1.88	15.94	23.38	
Subtotal									**92.70**	
Construcción de Alcantarilla Ancho Total PR 16+115	Poceta Encole	PR 16+115	PR 16+115	Izquierdo	2.20	1.95	2.30	5.06	9.87	
	Cuerpo de Tuberia	PR 16+115	PR 16+115	Calzada	10.00	2.13	1.60	16.00	34.08	
	Solera de Descole	PR 16+115	PR 16+115	Derecho	1.85	4.25	2.55	4.72	20.05	
	Canal de Descole Natural	PR 16+115	PR 16+115	Derecho	9.00	1.20	0.84	7.54	9.05	
Subtotal									**73.04**	
Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+250	Cuerpo de Tuberia	PR 16+250	PR 16+250	Derecho	5.00	1.80	1.70	8.50	15.30	
	Solera de Descole	PR 16+250	PR 16+250	Derecho	1.60	4.00	3.50	5.60	22.40	
	Canal de Descole Natural	PR 16+250	PR 16+250	Derecho	40.00	3.20	3.50	128.00	447.36	
Subtotal									**485.06**	
Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+410	Cuerpo de Tuberia	PR 16+410	PR 16+410	Derecho	5.00	1.95	1.65	8.25	16.09	
	Solera de Descole	PR 16+410	PR 16+410	Derecho	1.90	4.35	2.50	4.75	20.66	
	Canal de Descole Natural	PR 16+410	PR 16+410	Derecho	3.00	1.20	0.80	2.40	2.88	
Subtotal									**39.63**	
Subtotal Presente Acta									**918.94**	
Demolición Alcantarilla PR 15+187									**-1.60**	
Demolición y Volumen de Flujo Alcantarilla PR 16+013									**-13.18**	
Demolición y Volumen de Flujo Alcantarilla PR 16+115									**-5.59**	
Demolición y Volumen de Flujo Alcantarilla PR 16+250									**-13.78**	
TOTAL									**884.79**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 600-13	Excavaciones varias en roca en seco	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135) — **UNIDAD** m3

Localización	Nº	ABCISA	Margen	DIMENSIONES			Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
Demolición en Roca Conformación de Subrasante PR 16+295	R5	PR 16+295	Derecho	3.43	2.60	1.58	5.44	14.13	14.13	
	R2	PR 16+302	Derecho	2.25	1.28	1.70	3.83	4.91	19.04	
	R1	PR 16+302	Derecho	2.20	1.46	1.43	3.15	4.59	23.64	
Subtotal									**23.64**	
TOTAL									**23.64**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134281 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 610.3	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización		ABCISA		DIMENSIONES			Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)
		INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
Relleno de Estructura Alcantarilla (Sesgada) Margen Derecho PR 15+187 - PR 15+188	Aletas Descole	PR 15+187	PR 15+187	2.40	0.59	1.95	4.68	2.75	5.50
	Sobre Tuberia	PR 15+187	PR 15+188	9.50	1.86	0.85	8.08	10.51	16.00
Subtotal									**16.00**
Relleno de Estructura Alcantarilla Margen Derecho PR 16+013	Aletas Descole	PR 16+013	PR 16+013	2.40	0.88	1.95	4.68	4.10	8.19
	Sobre Tuberia	PR 16+013	PR 16+013	10.00	2.10	0.91	9.10	14.36	22.55
Subtotal									**22.55**
Relleno de Estructura Alcantarilla Margen Derecho PR 16+115	Aletas Descole	PR 16+115	PR 16+115	2.40	0.80	1.80	4.32	3.46	6.91
	Sobre Tuberia	PR 16+115	PR 16+115	9.50	2.05	0.85	8.08	12.04	18.95
Subtotal									**18.95**
Relleno de Estructura Alcantarilla Margen Derecho PR 16+250	Sobre Tuberia	PR 16+250	PR 16+250	4.75	1.80	0.90	4.28	5.44	5.44
Subtotal									**5.44**
Relleno de Estructura Alcantarilla Margen Derecho PR 16+410	Sobre Tuberia	PR 16+410	PR 16+410	4.75	1.80	0.85	4.04	5.01	5.01
Subtotal									**5.01**
TOTAL									**67.95**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.6	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Solado (14MPa)								
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 15+139				4.75		0.46	2.19	
SUBTOTAL							**2.19**	
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 15+187			1.7	9.50	0.15	16.15	2.42	
	5.4	2.2	3.8	1.80	0.05	6.84	0.34	
				2.87		0.46	1.32	
SUBTOTAL							**4.08**	
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 16+013			1.7	10.00	0.15	17.00	2.55	
	5.4	2.2	3.8	1.80	0.05	6.84	0.34	
				10.00		0.46	4.60	
SUBTOTAL							**7.49**	
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 16+115			1.7	9.50	0.15	16.15	2.42	
	5.4	2.2	3.8	1.80	0.05	6.84	0.34	
			1.7	1.70	0.05	2.89	0.14	
				9.50		0.46	4.37	
SUBTOTAL							**7.27**	
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 16+250			1.7	4.75	0.15	8.08	1.21	
	5.4	2.2	3.8	1.80	0.05	6.84	0.34	
				4.75		0.46	2.19	
SUBTOTAL							**3.74**	
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 16+410			1.7	4.75	0.15	8.08	1.21	
	5.4	2.2	3.8	1.80	0.05	6.84	0.34	
				4.75		0.46	2.19	
SUBTOTAL							**3.74**	
TOTAL							**28.50**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descirpción		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto para construcción de descole de Box Culvert,PR 12+020, Margen izquierda	Placa de descole Box Culvert PR 12+020	5.70	4.00	4.85	4.00	0.30	19.40	5.82	
	Placas Laterales			0.33	2.00	0.25	0.65	0.16	
	Placas Laterales			0.53	5.50	0.25	2.89	0.72	
Subtotal								**6.70**	
Concreto para construcción de descole canal lateral, Margen izquierda PR 11+780	Placa de descole Canal 11+780	3.40	2.10	2.75	2.90	0.25	7.98	1.99	
	Placa de descole Canal 11+781	3.4	1.7	2.55	2.1	0.25	5.36	1.34	
		1.70	1.40	1.55	1.55	0.25	2.40	0.60	
				3.60	5.30	0.25	19.08	4.77	
Subtotal								**8.70**	
Concreto para construcción de muro de confinamiento de cunetas PR 11+630	Vastago			0.50	1.35	0.20	0.68	0.14	
	Zapata			0.20	1.35	0.80	0.27	0.22	
Subtotal								**0.36**	
TOTAL								**15.76**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización	Altura Mayor (m)	Altura Menor (m)	Altura Prom (m)	Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Instalacion de Tuberia de 36" Alcantarilla PR 15+187								
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla PR15+187				10.00			10.00	
SUBTOTAL							**10.00**	
Instalacion de Tuberia de 36" Alcantarilla PR 16+013								
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla PR16+013				10.50			10.50	
SUBTOTAL							**10.50**	
Instalacion de Tuberia de 36" Alcantarilla PR 16+115								
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla PR16+115				10.00			10.00	
SUBTOTAL							**10.00**	
Instalacion de Tuberia de 36" Alcantarilla PR 16+250								
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla PR 16+250 (Media Sección hacia descole)				5.00			5.00	
SUBTOTAL							**5.00**	
Instalacion de Tuberia de 36" Alcantarilla PR 16+410								
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla PR 16+410 (Media Sección hacia descole)				5.00			5.00	
SUBTOTAL							**5.00**	
TOTAL							**40.50**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoria
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Excavación Mecanica Mejoramiento de Subrasante PR16+050 - PR16+430	PR 16+050	PR 16+430	PR 16+990	0.75	0.1	0.65	906.81	m3/km	589.4
Subtotal									**589.40**
Excavación Mecanica Conformación de Subrasante PR16+130 - PR16+430	PR 16+130	PR 16+430	PR 16+990	0.71	0.1	0.61	1184.80	m3/km	722.7
Subtotal									**722.70**
Excavación Mecanica Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+013	PR 16+013	PR 16+013	PR 16+990	0.977	0.1	0.877	92.70	m3/km	81.3
Subtotal									**81.30**
Excavación Mecanica Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+115	PR 16+115	PR 16+115	PR 16+990	0.875	0.1	0.775	73.04	m3/km	56.6
Subtotal									**56.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Excavación Mecanica Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+250	PR 16+250	PR 16+250	PR 16+990	0.74	0.1	0.64	485.06	m3/km	310.4
Subtotal									**310.40**
Excavación Mecanica Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+410	PR 16+410	PR 16+410	PR 16+990	0.58	0.1	0.48	39.63	m3/km	19
Subtotal									**19.00**
Excavación Mecanica Conformación de Taludes en Corte PR 15+550 - PR16+430	PR 15+550	PR 16+870	PR 16+990	0.78	0.1	0.68	1123.11	m3/km	763.7
Subtotal									**763.70**
TOTAL									**2543.10**





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3-km

Localización / Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad / PR Aporte de Material	PR Sitio de Cantera	DESCRIPCIÓN			Volumen Material Transportado (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
					Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Suministro e Instalación de Afirmado para Sello de pedraplen y conformación de Subrasante	PR 16+050	PR 16+430	PR 16+240	PR 12+000			4.24	290.19		1230.40	
Subtotal										1230.40	
Suministro e Instalación de Pedraplen para Mejoramiento de Subrasante	PR 16+050	PR 16+430	PR 16+240	PR 12+000			4.24	453.20		1921.57	
	PR 15+960	PR 15+974	PR 15+967	PR 12+000			3.97	16.94		67.20	
	PR 15+980	PR 15+984	PR 15+982	PR 12+000			3.98	3.85		15.33	
	PR 15+980	PR 16+000	PR 15+990	PR 12+000			3.99	11.52		45.96	
	PR 16+120	PR 16+140	PR 16+130	PR 12+000			4.13	5.92		24.45	
	PR 16+340	PR 16+355	PR 16+348	PR 12+000			4.35	14.33		62.30	
	PR 16+370	PR 16+410	PR 16+390	PR 12+000			4.39	28.80		126.43	
Subtotal										2050.06	
TOTAL										**3280.46**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE IZQ	DIST. EJE DER	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+050 - PR16+430	PR16+050	785.704	785.604	785.617	785.52	785.523	785.42	3.70	3.95	7.65	0.10	0.77		
	PR16+060	786.139	786.039	786.020	785.92	785.887	785.79	3.70	4.06	7.76	0.10	0.78	10.00	7.71
	PR16+070	786.419	786.319	786.300	786.20	786.168	786.07	3.70	4.04	7.74	0.10	0.77	10.00	7.75
	PR16+080	786.658	786.558	786.562	786.46	786.462	786.36	3.70	3.80	7.50	0.10	0.75	10.00	7.62
	PR16+090	786.881	786.781	786.825	786.72	786.755	786.65	3.70	3.66	7.36	0.10	0.74	10.00	7.43
	PR16+100	787.126	787.026	787.109	787.01	787.039	786.94	3.70	3.66	7.36	0.10	0.74	10.00	7.36
	PR16+110	787.414	787.314	787.437	787.34	787.367	787.27	3.70	3.66	7.36	0.10	0.74	10.00	7.36
	PR16+120	787.745	787.645	787.808	787.71	787.738	787.64	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.40
	PR16+130	788.152	788.052	788.222	788.12	788.152	788.05	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.43
	PR16+140	788.589	788.489	788.659	788.56	788.589	788.49	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.43
	PR16+150	789.031	788.931	789.095	788.99	789.025	788.92	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.43
	PR16+160	789.519	789.419	789.531	789.43	789.461	789.36	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.43
	PR16+170	789.987	789.887	789.946	789.85	789.876	789.78	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.43
	PR16+180	790.308	790.208	790.215	790.12	790.106	790.01	3.70	0.88	4.58	0.10	0.46	10.00	6.01
	PR16+190	790.462	790.362	790.317	790.22	790.117	790.02	3.70	5.05	8.75	0.10	0.88	10.00	6.67
	PR16+200	790.455	790.355	790.273	790.17	790.018	789.92	3.70	5.13	8.83	0.10	0.88	10.00	8.79
	PR16+210	790.389	790.289	790.207	790.11	789.953	789.85	3.70	5.13	8.83	0.10	0.88	10.00	8.83
	PR16+220	790.324	790.224	790.142	790.04	789.887	789.79	3.70	5.13	8.83	0.10	0.88	10.00	8.83
	PR16+230	790.259	790.159	790.077	789.98	789.822	789.72	3.70	5.13	8.83	0.10	0.88	10.00	8.83
	PR16+240	790.177	790.077	789.995	789.89	789.740	789.64	3.70	5.13	8.83	0.10	0.88	10.00	8.83
	PR16+250	789.978	789.878	789.796	789.70	789.541	789.44	3.70	5.13	8.83	0.10	0.88	10.00	8.83
	PR16+260	789.605	789.505	789.463	789.36	789.269	789.17	3.70	4.92	8.62	0.10	0.86	10.00	8.73
	PR16+270	789.090	788.990	788.996	788.90	788.886	788.79	3.70	4.25	7.95	0.10	0.80	10.00	8.29
	PR16+280	788.441	788.341	788.395	788.29	788.349	788.25	3.70	3.66	7.36	0.10	0.74	10.00	7.66
	PR16+290	787.675	787.575	787.677	787.58	787.679	787.58	3.70	3.66	7.36	0.10	0.74	10.00	7.36
	PR16+300	786.888	786.788	786.942	786.84	786.992	786.89	3.97	3.66	7.63	0.10	0.76	10.00	7.50
	PR16+310	786.093	785.993	786.207	786.11	786.305	786.21	4.25	3.66	7.91	0.10	0.79	10.00	7.77
	PR16+320	785.291	785.191	785.489	785.39	785.635	785.54	4.93	3.67	8.60	0.10	0.86	10.00	8.26
	PR16+330	784.667	784.567	784.888	784.79	785.056	784.96	4.80	3.66	8.46	0.10	0.85	10.00	8.53
	PR16+340	784.199	784.099	784.420	784.32	784.588	784.49	4.80	3.66	8.46	0.10	0.85	10.00	8.46
	PR16+350	783.865	783.765	784.086	783.99	784.254	784.15	4.80	3.66	8.46	0.10	0.85	10.00	8.46
	PR16+360	783.664	783.564	783.885	783.78	784.053	783.95	4.80	3.70	8.50	0.10	0.85	10.00	8.48
	PR16+370	783.580	783.480	783.801	783.70	783.969	783.87	4.80	3.73	8.53	0.10	0.85	10.00	8.52
	PR16+380	783.513	783.413	783.734	783.63	783.902	783.80	4.80	3.73	8.53	0.10	0.85	10.00	8.53
	PR16+390	783.509	783.409	783.666	783.57	783.786	783.69	4.80	3.73	8.53	0.10	0.85	10.00	8.53
	PR16+400	783.519	783.419	783.599	783.50	783.663	783.56	4.21	3.73	7.94	0.10	0.79	10.00	8.24
	PR16+410	783.480	783.380	783.551	783.45	783.558	783.46	3.72	3.73	7.45	0.10	0.75	10.00	7.70
	PR16+420	783.562	783.462	783.632	783.53	783.584	783.48	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.44
	PR16+430	783.792	783.692	783.862	783.76	783.792	783.69	3.70	3.73	7.43	0.10	0.74	10.00	7.43
Subtotal														301.29
No Conformidad Acta de Obra Nº 43 (Mejoramiento PR 15+550 - PR 15+750)														-71.29
Box Coulvert (16+190)														-5.15
Box Coulvert (16+360)														-5.95
TOTAL														**218.90**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	m3	

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE IZQ	DIST. EJE DER	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 210-13	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135) **UNIDAD** m3

Localización	ABCISA			Ancho	Carril	Espesor	Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL	Long (m)							
Suministro e Instalación de Pedraplén Mejoramiento de Subrasante PR15+380 al PR15+490	PR 16+050		0.00	7.65	Corona	0.15	1.15	0.00	0.00	
	PR 16+050	PR 16+060	10.00	7.76	Corona	0.15	1.16	11.55	11.55	
	PR 16+060	PR 16+070	10.00	7.74	Corona	0.15	1.16	11.61	23.16	
	PR 16+070	PR 16+080	10.00	7.50	Corona	0.15	1.13	11.43	34.59	
	PR 16+080	PR 16+090	10.00	7.36	Corona	0.15	1.10	11.15	45.74	
	PR 16+090	PR 16+100	10.00	7.36	Corona	0.15	1.10	11.04	56.78	
	PR 16+100	PR 16+110	10.00	7.36	Corona	0.15	1.10	11.04	67.82	
	PR 16+110	PR 16+120	10.00	7.43	Corona	0.15	1.10	11.04	78.86	
	PR 16+120	PR 16+130	10.00	7.43	Corona	0.15	1.10	11.04	89.90	
	PR 16+130	PR 16+140	10.00	7.43	Corona	0.15	1.10	11.04	100.94	
	PR 16+140	PR 16+150	10.00	7.43	Corona	0.15	1.10	11.04	111.98	
	PR 16+150	PR 16+160	10.00	7.43	Corona	0.15	1.10	11.04	123.02	
	PR 16+160	PR 16+170	10.00	7.43	Corona	0.15	1.10	11.04	134.06	
	PR 16+170	PR 16+180	10.00	4.58	Corona	0.15	1.20	11.50	145.56	
	PR 16+180	PR 16+190	10.00	0.00	Corona	0.15	1.32	12.44	158.00	
	PR 16+190	PR 16+200	10.00	8.83	Corona	0.15	1.32	12.95	170.95	
	PR 16+200	PR 16+210	10.00	8.83	Corona	0.15	1.34	13.04	183.99	
	PR 16+210	PR 16+220	10.00	8.83	Corona	0.15	1.34	13.10	197.09	
	PR 16+220	PR 16+230	10.00	8.83	Corona	0.15	1.33	13.09	210.18	
	PR 16+230	PR 16+240	10.00	8.83	Corona	0.15	1.33	13.08	223.26	
	PR 16+240	PR 16+250	10.00	8.83	Corona	0.15	1.33	13.08	236.34	
	PR 16+250	PR 16+260	10.00	8.62	Corona	0.15	1.30	12.96	249.30	
	PR 16+260	PR 16+270	10.00	7.95	Corona	0.15	1.19	12.37	261.67	
	PR 16+270	PR 16+280	10.00	7.36	Corona	0.15	1.10	11.47	273.14	
	PR 16+280	PR 16+290	10.00	7.36	Corona	0.15	1.10	11.04	284.18	
	PR 16+290	PR 16+300	10.00	7.63	Corona	0.15	1.14	11.24	295.42	
	PR 16+300	PR 16+310	10.00	7.91	Corona	0.15	1.18	11.62	307.04	
	PR 16+310	PR 16+320	10.00	8.60	Corona	0.15	1.29	12.27	319.31	
	PR 16+320	PR 16+330	10.00	8.46	Corona	0.15	1.27	12.65	331.96	
	PR 16+330	PR 16+340	10.00	8.46	Corona	0.15	1.27	12.57	344.53	
	PR 16+340	PR 16+350	10.00	8.46	Corona	0.15	1.27	12.56	357.09	
	PR 16+350	PR 16+360	10.00	0.00	Corona	0.15	1.25	12.47	369.56	
	PR 16+360	PR 16+370	10.00	8.53	Corona	0.15	1.27	12.50	382.06	
	PR 16+370	PR 16+380	10.00	8.53	Corona	0.15	1.28	12.65	394.71	
	PR 16+380	PR 16+390	10.00	8.53	Corona	0.15	1.28	12.69	407.40	
	PR 16+390	PR 16+400	10.00	7.94	Corona	0.15	1.19	12.30	419.70	
	PR 16+400	PR 16+410	10.00	7.45	Corona	0.15	1.12	11.54	431.24	
	PR 16+410	PR 16+420	10.00	7.43	Corona	0.15	1.11	11.16	442.40	
	PR 16+420	PR 16+430	10.00	7.43	Corona	0.15	1.11	10.80	453.20	
			Subtotal						**453.20**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 15+960 - PR 15+974 Margen Izquierdo	PR 15+960		0.00	2.20	Izquierdo	0.55	1.21	0.00	0.00	
	PR 15+960	PR 15+970	10.00	2.20	Izquierdo	0.55	1.21	12.10	12.10	
	PR 15+970	PR 15+974	4.00	2.20	Izquierdo	0.55	1.21	4.84	16.94	
			Subtotal						**16.94**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 15+980 - PR 15+984 Margen Izquierdo	PR 15+980		0.00	2.00	Izquierdo	0.55	1.10	0.00	0.00	
	PR 15+980	PR 15+984	3.50	2.00	Izquierdo	0.55	1.10	3.85	3.85	
			Subtotal						**3.85**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 15+980 - PR 16+000 Margen Izquierdo	PR 15+980		0.00	4.80	Izquierdo	0.12	0.58	0.00	0.00	
	PR 15+980	PR 15+990	10.00	4.80	Izquierdo	0.12	0.58	5.76	5.76	
	PR 15+990	PR 16+000	10.00	4.80	Izquierdo	0.12	0.58	5.76	11.52	
			Subtotal						**11.52**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+120 - PR 16+140 Margen Izquierdo	PR 16+120		0.00	3.70	Izquierdo	0.08	0.30	0.00	0.00	
	PR 16+120	PR 16+130	10.00	3.70	Izquierdo	0.08	0.30	2.96	2.96	
	PR 16+130	PR 16+140	10.00	3.70	Izquierdo	0.08	0.30	2.96	5.92	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-13	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Long (m)	Ancho	Carril	Espesor	Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Subtotal									**5.92**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+370 - PR 16+410 Margen Izquierdo	PR 16+340		0.00	2.30	Izquierdo	0.50	1.15	0.00	0.00	
	PR 16+340	PR 16+347	7.00	2.30	Izquierdo	0.50	1.15	8.05	8.05	
	PR 16+347	PR 16+350	3.00	1.40	Izquierdo	0.50	0.70	2.78	10.83	
	PR 16+350	PR 16+355	5.00	1.40	Izquierdo	0.50	0.70	3.50	14.33	
Subtotal									**14.33**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+370 - PR 16+410 Margen Izquierdo	PR 16+370		0.00	4.50	Izquierdo	0.16	0.72	0.00	0.00	
	PR 16+370	PR 16+380	10.00	4.50	Izquierdo	0.16	0.72	7.20	7.20	
	PR 16+380	PR 16+390	10.00	4.50	Izquierdo	0.16	0.72	7.20	14.40	
	PR 16+390	PR 16+400	10.00	4.50	Izquierdo	0.16	0.72	7.20	21.60	
	PR 16+400	PR 16+410	10.00	4.50	Izquierdo	0.16	0.72	7.20	28.80	
Subtotal									**28.80**	
TOTAL									**534.56**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 2520213-261 CND


Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

								FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45					**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021					**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030					**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM NP 10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar					**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)		**UNIDAD**	M	

Localización		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Longitud total (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 15+187, Margen derecha	Muro y Aletas				5.40			5.40	
Subtotal								**5.40**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+115, Margen derecha	Muro y Aletas				5.45			5.45	
Subtotal								**5.45**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+013, Margen derecha	Muro y Aletas				5.35			5.35	
Subtotal								**5.35**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+250, Margen derecha	Muro y Aletas				5.30			5.30	
Subtotal								**5.30**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+410 Margen derecha	Muro y Aletas				5.20			5.20	
Subtotal								**5.20**	
Subtotal Presente Acta								**26.70**	
No Conformidad Acta Nº 43								**-16.84**	
TOTAL								**9.86**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202434261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 19202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	28 / 2 / 2025
SOPORTE ACTA No.	45		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY	
ITEM NP 19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD** m

Descripción	ABSCISA	Modulo	Pilote Nº	Acta	Long (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e instalación de camisa e=6mm d= 1,2m (No recuperable) Construcción de Muro de Contención (Caisson Armado) PR 15+842 - PR15 +878 Margen Derecho	PR15+877	Modulo 1	P1	Acta 38	6.00	
	PR15+867	Modulo 2	P5	Acta 38	6.00	
	PR15+863	Modulo 3	P7	Acta 38	6.00	
	PR15+860,47	Modulo 3	P8	Acta 38	6.00	
	PR15+858	Modulo 3	P9	Acta 38	6.00	
	PR 15+874	Modulo 1	P2	Acta 39	6.00	
	PR 15+871	Modulo 1	P3	Acta 39	6.00	
	PR 15+869	Modulo 2	P4	Acta 39	6.00	
	PR 15+865	Modulo 2	P6	Acta 39	6.00	
	PR 15+855	Modulo 4	P10	Acta 39	6.00	
	PR 15+853	Modulo 4	P11	Acta 39	6.00	
	PR 15+851	Modulo 4	P12	Acta 39	6.00	
	PR 15+848	Modulo 5	P13	Acta 39	6.00	
	PR 15+846	Modulo 5	P14	Acta 39	6.00	
	PR 15+843	Modulo 5	P15	Acta 39	6.00	
Subtotal					-90.00	
TOTAL					-90.00	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY	
ITEM NP 60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD** m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Modulo	Acta	VOLUMEN (M3)
Concreto 28 Mpa Zarpa de Cimentación (PR 15+878 - PR 15+842) Muro de contención Margen derecho	PR15+843	PR15+848	1	Acta 40	-12.24
	PR15+851	PR15+855	2	Acta 40	-12.24
	PR15+858	PR15+863	3	Acta 40	-12.24
	PR15+865	PR15+869	4	Acta 40	-12.24
	PR15+871	PR15+876	5	Acta 40	-12.24
Subtotal					**-61.20**
TOTAL					**-61.20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

									FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**					**UNIDAD EJECUTORA**			GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021					**DIRECCIÓN TERRITORIAL**			CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**			ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030					**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**			ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M						**FRENTE DE OBRA**		Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m	

Localización/Descripción	**Abscisa**	**Perno Nº**	**Coordenadas**		**Fila**	**Cota**	**Altura a rasante**	**Margen**	**Longitud (ml)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
			Norte	**Este**						
Pernos Pasivos Anclados PR 12+132 - PR 12+195.4 Fila 3 y 4 (Margen Derecho)	PR 12+178	P94	814807.238	880723.872	Fila 3	672.912	4.2	Derecho	15	
	PR 12+180	P95	814807.260	880726.379		673.029	4.2	Derecho	15	
	PR 12+181	P96	814806.964	880728.295		672.962	4.2	Derecho	15	
	PR 12+183	P97	814806.542	880730.064		672.967	4.2	Derecho	15	
	PR 12+185	P98	814805.882	880731.903		672.940	4.2	Derecho	15	
	PR 12+187	P99	814805.495	880733.880		672.933	4.2	Derecho	15	
	PR 12+188	P100	814804.941	880735.730		672.790	4.2	Derecho	15	
	PR 12+190	P101	814804.467	880737.462		672.665	4.2	Derecho	15	
	PR 12+134	P102	814835.114	880685.574		675.400	5.8	Derecho	15	
	PR 12+136	P103	814833.698	880686.813		675.277	5.8	Derecho	15	
	PR 12+138	P104	814832.186	880688.044		675.319	5.8	Derecho	15	
	PR 12+140	P105	814830.597	880689.259		675.388	5.8	Derecho	15	
	PR 12+142	P106	814829.471	880690.828		675.279	5.8	Derecho	15	
	PR 12+144	P107	814828.150	880692.134		675.404	5.8	Derecho	15	
	PR 12+145	P108	814826.945	880693.640		675.334	5.8	Derecho	15	
	PR 12+147	P109	814825.509	880695.052		675.241	5.8	Derecho	15	
	PR 12+149	P110	814824.378	880696.566		675.248	5.8	Derecho	15	
	PR 12+151	P111	814823.242	880697.956	Fila 4	675.214	5.8	Derecho	15	
	PR 12+155	P113	814820.681	880700.929		675.187	5.8	Derecho	15	
	PR 12+157	P114	814819.131	880702.837		675.089	5.8	Derecho	15	
	PR 12+159	P115	814818.091	880704.215		675.053	5.8	Derecho	15	
	PR 12+161	P116	814816.825	880705.939		674.863	5.8	Derecho	15	
	PR 12+163	P117	814815.770	880707.470		674.821	5.8	Derecho	15	
	PR 12+164	P118	814814.928	880709.119		675.012	5.8	Derecho	15	
	PR 12+166	P119	814813.963	880710.759		675.010	5.8	Derecho	15	
	PR 12+168	P120	814813.191	880712.555		674.938	5.8	Derecho	15	
	PR 12+170	P121	814812.368	880714.317		674.826	5.8	Derecho	15	
Subtotal									405	
TOTAL									**405.00**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP 59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135) **UNIDAD** m

Descripción	ABSCISA	Modulo	Pilote Nº	Acta	Long (m)
Suministro e instalación de camisa e=6mm d= 1,2m (No recuperable) Construcción de Muro de Contención (Caisson Armado) PR 15+842 - PR15 +878 Margen Derecho	PR15+877	Modulo 1	P1	Acta 38	6.00
	PR15+867	Modulo 2	P5	Acta 38	6.00
	PR15+863	Modulo 3	P7	Acta 38	6.00
	PR15+860,47	Modulo 3	P8	Acta 38	6.00
	PR15+858	Modulo 3	P9	Acta 38	6.00
	PR 15+874	Modulo 1	P2	Acta 39	6.00
	PR 15+871	Modulo 1	P3	Acta 39	6.00
	PR 15+869	Modulo 2	P4	Acta 39	6.00
	PR 15+865	Modulo 2	P6	Acta 39	6.00
	PR 15+855	Modulo 4	P10	Acta 39	6.00
	PR 15+853	Modulo 4	P11	Acta 39	6.00
	PR 15+851	Modulo 4	P12	Acta 39	6.00
	PR 15+848	Modulo 5	P13	Acta 39	6.00
	PR 15+846	Modulo 5	P14	Acta 39	6.00
	PR 15+843	Modulo 5	P15	Acta 39	6.00
Subtotal					**90.00**
TOTAL					**90.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

	FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP 60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)

UNIDAD	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Modulo	Acta	VOLUMEN (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Concreto 28 Mpa Zarpa de Cimentación (PR 15+878 - PR 15+842) Muro de contención Margen derecho	PR15+843	PR15+848	1	Acta 40	12.24	
	PR15+851	PR15+855	2	Acta 40	12.24	
	PR15+858	PR15+863	3	Acta 40	12.24	
	PR15+865	PR15+869	4	Acta 40	12.24	
	PR15+871	PR15+876	5	Acta 40	12.24	
Subtotal					**61.20**	
TOTAL					**61.20**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

							FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**					**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021					**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030					**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano					**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)		**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (M)	AREA SECCION (M2)	Acta	VOLUMEN (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Manual Zanjas de Coronación Taludes en Corte PR 10+627 - PR 10+870 Margen Derecho	PR10+696	PR10+736	40.00	0.35	40	14.00	
	PR10+627	PR10+696	78.50	0.35	41	27.48	
	PR10+828	PR10+870	43.00	0.35	44	15.05	
Subtotal						**56.53**	
TOTAL						**56.53**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP 62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)
			UNIDAD m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Modulo	Acta	VOLUMEN (M3)
Concreto 28 Mpa para Vastago (PR 15+878 - PR 15+842) Muro de contención Margen derecho	PR15+877	PR15+870	1	Acta 41	5.84
	PR15+870	PR15+863	2	Acta 41	5.87
	PR15+863	PR15+858	3	Acta 41	5.87
	PR15+858	PR15+849	4	Acta 41	5.84
	PR15+849	PR15+842	5	Acta 41	5.83
Subtotal					**29.25**
TOTAL					**29.25**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
38+848	38+848	6504	DERECHO	CABEZOTE DESCOLE	1.45	0.25		2.80	0.24	0.78	
38+848	38+848	6504	DERECHO	DEMOLICION ALETA			2.85	0.25		0.71	
38+848	38+848	6504	DERECHO	DEMOLICION ALETA			2.85	0.25		0.71	
39+188	39+188	6504	DERECHO	DEMOLICION CAJA	1.80	0.25		2.14	0.24	0.72	
39+188	39+188	6504	DERECHO	DEMOLICION CAJA	1.80	0.25		1.94		0.87	
39+188	39+188	6504	DERECHO	DEMOLICION CAJA	1.04	0.25		1.94		0.50	
39+188	39+188	6504	DERECHO	DEMOLICION CAJA	1.04	0.25		1.94	0.05	0.45	
39+188	39+188	6504	DERECHO	DEMOLICION CAJA	1.30	1.04		0.25		0.34	
										-	
TOTAL										**5.09**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

	FECHA	28 / 2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 201.13	Remocion de alcantarillas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan — **UNIDAD**

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
39+188	39+188	6504	DERECHO	TUBERIA EXISTENTE	1.00					1.00	
38+848	38+848	6504	DERECHO	TUBERIA EXISTENTE	5.00					5.00	
										-	
										-	
TOTAL										**6.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
39+174	39+202	6504	DERECHO	CORTE TALUD	28.00	1.83		3.00		153.72	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**153.72**	



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 211.13	Remoción de derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANTIDAD VIAJE (M3)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	DESCUENTO ACTA 23 PARA COBRO EN NP 51						- 196.00	
										-	
TOTAL										-196.00	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE DEL CAGUAN										
39+188	39+188	6504	DERECHO	EXCAVACION CAJA ALC			13.27	7.00	6.61	86.27
38+848	38+848	6504	DERECHO	EXCAVACION DESCOLE	3.90	2.47		1.70	4.75	11.62
38+848	38+848	6504	DERECHO	EXCAVACION DESCOLE			19.64	1.40	5.89	21.60
										-
TOTAL										**119.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE EL PAUJIL										
42+600	42+600	6503		ALETA IZQUIERDA LADO FLORENCIA	4.10	0.30		3.55		4.37
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE PUERTO RICO										
2+650	2+650	6504		ZAPATA MURO COSTADO DERECHO	11.00	2.40		0.30		7.92
2+650	2+650	6504		VASTAGO MURO COSTADO DERECHO	11.00	0.35		3.20	0.67	11.66
FRENTE SAN VICENTE										
39+188	39+188	6504	DERECHO	CAJA ENCOLE	1.70	1.70		0.25		0.72
38+848	38+848	6504	DERECHO	PLACA SOLERA DESCOLE			6.92	0.25		1.73
38+848	38+848	6504	DERECHO	DENTELLON DESCOLE	5.05	0.20		0.35		0.35
FRENTE LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	IZQUIERDO	ZAPATA ESTRIBO EJE 1	14.25	5.40		1.30		100.04
38+200	38+200	6503	IZQUIERDO	ZAPATA ESTRIBO EJE 2	14.25	5.40		1.30		100.04
38+200	38+200	6503	IZQUIERDO	ZAPATA ESTRIBO EJE 2	5.00	0.38		1.30		2.47
FRENTE PUERTO RICO										
3+325	3+325	6504	DERECHO	PLACA SOLERA DESCOLE			9.14	0.30		2.74
3+325	3+325	6504	DERECHO	DENTELLON DESCOLE	6.83	0.25		0.40		0.68
TOTAL										**232.72**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES PENDIENTES BOX CULVERT 4+800										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
4+800		6504		MURO DERECHO	5.01	0.45	4.24		9.56	
4+800		6504		ALETA DERECHA	3.39	0.45	2.65		4.04	
					0.50	0.45	2.90		0.65	
					1.83	0.45	1.45		1.19	
TOTAL									**15.45**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630.13	Concreto clase 21 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE PUERTO RICO										
PR 0+650	PR 0+650	6504	DERECHO	REALCE ALC	7.70	0.25		0.30		0.58
PR 0+650	PR 0+650	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	6.75	0.25		0.30		0.51
PR 0+730	PR 0+730	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	6.19	0.25		0.30		0.46
PR 0+730	PR 0+730	6504	DERECHO	REALCE ALC	7.20	0.25		0.30		0.54
PR 0+792	PR 0+792	6504	DERECHO	REALCE ALC	4.70	0.25		0.30		0.35
PR 0+792	PR 0+792	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	7.00	0.25		0.50		0.88
PR 0+946	PR 0+946	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	7.20	0.25		0.30		0.54
PR 1+102	PR 1+102	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	2.00	0.25		0.30		0.15
PR 1+205	PR 1+205	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	2.10	0.25		0.50		0.26
PR 1+484	PR 1+484	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	8.50	0.25		0.50		1.06
										-
										-
TOTAL										**5.33**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES ENERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
2+650	2+650	6504	IZQUIERDO	ATRAQUE TUBERIA MURO	1.60	1.60		0.55	0.76	0.65
2+650	2+650	6504	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA MURO	1.60	1.60		0.55	0.76	0.65
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
39+188	39+188	6504	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA ALC	2.75	1.60		0.55	1.31	1.11
39+188	39+188	6504	DERECHO	SOLADO TUBERIA ALC	2.75	1.60		0.20		0.88
39+188	39+188	6504	DERECHO	SOLADO CAJA ALC	1.80	1.80		0.05		0.16
38+848	38+848	6504	DERECHO	SOLADO TUBERIA ALC	5.75	1.60		0.20		1.84
38+848	38+848	6504	DERECHO	SOLADO ALETAS ENCOLE			6.95	0.05		0.35
38+848	38+848	6504	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA ALC	5.75	1.60		0.55	2.73	2.33
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
1+484	1+484	6504	IZQUIERDO	PIEDRA PEGADA PROTECCION TALUD BOX	4.00	3.00		0.05		0.60
0+730	0+730	6504	IZQUIERDO	RESANE MUROS ALC	4.00	1.75		0.03		0.21
										-
										-
TOTAL										**8.78**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
2+650	2+650	6504	DERECHO	ZAPATA FIG 1	0.994	#4	55.00	2.65		144.88	
2+650	2+650	6504	DERECHO	ZAPATA FIG 2	0.994	#4	99.00	2.65		260.78	
2+650	2+650	6504	DERECHO	ZAPATA FIG 7	0.994	#4	22.00	11.90		260.23	
2+650	2+650	6504	DERECHO	ZAPATA FIG 6	0.994	#4	41.00	3.75		152.83	
2+650	2+650	6504	DERECHO	ZAPATA FIG 3	0.994	#4	22.00	3.75		82.01	
2+650	2+650	6504	DERECHO	ZAPATA FIG 4	0.994	#4	19.00	2.50		47.22	
2+650	2+650	6504	DERECHO	ZAPATA FIG 5	0.994	#4	20.00	1.30		25.84	
2+650	2+650	6504	DERECHO	HORIZONTALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	3.37		6.70	
2+650	2+650	6504	DERECHO	HORIZONTALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	3.38		6.72	
2+650	2+650	6504	DERECHO	HORIZONTALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	3.27		6.50	
2+650	2+650	6504	DERECHO	HORIZONTALES VASTAGO	0.994	#4	18.00	11.56		206.83	
2+650	2+650	6504	DERECHO	HORIZONTALES VASTAGO	0.994	#4	8.00	7.35		58.45	
2+650	2+650	6504	DERECHO	VERTICALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	2.38		4.73	
2+650	2+650	6504	DERECHO	VERTICALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	2.32		4.61	
2+650	2+650	6504	DERECHO	VERTICALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	2.27		4.51	
2+650	2+650	6504	DERECHO	VERTICALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	2.32		4.61	
2+650	2+650	6504	DERECHO	VERTICALES VASTAGO	0.994	#4	2.00	2.47		4.91	
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 405	0.994	#4	160.00	2.40		381.70	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 407	0.994	#4	52.00	6.96		359.75	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 408	0.994	#4	4.00	3.20		12.72	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 410	0.994	#4	4.00	1.00		3.98	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 503	1.552	#5	73.00	9.25		1,047.99	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 504	1.552	#5	73.00	6.40		725.09	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 505	1.552	#5	10.00	5.90		91.57	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 506	1.552	#5	65.00	6.60		665.81	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 508	1.552	#5	10.00	5.40			
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 601	2.235	#6	96.00	7.20		1,544.83	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 603	2.235	#6	8.00	3.20		57.22	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 701	3.042	#7	87.00	5.30		1,402.67	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 801	3.973	#8	209.00	6.10		5,065.18	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 802	3.973	#8	81.00	3.90		1,255.07	
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 803	3.973	#8	88.00	2.20			
38+200	38+200	6503	EJE 2	FIG 501	1.552	#5	90.00	4.50		628.56	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
PR 0+650	PR 0+650	6504	DERECHO	REALCE ALC	0.56	#3	60.00	0.55		18.48	
PR 0+650	PR 0+650	6504	DERECHO	REALCE ALC	0.56	#3	4.00	0.95		2.13	
PR 0+650	PR 0+650	6504	DERECHO	REALCE ALC	0.994	#4	12.00	2.29		27.32	
PR 0+650	PR 0+650	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	54.00	0.55		16.63	
PR 0+650	PR 0+650	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	2.00	2.60		2.91	
PR 0+650	PR 0+650	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	8.00	3.77		29.98	
PR 0+730	PR 0+730	6504	DERECHO	REALCE ALC	0.56	#3	58.00	0.55		17.86	
PR 0+730	PR 0+730	6504	DERECHO	REALCE ALC	0.56	#3	4.00	0.95		2.13	
PR 0+730	PR 0+730	6504	DERECHO	REALCE ALC	0.994	#4	8.00	2.42		19.24	
PR 0+730	PR 0+730	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	61.00	0.55		18.79	
PR 0+730	PR 0+730	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	8.00	0.90		7.16	
PR 0+730	PR 0+730	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	4.00	5.750		22.86	
PR 0+792	PR 0+792	6504	DERECHO	REALCE MURO	0.56	#3	48.00	0.55		14.78	







PR 0+792	PR 0+792	6504	DERECHO	REALCE MURO	0.994	#4	4.00	4.90		19.48
PR 0+792	PR 0+792	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	62.00	0.63		21.87
PR 0+792	PR 0+792	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	12.00	2.20		26.24
PR 0+792	PR 0+792	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	8.00	1.90		15.11
PR 0+946	PR 0+946	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	57.00	0.55		17.56
PR 0+946	PR 0+946	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	20.00	1.56		31.01
PR 1+102	PR 1+102	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	22.00	0.55		6.78
PR 1+102	PR 1+102	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	4.00	2.24		8.91
PR 1+205	PR 1+205	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	22.00	0.75		9.24
PR 1+205	PR 1+205	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	6.00	2.20		13.12
PR 1+485	PR 1+485	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.56	#3	87.00	0.75		36.54
PR 1+485	PR 1+485	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	12.00	2.41		28.75
PR 1+485	PR 1+485	6504	IZQUIERDO	REALCE ALC	0.994	#4	6.00	4.05		24.15
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
1+344	1+357	6504	IZQUIERDO	CUNETA ENTREGA OBRA	0.994	#4	10.00	12.00		119.28
1+344	1+357	6504	IZQUIERDO	CUNETA ENTREGA OBRA	0.994	#4	128.00	0.90		114.51
1+285	1+301	6504	IZQUIERDO	CUNETA ENTREGA OBRA	0.994	#4	62.00	3.00		184.88
1+285	1+301	6504	IZQUIERDO	CUNETA ENTREGA OBRA	0.994	#4	96.00	0.90		85.88
1+285	1+301	6504	IZQUIERDO	CUNETA ENTREGA OBRA	0.994	#4	64.00	1.40		89.06
1+393	1+403	6504	IZQUIERDO	CUNETA ENTREGA OBRA	0.994	#4	10.00	8.50		84.49
1+393	1+403	6504	IZQUIERDO	CUNETA ENTREGA OBRA	0.994	#4	90.00	0.90		80.51
4+590	4+590	6504	IZQUIERDO	CUNETA CURVA	0.994	#4	100.00	3.00		298.20
4+590	4+590	6504	IZQUIERDO	CUNETA CURVA	0.994	#4	320.00	0.90		286.27
4+620	4+620	6504	IZQUIERDO	CUNETA CURVA	0.994	#4	90.00	3.00		268.38
4+620	4+620	6504	IZQUIERDO	CUNETA CURVA	0.994	#4	288.00	0.90		257.64
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+325	3+325	6504	DERECHO	PLACA SOLERA Y DENTELLON						735.51
										-
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
38+848	38+848	6504	DERECHO	DESCOLE ALC						516.81
39+188	39+188	6504	DERECHO	CAJA ALC						549.70
TOTAL										**18654.64**







FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ACTA	VARILLA No	KG/ML	LONGITUD (M)	CANT	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)	REGISTRO FOTOGRAFICO
ACEROS DE CUNETAS FALTANTES EN ACTAS 36, 39 Y 40									
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO									
2+081 AL 2+117 CI	CUNETA	36	#4	0.994	6.00	107.94		643.75	
TOTAL								**643.75**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente	

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	FRENTE DE OBRA	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan		UNIDAD	M3

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FIGURA	VARILLA No	KG/ML	LONGITUD (M)	CANT	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDAD DE ACERO NO COBRADO BOX 4+800 RN 6504									
ACERO ALETAS ENCOLE									
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	15	#6	2.235	6.4	4.00		57.22	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	16	#5	1.552	5.2	4.00		32.28	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	17	#5	1.552	2.15	64.00		213.56	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	18	#5	1.552	3.7	60.00		344.54	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	19	#5	1.552	1.9	48.00		141.54	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	20	#6	2.235	4.85	26.00		281.83	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	21	#6	2.235	5	36.00		402.30	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	22	#8	3.973	6	14.00		333.73	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	23	#8	3.973	6.85	28.00		762.02	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	24	#4	0.994	2.2	49.00		107.15	
4+800	ACERO ALETA ENCOLE	25	#4	0.994	5.7	8.00		45.33	

ACERO MEDIO CUERPO								
4+800	MEDIO CUERPO BOX	1	#6	2.235	6.80	132.00		2,006.14
4+800	MEDIO CUERPO BOX	2	#6	2.235	6.40	132.00		1,888.13
4+800	MEDIO CUERPO BOX	3	#4	0.994	1.80	152.00		271.96
4+800	MEDIO CUERPO BOX	4	#5	1.552	4.70	33.00		240.72
4+800	MEDIO CUERPO BOX	5	#5	1.552	7.90	33.00		404.61
4+800	MEDIO CUERPO BOX	6	#5	1.552	5.80	58.00		522.09
4+800	MEDIO CUERPO BOX	7	#5	1.552	7.90	58.00		711.13
4+800	MEDIO CUERPO BOX	8	#5	1.552	7.00	33.00		358.51
4+800	MEDIO CUERPO BOX	9	#5	1.552	5.10	4.00		31.66
4+800	MEDIO CUERPO BOX	10	#5	1.552	7.80	14.50		175.53
4+800	MEDIO CUERPO BOX	11	#5	1.552	4.20	14.50		94.52
4+800	MEDIO CUERPO BOX	12	#5	1.552	6.00	29.00		270.05
4+800	MEDIO CUERPO BOX	13	#3	0.560	2.10	30.00		35.28
4+800	MEDIO CUERPO BOX	14	#4	0.994	5.80	4.00		23.06
SUBTOTAL								**9754.88**
DESCUENTO ACTA 25								**4103.38**
TOTAL								**5651.50**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES ENERO										
FRENTE PUERTO RICO										
2+650	2+650	6504	IZQUIERDO	MURO DE CONTENCION	2.00					2.00
2+650	2+650	6504	DERECHO	MURO DE CONTENCION	2.00					2.00
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE SAN VICENTE										
39+188	39+188	6504	DERECHO	TUBERIA ALCANTARILLA	3.00					3.00
38+848	38+848	6504	DERECHO	TUBERIA ALCANTARILLA	6.00					6.00
TOTAL										**13.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 671.13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
0+730	0+730	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA			4.71	0.20		0.94
				BORDILLOS	6.65	0.20		0.25		0.33
				DESCOLE CUNETA	1.90	1.93		0.20		0.73
				DESCOLE CUNETA			9.27	0.20		1.85
0+792	0+792	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA			6.41	0.20		1.28
				BORDILLOS	7.90	0.20		0.25		0.40
				DESCOLE CUNETA	2.02	2.19		0.20		0.88
				DESCOLE CUNETA			7.23	0.20		1.45
0+946	0+946	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA			4.94	0.20		0.99
				BORDILLOS	6.49	0.20		0.25		0.32
				DESCOLE CUNETA			4.67	0.20		0.93
				DESCOLE CUNETA			5.50	0.20		1.10
0+968	0+968	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA			2.71	0.20		0.54
				BORDILLOS	5.60	0.20		0.25		0.28
				DESCOLE CUNETA	1.99	1.51		0.20		0.60
				DESCOLE CUNETA			5.77	0.20		1.15
1+100	1+100	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA			3.55	0.20		0.71
				BORDILLOS	6.17	0.20		0.25		0.31
				DESCOLE CUNETA	2.00	0.83		0.20		0.33
				DESCOLE CUNETA			6.05	0.20		1.21
1+205	1+205	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA			3.09	0.20		0.62
				BORDILLOS	3.55	0.20		0.25		0.18
				DESCOLE CUNETA	2.00	0.40		0.20		0.16
				DESCOLE CUNETA			2.87	0.20		0.57
1+290	1+290	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA			6.78	0.20		1.36
				BORDILLOS	12.89	0.20		0.25		0.64
				DESCOLE CUNETA	1.22	1.00		0.20		0.24
				DESCOLE CUNETA	3.74	1.48		0.20		1.11
				DESCOLE CUNETA			2.39	0.20		0.48
				DESCOLE CUNETA			4.28	0.20		0.86
				DESCOLE CUNETA	6.05	1.20		0.20		1.45
1+350	1+350	6504	IZQUIERDO	BORDILLOS	11.05	0.20		0.25		0.55
				DESCOLE CUNETA	12.35	1.20		0.20		2.96
				DESCOLE CUNETA	4.55	0.97		0.20		0.88
				BORDILLOS	4.55	0.20		0.25		0.23
1+397	1+397	6504	IZQUIERDO	BORDILLOS	13.60	0.20		0.25		0.68
				DESCOLE CUNETA	8.70	1.20		0.20		2.09
				DESCOLE CUNETA	1.10	4.80		0.20		1.06
1+397	1+397	6504	IZQUIERDO	BORDILLOS	10.20	0.20		0.25		0.51
				DESCOLE CUNETA	6.10	1.46		0.20		1.78
1+542	1+547	6504	IZQUIERDO	CUNETA	12.55		0.2487			3.12
1+579	1+590	6504	IZQUIERDO	CUNETA	12.50		0.2487			3.11
2+958	2+964	6504	IZQUIERDO	CUNETA	12.60		0.2487			3.13
4+591	4+620	6504	IZQUIERDO	CUNETA	29.15		0.2487			7.25
4+620	4+646	6504	IZQUIERDO	CUNETA	25.88		0.2487			6.44
TOTAL										**57.81**

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 671.13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FALTANTES EN ACTAS 2024										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE DEL CAGUAN										
43+451	43+511	6504	Derecho	cuneta	60.00		0.249	No cobrado en acta 35 abril	14.92	
44+732	44+768	6504	Izquierdo	cuneta sobre muro	36.00		0.249	No cobrado en acta 39 agosto	8.95	
44+559	44+608	6504	Izquierdo	cuneta	49.00		0.249	No cobrado en acta 41 octubre		
42+042	42+148	6504	Izquierdo	cuneta	106.00		0.249	No cobrado en acta 39 agosto	26.36	
42+156	42+220	6504	Izquierdo	cuneta	64.00		0.249	No cobrado en acta 39 agosto	15.92	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+689	3+758	6504	Derecho	cuneta	69.00		0.249	No cobrado en acta 37 junio	17.16	
TOTAL									**83.31**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de cien mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100m).	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
TRANSPORTES FEBRERO										
FRENTE SAN VICENTE										
CORTE TALUD PARA CAJA ALC		PR 38+848	PR 05+300	33.55	0.10	33.45	14.00		468.27	
TOTAL									**468.27**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera (6504)	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
RELLENO MURO DE CONTENCION	2+650	2+650	PR 02+650	PR 05+300	2.65			53.08		140.70	
TOTAL										**140.70**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
2+650	2+650	6504	IZQUIERDO	RELLENO MURO	8.00	3.50		1.95	1.52	53.08
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**53.08**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	45	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m

PR INICIAL	PR FINAL	Acta	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	Long Acum (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL											
Pilote 1 PR52+800		Acta 24				7.00				7.00	
Pilote 9 PR52+800		Acta 24				5.27				12.27	
Pilote 13 PR52+800		Acta 24				6.30				18.57	
Pilote 10 PR52+800		Acta 25				4.92				23.49	
Pilote 11 PR52+800		Acta 25				3.85				27.34	
Pilote 2 PR52+800		Acta 25				9.44				36.78	
Pilote 8 PR52+800		Acta 25				7.00				43.78	
Pilote 5 PR52+800		Acta 26				9.60				53.38	
Pilote 7 PR52+800		Acta 26				7.00				60.38	
Pilote 6 PR52+800		Acta 26				5.11				65.49	
Pilote 12 PR52+800		Acta 26				7.00				72.49	
Pilote 4 PR52+800		Acta 26				7.00				79.49	
Pilote 3 PR52+800		Acta 26				7.00				86.49	
Pilote 5 PR52+800		Acta 27				- 9.60				76.89	
Pilote 7 PR52+800		Acta 27				- 7.00				69.89	
Pilote 6 PR52+800		Acta 27				- 5.11				64.78	
Pilote 12 PR52+800		Acta 27				- 7.00				57.78	
Pilote 4 PR52+800		Acta 27				- 7.00				50.78	
Pilote 3 PR52+800		Acta 27				- 7.00				43.78	
Pilote 10 PR52+800		Acta 27				- 4.92				38.86	
Pilote 11 PR52+800		Acta 27				- 6.80				32.06	
Pilote 2 PR52+800		Acta 27				- 9.44				22.62	
Pilote 5 PR52+800		Acta 28				9.60				32.22	
Pilote 7 PR52+800		Acta 28				7.00				39.22	
Pilote 6 PR52+800		Acta 28				5.11				44.33	
Pilote 12 PR52+800		Acta 28				7.00				51.33	
Pilote 4 PR52+800		Acta 28				7.00				58.33	
Pilote 3 PR52+800		Acta 28				7.00				65.33	
Pilote 10 PR52+800		Acta 28				4.92				70.25	
Pilote 11 PR52+800		Acta 28				6.80				77.05	
Pilote 2 PR52+800		Acta 28				9.44				86.49	
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
CIMENTACION PUENTE LAS DELICIAS PR 38+200 RUTA 6503	38+200 Eje 1 Pilote 1	Acta 40				8.18				94.67	
	38+200 Eje 1 Pilote 2	Acta 40				8.55				103.22	
	38+200 Eje 1 Pilote 3	Acta 40				9.00				112.22	
TOTAL										-112.22	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
2+650	2+650	6504	IZQUIERDO	GEODREN MURO	6.90					6.90
										-
TOTAL										**6.90**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoría

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	28	2	2025

SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
2+650	2+650	6504	IZQUIERDO	GEODREN MURO	8.00			1.80		14.40
										-
TOTAL										**14.40**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
NP 51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANTIDAD VIAJE (M3)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA					Remoción De Palizada cobrada en acta 23	196.00	
									-	
TOTAL									**196.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m

PR INICIAL	PR FINAL	Acta	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	Long (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL											
Pilote 1 PR52+800		Acta 24				7.00				7.00	
Pilote 9 PR52+800		Acta 24				5.27				12.27	
Pilote 13 PR52+800		Acta 24				6.30				18.57	
Pilote 10 PR52+800		Acta 25				4.92				23.49	
Pilote 11 PR52+800		Acta 25				3.85				27.34	
Pilote 2 PR52+800		Acta 25				9.44				36.78	
Pilote 8 PR52+800		Acta 25				7.00				43.78	
Pilote 5 PR52+800		Acta 26				9.60				53.38	
Pilote 7 PR52+800		Acta 26				7.00				60.38	
Pilote 6 PR52+800		Acta 26				5.11				65.49	
Pilote 12 PR52+800		Acta 26				7.00				72.49	
Pilote 4 PR52+800		Acta 26				7.00				79.49	
Pilote 3 PR52+800		Acta 26				7.00				86.49	
Pilote 5 PR52+800		Acta 27				- 9.60				76.89	
Pilote 7 PR52+800		Acta 27				- 7.00				69.89	
Pilote 6 PR52+800		Acta 27				- 5.11				64.78	
Pilote 12 PR52+800		Acta 27				- 7.00				57.78	
Pilote 4 PR52+800		Acta 27				- 7.00				50.78	
Pilote 3 PR52+800		Acta 27				- 7.00				43.78	
Pilote 10 PR52+800		Acta 27				- 4.92				38.86	
Pilote 11 PR52+800		Acta 27				- 6.80				32.06	
Pilote 2 PR52+800		Acta 27				- 9.44				22.62	
Pilote 5 PR52+800		Acta 28				9.60				32.22	
Pilote 7 PR52+800		Acta 28				7.00				39.22	
Pilote 6 PR52+800		Acta 28				5.11				44.33	
Pilote 12 PR52+800		Acta 28				7.00				51.33	
Pilote 4 PR52+800		Acta 28				7.00				58.33	
Pilote 3 PR52+800		Acta 28				7.00				65.33	
Pilote 10 PR52+800		Acta 28				4.92				70.25	
Pilote 11 PR52+800		Acta 28				6.80				77.05	
Pilote 2 PR52+800		Acta 28				9.44				86.49	
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
CIMENTACION PUENTE LAS DELICIAS PR 38+200 RUTA 6503	38+200 Eje 1 Pilote 1	Acta 40				8.18				94.67	
	38+200 Eje 1 Pilote 2	Acta 40				8.55				103.22	
	38+200 Eje 1 Pilote 3	Acta 40				9.00				112.22	
TOTAL										**112.22**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	28	2	2025
SOPORTE ACTA No.	**45**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO									
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO									
0+650	0+650	6504	DERECHO			64.00		64.00	
0+650	0+650	6504	IZQUIERDO			60.00		60.00	
0+730	0+730	6503	DERECHO			26.00		26.00	
TOTAL								**150.00**	


FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

PR 16+050.000




Cota Subrasante: 785.667 m

PR 16+050

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.30	0.00	0.00
Pedraplen	1.15	0.00	0.00

PR 16+060.000




Cota Subrasante: 786.070 m

PR 16+060

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.33	23.10	23.10
Pedraplen	1.16	11.55	11.55

PR 16+070.000




Cota Subrasante: 786.350 m

PR 16+070

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.32	23.23	46.32
Pedraplen	1.16	11.61	23.16

PR 16+080.000




Cota Subrasante: 786.612 m

PR 16+080

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.25	22.86	69.18
Pedraplen	1.13	11.43	34.59

PR 16+090.000




Cota Subrasante: 786.875 m

PR 16+090

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.30	91.48
Pedraplen	1.10	11.15	45.74

PR 16+100.000



Cota Subrasante: 787.159 m

PR 16+100

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	113.56
Pedraplen	1.10	11.04	56.78

PR 16+110.000



Cota Subrasante: 787.487 m

PR 16+110

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	135.64
Pedraplen	1.10	11.04	67.82

PR 16+120.000



Cota Subrasante: 787.858 m

PR 16+120

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	157.72
Pedraplen	1.10	11.04	78.86

PR 16+130.000



Cota Subrasante: 788.272 m

PR 16+130

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	179.79
Pedraplen	1.10	11.04	89.90

PR 16+140.000

Cota Subrasante: 788.709 m

PR 16+140

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	201.87
Pedraplen	1.10	11.04	100.93

PR 16+150.000

Cota Subrasante: 789.145 m

PR 16+150

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	223.95
Pedraplen	1.10	11.04	111.97

PR 16+160.000

Cota Subrasante: 789.581 m

PR 16+160


Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	246.02
Pedraplen	1.10	11.04	123.01

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL DE CANTIDADES MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (Excavación y Pedraplen)
PR16+050 - PR16+430

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Subrasante
- Excavación Proyectada
- Corona de Pedraplen
- Área de Corte
- Pedraplen

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA


REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.

ESCALAS: 1:200
FECHA: FEBRERO DE 2025
ARCHIVO:

PLANCHA: 1 DE 4

PR 16+170.000




Cota Subrasante: 789.996 m

PR 16+170

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.08	268.10
Pedraplen	1.10	11.04	134.05

PR 16+180.000




Cota Subrasante: 790.265 m

PR 16+180

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.40	23.00	291.10
Pedraplen	1.20	11.50	145.55

PR 16+190.000




Cota Subrasante: 790.367 m

PR 16+190

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.64	24.92	316.02
Pedraplen	1.32	12.44	157.99

PR 16+200.000




Cota Subrasante: 790.323 m

PR 16+200

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.64	25.93	341.95
Pedraplen	1.32	12.95	170.94

PR 16+210.000




Cota Subrasante: 790.257 m

PR 16+210

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.67	26.08	368.03
Pedraplen	1.34	13.04	183.98

PR 16+220.000




Cota Subrasante: 790.191 m

PR 16+220

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.67	26.19	394.22
Pedraplen	1.34	13.10	197.08

PR 16+230.000




Cota Subrasante: 790.126 m

PR 16+230

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.67	26.18	420.40
Pedraplen	1.33	13.09	210.17

PR 16+240.000




Cota Subrasante: 790.042 m

PR 16+240

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.67	26.16	446.56
Pedraplen	1.33	13.08	223.25

PR 16+250.000




Cota Subrasante: 789.840 m

PR 16+250

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.66	26.15	472.71
Pedraplen	1.33	13.08	236.32

PR 16+260.000




Cota Subrasante: 789.504 m

PR 16+260

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.59	25.92	498.63
Pedraplen	1.30	12.96	249.28

PR 16+270.000




Cota Subrasante: 789.034 m

PR 16+270

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.38	24.74	523.37
Pedraplen	1.19	12.37	261.65

PR 16+280.000



Cota Subrasante: 788.431 m

PR 16+280


Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.94	546.31
Pedraplen	1.10	11.47	273.12

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL DE CANTIDADES MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (Excavación y Pedraplen)
PR16+050 - PR16+430

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Subrasante
- Excavación Proyectada
- Corona de Pedraplen
- Área de Corte
- Pedraplen

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 2 DE 4

PR 16+290.000




Cota Subrasante: 787.712 m

PR 16+290

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	22.09	568.40
Pedraplen	1.10	11.04	284.17

PR 16+300.000




Cota Subrasante: 786.977 m

PR 16+300

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.29	22.49	590.89
Pedraplen	1.14	11.24	295.41

PR 16+310.000




Cota Subrasante: 786.243 m

PR 16+310

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.37	23.25	614.13
Pedraplen	1.18	11.62	307.03

PR 16+320.000




Cota Subrasante: 785.527 m

PR 16+320

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.57	24.55	638.68
Pedraplen	1.29	12.27	319.31

PR 16+330.000




Cota Subrasante: 784.928 m

PR 16+330

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.54	25.30	663.98
Pedraplen	1.27	12.65	331.96

PR 16+340.000



Cota Subrasante: 784.462 m

PR 16+340

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.54	25.14	689.12
Pedraplen	1.27	12.57	344.53

PR 16+350.000

Cota Subrasante: 784.131 m

PR 16+350

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.54	25.13	714.24
Pedraplen	1.27	12.56	357.09

PR 16+360.000

Cota Subrasante: 783.934 m

PR 16+360

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.53	25.09	739.33
Pedraplen	1.25	12.47	369.56

PR 16+370.000

Cota Subrasante: 783.849 m

PR 16+370

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.55	25.15	764.49
Pedraplen	1.27	12.50	382.06

PR 16+380.000

Cota Subrasante: 783.782 m

PR 16+380

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.56	25.30	789.78
Pedraplen	1.28	12.65	394.71

PR 16+390.000

Cota Subrasante: 783.714 m

PR 16+390

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.55	25.38	815.17
Pedraplen	1.28	12.69	407.41

PR 16+400.000

Cota Subrasante: 783.648 m

PR 16+400


Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.38	24.61	839.78
Pedraplen	1.19	12.30	419.71

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL DE CANTIDADES MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (Excavación y Pedraplen)
PR16+050 - PR16+430

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Subrasante
- Excavación Proyectada
- Corona de Pedraplen
- Área de Corte
- Pedraplen

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA


REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Obra
Ing.
MP.

ESCALAS: 1:200
FECHA: FEBRERO DE 2025
ARCHIVO:

PLANCHA: 3 DE 4

PR 16+410.000




Cota Subrasante: 783.603 m

PR 16+410

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.24	23.07	862.85
Pedraplen	1.12	11.54	431.25

PR 16+420.000




Cota Subrasante: 783.689 m

PR 16+420

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.23	22.32	885.17
Pedraplen	1.11	11.16	442.41

PR 16+429.689



Cota Subrasante: 783.912 m

PR 16+430

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.23	21.60	906.77
Pedraplen	1.11	10.80	453.21

Consorcio
Vias Nacionales
del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO

DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL DE CANTIDADES MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (Excavación y Pedraplen)
PR16+050 - PR16+430

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Subrasante
- Excavación Proyectada
- Corona de Pedraplen
- Área de Corte
- Pedraplen

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.


CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Obra
Ing.
MP.

ESCALAS:	1:200	PLANCHA: 4 DE 4
FECHA:	FEBRERO DE 2025	
ARCHIVO:		

PR 16+130.000




Cota Excavación
Subrasante: m

PR 16+130

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.00	0.00	0.00

PR 16+140.000




Cota Excavación
Subrasante: 789.210 m

PR 16+140

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	5.85	29.26	29.26

PR 16+150.000




Cota Excavación
Subrasante: 789.640 m

PR 16+150

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	7.62	67.35	96.60

PR 16+160.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.080 m

PR 16+160

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	19.34	134.81	231.42

PR 16+170.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.500 m

PR 16+170

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	19.28	193.15	424.56

PR 16+180.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.770 m

PR 16+180

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	14.13	168.34	592.90

PR 16+190.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.870 m

PR 16+190

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.01	71.77	664.67

PR 16+200.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.820 m

PR 16+200

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.00	0.07	664.74

PR 16+210.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.760 m

PR 16+210

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	6.66	34.15	698.89

PR 16+220.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.690 m

PR 16+220

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	9.18	80.88	779.78

PR 16+230.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.630 m

PR 16+230

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	6.25	78.96	858.74

PR 16+240.000



Cota Excavación
Subrasante: 790.539 m

PR 16+240

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.16	32.92	891.66

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL DE CANTIDADES CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (Excavación)
PR16+130 - PR16+430

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

Terreno Natural

Subrasante

Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:

Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:

Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:

Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ:

Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 1 DE 3

PR 16+250.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.349 m

PR 16+250

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.96	5.13	896.78

PR 16+260.000




Cota Excavación
Subrasante: 790.008 m

PR 16+260

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	3.84	23.95	920.74

PR 16+270.000




Cota Excavación
Subrasante: 789.547 m

PR 16+270

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.02	29.60	950.34

PR 16+280.000




Cota Excavación
Subrasante: 788.937 m

PR 16+280

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	1.53	17.79	968.13

PR 16+290.000




Cota Excavación
Subrasante: 788.226 m

PR 16+290

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	3.18	23.53	991.66

PR 16+300.000




Cota Excavación
Subrasante: 787.486 m

PR 16+300

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.49	28.44	1020.09

PR 16+310.000




Cota Excavación
Subrasante: 786.756 m

PR 16+310

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	1.76	21.52	1041.62

PR 16+320.000




Cota Excavación
Subrasante: 786.037 m

PR 16+320

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.78	12.90	1054.52

PR 16+330.000




Cota Excavación
Subrasante: 785.437 m

PR 16+330

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	1.49	11.39	1065.91

PR 16+340.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.968 m

PR 16+340

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.53	10.14	1076.05

PR 16+350.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.639 m

PR 16+350

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	1.41	9.64	1085.69

PR 16+360.000



Cota Excavación
Subrasante: 784.429 m

PR 16+360

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	1.04	12.18	1097.87

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL DE CANTIDADES CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (Excavación)
PR16+130 - PR16+430

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

Terreno Natural

Subrasante

Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 2 DE 3

PR 16+370.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.350 m

PR 16+370

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	1.16	10.93	1108.80

PR 16+380.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.280 m

PR 16+380

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.21	16.34	1125.14

PR 16+390.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.219 m

PR 16+390

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	2.99	25.43	1150.57

PR 16+400.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.150 m

PR 16+400

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	1.02	19.80	1170.37

PR 16+410.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.100 m

PR 16+410

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.51	7.61	1177.98

PR 16+420.000




Cota Excavación
Subrasante: 784.181 m

PR 16+420

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.42	4.67	1182.65

PR 16+429.926



Cota Excavación
Subrasante: 784.410 m

PR 16+430


Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavación	0.01	2.15	1184.80

Consorcio
Vías Nacionales
del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL DE CANTIDADES CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (Excavación)
PR16+130 - PR16+430

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

Terreno Natural

Subrasante

Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 3 DE 3

PR 15+550.000




Cota Rasante: 742.539 m

PR 15+550

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.39	0.00	0.00

PR 15+560.000

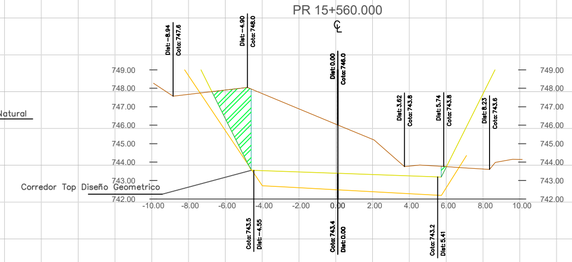


Cota Rasante: 743.394 m

PR 15+560

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	4.88	33.41	33.41

PR 15+570.000




Cota Rasante: 744.259 m

PR 15+570

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	4.22	48.68	82.09

PR 15+580.000

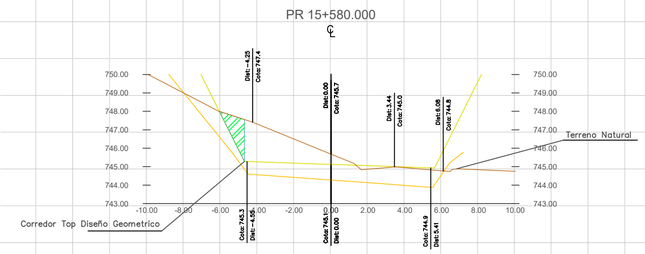


Cota Rasante: 745.125 m

PR 15+580

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.54	30.83	112.92

PR 15+590.000

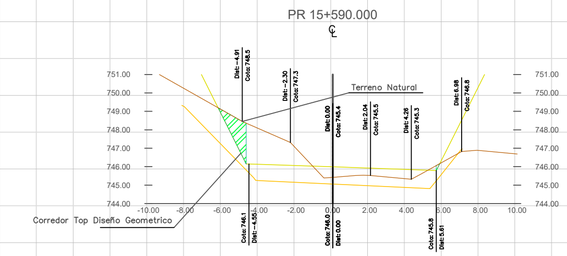


Cota Rasante: 745.991 m

PR 15+590

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.69	17.26	130.18

PR 15+600.000

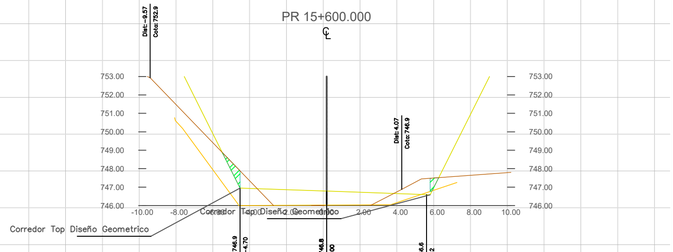


Cota Rasante: 746.786 m

PR 15+600

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.66	12.39	142.56

PR 15+610.000




Cota Rasante: 747.442 m

PR 15+610

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.07	3.68	146.24

PR 15+620.000

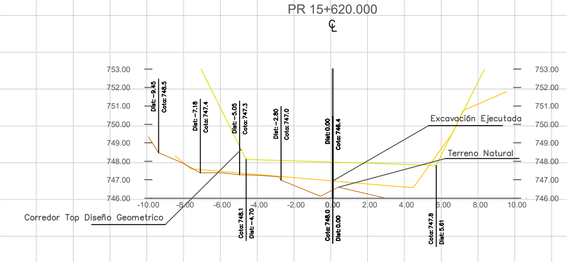


Cota Rasante: 747.957 m

PR 15+620

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.33	146.57

PR 15+630.000

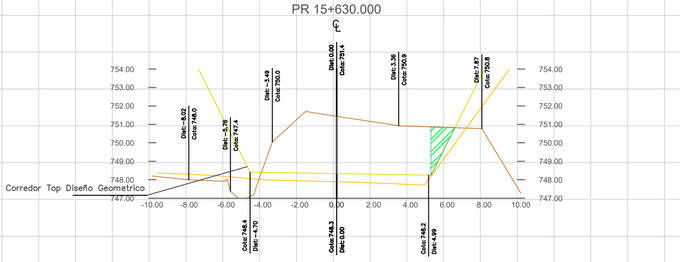


Cota Rasante: 748.332 m

PR 15+630

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.71	8.17	154.74

PR 15+640.000

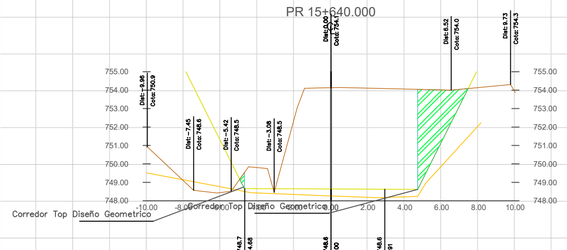


Cota Rasante: 748.638 m

PR 15+640

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	7.43	45.22	199.96

PR 15+650.000

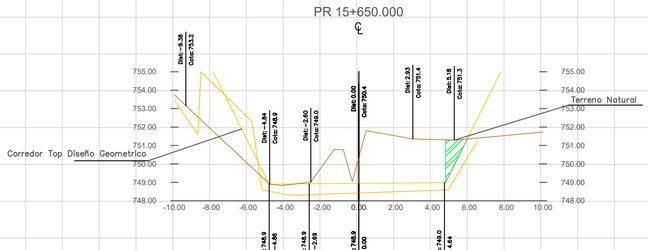


Cota Rasante: 748.944 m

PR 15+650

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.35	44.47	244.43

PR 15+660.000

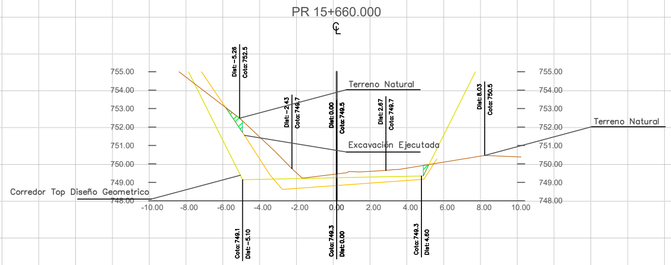

Cota Rasante: 749.250 m

PR 15+660

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.39	8.87	253.30

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 1 DE 12


PR 15+670.000

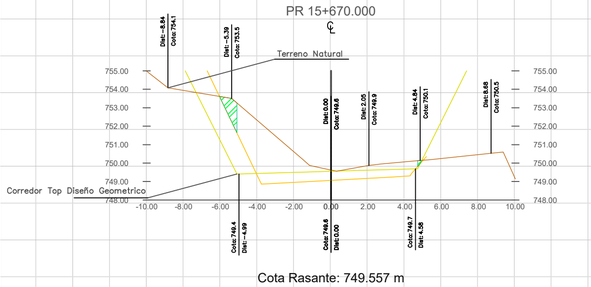

Cota Rasante: 749.557 m

PR 15+670			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.87	6.01	259.32


PR 15+680.000

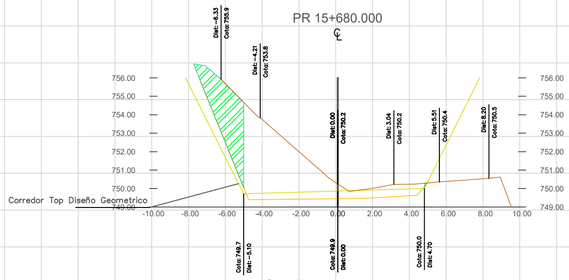

Cota Rasante: 749.863 m

PR 15+680			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	6.94	36.71	296.03


PR 15+690.000

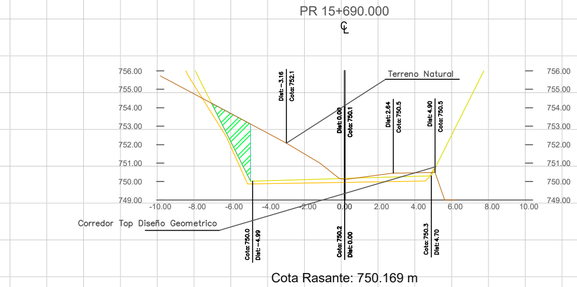

Cota Rasante: 750.169 m

PR 15+690			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	3.29	48.08	344.11


PR 15+700.000

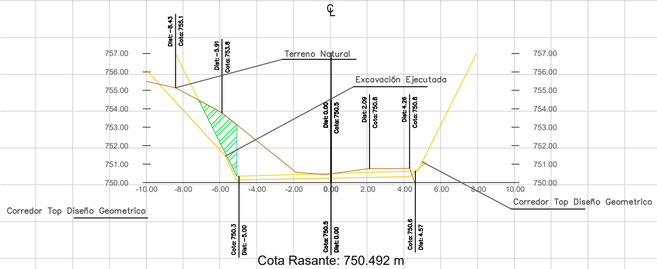

Cota Rasante: 750.492 m

PR 15+700			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	3.02	29.73	373.84


PR 15+710.000

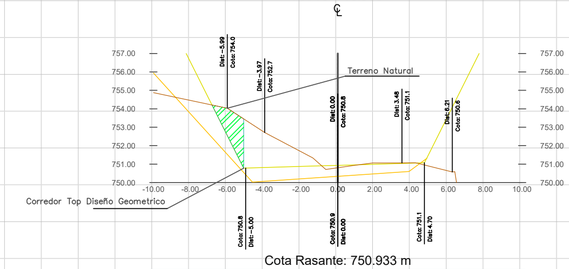

Cota Rasante: 750.933 m

PR 15+710			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	2.45	25.80	399.64


PR 15+720.000

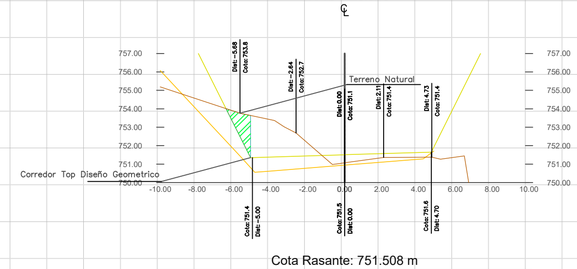

Cota Rasante: 751.508 m

PR 15+720			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	1.49	18.63	418.27


PR 15+730.000



Cota Rasante: 752.219 m

PR 15+730			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	1.25	13.15	431.42


PR 15+740.000



Cota Rasante: 753.064 m

PR 15+740			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.52	8.67	440.09


PR 15+750.000



Cota Rasante: 754.043 m

PR 15+750			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.45	4.83	444.92


PR 15+760.000



Cota Rasante: 755.141 m

PR 15+760			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.39	4.27	449.19


PR 15+770.000



Cota Rasante: 756.256 m

PR 15+770			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.75	5.93	455.12

PR 15+780.000



Cota Rasante: 757.370 m

PR 15+780			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	3.99	459.11

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCION	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 2 DE 12

PR 15+790.000




Cota Rasante: 758.484 m

PR 15+790

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.03	0.18	459.29

PR 15+800.000




Cota Rasante: 759.598 m

PR 15+800

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.18	459.46

PR 15+810.000




Cota Rasante: 760.712 m

PR 15+810

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.00	459.46

PR 15+820.000

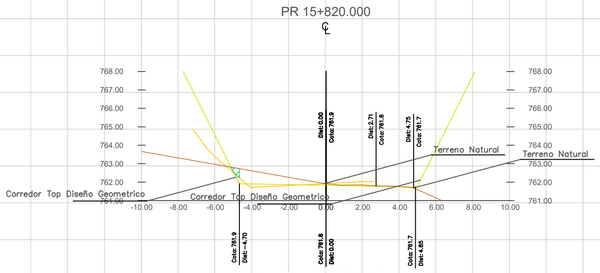


Cota Rasante: 761.827 m

PR 15+820

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.14	0.72	460.18

PR 15+830.000

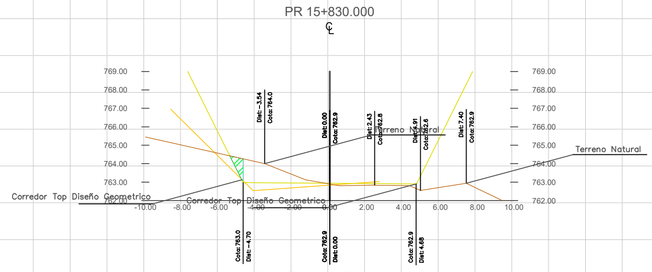


Cota Rasante: 762.940 m

PR 15+830

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.46	3.03	463.21

PR 15+840.000

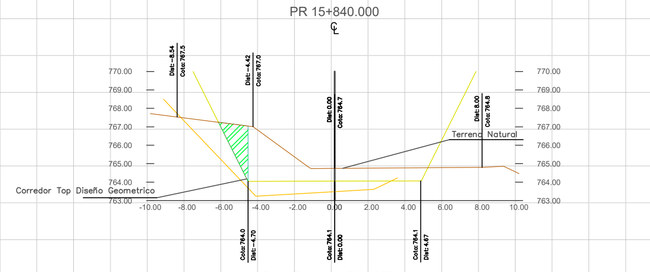


Cota Rasante: 764.055 m

PR 15+840

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	2.40	14.32	477.54

PR 15+850.000

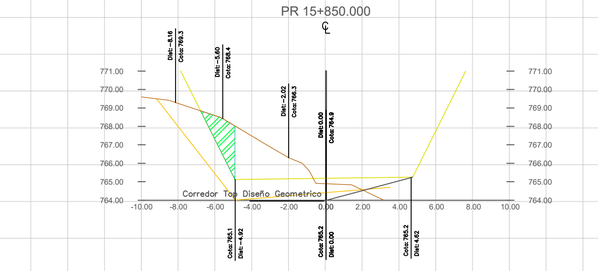


Cota Rasante: 765.184 m

PR 15+850

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	2.81	25.70	503.24

PR 15+860.000

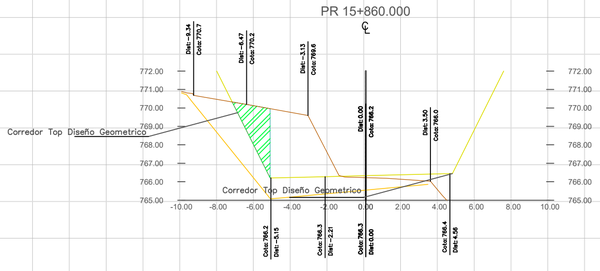


Cota Rasante: 766.328 m

PR 15+860

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	3.87	31.86	535.10

PR 15+870.000

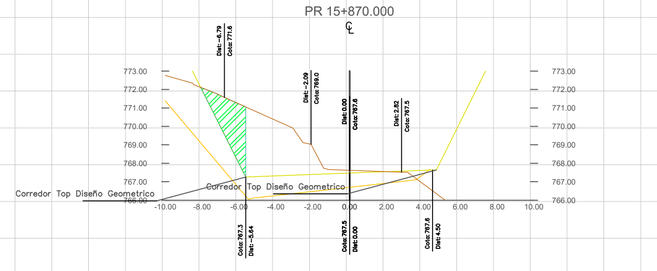


Cota Rasante: 767.471 m

PR 15+870

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	4.67	39.10	574.20

PR 15+880.000

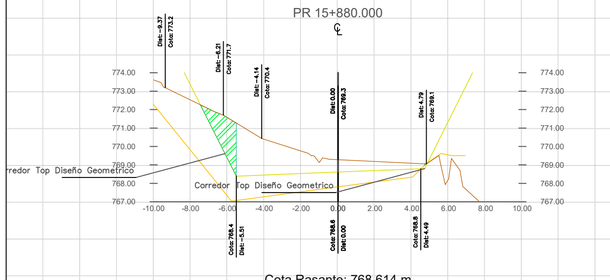


Cota Rasante: 768.614 m

PR 15+880

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	2.87	33.72	607.92

PR 15+890.000

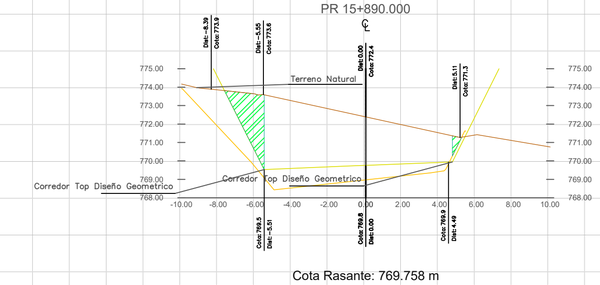


Cota Rasante: 769.758 m

PR 15+890

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	4.62	33.83	641.75

PR 15+900.000

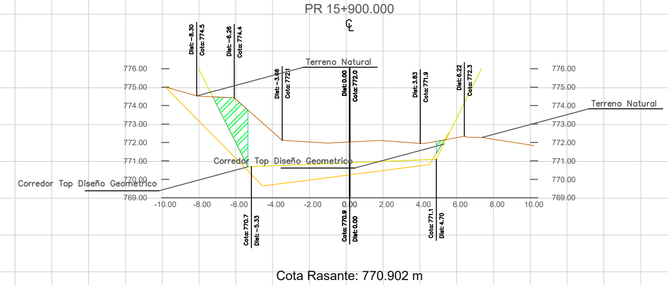

Cota Rasante: 770.902 m

PR 15+900

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	3.45	36.54	678.29

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 3 DE 12

PR 15+910.000




Cota Rasante: 772.045 m

PR 15+910

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.25	21.75	700.05

PR 15+920.000




Cota Rasante: 773.189 m

PR 15+920

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.80	9.86	709.91

PR 15+930.000




Cota Rasante: 774.332 m

PR 15+930

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.85	8.16	718.07

PR 15+940.000




Cota Rasante: 775.475 m

PR 15+940

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.65	7.42	725.49

PR 15+950.000




Cota Rasante: 776.576 m

PR 15+950

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.40	4.98	730.48

PR 15+960.000




Cota Rasante: 777.678 m

PR 15+960

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.32	3.24	733.71

PR 15+970.000




Cota Rasante: 778.780 m

PR 15+970

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.02	1.49	735.20

PR 15+980.000




Cota Rasante: 779.881 m

PR 15+980

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.03	0.25	735.45

PR 15+990.000




Cota Rasante: 780.983 m

PR 15+990

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.14	0.76	736.20

PR 16+000.000




Cota Rasante: 782.084 m

PR 16+000

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.37	2.25	738.46

PR 16+010.000




Cota Rasante: 783.167 m

PR 16+010

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.42	3.66	742.12

PR 16+020.000



Cota Rasante: 784.128 m

PR 16+020

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.69	5.35	747.47

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercotor	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ: _____ Residente de Interventoría Ing. MP.

APROBÓ: _____ Director de Interventoría Ing. MP.

CONTRATISTA

REVISÓ: _____ Residente de Obra Ing. MP.

APROBÓ _____ Director de Obra Ing. MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 4 DE 12

PR 16+030.000




Cota Rasante: 784.948 m

PR 16+030

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.26	4.74	752.21

PR 16+040.000




Cota Rasante: 785.629 m

PR 16+040

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.41	3.36	755.57

PR 16+050.000




Cota Rasante: 786.170 m

PR 16+050

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	2.11	12.31	767.88

PR 16+060.000




Cota Rasante: 786.572 m

PR 16+060

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.14	15.66	783.54

PR 16+070.000




Cota Rasante: 786.852 m

PR 16+070

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.36	7.22	790.76

PR 16+080.000




Cota Rasante: 787.114 m

PR 16+080

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.20	2.79	793.55

PR 16+090.000




Cota Rasante: 787.377 m

PR 16+090

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.39	3.00	796.55

PR 16+100.000




Cota Rasante: 787.661 m

PR 16+100

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.31	3.50	800.05

PR 16+110.000




Cota Rasante: 787.990 m

PR 16+110

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.17	2.41	802.45

PR 16+120.000




Cota Rasante: 788.361 m

PR 16+120

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.02	0.93	803.38

PR 16+130.000




Cota Rasante: 788.775 m

PR 16+130

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.23	1.22	804.60

PR 16+140.000



Cota Rasante: 789.212 m

PR 16+140

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.53	3.79	808.39

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercotor	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 5 DE 12

PR 16+150.000




Cota Rasante: 789.648 m

PR 16+150

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.35	9.40	817.79

PR 16+160.000




Cota Rasante: 790.084 m

PR 16+160

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	2.62	19.83	837.62

PR 16+170.000




Cota Rasante: 790.498 m

PR 16+170

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	2.66	26.71	864.33

PR 16+180.000




Cota Rasante: 790.766 m

PR 16+180

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.37	20.89	885.22

PR 16+190.000




Cota Rasante: 790.867 m

PR 16+190

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	7.40	892.62

PR 16+200.000




Cota Rasante: 790.822 m

PR 16+200

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.00	892.62

PR 16+210.000




Cota Rasante: 790.756 m

PR 16+210

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.16	0.89	893.51

PR 16+220.000




Cota Rasante: 790.691 m

PR 16+220

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.90	894.41

PR 16+230.000




Cota Rasante: 790.626 m

PR 16+230

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.13	0.71	895.12

PR 16+240.000




Cota Rasante: 790.543 m

PR 16+240

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.70	895.82

PR 16+250.000




Cota Rasante: 790.343 m

PR 16+250

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.01	895.83

PR 16+260.000



Cota Rasante: 790.008 m

PR 16+260

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.13	0.69	896.52

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCION	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ: Residente de Interventoría Ing. MP.

APROBÓ: Director de Interventoría Ing. MP.

CONTRATISTA

REVISÓ: Residente de Obra Ing. MP.

APROBÓ: Director de Obra Ing. MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 6 DE 12

PR 16+270.000




Cota Rasante: 789.539 m

PR 16+270

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.01	0.73	897.25

PR 16+280.000




Cota Rasante: 788.937 m

PR 16+280

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.04	0.24	897.49

PR 16+290.000




Cota Rasante: 788.218 m

PR 16+290

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.42	2.26	899.75

PR 16+300.000




Cota Rasante: 787.483 m

PR 16+300

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	2.11	901.86

PR 16+310.000




Cota Rasante: 786.748 m

PR 16+310

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.01	901.87

PR 16+320.000




Cota Rasante: 786.031 m

PR 16+320

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.01	0.03	901.90

PR 16+330.000




Cota Rasante: 785.432 m

PR 16+330

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.01	0.09	901.99

PR 16+340.000




Cota Rasante: 784.965 m

PR 16+340

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.01	0.11	902.10

PR 16+350.000




Cota Rasante: 784.633 m

PR 16+350

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.01	0.12	902.22

PR 16+360.000




Cota Rasante: 784.434 m

PR 16+360

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.08	902.30

PR 16+370.000




Cota Rasante: 784.350 m

PR 16+370

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.00	902.30

PR 16+380.000



Cota Rasante: 784.283 m

PR 16+380

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.00	902.30

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ: Residente de Interventoría Ing. MP.

APROBÓ: Director de Interventoría Ing. MP.

CONTRATISTA

REVISÓ: Residente de Obra Ing. MP.

APROBÓ: Director de Obra Ing. MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 7 DE 12


PR 16+390.000



Cota Rasante: 784.215 m

PR 16+390			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	902.30


PR 16+400.000



Cota Rasante: 784.148 m

PR 16+400			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	902.30


PR 16+410.000



Cota Rasante: 784.102 m

PR 16+410			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	902.30


PR 16+420.000



Cota Rasante: 784.185 m

PR 16+420			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.04	0.20	902.49


PR 16+430.000



Cota Rasante: 784.417 m

PR 16+430			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.20	902.69


PR 16+440.000



Cota Rasante: 784.798 m

PR 16+440			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	902.69


PR 16+450.000



Cota Rasante: 785.327 m

PR 16+450			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	902.69


PR 16+460.000



Cota Rasante: 786.006 m

PR 16+460			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	902.69


PR 16+470.000



Cota Rasante: 786.833 m

PR 16+470			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	902.69


PR 16+480.000



Cota Rasante: 787.808 m

PR 16+480			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.01	0.03	902.72


PR 16+490.000



Cota Rasante: 788.912 m

PR 16+490			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.03	902.75

PR 16+500.000



Cota Rasante: 790.034 m

PR 16+500			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.02	902.77

Consorcio
Vias Nacionales
del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercotor	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 46.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 8 DE 12

PR 16+510.000




Cota Rasante: 791.156 m

PR 16+510

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.66	3.61	906.38

PR 16+520.000




Cota Rasante: 792.217 m

PR 16+520

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	3.60	909.99

PR 16+530.000

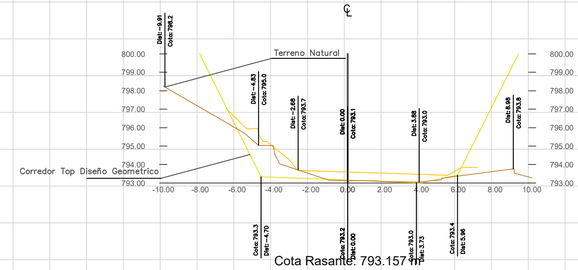


Cota Rasante: 793.157 m

PR 16+530

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.00	909.99

PR 16+540.000




Cota Rasante: 793.978 m

PR 16+540

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.21	1.14	911.13

PR 16+550.000




Cota Rasante: 794.740 m

PR 16+550

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	1.14	912.27

PR 16+560.000




Cota Rasante: 795.502 m

PR 16+560

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.00	912.27

PR 16+570.000




Cota Rasante: 796.265 m

PR 16+570

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.27	1.35	913.61

PR 16+580.000




Cota Rasante: 797.027 m

PR 16+580

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.04	1.54	915.15

PR 16+590.000




Cota Rasante: 797.788 m

PR 16+590

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.26	1.46	916.61

PR 16+600.000




Cota Rasante: 798.550 m

PR 16+600

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.04	6.61	923.22

PR 16+610.000




Cota Rasante: 799.312 m

PR 16+610

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.65	8.78	932.00

PR 16+620.000



Cota Rasante: 800.074 m

PR 16+620

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	2.48	16.43	948.43

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES (Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ: _____ Residente de Interventoría Ing. MP.

APROBÓ: _____ Director de Interventoría Ing. MP.

CONTRATISTA

REVISÓ: _____ Residente de Obra Ing. MP.

APROBÓ: _____ Director de Obra Ing. MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 9 DE 12

PR 16+630.000




Cota Rasante: 800.836 m

PR 16+630

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.06	13.11	961.54

PR 16+640.000

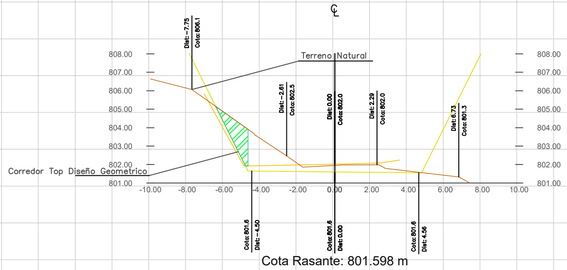


Cota Rasante: 801.598 m

PR 16+640

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.96	10.26	971.80

PR 16+650.000




Cota Rasante: 802.360 m

PR 16+650

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.66	17.89	989.69

PR 16+660.000




Cota Rasante: 803.122 m

PR 16+660

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.40	9.28	998.98

PR 16+670.000




Cota Rasante: 803.885 m

PR 16+670

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.07	1.86	1000.83

PR 16+680.000




Cota Rasante: 804.648 m

PR 16+680

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.91	3.32	1004.15

PR 16+690.000




Cota Rasante: 805.411 m

PR 16+690

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.33	4.07	1008.23

PR 16+700.000




Cota Rasante: 806.175 m

PR 16+700

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	1.48	6.25	1014.48

PR 16+710.000




Cota Rasante: 806.938 m

PR 16+710

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.12	6.42	1020.90

PR 16+720.000




Cota Rasante: 807.700 m

PR 16+720

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.01	0.61	1021.50

PR 16+730.000




Cota Rasante: 808.462 m

PR 16+730

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	0.05	1021.55

PR 16+740.000



Cota Rasante: 809.224 m

PR 16+740


Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.06	0.34	1021.89

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ: Residente de Interventoría Ing. MP.

APROBÓ: Director de Interventoría Ing. MP.

CONTRATISTA

REVISÓ: Residente de Obra Ing. MP.

APROBÓ: Director de Obra Ing. MP.


ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 10 DE 12


PR 16+750.000



Cota Rasante: 809.998 m

PR 16+750			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.32	1022.21


PR 16+760.000



Cota Rasante: 810.843 m

PR 16+760			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	1022.21


PR 16+770.000



Cota Rasante: 811.770 m

PR 16+770			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.00	0.00	1022.21


PR 16+780.000



Cota Rasante: 812.778 m

PR 16+780			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.24	1.27	1023.48


PR 16+790.000



Cota Rasante: 813.868 m

PR 16+790			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	1.08	7.00	1030.49


PR 16+800.000



Cota Rasante: 815.026 m

PR 16+800			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	1.23	12.26	1042.74


PR 16+810.000



Cota Rasante: 816.195 m

PR 16+810			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	1.56	14.42	1057.16


PR 16+820.000



Cota Rasante: 817.364 m

PR 16+820			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	1.36	14.58	1071.74


PR 16+830.000

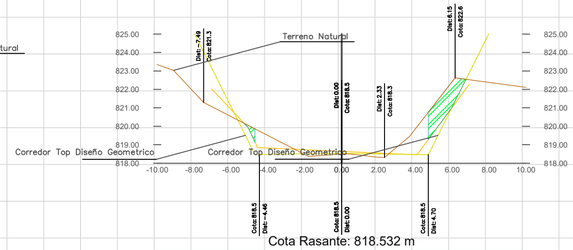

Cota Rasante: 818.532 m

PR 16+830			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	2.62	19.88	1091.62


PR 16+840.000



Cota Rasante: 819.701 m

PR 16+840			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	1.00	18.07	1109.69


PR 16+850.000



Cota Rasante: 820.870 m

PR 16+850			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.44	7.18	1116.88

PR 16+860.000



Cota Rasante: 822.039 m

PR 16+860			
Material	**Área Sección (m2)**	**Volumen Sección (m3)**	**Volumen Acumulado (m3)**
Excavacion	0.40	4.21	1121.08

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercotor	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.


APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.

ESCALAS: 1:200

FECHA: FEBRERO DE 2025

ARCHIVO:

PLANCHA: 11 DE 12

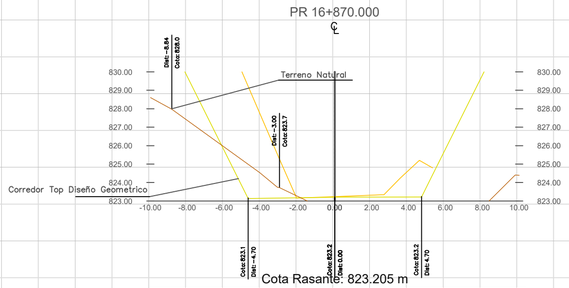

PR 16+870

Material	Área Sección (m2)	Volumen Sección (m3)	Volumen Acumulado (m3)
Excavacion	0.00	2.02	1123.10

Consorcio
Vias Nacionales
del Sur y Oriente

INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN NACIONAL DEL ESTUDIO



LOCALIZACIÓN MUNICIPAL DEL ESTUDIO



DATOS GEODÉSICOS

PROYECCION CARTOGRAFICA		SISTEMA DE REFERENCIA	
PROYECCIÓN	Tronverse Mercator	DATUM	Magna Sirgas
ORIGEN	Bogotá Magna	ELIPSOIDE	GSR–80 – WGS–84
FALSO NORTE	1000000.000	SEMI–EJE MAYOR	6378137
FALSO ESTE	1000000.000	ACHATAMIENTO	1/298.2572229329
LATITUD DE ORIGEN	04° 35' 48.32150" grados Norte	UNIDAD DE MEDIDA	Metro Internacional
LONGITUD DE ORIGEN	74° 04' 39.02850" grados Oeste		

CONTIENE

CONTROL CONFORMACIÓN DE LÍNEA DE TALUDES
(Excavación)
PR15+550 - PR16+870

NOTAS

CONVENCIONES TEMÁTICAS

- Terreno Natural
- Corredor Top de Diseño Geométrico
- Excavación Ejecutada
- Área de Corte

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA

REVISÓ:
Residente de Interventoría
Ing.
MP.

APROBÓ:
Director de Interventoría
Ing.
MP.

CONTRATISTA

REVISÓ:
Residente de Obra
Ing.
MP.

APROBÓ
Director de Obra
Ing.
MP.

ESCALAS:	1:200	PLANCHA:
FECHA:	FEBRERO DE 2025	12 DE 12
ARCHIVO:		

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA | PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 45 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: (Indicar con una X) | Resolución N°: (Indicar N° de Resolución, mes y año) | NO LICENCIADO (PMA o PAGA): X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN Y VISIÓN 2030"

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO: 991 DE 2021 | FECHA DE INICIO: 29/04/2023 | FECHA DE TERMINACION: 31/08/2030

N° CONTRATO: 985 DE 2021 | FECHA DE INICIO: 19/04/2023 | FECHA DE TERMINACION: 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	399,567,436,436.00
Valor Adicional No.	$	9,903,330,230.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	409,472,966,666.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3,102,123,540.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3,102,123,540.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 314,788,196.00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2,787,335,344.00

AIU %	30%
M %	0.0%

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	33,499,973,249.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	33,499,973,249.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _2_ Fecha 12/09/2024: CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2530 de 2022 tramo Neiva Bateillas Ruta 3001: Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2.76 hectareas**, lo anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 6 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,663			$ 264,059,083					$ 0.00		$ 0		$ 0		3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Bateillas Ruta 3001: El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen al menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	3036.00	$ 41,738,125		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Bateillas Ruta 3001: Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal -Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600					$ 0.00		$ 0		$ 0		8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Bateillas Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses, 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675					$ 0.00		$ 0		$ 0		300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para tala con factor de compresación de 1:2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección de trámite de 20 permisos de ocupacion de cauce rula 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos árboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 : Como medida compensatoria **se deberá realizar la siembra durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o productoras -** productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 **Se deberá instalar 1 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alto, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919					$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
			ARTICULO CUARTO Resolución 1881 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional **con el aporte de 20 aspersores mínimos manguales tanque voyorker,** para lo cual se deberá concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0						$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** rula **6504**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
			Proyección Permiso de aprovechaminato forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compresación de 1:4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
			Proyección Permiso de aprovechaminato forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
			Proyección Permiso de aprovechaminato forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615					$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA:	28 (Día) febrero (Mes) 2025 (Año)

DAGA 1.3- 03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimeinto y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)	X	6000	u	$ 86,345	$ 518,070,000	$ 3,785,896	$ 521,855,896	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	6000	u	$ 13,648	$ 81,888,000	$ 598,412	$ 82,486,412	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**	X	1	global	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 219,231	$ 30,219,231	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compnesación de 1:5)	X	260	u	$ 86,345	$ 22,449,700	$ 164,056	$ 22,613,756	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	260	u	$ 13,648	$ 3,548,480	$ 25,931	$ 3,574,411	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 14,615	$ 2,014,615	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con fcator de compnesación de 1:5)	X	375	u	$ 86,345	$ 32,379,375	$ 236,619	$ 32,615,994	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	375	u	$ 13,648	$ 5,118,000	$ 37,401	$ 5,155,401	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 18,269	$ 2,518,269	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente riecito Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos criticos que a la fecha no se han identificado	X	1	global	$ 224,503,223	$ 224,503,223	$ 1,640,600	$ 226,143,823	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.	X	2000	u	$ 2,600	$ 5,200,000	$ 38,000	$ 5,238,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.	X	1	u	$ 14,488,045	$ 14,488,045	$ 105,874	$ 14,593,919	$ 0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0
			Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0673 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergecnia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caqueta ARTICULO QUINTO	X	1000	u	$ 2,600	$ 2,600,000	$ 19,000	$ 2,619,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000

			ARTICULO CUARTO. Resolución 1683 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 **suspenzi** 20 el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caqueta de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional con el **aporte de 20 salarios minimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación			X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0		$ 26,000,000.00	$ 0			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	20.00	$ 26,000,000		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2000 arboles por cada permiso Resolución 1555 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce batea provisional PR38+200, artículo cuarto, numeral 23.			X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	25.00	$ 364,847,979		
						X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)			X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	240.00	$ 20,874,236		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**			X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	240.00	$ 3,299,456		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**			X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	1.00	$ 2,014,615		
			Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**			X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	8.00	$ 19,380,600		
						X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	2.00	$ 5,630,850		
								SUBTOTAL		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,027,995,876.00**			**$ 22,127,662.00**		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,050,123,540.00**			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 314,788,197.00**		**$ 2,787,335,343.00**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
ANDIA CUEZA CARRASCO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-64184 CND

Vo. Bo. Firma:
CARLOS ALBERTO CADEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: MP AFB5110086675

Vo. Bo. Firma:
YENY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 19238-233357 CAU

Original: Archivo del Gestor del SIVOGE
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	45	FECHA	28	02	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	5									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL.($)	REEMBOLSO	PORCENTAJE	FIJO	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND					X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 417,461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1,000,000	$ 4,000,000		X			$ 4,760,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 445,109	$ 3,460,558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND					X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 436,871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1,500,000	$ 6,000,000		X			$ 7,140,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7,140,000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2,500,000	$ 10,000,000		X			$ 11,900,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11,900,000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1,200,000	$ 24,000,000		X			$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 722,009	$ 27,837,991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND					X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 144,165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND					X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 123,570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100,000	$ 140	$ 14,000,000		X			$ 16,660,000			2.50%	$ -	$ -	300	$ 102,975	$ 16,289,290	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lasificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18,000	$ 18,000,000		X			$ 21,420,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 21,420,000	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43,600	$ 52,320,000		X			$ 62,260,800			2.50%	$ -	$ -	1	$ 226,545	$ 61,941,578	
Información y Divulgación	Cuñas radiales						X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 92,678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100,000	$ 8,000,000		X			$ 9,520,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 353,204	$ 8,255,467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND					X						2.50%	$ -	$ -	2	$ 370,710		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND					X						2.50%	$ -	$ -	3	$ 540,619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8,000	$ 24,000,000		X			$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28,560,000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	45	FECHA	28	02	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,171,032				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 25,744				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,310,872				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 585,413				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 695,075				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 849,801				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1,400,000	$ 140,000,000	X		$ 166,600,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,171,341	$ 158,533,254			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 406,751				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 247,140				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,603,578				

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	45	FECHA	28	02	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 276,807			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 196,167			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 227,472			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 151,064			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 275,973			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 101,945			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 18,536			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 84,954			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 152,300			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 498,228			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 540,052			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 656,466			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 308,925			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$	500,000	$ 50,000,000	X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 874,258			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND					X		$ 59,500,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 453,090	$ 51,781,925		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Otra:**	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Caquetá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 140,046				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 836,157				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 875,288				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 597,255				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 298,628				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 154,463				
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250,207,815	$ 3,252,701,600	X		$ 3,870,714,904			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,870,714,904			
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2,716,026	$ 2,716,026	X		$ 3,232,071			2.50%	$ -	$ -	1	$ 2,796,828	$ 435,243			
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75,000,000	$ 75,000,000	X		$ 89,250,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 89,250,000			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	45	FECHA	28 / 02 / 2025	(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Otra:**	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Caquetá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL PERIODO DE ABRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA: 5 DICIEMBRE 2023										
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REEM**	**ITEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	**OBSERVACIONES**
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 4,357,520,212	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 22,557,563
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4,380,077,775	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0.52%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Aníbal Ojeda Carriazo** ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Ríos ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 120

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2025, 16:17
Expedición	20/03/2025, 16:20
Vencimiento	19/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 45- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	SERVICIO	1.00	739,270,635.42	0 %	0.00	710,439,080.42
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	147,854,126.00	0 %	0.00	147,854,126.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	36,963,532.00	0 %	0.00	36,963,532.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	36,963,531.58	19 %	7,023,071.00	43,986,602.58

Total items: 4

Valor en Letras: Novecientos treinta y nueve millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-19 por $ 939,243,341.00

Total Bruto	961,051,825.00
Descuentos	28,831,555.00
Subtotal	932,220,270.00
IVA 19%	7,023,071.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**939,243,341.00**

Observaciones: PERIODO FEBRERO 2025
IVA 19% EJECUCION OBRA: $7.023.071
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00%: $ 28.831.555
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE Nº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS- PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240812 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 20546690da2bf4e69f1b19092657f6755e051ef6cb0e79724691c5e48c9e362f4bab51c021951badcb82c9b1e551b5aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 45

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		11	3	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		12	4	2025
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 45 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: FEBRERO 2025 IVA 19% EJECUCION OBRA : $7.023.071 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 28.831.555	739.270.635

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

SUBTOTAL		739.270.635,00
ADMINISTRAC	**20%**	147.854.126,00
IMPREVISTOS	**5%**	36.963.532,00
UTILIDAD	**5%**	36.963.532,00
IVA		7.023.071,00
TOTAL FACTURA		**968.074.896,00**
RETE IVA		-
RETE ICA		-
RETE FUENTE		-
AMORT. ANT	**3,00000%**	28.831.555,00
RETE GARAN.		
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		**939.243.341,00**

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**
