Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**13**			FECHA:	**22**	de	**JULIO**	de	**2025**		
PERIODO: DEL	1		JUNIO	de	2025	AL	11	de	JUNIO	de	2025
CONTRATO No:	**3230**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150318**						

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGÜI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se ubica en el corredor vial que conduce de Moniquirá al municipio de Togüi, en el departamento de Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA


NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **NIT 900.916.608-4**	**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR - CC.52.461.611**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO MONIQUIRA **NIT 901.740.222-1**	**JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01, Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3230 DE 2023	$ 175,669,652.93	03 MESES
2	ADICIONAL EN VALOR N°2 Y PRORROGA No. 2	$ 11,763,392.61	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 187,433,045.54	04 MESES Y DIEZ (10) DIAS

VALOR INICIAL:	**$ 361,963,536.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 187,433,045.54**	VALOR TOTAL:	**$ 549,396,581.54**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**7**	de	**DICIEMBRE**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**11**	de	**JUNIO**	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE AVANCE CTO INTERV.	**100.00%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**100.00%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**100.00%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA						
No PÓLIZA	CSC-100035562	3/12/2024	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	17	3	2025	12	12	2025	$ 109,879,316.31
PRESTACIONES SOCIALES	17	3	2025	12	6	2028	$ 27,469,829.08
CALIDAD DEL SERVICIO	12	6	2025	12	6	2030	$ 109,879,316.31

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	8	4	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	5	12	2024
ACTA DE REINICIO 1	19	12	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN 2	17	3	2025
ACTA PRORROGA 1 DE SUSPENSIÓN 2	2	4	2025
ACTA DE PRORROGA 2 DE SUSPENSIÓN 2	22	4	2025
ACTA DE REINICIO 2	30	4	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
Verificación de actividades ejecutadas en obra	K4+090-K6+270
RevisiÛn de documentaciÛn entregada por el contratista	N/A
VerificaciÛn de afiliaciones del personal a seguridad social	N/A
Registro diario en bitacora de obra	N/A

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Automovil EIQ365	Transporte	100%	
Campamento Oficina		100%	

Observaciones y aclaraciones: Para el presente informe se registra utilización de equipos por parte de la interventoria, de acuerdo al contenido y evidencias del informe mensual.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	6	9	2024	$ 117,239,989.00
ACTA PARCIAL No. 2	11	10	2024	$ 64,972,455.00
ACTA PARCIAL No. 3	28	11	2024	$ 17,555,232.00
ACTA PARCIAL No. 4	5	2	2025	$ 93,618,755.00
ACTA PARCIAL No. 5	18	2	2025	$ 70,483,711.00
ACTA PARCIAL No. 6	17	2	2025	$ 38,602,063.00
ACTA PARCIAL No. 7	20	5	2025	$ 78,854,140.00
ACTA PARCIAL No. 8	17	6	2025	$ 13,130,578.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 494,456,923.00**

Observaciones y aclaraciones:

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
CMONIQUIRÁ-CE-233 05/06/25	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME MENSUAL NO 12	
GIC-CB-333-25 05/06/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 11 DE INTERVENTORÍA	
GIC-CB-334-25 06/06/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL Y LIMPIEZA DE LA OBRA	
GIC-CB-335-25 06/06/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	REITERACIÓN COMUNICACIÓN NECESIDAD DE ACTIVIDADES DE DESMONTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MONIQUIRÁ Y TOGÜI	
CMONIQUIRÁ-CE-234 11/06/25	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	ENTREGA BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA.	
GIC-CB-336-25 11/06/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	COMUNICACIÓN CMONIQUIRÁCE-244 - ENTREGA BALANCE DE	

Observaciones y aclaraciones: Se relaciona la correspondencia acumulada cruzada entre contratista, supervisión y dependencias de la entidad

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAES	79.758.293	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS	13.874.430	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
FABIAN ANDRES POVEDA RODRÍGUEZ	1.000.622.784	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025
IVAN DARÕO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151	X	X	X	30	5	2025	31	5	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397
ESPECIALISTA GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAES	79.758.293
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS	13.874.430
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959
TOPÓGRAFO	IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574
CADENERO 1	FABIAN ANDRES POVEDA RODRÍGUEZ	1.000.622.784
CADENERO 2	IVAN DARÕO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151

***Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se realiza verificaciÛn diaria del uso de elementos de protecciÛn personal por parte de los trabajadores en obra.	N/A
Se verifica la realizaciÛn de preoperacionales de maquinaria, charlas de seguridad y demas actividades de seguridad y salud ocupacional.	N/A
Observaciones y aclaraciones: Se registran las actividades de control, manejo ambiental y seguridad industrial por parte de la interventoria. Lo anterior teniendo en cuenta el reporte y las evidencias del informe mensual.	

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia concreto pantallas muro No. 7A, 4000 psi	31	5	2025	145% de resistencia a los 47 dias
Resistencia concreto cunetas, 3000 psi	31	5	2025	212% de resistencia a los 46 dias.

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de obra	11	5	2025	Acta de Comité

Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría. (ver anexo. Actas de comité en informe cero, informe mensual

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervisión No.1	8	4	2024	7	5	2024	
Informe de supervisión No.2	8	5	2024	7	6	2024	
Informe de supervisión No.3	8	6	2024	7	7	2024	
Informe de supervisión No.4	8	7	2024	7	8	2024	
Informe de supervisión No.5	8	8	2024	7	9	2024	
Informe de supervisión No.6	8	9	2024	7	10	2024	
Informe de supervisión No.7	8	10	2024	7	11	2024	
Informe de supervisión No.8	8	11	2024	7	12	2024	
Informe de supervisión No.9	19	12	2024	18	1	2024	
Informe de supervisión No.10	19	1	2025	18	2	2025	
Informe de supervisión No.11	19	2	2025	17	3	2025	
Informe de supervisión No.12	30	4	2025	31	5	2025	

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

Luego de realizo comité de obra y verificacion en campo, se procede con el tramite administrativo de actas de Terminacion, posterior a estyo actas de recibo con recorrido previo de interventoria, dejando constancia como informe 13, como ultimo de los periodos contractuales de seguimiento

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA: Supervisor

NOMBRE: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Gobernación de Boyacá Contratación

PUBLICADO
MARILYN XIOMARA PACHECO BUENO
Fecha: 03/09/2025

GIC-GB-337-25

Bogotá, D.C., 16 de junio de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 53 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite los informes semanales para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 53	Del 26/05/25 al 01/06/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Anexo: Informes Semanales No. 53
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974
CONTACTO

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN — SEMANA No.: 53 del 26/05/2025 al 1/06/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRÁ			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.556.286.001,18	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 187.433.045,54
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.492.887.854,32	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 549.396.581,54
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.555,95	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.480.980.555,95			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.556.286.001		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.556.286.001		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 11.763.393		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 129.480.171	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 232.483.365	$ 11.763.393		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$ 2.395.852.200,55	
ADICIÓN 2	$ 160.433.800,63	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.492.887.854,32	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.274.736.820,69	97,09% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.212.222.746,75	96,25% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (62.514.073,94)	-0,83% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.274.736.820,69	97,1% *
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 7.212.222.746,75	96,3% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (62.514.073,94)	-0,83% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 278.730.922,70	3,72% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 288.848.320,63	5,85% *

Observaciones:

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$ 175.669.652,93	
ADICIÓN 2	$ 11.763.392,61	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 549.396.581,54	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 539.222.570,77	98,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 539.222.570,77	98,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 10.174.010,77	2,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.174.010,77	2,81%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,95
Amortizado $	$ 1.480.980.555,95
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 97,09% — Avance o Atraso Físico % -0,83%
Meta Física Ejecutada % 96,25% — Avance tiempo contrato 98,93%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCION N° 1-15	99,52%	98,68%
II. VARIOS	86,06%	70,25%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	95,75%	97,69%
TOTAL OBRA	**97,09%**	**96,25%**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTO CARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO: VÍA MONIQUIRÁ-TOGUI

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se ejecutaron actividades de relleno con material de base compactado en muros No. 1, 11, 7A, 12, 13, 14 y 15.
* Se realizaron trabajos de instalación de riego de liga y mezcla asfáltica en muros No. 1, 11, 7A, 12, 13, 14 y 7A
* Se ejecutaron actividades de instalación de mezcla asfáltica en caliente en muros No. 1, 11, 7A, 12, 13, 14 y 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se efectuarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muros No. 14 y 15.
* Se realizarán actividades de corte y excavación para construcción de cunetas en muros No. 14 y 15.
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

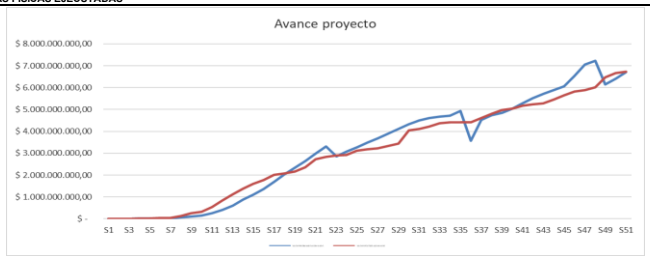

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRÍTICOS VÍA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 1.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.

Muro No. 07A abscisa K5+080



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 7A.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 7A.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 11.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 12.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 12.

Muro No. 13 abscisa K5+910



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 13.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 13.

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 14.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 15.



Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* A través del comunicado No. GIC-GB-331-25 del 28 de mayo de 2025, la interventoría remite al contratista Reiteración comunicación GIC-GB-255-24 Solicitud documentación para liquidación contrato de obra.
* Por medio del oficio No.GIC-GB-330-25 del 27 de mayo de 2025, la interventoría remite al supervisor del contrato Entrega Informe Semanal No. 52 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023.
* Con el comunicado No. GIC-GB-332-25 del 30 de mayo de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud de inicio de actividades de cunetas.
* El día 30 de mayo del 2025 se realiza comité de seguimiento de obra, con presencia de supervisor del contrato, contratista e interventoría, cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva..

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ING. EDGAR ARAGÓN OTERO

Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-340-25

Bogotá, D.C., 19 de junio de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 54 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite los informes semanales para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 54	Del 02/06/25 al 08/06/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Anexo: Informes Semanales No. 54
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974
CONTACTO

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA: 8/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN — SEMANA No.: 54 del 2/06/2025 al 8/06/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRÁ	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.556.286.001,18	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 187.433.045,54
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.492.887.854,32	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 549.396.581,54
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.555,95	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR AMORTIZADO:	$ 1.480.980.555,95	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853,14	$ 7.332.454.053,69	$ 3.491.743.125,11	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 4.001.144.729,21	$ 2.742.243.378,58	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.936.601.853,14	$ 3.331.309.324,48	$ 749.499.746,53	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536,00	$ 537.633.188,93	$ 256.010.150,54	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 293.386.431,00	$ 201.070.492,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 361.963.536,00	$ 244.246.757,93	$ 54.939.658,54	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
ADICIÓN 2	$	160.433.800,63	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.492.887.854,32	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.481.576.744,33	99,85% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	7.422.898.252,86	99,07% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(58.678.491,47)	-0,78% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.481.576.744,33	99,85% *
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$	7.422.898.252,86	99,07% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(58.678.491,47)	-0,78% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	206.839.923,64	2,76% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	210.675.506,11	4,27% *

Observaciones:

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
ADICIÓN 2	$	11.763.392,61	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	549.396.581,54	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	549.396.581,54	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	549.396.581,54	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	10.174.010,77	2,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.174.010,77	2,81%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,95
Amortizado $	$ 1.480.980.555,95
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 99,85% — Avance o Atraso Físico %: -0,78%
Meta Física Ejecutada %: 99,07% — Avance tiempo contrato: 99,47%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCION N° 1-15	99,95%	99,99%
II. VARIOS	99,71%	87,04%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	99,71%	100,00%
TOTAL OBRA	**99,85%**	**99,07%**

TRAMO: VÍA MONIQUIRÁ-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTO CARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se ejecutaron actividades de demolición y excavación para cunetas en muros No. 14 y 15.
* Se realizaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muros No. 14 y 15

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se efectuarán trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muros No. 14 y 15.
* Se realizarán actividades de corte y excavación para construcción de cunetas en muros No. 14 y 15.
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

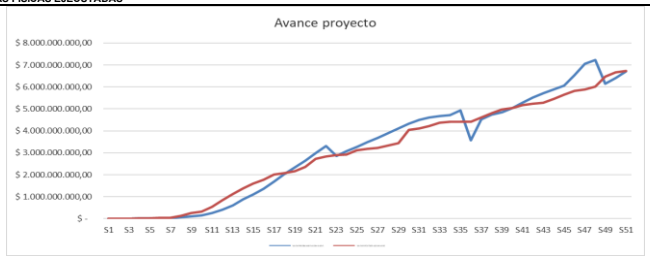

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRÍTICOS VÍA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.

Muro No. 07A abscisa K5+080



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.

Muro No. 13 abscisa K5+910



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA: 8/06/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Demolición de cunetas antiguas en muro No. 14.



Excavación manual y amarre de acero de refuerzo para cunetas en muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en muro No. 15.



Excavación para cunetas en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* A través del comunicado No.GIC-GB-335-25 del 6 de junio de 2025, la interventoría remite al supervisor del contrato Necesidad de actividades de desmonte, limpieza y mantenimiento del corredor vial que comunica los municipios de Moniquirá y Togüi.
* Por medio del oficio No.GIC-GB-334-25 del 6 de junio de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud de ingreso de personal y limpieza general de la obra.
* Con el comunicado No. GIC-GB-333-25 del 5 de junio de 2025, la interventoría remite al supervisor del contrato Remisión Informe Mensual No. 12 de Interventoría - Contrato de Interventoría No. 3230-2023 .

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ING. EDGAR ARAGÓN OTERO
Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-346-25

Bogotá, D.C., 01 de julio de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 55 - Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite los informes semanales para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 55	Del 09/06/25 al 11/06/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Anexo: Informes Semanales No. 55
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974
CONTACTO

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA: 11/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN — SEMANA No.: 55 del 9/06/2025 al 11/06/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRÁ		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL: $ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL: $ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES: $ 2.556.286.001,18	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES: $ 187.433.045,54
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 7.492.887.854,32	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2025	VALOR ACUMULADO: $ 549.396.581,54
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR ANTICIPO: $ 1.480.980.555,95	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/06/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		VALOR AMORTIZADO: $ 1.480.980.555,95			VALOR AMORTIZADO: $ -
		SALDO POR AMORTIZAR: $ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853,14	$ 7.332.454.053,69	$ 3.491.743.125,11	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 4.001.144.729,21	$ 2.742.243.378,58	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.936.601.853,14	$ 3.331.309.324,48	$ 749.499.746,53	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536,00	$ 537.633.188,93	$ 256.010.150,54	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 293.386.431,00	$ 201.070.492,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 361.963.536,00	$ 244.246.757,93	$ 54.939.658,54	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
ADICIÓN 2	$	160.433.800,63	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.492.887.854,32	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.492.887.854,49	100,00% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	7.492.838.794,40	100,00% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(49.060,09)	0,00% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.492.887.854,49	100,0% *
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$	7.492.838.794,40	100,0% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(49.060,09)	0,00% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	206.839.923,64	2,76% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	147.949.673,87	3,00% *

Observaciones:

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
ADICIÓN 2	$	11.763.392,61	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	549.396.581,54	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	559.570.592,31	101,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	559.570.592,31	101,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	10.174.010,77	2,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.174.010,77	2,81%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,95
Amortizado $	$ 1.480.980.555,95
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: 0,00%
Meta Física Ejecutada %: 100,00% — Avance tiempo contrato: 100,00%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCION N° 1-15	100,00%	100,00%
II. VARIOS	100,00%	100,00%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	100,00%	100,00%
TOTAL OBRA	**100,00%**	**100,00%**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTO CARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO: VÍA MONIQUIRÁ-TOGUI

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se ejecutaron actividades de demolición y excavación para cunetas en muros No. 1, 11, 12, 13 y 14.
* Se realizaron trabajos de amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muros No. 1, 11, 12, 13 y 14.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo al recorrido de obra realizado el 11 de junio de 2025, quedan pendiente las siguientes actividades para el recibo final de la obra:

MURO	ACTIVIDAD
1	- Atender detalle de acabado en el asfalto instalado al final del muro. - Realizar el remate de la cuneta.
2	- Rematar cuneta y cierres de muros
5	- Destapar la salida del filtro.
6	- Realizar detalle en la cuneta del inicio del muro. - Reparar cuneta del muro y hacer corte longitudinal. - Arreglar fisuras de la cuneta.
7A	- Realizar el remate de la cuneta.
8	- Rematar cuneta que conecta con el muro 9.
9	- Conformación lleno del muro (terraceo).
10	- Rematar cuneta del inicio del muro.
11	- Realizar el remate de la cuneta en ambos costados.
12	- Terminación de acabados de la cuneta.
13	- Realizar el remate de la cuneta.
14	- Terminación de acabados para las cunetas - Conexión descarga del filtro hasta alcantarilla muro 15.
15	- Atender detalles constructivos para el remate del muro - Conformación lleno del muro (terraceo). - Realizar el remate de los gaviones.
GENERAL	- Realizar el corte y retiro de aceros expuestos. - Realizar aseo y limpieza de escombros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

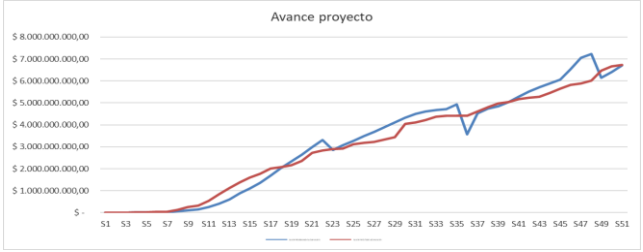

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRÍTICOS VÍA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 7.

Muro No. 07A abscisa K5+080



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.



Carpeta asfáltica en muro No. 7A.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.



Carpeta asfáltica y cunetas terminadas en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 12.

Muro No. 13 abscisa K5+910



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 13.

Gobernación de Boyacá	**INFORME SEMANAL** **MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

FECHA 11/06/2025
(Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 14.



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 15.



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
* A través del comunicado No.CMONIQUIRÁ-CE-244 del 10 de junio de 2025, el contratista remite a la interventoría Entrega Balance de cantidades de obra. * El día 11 de junio de se realiza recorrido en obra con presencia del supervisor del contrato, contratista e interventoría para recibir las obras a satisfacción y quedando unos pendientes de remates de cunetas que se ejecutarán en el transcurso de la siguiente semana.	FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGÓN OTERO Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND
