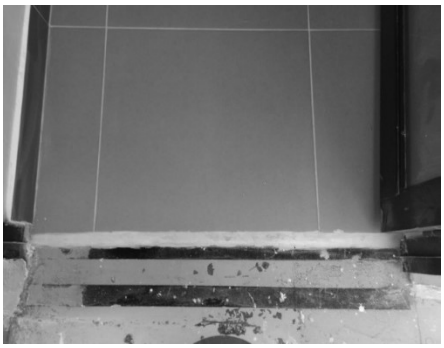
DILE TEUSAQUILLO - CHAPINERO : Plazo para Entrega 19 de Febrero de 2024.

Registro fotográfico	
	
Foto1. Instalar breaker y conexión de tablero eléctrico - zona oficina de archivo	Foto 2. Instalar ventana fija- zona oficina de archivo
	
Foto 3. Remate de boca puertas- zona oficina de archivo	Foto 4. Remate de pintura en muros- zona oficina de archivo

	
Foto 5. Remate de boca puertas- zona pasillo de archivo	Foto 6. Remate de boca puertas- zona pasillo de archivo
 	
Foto 7. Se deberá corregir la posición de la puerta existente, abriendo hacia afuera como anteriormente estaba- zona pasillo de archivo	Foto 8. Remate de pintura en muros – zona pasillo de archivo
	
Foto 9. Instalar espejo y papelera- zona baño PMR	Foto 10. Realizar conexión de extractor y remate de pintura en cielo raso- zona baño PMR

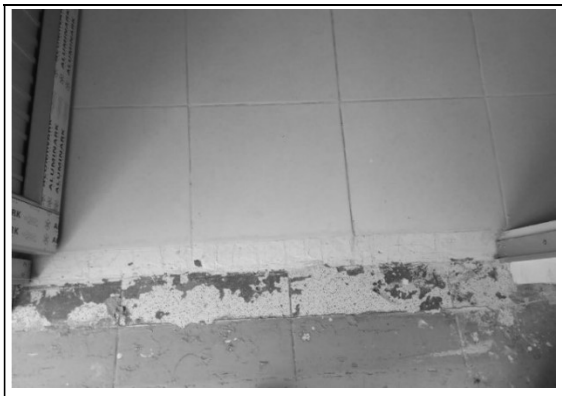
	
Foto 11. Remate de boca puerta- zona acceso baño PMR	Foto 12. Remate de pintura en fachada
	
Foto 13. Instalar ventana fija, remate de pintura en muros - zona cocina	Foto 14. Resane de muro- zona cocina
	
Foto 15. Emboquillar parte baja de mesón en mármol- zona cocina	Foto 16. Arreglar filtración en tubería de desagüe de lavaplatos- zona cocina

	
Foto 16. Remate de boca puerta- zona acceso cocina	Foto 17. Se evidencia piso podotactil despegado
	
Foto 18. Ajuste de puerta que interfiere la apertura de esta debido al piso podotáctil- zona pasillo entre cocina y comedor	Foto 19. Ajustar puerta principal para instalación de piso podotáctil

En este frente se solicita para cumplir con el plazo trabajar de manera continua , incluso el fin de semana del 17 y 18 de Febrero de 2024.

Atentamente;

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
Representante Legal
CONSORCIO SED DISTRITAL

Anexo: Ninguno

c.c. SECRETARIA DE EDUCACION - DCCE

CONSORCIO
SED-DISTRITAL

Bogotá, 14 de Febrero de 2024. ***RL – IMG1-4146203– 331***

Señores
CONSORCIO OBRAS MG.
CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN.
Representante legal
Ciudad

Ref.: ***Contrato No. CO1.PCCNTR.****4146203 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".*
Contrato de obra CO1.PCCNTR.4087800

Asunto**:** **Devolución de APU de ítems No previstos.**

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que las aclaraciones a los APU No previstos NP 15 ,NP 16 , NP 26 y NP 27 no fueron oportuna y debidamente subsanadas el área de estudios previos realizo su devolución.

Lo anterior conlleva a que se deba realizar nuevamente el trámite de radicación con los ajustes y soportes correspondientes.

Atentamente;

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
Representante Legal
CONSORCIO SED DISTRITAL

Anexo: Memorando de devolución APU No previstos

c.c. SECRETARIA DE EDUCACION - DCCEE

CONSORCIO
SED-DISTRITAL

Bogotá, 14 de Febrero de 2024. ***RL – IMG1-4146203– 332***

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Atn; Ing Luis Antonio Pinzón.
Supervisor
Arq. Carlos Enrique Sánchez
Apoyo a Supervisión
Avenida el Dorado No. 66 -63.
Ciudad

Ref.: ***Contrato No. CO1.PCCNTR.4146203 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".***
Contrato de obra CO1.PCCNTR.4087800

Asunto: **Módulos Nuevo Horizonte Sede D - Torca.**

Cordial saludo:

Dando alcance a nuestro comunicado *RL – IMG1-4146203– 309* del 5 de Enero de 2024 y de conformidad con la vista realizada el 31 de Enero de 2024 con participación de representantes del Colegio , la Supervisión , Contratista e interventoría , se adjuntan los esquemas correspondientes a los módulos (batería sanitaria, cuarto técnico, shut , servicios generales) a implementar en Colegio Nuevo Horizonte Sede D - Torca según alcance adicional No. 2 Contrato de obra CO1.PCCNTR.4087800


Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.


Atentamente;

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
Representante Legal
CONSORCIO SED DISTRITAL


Anexo: Esquemas Nuevo Horizonte sede D.

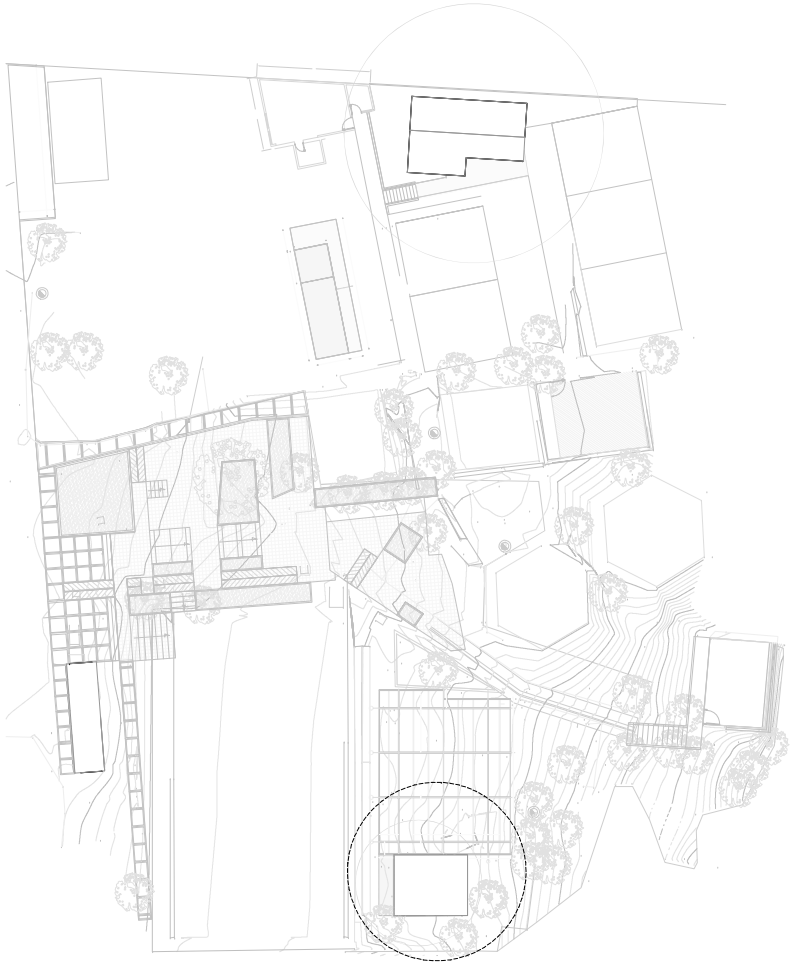

1 P. General - Modulo refrigerios
1 : 250

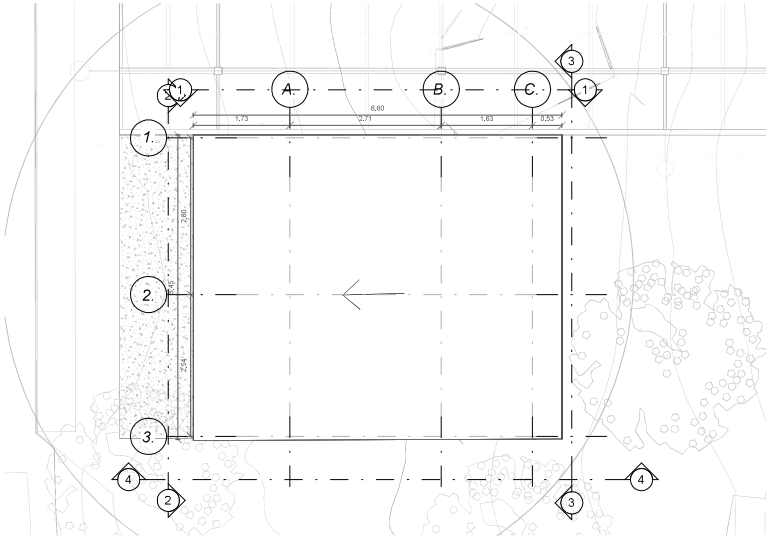

2 P. Cubierta- Modulo refrigerios
1 : 50

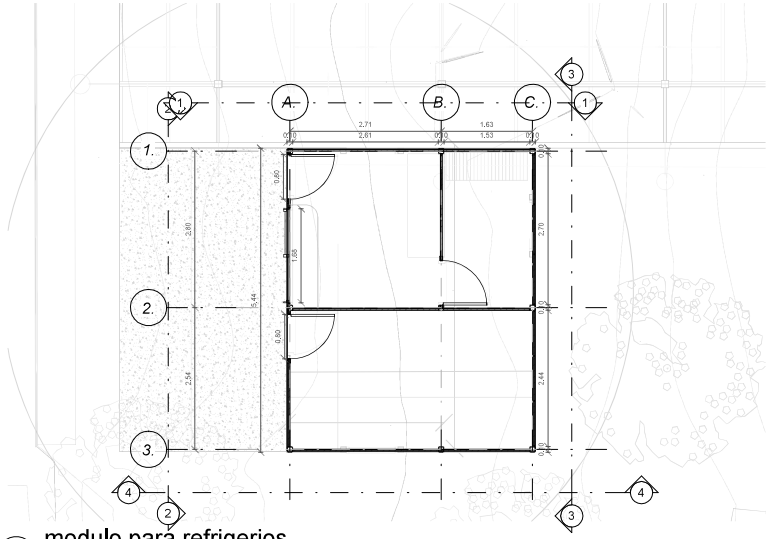

3 modulo para refrigerios
1 : 50

CONTRATISTA

Consorcio Obras MG

NIT. 901.640.210 - 4

CONTRATANTE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.4087800

GRUPO - 1 SED USAQUEN - CHAPINERO - TEUSAQUILLO

IED NUEVO HORIZONTE SEDE D - TORCA

CALLE 127C N0. 9A-03

APROBACIÓN:

ARQ. CARLOS SANCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SED - DCCEE
APOYO A LA SUPERVISION

ING. OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

ING. ALVARO HERNANDEZ
CONSORCIO OBRAS MG
DIRECTOR DE OBRA

ELABORÓ:

ARQ. RODRIGO BECERRA
CONSORCIO OBRAS LG

ARQ. JUAN D. BRICEÑO
CONSORCIO OBRAS MG

CONTENIDO

PLANOS ARQUITECTONICOS AULA 11 - AULA PREFABRICADA - CUBIERTA ZONA JUEGOS


CONTROL DE CAMBIOS

No.	VER	A CARGO	FECHA
1	V.1	AG3	31/01/2023


ESCALA: INDICADAS

FECHA: ENERO-2023


PLANO: 2 DE 2

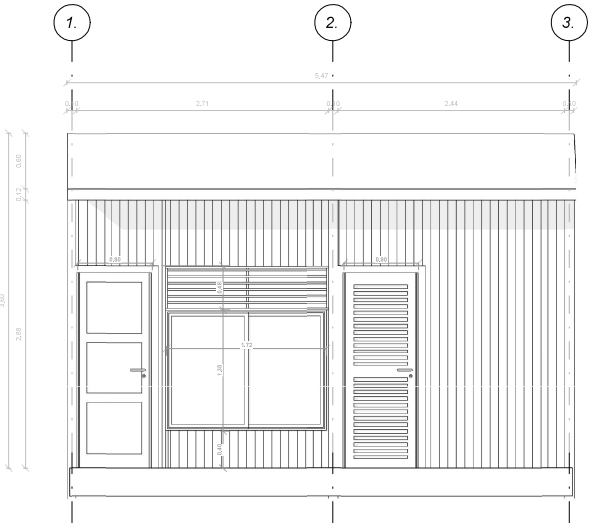


2 F OCCIDENTE
1 : 30

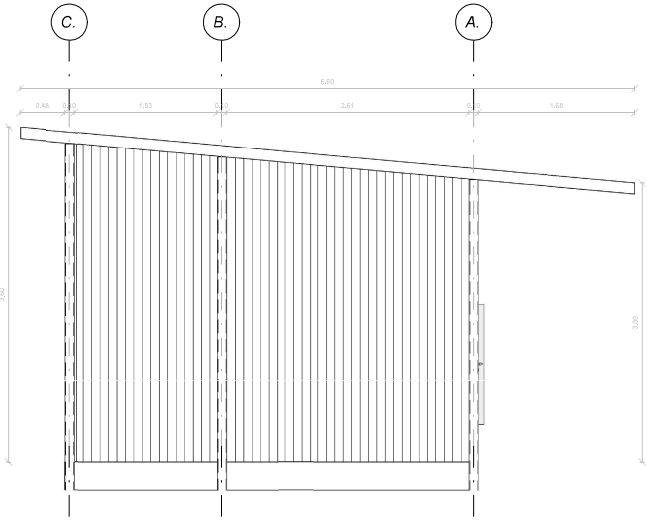

1 F NORTE
1 : 30

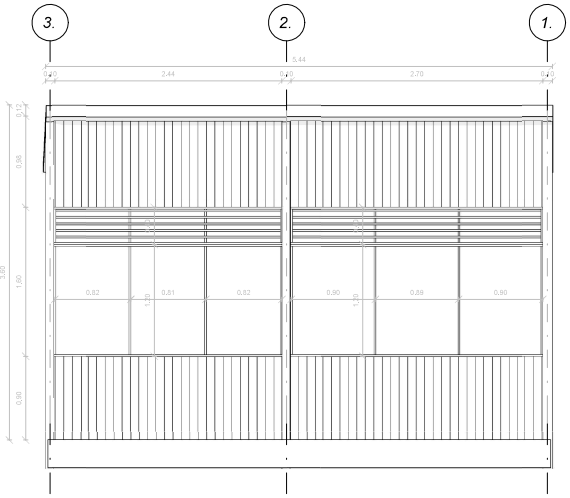

3 F ORIENTE
1 : 30

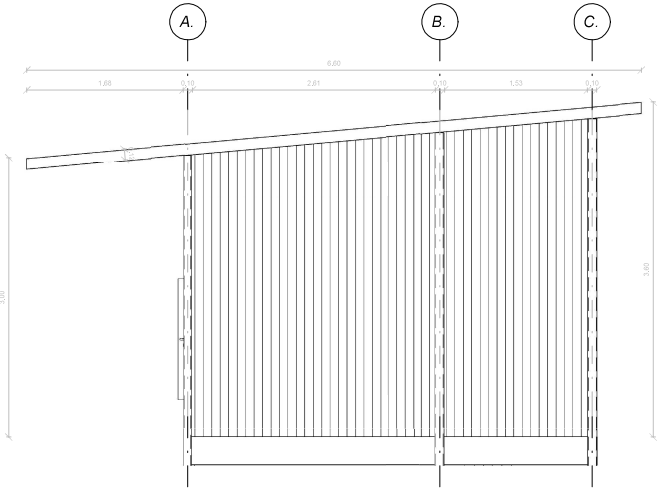

4 F SUR
1 : 30

CONTRATISTA

Consorcio Obras MG

NIT. 901.640.210 - 4

CONTRATANTE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.4087800

GRUPO - 1 SED USAQUEN - CHAPINERO - TEUSAQUILLO

IED NUEVO HORIZONTE
SEDE D - TORCA

CALLE 127C N0. 9A-03

APROBACIÓN:

ARQ. CARLOS SANCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SED - DCCEE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ING. OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

ING. ALVARO HERNANDEZ
CONSORCIO OBRAS MG
DIRECTOR DE OBRA

ELABORÓ:

ARQ. RODRIGO BECERRA
CONSORCIO OBRAS LG

ARQ. JUAN D. BRICEÑO
CONSORCIO OBRAS MG

CONTENIDO

PLANOS ARQUITECTONICOS AULA 11 - AULA PREFABRICADA - CUBIERTA ZONA JUEGOS


CONTROL DE CAMBIOS

No.	VER	A CARGO	FECHA
1	V.1	AG3	31/01/2023


ESCALA: INDICADAS

FECHA : ENERO-2023


PLANO: 2 DE 2

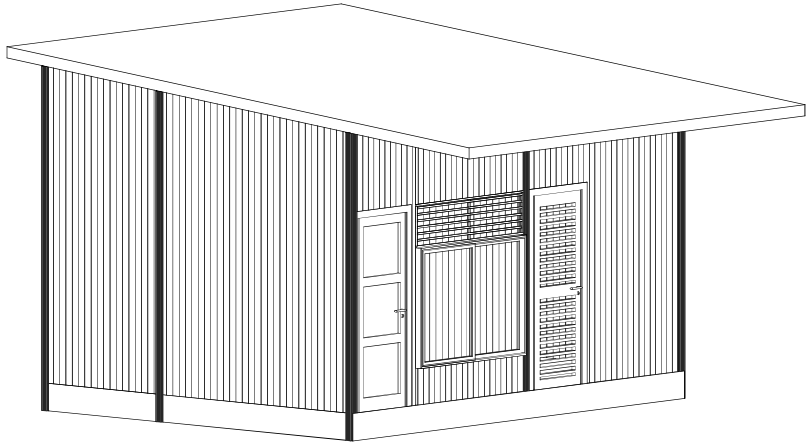


1 3D modulo refrigerios norte-occidente

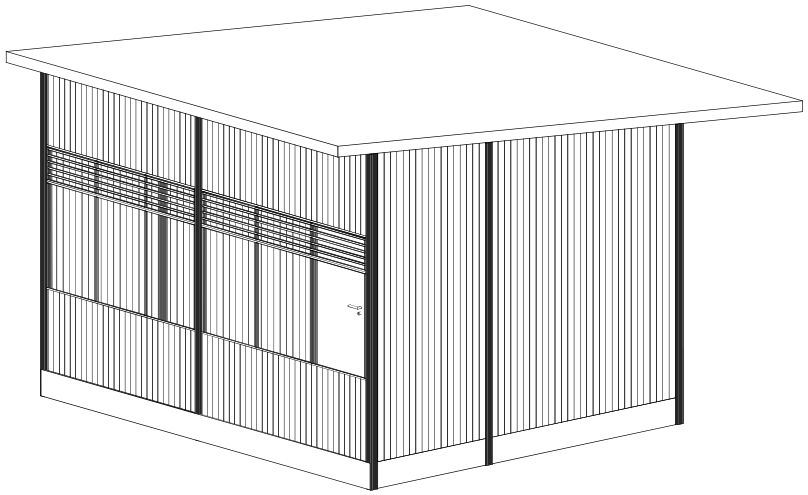

2 3D modulo refrigerios norte-oriente

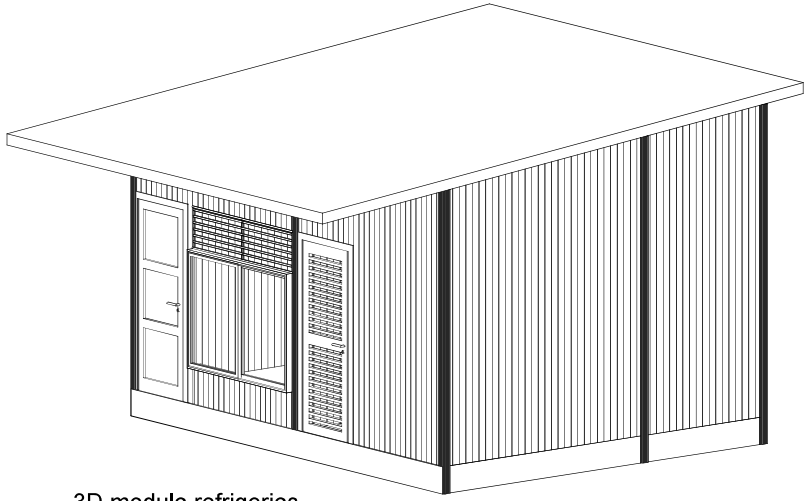

3 3D modulo refrigerios sur-occidente

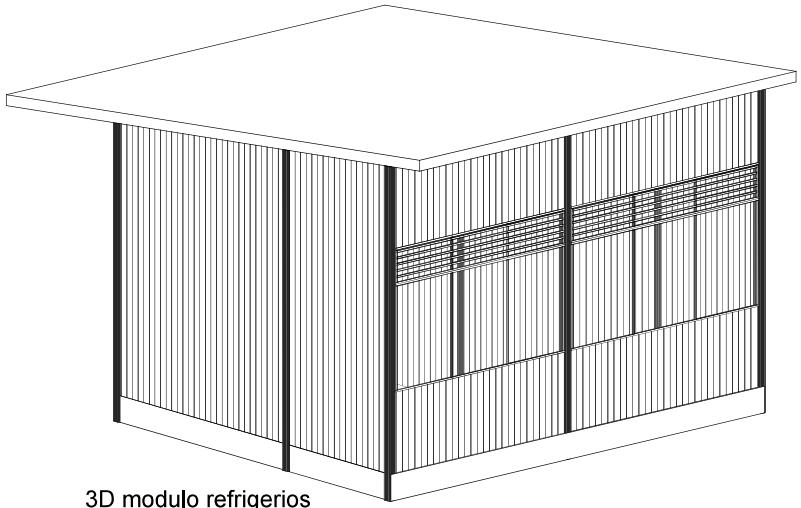

4 3D modulo refrigerios sur-oriente

CONTRATISTA

Consorcio Obras MG

NIT. 901.640.210 - 4

CONTRATANTE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.4087800

GRUPO - 1 SED USAQUEN - CHAPINERO - TEUSAQUILLO

IED NUEVO HORIZONTE SEDE D - TORCA

CALLE 127C N0. 9A-03

APROBACIÓN:

ARQ. CARLOS SANCHEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SED - DCCEE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ING. OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

ING. ALVARO HERNANDEZ
CONSORCIO OBRAS MG
DIRECTOR DE OBRA

ELABORÓ:

ARQ. RODRIGO BECERRA
CONSORCIO OBRAS LG

ARQ. JUAN D. BRICEÑO
CONSORCIO OBRAS MG

CONTENIDO

PLANOS ARQUITECTONICOS AULA 11 - AULA PREFABRICADA - CUBIERTA ZONA JUEGOS


CONTROL DE CAMBIOS

No.	VER	A CARGO	FECHA
1	V.1	AG3	31/01/2023


ESCALA: INDICADAS

FECHA : ENERO-2023


PLANO: 2 DE 2

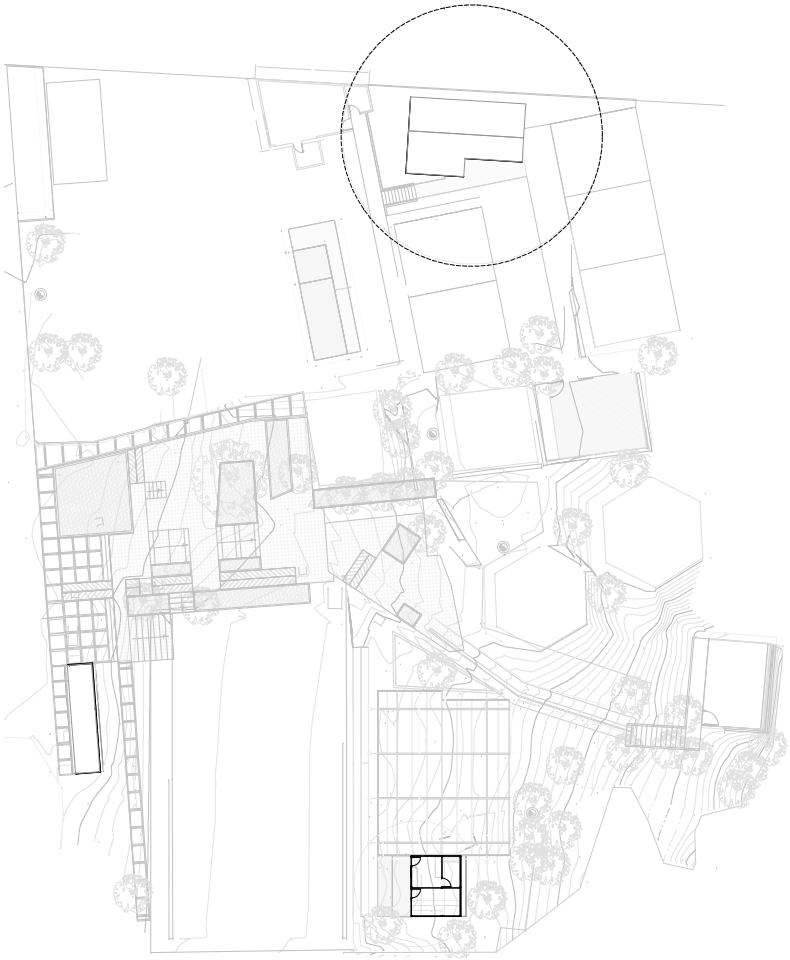

3 P. General - Modulo para baños
1 : 250

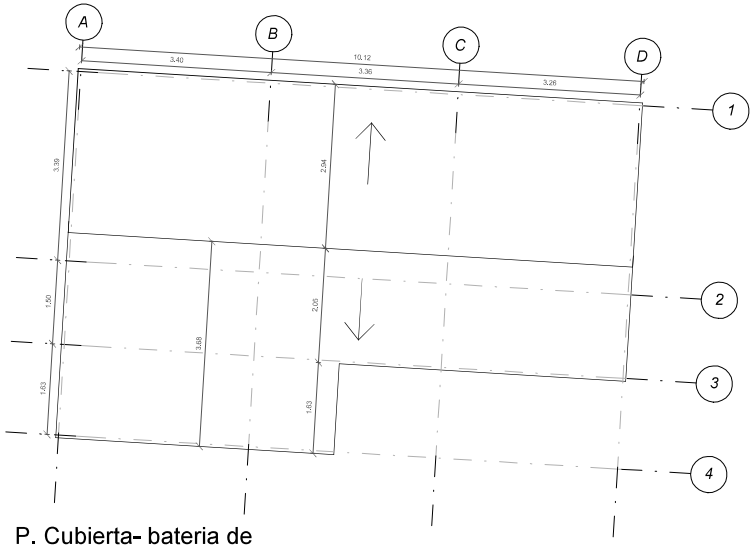

1 P. Cubierta- bateria de baños
1 : 50

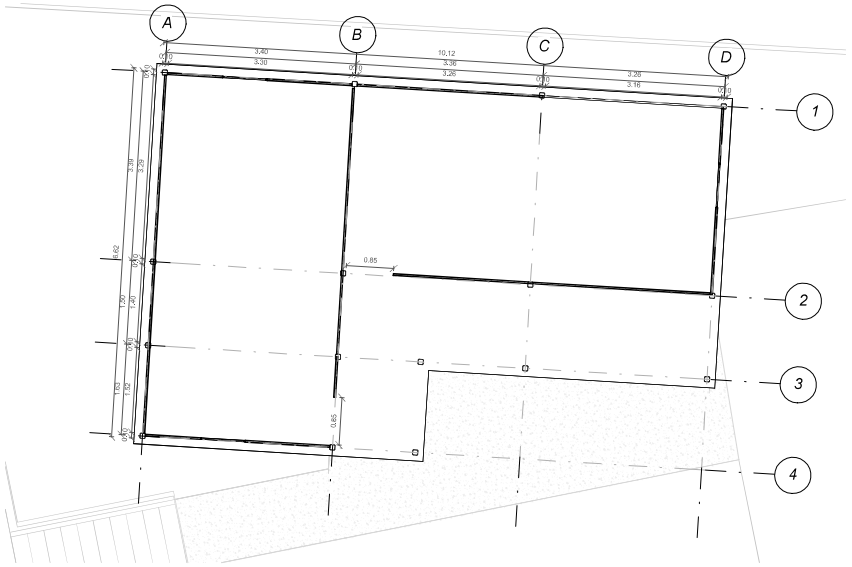

2 Modulo para baños
1 : 50

CONTRATISTA

Consorcio Obras MG

NIT. 901.640.210 - 4

CONTRATANTE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.4087800

GRUPO - 1 SED USAQUEN - CHAPINERO - TEUSAQUILLO

IED NUEVO HORIZONTE SEDE D - TORCA

CALLE 127C N0. 9A-03

APROBACIÓN:

ARQ. CARLOS SANCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SED - DCCEE
APOYO A LA SUPERVISION

ING. OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

ING. ALVARO HERNANDEZ
CONSORCIO OBRAS MG
DIRECTOR DE OBRA

ELABORÓ:

ARQ. RODRIGO BECERRA
CONSORCIO OBRAS LG

ARQ. JUAN D. BRICEÑO
CONSORCIO OBRAS MG

CONTENIDO

PLANOS ARQUITECTONICOS AULA 11 - AULA PREFABRICADA - CUBIERTA ZONA JUEGOS


CONTROL DE CAMBIOS

No.	VER	A CARGO	FECHA
1	V.1	AG3	31/01/2023


ESCALA: INDICADAS

FECHA : ENERO-2023


PLANO: 2 DE 2

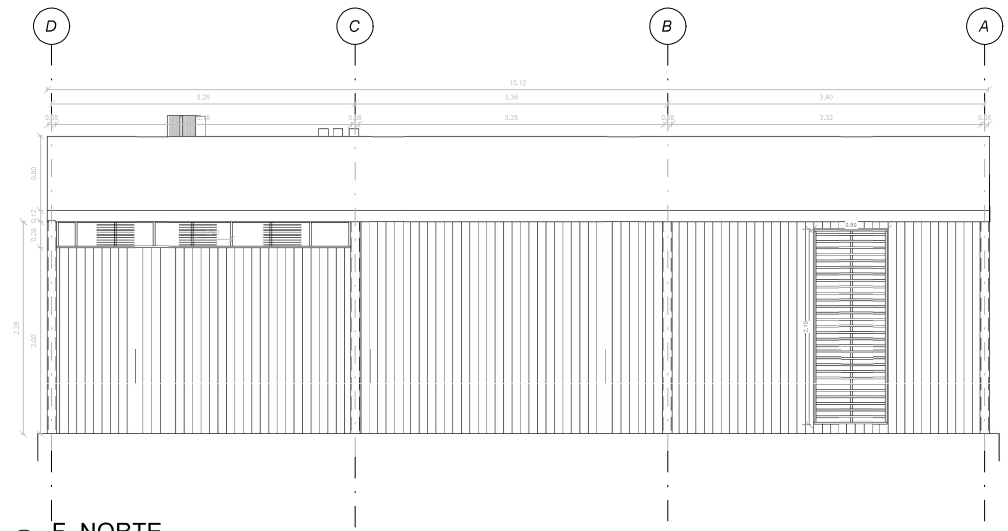


1 F. NORTE
1 : 30

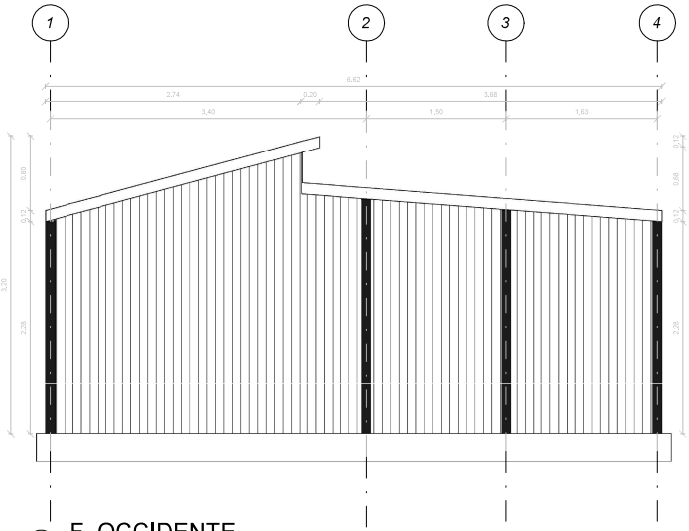

3 F. OCCIDENTE
1 : 30

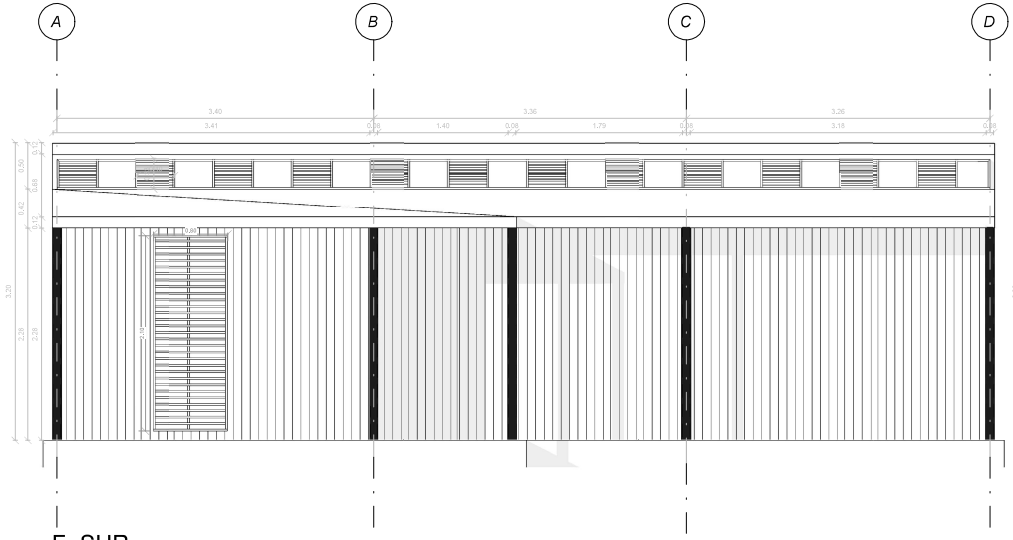

2 F. SUR
1 : 30

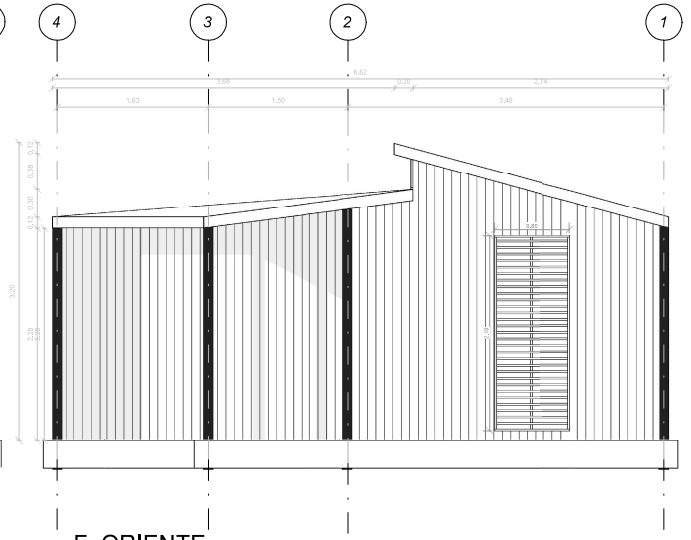

4 F. ORIENTE
1 : 30

CONTRATISTA

Consorcio Obras MG

NIT. 901.640.210 - 4

CONTRATANTE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.4087800

GRUPO - 1 SED USAQUEN - CHAPINERO - TEUSAQUILLO

IED NUEVO HORIZONTE
SEDE D - TORCA

CALLE 127C N0. 9A-03

APROBACIÓN:

ARQ. CARLOS SANCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SED - DCCEE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ING. OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

ING. ALVARO HERNANDEZ
CONSORCIO OBRAS MG
DIRECTOR DE OBRA

ELABORÓ:

ARQ. RODRIGO BECERRA
CONSORCIO OBRAS LG

ARQ. JUAN D. BRICEÑO
CONSORCIO OBRAS MG

CONTENIDO

PLANOS ARQUITECTONICOS AULA 11 - AULA PREFABRICADA - CUBIERTA ZONA JUEGOS


CONTROL DE CAMBIOS

No.	VER	A CARGO	FECHA
1	V.1	AG3	31/01/2023


ESCALA: INDICADAS

FECHA : ENERO-2023


PLANO: 2 DE 2

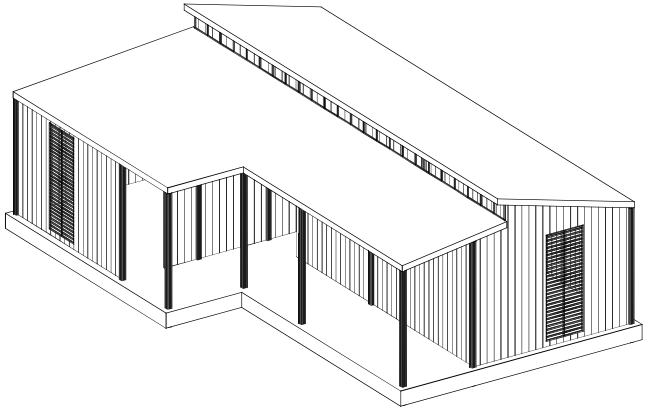


1 3D modulo baños norte -occidente

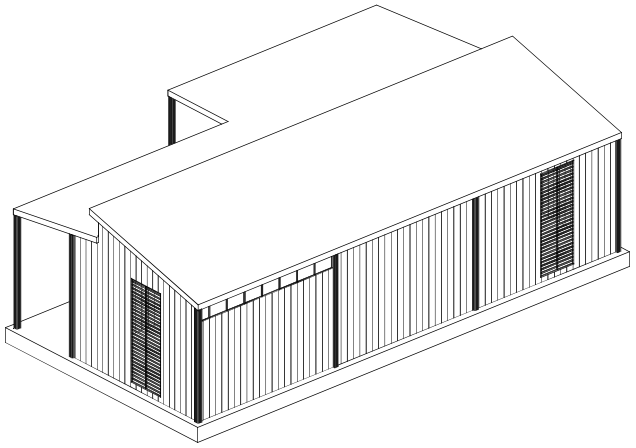

2 3D modulo baños norte-oriente

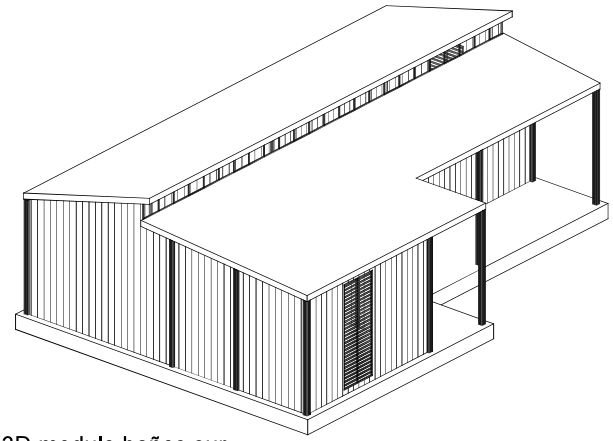

3 3D modulo baños sur-occidente

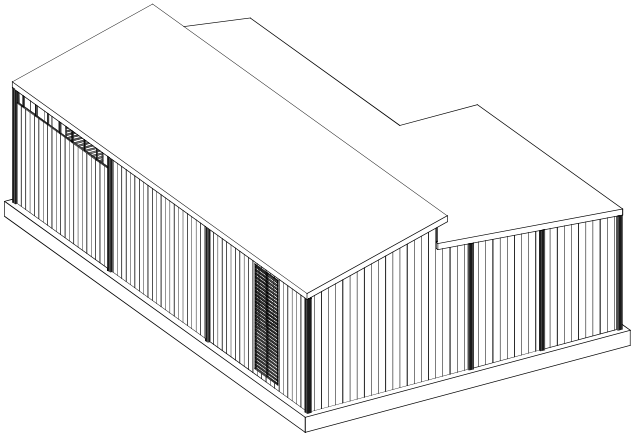

4 3D modulo baños sur-oriente

CONTRATISTA

Consorcio Obras MG

NIT. 901.640.210 - 4

CONTRATANTE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.
CO1.PCCNTR.4087800

GRUPO - 1 SED USAQUEN - CHAPINERO - TEUSAQUILLO

IED NUEVO HORIZONTE SEDE D - TORCA

CALLE 127C N0. 9A-03

APROBACIÓN:

ARQ. CARLOS SANCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SED - DCCEE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ING. OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

ING. ALVARO HERNANDEZ
CONSORCIO OBRAS MG
DIRECTOR DE OBRA

ELABORÓ:

ARQ. RODRIGO BECERRA
CONSORCIO OBRAS LG

ARQ. JUAN D. BRICEÑO
CONSORCIO OBRAS MG

CONTENIDO

PLANOS ARQUITECTONICOS AULA 11 - AULA PREFABRICADA - CUBIERTA ZONA JUEGOS

CONTROL DE CAMBIOS

No.	VER	A CARGO	FECHA
1	V.1	AG3	31/01/2023

ESCALA: INDICADAS

FECHA : ENERO-2023

PLANO: 2 DE 2

Anexo No.11 Correspondencia recibida.

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 289

Bogotá, 16 de Enero de 2023

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas
Pardo seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Solicitud de Aprobación Ítems No Previstos **N.P.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ACÚSTICA STC 42 (1,00m * 1,00m) CON CÁMARA DE AIRE: VIDRIO LAMINADO 9.76MM (4MM + PVB 0.76MM + 5MM) + CÁMARA DE AIRE 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM. PERFILARÍA EN ALUMINIO CON POLIURETANO EXPANDIDO, EMPAQUES EN NEOPRENO PARA SUJECIÓN DE VIDRIO, INYECCIÓN DE POLIURETANO ENTRE VANO Y MARCO. CUENTA CON DOS BATIENTES DE 40 CM C/U**

Cordial saludo.

De la manera más atenta nos permitimos remitir la documentación correspondiente para el trámite de aprobación de ítems no previstos los cuales han surgido en el transcurso de la obra de sede CIUDAD MAESTRA. El ítem que se requiere es el siguiente:

1. **N.P.16**

I. ITEMS NO PRESENTES DENTRO DE LA LISTA UNIFICADA 2022

LISTADO DE ITEMS NO PRESENTE EN LISTA UNIFICADA SED 2022			
ITEM - N.P	DESCRIPCIÓN	UN	V/UNITARIO
N.P.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ACÚSTICA STC 42 (1,00m * 1,00m) CON CÁMAR DE AIRE: VIDRIO LAMINADO 9.76MM (4MM + PVB 0.76MM + 5MM) + CÁMARA DE AI 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM. PERFILARÍA EN ALUMINIO CON POLIURETAN EXPANDIDO, EMPAQUES EN NEOPRENO PARA SUJECIÓN DE VIDRIO, INYECCIÓN D POLIURETANO ENTRE VANO Y MARCO.	M2	$1.961.466

N.P.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ACÚSTICA STC 42 (1,00 * 1,00m) CON CÁMARA DE AIRE: VIDRIO LAMINADO 9.76MM (4MM + PVB 0.76MM + 5MM) + CÁMARA DE AIRE 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM. PERFILARÍA EN ALUMINIO CON POLIURETANO EXPANDIDO, EMPAQUES EN NEOPRENO PARA SUJECIÓN DE VIDRIO, INYECCIÓN DE POLIURETANO ENTRE VANO Y MARCO.

I. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta nuestra labor como Contratista para la realización del contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE


LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Dentro del Alcance de las actividades de la sede Ciudad Maestra de debe realizar el suministro e instalación de ventana una acústica stc 42 (1,00m * 1,00m) con cámara de aire: vidrio laminado 9.76mm (4mm + pvb 0.76mm + 5mm) + cámara de aire 18mm + vidrio monolítico 7mm. perfilaría en aluminio con poliuretano expandido, empaques en neopreno para sujeción de vidrio, inyección de poliuretano entre vano y marco. cuenta con dos batientes de 40 cm c/u; dando cumplimiento al diseño propuesto por la SED de la emisora.

I. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

VENTANA ACÚSTICA con cámara de aire: vidrio laminado 9.76mm (4mm + PVB 0.76mm + 5mm)+ cámara de aire 18mm + vidrio monolítico 7mm. Perfilaría en aluminio con poliuretano expandido, empaques en neopreno para sujeción de vidrio, inyección de poliuretano entre vano y marco

II. APLICACIÓN Y SOLUCIONES

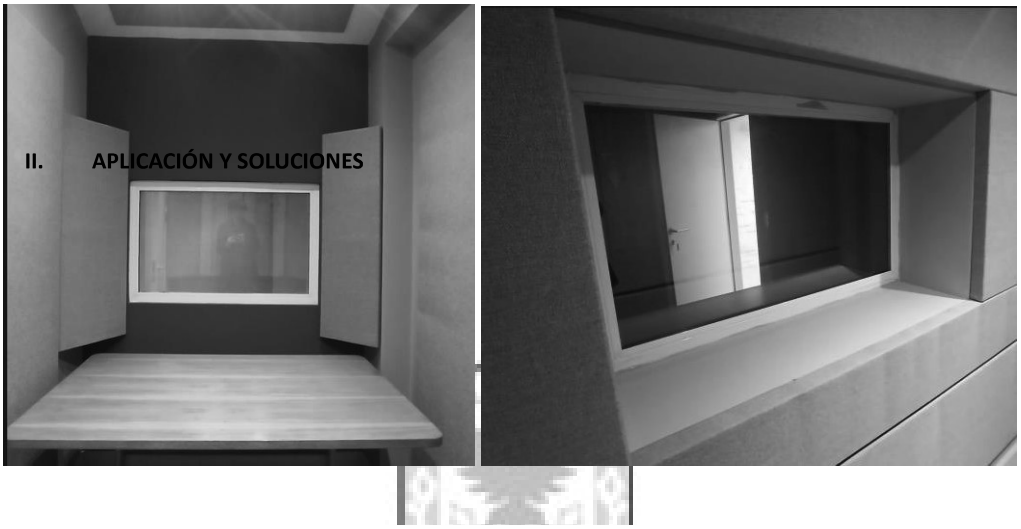

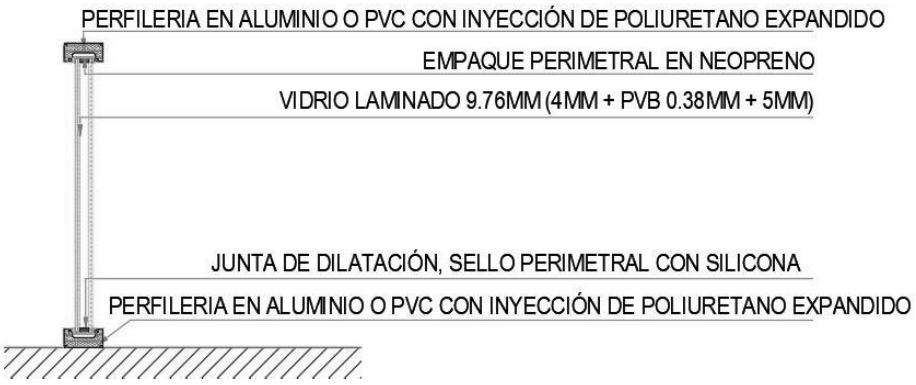


FIGURA 17. DETALLE ARQUITECTONICO VISOR ACÚSTICO

Consorcio Obras MG

II. COTIZACIONES

✓ COTIZACIÓN No.1 AQSTICA

Fecha: 6/12/2023

AQSTICA S.A.S

Cot. N°: **O-23-0362 Consorcio Obras MG EMISED**
Atn.: Alvaro Hernandez
Mail.: director@comg.work
Tel.: 3016340193

Atendiendo su amable solicitud, presentamos la siguiente cotización

O-23-0362

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LIVE ROOM (EMISORA)					
1	Suministro e instalación de ventana acústica stc 42 (3,30m * 1,60m) con cámara de aire: vidrio laminado 9.76mm (4mm + pvb 0.76 mm + 5mm) + cámara de aire 18mm + vidrio monolítico 7mm. perfilaría en aluminio con poliuretano expandido, empaques en neopreno para sujeción de vidrio, inyección de poliuretano entre vano y marco. cuenta con dos batientes de 40 cm c/u	5.28	m²	$ 1,781,863.61	$ 9,408,239.86
2	Suministro e instalación de ventana acústica stc 42 (1,00m * 1,00m) con cámara de aire: vidrio laminado 9.76mm (4mm + pvb 0.76mm + 5mm) + cámara de aire 18mm + vidrio monolítico 7mm. perfilaría en aluminio con poliuretano expandido, empaques en neopreno para sujeción de vidrio, inyección de poliuretano entre vano y marco.	1	m²	$ 1,581,863.61	$ 1,581,863.61
TOTAL (Incluye IVA)					**$ 10,990,103.47**

Notas

- Sujeto a rectificación de medidas.
- Tiempos de entrega sujetos a disponibilidad de materiales y acabados.
- Incluye transporte, suministro e instalación en Bogotá
- Incluye labores solo en horario diurno, horario nocturno o festivo genera costo adicional.
- No incluye demoliciones ni desmonte de otros elementos, que no esten descritos en la cotización.
- No incluye la instalación de acabados que no sean descritos en la cotización.
- El cliente asume cualquier costo adicional que genere la solicitud de aumento de especificaciones.
- El cliente asume cualquier resultado que genere la solicitud de reducción de especificaciones.
- La selección de colores o acabados se realizará de acuerdo con los catálogos disponibles.
- No incluye refuerzo estructural, en caso de ser necesario será responsabilidad del contratante.
- Se firmará un acta de inicio de obra recopilando los colores elegidos.
- No incluye siso ni residente permanente durante la ejecución de la obra. De ser necesario, se generarán costos adicionales
- El precio aplica únicamente para tonalidades disponibles en inventario.
- Cualquier solicitud de cambio de color o acabado, que genere costo adicional, es asumida por el cliente.

Forma de pago:
50% Anticipo, 40% por cortes de obra, 10% Contra entrega

Tiempos de entrega:
40 días hábiles

Vigencia de la propuesta
15 días.

Propuesta realizada por:

Ing. Ana María Quintero
Comercial | Diseño
ventas2@aqstica.com
Móvil: (300)8688040
NIT:900.214.218-2

Consorcio Obras MG

✓ **COTIZACIÓN No.2 TERMOACUSTIK**

Client Quote

Cliente: CONSORCIO OBRAS MG

Proyecto: 8026101123 - ALVARO HERNÁNDEZ / Fecha: 20/11/2023


001 - V1	
Dimensiones:	3.330 mm x 1.600 mm
Serie de Perfiles:	Deceuninck
Vidrios:	Lam 9.76MM (4MM + PVB 0.76MM + 5MM) + CÁMARA DE AIRE 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM
Opening type:	Fijo



Vista interior.

Valores Computarizados				
Precio Unitar	5,28	m²	1.846.044,00	$
Cantidad			1	Pzas.
Valor			9.747.112,32	$

002 - V2	
Dimensiones:	1.000 mm x 1.000 mm
Serie de Perfiles:	Deceuninck
Vidrios:	Lam 9.76MM (4MM + PVB 0.76MM + 5MM) + CÁMARA DE AIRE 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM inc 10+8 (.76)
Opening type:	Fijo



Vista interior.

Valores Computarizados				
Precio Unitar	1,000	m²	1.646.044,00	$
Cantidad			1	Pzas.
Valor			1.646.044,00	$

Total Oferta		
Valor	11.393.156,32	$
IVA	2.164.699,70	$
Presupuesto Total	**13.557.856,02**	**$**
Estadísticas Oferta		
Número de Componentes	2	Pzas.

Cordialmente,

TERMOACUSTIK GLASS SAS.
Nit: 901.168-554-9
Calle 74A #64-51
info@termoacustik.com
3153845552-3187386169
www.termoacustik.landingpage.com.co

Consorcio Obras MG

✓ **COTIZACIÓN No.3 ARQUILUN LTDA**

ARQUITECTURA Y ALUMINIOS ARQUILUM LTDA.

MARQUESINAS – VIDRIOS TEMPLADOS – DIVISIONES DE BAÑO – PORTONES ELECTRICOS – FACHADAS – VENTANERIA EN ALUMINIO

Señor
Alvaro Hernandez
Consorcio Obras MG
Director de Obra

Bogotá 30/11/2023

COTIZACION N- B1485-B

NIT: 900.179.387-9

Atendiendo Su Amable Solicitud Nos Complace Presentarle La Siguiente Cotización.

VENTANA ACÚSTICA STC 42 (1,00m * 1,00m) CON CÁMARA DE AIRE: VIDRIO LAMINADO 9.76MM (4MM + PVB 0.76MM + 5MM) + CÁMARA DE AIRE 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM. PERFILARÍA EN ALUMINIO CON POLIURETANO EXPANDIDO, EMPAQUES EN NEOPRENO PARA SUJECIÓN DE VIDRIO, INYECCIÓN DE POLIURETANO ENTRE VANO Y MARCO. CUENTA CON DOS BATIENTES DE 40 CM / U

Medidas
1.11 x 1.10=1.00m2. Valor x m2 $1.424.444



Valor total ventaneria con IVa ----------$ 1.424.444

Incluye Instalación e Impermeabilización y transporte

CONDICIONES COMERCIALES:

50% INICIAL
50% CONTRA ENTREGA

GARANTÍA:
*Setenta meses por defectos de fabricación a partir de la emisión de Nuestra factura excluyendo uso inadecuado del producto.

TIEMPO DE ENTREGA
20 Días calendario.

HAROLD ANDRES MATEUS.
Arquitecto.

Consorcio
Obras MG

Por los tanto, se adjunta a este comunicado los siguientes documentos:

1. Documento de Solicitud de Aprobación Ítems No Previstos del Contrato (JUSTIFICACIONES – Presente Oficio)
2. APUs, Ítems No Previstos (Formato Excel – APUs. N.P - Excel)
3. APUs, Ítems No Previstos (Formato PDF – APUs N.P PDF)
4. Formato Estructura del Túnel
5. Tres(3) Cotizaciones y RUT..
6. Una (1)Justificación.

Estaremos atentos a resolver cualquier duda o inquietud al respecto, así mismo complementar la información de acuerdo a sus observaciones.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Ing. Álvaro Hernández
CONSORCIO OBRAS MG
Director de Obra

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 291

Bogotá, 25 de enero de 2023

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo
seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Entrega ACTA PARCIAL No. 11

Cordial saludo.

De la manera más atenta nos permitimos remitir la documentación correspondiente para el trámite del Acta Parcial No. 11 correspondiente al periodo del 04 de diciembre de 2023 al 03 de enero de 2024. La documentación que se anexa es la siguiente:

1. Acta parcial No.11 (en Excel y PDF Firmado)
2. Memorias (en Excel y PDF Firmadas, oficios de aprobación de NP)
3. Memorias (en Excel y PDF Firmadas, oficios de aprobación de NP)

Link de descarga de la información:

https://drive.google.com/drive/folders/1oOe9sFfsOCJ0iCKcbxr4IjU8bwVRxT4r?usp=sharing

Estaremos atentos a resolver cualquier duda o inquietud al respecto, así mismo complementar la información de acuerdo a sus observaciones.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Ing. Álvaro Hernández
C.C. No. 13.741.689
Director de Obra

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 292

Bogotá, 26 de enero de 2023

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo
seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Entrega ACTA PARCIAL No. 11

Cordial saludo.

De la manera más atenta nos permitimos remitir la documentación correspondiente para el trámite del Acta Parcial No. 11 correspondiente al periodo del 04 de diciembre de 2023 al 03 de enero de 2024. La documentación que se anexa es la siguiente:

1. Acta parcial No.11 (en Excel y PDF Firmado)
2. Memorias (en Excel y PDF Firmadas, oficios de aprobación de NP)
3. Memorias (en Excel y PDF Firmadas, oficios de aprobación de NP)
4. Pre factura No. FE XX y Resolución de Facturación.
5. Certificación Bancaria Davicienda Ahorros No. 007700874873.
6. Soporte Parafiscales
7. Registro Único Tributario (RUT) – Registro de Información Tributaria (RIT)
8. Formato Actualización de terceros
9. Cámara de Comercio actualizada Socios
10. Cédulas de los representantes legales de los consorciados y del consorcio
11. FURC (PDF Firmado)
12. Ítems No Previstos Aprobados por la SED

Link de descarga de la información:
https://drive.google.com/drive/folders/1oOe9sFfsOCJ0iCKcbxr4IjU8bwVRxT4r?usp=sharing

Estaremos atentos a resolver cualquier duda o inquietud al respecto, así mismo complementar la información de acuerdo a sus observaciones.

Consorcio
Obras MG

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Ing. Álvaro Hernández
C.C. No. 13.741.689
Director de Obra

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 293

Bogotá, 26 de enero de 2024

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo
seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Respuesta al oficio R1– IMG1-4146203– 45 Observaciones informe No 12 en su componente técnico.

Cordial saludo.

Por medio de la presente se hace la remisión a la Respuesta al oficio R1– IMG1-4146203– 45 Observaciones informe No 12 en su componente técnico.

Se adjunta a este oficio la siguiente información:

- Informe Técnico No.12.
- Anexos.

A través del siguiente link de descarga de la información:

https://drive.google.com/drive/folders/1hEXQbsFOV_AXaCBrMO5EAX1rqND7aXGC?usp=sharing

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Ing. Álvaro Hernández
C.C. No. 13.741.689
Director de Obra

Gmail **CONSORCIO SED DISTRITAL <seddistrital@gmail.com>**

Re: NOVEDADES POR OBRA - MEJORAMIENTOS 2022

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ <cesancheza@educacionbogota.gov.co> 28 de enero de 2024, 11:21 a.m.
Para: CONSORCIO SED DISTRITAL <seddistrital@gmail.com>, EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>, CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cvnieto@educacionbogota.gov.co>, JOSE ALEJANDRO FUENTES CASTELLANOS <jose.fuentes001@educacionbogota.edu.co>, JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA <jvalencia@educacionbogota.gov.co>
CC: JUAN CARLOS CORTES ACOSTA <jccortesa@educacionbogota.edu.co>, "coldicristobalcolo1@educacionbogota.edu.co" <coldicristobalcolo1@educacionbogota.edu.co>

Señores CONSORCIO SED DISTRITAL, en su calidad de supervisores del contratista de obra CONSORCIO OBRAS MG, comedidamente solcito su atención y seguimiento a lo anunciado por el Rector del colegio Cristóbal Colón referente a las sedes A y C.

Quedo atento de sus informes al respecto.

Cordial saludo

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
ARQUITECTO
Apoyo a la Supervisión Mejoramientos 2022
USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO
DCCEE
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3142
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: JOSE ALEJANDRO FUENTES CASTELLANOS <jose.fuentes001@educacionbogota.edu.co>
Enviado: martes, 23 de enero de 2024 04:43 p. m.
Para: CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ <cesancheza@educacionbogota.gov.co>; JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA <jvalencia@educacionbogota.gov.co>
Cc: JUAN CARLOS CORTES ACOSTA <jccortesa@educacionbogota.edu.co>; coldicristobalcolo1@educacionbogota.edu.co <coldicristobalcolo1@educacionbogota.edu.co>
Asunto: NOVEDADES POR OBRA - MEJORAMIENTOS 2022

Buena tarde Arquitecto Carlos y Juan,

En primer lugar, quiero desearles un 2024 muy prospero, con nuevos retos laborales y profesionales; así mismo agradecerles por el apoyo en la gestión realizada en el 2023.

En segundo lugar, doy a conocer las siguientes situaciones identificadas a hoy (23-01-2024):

- Realizado un recorrido en la sede C se identificó en la parte de la huerta, algunos escombros que no fueron retirados de dicha zona al finalizar la obra. Estos son residuos como tuberías y batería sanitaria, se adjuntan imagenes:









- En la Sede A un docente nos reporta riesgo de caída de reja ubicada en la zona de las canchas. Al validar, identificamos que la reja en mención corresponde a la misma que fue damnificada por un golpe dado en su momento por las volquetas que ingresaron en la intervención de las obras de las canchas, es decir fue un daño por parte del contratista. Se adjuntan imágenes:









De acuerdo con lo anterior, se solicita su colaboración para que desde su alcacne se pueda subsanar y/o mitigar lo antes posible dichas novedades.

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Jose Alejandro Fuentes Castellanos
Administrativo Of. Almacén
COLEGIO CRISTOBAL COLÓN (IED).
Jose.fuentes001@educacionbogota.edu.co
Calle 165 # 8A -03 CRISTOBAL norte USAQUEN
Tel: 3147831632
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195
Secretaria de Educación del Distrito-Bogotá D.C.
Av. el Dorado No. 66-63

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener

material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado No

Radicado Nº I-2024-8158
Fecha: 23-01-2024 - 20:28
Folios: 1 Anexos:
Radicador: CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 4RGJP

MEMORANDO

PARA: **MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE**
Oficina de Estudios Previos

DE: **CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ**
Apoyo a la supervisión de contratos

ASUNTO: **REMISIÓN SOLICITUD ESTUDIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No 008. Contratista de obra CONSORCIO OBRA MG, Contratista de Interventoría CONSORCIO SED DISTRITAL. GRUPO 1 MEJORAMIENTOS 2022**

Cordial saludo,


Dentro del proceso de intervención MEJORAMIENTOS 2022, el CONSORCIO OBRAS MG (contrato de obra 4087800 de 2022) presentó listado de ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No Previstos para estudio y aprobación.

El listado anunciado fue estudiado por la Interventoría y a solicitud de la DCCEE (supervisión apoyo a la supervisión) ha sido objeto de la realización de mesas de trabajo en procura de conciliar los diferentes APU en estudio.

El resultado de este trabajo es la solicitud formal mediante oficio No. radicado RL-IMG1-4146203-317, adjunto para su estudio y comentarios.

Por lo anterior, solicito comedidamente procurar mesa de trabajo con la Interventoría y el contratista de obra, con miras a aclarar dudas y agilizar el trámite requerido.

Quedo atento a sus comentarios e instrucciones al respecto.



Arq. CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
Apoyo a la supervisión Usaquén - Teusaquillo -Chapinero
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., 29 de enero de 2024

Radicado Nº S-2024-23571
Fecha: 29-01-2024 - 12:27
Folios: 2 Anexos:
Radicador: LUIS RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ - 2202
Destino: COLEGIO SIMON RODRIGUEZ
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: ZYP1I

Señor
OSCAR ROJAS
Ingeniero
CONSORCIO SEA DISTRITAL
seddistrital@gmail.com
seadistrital@gmail.com
Ciudad,

Asunto: Solicitud informe acciones de interventoría en relación a presunto incumplimiento contratista en adecuación de obras sede C, colegio Simón Rodriguez.

Respetado Señor Rojas,

Reciba un caluroso saludo por parte de la Dirección Local de Educación de Chapinero, nos encontramos altamente preocupados tanto la comunidad educativa como ésta Dirección Local de Educación, por el estado de la obra de adecuación mencionada en el asunto, paso a realizar algunos requerimientos sobre las acciones puntuales y fácticas de la interventoría con respecto al contratista, ya que en visitas realizadas durante la semana pasada por esta Dirección, se encontró ausencia total de trabajadores, cerramiento deficiente (cintas peligro, sin ningún tipo de señalética para una sede que maneja niños y niñas de educación prescolar y Básica), grietas en el muro de ladrillo a la vista, muebles en la zona de construcción, material de los escombros en otros sitios de la sede, entre otras anomalías que se alcanzan a apreciar en las siguientes imágenes:





En atención a lo anterior, los requerimientos puntales son:

1. Copias de los comités de obra realizadas.
2. Copias de los oficios dirigidos por interventoría al contratista en cumplimiento de las funciones de unos y otros; especialmente el informe de las razones y las cuales la obra se encuentra detenida; (evidenciado en la semana del 22 al 26 de enero) y hoy 29 de enero de 2024 a las 8:30 am solo había presencia de un ingeniero y un trabajador
3. Informe de interventoría sobre el plan de obra desarrollado, porcentaje de ejecución, fecha de terminación y entrega de la obra por parte del contratista y copia de la respuesta del contratista a las anomalías encontradas y ya referidas en esta misiva.

Cordialmente,

EDGAR RIVEROS LEAL
Director Local de Educación Chapinero
Proyectó: Rafael Hernández –Auxiliar Administrativo

C.C Dirección de Construcciones Escolares
C.C Colegio Simón Rodriguez

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 294

Bogotá, 03 de febrero de 2024

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo
seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Respuesta al oficio R1– IMG1-4146203– 48 - Requerimiento Colegio Cristóbal Colon A

Cordial saludo.

Dando respuesta al requerimiento del oficio del asunto, correspondiente a la situación de los 5 tanques aéreos de reserva del agua potable de la institución, ubicados en la cubierta del edificio principal, se informa que día de hoy 3 de febrero de 2024 se realizó la respectiva limpieza de los tanques y se taparon tal y como se encontraban antes de la intervención como se muestra en la foto anexa.



ANTES



DESPUES

Consorcio
Obras MG

Por otro lado, informamos que en el transcurso de la otra semana se realizar la desinfección y lavado por una empresa especializada.

Muchas gracias, estaremos informado de cualquier novedad.

Sin otro particular, gradezco su atención.

Cordialmente,



Arq. Rodrigo Becerra
C.C. No. 75´094.542
Residente de Obra

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 297

Bogotá, 7 de febrero de 2024

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo
seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Respuesta oficio RL – IMG1-4146203– 323 - Solicitud de información accidente Colegio Agustín Fernández Sede A

De acuerdo con la solicitud de presentar la documentación que soporta la investigación del accidente de trabajo del señor NARWYS JOSE CHUELLO CHUELLO, con PT No. 43524, el 23 de enero del 2024 en el frente Agustín Fernández sede A, se adjunta los soportes correspondientes.

- Soportes de inspecciones
- Documentación de personal
- Formatos de investigación del Accidente de trabajo
- Procedimientos

Agradezco su atención.

Cordialmente,



Arq. Rodrigo E. Becerra
C.C. No. 75.094.542
Residente de Obra
CONSORCIO OBRAS M.G
