Barranquilla, 01 septiembre de 2025

LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
Supervisor
Ciudad

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES No. 7 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO No. CD-58-2025-0613

Cordial Saludo.

Con la presente hago entrega del informe de actividades **No.7** correspondiente AL SÉPTIMO PAGO DEL CONTRATO No. CD-58-2025-0613**,** cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Atentamente,



_____

ADOLFO JUNIOR MARTINEZ VASQUEZ
CC No 1.140.868.257

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME NUMERO	**7**
CONTRATISTA	**ADOLFO JUNIOR MARTINEZ VASQUEZ**
IDENTIFICACION	**1.140.868.257**
CONTRATO No.	CD-58-2025-0613
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo para la ejecución del Contrato será **HASTA TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025**
SUPERVISOR	**LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO**
DEPENDENCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
PERIODO DE ACTIVIDADES	UN SÉPTIMO PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2025


INFORME

- Asistencia de reuniones comité técnicos de obras, de seguimiento y avance de obra entre el contratista de obra, interventor de obra y El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO LOCAL, EN EL GRAN MALECÓN DEL RÍO Y SUS DESARROLLOS, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".**



- Apoyo en la supervisión técnica del proyecto de obra pública No. LP-028-2024, **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEL**

DEPORTE Y EL DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO LOCAL, EN EL GRAN MALECÓN DEL RÍO Y SUS DESARROLLOS, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

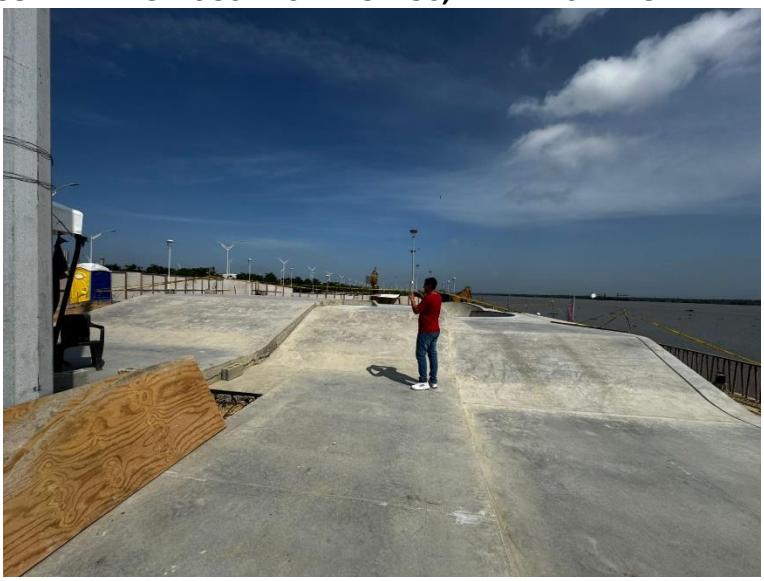

- **SEGUNDA VISITA DE INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE CANCHA MÚLTIPLE Y ESPACIOS RECREATIVOS COMPLEMENTARIOS, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO LA PLAYA, CIUDAD DE BARRANQUILLA.**



- Control y Gestión documental del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO LOCAL, EN EL GRAN MALECÓN DEL RÍO Y SUS DESARROLLOS, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".**
- Visita técnica de la pista de ciclo montañismo, para identificar que actividades se realizan teniendo en cuenta el contrato de telecomunicaciones.



- Apoyo en los informes técnicos de avances mensuales del mes de julio, de convenios de infraestructura entre el Ministerio Del Deporte y El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: ATC-PR-003
		Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE JULIO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº 1058 DE_2021_ SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Objeto del Convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA ".						
Valor del Convenio:	$ 32,152,266,035.00	Aporte de MINDEPORTE		$ 16,402,992,157.00		Aporte del Municipio:	$ 15,749,273,878.00
Valor Adición:	$ 4,608,319,847.41	Adición por Mindeporte		$ 348,769,960.00		Adición por el municipio	$ 4,259,549,887.41
Valor Total:	$ 36,760,585,882.41			$ 16,751,762,117.00			$ 20,008,823,765.41
Plazo de Ejecución:	39 meses y 7 días	Suspensión 1	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 1	Hasta el 31 de octubre de 2023
Fecha de Inicio:	27 de octubre de 2021	Suspensión 2	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 2	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Vencimiento:	6 de febrero de 2025	Suspensión 3	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 3	Hasta el 30 de abril de 2024
		Suspensión 4	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 4	Hasta el 06 de febrero de 2025
		Suspensión 5	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 5	N/A
		Suspensión 6	N/A	Reinicio:	N/A	Plazo Actualizado	Hasta el 06 de febrero de 2025
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
SEGUROS DEL ESTADO	Desde 27/10/2021		Hasta 30/06/2024	$ 6,430,453,207.00		Hasta 6/08/2025	$ 7,158,039,742.48

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	45	Período comprendido entre el	1 de JULIO de 2025	y el	31 de JULIO del 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA				
Localización	BARRANQUILLA, BARRIO MIRAMAR				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA/ GERENCIA INTEGRAL	
Objeto:	"LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA"	Objeto:	GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA / CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA
Contrato Nº:	3-1-102452 COI 1364-03	Contrato Nº:	CD-58-2021-4425 / EDU-269-2022
Contratista:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR	Contratista:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. (EDUBAR SA) / CONSORCIO SENDEROS 2021
Plazo Inicial:	QUINCE (15) MESES	Plazo Inicial:	13 MESES / HASTA 31/12/2022
Fecha de Inicio Etapa I:	8 de abril de 2022	Fecha de Inicio:	25 de noviembre de 2021 / 9 de Junio de 2022
*Fecha de Suspensión No. 1:	8 de mayo de 2022	*Fecha de Suspensión No. 1:	del 30/10/2023 a 31/10/2023 - del 30/10/23 a 01/11/2023
*Fecha de Reinicio No. 1:	8 de junio de 2022	*Fecha de Reinicio No. 1:	1 de noviembre de 2023 / 02 de noviembre de 2023
Inicio etapa 2:	9 de junio de 2022	*Fecha de Suspensión No. 2:	28 de diciembre del 2023 / 15 de diciembre del 2023

Página 1 de 46

- Asistencia a comités internos para control y seguimiento de actividades asignadas por mi supervisor Luis Restrepo.

ADOLFO JUNIOR MARTINEZ VASQUEZ
CC No 1.140.868.257
