CONTRATO
002-00-F-CACOM-3 GRUA-2025

OBJETO DEL PROYECTO

Mantenimiento Recuperativo Infraestructura y Equipos Ayo Nauticos Alojamientos Militares/Casados DEL CACOM 3, MANTENIMIENTO Interruptores Radar, y MANTENIMIENTO Bienes Inmuebles CACOM-3 y RADAR

CONTRATISTA
NAVUSSY
NIT 901.109.885-1

INTERVENTORIA
CONTRATO
038-00-F CACOM-3-GRUA2-2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO CONSORCIO INTERSEXES 4
NIT 901.951.511-0

10-07-2025

Se Hace ingreso al Batallon con el fin de Hacer reconocimiento delos sitios donde se van a ejecutar las labores, se inicia recorrido en compañia del supervisor del contrato, se inicia a verificar Actividades en los diferentes Puntos Para Hacer la toma de inicio de labores

Ing Residente

11-07-2025

se continua Recorrido con la supervision se verifica cantidades y se da inicio ala revision de los documentos necesarios para el ingreso de Personal y vehiculos con materiales, se Revisan las areas a intervenir; se da inicio ala Logistica Para Poder iniciar a realizar las mediciones para el Balance del Proyecto

Ing Residente

12-07-2025

Se continua con la logistica para iniciar labores, se continua con la verificación de las actividades en cada uno de los items mediciones y Replanteos de cada actividad

Ing Residente

15-07-2025

Alojamiento Soldados:

Dia Soleado

Personal 1 Arq Residente, 1 HSQ, 2 Oficiales, 3 Ayudantes de obra; Localizacion y Replanteo del Area ~~de~~ Intervención, Desmonte de divisiones de Ducteas, Desmonte de Cielo Rasos, Estructura Metalica, Demolicion encuentros de Muros

Arq Residente Obra

Interventora

16-07-2025

Dia Soleado:

Personal: 1 Arq Residente de obra, 1 HSQ, 2 Oficiales, 3 ayudantes de obra.

Alojamiento Soldados: Desmonte de aparatos Sanitarios; Desmonte de cielo raso incluye estructura, Demolición encuentros de Muros y Pisos, Retiro de escombros y Aparatos Retirados a Punto de acopio.

Arq Residente Obra

Interventora

17-07-2025 Alojamiento Soldados

Desmonte cielo raso incluye estructura; Demolición encuentros Muros y Pisos, Retiro de escombros a Punto de acopio; Descargue camion tipo NPR, Andamios certificados, Herramientas varias, Escalera Metalicas personal: 1 Arq Residente de Obra, 1 HSQ, 2 Oficiales, 3 ayudantes de obra.

Arq Residente Obra

18-07-2025
Dia soleado
Personal 1 Arq Residente, 1 HSQ, 2 oficiales, 3 Ayudantes de obra
Alojamiento soldados
Responsable de Estructura ciclo Losa, continuan demolicion encharpe Muros y Pisos, Retiro de escombros A Punto de Acopio, se organizan los Andamios certificados en Punto Autorizados, se reciben materiales, Cemento, Polisombra, Malla Impermeabilizante, casetillas, Herramientas Varias

Arq Residente Obra

Interventoria

19-07-2025
Dia soleado
Personal 1 arq Residente, 1 HSQ, 2 oficiales, 3 Ayudantes de obra
Alojamiento soldados
Demolicion encharpe Muros y Pisos, Retiro de escombros al Punto de acopio
se realiza el levantamiento de Medidas en Alojamiento oficiales Casados

Residente Interventoria hace reconocimiento del Arq Residente Obra area de Trabajo. Alojamiento. y Baños soldados Verifica Cantidades de obra

Interventoria

21-07-2025
DIA soleado
Personal de obra 1 Arq Residente, 1 HSQ, Maestro obra, 2 oficiales de obra, 3 Ayudantes de obra;

Alojamiento Soldados — 3 a Soldados

Desmonte de aparatos sanitarios, divisiones de ducto y Demolición de enchapes de Muros y Piso. Desmonte de ventanería en aluminio Baño, Retiro de escombros al Punto de acopio, se continuan la verificación y Ejecución de Actas de verdad correspondientes a cada area a intervenir. Retiro de camarotes y colchonetes de Alojamiento

1 Arq Residente Obra — Personal de obra, 1 Arq residente 1 HSQ, Maestro de obra; Oficiales de obra Ayudantes de obra.

1 Arq Residente Obra

Interventoria

22-07-2025

Dia Soleado

Personal en obra 1 Residente de obra; 1 Aux Maestro de obra, 2 Oficiales de obra, 3 Ayudantes de obra

Alojamiento Soldados

Demolición de enchapes Muros y Piso, Mantenimiento de cubierta y Viga canal, Desmonte de ventanería de Aluminio, traslado de escombros al Punto de ACOPIO

Bateria de Baños

Baño comando: Localización y replanteo Area a intervenir; Desmonte de Aparatos sanitarios Lavamanos, Sanitarios, orinales, Divisiones Acero inoxidable

Comite de obra con el supervisor; Interventoria y contratista

Retiro de aparatos y divisiones a Punto

de acopio. : Intervención acta apertura de frente de Trabajo en baños comando. Hombres y Damas, se solicita a Contratista apertura de otros frentes de Trabajo De acuerdo programación de obra

Arq Residente obra.

Interventoría

23-07-2025

Dia Soleado

Personal en obra: Residente obra; 1 HSQ, Maestro de obra; 2 oficiales de obra; 3 Ayudantes de obra; 1 Inspector de obra

Alojamiento Soldados

Excavificado de Muros Baños; Mantenimiento de Cubierta Lavado, Viga canal Lavado y Retiro Material organico, Retiro de escombros y material organico al Punto de Acopio

Bateria Baños

Baños Comando Demolición enchape de Muros; Desmonte de divisiones de Baños; Espejos, Aparatos Sanitarios; Puertas, Cielo rasos Dry-wall; Desmonte de laminas, Desmonte enchape Pisos

Comite de obra con supervisión e interventoria Contratista, Realización Actas de seguridad

Arq Residente obra: Intervención solicita programación de obra y actas de seguridad de cada uno de los frentes a intervenir. para hacer Seguimiento en Tiempo y espacio.

Interventoría

4-07-2025

Dia Soleado

Personal en obra Residente obra; 1 HSQ; Residente obra; 3 Maestro de obra, oficiales de obra; 5 Ayudantes de obra

Alojamiento soldados

Escarificación, Limpieza y Resanado Muros fachadas, Lavada con Hidrolavadora; Mantenimiento de cubiertas y vigas canal; demolición de Paneles Muros internos Alojamiento y Baños, Traslado de escombros al Punto de acopio, se continuan la verificación y Realización de Actas de vecindad

Batería de Baños

Baños Inteligencia Hombres Desmonte de divisiones sanitarios y ocinales, desmonte de sanitarios, Lavamanos y ocinales, Espejos, Demolición enchape de muros, Retiro de Aparatos Sanitarios A Punto de Acopio

Baños comando

Retiro de escombros a Punto de acopio

Trabajo en Alturas SST interventoria solicita certificados de Arq Residente de obra los equipos de seguridad (arnesos, Arnes, lineas de vida). Arq interventoria avala apertura de otro frente de trabajo. Baños inteligencia

Interventoria

25-07-2025

Dia Soleado.

Personal en obra 1 Arq Residente de obra; 1 HSE, 1 Inspector de obra, 3 Maestro de obra, 6 oficiales de obra, 6 Ayudantes de obra

1-Alojamiento Soldados

Escarificado, Resanado y Lavado Muros Fachada Mantenimiento de cubierta; Demolición Panete Muros internos Alojamiento y Baños; Retiro de escombros al Punto de acopio.

Batería de Baños

2-Baños comando Retiro de escombros al Punto de acopio.

3-Baños Inteligencia Demolición enchapes de Pisos, demolición de mesones Lavamanos; Demolición Bateria Piso, se inicia a desmontar Puntos Hidraulicos y Sanitarios; Retiro de

Escombros al Punto de Acopio
Alojamiento Cascos Oficiales casa 7
Desmonte cielo raso eternit incluye la estructura de aluminio, Demolición Pisos cerámica sala, cocina, Desmonte Puertas cocina y Alcobas, Desmonte Mueble superior cocina; Retiro escombro Punto acopio (gomas)
4 Auto motores Desmonte Aparatos Sanitarios Demolición enchape muros Baño, Ducha y vestier, Desmonte de 3 Puntos de Iluminación Desmonte ofinal espejo y Divisiones Baño Desmonte de cielo raso Ducha y vestier, Reparación de fugas hidraulicas en Ducha, Retiro de escombros y aparatos sanitarios a Punto Acopio
Interventoria solicita nuevamente la documentación pendiente por entregar (programación ejecutadas de Desunda y Babaco) a la fecha no an sido entregados. Se solicita al Contratista mantener los frentes de Trabajos activos, hay areas q' quedan inactivas habiendo actividades por ejecutar. Interventoria
26-07-2025
Dia soleado
Personal obra 1 Arq Residente obra, 1 HSE, 4 Maestro de obra, 7 oficiales de obra, 7 Ayudantes de obra;
Alojamiento Soldados
Escarificación muros internos Baños, Pañetes mal estado muros Lavamanos Segunda Capa
Retiro de escombros al Punto de Acopio
Bateria Baños
Baños comando
Escarificación de Pañetes muros y Pisos Placa
Retiro de escombros al Punto acopio, Desmonte de Red Hidro sanitaria
Baños - Inteligencia Hombres
Desmonte cielo raso PVC; Demolición

Plantilla (Placa) contrapiso, Retiro de escombros a Punto acopio

Baños Grod

Desmonte de estructura de cielo raso; Demolición enchape Muros y Pisos; Demolición Plantilla Piso (Placa) mal estado Traslado escombros al Punto de acopio

Automotores

Desmonte de cielo raso Estructura; Demolición enchape Pisos y Paredes, Reparación Fuga de Agua; Retiro escombros al Punto de acopio

Alojamiento oficiales casados

Desmonte Cielo Rasos en eternit Laminas eternit incluye estructura; Desmonte de Puerta de la Cocina y 3 de alcobas; Demolición Paredes mal estado en Patio, Demolición enchape cerámica Pisos sala cocina labores, Hall y Alcobas, Demolición Plantilla mal estado (Placa contrapiso) Retiro de escombros al Punto acopio.

Frentes de trabajo baños grod, intalaciones hidrosanitarias y electricas) fechados aloamiento Arq Residente Obra por ejecutar. (excavacion paredes, desmonte redes por bop periodo de Tiempo con actividades solados estructuras inicio por certificación interventoria 28-07-2025

Dia solrado

Personal obra 1 Arq Residente, 1 HSQ, 1 inspector obra 4 Maestros de obra, 5 oficiales de obra, 10 Ayudantes de obra...)

Alojamiento oficiales casados C-7

Desmonte de aparatos sanitarios Lavamanos sanitarios, Divisiones en aluminio y Acrilico Demolición de enchapes Muros y Pisos de Baños; Demolicion Placa contrapiso; Escarificación (demolición) Muros Patio,

Frentes Arq Residente

Alojamiento Soldados
Escarificación De Pañete (Demolición) sobre Muro
Trasiego de escombros al punto de acopio
Baleria Baños
Escarificación De Pañete sobre Muros (Demolición)
Demolición Placa Contrapiso Baños, Retiro de
Escombros Al Punto de Acopio; ———
BAÑOS comando
Demolición Placa contrapiso, Retiro de Escombros al Punto de Acopio. ———
Baños Inteligencia Hombres
Demolición Placa Contrapiso Escarificación, Retiro de escombros al Punto de Acopio.
Autonomos
Demolición cerámica Roja tipo Piso taller latonería y taller Pintura, Escarificación de Placa Contrapiso en los dos talleres, Demolición Ciclo Tubos aluminio y laminas electrif.

Arq Residente Obra

Interventoría

29-07-2025
Día Laborado
Personal en Obra. 1 Arq Residente Obra, 1 Maestro 1 Inspector obra, Maestros, Oficiales, Ayudantes de obra
Alojamiento oficiales cuadro
Desmonte de Aparatos sanitarios, Lavamanos sanitario, división de ducha en aluminio y Acrilico Baño Alcoba Principal, Demolición enchape muros y Pisos, Demolición Placa Contra Piso, Demolición Pañete sobre muros

Alojamiento soldados
Escarificación de Pañetes sobre muros (Demolición) en Baños y Alojamiento, Retiro de Escombros al Punto de Acopio.

Automotores
Demolición de Placa de contrapiso, Retiro de escombros al Punto de Acopio.
Llegan materiales Hidro sanitarios (Tuberías y Accesorios), Cascrilla, Boquillera, Herramienta menor varias material para obra y Pintura Tubos, Lijas Rodillos varios, se realizan cerramientos con Polisombra verde a Punto de Acopio Escombros, llega un viaje de 6 mts de arenadería para concretos y Alistados.

Intervventoría.

30-07-2025
Día
Personal en obra; 1 Arq Residente, 1 HSQ, 1 Ingeniero de obra, 4 Maestros, 5 oficiales, 10 Ayudantes de obra.

Alojamiento soldados
Escarificación de superficies muros Parte superior Alojamiento, Demolición de 2 cabeza de Pañete suelto en Baños y alojamiento, Retiro escombros al Punto de acopio

Batería de Baños
Baños comando
Suministro e instalación de Registro de 1", desmonte tubería sanitarias de 2" y 4"; Desmonte de tubería Hidraulica, suministros e instalación Puntos sanitarios de 2" y 4", Pañetes impermeabilizado Baño Damas, Retiro escombros al Punto

de acopio

Baños inteligencia

Demonte de tuberias de 2" y 4" sanitarias, Reti-
ro escombros al Punto de acopio

Baños Gral


Escarificación muros Parte Superior

Auto motores

Escarificación muros en ducha y vestier, des-
monte de 3 ventanas en aluminio Gudo

Alojamiento oficiales Sabados

Escarificación muros, Demolición de enchapes
Pisos Baño, Retiro escombros al Punto de
Acopio

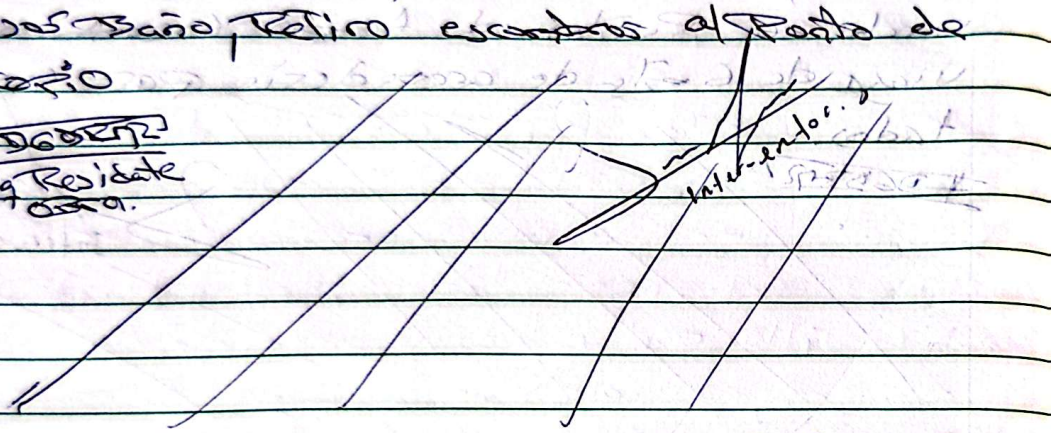


Arq Residente
Obra.

31-07-2025

Dia Soleado, sensación termica

Personal en obra 1 Residente de obra, 1 HSEQ, 1 Inspector de obra, 4 Maestros de obra, 8 Oficiales de obra, 13 Ayudantes de obra

Nota: Baño hombre de inteligencia se evidencian muro No confinado con viga intermedia, el cual presenta una condicion insegura por desprendimiento (caida) de muro. En Reunion con el contratista, interventoria tecnica y Supervision de proyecto, se realza desmonte cielo raso para verificar las condiciones anteriormente dichas, se tomo la decision de realizar la Demolicion del muro con andamio. Se deja plasmada las medidas correspondiente de area.

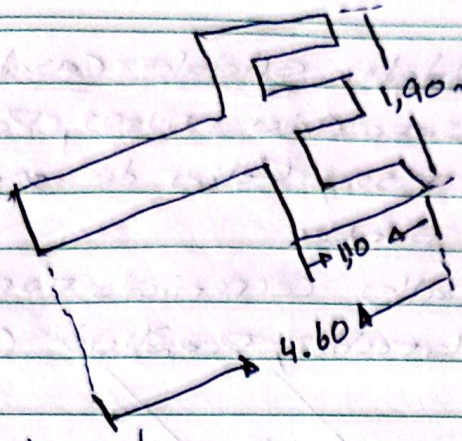

Nota interventoria: No se evidencia, el Registro diario de actividades del presente dia 31/07/2025

Interventoria.

1-08-2025

Dia soleado Sensación Térmica 43°

Personal en obra 1 Ing Residente, 1 HSE, 1 Inspector de obra 4 Maestros, 8 oficiales, 13 Ayudantes

Alojamiento soldados

se continua excavificado de sobre filos muros (retiro 2 cara Posterior); Demolición de Pañetes, se iniciaron los Pañetes de muros con impermeabilizante, y una capa de mortero impermeabilizado (Retacondal);

Batería de Baños Baño comando

Suministro e instalación de tuberías Sanitarias 2" y 4" Puntos nuevo sanitarios de 2" y 4", Pañete impermeabilizado en muros.

Baños inteligencia

Desmonte de tuberías de 2" y 4", retiro de escombros

Baños Grupal

Escarificado de superficie muros parte superior, Retiro de escombros

Automatores

Escarificado muros parte superior muros en Baños + rejillas

Alojamiento Soldados Oficiales Casados C-7
Escarificado de superficies muros, Demolición de enchapes muros y pisos, Relleno de escombros, MURO cerramiento Bonkes
Desmonte de malla, cerramiento muros, Demolición muros antiguos, Demolición Columnas en concreto.

Nota interventoria: Se realiza aclaracion que el baño Grual el dia de hoy 01/08/2025, No se realizo ninguna actividad, De igual forma en automotores en taller 1 y 2 No se realizo Ninguna actividad de obra civil. Se retira el compromiso de las protect de madera de los tubos de combustibles.
En automores se evidencia intervencion a corte de fluido electrico en oficina y cuartos.

31-07-2025
Alojamiento soldados
Escarificación de superficies muros Alojamiento y Baños Pintores que salieron debajo de los Baños Resiego de escombros al Punto de Acopio
Bateria de Baños
Baños comando
Suministro e instalación de tuberias sanitarias de 2" y 4", Puntos sanitarios de 2" y 4" Baños Hombres; Baños impermeabilizados
Baños inteligencia
Desmonte de tuberias sanitarias de 2" y 4", Hidraulicas, se decisma en conjunto con interventoria, supervisión y contratista la demolición del segundo de mampara y el muro que aparecio producto de una intervención anterior, esta demolición se justifica ya que genera una condición insegura, se deja

Plasmado en Bitacora

Alojamiento oficiales casados

Excarificación de superficies muros; Demolición de enchapes de muros y Pisos, Retiro de escombros A Punto de Acopio.

Complejo de combustible (Bunker)

Demolición muros Antepechos cercamiento, Desmonte de Mallas; Retiro de escombros a Punto de acopio-

01-08-2025

Esta consignada en Hoja #13

02-08-2025

Alojamiento de soldados

Escarificación de superficies muros, demolición de Paret. tes, se inicia Paretes muros impermeabilización con impermeabilizante y cemento(mortero), retiro de Escombro,

Batería de Baños

Baños comando

INSTalaciones Hidraulicas y Sanitarios, Pruevas en Punt. sanitarios de 2" y de 4", Paretes impermeabilizados

Baños comando

Desmonte de cielo raso-Dry-wall y demolición muro fa- tante de antiguo INTervención, Retiro de escombros al Punto de acopio

Baños Inteligencia

Demolición muro flotante, Retiro de escombros al Punto de acopio.

Automatas

Corte y Desmonte de malla eslabonada

Muro cerramiento complejo combustible (Bankes)
Desmonte de malla, Demolición muro Antes.
Picado, Retiro de escombros
Ingeniero
Personal en obra 1 Residente de obra, 1 Residente sisoma (HSQ)
1 Inspector de obra, 4 Maestros de obra, 16 Oficiales de obra,
13 Ayudantes de obra

04-08-2025
Dia soleado 38 sensación Térmica 43°
Personal en obra, 1 Arq Residente, 1 HSQ,
1 Inspector de obra, 4 maestros, 4 oficiales
16 Ayudantes
Alojamiento soldados
se continua con excarificación de muros, Demolición de Rañetes, Rañete impermeabilizado muros Alojamiento, Excavación manual para muros, Acarreo de escombros al Punto de Acopio
Baños Inteligencia
Baños Duros Desmonte de cerámicas, sanitarios, Lavamanos, divisiones, Sanitarios
Desmonte de espejos
Baño Hombres Retiro de escombros al Punto de Acopio
Auto motores corte y desmonte de Malla eslabonada, rañetes impermeabilizados en baño, Ducha y Vestier, Demolición de Antepechos
Alojamiento Oficiales Casados
Excarificación de superficies muros, Rañetes en cocina y Baños.

Muro cerramiento complejo combustible
Demolición de muro antepecho
Retiro de escombros al Punto
Ingeniero
Arq Residente

5-08-2025
Dia soleado 35° sensación
Personal en obra, 1 Arq Re-
tor de obra, 5 Maestros, 16 A
llegada de 2 carretillas, 2 Bac
cerámica Raca Muro y Pisos
Alojamiento soldados
Excarificación de superficies m
de Rañete, Rañetes muros Ale
bros al Punto de Acopio, Exc
Manual.
Batería de Baños
Baños inteligencia, Duchas, C
1/2", tubería de PVC de 1/2"
Baño damas Desmonte de c
Autoamotores
Escarificado de superficies mu
Desmonte de malla eslabonada,
tario, Ducha y Vestier; Demoli
cerramiento.
Alojamiento oficiales casados
Escarificado de superficies mu
Muro Patio, se inicia a exc
cajos para las instalacion
Muro cerramiento complejo co

Demolición de muro cerra

Muro cerramiento complejo deportivo
Demolición de muro antepecho, Desmonte de malla
Retiro de escombros al Punto de acopio

Arq Residente

Interventor

5-08-2025
Dia soleado 35° sensación térmica 42°
Personal en obra, 1 Arq Residente, 1 HSQS; 1 Inspector de obra, 5 Maestros, 16 Ayudantes, 6 Oficiales
llegada de 2 carretillas, 2 Barras de 16 Libras, Muestra cerámica Para Muro y Pisos Baños,
Alojamiento Soldados
Escarificación de superficies muros, demolición 2da Capa de Pañete, Pañales muros Alojamiento, trasiego de Escombros al Punto de Acopio, Impermeación de muros con Acroral.
Batería de Baños
Baños inteligencia, Duchas, Puntos hidraulicos de 1/2", tubería de PVC de 1/2" en Baños Hombres Baño damas Desmonte de aparatos Sanitarios
Automotores
Escarificado de superficies muros Talleres y Baños; Desmonte de malla, eslabonada, Pañete en baño sanitario, Ducha y Vestier; Demolición muro antepecho cerramiento.
Alojamiento oficiales casados
Escarificado de superficies muros, Demolición Pañete Muro Patio, se inicia a instalar la tubería y los cajos Para las instalaciones electricas
Muro cerramiento acopio Combustible (Bonkes)

Demolición de muro cerramiento Antepecho

Retiro de escombros Al Punto de Acopio

Ing Residente

Intervendido

6-08-2025

Dia soleado 37 Sensación Termica 40°

Personal en obra 1 Arq Residente de obra; 1 HSEQ; 1 Inspector de obra, 5 Maestros, 6 oficiales, 17 Ayudantes de obra;

Alojamiento de soldados

Demolición segunda capa de Pañete en sector sanitarios; se continuan con Pañetes de Muros en Alojamiento, traslado de escombros al Punto de Acopio.

Bateria Baños

Baños Damas inteligencia: Demolición muros de muros, Demolición muro acero por Riesgo de Accidente Producto de Anteriores intervenciones.

Baños Hombres inteligencia, Resanes de instalaciones sanitarias de 2" y 4", Regatas Para las nuevas instalaciones sanitarias, Retiro de escombros al Punto de Acopio.

Baños General

Baños Hombres

Instalación de tuberias de 1/2 y 1", se conforman Puntos de distribucion Hidraulica de 1/2".

Automatones

Escarificación de superficies muros talleres, Pañetes impermeabilizados en baño, Sanitario, Ducha y vestier

Alojamiento Oficiales Casados
Demolición Paredes en Baños y muros de Patio
Pared ya impermeabilizada en muros de Patio, extr
dida de tubería y cajas de Pozo Redes eléctricas bajo
techo
Muro cerramiento complejo contabilidad (Bomba)
Demolición de muro antepecho cerramiento, Retiro de
escombros al Punto de Acopio
Firmado
Arq Residente

Intervenido...

08-08-2023
Día Soleado 37° / Sensación Térmica 43°
Personal en obra 1 Arq Residente, 1 Hseq. y 1 inspect
de obra, 5 Maestros, 8 oficiales, 72 Ayudantes.
Alojamiento Soldados
se continua con actividad de Paredes en el alojam.
entre Paredes en Baños sobre Pared ya impermeabilizado, traslado de escombros al Punto de Acopio
Batería de Baños
Baños Inteligencia Damas Retiro de escombros al Punto de Acopio, Baños Hombres se inician a configurar las instalaciones sanitarias en 2" y 4" para sanitarios, orinales y lavamanos.
GENERAL
Baños Damas: Escarificación de muros parte superior Baños Hombres: Pared impermeabilizado muros.
Automatores: Retiro de escombros al Punto de Acopio.
Alojamiento Oficiales CASADOS
Pared ya impermeabilizado en Patio y Baño alcal

Principal, excavación para retiro de tuberías sanitarias para cambio.
Muro cerramiento empleo combustible (Bunker)
Excavación para viga cimiento de cerramiento.
Muro Costado Posterior, el izquierdo se realiza la demolición completa hasta llegar a la viga existente.

Arq Residente.

.

.

.

.

.9-08-2025

Dia soleado 35° Sensación térmica

Personal en obra 1 Arq. Residente; 1 HSQS, 1 Inspector de obra; 4 Maestros, 7 oficiales, 11 Ayudantes.

Alojamiento soldados
se continua con Pañetes impermeabilizados en baños; Pañetes en Alojamiento filos; Retiro de escombros al punto de Acopio.

Batería Baños
Baños Hombres se continua con instalaciones sanitarias de 2" y de 4"
Baños Mujeres
Baños Damas: Escarificación de superficies muros pared superior;
Baños Hombres; se continua con afinidad Pañete impermeabilizado muros
Autonatores
se continua escarificado de muros, se instala tendido de tubería y cajas para instalaciones eléctricas

Arq Residente

Se evidencia cerramiento impactado por cuantificación de balance de obras

11-08-2025

Dia soleado 37° sensación térmica 43°

Personal en obra 1 Arq Residente, 1 HSQS, 1 Inspector de obra, ~~Hay~~ maestros, oficiales, Ayudantes de obra

Alojamiento soldados: Se desistalo tubería aerea con cableado, y se desistalo estructura cielo raso.

Batería de baños:

Armado de grada en baño de hombres y se continua con excavación para tubería en baño de mujeres.

Baños Gral:

Baños de Panas: Se continuo con escarificación superficies de muros parte superior, y Pañete impermedibizado en muros.

Baño de hombres: Se continua con actividad de pañete impermedibilizado muros.

Automotores: Se continua desistalación de tubería y capas para instalación eléctrica.

Casa de oficiales casados: Se desmonto tubería hidraulica y se instalo tubería de 4" del registro hacia dentro

Ingeniero Residente Arq

Bunker: Pañete en muro de cerramiento

Interventor

12-08-2025

Día Soleado 38° Sensación termica 43°

Personal en obra 1 Arq Residente, 1 HSQS, 1 Inspector de obra, Maestros, oficiales, Ayudantes

Alojamiento de Soldados:
Se empieza estucado en muros y pañete en techos de baños
Baterías de Baños:
Baños Hombres:
Instalación se continua de tuberías sanitarias y de presión
Baños mujeres:
Se instala tubería sanitaria y de presión
Baños Gracal:
Baños de hombre: Pañete impermeabilizado terminado en muros
Baños de mujeres: Se continua con escarificación de muros
Automotores:
Se continua con escarificación en muros, instalación de tubería conduit e instalación de redes eléctricas
Casa de oficiales casados:
Instalación de tuberías conduit, e instalaciones de redes eléctrica en todo la casa.
Baño comando inactivos por falta de ensayos y por diseño de concreto

13-08-2025
Día Soleado Sensación termica 43°
Personal en obra 1 Arq. Residente, 1 HSEQS, 1 Inspector de obra; Maestros, Oficiales, Ayudantes.
Alojamiento de Soldados: Se continua con pañetes en baños se termina de estucar y toma de filos en ventanas
Batería de Baños:
Baños Hombres: Se continua con la instalación de tubería sanitaria.
Baños Mujeres: Se continua con instalación de tubería sanitaria y de presión
Automotores: Se continua con escarificación y la instalación de tubería conduit y redes eléctricas
Casa de Oficiales Casados: Se continua con la instalación de redes eléctricas en toda la casa.

14-08-2025
Día Soleado 35° Sensación
Personal en obra 1 Arq Residente
Alojamiento de Soldados: Se continua de enchape y dismante de sanitario, se
existente y se termina de estucar.
Baterías de Baños:
Baños mujeres Inteligencia: Se continua
sanitaria y de presión.
Baños Gracal:
Baños mujeres: Se continua con pa
Automotores: Se estuca en oficinas y
de redes y tubería eléctrica
Casa de Oficiales Casados: Se instala pant
se continua con redes eléctricas.
Bunker: Se empieza excavaciones de
acero
No.: Se Recomien
adecuado de estu
y columnas con c
en los apu del p

15-08-2025
Día Soleado 33° Sensación term
Personal en obra 1 Arq Residente,
obra, Maestros, Oficiales, Ayudant

Powered by CamScanner

eléctricas en toda la casa.

Ing Residente
Interventor.

14-08-2025

Día Soleado 35° Sensación térmica 40°

Personal en obra 1 Arq Residente, 1 HSQS; 1 Inspector de obra, Maestros, Oficiales, Ayudantes.

Alzamiento de Soldados: Se continua con pañete en baños y demolición de enchape y desmonte de sanitario, se desmonta tubería de presión existente y se termina de estocar.

Baterías de Baños:

Baños mujeres Inteligencia: Se continua con la instalación de tubería sanitaria y de presión.

Baños Civil:

Baños mujeres: Se continua con pañete impermeabilizado

Automotores: Se estuca en oficinas y se continua con la instalación de redes y tubería eléctrica.

Casa de Oficiales Casados: Se instala puntos sanitarios en baños y se continua con redes eléctricas.

Bonker: Se empieza excavaciones de zapatas y figurado de acero

Nota: Se Recomienda realizar el procedimiento adecuado de estuco en los filos de vano y columnas con cinta metalica especificada en los apu del proyecto

Ing Residente
Interventor

15-08-2025

Día Soleado 33° Sensación térmica 35°

Personal en obra 1 Arq Residente 1 HSQS, 1 Inspector de obra, Maestros, Oficiales, Ayudantes.

Powered by CamScanner

Alojamiento de Soldados: Se continua con el retiro de tubería de presión, se continua con el estucado de los loquets.
Baterías de Baños:
Baño de hombres Inteligencia: Se empieza con el pañete impermeabilizado.
Baño de mujeres Inteligencia: Se continua con el instalado de tubería sanitaria y tubería de presión.
Automotores: Se continua con el estucado de las oficinas y con la instalación de redes eléctricas.
Casa de Oficiales Casados: Se empieza con el estucado y se continua con la instalación de redes eléctricas

Se evidencio Riesgo electrico en el area de automores el cual se le Notifico al contratista sst a cargo haciendo caso omiso a las recomendaciones y toma de accion para mitigar los Riesgo latentes.

Interventoria

16-08-2025
Dia soleado 30° sensación térmica 35°
Personal en obra 1 Arq Residente, 1 HSEQ, 1 inspector de obra, 5 maestros, oficiales Ayudantes de obra.
Alojamiento de Soldados: Se continua con pañete impermeabilizado y con regatas para tuberías sanitarias.
Baterías de Baños:
Baño de hombres inteligencia: Se continua con pañete impermeabilizado
Baño de mujeres inteligencia: Se continua con la instalación de tubería sanitaria y tubería de presión
Automotores: Se continua con el estucado de oficinas y con el cableado eléctrico.
Bunker: Se continua con excavación de zapatas y vigas de cimentación
Casa de oficiales casados, Se continua con la instalación de tubería

de presión y se continua con el estucado.

19-08-2025
Día Soleado 32° Sensación termica 36°
Personal en obra 1 Arq Residente, 1 HSQS, 1 Inspector de obra, 5 Maestros, Oficiales, Ayudantes de obras.
Alojamiento de Soldados: Se continua con estucado en locales. - se continua con el desmonte de tuberia sanitaria existente de 2" y 4".
Baterias de Baños:
Baños de hombres Inteligencia: Se continua con instalación de tuberia de presión y se deja puesta bomba para su respectiva prueba
Baño de Mujeres Inteligencia: Se continua con pañete impermeabilizado
Automotores: Se continua con estucado en las oficinas, se continua con instalación de cable electrico.
Bunker: Se continua con pertilena en excavación de zapatas y vigas, se continua con armado de acero.
Casa de Oficiales casados: Se continua con estucado en el area y se continua con instalación de redes electricas.

20-08-2025
Día Soleado 30° Sensación termica 39°
Personal en obra 1 Arq Residente, 1 HSQS, 1 Inspector de obra, 4 Maestros, Oficiales, Ayudantes.
Alojamiento de Soldados: Se continua con regadas en baños y se continua

con desmonte de tubería sanitaria de 2" y 4" existente.

Baterías de baños:

Baño de hombres Inteligencia: Se libera tubería de presión junto con interventoría. y de tubería sanitaria.

Baño de mujeres Inteligencia: Se continua con pañete de impermeabilizado y se libera tubería sanitaria junto con interventoría.

Baños comandos hombres y mujeres: Se realiza prueba de tubería de presión y tubería sanitaria.

Automotores: Se continua con estucado de oficinas.

Casa de Oficiales Casados: Se continua con estucado en habitaciones.

Dragón 1:

Apto 303: Se empieza a intervenir, se realiza con desmonte de cielo raso, desmonte de puertas y de espejos de baños. Notifi prueba de estanquido en casa 7° No cumple, se solicita corrección de la misma.

Ing Residente.

21-08-2025

Día soleado sensación térmica Personal en obra Residente de obra, Inspector de obra, Maestros, Oficiales Ayudantes de obra.
