
Cronograma de Interventoría para la Conservación de la Malla Vial Rural Principal y/o Primaria, en la ciudad de Bogotá D.C. - Zona 1

Id	EDT	Nombre de la Actividad	DURACIÓN.
0	0	**Cronograma de Interventoría para la Conservación de la Malla Vial Rural, en la ciudad de Bogotá. VIGENCIAS 2025 - 2027**	
1	1	**INTERVENTORIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL ZONA 1, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, VIGENCIAS 2025-2027.**	**24 MESES**
2	1.1	Revisión y aprobacion Hojas de Vida del Recurso Humano Mínimo de Interventoría requerido previo al Acta de Inicio.	2 días
3	*1.2*	*ACTA DE INICIO*	**HITO**
4	1.3	**ACTIVIDADES PREVIAS (Control y revisión)**	**3 Meses**
5	1.3.1	**Recopilación de Información**	**½ mes**
6	1.3.2	**Visita de Obra**	**5 días**
7	1.3.3	Otras actividades requeridas	**1 sem**
8	1.3.4	**Control y revisión a los Documentos Preliminares entregados por el Contratista.**	**9 Sem**
9	1.3.4.1	Revisión Hojas de Vida de Recurso Humano del Contratista de Obra	1 sem
10	1.3.4.2	Revisión del Plan Detallado de Inversión del Anticipo	3 días
11	1.3.4.3	Revisión de la Relación de Equipo Mínimo	1 sem
12	1.3.4.4	Revisión del Desglose del AIU ofertado	2 días
13	1.3.4.5	Revisión Cronograma General del Proyecto	1 sem
14	1.3.4.6	Revisión de Analisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la oferta economica presentada por el Contratista.	2 días
15	1.3.4.7	Revisión Programa de Manejo Ambiental en Obra – MAO	½ mes
16	1.3.4.8	Revisión Planes de Manejo de Tránsito (PMT)	10 días
17	1.3.4.9	Revisión Plan Anual de Caja – PAC	2 días
18	1.3.4.10	Revisión Plan de Calidad de Obra	½ mes
19	1.3.4.11	Revisión Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica	½ mes
20	1.3.4.12	Revisión Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición (RCD)	½ mes
21	1.3.4.13	Revisión Alcance, Metodología y Enfoque del Contrato de Obra	2 días
22	1.3.4.14	Revisión Cronograma Detallado, Flujo de Caja y Presupuesto de la Etapa de Conservación.	1 mes
23	*1.3.4.15*	Aprobación de los documentos preliminares	Hito
24	1.3.5	**Documentos Preliminares de Interventoría**	**10 días**
25	1.3.5.1	Revisión de Hojas de Vida del Recurso Humano Mínimo de Interventoría requerido para el inicio de la ejecución.	1 sem
26	1.3.5.2	Desglose de la oferta económica de la Interventoría	3 días
27	1.3.5.3	Presentación al IDU de hojas de vida del recurso humano faltante de interventoría para la ejecución del contrato.	3 días
28	1.3.5.4	Presentación del Plan Anual de Caja (PAC) Contrato de Interventoria	2 días
29	1.3.5.5	Presentación Plan de Calidad de Interventoria	10 días
30	1.3.6	**Diagnósticos correspondiente al área de los Km-Carril distribuidos para las Vigencias 2025 y 2026, incluyendo sus puntos críticos o inestables (incluye Informe, alternativas de intervención y Presupuesto Preliminar)**	**11 sem**
31	1.3.6.1	Seguimiento y Control a la Elaboración Diagnósticos Conservación Programada del área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2025 , incluyendo sus puntos críticos o inestables (incluye Informe, alternativas de intervención y Presupuesto Preliminar)	1½ mes
32	1.3.6.2	Revisión y aprobación de diagnósticos por la Interventoría - Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2025	1 sem
33	*1.3.6.3*	Diagnósticos aprobados del área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2025 de la MVR a atender con estrategias de conservación programada	Hito
34	1.3.6.4	Seguimiento y control a la Elaboración Diagnósticos Conservación Programada del área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2026 , incluyendo sus puntos críticos o inestables (incluye Informe, alternativas de intervención y Presupuesto Preliminar)	1½ mes
35	1.3.6.5	Revisión y aprobación de diagnósticos por la Interventoría - Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2026	1 sem
36	*1.3.6.6*	Diagnósticos aprobados del área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2026 de la MVR a atender con estrategias de conservación programada	Hito
37	1.3.6.7	Acta de Recibo Final de Productos de Consultoría de los Diagnósticos correspondientes al área de los Km-Carril distribuidos para las Vigencias 2025 y 2026, incluyendo sus puntos críticos o inestables (incluye Informes, con alternativas de intervención y P	Hito
38	*1.3.7*	*Fin actividades Previas*	**Hito**
39	1.4	**ACTIVIDADES DE OBRA**	**22 meses**
40	*1.4.1*	***Inicio de Obra***	**Hito**
41	1.4.2	**Diseños de alternativas de intervención y ensayos de laboratorio por conservación correspondientes a los elementos definidos por el IDU, cuya estrategia de intervención producto del diagnóstico realizado al área de los Km-Carril distribuidos para las Vige**	**4½ meses**
42	1.4.2.1	Seguimiento y Control a la Elaboración de los diseños de alternativas de intervención y ensayos de laboratorio por conservación de los elementos definidos por el IDU, cuya estrategia de intervención producto del diagnóstico realizado al área de los Km-Car	4 meses
43	1.4.2.2	Revisión y aprobación por parte de Interventoría de diseños de alternativas de intervención y ensayos de laboratorio por conservación de los elementos definidos por el IDU, cuya estrategia de intervención producto del diagnóstico realizado al área de los	½ mes
44	*1.4.2.3*	Aprobación de Diseño de Alternativas de Intervención de los Km-Carril distribuidos para las Vigencias 2025 y 2026, incluyendo sus puntos críticos o inestables (Conservación Programada)	Hito

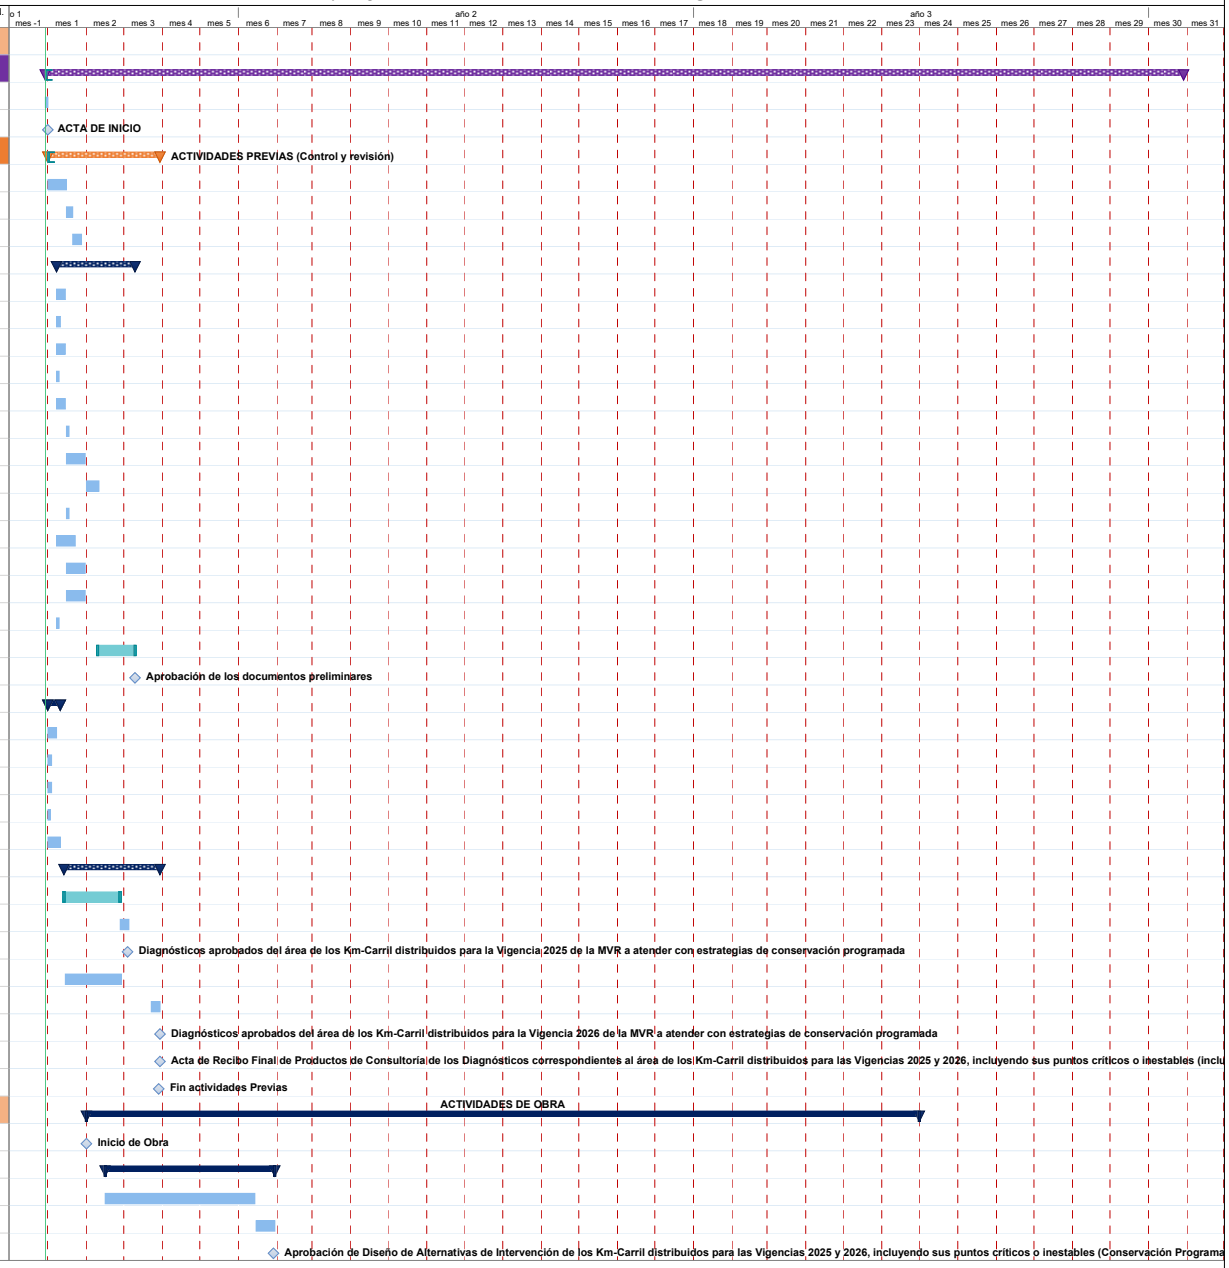


Proyecto: Conservación de la Malla Vial Rural, en la ciudad de Bogotá D.C. VIGENCIAS 2025 - 2027 (Zona 1)
Plazo: 24 MESES

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Cronograma Ilustrativo de Interventoría
Alternativa 2

Cronograma de Interventoría para la Conservación de la Malla Vial Rural Principal y/o Primaria, en la ciudad de Bogotá D.C. - Zona 1

Id	EDT	Nombre de la Actividad	DURACIÓN.
45	*1.4.2.4*	Acta de Recibo Final de Productos de Consultoría de los Diseños de Alternativas de Intervención y Ensayos de Laboratorio, correspondientes al área de los Km-Carril distribuidos para las Vigencias 2025 y 2026, incluyendo sus puntos críticos o inestables.	Hito
46	**1.4.3**	**Diagnósticos correspondiente al área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2027, incluyendo sus puntos críticos o inestables (incluye Informe, alternativas de intervención y Presupuesto Preliminar)**	**8 sem**
47	1.4.3.1	Seguimiento y Control a la Elaboración de Diagnósticos Conservación Programada del área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2027 , incluyendo sus puntos críticos o inestables (incluye Informe, alternativas de intervención y Presupuesto Prelimin	1 3/4 meses
48	1.4.3.2	Revisión y aprobación de diagnósticos por la Interventoría - Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2027	1 sem
49	*1.4.3.3*	Aprobación de Diagnósticos del área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2027 de la MVR a atender con estrategias de conservación programada	Hito
50	*1.4.3.4*	Acta de Recibo Final de Productos de Consultoría de los Diagnósticos correspondientes al área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2027, incluyendo sus puntos críticos o inestables (incluye Informes, con alternativas de intervención y Presupuest	Hito
51	**1.4.4**	**Diseños de alternativas de intervención y ensayos de laboratorio por conservación correspondientes a los elementos definidos por el IDU, cuya estrategia de intervención producto del diagnóstico realizado al área de los Km-Carril distribuidos para la Vigen**	**2 meses**
52	1.4.4.1	Seguimiento y Control a la Elaboración de los diseños de alternativas de intervención y ensayos de laboratorio por conservación de los elementos definidos por el IDU, cuya estrategia de intervención producto del diagnóstico realizado al área de los Km-Car	1½ meses
53	1.4.4.2	Revisión y aprobación por parte de Interventoría de diseños de alternativas de intervención y ensayos de laboratorio por conservación de los elementos definidos por el IDU, cuya estrategia de intervención producto del diagnóstico realizado al área de los	½ mes
54	*1.4.4.3*	Aprobación de Diseño de Alternativas de Intervención de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2027, incluyendo sus puntos críticos o inestables (Conservación Programada)	Hito
55	*1.4.4.4*	Acta de Recibo Final de Productos de Consultoría de los Diseños de Alternativas de Intervención y Ensayos de Laboratorio, correspondientes al área de los Km-Carril distribuidos para la Vigencia 2027, incluyendo sus puntos críticos o inestables.	Hito
56	**1.4.5**	**VÍA TRONCAL BOLIVARIANA (Límite con USME-CHORRERAS-PUENTE DEL AGUILA A COLOMBIA HUILA)**	**22 meses**
57	1.4.5.1	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Rutinario	22 meses
58	1.4.5.2	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Periódico	22 meses
59	1.4.5.3	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencias 2025-2026)	11 meses
60	1.4.5.4	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo sus puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencia 2027)	7 meses
61	**1.4.6**	**VÍA A CABRERA - COLOMBIA (HUILA) A TRAVÉS DE SUMAPAZ, SAN JUAN Y LA UNIÓN**	**22 meses**
62	1.4.6.1	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Rutinario	22 meses
63	1.4.6.2	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Periódico	22 meses
64	1.4.6.3	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencias 2025-2026)	11 meses
65	1.4.6.4	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo sus puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencia 2027)	7 meses
66	**1.4.7**	**VÍA A UNE, A TRAVÉS DE SANTA ROSA (SUMAPAZ) Y NAZARETH**	**22 meses**
67	1.4.7.1	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Rutinario	22 meses
68	1.4.7.2	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Periódico	22 meses
69	1.4.7.3	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencias 2025-2026)	11 meses
70	1.4.7.4	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo sus puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencia 2027)	7 meses
71	**1.4.8**	**VÍA A BETANIA**	**22 meses**
72	1.4.8.1	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Rutinario	22 meses
73	1.4.8.2	Seguimiento y Control a las Actividades de Mantenimiento Periódico	22 meses
74	1.4.8.3	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencias 2025-2026)	11 meses
75	1.4.8.4	Seguimiento y Control a las Actividades de Rehabilitación y/o Reconstrucción, incluyendo sus puntos críticos o inestables (según diseños corredores seleccionados vigencia 2027)	7 meses
76	**1.4.9**	**SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ACTIVIDADES ESPECIALES**	**22 meses**
77	**1.4.10**	**Recibo Final de Obras de la Anualidad 2025 - 2026**	**3 1/4 meses**
78	1.4.10.1	Recibo Físico Final de Obras de la Anualidad 2025 - 2026.	1 mes
79	*1.4.10.2*	Acta de Recorrido Inicial de Estado de Obras de la Anualidad 2025 - 2026.	Hito
80	*1.4.10.3*	Acta de Recorrido Final de Estado de Obras de la Anualidad 2025 - 2026.	Hito
81	1.4.10.4	Elaboración y Suscripción de Acta de Recibo Final de Obras de la Anualidad 2025 - 2026.	2 1/4 meses
82	*1.4.10.5*	Acta de Recibo Final de Obras de la Anualidad 2025 - 2026.	Hito
83	*1.4.10.6*	Informe Final para Seguimiento a las Garantías de las Obras de la Anualidad 2025 - 2026	Hito
84	**1.5**	**Recibo Final de Obras de la Anualidad 2027**	**1 mes**
85	1.5.1	Recibo Físico Final de Obras de la Anualidad 2027.	1 mes
86	*1.5.2*	Acta de Recorrido Inicial de Estado de Obras de la Anualidad 2027.	Hito
87	*1.5.3*	Acta de Recorrido Final de Estado de Obras de la Anualidad 2027.	Hito
88	**1.6**	**RECIBO FINAL DE OBRA**	**1 MES**
89	**1.7**	**COMPONENTES DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA**	**23½ meses**

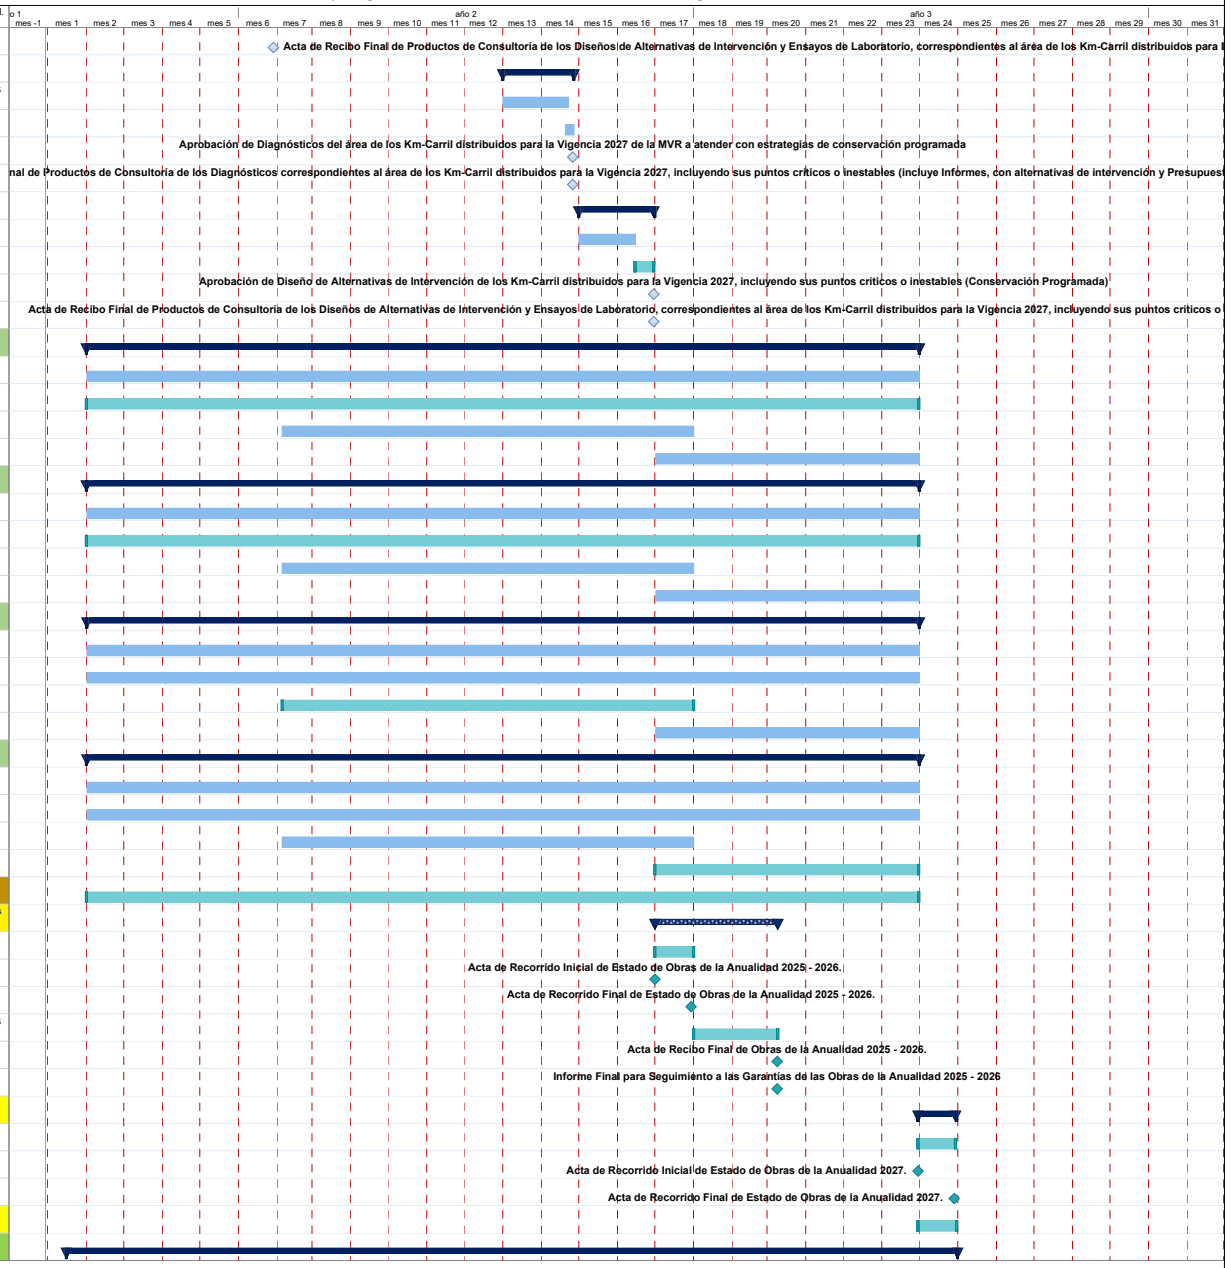


Proyecto: Conservación de la Malla Vial Rural, en la ciudad de Bogotá D.C. VIGENCIAS 2025 - 2027 (Zona 1)
Plazo: 24 MESES

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Cronograma Ilustrativo de Interventoría
Alternativa 2

Cronograma de Interventoría para la Conservación de la Malla Vial Rural Principal y/o Primaria, en la ciudad de Bogotá D.C. - Zona 1

Id	EDT	Nombre de la Actividad	DURACIÓN.
90	1.7.1	Gestión Social	23⅓ meses
91	1.7.2	Gestión Ambiental	23⅓ meses
92	1.7.3	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	23⅓ meses
93	1.7.4	Gestión de Tránsito	23⅓ meses
94	*1.7.5*	Fin Componentes de Gestión de Interventoría	Hito
95	**1.8**	**SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, RECURSOS y METAS FÍSICAS.**	**23⅓ meses**
96	1.8.1	Informes Semanales de Interventoría	Semanal
97	1.8.2	Informes Mensuales de Interventoría	Mensual
98	1.8.3	Actas de Recibos Parciales de Obra	Periódico
99	1.8.4	Programacion PAC	Mensual
100	1.8.5	Actas de Comités de Seguimiento a la Ejecución Contractual	Periódico
101	1.8.6	Otros Informes y Documentos Exigibles	Periódico
102	*1.9*	***Acta de Terminación***	**HITO**
103	**1.10**	**Cronograma Interventoría - Fase de Liquidación**	**Hito**
104	1.10.1	Actas de Reunión de Seguimiento al Cronograma de Liquidación	Periódico
105	1.10.2	Elaboración y Suscripción de Acta de Recibo Final de Obras de la Anualidad 2027	2 1/4 meses
106	*1.10.3*	Acta de Recibo Final de Obras de la Anualidad 2027.	Hito
107	1.10.4	Elaboración y Suscripción de Acta de Recibo Final del Contrato.	2 1/4 meses
108	*1.10.5*	Acta de Recibo Final del Contrato.	Hito
109	*1.10.6*	Informe Final para Seguimiento a las Garantías de las Obras de la Anualidad 2027	Hito
110	1.10.7	Gestión de informes finales y documentación general de cierres.	6 meses
111	*1.10.8*	Elaboración y Suscripción de Acta de Liquidación Final del Contrato de Obra.	Hito
112	*1.10.9*	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA	Hito
113	*1.10.10*	Acta de Recibo y Liquidación Final del Contrato de Interventoría	Hito
114	*1.11*	***FIN DEL CONTRATO***	**HITO**

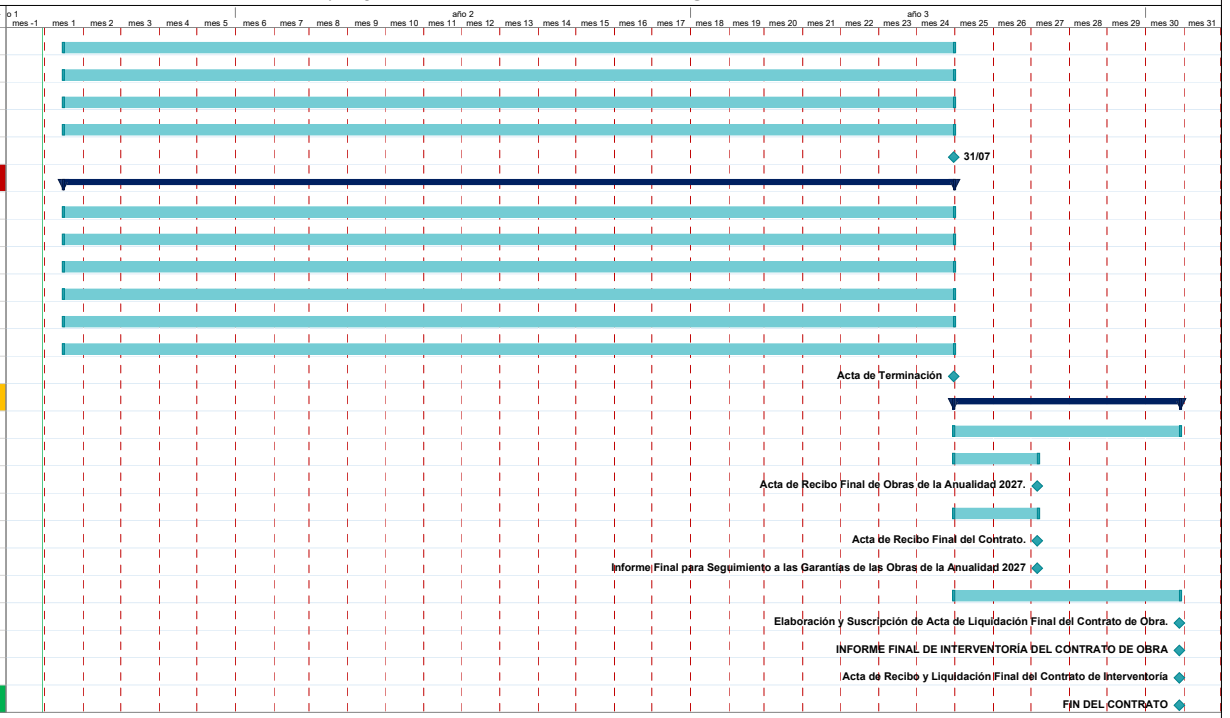

Proyecto: Conservación de la Malla Vial Rural, en la ciudad de Bogotá D.C. VIGENCIAS 2025 - 2027 (Zona 1)
Plazo: 24 MESES

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Cronograma Ilustrativo de Interventoría
Alternativa 2
