INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N°: 110-14.49-023- 2025

CONTRATISTA: MUZDEL INGENIERIA SAS — NIT. 901.114.890-7

Reprentante Legal: R.L. IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO — C.C. # C.C. 98.323.736 de San Pablo

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MITIGACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA A CAUSA DE LA OLA INVERNAL QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO DE PATIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No 004 DEL OCHO (8) DE ENERO DE 2025

VALOR INICIAL: $ 245.610.222 — **VALOR ADICIONAL:** $ 0

VALOR TOTAL: $ 245.610.222

PLAZO INICIAL: seis (6) meses — **PLAZO ADICIONAL:** N.A.

2. CRONOLOGIA Y DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N° 36 16 de enero de 2025 — Valor: $ 245.610.222

FIRMA DEL CONTRATO: 25 de enero de 2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: Póliza: CCS-100037973 — Compañía: SEGUROS MUNDIAL
Anexo: 0
Fecha Expedición: 25/01/2025
Vigencia: Desde: 25/01/2025 — Hasta: 25/07/2030
Valor Asegurado: $ 110.524.599,90

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Póliza: CCS-100008191 — Compañía: SEGUROS MUNDIAL
Fecha Expedición: 25/01/2025
Vigencia: Desde: 25/01/2025 — Hasta: 25/11/2025
Valor Asegurado: $ 284.700.000,00

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE POLIZAS N°: 65 del 6 de febrero de 2025

REGISTRO / COMPROMISO PRESUPUESTAL: N° 27 de 25 de enero de 2025 — Valor: $ 245.611.222

FECHA DE INICIACION: 6 de febrero de 2025

INFORME DEL CONTRATISTA - PREACTAS: Fecha del Acta: 4/03/2025

ACTA DE OBRA N° 01: Fecha del Acta: 5/03/2025 ✓ — Valor del Acta $ 129.407.089 ✓

ACTA DE RECIBIDO DE OBRA No 1: Fecha del Acta: 5/3/20256

VENCIMIENTO CONTRACTUAL: **6 de agosto de 2025**

FECHA DEL PRESENTE INFORME: ***6 de marzo de 2025***

/

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
0	0				
1	limpieza manual obras de drenaje	M2	0,0	19.000	$ -
2	conformacion de via con adicion de material granular	m2	1.927,0	18.199	$ 35.069.473,00
3	Remoción de derrumbes	m3	3.255,0	19.118	$ 62.229.090,00
0	Ajuste por decimales				$ -
				Valor Costos Directos	**$ 97.298.563,00**
				Administracion 28%	$ 27.243.598,00
				imprevistos 3%	$ 2.918.957,00
				utilidad 2%	$ 1.945.971,00
				Valor Costos Indirectos AIU 33%	**$ 32.108.526,00**
	VALOR TOTAL DE LA OBRA FINAL EJECUTADA				**$ 129.407.089,00** ✓




	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04 VERSIÓN: 01
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	FECHA: 30-07-2011

INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025



4. REGISTRO FOTOGRAFICO:






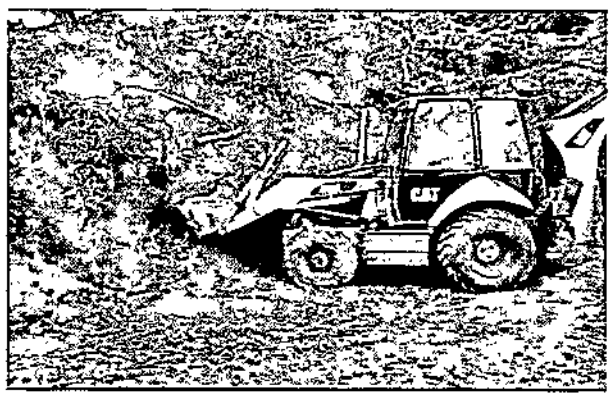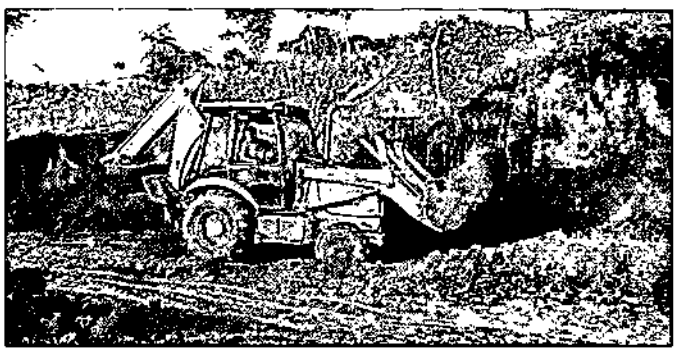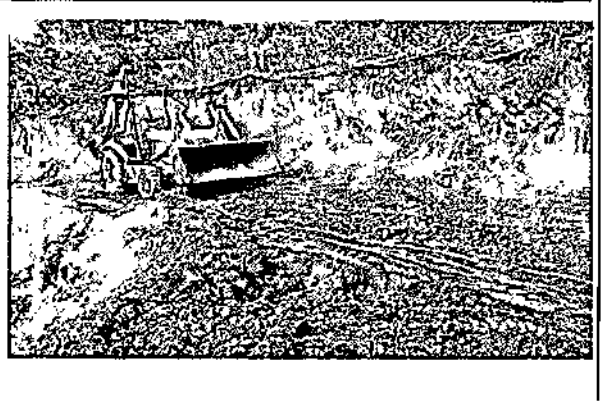


INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025

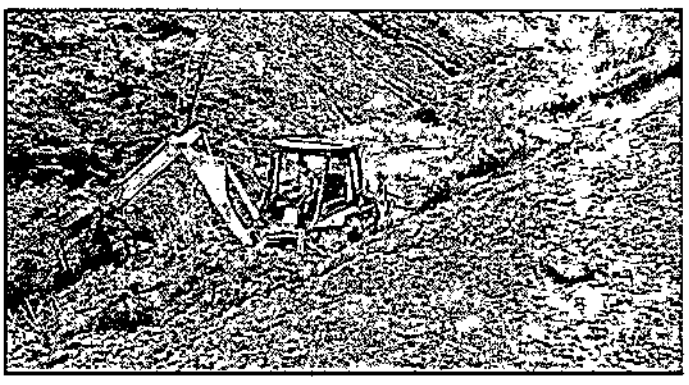




	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

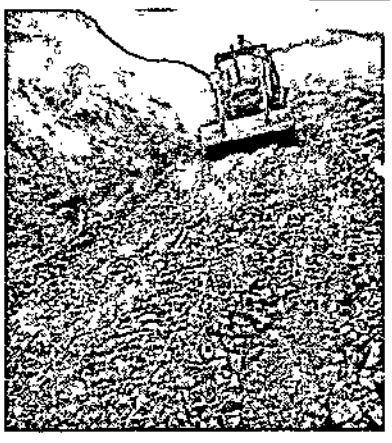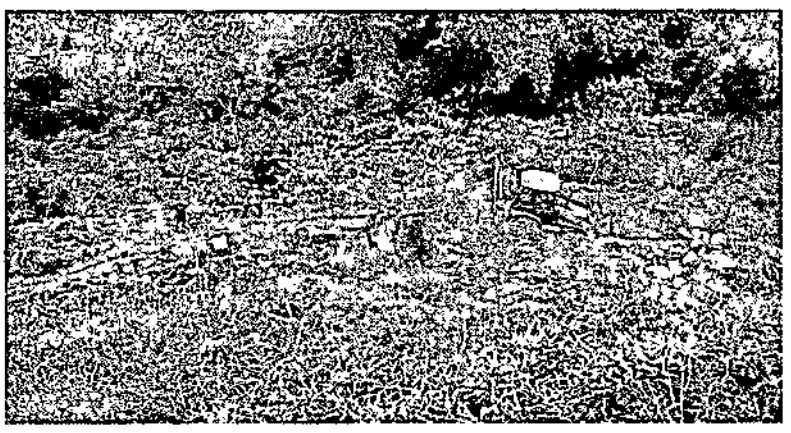INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025

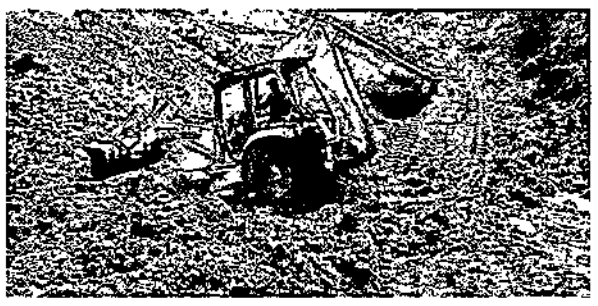



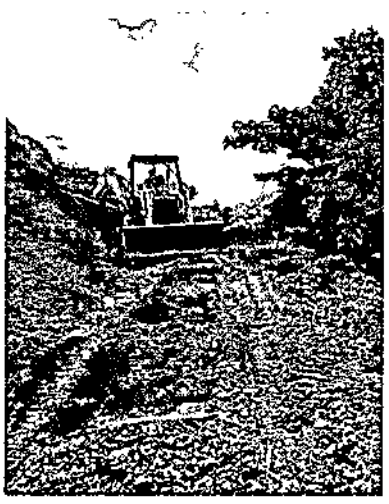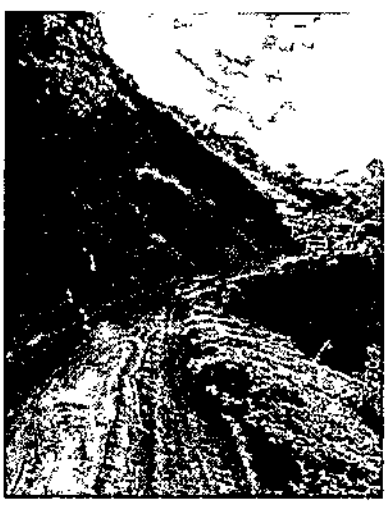


INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO N° 110-14.49-023- 2025

5. VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN EL ACTA DE LIQUIDACION:

Valor actividades ejecutadas por el Contratista y recibidas por el Supervisor:		$ 129.407.089,00
Valor de las actividades contractuales iniciales, según el Convenio:		$ 0,00
Valor mayor cantidad de obra ejecutada por el Contratista:		$ 0,00
Pagos realizados al contratista:	Por concepto del pago de anticipo:	$ 0
	Por concepto del pago de actas de obra:	$ 0
	Total pagos realizados al Contratista:	$ 0

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: $ 129.407.089,00

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

6. OBSERVACIONES:

7. CERTIFICACION:

El Supervisor del contrato de la referencia CERTIFICA que:

a.) Los documentos precontractuales (CDP, Certificación de Plan Anual de Adquisiciones, Viabilidad, Estudios previos, Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Aviso Convocatoria, Proyecto de Pliegos de Condiciones, Resolución de apertura del proceso, Pliegos de condiciones, Lista de Oferentes, Acta de Cierra, Documentos del contratista, Informe de Evaluación, Adenadas, Resolución de Adjudicación) se encuentran dentro del expediente del convenio en mención y están debidamente firmados.

b.) Los documentos contractuales y descritos en el numeral 2 del presente informe, igualmente se encuentran dentro del expediente del presente contrato y están debidamente firmados.

c.) El objeto y las obligaciones derivadas del contrato se ejecutaron según lo planificado. De igual manera se deja constancia que con las dimensiones tomadas in situ, si el constratista realizó mayor cantidad de obra, esto no imprica el reconocimiento y pago de dicho valor adicional por parte de la entidad contratante.

d.) Las actividades detalladas en el numeral 3 del presente informe fueron ejecutadas y recibidas a entrera satisfación por parte de del comunidad beneficiada, pero por esta circunstancia no se exime al Contratista de la responsabilidad por la calidad de las actividades entregadas y recibidas.

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Revisó y Aprobó:

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal y Supervisor

Elaboró: Edwin Ricardo Zapata - Arq. Apoyo SIV
