TPD INGENIERIA	REPORTE EJECUCION SEMANAL - ACUMULADO	TPD-F-PCO2782-15
	CONTRATO DE OBRA 2025-2782	VERSIÓN 0
		FECHA: 16/04/25


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

PERIODO: DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2025

1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS


EXT.	I.D.	LUGAR DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	TIPO POSTE PROGRAMADO	TIPO POSTE NO REALIZADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	%	DEBIDO
1002	203	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 69	martes, 3 de junio de 2025	1 T1 + 1 T2 5,5		2	2	100,00%	
1001	1172	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 66	miércoles, 4 de junio de 2025	1 T2 4,5 + 1 T2 6,5		2	2	100,00%	
1160.	235	KR 13 X CL 67	jueves, 5 de junio de 2025	1 T1X + 1 T2 5,5		2	2	100,00%	
1160.	235	KR 13 X CL 67	viernes, 6 de junio de 2025	1 T2 5,5 + 1 T2 6,5		2	2	100,00%	
1002.	213	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 67	sábado, 7 de junio de 2025	1 T2 6,5		1	1	100,00%	
2051	244	KR 13 X AV JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63)	lunes, 9 de junio de 2025	1 T1 X + 1 T2 6,5		2	2	100,00%	
2051	244	KR 13 X AV JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63)	martes, 10 de junio de 2025	1 T1 + 1 T2 6,5		2	2	100,00%	
2052	252	KR 13 X CL 60	miércoles, 11 de junio de 2025	2 T1 + 2 T2 6,5		4	4	100,00%	
2054	260	KR 13 X CL 57	jueves, 12 de junio de 2025	1 T1 + 2 T2 6,5		3	3	100,00%	
2054	260	KR 13 X CL 57	viernes, 13 de junio de 2025	1 T1 + 1 T2 5,5		2	2	100,00%	
1050	239	KR 13 X CL 66	sábado, 14 de junio de 2025	1 T2 4,5		1	1	100,00%	
						23	23		

TOTAL	100,00%
TOTAL EFECTIVIDAD	100,00%
TOTAL DEFICIENCIA	0,00%

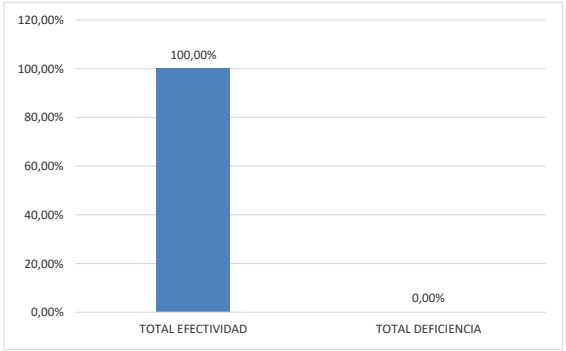

2 INSTALACIONES Y CAMBIOS DE TAPAS

TAPAS UTILIZADAS EN EL MES	16	
TAPAS INSTALADAS POR HURTO	4	25,00%
TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO	12	75,00%



3 SINIESTROS

SINIESTROS TOTALES		4	
T1		3	75,00%
T1X			0,00%
T2 DE 2,5		1	25,00%
T2 DE 4,5			0,00%
T2 DE 5,5			0,00%
T2 DE 6,5			0,00%

