	ORDEN DE SERVICIO	TPD-F-PCO2782-02	
TPD INGENIERÍA	CONTRATO DE OBRA 2025-2782	VERSIÓN 0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
		FECHA: 16/04/25	

					Tipo de Poste	T1	T1X	T2						VIDEO DETECCION TIPO						Orden N° TPD	Código Grupo TPD
Hora y Fecha Llegada	h 06:00	d 9	m VI	2025																	
Hora y Fecha Terminación	h 03:00	d 9	m VI	2025	Dimensión	3,8	5,0	2,5	4,5	5,5	6,5	8,5	1	2	3	4	5	6		4	SE 19 — ~~1~~ 2 3
Prioridad	Alta X		Media		Cantidad				3												T
Número Externo	1279		ID	156	Orden N° Central	2025 - 01 3258															
Dirección Intersección	~~CL~~	DG	76			~~CR~~	TV	11													T. A.
Origen	Siniestro		~~Mantenimiento~~		Intersección Nueva	Modificación		Apoyo Requerido			Eléctrico	Equipos	Obras Civiles								PD
PMT Típico Utilizado	1	2	3	~~4~~	5	6	7	8	Código SE -												


Descripción de los trabajos

Retiro de Soldadura:		Colocación de Soldadura:	
Nivelación de Poste:	3	Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2	
Reemplazo platina de la base:		Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2	
Realce de Base para poste:		Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	
Reparación de platina de la base para postes		Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección	
Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X		Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1, Tipo T2 Y Tipo T6	
Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 , Tipo T4 y Tipo T5		Pintura en vía de Postes del tipo T1	
Pintura en vía de Postes del tipo T1X		Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1, Tipo T2 Y Tipo T6	3
Pintura De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 , Tipo T4 y Tipo T5			

Observaciones en terreno

Se remueve la pintura de 3 postes T2. Se aplica pintura gris anticorrosiva, pintura amarilla, pintura negra, se nivela y se cambian los tornillos.

Localización

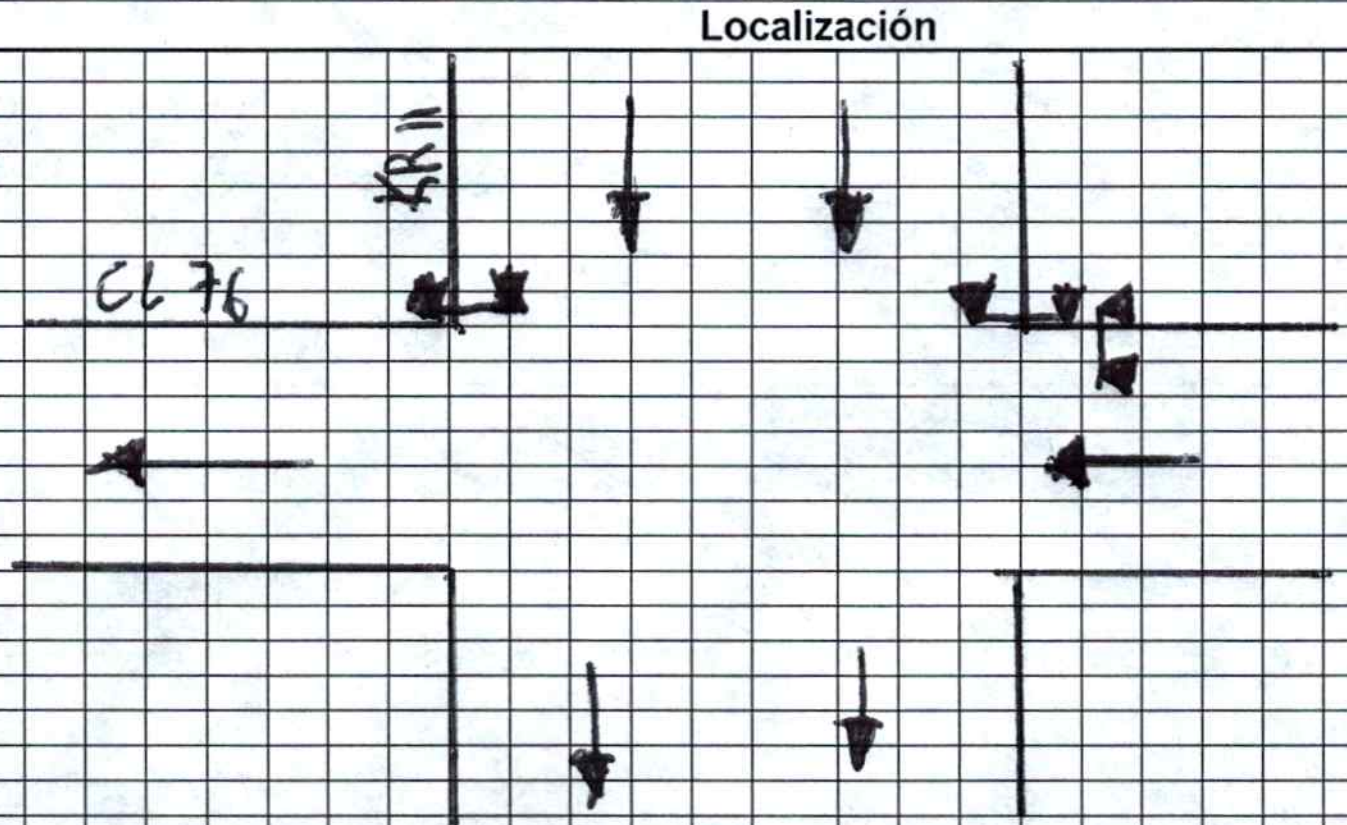

TPD INGENIERIA	ORDEN DE SERVICIO	TPD-F-PCO2782-02	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2025-2782	VERSIÓN 0	
		FECHA: 16/04/25	

Evaluación ejecutada por ítems en terreno

Tipo	Flujo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
TAPAS																										
PEDESTAL																										
T2	1D			1					1														1		1	1
T2	1I			1					1														1		1	1
T2	4D			1					1														1		1	1
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
T																										
TOTAL				3					3														3		3	3

Ítems

40	Retiro de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso
41	Colocación de Soldadura para Tapas de Cajas de Paso
42	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T1, T1X y T2 (L=2.5 a 6.5 Metros)
43	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes semafóricos T2 de 8.5 m
44	Suministro e instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación para postes para cámaras de video detección
45	Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección
46	Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/ó Postes de Video Detección
47	Nivelación de Postes T1, T1X, T2 y/o Poste de Video Detección
48	Apertura de huecos para fijación semáforo en postes T1, T1X o T2
49	Apertura de huecos para fijación de botones en postes semafóricos T1, T1X y/o T2
50	Realce de Base para poste (entre 1 y 15 cm.)
51	Realce de Base para poste (entre 16 y 25 cm.)
52	Reemplazo de platina de la base para poste semafórico
53	Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T1, T2, T3 y T6
54	Reemplazo de la platina de la base para poste para cámara de video detección Tipo T4 y T5
55	Reparación de platina de la base para postes
56	Lavado de Postes Semafóricos T1 o T1X
57	Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1(L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5")
58	Lavado De Postes Semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8"), Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 6"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8")
59	Pintura en vía de Postes del tipo T1
60	Pintura en vía de Postes del tipo T1X
61	Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros - Tubería Diámetro 4") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T1(L = 8 Metros - Tubería Diámetro 4") Y Tipo T2 (L = 12 Metros - Tubería Diámetro 5") Y Tipo T6 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 5")
62	Pintura En Vía De Postes Semafórico T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8 ") Ó Para Postes Con Cámara De Video Detección Tipo T3 (L = 6 Metros - Tubería Diámetro 6"), Tipo T4 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8"), Tipo T5 (L = 8 Metros - Tubería Diámetro 8")
63	Implementación PMT, para trabajos en andén
64	Implementación PMT, para trabajos con vehículo en calzada

Jaider Perez Romero

OFICIAL DE OBRA
CONTRATISTA

Residente T.P.D. INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

Residente CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
INTERVENTORÍA
