INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	3-sep-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1

CONTRATO No: 1357 DE 2025


OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DÍAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULAD	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	1 ago 2025 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 dic 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 137.650.000,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA)	$ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A	$ 137.650.000,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5
				%Programado					
				$ Valor Programado	01 al 31 agosto 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
				$ Valor Ejecutado					
				% Ejecutado					
I. EXPLANACIONES	73.633	53,50%		%P	32,10%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
				$P	44.180	7.363	7.363	7.363	7.363
				$E	61.222				
				%E	44%				
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	5.379	3,91%		%P	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
				$P	1.075,8	1.075,8	1.075,8	1.075,8	1.075,8
				$E	3.112				
				%E	2,26%				
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	N/A								
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	9.111	6,62%		%P	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
				$P	1.822,1	1.822,1	1.822,1	1.822,1	1.822,1
				$E					
				%E					
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	N/A								
VI. OBRAS VARIAS	559	0,41%		%P	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
				$P	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8
				$E					
				%E					
VII. TRANSPORTE	43.892	31,89%		%P	19,13%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%
				$P	26.335	4.389	4.389	4.389	4.389
				$E	40.802				
				%E	29,64%				
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	5.068	3,68%		%P					3,68%
				$P					5.068
				$E					
				%E					
AJUSTES				%P					
				$P					
				$E					
				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	137.641	100,0%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')									

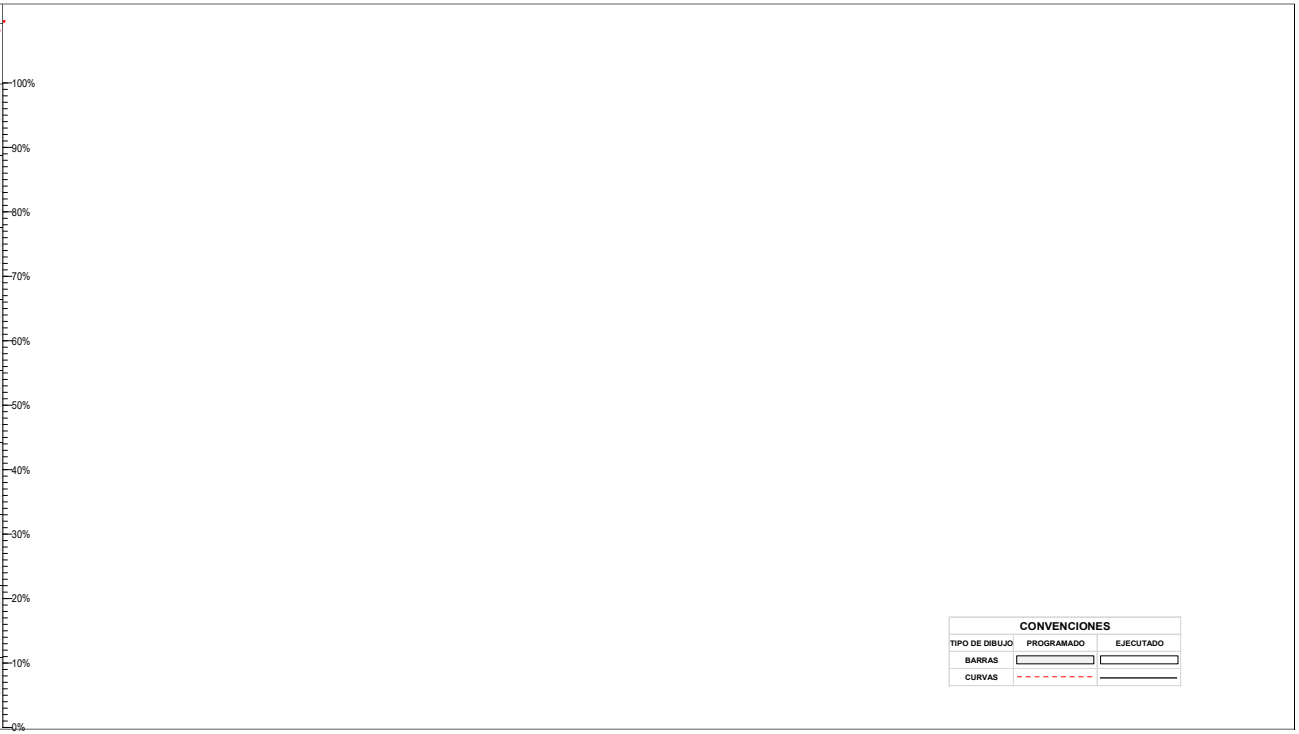

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

		1	2	3	4	5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	53,42%	10,73%	10,73%	10,73%	14,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	73.525	14.762	14.762	14.762	19.830
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	%	53,42%	64,14%	74,87%	85,59%	100,00%

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	73.525	88.287	103.049	117.811	137.641
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	76,38%				
	VALOR (Miles de Pesos)	105.135,80				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	76,38%				
	VALOR (Miles de Pesos)	105.135,80				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 137.640,99**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

CARLOS DE RIO DÍAZ
C.C No. 19.341.459.681 (Bogotá DC)
Representante legal
CARLOS DEL RIO DÍAZ
Contratista

Aprueba Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
Ingeniero Supervisor
Dirección Territorial Casanare

Aprueba Firma **N.A**

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: **N.A**

Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

JUAN GABRIEL RODRÍGEZ SOLANO
Ordenador del pago
M. P. No. 54202240042 NTS

Revisó Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

JUAN GABRIEL RODRÍGEZ SOLANO
Director territorial (e)
M. P. No. 54202240042 NTS

Revisó Firma: **N.A**

Nombre
Gestor Técnico del proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
