ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 10 de mayo de 2025	SEMANA No.	4	DEL	3-may-25	AL	9-may-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	31 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	31 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.837.558.807
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUITIERREZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:
PROVINCIA DEL GUAVIO:
JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN)
- GEOPOSICIONAMIENTO
PROVINCIA DE ORIENTE:
CHOACHÍ (EL ROSARIO - LA CAJA - CHATASUGA – LA LLANADA – FERRALARADA – BARRO NEGRO – GRANADILLO – CHIVATE – RESGUARDO BAJO)
- GEOPOSICIONAMIENTO
•FOMEQUE (FOMEQUE – CAQUEZA)
- GEOPOSICIONAMIENTO
2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:
PROVINCIA DEL GUAVIO:
JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN)
- APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS
UBALA (CASA ROSADA-SAN LUIS-LAGUNA AZUL):
- LABORATORIO
PROVINCIA DE ORIENTE:
CHOACHÍ (EL ROSARIO - LA CAJA - CHATASUGA – LA LLANADA – FERRALARADA – BARRO NEGRO – GRANADILLO – CHIVATE – RESGUARDO BAJO)
- APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

3. CONTROL DE EJECUCION

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	9-abr-25	8-jul-25	91	9-abr-25	8-jul-25	91	0	0
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	17-abr-25	20-ago-25	126	0	0
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	9-jul-25	31-dic-25	176	0	0
							no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 267 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,41%	0,48%	0,07%
Durante el periodo	0,45%	0,84%	0,39%
Acumulado Actual	0,85%	1,31%	0,46%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	31,00	236	1,24

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 143.730.358	$ 168.347.005	117%
Durante el periodo	$ 157.338.037	$ 296.404.548	188%
Acumulado Actual	$ 301.068.395	$ 464.751.553	154%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	163.683.158

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 10 de mayo de 2025	SEMANA No.	4	DEL	3-may-25	AL	9-may-25


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

54%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑO, POR TANTO, NO HA REALIZADO GESTIÓN O EJECUCIÓN DE LAS FICHAS CONTEMPLADAS EN EL PAGA.

EN LA SEMANA DE REPORTE SE REMITE APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA DEL PAGA V3 POR MEDIO DE COMUNICADO 766-060 RTA COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-063 APROBACIÓN PAGA V3.

SE CONTINÚA CON LA GESTIÓN EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA COMPRA DEL RECURSO DEL AGUA.

SE HACE ACERCAMIENTO CON LA CAR COMO ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA CONCESIÓN DE AGUA.

5. GESTION SOCIAL DEL PROYECTO

EL 05-05-2025 SE REALIZA LA MESA DE TRABAJO No. 2. PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, EN LA CUAL PARTICIPAN LAS ÁREAS TÉCNICAS Y SOCIALES DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA, DANDO CLARIDAD DE LAS OBSERVACIONES APLICABLES AL DOCUMENTO Y ESTABLECIENDO EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA EXTENSIÓN DEL PROYECTO Y LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. EN LA MISMA FECHA, SE REMITEN LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, PARA QUE SEAN ATENDIDAS POR EL CONTRATISTA A MÁS TARDAR EL 9 DE MAYO DEL 2025, PARA SU APROBACIÓN.

EL 06-05-2025 SE REMITE ACUSO RECIBIDO DE LOS INFORME SEMANALES 1 Y 2 DEL 9 AL 27 DE ABRIL DEL 2025, SIN EMBARGO, SE SOLICITA QUE EN LOS PRÓXIMOS SE REPORTEN LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.

EL 6-05-2025, EL CONTRATISTA REMITE EL ACTA DE VECINDAD No. 1 LEVANTADA AL PREDIO "CASA ROSADA" POR SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL INMUEBLE.

El 07-05-2025 EL CONTRATISTA REMITE INFORME SEMANAL No. 3 DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO, EN LA MISMA FECHA, SE REMITEN LAS OBSERVACIONES DE DICHO DOCUMENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. EN LA MISMA FECHA EL CONTRATISTA REMITE LOS AJUSTES TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.

EL 07-05-2O25 LA INTERVENTORÍA REMITE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE VECINDAD No. 1, PARA ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.

EL 07-05-2025 EL CONTRATISTA REMITE EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CON LOS AJUSTES REALIZADOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES Y ALO CONVERSADO EN LA MESA DE TRABAJO No. 2.

EL 07-05-2025 SE PROGRAMA MESA DE TRABAJO No. 3 VIRTUAL PARA EL 08-05-2025 SEGÚN LO ACORDADO EN LA MESA DE TRABAJO No. 2, SIN EMBARGO, POR SOLICITUD DE LA RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA DEBE SER REPROGRAMADA PARA EL 09-05-2025, POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS, NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE LA INTERVENTORÍA NO TIENE CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTABA DESARROLLANDO EL CONTRATISTA Y NO HA RECIBIDO UN REPORTE AL RESPECTO.

EL 08-05-2025 LA INTERVENTORÍA ACUSA RECIBO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CON LOS AJUSTES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA E INDICA QUE EXPLICARÁ AL CONTRATISTA AQUELLAS OBSERVACIONES QUE NO FUERON ATENDIDAS Y LAS QUE FUERON ATENDIDAS PARCIALMENTE, ESTO DURANTE LA MESA DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 09-05-2025.

EL 09-05-2025 SE REALIZA MESA DE TRABAJO No. 3 DEL COMPONENTE SOCIAL (CONTRATISTA E INTERVENTORÍA) DONDE SE TRABAJARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL COMPONENTE SOCIAL (CONTRATISTA E INTERVENTORÍA). 2. SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS 766-043-ICCU Y 766-054-ICCU. 3. SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME SEMANAL NO. 3. 4. SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL INFORME MENSUAL. 5. SEGUIMIENTO AL ACTA DE VECINDAD REALIZADA COMO PARTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. 6. SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. EN LA MISMA FECHA, SE REMITEN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO LAS GRABACIONES DE LA MESA DE TRABAJO, EL DOCUMENTO OBSERVADO, EL ESQUEMA DE UN CRONOGRAMA PROPUESTO, SE COMPARTEN LOS ANEXOS CON OBSERVACIONES Y EL LISTADO DE LOS ANEXOS FALTANTES, PARA ATENCIÓN Y AJUSTE DEL CONTRATISTA

6. GESTION SST DEL PROYECTO

LAS ACTIVDADES DEL COMPONENTE SST EN EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2025:

1.INGRESO DE PERSONAL Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA INFORME MENSUAL

2.GESTIÓN DE SOLICITUD DE EPP Y DOTACIÓN.

3.RADICACIÓN DE SOLICITUD DOCUMENTAL DE MESA DE TRABAJO DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2025, EN REVISIÓN POR COMPONENTE SST INTERVENTORÍA.

4.VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL DE ACUERDO A LA MESA DE TRABAJO DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

DE ACUERDO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA ESTAS FASES I Y II DE CARACTERIZACIÓN CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE SUELOS CERTIFICADO, PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS IN SITU, ADEMÁS, CUENTA CON EQUIPOS DE GEOPOSICIONAMIENTO Y TOPOGRAFÍA PARA DICHAS ACTIVIDADES.

8. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 10 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**4**	DEL	**3-may-25**	AL	**9-may-25**

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A	N/A	N/A

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

PARA EL PRESENTE INFORME SEMANAL NO SE CONTEMPLARÁ ESTE CAPÍTULO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS FASES DE CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS QUE SE VAN A INTERVENIR Y POR AHORA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y/O ACTIVIDADES NO PREVISTAS NI MAYORES CANTIDADES.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO SOFAN C-031 CONTINÚA SATISFACTORIAMENTE CON LAS FASES I Y II DE CARACTERIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE UBALÁ, GAMA Y JUNÍN DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO E INICIA EN LOS MUNICIPIOS DE CHOACHÍ Y FOMEQUE EN LA PROVINCIA DE ORIENTE.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


12.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN)





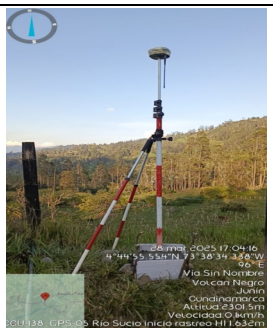

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO - LA CAJA - CHATASUGA – LA LLANADA – FERRALARADA – BARRO NEGRO – GRANADILLO – CHIVATE – RESGUARDO BAJO)





•FOMEQUE (FOMEQUE – CAQUEZA)





ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 10 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**4**	DEL	**3-may-25**	AL	**9-may-25**

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN)





UBALA (CASA ROSADA-SAN LUIS-LAGUNA AZUL):







PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO - LA CAJA - CHATASUGA – LA LLANADA – FERRALARADA – BARRO NEGRO – GRANADILLO – CHIVATE – RESGUARDO BAJO)







Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.05.12 16:45:11 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
