ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 24 de mayo de 2025	SEMANA No.	6	DEL	17-may-25	AL	23-may-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0
8
22

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	45 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	45 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.837.558.807
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUITIERREZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:
PROVINCIA DEL GUAVIO:
UBALA (CASA ROSADA-SAN LUIS-LAGUNA AZUL):
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:
PROVINCIA DEL GUAVIO:
UBALA (CASA ROSADA-SAN LUIS-LAGUNA AZUL):
- LABORATORIO

PROVINCIA DE ORIENTE:
CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)
- LABORATORIO

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	9-abr-25	8-jul-25	91	9-abr-25	8-jul-25	91	0	0
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	17-abr-25	20-ago-25	126	0	0
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	9-jul-25	31-dic-25	176 no iniciado	0 no iniciado	0 no iniciado

Plazo del proyecto: 267 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,42%	2,05%	0,63%
Durante el periodo	0,47%	0,36%	-0,12%
Acumulado Actual	1,89%	2,40%	0,52%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

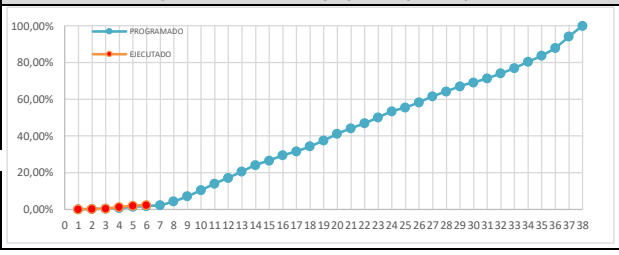

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	45,00	222	1,38

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 500.563.323	$ 723.598.565	145%
Durante el periodo	$ 166.745.415	$ 125.990.877	76%
Acumulado Actual	$ 667.308.738	$ 849.589.441	127%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	182.280.703

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO


GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 24 de mayo de 2025	SEMANA No.	6	DEL	17-may-25	AL	23-may-25

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%

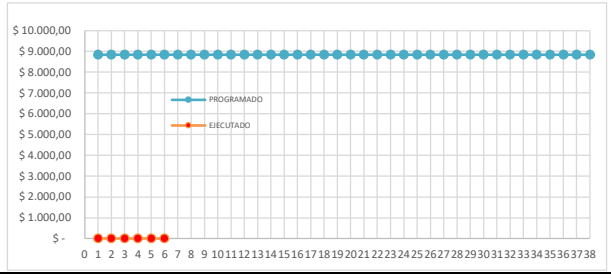

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

27%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

DURANTE LA SEMANA SE REALIZA COMITE DE OBRA VIRTUAL, SE PACTA REUNION CON ALCALDIA DE UBALA PARA EL ESTUDIO Y POSIBILIDAD DE RECEPCION Y MANEJO DE RCD POR PARTE DE ESTA ENTIDAD GUBERNAMENTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION DE RCD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1257 DE 2021. POR OTRO LADO SE REALIZA LA SOLICITUD DE COMPRA DE PUNTO ECOLOGICO Y ELEMENTOS PARA ADECUACION DE CAMPAMENTO. EN ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD SOBRE EL PAGA RADICADO EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

SE REALIZA SOCIALIZACIÓN CON EL ALCALDE DE UBALÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREA TÉCNICA Y SOCIAL DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA, DONDE SE ACLARAN LAS INQUIETUDES DEL SEÑOR ALCALDE, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO ACTUALMENTE EN EL SECTOR(PRELIMINARES) Y SE INDICA QUE CUANDO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN ESTOS SE SOCIALIZARÁN CON LA COMUNIDAD Y LA ALCALDÍA, CON EL FIN DE MANTENER UNA COMUNICACIÓN FLUIDA ENTRE LAS PARTES.

SE REALIZA ACERCAMIENTO POR PARTE DEL ÁREA SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA A LA ALCALDÍA DE JUNÍN, CON EL FIN DE CONSEGUIR UN DATO DE CONTACTO PARA PROGRAMAR LOS ACERCAMIENTOS PREVIOS, POR LO QUE SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA SECRETARIA DE LA ALCALDÍA LA SEÑORA ADRIANA PRIETO, QUIEN BRINDA UN TELÉFONO DE CONTACTO.

POR PARTE DEL COMPONENTE SOCIAL SE ASISTE A REUNIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL, PROYECTO LOTE 1 PROGRAMA DE CAMINOS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA EN LA CUAL PARTICIPAN LAS ÁREAS CONTRACTUALES DEL ICCU, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, ALLÍ LA SUPERVISORA SOCIAL DEL ICCU, DA CLARIDAD ACERCA DE LAS REUNIONES PRELIMINARES QUE SE DEBEN ADELANTAR EN LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN. ADICIONALMENTE, SE REALIZA LA MESA DE TRABAJO NO. 5 DEL COMPONENTE SOCIAL, DONDE EL RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA DA A CONOCER EL AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y SE RESUELVEN ALGUNAS INQUIETUDES AL RESPECTO.

SE REALIZA LA MESA DE TRABAJO NO. 6 DANDO CUMPLIMIENTO A LOS SEGUIMIENTOS SEMANALES, A LA CUAL ASISTE EL COMPONENTE SOCIAL DEL ICCU, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, EN ESTE ENCUENTRO, SE DA CLARIDAD ACERCA DE TEMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL COMO LOS PERFILES PROFESIONALES DE APOYO DEL CONTRATISTA, LAS REUNIONES PRELIMINARES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD, PUNTOS SAU, NO APLICABILIDAD DE LAS REUNIONES DE AVANCE, ENTRE OTROS, PARA TERMINAR LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN E INICIAR LAS GESTIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE AVANCE.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LOS SEGUIMIENTOS DE SST EL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE VALIDA NUEVAMENTE EL INFORME MENSUAL, POR PARTE DE LA SUPERVISION DE SOLICITA EL FORMATO DE IBC DEL PERSONAL Y LOS COMPROMISOS DE ENTREGA DEL MANUAL SG-SST, GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS, PROGRAMA DE INSPECCIONES, POLITICAS SST, REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, MATRIZ DE PELIGROS, PLAN DE TRABAJO ANUAL, PLAN DE EMERGENCIAS,AUTOEVALUACION DE ESTANDRES MINIMOS LOS CUALES SE DEBEN RADICAR TANTO EL CONTRATISTA COMO LA INTERVENTORIA, ADICIONAL AL INFORME MENSUAL Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. SE PROGRAMO MESA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO PARA EL DIA 6 DE JUNIO, TANTO LA SUPERVISION, COMO EL CONTRATISTA.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

DE ACUERDO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA ESTAS FASES I Y II DE CARACTERIZACIÓN CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE SUELOS CERTIFICADO, PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS IN SITU, ADEMÁS, CUENTA CON EQUIPOS DE GEOPOSICIONAMIENTO Y TOPOGRAFÍA PARA DICHAS ACTIVIDADES.

8. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A	N/A	N/A

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

PARA EL PRESENTE INFORME SEMANAL NO SE CONTEMPLARÁ ESTE CAPÍTULO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS FASES DE CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS QUE SE VAN A INTERVENIR Y POR AHORA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y/O ACTIVIDADES NO PREVISTAS NI MAYORES CANTIDADES.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL										
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 24 de mayo de 2025	SEMANA No.	6	DEL	17-may-25	AL	23-may-25

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO SOFAN C-031 CONTINÚA CON LAS FASES I Y II DE CARACTERIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO Y EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ EN LA PROVINCIA DE ORIENTE.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

12.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALA (CASA ROSADA-SAN LUIS-LAGUNA AZUL):

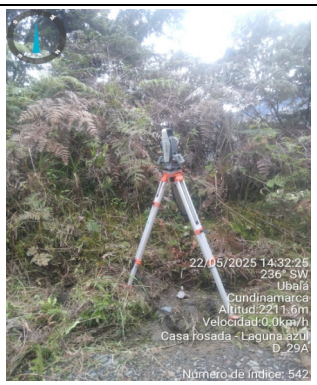





PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALA (CASA ROSADA-SAN LUIS-LAGUNA AZUL):





ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 24 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**6**	DEL	**17-may-25**	AL	**23-may-25**

12.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALA (CASA ROSADA-SAN LUIS-LAGUNA AZUL):






PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)





CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

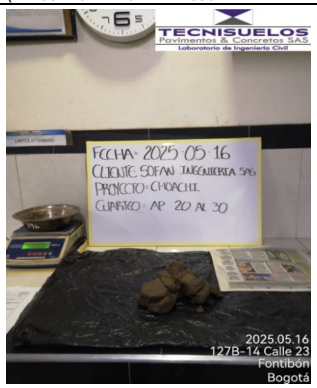





ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 24 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**6**	DEL	**17-may-25**	AL	**23-may-25**

COMPONENTE SOCIAL

SOCIALIZACIÓN ETAPA DE CARACTERIZACIÓN ALCALDE DEL MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA DEL GUAVIO



ACERCAMIENTO ALCALDÍA DE JUNIN



Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.05.29 11:01:59 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
