ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 28 de junio de 2025	SEMANA No.	11	DEL	21-jun-25	AL	27-jun-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	80 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	80 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.837.558.807
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ / LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:
PROVINCIA DEL GUAVIO:
JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN):
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
PROVINCIA DE ORIENTE:
CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO):
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:
PROVINCIA DE ORIENTE:
FOSCA (FOSCA-QUINCHITA-SANAME)
- APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS EN LA SUBRASANTE
CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)
- LABORATORIO
FOMEQUE (FOMEQUE-CÁQUEZA):
- LABORATORIO

3. CONTROL DE EJECUCION

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	9-abr-25	8-jul-25	91	9-abr-25	8-jul-25	91	0	0
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	17-abr-25	20-ago-25	126	0	0
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	9-jul-25	31-dic-25	176	0	0
							no iniciado	no iniciado	no iniciado
	Plazo del proyecto: 267 días								


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	4,87%	3,34%	-1,54%
Durante el periodo	1,06%	0,19%	-0,86%
Acumulado Actual	5,93%	3,53%	-2,40%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

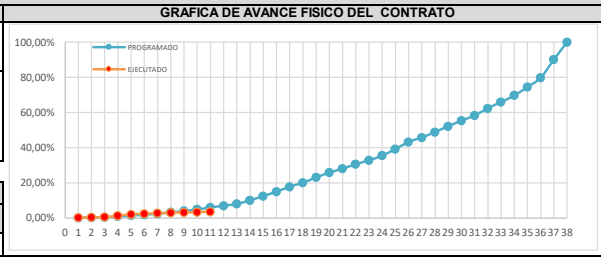

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	80,00	187	-6,41

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.722.388.681	$ 1.179.328.252	68%
Durante el periodo	$ 373.544.118	$ 67.837.316	18%
Acumulado Actual	$ 2.095.932.799	$ 1.247.165.568	60%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 848.767.231

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 28 de junio de 2025	SEMANA No.	11	DEL	21-jun-25	AL	27-jun-25


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-2,40%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

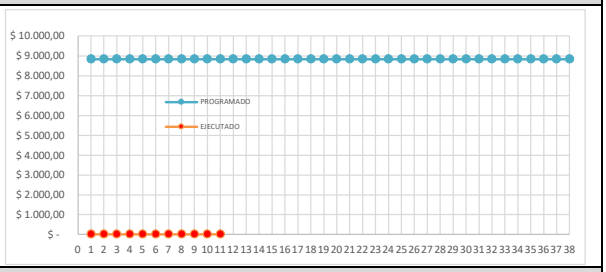

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

SE CONTINÚA CON EL AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SU DEMORA SE DEBE A AJUSTES SOLICITADOS AL CONTRATISTA DE OBRA, SE ESTABLECIERON COMPROMISOS PARA MEJORAR FECHAS DE PRESENTACIÓN

EL MARTES 24 DE JUNIO SE DA RESPUESTA AL COMUNICADO FOR-CO-03-ICCU031-070 / OBSERVACIONES FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO DE OBRA DONDE SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALICE EL AJUSTE EN EL VALOR FINAL DEL FLUJO DE CAJA DE $1,4 PESOS QUE ESTÁN POR DEBAJO DEL VALOR CONTRACTUAL.

EL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO SE REMITE AL ICCU EL INFORME SEMANAL No.10 DE INTERVENTORÍA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2025.

EL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO SE REALIZA REUNIÓN PRESENCIAL EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL ICCU CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA DE OBRA CUYO OBJETO PRINCIPAL ERA REVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES DEL LOTE 1, Y POR OTRA PARTE SE AUTORIZÓ EL INICIO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO Y SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LAS FASES 1 Y 2 QUE PRESENTAN ATRASO.

EL JUEVES 26 DE JUNIO EL TOPOGRAFO DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE LA REVISION REALIZADA A LOS ARCHIVOS DE CALCULO DE LAS DOS POLIGONALES DEL TRAMO CASA ROSADA - LAGUNA AZUL DEL MUNICIPIO DE UBALÁ SE EVIDENCIÓ QUE LOS CIERRES DE LAS MISMAS ESTÁN ACORDE A LO ESTIPULADO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, SIN EMBARGO, SE ENVÍAN LAS OBSERVACIONES AL TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA SOLICITANDOLE HACER LAS CORRECCIONES EN LOS ENCABEZADOS DE LAS HOJAS DE LOS ARCHIVOS, DONDE SE CITAN PUNTOS GPS QUE NO CORRESPONDEN (EN LA POLIGONAL 2 APARECEN LOS DE REFERENCIA DE LA POLIGONAL 1). A PARTE, SE SOLICITA HACER LLEGAR EN LA INFORMACIÓN PENDIENTE DE LA TOPOGRAFÍA DEL SECTOR EL POSICIONAMIENTO DE LOS PUNTOS GPS INTERMEDIOS DEL SECTOR GUAVIO, YA QUE EN ESTAS POLIGONALES LA LLEGADA Y SALIDA SE USARON UN PAR DE ESTOS (GPS 12.1 Y GPS12.2) PARA JUSTIFICAR LAS COORDENADAS DE LLEGADA Y SALIDA EN EL CÁLCULO DEL CIERRE DE LAS POLIGONALES MENCIONADAS.

EL JUEVES 26 DE JUNIO SE DA RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-076 APROBACIÓN DE HOJA DE VIDA – PROFESIONAL TOPÓGRAFO.

EL JUEVES 26 DE JUNIO SE ENVÍA COMUNICADO 766-095 AL CONTRATISTA DE OBRA DE REITERACIÓN EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS TOPOGRÁFICOS TRAMO CASA ROSADA – LAGUNA AZUL, MUNICIPIO DE UBALÁ (POLIGONALES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ABSCISADO) E INFORME POSICIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL TOPOGRÁFICO (GPS) INTERMEDIOS.

EL JUEVES 26 DE JUNIO SE ENVÍA COMUNICADO 766-096 AL CONTRATISTA DE OBRA DE LLAMADO DE ATENCIÓN Y SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE SEGUIMIENTOS SEMANALES E INFORMES DE OBRA.

CON RESPECTO A ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:
- EL LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS: EN EL TRAMO DEL MUNICIPIO DE UBALÁ DE 0,4 KM Y EN EL TRAMO DE JUNIN 1,5 KM DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO Y EN EL TRAMO DE CHOACHÍ 1,5 KM DE LA PROVINCIA DE ORIENTE.
- APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS EN LA SUBRASANTE 0,38 KM EN LA PROVINCIA DE ORIENTE
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN 12,9 KM EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ Y 1,9 KM DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE EN LA PROVINCIA DE ORIENTE.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DE AVANCES AMBIENTALES SON LAS SIGUIENTES:
1.CAPACITACION AL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS
2. INDUCCION AMBIENTAL AL PERSONAL
3. JORNADA DE ORDEN Y ASEO EN CAMPAMENTO
4.ACTUALIZACION CARTELERA AMBIENTAL
5. SE CONTINUA CON LA ELABORACION DEL CANAL RECEPTOR PARA RESIDUOS LIQUIDOS EN AREA DE TRABAJO
6. ASISTENCIA A COMITES
7.PREPARACION DE ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA SOCIALIZACION DE PMT.
8. GESTION DE LLEGADA DE LA SEÑALIZACION DE PMT.
9. ENTREGA DE INFORME MESNUAL No 2 DE MAYO APROBADO POR INTERVENTORIA.
10. GESTION DE LOS PUNTOS ECOLOGICOS A ESPERA DE LA RESPUESTA DEL CONTRATISTA.
11. GESTION DE BAÑO PORTATIL A ESPERA DE RESPUESTA DEL CONTRATISTA.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

EL 23 DE JUNIO, EL CONTRATISTA REMITIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DISEÑO DEL BANNER DEL PUNTO SAU AJUSTADO EN VERSIÓN 3, PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA

EL 23 DE JUNIO, EL CONTRATISTA REMITIÓ UN CORREO ELECTRÓNICO EN EL CUAL INDICÓ QUE, A LA FECHA NO SE ENVIÓ RESPUESTA A LA INVITACIÓN DE LA ALCALDÍA DE UBALÁ A LA PRIMERA FERIA GASTRONÓMICA Y DE SERVICIOS, YA QUE EL OFICIO ESTABA DIRIGIDO AL ICCU Y NO AL CONSORCIO SOFAN C-031. POR LO QUE QUEDÓ ATENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA EMITIR RESPUESTA O NO.

EL 24 DE JUNIO, EL CONTRATISTA REMITIÓ EL ACTA DE LA REUNIÓN PRELIMINAR NO. 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO, JUNTO CON EL LISTADO DE ASISTENCIA Y EL REGISTRO FOTOGRÁFICO, ADICIONALMENTE, INFORMÓ QUE, LA GRABACIÓN (AUDIO) DE LA REUNIÓN SE ENCUENTRA EN LA CARPETA COMPARTIDA; LO ANTERIOR, PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA.

EL 24 DE JUNIO, SE REMITIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO RESPUESTA AL CONTRATISTA HACIENDO CLARIDADES RESPECTO AL ENVIÓ OPORTUNO DE LA CORRESPONDENCIA QUE ESTÉ DIRIGIDA AL ICCU, LAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA Y REITERANDO LA SOLICITUD REALIZADA DE REMITIR RESPUESTA A LA ALCALDÍA DE UBALÁ FRENTE A LA INVITACIÓN A LA PRIMERA FERIA GASTRONÓMICA Y DE SERVICIOS. EN LA MISMA FECHA, SE REMITIÓ LA INVITACIÓN MENCIONADA A LA ENTIDAD. EN LA MISMA FECHA, EL CONTRATISTA REMITIÓ LA CARTA PROYECTADA PARA DAR RESPUESTA A LA ALCALDÍA DE UBALÁ PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA.

EL 24 DE JUNIO, SE REMITIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU EL DISEÑO DEL BANNER APROBADO POR LA INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y AVAL.

EL 24 DE JUNIO, SE REMITIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL INFORME MENSUAL NO. 2 EN VERSIÓN 2 OBSERVADO PARA ATENCIÓN DEL CONTRATISTA PARA ATENCIÓN EL 26 DE JUNIO A MEDIODÍA.

EL 25 DE JUNIO, SE REMITIERON AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE LA REUNIÓN PRELIMINAR NO. 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO Y DE LOS SOPORTES COMPARTIDOS EL 24 DE JUNIO, PARA SER ATENDIDOS A MÁS TARDAR EL 1 DE JULIO.

EL 25 DE JUNIO, SE REMITIÓ UNA OBSERVACIÓN A LA CARTA PROYECTADA PARA RESPUESTA A LA ALCALDÍA DE UBALÁ FRENTE A LA INVITACIÓN A LA PRIMERA FERIA GASTRONÓMICA Y DE SERVICIOS REFERIDA A UNIFICAR EL TIPO DE LETRA, ADICIONALMENTE, SE RECORDÓ QUE SI ÉSTA SE IBA A RADICAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL ARCHIVO DEBÍA ENVIARSE EN PDF. EN LA MISMA FECHA, EL CONTRATISTA REMITIÓ LA RESPUESTA A LA ALCALDÍA DE UBALÁ "PROGRAMAS SOCIALES", INDICANDO QUE, SI BIEN NO SE IBA A INSTALAR UN STAND, SE ENTREGARÍAN VOLANTES PARA DISPONERLOS EN LA FERIA, CON EL FIN DE QUE LOS INTERESADOS CONOCIERAN LA OFERTA LABORAL DEL PROYECTO. A TRAVÉS DEL MISMO MEDIO Y EN LA MISMA FECHA, LA INTERVENTORÍA REMITIÓ EL ACUSO ENTERADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR EL CONTRATISTA A LA ALCALDÍA DE UBALÁ, QUEDANDO ATENTOS A LOS SOPORTES DE ENTREGA DEL VOLANTE NO. 3.

EL 25 DE JUNIO, EL CONTRATISTA REMITIÓ EL VOLANTE NO. 2. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD AJUSTADO EN VERSIÓN 3 PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA. EN LA MISMA FECHA, LA INTERVENTORÍA REMITIÓ EL VOLANTE NO. 2 A LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU PARA REVISIÓN Y AVAL.

EL 25 DE JUNIO, LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU INFORMÓ QUE NO TENÍA OBSERVACIONES DEL DISEÑO DEL BANNER DEL PUNTO SAU REMITIDO EL 24 DE JUNIO POR LA INTERVENTORÍA. POR LO TANTO, EN LA MISMA FECHA, SE REMITIÓ DESDE LA INTERVENTORÍA EL AVAL AL CONTRATISTA PARA LA GESTIÓN DE IMPRESIÓN Y POSTERIOR INSTALACIÓN DEL BANNER.

EL 25 DE JUNIO, SE REMITIÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL VISTO BUENO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO – ALCALDÍAS MUNICIPALES, COMPARTIDA POR EL CONTRATISTA EL 20 DE JUNIO CON LOS AJUSTES REQUERIDOS.

EL 25 DE JUNIO, SE REMITIERON LAS OBSERVACIONES DE LAS CARTAS QUE SE RADICARÁN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ALCALDÍA DE UBALÁ Y VALLE DE TENZA (EMPRESA DE TRANSPORTE) RESPECTO AL INICIO DE ACTIVIDADES HIDRÁULICAS EN EL TRAMO CASA ROSADA – LAGUNA AZUL, EN LA PROVINCIA DEL GUAVIO Y ADICIONALMENTE, SE SOLICITÓ REMITIR EL FOLLETO DE SOCIALIZACIÓN DE PMT COMO SE ESTIPULÓ EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

EL 26 DE JUNIO, SE REMITIÓ UN CORREO ELECTRÓNICO AL CONTRATISTA, RECORDANDO LA FECHA Y HORA LÍMITE DE ENVÍO DEL INFORME MENSUAL NO. 2 CON LAS OBSERVACIONES ATENDIDAS. POR LO ATENTO, EL CONTRATISTA REMITIÓ EL INFORME MENSUAL NO. 2 EN VERSIÓN 3 AJUSTADO CON LOS RESPECTIVOS ANEXOS PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA.

EL 26 DE JUNIO, EL CONTRATISTA REALIZÓ LA INSTALACIÓN DEL BANNER DEL PUNTO SAU.

EL 27 DE JUNIO, POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU, SE REENVIÓ EL VOLANTE NO. 2. DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN. EN LA MISMA FECHA, LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU INDICÓ QUE SE DEBE AJUSTAR LA PIEZA COMPARTIDA A LA PLANTILLA EDITABLE REMITIDA POR ELLA. POR LO TANTO, SE DIRECCIONÓ ESTA OBSERVACIÓN AL CONTRATISTA PARA QUE SEA ATENDIDA.

EL 27 DE JUNIO, POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU, SE REENVIÓ EL VOLANTE NO. 3. DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN. EN LA MISMA FECHA, LA SUPERVISIÓN SOCIAL, MANIFESTÓ QUE NO TENÍA OBSERVACIONES. POR LO TANTO, EN LA MISMA FECHA, SE REMITE EL AVAL AL CONTRATISTA PARA INICIAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA PIEZA.

EL 27 DE JUNIO, POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU, SE REENVIARON LAS ACTAS DE LAS MESAS DE TRABAJO NO. 6, 9 Y 10 PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN Y FIRMA.

EL 27 DE JUNIO, POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN SOCIAL DEL ICCU, SE REENVIÓ LA INVITACIÓN A LA PRIMERA FERIA GASTRONÓMICA Y DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE UBALÁ, ASÍ MISMO, SE COMPARTIÓ LA CARTA DE RESPUESTA QUE ENVIÓ EL CONTRATISTA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD.

EL 27 DE JUNIO, SE REALIZÓ LA MESA DE TRABAJO SEMANAL NO. 13 DE SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL, DONDE EL CONTRATISTA HIZO EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA (21 AL 27 DE JUNIO) Y LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA, ADICIONALMENTE, SE HIZO EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA MESA DE TRABAJO NO. 12.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO: MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN: 0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA: 22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 28 de junio de 2025	**SEMANA No.**	**11**	DEL	**21-jun-25**	AL	**27-jun-25**

EL 27 DE JUNIO EL CONTRATISTA, REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LOS TRES (3) BUZONES SATELITALES EN EL TRAMO CASA ROSADA LAGUNA AZUL.

EL 27 DE JUNIO, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE 15 VOLANTES No. 3. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA A LA ENCARGADA DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA ALCALDÍA DE UBALÁ.

DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE JUNIO, SE RECIBIERON A TRAVÉS DEL PUNTO SAU 10 HOJAS DE VIDA, OCHO (8) DE MANERA PRESENCIAL AL PUNTO SAU Y DOS (2) POR WHATSAPP.

4.4 GESTION SST DEL PROYECTO

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SE DESARROLLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1.SE LE SOLICITA HACER SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DEL BAÑO PORTATIL, Y LA BATERIA SANITARIA QUE HAY EN CAMPAMENTO Y OFICINA SEGUIMIENTO POR ESCRITO DEL ORDEN Y ASEO.
2.SE SOLICITA HACER SEGUIMIENTO EN LOS FRENTES DE TRABAJO CON RELACION AL PERSONAL.
3.SE SOLICITA REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL POR CADA FRENTE DE TRABAJO.
4. DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DE LOS FRENTES DE TRABAJO TENER EL ATS YA QUE ES IMPORTANTE EL PASO A PASO DE LA TAREA.
5. SE SOLICITA LA ACTUALIZACION DEL MEDEVAC TENIENDO EN CUENTA LOS FRENTES DE TRABAJO Y EL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES.
6.EL CONTRATISTA ENTREGA SUBSANACION DE INFORME N° 1 ABRIL-25
7.INFORME N° 2 MAYO-25 SE ENTREGA, PERO SE OBSERVA EN PROCESOS DE SUBSANACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.
8. SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA POR PARTE DE MESAS DE TRABAJO Y DE MANERA VERBAL.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

DE ACUERDO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA ESTAS FASES I Y II DE CARACTERIZACIÓN CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE SUELOS CERTIFICADO, PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS IN SITU, ADEMÁS, CUENTA CON EQUIPOS DE GEOPOSICIONAMIENTO Y TOPOGRAFÍA PARA DICHAS ACTIVIDADES.

5. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

SE REPORTA UN RETRASO DEL -2,40%, YA QUE EL AVANCE PROGRAMADO ERA DEL 5,93% Y SOLO SE HA EJECUTADO EL 3,53%. EL CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE, A PESAR DE HABER INCREMENTADO EL NÚMERO DE CUADRILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN, EN LAS PROVINCIAS DEL GUAVIO Y ORIENTE SE HAN PRESENTADO LLUVIAS FUERTES Y CONSTANTES QUE HAN IMPEDIDO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS LABORES. ADEMÁS, EN LA PROVINCIA DE MEDINA NO SE HAN INICIADO LAS ETAPAS DE CARACTERIZACIÓN DEBIDO AL FUERTE SISMO OCURRIDO EL PASADO 8 DE JUNIO, EL CUAL HA GENERADO RETRASOS EN LA LOGÍSTICA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL A LA ZONA

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

EN ESTE ASPECTO NO SE PRESENTAN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A	N/A	N/A

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

PARA EL PRESENTE INFORME SEMANAL NO SE CONTEMPLARÁ ESTE CAPÍTULO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS FASES DE CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS QUE SE VAN A INTERVENIR Y POR AHORA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y/O ACTIVIDADES NO PREVISTAS NI MAYORES CANTIDADES.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO SOFAN C-031 CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE LAS FASES I Y II DE CARACTERIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE JUNÍN DE LA PROVINCIA DEL GUAVIO Y EN LOS MUNICIPIOS DE CHOACHÍ, FOSCA Y FÓMEQUE EN LA PROVINCIA DE ORIENTE.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN):







ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 28 de junio de 2025	SEMANA No.	11	DEL	21-jun-25	AL	27-jun-25

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO):







9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE ORIENTE:

FOSCA (FOSCA-QUINCHITA-SANAME)








CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)



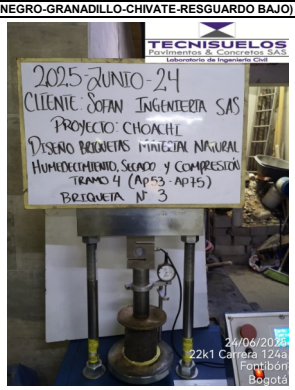



FOMEQUE (FOMEQUE-CÁQUEZA):







ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023


PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 28 de junio de 2025	SEMANA No.	11	DEL	21-jun-25	AL	27-jun-25

INSTALACIÓN BANNER PUNTO SAU - MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA DEL GUAVIO - 26 DE JUNIO



MESA DE TRABAJO No. 13 - 27 DE JUNIO



INSTALACIÓN DE BUZONES SATELITALES - 27 DE JUNIO







ENTREGA DE VOLANTE No. 3. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA - 27 DE JUNIO



Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.07.01 16:18:03 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
