INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 12
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA "COOTRACAVIL"

CONTRATO 1449 DE 2024

PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

MAYO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", Lote 6, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS,** expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el periodo del primero (1) y el treinta (30) de abril de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL C.T.A."

El contrato 1449 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL C.T.A."

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACAVIL.

La microempresa COOTRACAVIL encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

- Vía 9004 Lorica - Coveñas, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000,
- Vía 2103 Cereté - Lorica. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360
- Vía 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (Lorica) - PR10+0000 (Purísima)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL C.T.A.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRACAVIL", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores 9004 Lorica - Coveñas, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 Cereté - Lorica. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (Purísima), a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de abril de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ ***COOTRACAVIL (CONTRATO 1449 DE 2024)***
Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

- **VIA 9004 LORICA – COVEÑAS**

Semana 1: Martes 1 – Domingo 6 de Abril de 2025.

- Limpieza de calzada en el PR1+0050, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR24+0800 hasta el PR26+0950, en donde se podaron 5 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 7 – Domingo 13 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR26+0000 hasta el PR29+0100 y desde el PR24+0000 hasta el PR26+0000, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0500 hasta el PR29+0100, desde el PR24+0850 hasta el PR24+0900 y desde el PR1+0650 hasta el PR1+0700, en donde se limpiaron 700 metros lineales con 9 jornales de jornal de trabajo.
- Parcheo con asfalto reciclado en el PR0+0600, en donde se colocó un metro cubico con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR1+0700, con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR2+0400 hasta el PR4+0000, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR2+0400 hasta el PR3+0000, en donde se limpiaron 600 metros lineales con 3 jornales de jornal de trabajo

- Elaboración e instalación de postes de referencia entre el PR24+0000 y el PR30+0000, en donde se colocaron 3 postes con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 21 – Domingo 27 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR1+0800 hasta el PR2+0400 y desde el PR4+0000 hasta el PR5+0800, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 28 – Miércoles 30 de Abril de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ **VIA 7801 LORICA – CHINU**

Semana 1: Martes 1 – Domingo 6 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR4+0000 hasta el PR5+0500 y desde el PR1+0600 hasta el PR4+0000, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR4+0900 hasta el PR4+0970, en donde se limpiaron 70 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 7 – Domingo 13 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR1+0600, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR3+0460 hasta el PR3+0490, en donde se limpiaron 30 metros lineales con 3 jornales de jornal de trabajo.
- Limpieza del puente El Toto en el PR1+0600, con 8 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Abril de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 21 – Domingo 27 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR8+0000 hasta el PR10+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR5+0050 hasta el PR8+0000 lado izquierdo de la vía y desde el PR4+0500 hasta el PR8+0000 lado derecho de la vía, con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR5+0000 hasta el PR5+0750 y desde el PR6+0000 hasta el PR6+0100, en donde se limpiaron 850 metros lineales con 6 jornales de jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR8+0300 hasta el PR9+0150, en donde se limpiaron 2 obras con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señales en el PR8+0000, en donde se despejaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR8+0000 hasta el PR9+0000, en donde se podaron 2 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 28 – Miércoles 30 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR1+0600 hasta el PR4+0500, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR2+0400 hasta el PR2+0450, en donde se limpió 1 obra con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR3+0160 hasta el PR3+0180, en donde se podaron 2 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ VIA 2103 CERETE – LORICA

Semana 1: Martes 1 – Domingo 6 de Abril de 2025.

- Limpieza y erradicación de basureros en PR48+0400 y en el PR49+0090, con 8 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 7 – Domingo 13 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR48+0400 hasta el PR49+0100, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente Caño de Aguas Prietas en el PR49+0113, con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR48+0570, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza y retiro de basura en el PR49+0050, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Abril de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR7+0400 hasta el PR10+0764, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR48+0350 hasta el PR49+0100, en donde se limpiaron 750 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Instalación de señal vertical en el PR7+0740, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR7+0780 hasta el PR8+0000, en donde se podaron 5 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Parcheo con asfalto frio en el PR7+0630, en donde se colocó un saco con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 21 – Domingo 27 de Abril de 2025.

- Elaboración e instalación de poste de referencia en el PR7+0000, en donde se colocó 1 poste con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 28 – Miércoles 30 de Abril de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el periodo del primero (1) y el treinta (30) de abril de 2025. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento Caño Viejo, en el PR32+0730, vía 9003, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA MICROEMPRESA

MICROEMPRESA	COOTRACAVIL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ-LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.
NÚMERO DEL CONTRATO	1449 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$930.269.866,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$930.269.866,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La microempresa Cootracavil informa diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de abril de 2025 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se colocó un metro cúbico (1 m3) de asfalto reciclado para la actividad de tapahuecos en puntos críticos de la vía 9004.

Se colocó un saco de asfalto frio para la actividad de tapahuecos en puntos críticos de la vía 2103.

Se elaboraron e instalaron 4 postes de referencia en concreto en puntos faltantes para mejorar la referenciación sobre la vía.

La cooperativa estuvo disponible para atender las emergencias que pudieran ocurrir en la vía a cargo.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Salud Mental".

ANEXOS

CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
NIT. No. 812.008.049-2.
CONTRATO No. 1449 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR4+0000	PR5+0500	3	3	1,50	0,90	8	0,11	VIA 7801
PR1+0600	PR4+0000	4	5	2,40	2,16	8	0,27	VIA 7801
PR+00	PR1+0600	3	4	1,60	1,12	8	0,14	VIA 7801
PR26+0000	PR29+0100	3	4	3,10	2,17	8	0,27	VIA 9004
PR24+0000	PR26+0000	3	3	2,00	1,20	8	0,15	VIA 9004
PR48+0400	PR49+0100	4	4	0,70	0,56	8	0,07	VIA 2103
PR7+0400	PR10+0764	4	4	3,36	2,69	8	0,34	VIA 2103
PR2+0400	PR4+0000	3	4	1,60	1,12	8	0,14	VIA 9004
PR1+0800	PR2+0400	3	3	0,60	0,36	8	0,05	VIA 9004
PR4+0000	PR5+0800	3	4	1,80	1,26	8	0,16	VIA 9004
PR8+0000	PR10+0000	5	5	2,00	2,00	8	0,25	VIA 7801
PR5+0050	PR8+0000	4		2,95	1,18	8	0,15	VIA 7801
PR4+0500	PR8+0000		5	3,50	1,75	8	0,22	VIA 7801
PR1+0600	PR4+0500	4		2,90	1,16	8	0,15	VIA 7801
PR1+0600	PR4+0500		4	2,90	1,16	8	0,15	VIA 7801

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR4+0900	PR4+0970	X		Triangular	70	3	23,3	VIA 7801
PR28+0500	PR29+0100	X		Triangular	600	3	200,0	VIA 9004
PR24+0850	PR24+0900	X		Triangular	50	3	16,7	VIA 9004
PR1+0650	PR1+0700	X		Triangular	50	3	16,7	VIA 9004
PR3+0460	PR3+0490	X		Triangular	30	3	10,0	VIA 7801
PR2+0400	PR3+0000	X		Triangular	600	3	200,0	VIA 9004
PR5+0000	PR5+0750	X		Triangular	750	3	250,0	VIA 7801
PR6+0000	PR6+0100	X		Triangular	100	3	33,3	VIA 7801

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR48+0350	PR49+0100	X		I-D	750	4	187,5	VIA 2103

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR8+0300	PR9+0150	2	2	2	3	0,67	VIA 7801
PR2+0400	PR2+0450	1	1	1	3	0,33	VIA 7801

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
NIT. No. 812.008.049-2.
CONTRATO No. 1449 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR1+0600	EL TOTO	10,6	8	1,33	VIA 7801
PR49+0100	CAÑO DE AGUAS PRIETAS	71	4	17,75	VIA 2103 (Concreto)

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍAS 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó la actividad de limpieza y erradicación de basureros en PR48+0400, PR49+0050 y en el PR49+0090 de la vía 2103.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada PR1+0050 de la vía 9004.
- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles sobre las vías 2103, 9004 y 7801.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con material de fresado reciclado con ACPM en el PR0+0600 de la vía 9004.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada en el PR1+0700 de la vía 9004 y en el PR48+0570 de la vía 2103.
- Se realizó la actividad de instalación de señal vertical PR7+0740 de la vía 2103.
- Se realizó la actividad de elaboración e instalación de postes de referencia en el PR28+0000 y en el PR29+0000 de la vía 9004 y en el PR7+0000 de la vía 2103.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con asfalto frio en el PR7+0630 de la vía 2103.
- Se realizó la actividad de despeje de señales PR8+0000 de la vía 7801.
RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	20,8	120	0,17	90%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	2250	24	94	94%
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	750,0	4	188	96%
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	3	6	0,5	95%
4	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	2	12	0,2	98%
5	TAPAHUECOS CON ASFALTO FRIO		UND	1	2	0,5	100%
5	TAPAHUECOS CON MATERIAL DE FRESADO RECICLADO CON ACPM		M3	1	3	0,3	100%
5	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES		UND	14	8	1,75	95%

OBSERVACIONES

- Durante el mes de mayo se debe continuar priorizando la actividad de rocería para mantenerla en los porcentajes de cumplimiento de INVIAS.
- Se debe continuar priorizando la limpieza de cunetas, obras de drenaje, puentes y pontones dado el inicio de la temporada invernal.
- En el mes de mayo se debe ejecutar la actividad de limpeza de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Durante este mes se debe delantar la limpieza de las señales verticales principalmente en el sector de Coveñas.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento.
Representante Legal

Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**01 - 06 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 7801; PR4+0900

ANTES




DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR5+0500

ANTES

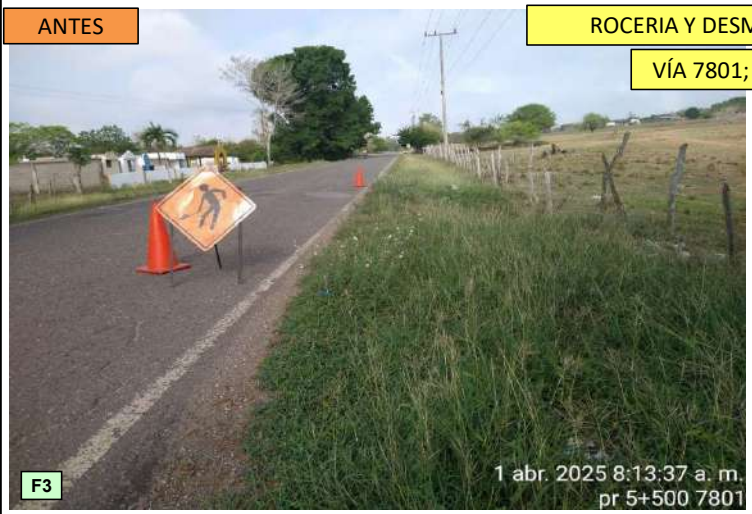

DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR3+0950

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
FECHA:	01 - 06 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

LIMPIEZA Y ERRADICACIÓN DE BASUREROS

VÍA 2103; PR49+0100

DURANTE



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103; PR49+0100

ANTES



DESPUES



RETIRO DE BASURA

VÍA 2103; PR49+0100

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	01 - 06 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 9004; PR24+0800

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 9004; PR1+0050

ANTES



DURANTE



DESPEJE DE SEÑALES

VÍA 9004; PR28+0300

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	01 - 06 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 9004; PR26+0950

DESPUES





ANTES

DESPEJE DE SEÑALES

VÍA 9004; PR28+0100

DESPUES





DURANTE

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 9004; PR28+0150

DESPUES





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	07 - 13 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ROCERÍA Y DEMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR1+0600

DURANTE



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR1+0600

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 7801; PR4+0460

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	07 - 13 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
LIMPIEZA DE CALZADA
VÍA 9004; PR1+0750

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR24+0000

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 9004; PR24+0850

DURANTE



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**2103: CERETÉ - LORICA**	**SECTOR:**	**CERETÉ - LORICA**
FECHA:	**07 - 13 DE ABRIL DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 2103; PR48+0050

DESPUES





ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103; PR49+0100

DESPUES





ANTES

ABSCISADO DE LA VIA

VÍA 2103; PR48+0700

DESPUES





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
FECHA:	14 - 20 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 2103; PR10+0800

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑALES
VÍA 2103; PR7+0760

DURANTE



DESPUES



INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL
VÍA 2103; PR7+0740

DURANTE



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
FECHA:	14 - 20 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

APLOMADO DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR49+0900

DESPUES





ANTES

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 2103; PR48+0350

DURANTE





ANTES

LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 2103; PR48+0350

DURANTE





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	21 - 27 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ROCERÍA Y DEMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR10+0000

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR8+0000 LI

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR8+0000 LD

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	28 - 30 DE ABRIL DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

CAPACITACIÓN A LAS COOPERATIVAS

TEMA: SALUD MENTAL

DURANTE



DURANTE



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR4+0550

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR3+0160

ANTES



DESPUES

