INFORME ACTA DE COBRO 01

(COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2025 al 31/08/2025)

1. INTRODUCCION

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

2. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA".

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	4182.010.32.1.634-2025
CONTRATISTA	MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

Documento de identificación del contratista: *16.758.135*

Interventoría: *INARCONST S.A.S*

Obra Física Ejecutada Acumulada: *34.92 %*

COMPONENTE JURÍDICO

Fecha de Inicio: 01/08/2025

Fecha de Terminación Inicial: 01/11/2025

Suspensiones del contrato:

-

Reanudación del contrato:

-

Modificaciones del contrato 1: Del 2 de agosto del 2025, Se ajustan clausulas Cuarta y Vigésima octava debido a un error en el numero del CDP emitido inicialmente para la obra.

-

Suspensiones del contrato:

-

COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($708.291.172,00)

- **Resumen Contable y Financiero:**

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar en acta 1	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$708.291.172	$ 247.321.291,00	$ 0	$ 460.969.881,00

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA

REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTOPROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA

MOVIMIENTO DE TIERRA

- Se realizan excavaciones y movimientos de tierra en seco y/o en material conglomerado, ejecutados manualmente conforme a los diseños y especificaciones del proyecto.
- Se instala geotextil sobre el terreno previamente compactado, conformando la base para la disposición de los bolsacreto, de acuerdo con los diseños y especificaciones del proyecto.
- Se ejecuta relleno con material importado (roca muerta), suministrado por el contratista, conforme a las especificaciones del proyecto.


SEÑALIZACION

- Se realiza el cerramiento en tela.

MURO CONCRETO REFORZADO


- Se ejecuta la demolición de muro en concreto armado de 30 cm de espesor, cumpliendo con las especificaciones de seguridad y el plan de manejo de escombros
- Se realiza bombeo con motobomba hidráulica para el control y evacuación de aguas en el área de trabajo, garantizando la continuidad de las actividades constructivas.
- Se realiza el suministro e instalación de solado en concreto de 0,05 m de espesor, con resistencia de 2.000 psi (14 MPa), conforme a las especificaciones del proyecto.
- Se realiza el suministro, transporte, acarreo e instalación de acero de refuerzo con resistencia de 60.000 psi, de acuerdo con los diseños estructurales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO MOVIMIENTO DE TIERRAS

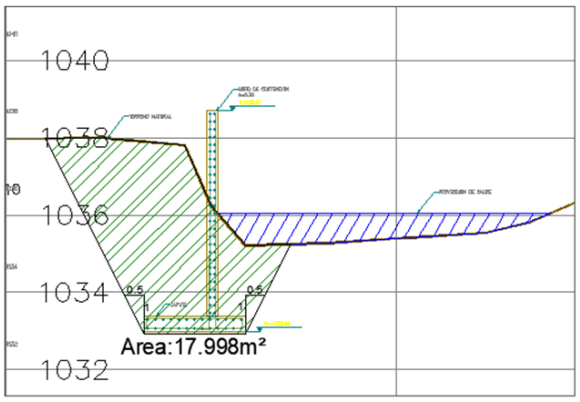




Fotografía 1. Excavaciones

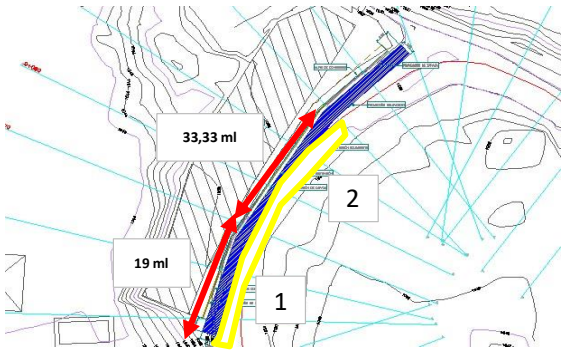



Fotografía 2. Geotextil

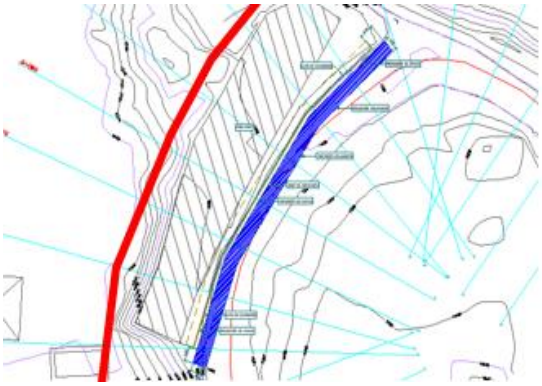




Fotografía 3. cerramiento en tela de zona obra





Fotografía 4. bombeo con motobomba hidráulica

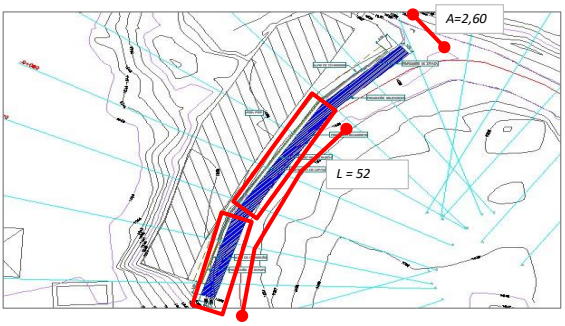



Fotografía 5. sum. e inst. de solado espesor e=0.05m 2000 psi 14 mpa





Fotografía 6 . acero de refuerzo 60.000 psi incluye transporte y acarreo





Fotografía 7. Construcción Ataguía e instalación de tubería Novafort 8”





Fotografía 8. demolición de muro en concreto armado e=30cm

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
CONTRATISTA
