Informe Mensual No. 6
CONTRATO 552-2024 COP (120683)
Periodo: del 1 al 31 de julio de 2025



OBJETO DEL CONTRATO:

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”

CONTRATISTA:

Consorcio Teusavial

CONSORCIO TEUSAVIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA No. 552-2024 COP (120683)

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Informe de Gestión Social No. 6

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Número de revisión: 1		**Versión No. 1**
Elaborado por: CONSORCIO TEUSAVIAL		
Responsable por elaboración Residente social	Nombre	T.S Ángela María Quiroga G.
	Firma	
Aprobado por: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG		
Responsable por Aprobación Residente Social de Interventoría	Nombre	T.S. Luz Escobar Ospina
	Firma	
Agosto de 2025		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. JUSTIFICACIÓN 7
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 8
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 9
5. ALCANCE DEL PROYECTO 11
6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL 11
7. GESTIÓN SOCIAL 11
7.1 Objetivo General. 12
7.2 Objetivos Específicos. 12
8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 12
9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. 13
9.1 Afiches informativos 13
9.2 Reuniones de inicio 13
9.3. Reuniones de finalización 14
9.4. Reuniones Extraordinarias 15
9.5. Socializaciones 15
10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO. 17
10.1. Objetivo General 17
10.2. Puntos satélites de información 17
10.3. Volante informativo de inicio de obra 18
10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra 19
10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias . 20
10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad 20
10.7. Volante Oferta laboral 21
10.8. Volante de información ciudadana 21
10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 22
10.10. Volante otras informaciones 22
10.11. Volante notificación cierre actas de vecindad 23
10.12. Volante de convocatoria a reuniones de finalización de obra 25
11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD 26
11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales. 26
11.2. Actas de compromiso. 27
11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas 27

11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió. 27
11.5. Actas de Vecindad de cierre 27
12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 30
12.1. Punto PAC fijo 30
12.2. Punto PAC VIRTUAL 31
12.3. Punto PAC Móvil 31
12.5 PQRSD 32
12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano 35
13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 36
13.1. Objetivo General 36
14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO. 36
14.1 Objetivo General 36
14.2 Capacitación mensual 36
15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA 37
15.1 Objetivo General 37
15.2 Generación total de empleo 37
5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 6. 41
16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES 44
16.1 Objetivo General. 44
16.2 Seguimientos por periodo 45
17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 45
17.1 Informes Semanales 45
17.2 Informe Mensual 46
17.3 Informe Final 46
18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS. 47
18.1 Comités de Gestión Social 47

Listado de Tablas

Tabla 1 Información del proyecto 8
Tabla 2 Información del Contratista 8
Tabla 3 Información de la Interventoría 9
Tabla 4 CIV´S del proyecto 10
Tabla 5 Personal mínimo requerido área social 11
Tabla 6 Consolidado realización reuniones de inicio 14
Tabla 7 Consolidado realización reuniones de finalización 14
Tabla 8 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo 16

Tabla 9 PSI vigentes en el periodo 17
Tabla 10 Indicador PSI instalados 18
Tabla 11 Indicador PSI actualizados 18
Tabla 12 Indicador PSI desinstalados 18
Tabla 13 consolidado notificación de inicio de obra 19
Tabla 14 Indicador distribución de volantes de inicio de obra 19
Tabla 15 consolidado convocatoria reuniones de inicio 20
Tabla 16 Indicador distribución de volantes de convocatoria a reunión inicio 20
Tabla 17 Consolidado notificación inicio actas de vecindad en el periodo 21
Tabla 18 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad primera visita en el periodo 21
Tabla 19 Consolidado notificación otras informaciones 22
Tabla 20 Indicador distribución de volantes de otras informaciones en el periodo 22
Tabla 21 Consolidado notificación cierre de actas de vecindad en el periodo 23
Tabla 22 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad primera visita en el periodo 23
Tabla 23 Consolidado de distribución de volante notificación segunda visita de cierre actas de vecindad 24
Tabla 24 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad segunda visita en el periodo 24
Tabla 25 Consolidado de distribución de volante notificación tercera visita de cierre de actas de vecindad 24
Tabla 26 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad tercera visita en el periodo 24
Tabla 27 consolidado convocatoria reuniones de finalización 25
Tabla 28 Indicador distribución de volantes de convocatoria a reunión finalización 25
Tabla 29 Consolidado levantamiento actas de vecindad en el periodo 26
Tabla 30 Indicador levantamiento actas de vecindad en el periodo 27
Tabla 31 Consolidado cierres de actas de vecindad 28
Tabla 32 Consolidado divulgación copias de actas de vecindad a la comunidad 29
Tabla 33 Indicador divulgación copias de actas de vecindad 30
Tabla 34 Tabla de atención PUNTO PAC 32
Tabla 35 Indicador Punto PAC Móvil 32
Tabla 36 Consolidado PQRSD 33
Tabla 37 Consolidado de reuniones comité de participación ciudadana 36
Tabla 38 Realización de capacitación mensual 37
Tabla 39 Indicador realización de capacitación mensual 37
Tabla 40 Personal contratado en el periodo No. 6 38
Tabla 41 Porcentajes MONF – Mujeres en el periodo 41
Tabla 42 Personal MONF en el periodo 41
Tabla 43 Indicador vinculación MONC 43
Tabla 44 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021 43

Tabla 45 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo 44
Tabla 46 Indicador control y seguimiento de dotaciones 45

Lista de Anexos

Anexo 1 Acta de reunión de inicio Galerías, listado de asistencia y registro fotográfico. 14
Anexo 2 Actas de reunión de entrega a la comunidad tramos Nicolas de Federman tramos 2 y 3, listado de asistencia y registro fotográfico. 14
Anexo 3 Actas de socialización PMT Alfonso López tramo 2, Chapinero Occidental tramos 1, 2 y 3, registro fotográfico. Acta socialización inicio de obra Ortezal, listado de firmas, plano PMT y registro fotográfico, acta de socialización suspensión accidental del servicio de energía Nicolás de Federmán y registro fotográfico 16
Anexo 4 PSI vigentes en el periodo 17
Anexo 5 Formato control entrega de piezas de divulgación de inicio de obra, volante, registro fotográfico tramo Nicolás de Federmán. 19
Anexo 6 Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de inicio, volante y registro fotográfico tramo Galerías. 19
Anexo 7 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante levantamiento actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Chapinero Occidental, Nicolás de Federmán. 21
Anexo 8 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante convocatoria reunión del comité ciudadano y registro fotográfico Nicolás de Federmán. 22
Anexo 9 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Nicolás de Federmán. 23
Anexo 10 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico Nicolas de Federmán tramo 2. 24
Anexo 11 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico Nicolas de Federmán tramo 2. 24
Anexo 12 Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de finalización, volante y registro fotográfico tramos 2 y 3 barrio Nicolás de Federmán 25
Anexo 13 Formatos de control entrega de copias de actas de vecindad y registros fotográficos Nicolas de Federmán. Tramo 1 y 3, Galerías, Alfonso López y San Luis. 29
Anexo 14 PQRSD No. 5. 32
Anexo 15 Acta de reunión de participación ciudadana comité ciudadano tramo 1 Nicolás de Federmán. 35
Anexo 16 Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 6 36

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados y avances de la Gestión Social del contrato No. 552-2024 COP (120683) el cual hace parte integral de los componentes requeridos en el marco de ejecución, cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES",** celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la firma Consorcio Teusavial.

Con base a lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, busca elevar las condiciones de bienestar de la ciudadanía, a través del cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas que deben desarrollar los contratistas en el marco del Plan de Desarrollo Local. Lo anterior con el fin de minimizar el impacto social generado por las obras de la construcción de vías en los diferentes barrios de la localidad de Teusaquillo, ejecutadas por la firma Consorcio Teusavial.

Dentro de los fines y objetivos del presente informe, se plantea describir las acciones realizadas desde la parte social del contratista en la etapa preliminar del contrato No. 552-2024 COP (120683), cabe señalar que este informe entregará un resumen de la gestión realizada en el **periodo No. 6, del 1 al 31 de julio de 2025**, a partir de los siguientes programas:

- Programa de divulgación e información a la comunidad.
- Programa de atención al ciudadano
- Programa de sostenibilidad.
- Programa de capacitación empleados del proyecto
- Programa de control y seguimiento a dotaciones.
- Programa de contratación de mano de obra no calificada.
- Programa de gestión de aseguramiento de la calidad.
-

2. JUSTIFICACIÓN

Con ocasión de la ejecución del contrato No. 552-2024 COP (120683), cuyo objeto **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"** y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, es una entidad de carácter público, la cual es responsable de la contratación de múltiples obras de infraestructura junto con el espacio público, es importante ejecutar obras que den alcance y respuesta a las necesidades de las comunidades.

Por lo anterior la ejecución de obras en los diferentes segmentos viales de la localidad de Teusaquillo, se convierte en acciones de carácter misional que cumple el FDLT, mediante la intervención de obras de infraestructura vial y del espacio público que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Por lo tanto, se plantean estrategias y actividades que mitiguen los impactos generados debido a la ejecución de las obras a través de la implementación del Plan de Gestión Social y sus respectivos programas.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 1 Información del proyecto

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo	
Contrato No.	552-2024 COP (120683)
Objeto del contrato	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
Localización del proyecto	Teusaquillo
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	22 de enero de 2025
Fecha de terminación	21 de septiembre de 2025

Fuente: acta de inicio Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 2 Información del Contratista

Contratista	
Contratista	Consorcio Teusavial
Director de obra	Ing. Juan Felipe Delgado.
Residente técnico	Ing. Andrés Echandía
Residente junior	Ing. Marcela Arévalo
Residente SST	Ing. Camilo Durán
Residente Ambiental	Ing. Camilo Durán
Residente Social	T.S Angela María Quiroga G.

Fuente: Archivos del contratista Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 3 Información de la Interventoría


Interventoría	
Contratista	Consorcio Interteusaquillo JG
Director de obra	Ing. Jorge Gómez Falla
Residente técnico	Ing. Johan Mojica Sierra
Residente SST	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Ambiental	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Social	T.S. Luz Escobar Ospina

Fuente: residente social de interventoría

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

EL contrato se ejecuta en la localidad 13 de Teusaquillo, esta localidad está compuesta por seis UPL, las cuales son:

- ✓ UPL 100 Galerías
- ✓ UPL 101 Teusaquillo
- ✓ UPL 104 Parque Simón Bolívar – CAN
- ✓ UPL 106 La Esmeralda
- ✓ UPL 107 Quinta Paredes
- ✓ UPL 109 Ciudad Salitre Oriental

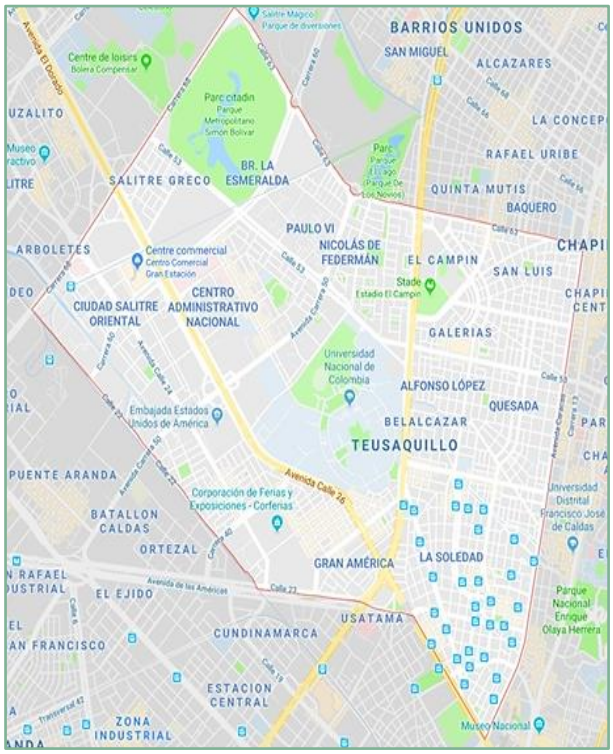

Fuente: Anexo técnico CCE-EICP-IDI-01
Imagen 1 Mapa de la localidad de Teusaquillo

El contrato No. 552-2024 COP (120683), realizará intervención vial en las UPL, Galerías, Teusaquillo, La Esmeralda y Quinta Paredes, de acuerdo con el listado de vías contempladas en el anexo técnico del contrato en referencia, lo cual representa un factor positivo para la ciudadanía puesto que habrá cobertura en un número significativo de UPL, de la localidad. A continuación, se relacionan los CIV´S a intervenir.

Tabla 4 CIV´S del proyecto

No	CIV o Código	No. UPL	Barrio	Eje Vial
1	13002387	101 Teusaquillo	Teusaquillo	Carrera 24 entre SE y Avenida Calle 34
2	13000593	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58B y 59
3	13000686	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58 y 58A
4	13000794	100 Galerías	San Luis	Carrera 16 entre Calles 57 y 58
5	13001165	100 Galerías	Alfonso López	Carrera 27 entre Calles 50 y 51
6	13002083	101 Teusaquillo	La Magdalena	Calle 38 entre Carreras 17A y 17
7	13000284	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58A y 59
8	13000343	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58 y 58A
9	13000476	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 36A entre Calles 57A y 57B
10	13000846	100 Galerías	Campin	Transversal 28 entre Carrera 28 y Diagonal 61B
11	13000875	100 Galerías	Galerías	Calle 53B entre Carrera 27 y Transversal 27A
12	13000864	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Calle 53A entre Carreras 35 y 36
13	13000336	100 Galerías	San Luis	Diagonal 61B entre Carreras 19A y 20
14	13000826	100 Galerías	Chapinero Occidental	Avenida Calle 57 entre Avenida Carrera 14 y Carrera 14A
15	13000814	100 Galerías	Chapinero Occidental	Carrera 14A entre Avenida Calle 57 y Calle 58

Fuente: Anexo técnico Contrato 552-2024 COP (120683)

5. ALCANCE DEL PROYECTO

En el presente documento se da respuesta al lineamiento técnico y social del contrato COP-552-2024 COP (120683), donde se garantiza por parte del contratista el cumplimiento del Plan de Gestión Social, a través del desarrollo de los programas aquí planteados.

Cabe resaltar que todos los procesos que surjan deben contar con la aprobación de la Interventoría y por su parte el contratista brindará una atención permanente y oportuna a los requerimientos realizados por la comunidad.

6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL

El equipo humano de la gestión social está integrado por profesionales idóneos los cuales trabajarán de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director, residente, residente ambiental, residente de seguridad y salud en el trabajo en pro de favorecer la ejecución de las obras de manera eficaz y oportuna. El Consorcio Teusavial, cuenta con el siguiente personal a fin de cubrir todas las obligaciones contenidas en el Plan de Gestión Social del Contrato:

Tabla 5 Personal mínimo requerido área social

Cargo	Nombres y apellidos	Dedicación
Residente Social	T.S Ángela María Quiroga G	100 %

Fuente: elaboración propia

7. GESTIÓN SOCIAL

Para el **sexto periodo**, la firma contratista Consorcio Teusavial, por medio de la residente social, diseñó y realizó la distribución de diferentes piezas informativas, también se realizó socialización de Plan de Manejo de Tránsito de emergencia de vías asignadas para acciones de movilidad por la entidad contratante, barrios Nicolás de Federmán, Chapinero Occidental, Palermo, El Recuerdo y Ortezal.

7.1 Objetivo General.

Describir las acciones y actividades adelantas por el área de Gestión Social, de acuerdo a cada uno de los programas que hacen parte de este componente; garantizando a la comunidad del área de influencia directa del proyecto una información clara, veraz y oportuna que les permitan participar y apropiarse por las obras ejecutadas

7.2 Objetivos Específicos.

- Fomentar canales de comunicación que permitan al contratista brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades del área de influencia del proyecto.
- Generar escenarios de participación comunitaria que faciliten la interacción entre la ciudadanía, el contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.
- Brindar por medio de estrategias, una atención al ciudadano oportuna y eficaz, dando alcance a sus solicitudes, inquietudes, sugerencias quejas y/o reclamos que surjan con la ejecución de las obras.
- Mitigar los impactos sociales causados por la ejecución de las obras contempladas dentro del proyecto.

8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

A continuación, se describe las actividades que adelantó el contratista desde el componente social en el **sexto periodo**, en pro de dar cumplimiento a las obligaciones de gestión social, las cuales están encaminadas a garantizar que los usuarios beneficiarios de los diferentes frentes de obra o CIV del proyecto y/u otros actores representantes organizaciones sociales, socioeconómicas y ambientales, se mantengan informados sobre las obras:

- Recorridos por los frentes de obra.
- Elaboración de metodología y cronograma de actividades del Plan de Gestión Social.
- Asistencia a los comités de seguimiento.
- Realización de trabajo interdisciplinario con los profesionales de las otras áreas que hacen parte del proyecto (Técnica, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST), para garantizar el cumplimiento de los criterios del proyecto de manera integral.
- Implementación de los formatos, informes semanales, mensual, entre otros.

9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

El área social del contratista en el **periodo No. 6,** mantuvo el objetivo de fortalecer los procesos de comunicación con la comunidad y sus representantes, de manera que se genere una relación de confianza y participación constante, entre los diversos actores involucrados directa o indirectamente en la obra.

9.1 Afiches informativos

El contratista **en el periodo No. 6**, realizó la publicación de afiches informativos, los cuales tienen por objeto divulgar las actividades a realizar, dichos afiches fueron instalados en los PSI, y funcionan como estrategia informativa hacia la comunidad. Estos afiches se instalaron en los PSI vigentes en el periodo.

9.2 Reuniones de inicio

El área social del contratista, para el **periodo No. 6,** realizó una (1) reunión de inicio de obra, para el tramo No. 1 del barrio Galerías, se contó con amplia asistencia y participación de la comunidad. En este espacio de reunión se dio a conocer aspectos de relevancia de la intervención vial. Se informó a la comunidad los aspectos técnicos, sociales, SST y ambientes que contemplan las diferentes intervenciones; así como la inversión realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, tiempo de ejecución general del contrato y tiempo por tramo, se realizaron recomendaciones que contribuyan a que las obras se ejecuten dentro de un ambiente de confianza y satisfacción para la comunidad. La reunión contó con el acompañamiento y el aval de la interventoría y la supervisión del contrato. Dentro de los aspectos de mayor relevancia tratados fueron:

- ✓ Presentación de los profesionales del FDLT, Interventoría y Constructor.
- ✓ Localización del proyecto
- ✓ Antecedentes del proyecto
- ✓ Lineamientos básicos de seguridad.
- ✓ Plan de manejo ambiental y plan de gestión social.
- ✓ Tiempo de ejecución.
- ✓ Localización de los segmentos viales a intervenir.
- ✓ Informe sobre el punto PAC, puntos satélites de información y demás actividades de gestión social.
- ✓ Accesos vehiculares a predios.
- ✓ Procedimiento para el levantamiento de actas de vecindad.
- ✓ Respuesta a inquietudes de la comunidad.

Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial, la información suministrada a la comunidad estuvo a cargo de la supervisión del contrato, la interventoría y el contratista.

Anexo 1 Acta de reunión de inicio Galerías, listado de asistencia y registro fotográfico.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de la reunión de inicio de obra realizada en este periodo.

Tabla 6 Consolidado realización reuniones de inicio

Periodo No. 6					
Fecha	**CIV**	**Barrio/tramo**	**No. De acta de reunión**	**No. De asistentes comunidad**	**No. De asistentes interventoría/contratista otros**
08/07/2025	13000875	Galerías	1	7	8

9.3. Reuniones de finalización

Para el presente periodo desde el componente social, dando alcance a lo dispuesto en el Plan de Gestión Social; con el propósito de presentar los resultados obtenidos durante la intervención de las vías, es pertinente señalar que se llevaron a cabo dos (2) reuniones de entrega y finalización de obra a la comunidad del barrio Nicolás de Federmán tramos 2 y 3; la información suministrada a la comunidad estuvo a cargo de la señora alcaldesa local de Teusaquillo, la supervisión del contrato, la interventoría y el contratista. En este espacio se dio atención y respuesta a las observaciones que surgieron por parte de los asistentes de la comunidad.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de las reuniones de entrega de obra realizadas en este periodo.

Anexo 2 Actas de reunión de entrega a la comunidad tramos Nicolas de Federman tramos 2 y 3, listado de asistencia y registro fotográfico.

Tabla 7 Consolidado realización reuniones de entrega a la comunidad

Periodo No. 6					
Fecha	**CIV**	**Barrio/tramo**	**No. De acta de reunión**	**No. De asistentes comunidad**	**No. De asistentes interventoría/contratista otros**
18/07/2025	13000864	Nicolás de Federmán	1	6	10
18/07/2025	13000476	Nicolás de Federmán	2	3	12

9.4. Reuniones Extraordinarias

Para este periodo, no se recibieron solicitudes por parte de la comunidad o la interventoría, tampoco surgieron situaciones que ameritaran la realización de reuniones extraordinarias. Por lo tanto, no se reporta ejecución de reuniones de este tipo para este mes.

9.5. Socializaciones

El área de Gestión Social del Consorcio Teusavial, para el periodo No. 6, por requerimiento de la Secretaría Distrital de Movilidad, realizó el levantamiento de actas de socialización de PMT, para los siguientes tramos de la siguiente manera:

Para cierre total de calzada

- Tramo 2 barrio Alfonso López CIV 13001214
- Tramo 3 barrio Chapinero Occidental CIV 13000744
- Tramo 1 barrio Chapinero Occidental CIV´S 13000985 – 13002468
- Tramo 2 barrio Chapinero Occidental CIV 13000826

Desde el área social del contratista se realizó visita predio a predio, se informó a la comunidad de zona de influencia directa las implicaciones del cierre total de calzada y espacio público, se recibió respuesta favorable de la comunidad, quienes firmaron las actas de socialización a conformidad. Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial.

Igualmente, se realizó socialización puerta a puerta en el barrio Ortezal, informando sobre el inicio de actividades de mantenimiento de calzada de emergencia, las cuales están contempladas dentro del Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía Local. Se informó a la comunidad los aspectos técnicos, sociales, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y ambientales que contemplan las diferentes intervenciones; así como el tiempo de ejecución general del tramo, se realizaron recomendaciones que contribuyan a que las obras se ejecuten dentro de un ambiente de confianza y satisfacción para la comunidad.

De la misma manera, se realizó acercamiento con la comunidad del barrio Nicolás de Federmán tramo 1, con el objeto de validar y corroborar la ruptura de cables de energía, por labores inherentes a la obra y de manera accidental; donde la comunidad con el acompañamiento del área técnica realizó el respectivo reporte, subsanando de esta forma el inconveniente mencionado, se hizo énfasis que las obras generan impactos, entre ellos la interrupción de servicios públicos.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de socializaciones realizadas en este periodo.

Anexo 3 Actas de socialización PMT Alfonso López tramo 2, Chapinero Occidental tramos 1, 2 y 3, registro fotográfico. Acta socialización inicio de obra Ortezal, listado de firmas, plano PMT y registro fotográfico, acta de socialización suspensión accidental del servicio de energía Nicolás de Federmán y registro fotográfico

Tabla 8 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo

Periodo No. 6			
Fecha	**CIV**	**Barrio/tramo**	**Institución**
09/07/2025	13001214	Alfonso López	Comunidad residente de la zona de intervención
			Edificio Vivo
			Restaurante Amazónico Selva y Rio
			Restaurante Sopa y Seco
			Montallantas La 5000
09/07/2025	13000744	Chapinero Occidental	Comunidad residente de la zona de intervención
			Parqueadero RB
			Restaurante Carne a la Llanera
09/07/2025	13000985 13002468	Chapinero Occidental	Comunidad residente de la zona de intervención
			Colegio Integral Ervid
			Dulce Romero
			Kuana Café
14/07/2025	13000826	Chapinero Occidental	Colegio Manuela Beltrán I.E.D. Sede A
			Colegio Principado de Mónaco
			Grupo Educativo Fortec
28/07/2025	13001326	Ortezal	Comunidad Residente de la zona de intervención
31/07/2025	13000284	Nicolás de Federmán	Comunidad residente en sector donde se presentó corte accidental del servicio de energía.

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

10.1. Objetivo General

Mantener informada a la comunidad durante la ejecución del proyecto, por medio de piezas de divulgación del proyecto, que contengan información de las diferentes actividades y acontecimientos específicos que se puedan presentar y que impacten a la comunidad.

10.2. Puntos satélites de información

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, para este proyecto tendrán como función difundir por medio de piezas de divulgación la información de este contrato la comunidad de la localidad de Teusaquillo.

Para el **periodo No. 6,** se realizó la instalación de (2) PSI, en los barrios Chapinero Occidental tramo 2 y Ortezal, también se hizo actualización de (5) PSI, ubicados en los barrios Nicolas de Federmán tramos 1 y 3, Alfonso López, Galerías y San Luis, se publicaron piezas informativas de acuerdo a la dinámica de la obra. Igualmente, se realizó la desinstalación de (1) PSI por terminación de obra en el tramo 2 de Nicolás de Federmán.

Anexo 4 PSI vigentes en el periodo

Tabla 9 PSI vigentes en el periodo

Periodo No. 6						
Fechas	**CIV**	**Barrio/tramo**	**Dirección**	**Instalación**	**Mantenimiento/ actualización**	**Desinstalación**
22/07/2025	13000284	Nicolás de Federmán tramo 1	Caseta parque de la carrera 47 con calle 58 y 59	0	1	0
10/07/2025	13000864	Nicolás de Federmán tramo 2	Carrera 35 # 53 - 53	0	0	1
01/07/2025 09/07/2025 17/07/2025	13000476	Nicolas de Federmán tramo 3	Carrera 36A # 57A-08	0	3	0
22/07/2025	13001165	Alfonso López	Carrera 27 # 50-77	0	1	0
07/07/2025	13000875	Galerías	Calle 53B # 27-31	0	1	0

22/07/2025	13000336	San Luis	Carrera 19A # 61-67/65	0	1	0
01/07/2025	13000826	Chapinero Occidental	Carrera 14A # 57-28	1	0	0
28/07/2025	13001326	Ortezal	Calle 22Bis # 48-28	1	0	0
Total				2	7	1

Tabla 10 Indicador PSI instalados

Ítem	Formula	Meta	% de cumplimiento
PSI	2 PSI instalados _____ 2 PSI requeridos * 100	Instalación de 1 PSI por tramo a intervenir	100%

Tabla 11 Indicador PSI actualizados

Ítem	Formula	Meta	% de cumplimiento
PSI	6 PSI actualizados _____ 6 PSI con necesidad de actualización * 100	Actualizar los PSI	100%

Tabla 12 Indicador PSI desinstalados

Ítem	Formula	Meta	% de cumplimiento
PSI	1 PSI desinstalado _____ 1 PSI con terminación de obra * 100	Desinstalar los PSI abiertos	100%

10.3. Volante informativo de inicio de obra

Para el **periodo No. 6**, desde el área social del Consorcio Teusavial, se realizó la distribución de volantes de inicio de obra, para el barrio Nicolás de Federmán CIV 13000438, este tramo es complemento al tramo 3, se visitó predio a predio la zona de influencia directa de la vía a intervenir, informando a propietarios y residentes sobre las actividades a realizar, tiempos de ejecución y generalidades del contrato.

Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada para tal fin.

Anexo 5 Formato control entrega de piezas de divulgación de inicio de obra, volante, registro fotográfico tramo Nicolás de Federmán.

Tabla 13 consolidado de notificación de inicio de obra

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación inicio de obra	13000438	Nicolás de Federmán	3	1/07/2025	4
Total					4

Tabla 14 Indicador distribución de volantes de inicio de obra

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	4 volantes de notificación de inicio de obra distribuidos _____ 4 volantes de notificación de inicio de obra requeridos * 100	Distribuir un volante por pedio en zona de influencia directa de cada tramo a intervenir	100%

.

10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra

Para el **periodo No. 6,** desde el área social del Consorcio Teusavial, se realizó la distribución de volantes de invitación a reunión de inicio de obra, para el barrio Galerías, se realizó visita predio a predio en la zona de influencia directa de la vía a intervenir, invitando a propietarios y residentes a participar en la reunión de socialización para el inicio de las obras en el sector, se aplicó la metodología aprobada para tal fin, se contó con el aval de la interventoría.

Anexo 6 Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de inicio, volante y registro fotográfico tramo Galerías.

Tabla 15 consolidado convocatoria reuniones de inicio

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Convocatoria reunión de inicio	13000875	Galerías	1	07/07/2025	8
Total					8

Tabla 16 Indicador distribución de volantes de convocatoria a reunión inicio

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	8 volantes de convocatoria a reunión de inicio distribuidos _____ 8 volantes de convocatoria a reunión de inicio requeridos * 100	Distribuir un volante por pedio en zona de influencia directa de cada tramo a intervenir	100%

10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias

El contratista implementará esta pieza una vez se inicie la etapa de obra, en los predios que requieran su utilización, para acordar con la comunidad la correcta instalación de canales y bajantes de aguas lluvias, sin embargo, para **el periodo No. 6,** no aplica, dado que no se identificaron situaciones que dieran lugar a su implementación.

10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad

Para el **periodo No. 6**, desde el área social se realizó la distribución de volantes inicio actas de vecindad de primera visita en los barrios Chapinero Occidental CIV 13000826 y Nicolás de Federmán CIV 13000438, estas piezas informativas se entregaron predio a predio, de manera personalizada, se explicó a la comunidad beneficiada por la obra, la importancia de realizar el levantamiento de actas de vecindad.

Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada. A continuación, se presentan tablas de consolidados de distribución de volantes de primera visita durante el periodo.

Tabla 17 Consolidado notificación inicio actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación primera visita actas de vecindad	13000826	Chapinero Occidental	2	01/072025	1
	13000438	Nicolás de Federmán	3	01/07/2025	4
Total					5

Anexo 7 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante levantamiento actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Chapinero Occidental, Nicolás de Federmán.

Tabla 18 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad primera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	5 volantes de primera visita actas de vecindad distribuidos / 5 volantes de primera visita actas de vecindad requeridos * 100	Distribuir un volante por pedio en zona de influencia directa de cada tramo a intervenir	100%

10.7. Volante Oferta laboral

Para el **periodo No. 6**, no se realizó publicación de volante de oferta laboral, sin embargo, en las reuniones de inicio de obra realizadas en los periodos anteriores se realizó la divulgación de oferta laboral para mano de obra no formada, se indicó a la comunidad el correo para el envío de las hojas de vida de las personas que estuvieran interesadas en las vacantes para cargos de BOAL y ayudantes de obra.

10.8. Volante de información ciudadana

Estas piezas se implementarán en caso de presentarse alguna contingencia, se adelantará información de las actividades según la programación de actividades técnicas específicamente cuando haya necesidad de brindar:

- Información sobre corte se servicios públicos.
- Cuando se presente intervención de tráfico vehicular.
- Cuando se presenten circunstancias de intervención particular.

Para el **periodo No. 6,** no se implementó esta pieza ya que no se generaron situaciones que diera lugar a su utilización, no aplica para este informe.

10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT.

Para el presente periodo no se generó la necesidad de implementar este tipo de piezas informativas, por lo cual este ítem no aplica para este periodo.

10.10. Volante otras informaciones

El área de Gestión Social del Consorcio Teusavial, para el periodo No. 6, realizó convocatoria por medio de WhatsApp, a la segunda reunión de comité ciudadano en el barrio Nicolás de Federmán tramo 1, la cual se relaciona en el siguiente consolidado:

Tabla 19 Consolidado notificación otras informaciones

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Convocatoria comité de participación ciudadana	13000284 13002498	Nicolás de Federmán	1	18/07/2025	17
Total					17

Anexo 8 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante convocatoria reunión del comité ciudadano y registro fotográfico Nicolás de Federmán.

Tabla 20 Indicador distribución de volantes de otras informaciones en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	17 volantes de convocatoria 2da reunión comité ciudadano distribuidos / 17 volantes de convocatoria 2da reunión comité ciudadano requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo en intervención	100%

10.11. Volante notificación cierre actas de vecindad

Para el presente periodo, el área social del Consorcio Teusavial, continúo con el proceso de cierre de actas de vecindad, por lo tanto, se realizó la distribución de volantes cierre de actas de vecindad de primera, segunda y tercera visita; a los tramos que están en proceso de remates por el área técnica. La actividad se realizó en el barrio Nicolás de Federmán tramo 2 y 3 CIV´S 13000864 y 13000476, respectivamente.

Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada.

A continuación, se presentan tablas de consolidados de distribución de volantes de primera, segunda y tercera visita durante el periodo.

Tabla 21 Consolidado notificación cierre de actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre de actas de vecindad primera visita	13000864	Nicolás de Federmán	2	07/072025	16
	13000476	Nicolás de Federmán	3	09/07/2025	6
Total					22

Anexo 9 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Nicolás de Federmán.

Tabla 22 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad primera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	22 volantes de cierre de actas de vecindad primera visita distribuidos _____ 22 volantes de cierre de actas de vecindad de primera visita requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo intervenido	100%

Tabla 23 Consolidado de distribución de volante notificación segunda visita de cierre actas de vecindad

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre actas de vecindad segunda visita	13000864	Nicolás de Federmán	2	9/07/2025	12
Total					12

Anexo 10 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico Nicolas de Federmán tramo 2.

Tabla 24 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad segunda visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	12 volantes de segunda visita de cierre actas de vecindad distribuidos _____ 12 volantes de segunda visita de cierre actas de vecindad requeridos * 100	Distribuir un volante de segunda visita de cierre actas de vecindad, en predios donde no se reciba atención en primera visita	100%

Tabla 25 Consolidado de distribución de volante notificación tercera visita de cierre de actas de vecindad

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre de actas de vecindad tercera vista	13000864	Nicolás de Federmán	2	11/07/2025	7
Total					7

Anexo 11 Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico Nicolas de Federmán tramo 2.

Tabla 26 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad tercera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	7 volantes de cierre de actas de vecindad tercera visita distribuidos _____ 7 volantes de cierre de actas de vecindad tercera visita requeridos * 100	Distribuir un volante de tercera visita de cierre de actas de vecindad, en predios donde no se reciba atención en segunda visita	100%

10.12. Volante de convocatoria a reuniones de finalización de obra

El área social del Consorcio Teusavial, realizó la distribución de volantes de invitación a reunión de finalización y entrega de obra de los tramos terminados por el área técnica; para el presente periodo, la actividad se realizó en el barrio Nicolás de Federmán tramos 2 y 3, invitando a propietarios y residentes a participar en la reunión. Se aplicó la metodología aprobada para tal fin, se contó con el aval de la interventoría.

Anexo 12 Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de finalización, volante y registro fotográfico tramos 2 y 3 barrio Nicolás de Federmán

Tabla 27 consolidado convocatoria reuniones de finalización

Periodo No. 6					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Convocatoria reunión de finalización	13000864	Nicolás de Federmán	2	09/07/2025	36
				17/07/2026 Reprogramación	26
	13000476		3	09/07/2025	8
				17/07/2026 Reprogramación	10
Total					80

Tabla 28 Indicador distribución de volantes de convocatoria a reunión finalización

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	80 volantes de convocatoria a reunión de finalización distribuidos / 80 volantes de convocatoria a reunión de finalización requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo intervenido	100%

11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD

11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales.

Desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, para el **periodo No. 6,** se realizó levantamiento actas de vecindad, para el tramo No. 2 del barrio Chapinero Occidental CIV 13000826. El personal social y técnico del Consorcio Teusavial, realizó la toma de información detallada de manera fílmica, fotográfica y escrita del estado físico estructural de los predios de zonas de influencia directa del tramo referenciado, en cumplimiento a la metodología aprobada para tal fin, por parte de la interventoría.

Igualmente, se aprobaron los volantes de inicio de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Nicolás de Federmán CIV 13000438, las cuales no serán realizadas, debido a que este tramo no será ejecutado por indicación de la entidad contratante.

Para este periodo, se generó la radicación a la interventoría del acta de vecindad realizadas en el tramo mencionado de Chapinero Occidental, la cual está en proceso de revisión.

A continuación, se presenta tabla de consolidado de levantamiento de actas de vecindad durante este periodo.

Tabla 29 Consolidado levantamiento actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 6						
Barrio	**Tramo**	**CIV**	**No. De actas internas**	**No. De actas de fachada zona influencia directa con tres visitas**	**No. De actas de fachada de prevención**	**No. Total, De actas**
Chapinero Occidental	2	13000826	1	0	0	1

Tabla 30 Indicador levantamiento actas de vecindad en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	1 acta de vecindad levantada / 1 acta de vecindad programada * 100	Levantar el 100% de actas de vecindad de predios existes en zonas de influencia directa por tramo a intervenir.	100%

11.2. Actas de compromiso.

Para el presente periodo no surgieron situaciones que ameritaran el levantamiento de actas de compromiso, dado que el contrato se encuentra en etapa preliminar, por tal motivo no hay reporte referente a este tema, no aplica para este informe.

11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas

Para el **periodo No. 6,** desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, no se reporta levantamiento de actas para acceso a rampas.

11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió.

Para el **periodo No. 6,** desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, no se reporta la realización de registro fílmico y fotográfico de vías aledañas y/o de posibles desvíos de PMT.

11.5. Actas de Vecindad de cierre

Para el presente periodo, el área social del Consorcio Teusavial, continúa con el proceso de cierre de actas de vecindad, procedimiento que consiste en la realización de una o tres visitas predio a predio en los tramos donde se concluyeron actividades técnicas, se valida con los encargados, responsables y/o propietarios de las viviendas, si a causa de la obra se generaron afectaciones en las mismas.

En caso de recibir manifestaciones de daños, se procede a verificar contra registro inicial de acta de vecindad y de evidenciar afectaciones nuevas, en caso de comprobar algún tipo de afectación se realiza respectivos acuerdos económicos y/o reparaciones para subsanar las afectaciones. Se levanta y se cierra PQR, y así mismo se da cierre correspondiente en paz y salvo, que estará anexo al formato de acta de vecindad.

Para este periodo, se realizó cierre de actas de vecindad en el barrio Nicolás de Federmán tramos 1, 2 y 3, CIV´S 13000343, 13000864 Y 13000476, las cuales se radicaron a la interventoría en este periodo y se encuentran en proceso de revisión. A continuación, se presenta tabla de consolidado de cierre de actas de vecindad:

Tabla 31 Consolidado cierres de actas de vecindad

Periodo No. 6						
Barrio	**Tramo**	**CIV**	Total, actas de predios cerradas con firma del propietario y/o encargado	Total, cierre de actas con tres vistas verificadas con firma interventoría	Total, actas pendientes para cierre	Observaciones
Nicolás de Federmán	1	13000343	1	0	2	Pendiente cierre de dos actas de vecindad por ser colindante al CIV 13000284 en intervención.
	2	13000864	17	6	0	Dos actas sin firma (propietarios suministran datos, pero niegan firmar), un acta por predio deshabitado
	3	13000476	6	0	0	Ninguna
Total			24	6	2	

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	24 actas de vecindad cerradas _____ 32 actas de vecindad realizadas inicialmente en los tramos 1 al 3 Nicolas de Federman* 100	Cerrar el 100% de actas de vecindad realizadas inicialmente en predios existes en zonas de influencia directa	75%

11.6. Divulgación actas de vecindad a la comunidad

Durante el presente periodo, se aprobaron las actas de vecindad de inicio del tramo 1 barrio San Luis CIV 13000336. Las actas de vecindad de inicio de los tramos 1 y 3 de Nicolás de Federmán, Alfonso López tramo 1 y de Galerías tramo 1, CIV´S 13000343, 13000476, 13001165 Y 13000875 respectivamente, fueron aprobados al finalizar el periodo anterior; por tal motivo, se realizó la entrega de copias de actas de vecindad a la comunidad en todos los tramos anteriormente mencionados.

Anexo 13 Formatos de control entrega de copias de actas de vecindad y registros fotográficos Nicolas de Federmán. Tramo 1 y 3, Galerías, Alfonso López y San Luis.

Tabla 32 Consolidado divulgación copias de actas de vecindad a la comunidad

Periodo No. 6				
Barrio	**Tramo**	**Fecha**	**CIV**	**Cantidad**
Nicolás de Federmán	1	02/07/2025	13000284	1
	3	09/07/2025	13000476	5
Galerías	1	07/07/2025	13000875	5
Alfonso López	1	16/07/2025	13001165	28
San Luis	1	24/07/2025	13000336	4
TOTAL				43

Tabla 33 Indicador divulgación copias de actas de vecindad

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	43 divulgación copias de actas de vecindad / 43 divulgación copias de actas de vecindad * 100	Divulgar el 100% de copias de actas de vecindad a la comunidad como soporte del estado inicial del predio	100%

12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones dará atención oportuna a la comunidad a través del trato digno y respetuoso que propenderá por la rápida solución de las diferentes consultas y requerimientos que se presenten; en virtud de ello contará con la instalación de un Punto PAC Fijo, virtual y móvil.

12.1. Punto PAC fijo

Desde el área social del contratista, se da cumplimiento a la metodología dispuesta para atención a la comunidad en caso de presentarse alguna petición, reclamo, queja, sugerencia, y/o denuncia, por tal motivo se instaló el Punto PAC fijo el cual cuenta con atención presencial, en la calle 39 A # 29 -21 piso 3.



Foto 1 Punto PAC

El equipamiento del Punto PAC, será dotado con los siguientes elementos y/o recursos:

- ✓ Espacio de recepción
- ✓ Escritorio y silla para la persona encargada de la atención del Punto PAC.
- ✓ Computador e impresora
- ✓ Sillas para la atención a la población.
- ✓ Material impreso: formato de sistema de atención PQRSD.
- ✓ Medios de comunicación: Línea telefónica para hacer la recepción de las llamadas realizadas por la población y cuenta de correo electrónico.
- ✓ Horario de atención al público.

12.2. Punto PAC VIRTUAL

La contratista continua con la disposición de la atención del Punto PAC Virtual, como mecanismo que no implique desplazamientos de la comunidad hasta el Punto físico, se realizó instalación de la línea de atención No. 3019072050, la cual está dispuesta para la atención a la comunidad y el correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com.

Esta información ha sido plasmada en cada pieza informativa que se ha entregado a la comunidad y en el punto satélite de información. Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

12.3. Punto PAC Móvil

Durante este periodo el contratista a través del área social realizó recorridos de reconocimiento de los tramos de obra, con el ánimo de tener un acercamiento directo con la comunidad, escuchar sus consultas y manifestaciones y así mismo tramitar su respuesta en lo posible de manera inmediata.

Para este periodo se presentó una (1) PQRSD, la cual será referenciada y se dará respectiva trazabilidad en el apartado PQRSD, al finalizar el programa atención al ciudadano. Se hace claridad que en la vigencia de este periodo el contratista Consorcio Teusavial continua con la disposición de canales de atención, los cuales se describen en la siguiente tabla.

Tabla 34 Tabla de atención PUNTO PAC

Horario de Atención Virtual		Contacto	Responsable
Días	**Horario**		
Lunes a viernes	8 am a 4:30 pm 	 Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com Teléfono Móvil: 3019072050	Profesional Social T.S Ángela María Quiroga G.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 35 Indicador Punto PAC Móvil

Ítems/programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Punto PAC Móvil	1 punto PAC móvil implementado _____ 1 punto PAC móvil programado * 100	Instalación de un Punto PAC móvil	100%

Fuente: elaboración propia.

12.5 PQRSD

Durante el **periodo No. 6,** se recibió una (1) PQRSD, correspondiente al consecutivo No. 5, dicha PQRSD corresponde a particularidades surgidas por los procesos constructivos en los tramos de obra. A continuación, se muestra consolidado y trazabilidad de las PQRSD generadas hasta la fecha de este informe.

Anexo 14 PQRSD No. 5.

Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

Tabla 36 Consolidado PQRSD

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
1	25/03/2025	7/04/2025	Copia acta de reunión de inicio tramo 1 Nicolás de Federmán	Jesika Aullon Guerrero Edificio Monterosso P-H Administración	Carrera 47 # 58 - 40 Edificio Monterosso	7/04/2025 Se emite correo electrónico con acta de reunión solicitada. En esta misma fecha se recibe notificación de la peticionaria, sobre el recibido de la información solicitada. Teniendo en cuenta la respuesta dada se genera cierre de la PARSD No. 1, a satisfacción de las partes.	Cerrado en informe No. 3
2 2	29/04/2025	19/05/2025	Garantizar el paso para silla de ruedas costado occidental, tramo de la carrera 27 entre calles 50 y 51, Alfonso López	Yessica Olaya Sánchez Tel. 3178376564	Carreras 27 3 entre calles 50 y 51	29/04/2025 Por medio del correo electrónico de atención a la comunidad, se recibe petición de una residente del tramo Alfonso López, quien solicita que por el andén del costado occidental se garantice el paso de una silla de ruedas o persona con movilidad reducida. Se dará trámite en el periodo No. 4. 13/05/2025 Se realiza recorrido con el área técnica del contratista, donde se verifican los niveles del espacio público del costado occidental. Igualmente, se realiza adecuación de sobresalto en la junta de los andenes, quedando el andén en condiciones óptimas para la movilidad de silla de ruedas. 19/05/2025 Se envía respuesta formal a la señora Peticionaria, a través de correo electrónico. 23/05/2025	Cerrado en informe No. 4

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
						Se realiza visita al predio y se recibe firma física de la trazabilidad y cierre de la presente PQRSD.	
3	08/05/2025	08/05/2025	Inconformidad referente al poco personal trabajando en el tramo y la maquinaria quieta	Julia Moreno Tel. 6012219996	Calle 53A No. 35-10	Se informa a la Peticionaria que las actividades que se están adelantando son de tipo manual: excavación, adecuación de cárcamos y la instalación de tubería hacia los pozos. Igualmente, se le informa que las condiciones climáticas hacen que en ciertos lapsos de tiempo sea necesario suspender actividades, sin embargo, la ejecución se encuentra en los tiempos estipulados. La Peticionaria recibe la información suministrada y cierra el PQRSD a satisfacción.	Cerrado en informe No. 4
4	11/06/2025	11/06/2025	Información sobre la intervención que se está llevando a cabo en la carrera 47 entre calles 58A y 59, tiempo de duración, pago de parqueaderos	Blanca Mojica Álvaro Suarez Tel. 3142328909	Carrera 47 No. 58A-67	Se informa a los Peticionarios que la intervención del tramo carrera 47 entre calles 58A es de tres meses aproximadamente, tiempo en el cual no se permite el ingreso a los garajes y el costo de los mismos es asumido por el propietario, arrendatario y/o encargado del predio.	Cerrado en informe No. 5

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
5	02/07/2025	02/07/2025	Durante proceso de cierre de actas de vecindad, el propietario manifiesta fisura mínima en muro de alcoba del costado sur.	John Alexander Blandon Tel. 3107713366	Carrera 47 No. 58-40 Apartamento 208	En visita realizada al predio con el acompañamiento del área técnica del contratista, se evidencia que el daño mencionado por el propietario, muestra levantamiento de pintura generada por humedad, que no son ocasionadas por los equipos y maquinaría utilizada; sin embargo y ante la negativa de firma del paz y salvo, el Consorcio Teusavial, realiza la reparación de la fisura mínima, aclarando que la intervención realizada en la vía no sobrepasa los 65 cm, siendo poco viable la afectación de alguna propiedad vecina. El propietario firma a satisfacción el cierre del acta de vecindad.	Cerrado en informe No. 6

12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano

La firma Contratista, a través de la residente social estableció en reunión de inicio del tramo 1 barrio Nicolás de Federmán, un comité ciudadano, conformado por personas de la comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto; los cuales, se reunirán cada dos meses, para informar a los participantes el avance de la obra y los cambios generados durante la intervención. Igualmente, los representantes del Contratista y la Interventoría identificarán las problemáticas manifestadas por los asistentes y ofrecerá alternativas y soluciones.

Durante el presente período, se llevó a cabo la segunda reunión de Comité de Participación Ciudadana, contando con la asistencia de miembros del comité, representantes del FDLT, profesionales de la firma Interventora y Contratista, se brindó información del avance de obra en el tramo, se dio atención y respuesta a las inquietudes manifestadas por los integrantes del comité ciudadano.

Anexo 15 Acta de reunión de participación ciudadana comité ciudadano tramo 1 Nicolás de Federmán.

Tabla 37 Consolidado de reuniones comité de participación ciudadana

Periodo No. 4						
Fecha	**CIV**	**Barrio / tramo**	**Motivo**	**No. De acta de reunión**	**No. De asistentes comunidad**	**No. De asistentes interventoría / contratista otros**
23/07/2025	13000284	Nicolás de Federmán	Reunión Comité de Participación Ciudadana No. 2	2	5	9

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

13.1. Objetivo General

Brindará información por medio de plegables de sostenibilidad sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, en pro de que las mismas se mantengan en el tiempo.

13.2. Plegables de Sostenibilidad

La implementación de los plegables se dará una vez se obtenga mínimo el 95% de terminación de actividades técnicas por tramo, teniendo en cuenta que el contrato está en etapa inicial, este ítem no aplica para el presente informe.

14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO.

14.1 Objetivo General

Realizar acciones encaminadas a la formación del personal que hace parte del contrato, articuladas con las áreas SST y ambiental, a través de una capacitación mensual sobre temas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y desarrollo personal, laboral y social de los trabajadores adscritos al proyecto, además de enfatizar sobre el trato a la ciudadanía.

14.2 Capacitación mensual

Para el **periodo No. 6**, desde el área social y SST, se implementó la capacitación No. 6, la cual se desarrolló en los tramos de obra de Nicolás de Federmán, Galerías y Alfonso López, el tema abordado fue comunicación asertiva, se contó con la participación activa del personal vigente.

Anexo 16 Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 6

Tabla 38 Realización de capacitación mensual

Periodo No. 6		
Fecha	**Tema**	**No. De asistentes**
23/07/2025	Comunicación asertiva	30

Tabla 39 Indicador realización de capacitación mensual

Ítems/programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Programa de capacitación a los empleados del proyecto.	30 trabajadores asistentes a la capacitación Mensual No. 6 / 30 trabajadores convocados a la capacitación * 100	Realización de una capacitación mensual.	100%

Fuente: elaboración propia.

15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA

15.1 Objetivo General

Vincular mínimo al 30% de personal MONF[1], de la localidad de Teusaquillo, en concordancia al anexo técnico del contrato.

15.2 Generación total de empleo

Para el **periodo No. 6,** el Consorcio Teusavial continua con la plantilla de personal profesional requerida, se cumple con la vinculación de mano de obra femenina, también se continua con contratación de mano de obra no formada, de la localidad de Teusaquillo. A continuación, se presenta tabla.

[1] Mano de obra no formada

Tabla 40 Personal contratado en el periodo No. 6

NÚMERO	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
NUEVO					
1	CONSORCIO TEUSAVIAL	HASSAY VANESA QUIROGA AGUILAR	1011080611	BOSA	INSPECTORA SSTAMB
2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHONATHAN ALEXANDER CADENA JARA	1032418471	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
3	EP INGENIEROS CIVILES SAS	CARLOS ANDRES SERNA GALLEGO	1032455022	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
4	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JOSE RICARDO MANZANILLA	5382962	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
5	CONSORCIO CAPITAL	LEIVER ESTIVEN RODRIGUEZ MORALES	1000000755	TEUSAQUILLO	CADENERO I
6	EP INGENIEROS CIVILES SAS	DANIEL ADRIAN SANCHEZ	1006903859	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
ANTIGUO					
1	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	79947081	USAQUÉN	DIRECTOR DE OBRA
2	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	80026555	PUENTE ARANDA	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
3	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	5471618	USAQUÉN	ESPECIALISTA HIDRAULICO
4	CONSORCIO TEUSAVIAL	SANDRA ISABEL PERILLA FONSECA	52104995	BOSA	AUXILIAR SOCIAL
5	CONSORCIO TEUSAVIAL	YOHANA MARCELA AREVALO MOLINA	1032380392	FONTIBÓN	INGENIERA CIVIL DE OBRAS Y TÉCNICA
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	HENRY CAMILO DURAN MARQUEZ	80903575	MARTIRES	RESIDENTE AMBIENTAL
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	ANDRES FELIPE ECHANDIA ROLDAN	79785617	USAQUÉN	RESIDENTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS	52753727	PUENTE ARANDA	RESIDENTE SOCIAL
9	CONSORCIO TEUSAVIAL	TATIANA ANDREA VALDELEÓN MANRIQUE	1014240890	ENGATIVA	RESIDENTE SST

10	CONSORCIO TEUSAVIAL	DANIEL FELIPE SANCHEZ MOLINA	1023928966	TUNJUELITO	TOPOGRÁFO
11	CONSORCIO TEUSAVIAL	ISABEL CRISTINA AGUDELO	1193074894	ENGATIVA	INSPECTORA SST AMBIENTAL
12	CONSORCIO TEUSAVIAL	DAVID SEBASTIAN MARTINEZ ARENAS	1022421350	KENNEDY	INSPECTOR DE OBRA
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
14	CONSORCIO TEUSAVIAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
15	CONSORCIO TEUSAVIAL	GLORIA ESPERANZA CAMPOS	52026157	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR SOCIAL
16	CONSORCIO TEUSAVIAL	RAFAEL GUTIERREZ	79122807	ENGATIVA	CONDUCTOR
17	PAVIOBRAS SAS	JOSE ALBERTO GUZMAN PERDOMO	93471010	TEUSAQUILLO	OPERADOR FRESADORA
18	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EDWIN MALAMBO	123349149	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
19	EP INGENIEROS CIVILES SAS	NESTOR ALBERTO REYES	4226971	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
20	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	JONATHAN ROZO MARTINEZ	1031137524	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR RETROEXCAVADORA
21	EP INGENIEROS CIVILES SAS	GIOVANNI GUIZA	1024524592	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR DE MINICARGADOR
22	CONSORCIO TEUSAVIAL	SANDRA LILIANA VACA	52971427	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
23	CONSORCIO TEUSAVIAL	JHON FREDY HERNANDEZ	74189712	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
24	CONSORCIO TEUSAVIAL	JULIÁN FERNANDO TRUJILLO DURÁN	1010200330	CIUDAD BOLIVAR	INSPECTOR SST-AMB
25	EP INGENIEROS CIVILES SAS	MIGUEL ANGEL ROA PEÑA	1023923191	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
26	CONSORCIO TEUSAVIAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
27	CONSORCIO TEUSAVIAL	YDALIS DEXIRE TORREALBA	5900718	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
28	CONSORCIO TEUSAVIAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA
29	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHON FREDY RAMIREZ	80254210	CIUDAD BOLIVAR	MAESTRO OBRA CIVIL

30	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EULOGIO RAMIREZ	6004326	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
31	EP INGENIEROS CIVILES SAS	ANDRES GUSTAVO ROA	1023892019	CIUDAD BOLIVAR	OFICIAL DE OBRA
32	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHON FREDY JIMENEZ	1074808680	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
33	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RUBEN DARIO PINILLA ROMERO	80006819	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
34	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JACKSON RODRIGUEZ RIVAS	18420022	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
35	CONSORCIO TEUSAVIAL	WILMER PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
36	CASTRO VARGAS INGENIEROS SAS	CARLOS ARTURO CADENA	1032383432	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
37	DISTRICOMERCIO YLSAS	HUMBERTO VARGAS	80265284	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
38	CONSORCIO TEUSAVIAL	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
39	CONSORCIO TEUSAVIAL	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
40	CONSORCIO TEUSAVIAL	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ SANCHEZ	1033698531	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
41	CONSORCIO TEUSAVIAL	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
42	CONSORCIO TEUSAVIAL	HUMBERTO DAVID CHIRINOS GRIMAN	7094719	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
43	EP INGENIEROS CIVILES SAS	OSCAR JAVIER GARZON MARTINEZ	107367696	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
44	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RONAL SALCEDO	5300663	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
45	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO	4052960	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
46	MAQUINARIA MEDINA R Y C SAS	JOSE ANDRES NIETO ROA	1031132699	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
47	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JOSE MIGUEL VARGAS ROA	79878620	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
48	CONSORCIO TEUSAVIAL	EDGAR DAVID GONZALEZ GOMEZ	1010178521	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
49	EP INGENIEROS CIVILES SAS	ANDRES FELIPE VILLEGAS MEDINA	1024592489	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
50	CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES	JHON FREDY QUINTERO	1022924380	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
RETIRO					

1	CONSORCIO TEUSAVIAL	MARIA CRISTINA RINCON	1023924468	TEUSAQUILLO	CADENERA I
2	CONSORCIO TEUSAVIAL	ANDRES FELIPE DAZA ROJAS	1233688505	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
3	CONSORCIO TEUSAVIAL	DAIRO JESUS PEREZ PATERNINA	1102881283	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA

5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 6.

Para el presente periodo se mantienen vinculadas (25) personas, con perfil mano de obra no formada, de las cuales (12) pertenecen a la localidad de Teusaquillo, las demás pertenecen a la localidad Ciudad Bolívar y otras localidades, desde el área de gestión humana del Consorcio Teusavial, se generó la vinculación de perfiles para actividades de auxiliares de tráfico y brigadistas de orden, aseo y limpieza con asignación de cargos de ayudantes de obra, desde el subcontratista de obra se realizaron vinculaciones para ayudantes de obra, para actividades operativas en los diferentes frentes del proyecto.

A continuación, se presenta tabla que permite verificar cuantitativamente los porcentajes alcanzados del ítem para vinculación laboral MONF y mujeres.

Tabla 41 Porcentajes MONF – Mujeres en el periodo

Periodo No. 6							
Total, MONF	**Total, MONF localidad Teusaquillo**	**Total, MONF otras localidades**	**Porcentaje cumplimiento MONF**	**Total, personal contratado (MONF, y Mujeres MONF)**	**Total, mujeres vinculadas al proyecto**	**Total, personal vinculado al proyecto**	**Porcentaje total vinculación (mujeres)**
25	12	13	48%	25	10	50	20%

Tabla 42 Personal MONF en el periodo

#	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
1	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHONATHAN ALEXANDER CADENA JARA	1032418471	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA

2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	DANIEL ADRIAN SANCHEZ	1006903859	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
3	CONSORCIO TEUSAVIAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
4	CONSORCIO TEUSAVIAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
5	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EDWIN MALAMBO	123349149	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	YDALIS DEXIRE TORREALBA	5900718	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA
9	EP INGENIEROS CIVILES SAS	EULOGIO RAMIREZ	6004326	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
10	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JHON FREDY JIMENEZ	1074808680	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
11	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RUBEN DARIO PINILLA ROMERO	80006819	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
12	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JACKSON RODRIGUEZ RIVAS	18420022	MARTIRES	AYUDANTE DE OBRA
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	WILMER PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
14	CONSORCIO TEUSAVIAL	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
15	CONSORCIO TEUSAVIAL	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
16	CONSORCIO TEUSAVIAL	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ SANCHEZ	1033698531	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
17	CONSORCIO TEUSAVIAL	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
18	CONSORCIO TEUSAVIAL	HUMBERTO DAVID CHIRINOS GRIMAN	7094719	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
19	EP INGENIEROS CIVILES SAS	OSCAR JAVIER GARZON MARTINEZ	107367696	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
20	EP INGENIEROS CIVILES SAS	RONAL SALCEDO	5300663	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA

21	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LUIS ALBERTO RIVERA CASTRO	4052960	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
22	EP INGENIEROS CIVILES SAS	JOSE MIGUEL VARGAS ROA	79878620	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
23	CONSORCIO TEUSAVIAL	EDGAR DAVID GONZALEZ GOMEZ	1010178521	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
24	CONSORCIO TEUSAVIAL	ANDRES FELIPE DAZA ROJAS	1233688505	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
25	CONSORCIO TEUSAVIAL	DAIRO JESUS PEREZ PATERNINA	1102881283	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA

Tabla 43 Indicador vinculación MONC

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación MONF	12 trabajadores MONF de localidad de Teusaquillo / 25 de trabajadores MONF * 100	30% mano de obra local y/o de localidades de estratos 1 y 2	48%

Es importante mencionar que, el contratista Consorcio Teusavial en el marco del contrato No. 552 – 2024 (120683), y en cumplimiento del acuerdo 332 de 2021 del Concejo de Bogotá, cuyo objetivo principal cerrar la brecha de pobreza y disminuir la informalidad económica e inclusión de mujeres en la contratación de obra pública, desde la etapa preliminar del contrato, realizó la vinculación de mano de obra femenina con un alcance del 20%, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 44 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021.

#	Contratista/ Subcontratista	Nombres Y Apellidos	Cédula	Localidad	Cargo
1	Consorcio Teusavial	María Cristina Rincón	1023924468	Teusaquillo	Cadenera I
2	Consorcio Teusavial	Sandra Isabel Perilla Fonseca	52104995	Bosa	Auxiliar Social
3	Consorcio Teusavial	Yohana Marcela Arévalo Molina	1032380392	Fontibón	Ingeniera Civil De Obras Y Técnica
4	Consorcio Teusavial	Angela maría Quiroga Galvis	52753727	Puente Aranda	Residente Social

#	Contratista/ Subcontratista	Nombres Y Apellidos	Cédula	Localidad	Cargo
1	Consorcio Teusavial	María Cristina Rincón	1023924468	Teusaquillo	Cadenera I
5	Consorcio Teusavial	Tatiana Valdeleón	1014240890	Engativá	Residente SST
6	Consorcio Teusavial	Isabel Cristina Agudelo	1193074894	Engativá	Inspectora SST-Ambiental
7	Consorcio Teusavial	Gloria Esperanza Campos	52026157	Bosa	Aux. Social
8	Consorcio Teusavial	Ydalis Dexire Torrealba	5900718	Teusaquillo	Ayudante de obra - Boal
9	Consorcio Teusavial	Sandra Liliana Vaca	52971427	Ciudad Bolívar	Aux. Topografía
10	**CONSORCIO TEUSAVIAL**	**HASSAY VANESA QUIROGA AGUILAR**	**1011080611**	**BOSA**	**INSPECTORA SSTAMB**

Tabla 45 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación mujeres	10 mujeres vinculadas al proyecto _____ 50 personas total vinculadas al proyecto * 100	Mantener mínimo el 13.4% mano de obra femenina en el desarrollo del contrato	20%

16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES

16.1 Objetivo General.

Velar porque todos los empleados del proyecto utilicen adecuadamente los elementos de protección personal acorde a las actividades que cada uno realiza, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Identidad Visual del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

16.2 Seguimientos por periodo

Para el **periodo No. 6**, desde el área social del Consorcio Teusavial, se efectúo el seguimiento a dotaciones, para personal administrativo y operativo del contrato, quienes portan la dotación acorde a la imagen corporativa privada del contratista y en concordancia a criterios del área SST.



Foto 2 Uso dotación personal administrativo y operativo

Tabla 46 Indicador control y seguimiento de dotaciones

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Control y seguimiento de dotaciones	50 trabajadores portando la dotación requerida _____ 50 trabajadores contratados en el periodo * 100	Que todo el personal administrativo y operativo contratado, porten la dotación requerida en cada periodo	100%

17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

17.1 Informes Semanales

Semanalmente la residente social del Consorcio Teusavial, ha remitido vía correo electrónico a la Interventoría, el informe semanal de actividades de gestión social, se han atendido las observaciones y sugerencias de la interventoría, de acuerdo a la etapa preliminar a la fecha.

17.2 Informe Mensual

Este es un mecanismo que permite verificar el cumplimiento de los programas del plan de gestión social planteados para el proyecto. En concordancia se presenta **el informe No. 6**, a corte 31 de julio de 2025**,** en este informe se describen las actividades que se realizaron durante el periodo. Posteriormente la interventora social realizará revisión, verificación, concepto y aprobación, para remitir a la alcaldía Local de Teusaquillo (FDLT).

17.3 Informe Final

Al finalizar el contrato se presentará un informe final a la firma interventoría, donde se plasme el consolidado de la implementación del Plan de Gestión Social en obra, dicho informe recogerá información cuantitativa y cualitativa de cada una de las actividades realizadas por tramo o sector intervenido. Como se proyecta realizar consolidado por tramo se dejará organizado el historial de anexos que den soporte de las actividades ejecutadas; los cuales fueron mencionados en los informes mensuales, pero que en el final también se registraran.

Las actas de vecindad harán parte de los anexos por cada segmento vial, estás llevaran un consolidado donde se registre el nombre del propietario, dirección teléfono y numero de acta, así mismo contarán con su respectivo soporte de acta de cierre que verifique si se generó alguna afectación y firma a satisfacción según sea el caso. El informe se entregará según los criterios de radicación del FDLT. El informe final contendrá los siguientes requisitos:

- ✓ Identificación, información del proyecto.
- ✓ Introducción.
- ✓ Componentes del Plan de Gestión Social con los programas y actividades desarrolladas por el contratista, incluirá consolidados e indicadores de cumplimiento.
- ✓ Análisis del cumplimiento del programa.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones y anexos.

18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS.

18.1 Comités de Gestión Social

El seguimiento del desempeño social del contratista ha sido verificado semanalmente por la interventoría, de acuerdo a las actividades de gestión en campo, seguimiento telefónico y por vía correo electrónico. Adicionalmente se ha realizado seguimiento y verificación del trabajo por medio de comités sociales e integrales, validados y efectuados por la interventoría a través de la lista de chequeo. Esta información reposa en actas de seguimiento de la interventoría.

Anexos

Anexo 1
Acta de reunión de inicio Galerías, listado de asistencia y registro fotográfico

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA COMUNIDAD BARRIO GALERIAS CIV 13000875			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 3:15 p.m.		**Hoja** 1 de 4
FECHA: 8 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 3:45 p.m.		**Acta N° 5**

PROYECTO: Descripción del proyecto
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Intervención líder de infraestructura FDLT
3. Intervención de la comunidad
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo, siendo el día 08 de julio de 2025 a las 3:15 p.m. la residente social del contratista Consorcio Teusavial, saluda a la comunidad presente y procede a preguntar si hay autorización para grabar la reunión, a lo cual de manera unánime, refieren estar de acuerdo.

La residente social del Consorcio Teusavial, nuevamente saluda a la comunidad y se presenta ante los asistente de la reunión, e indica que este contratista realizará la intervención de (1) segmento vial CIV (13000875) ubicado en la Calle 53B entre Carrera 27 y Carrera 27A en este sector del barrio Galerías. En el marco del contrato de obra No. FDLT-552-2024 COP (120683)

Explica la residente social del contratista que este es un contrato celebrado entre el consorcio Teusavial y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, donde se va a realizar la intervención de diferentes segmentos viales de unas vías especificas de esta localidad.

Se expone que esta obra es beneficiosa para la comunidad, las obras se ejecutaran con calidad y garantía; para ello el día de hoy se les va a a explicar que se realizará a nivel técnico; se indica que se cuenta con acompañamiento del jefe de infraestructura, el arquitecto Salas, quien de manera expositiva dará a conocer el proceco constructivo.

Seguidamente se realiza la presentación de la entidad Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y sus representantes en este espacio:

Inicia el arquitecto Álvaro Salas líder de infraestructura y también asisten de esta área los ingenieros Carlos Durán, ingeniera Daniela Benavidez, el ingeniero Juan Camilo López, y la Trabajadora Social Diana Silva.

Se procede a presentar a los participantes de la interventoría Consorcio InterTeusaquillo J.G., ingeniero Fredy Perdomo, residente técnico, Luz Ayda Escobar Ospina residente social, quienes emiten saludo a los asistentes.

Por último se realiza la presentación de los profesionales de las áreas técnica, SST - ambiental y social del Consorcio Teusavial contratista.

2. Intervención líder de infraestructura FDLT:

El arquitecto Álvaro Salas, emite saludo a la comunidad e indica que el objetivo principal es mejorar las condiciones de la vía, se realizará el manejo de las grietas, ondulaciones y problemas de drenaje de agua. La intervención implicará la remoción del asfalto existente, la instalación de un geotextil, conformación de subbase granular con agregado reciclado, instalación de geocelda rellena con agregado reciclado. instalación de Base granular mejorada con cemento y aditivo, se agregará una capa de base concreto asfaltico MD-25 y por último se instalará una capa de concreto asfaltico MD-19.

El arquitecto Álvaro Salas líder de infraestructura del FDLT indica que el inicio de obra es el día viernes 11 de julio del presente año con una duración de tres meses, aunque se harán esfuerzos para terminar antes. Se hace énfasis en que esta intervención no contempla intervención de las redes de alcantarillado, quedan las existentes, también se aclara que hay otra obra que se está ejecutando en el sector y ésta es independiente a este contratista y que las características del proceso constructivo es diferente, por lo cual esta intervención será más rápida.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA COMUNIDAD BARRIO GALERIAS CIV 13000875			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 3:15 p.m.	**Hoja** 2 de 4
FECHA: 8 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 3:45 p.m.	**Acta N° 5**

El jefe de infraestructura del FDLT arquitecto Álvaro Salas menciona que con respecto al PMT, va a haber un plan de manejo de tránsito que, antes de iniciar la obra debe estar instalado dicho PMT, explica que son todas las señalizaciones que indican la ejecución de la obra y los desvios del tráfico, refiere que se va a generar un cierre de media calzada de la vía, lo cual es necesario para poder hacer la intervención.

De igual manera, en los andenes se va a poder tener la circulación peatonal. También manifiesta que el contratista tendrá un campamento de obra el cual será ubicado en la zona de la vía a intervenir, aclara que el acceso vehicular, será un poco restringido, por lo que van a la circulación vial a media calzada.

El jefe de infraestructura del FDLT arquitecto Álvaro Salas menciona que las redes no se intervienen ya que en la actividad previa realizada por el contratista mediante revisión con CCTV, se verificó de que las tuberías se encuentran en buenas condiciones y el acueducto no solicitó su reemplazo.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. Un asistente a la reunión pregunta ¿cuál es la dirección exacta del cierre de la vía y en que fecha?

Respuesta del jefe de infraestructura del FDLT arquitecto Álvaro Salas, indica que el segmento vía de cierre es Calle 53B entre carrera 27 y carrera 27A, se inicia la obra el día 11 de julio de 2025 y será por tres meses.

2. Un asistente pregunta si ¿esta obra se va a demorar mas de los tres meses?

Respuesta del jefe de infraestructura del FDLT arquitecto Álvaro Salas, responde que esta obra es diferente y se tiene programada una ejecución de tres meses ya que no habrá cambios de tuberías de las redes.

Se indica que los funcionarios de la alcaldía local de Teusaquillo y la interventoría estarán supervisando estas obras para que se realicen por parte del contratista de manera correcta con la calidad que se requiere.

La reunión concluye con un recordatorio de los canales de comunicación disponibles para la atención a la comunidad.

4, Compromisos, se describen al finalizar el acta.



5. Una vez atendidas las inquietudes de la comunidad se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Instalar señales de PMT	Contratista	10 de julio de 2025
Iniciar la obra	Contratista	11 de julio de 2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia.		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Ayda Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	**SI**	**X**	**NO**		**TIPO DE ANEXO:** Reg. Fotográfico, listado de asistencia	**CANTIDAD: 2**

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	Julio 08/2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN INICIO DEOBRA				
LUGAR	CALLE 53B ENTRE CARRERA 27 Y 27A	BARRIO	GALERIAS	UPZ	GALERIAS	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	cc	80013738	Leonardo Ortiz	45	COMUNIDAD					3145604771	CRA 27A #53-36	Galerias		
2	cc	52236453	Concepcion Poveda A	45						3172637760	cll 53B #27-24	Galerias		
3	cc	10 286 549	Luis Fernán Rivera B	55	Parroquia	M				3113179751	cll 53B nr 27-36	Galerias	jorgandeca1@hotmail.com	
4	cc	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]			
5	cc	Secc	Sergio Ortiz	32	Rock Olao					3118736916	Cr 27a #539-24	Galerias	[illegible]	
6	cc	80 7 104	Francisco Betancur	43	TBC					3107744855	[illegible]	Galerias	[illegible]	
7	cc	1037388852	David Altamar	38	FDLT	M				3107733511	Cll 25b 32A-48	Gran América		
8	cc	1018456077	Juan Camilo Amaya P.	32	FDLT	M				3175236085	—	—	—	
9	cc	1085[illegible]98	Daneb Bernadez Vasquez		FDLT	M				3213961296	—	—	—	
10	cc	97 [illegible] 4	Carlos Ivan			M					Cra 18 # 2378		Carlos2e@	
11	cc	27 6/49[illegible]	Esther Vargas	60	Comunidad					311 811 87[illegible]	cll 53B # 27-23			
12	cc	92533 13	ALVARO SALAS	45										
13	cc	1032380856	Marcela Arevalo		Citesalud					3105838694	Cll 39A-29-21	La soledad	Consor.citesalud	Marcela A.
14	cc	5210499	Sandra I. Perilla		Citesalud					3132258858	cll 39A #29-21	La soledad	teusocial social@gmail.com	
15	cc	79498674	Freny Penagos	11	JUNED.					3007885221	11	11	Coordinadorcitesalud@gmail.com	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Julia Forero
Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO · BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	08 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Reunión de inicio de obra barrio Galerías CIV 13000875

Anexo 2
Actas de reunión de entrega a la comunidad tramos Nicolas de Federmán tramos 2 y 3, listado de asistencia y registro fotográfico

FORMATO ACTA REUNIÓN ENTREGA DE OBRA BARRIO NICOLÁS DE FEDERMÁN TRAMO 2 CIV 13000864			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:**	4:15 p. m.	**Hoja** 1 de 5
FECHA: 18 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**:	16:50 p.m.	**Acta N°** 1

OBJETO DEL CONTRATO:
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de Bienvenida

2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría, supervisión y el contratista

4. Resumen componente Técnico sobre intervención realizada.

3. Cierre

Siendo las 4:15 p.m del día 18 de julio de 2025, se realiza la reunión de entrega de obra en el barrio Nicolás de Federmann Tramo 2 CIV 13000864, ubicado en la calle 53A entre carreras 35 y 36.

1. Saludo, Se da inicio a la reunión de entrega de obra del tramo, tomando la palabra la señora Alcaldesa de la Localidad, Doctora María Angélica Gonzalez Russi, quien da un cordial saludo a la comunidad asistente, seguidamente realiza la presentación de los profesionales del contratista, interventoría y supervisión de la Alcaldía Local, quienes hicieron el acompañamiento en el proceso de intervención del segmento vial.

Igualmente, manifiesta su satisfacción al realizar la entrega de las obras, dando cumplimiento con los compromisos adquiridos en la reunión de inicio, menciona que honrando la palabra, la via cumple con las especificaciones técnicas que se contrataron, garantizando mayor durabilidad. Menciona la incomodidad que se generó con el cierre del segmento vial y las dificultades que se ocasionaron para el ingreso de los vehículos a los predios; igualmente, como la recolección de basuras, las cuales tuvieron que se trasladas a las esquinas; por tal motivo, las obras se realizaron en el menor tiempo posible, de una manera eficiente, donde la ejecución de la intervención se llevó en dos meses y no en los cuatro meses que se había mencionado en la reunión de inicio.

2. Toma la palabra el Arquitecto Alvaro Salas quien refiere que la obra se llevo acabo a pesar del clima y las lluvias, en el tiempo. Manifiesta que en el tramo se ejecutaron actividades de excavación mecánica y manual, se realizó la renovación de tubería residual, se hizo la construcción de cárcamos, se instaló geotextil y geocelda, se realizaron rellenos con material SBG reciclada, se instalaron sumideros, se realizó la nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con cemento y aditivo y por último, se instaló capa de asfalto MD-25 y MD-19. Igualmente, se llevó a cabo la intervención de la bahía la cual presentaba deterioro, quedando en mejores condiciones.

Manifiesta, que la señalización horizontal se realizará en dos meses aproximadamente, ya que el asfalto se encuentra recien instalado y no es procedente hacerlo en este momento.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

3. Cierre:

La comunidad asistente en general, manifiestan su satisfacción por las obras realizadas, agradecen a todos por el cumplimiento en la ejecución de obra en el menor tiempo.

Se realiza entrega de un aperitivo a los asistentes y se cierra la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Señalización horizontal de la vía	Contratista	Septiembre 21 de 2025 Recibo final de Interventoría

FORMATO ACTA REUNIÓN ENTREGA DE OBRA BARRIO NICOLÁS DE FEDERMÁN TRAMO 2 CIV 13000864			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CODIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSION** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 4:15 p. m.	**Hoja** 2 de 5
FECHA: 18 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 16:50 p.m.	**Acta N°** 1

FIRMAS		
NOMBRE	**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
Se adjunta listado de asistencia.		

	ELABORO	**RESPONSABLE**	**APROBO**
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	**SI**	**X**	**NO**		**TIPO DE ANEXO:** Reg. Fotográfico	**CANTIDAD: 1**

FORMATO			
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

FECHA	JULIO 18 DE 2025	TEMA	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DEL TRAMO 2												
LUGAR	[illegible] CL 53A-CR 35 y 36			BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMAN		UPZ	LA ESMERALDA		LOCALIDAD	TEUSAQUILLO				

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	41503907	Ana Elvira Hernandez		COMUNIDAD	M				3067573188	c/c 53A-35.23	NICOLAS DE FEDERMAN		
2	CC	20021904	Beatriz de Villareal		Comunidad	M				6012276810	cl 53A No 35-36			
3	CC	41955239	Maria Jose Buitrago L			M				3123483811	Cr 35 # 53-53			
4	CC	52818413	Ma Angelica Gonzalez Russi		PDLT	M				3102851170				
5	CC	52533532	Myrosoys Vargas		PDLT	H				—	—	—	—	
6	cc	43871687	Liliana Angarita Ulloa		Comunidad	M				3006358521	Cr 35 # 53-78			
7	CC	51603093	Patricia Martinez G		Comunal	M				3115947739	Cl 53 No 30-74			
8	CC	79236091	Hernando Neto			H				3243314483	cl 53A · 35 51			
9	CC	1032399624	Diana Silva	—	PDLT.	M				3014012438	Teusaquillo	—	—	
10	CC	1018491254	Sharon Yostin G.	—	PDLT	H				3138289513	Teusaquillo	—	—	
11	CC	79821051	WILSON O. RAMIREZ P.	—	PDLT	H				3178867623	TEUSAQUILLO	—	—	
12	CC	1032389858	Daniel Altamar	—	P.D.L.T.	H				3107732911	Teusaquillo	—	—	
13	CC	79[illegible]934	Ruben Duran		PDLT	H				3148214[illegible]				
14	CC	7469867	Freddy Perdomo		Teusaquillo	H				3007885273	—	—	—	
15	CC	1022403359	Sebastian Martinez		Centro Hist.	H				3204248868	—	—	—	

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Luis Escobar
Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	Julio 18/2025	TEMA	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DEL TRAMO 2				
LUGAR	CALLE 53A ENTRE CARRERAS 35 Y 36	BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMAN	UPZ	LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	52104995	Sandra I Perilla F.		COMUNIDAD	M	Ht	N	N	3132258859	Cl 39A N. 29-21	NICOLAS DE FEDERMAN	teusocial social @gmail.com	
2	CC													
3	CC													
4	CC													
5	CC													
6	CC													
7	CC													
8	CC													
9	CC													
10	CC													
11	CC													
12	CC													
13	CC													
14	CC													
15	CC													

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Jair Escobar
Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	18 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Reunión de finalización tramo 2 Nicolas de Federman

FORMATO ACTA REUNIÓN ENTREGA DE OBRA BARRIO NICOLÁS DE FEDERMÁN TRAMO 3 CIV 13000476 Y 13000438			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	
Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 5:18 p.m.		**Hoja** 1 de 4
FECHA: 18 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 18:15 p.m.		**Acta N°** 2

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁD.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría, supervisión y el contratista
4. Resumen componente Técnico sobre intervención realizada.
3. Cierre

Siendo las 5.18 p.m del día 18 de julio de 2025, se realiza la reunión de entrega de obra en el barrio Nicolás de Federman Tramo 3 CIV 13000476 y 13000438, ubicado en la carrera 36A entre calles 57A y 57B.

1. Saludo, Se da inicio a la reunión de entrega de obra del tramo, tomando la palabra la señora Alcaldesa de la Localidad, Doctora María Angélica Gonzalez Russi, quien da un cordial saludo a la comunidad asistente, seguidamente realiza la presentación de los profesionales del contratista, interventoría y supervisión de la Alcaldía Local, quienes hicieron el acompañamiento en el proceso de intervención del segmento vial.

Igualmente, manifiesta su satisfacción al realizar la entrega de las obras, dando cumplimiento con los compromisos adquiridos en la reunión de inicio, menciona que honrando la palabra, la via cumple con las especificaciones técnicas que se contrataron, garantizando mayor durabilidad. Menciona la incomodidad que se generó con el cierre del segmento vial y las dificultades que se ocasionaron para el ingreso de los vehículos a los predios; igualmente, como la recolección de basuras, las cuales tuvieron que se trasladas a las esquinas; por tal motivo, las obras se realizaron en el menor tiempo posible, de una manera eficiente, donde la ejecución de la intervención se llevó en dos meses y no en los cuatro meses que se había mencionado en la reunión de inicio.

2. Toma la palabra el Arquitecto Alvaro Salas quien refiere que la obra se llevo acabo a pesar del clima y las lluvias, en el tiempo. Manifiesta que en el tramo se ejecutaron actividades de excavación mecánica y manual, se realizó la renovación de tubería residual, se realizó relleno con material granular, se instaló la red de aguas lluvias y conexión de la red al colector ubicado en el costado occidental la carrera 36A, se instaló geotextil y geocelda, se realizaron rellenos con material SBG reciclada, se instalaron sumideros, se realizó la nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con cemento y aditivo y por último, se instaló capa de asfalto MD-25 y MD-19.

Manifiesta, que la señalización horizontal se realizará en dos meses aproximadamente, ya que el asfalto se encuentra recien instalado y no es procedente hacerlo en este momento.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Preguntas de la comunidad:

La señora Patricia Martínez, propietaria del predio ubicado en la carrera 36A No. 57A-05, pregunta si la vía y bahía del costado occidental, serán intervenidas?

Respuesta Supervisión Alcaldía Local: La señora Alcaldesa, Doctora Maria Angelica González Russi, le informa a la usuaria que la vía se intervendrá mas adelante por Acción de Movilidad, donde se recuperará espacios específicos afectados en la vía.

3. Cierre:

La comunidad asistente en general, manifiestan su satisfacción por las obras realizadas, agradecen a todos por el cumplimiento en la ejecución de obra en el menor tiempo.

Se realiza entrega de un aperitivo a los asistentes y se cierra la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Señalización horizontal de la vía	Contratista	Septiembre 21 de 2025 Recibo final interventoría

FORMATO ACTA REUNIÓN ENTREGA DE OBRA BARRIO NICOLÁS DE FEDERMÁN TRAMO 3 CIV 13000476 Y 13000438			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	**HORA INICIO:** 5:18 p.m.	**Hoja** 2 de 4
FECHA: 18 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 18:15 p.m.	**Acta N°** 2

FIRMAS		
NOMBRE	**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
Se adjunta listado de asistencia.		

	ELABORÓ	**RESPONSABLE**	**APROBÓ**
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	**SI**	**X**	**NO**		**TIPO DE ANEXO:** Reg. Fotográfico	**CANTIDAD: 1**

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	Julio 18/2025	TEMA	REUNIÓN DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DEL TRAMO 3				
LUGAR	CARRERA 36A ENTRE CALLES 57A Y 57B	BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMAN	UPZ	LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	41383196	Rosalba de Herrera	M	COMUNIDAD					3178146411	Cr 36A Cl 57A-08	NICOLAS DE FEDERMAN	—	
2	CC	2932411	Hector Herrera	H	Comunidad					3102891087	Cr 36A Cl 57A-08	Nicolas	—	
3	CC		Patricia Martinez	M	Comunidad					3125720397	Cra 36A #57A07	Federman		
4	CC		Claudia C Peron &	M										
5	CC	79.496.679	Freddy Peroma	H	INTERV.					3007885726			— — —	
6	CC	79.722434	Carlos Duran	H						4821477				
7	CC	1032399624	Diana Silva	M	PDLT.					3014012458	Teusaquillo	—	—	
8	CC	1032388852	Daniel Altamar	H	F.D.L.T.					3107732511	Teusaquillo	—		
9	CC	79821051	WILSON O. ESTUPIÑAN P.	H	F DLT					3198867623	TEUSAQUILLO	—		
10	CC	1018451254	Steven Martinez	H	FDLT					3138289513	Teusaquillo	—	—	
11	CC	52818473	Mª Angelica Gonzalez Cossi	M	FDLT					—	Teusaquillo	—		
12	CC	9533532	Alvaro Sotelo Gomez	H	FDLT					—	—	—	—	
13	CC	1022421350	Sebastian Marquez	H	Contratista					3209248863	—	—	—	
14	CC	1124865472	Brenda Castillo Portilla	M	Interventoria					3226894142	Teusaquillo	—	—	
15	CC	52104995	Sandra L. Perilla	M.	Contratista	H	Ht	D	N	3132258659	Teusaquillo	LA SOLEDAD	teusaurolsocio@gmail.com	

Sexo. M: Mujer / **H**: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht**: Heterosexual / **Bi**: Bisexual / **T**: Transexual/ **I**: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R**: Raizales / **A**: Afrodescendientes / **I**: Indígenas / **P**: Palenqueros(as)/**G**: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V**: Visual / **A**: Auditiva / **C**: Cognitiva / **MU**: Múltiple / **N**: Ninguna

Luz Escobar
Interventoria

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	18 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Reunión de finalización tramo 3 Nicolas de Federman

Anexo 3
Actas de socialización PMT Alfonso López tramo 2, Chapinero Occidental tramos 1, 2 y 3, registro fotográfico. Acta socialización inicio de obra Ortezal, listado de firmas, plano PMT y registro fotográfico, acta de socialización suspensión accidental del servicio de energía Nicolás de Federmán y registro fotográfico

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA: 2025/07/09 **HORA:** 9:00am **LUGAR:** cr 26 entre cll 49 y 50	
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización comunidad CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50 para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50 (CIV 13001214)**

Desvío al Norte: Tomar Calle 49 al Occidente, Carrera 27 al Norte, Calle 50 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Desvío al Sur: Tomar Calle 50 al Oriente, Carrera 25 al Sur, Calle 49 al Occidente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana, garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andres Angarita	79'955'434	Cr 26 Bis 49-44/42	-11-	-11-	
2	Jaime Fernandez	-11-	Cr 26 b 49-40	320 838 9965	-11-	
3	Juan Mora	1122931632	cr 26 b. 49-29	321241 2126	-11-	
4	Guillermo Bejarano	1000078275	cr 26 b. 49-27	320 345 1623	-11-	
5	Lucero Ospina	416 J 0848	Cr 26 b. 49-17	310 314 4930	-11-	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/09 **HORA:** _____ **LUGAR:** Cr 26 No 49-26
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Edificio Vivo para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50 (CIV 13001214)**

Desvío al Norte: Tomar Calle 49 al Occidente, Carrera 27 al Norte, Calle 50 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Desvío al Sur: Tomar Calle 50 al Oriente, Carrera 25 al Sur, Calle 49 al Occidente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana, garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Humberto Carrodor	19756562	C 126 b 49-26	315652 6508	Josehumberto Carr @	
2	Lider Consejo Administrativo				hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/09 **HORA:** 10:10am **LUGAR:** Cr 26 D. 49-04
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Restaurante Amazónico Selva y Río para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Aux. Social Sondra D Perilla

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50 (CIV 13001214)**

Desvío al Norte: Tomar Calle 49 al Occidente, Carrera 27 al Norte, Calle 50 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Desvío al Sur: Tomar Calle 50 al Oriente, Carrera 25 al Sur, Calle 49 al Occidente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana, garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Patricia Tongoa	41055988	Cr 26 bis.	322869	—11—	
2	Propietaria		49-04	9519		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2023/07/09 **HORA:** 9:20am **LUGAR:** Cr 26 No. 49-12
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Restaurante Sopa y Seco para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50 (CIV 13001214)**

Desvío al Norte: Tomar Calle 49 al Occidente, Carrera 27 al Norte, Calle 50 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Desvío al Sur: Tomar Calle 50 al Oriente, Carrera 25 al Sur, Calle 49 al Occidente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana, garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Carlos J Trejo	23026982	Cr 26 No. 49-12	316767 4699	Carlosedwardotrejo 23@gmail.com	
2	Empleado					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/09 **HORA:** 10:03 **LUGAR:** Cr 26 bis 49-62
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Montallanta La 5000 para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Aux. Social Sandra D. Perilla

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50 (CIV 13001214)**

Desvío al Norte: Tomar Calle 49 al Occidente, Carrera 27 al Norte, Calle 50 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Desvío al Sur: Tomar Calle 50 al Oriente, Carrera 25 al Sur, Calle 49 al Occidente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana, garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andrés Camilo	1013650937	Cr 26 Do.	322899	kmilo Suarez	
2	Suárez Empleado.		49-62	8875	1994@gmail	
3					com.	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización PMT Carrera 26
CIV 13001214 Alfonso López

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/09 **HORA:** 2:40pm **LUGAR:** Cr 20 entre Calles 57 y 58
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización Comunidad: **CARRERA 20 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58** para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: 1. **CARRERA 20 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

CARRERA 20 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58 (CIV 13000744)

Desvío al Norte: Tomar Calle 57 al Occidente, Carrera 21 al Norte, Calle 58 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana,

garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Katherin Hernandez	1022387118	cr 20 D 57-24	3118740852	-11-	
2	Carmen Rubayo	-11-	cr 20 b 57-40	3153109537	-11-	
3	Juan Cardenas	79568066	cr 20 b 57-48	3057782920	-11-	
4	Carlos Sánchez	1014190773	cr 20 b 57-39	3542782418	-11-	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/09 **HORA:** 2:45pm **LUGAR:** Cr 20 b. 57-55
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Parqueadero RB para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 20 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Aux Social Sandra I. Perilla.

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

CARRERA 20 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58 (CIV 13000744)

Desvío al Norte: Tomar Calle 57 al Occidente, Carrera 21 al Norte, Calle 58 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana,

garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jose Manuel Beltran	381906	Cr 20 Uo.	315059	peltransegura	
2	Administrador		57 - 55	9989	gmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/09 **HORA:** 3:00pm **LUGAR:** Cr 20 Bis 52-08
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial Restaurante Casa a la Llanera. para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 20 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Aux. Social Sandra I. Perilla

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

CARRERA 20 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58 (CIV 13000744)

Desvío al Norte: Tomar Calle 57 al Occidente, Carrera 21 al Norte, Calle 58 al Oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

Se requiere el cierre total de calzada, teniendo en cuenta el alcance de las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción vial requeridas y las dimensiones reducidas de calzada, las cuales imposibilitan el cierre parcial de calzada y la implementación de pasos alternados. Por esta razón, se realizarán intervenciones entre semana,

garantizando la rodadura durante los fines de semana, que corresponden al periodo de la semana con mayor tránsito de usuarios sobre la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de junio de 2025 y durante los 6 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Zaira Aza Herera	10229383	Cr 20 Da	314449	asomarera	Zaira Aza
2	Administradora	77	57-08	8041	2@gmail.co	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización PMT Carrera 20
CIV 13000744 Chapinero Occidental

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/09/09 **HORA:** 2:00pm **LUGAR:** Cr 15 entre Cll 54A y 55Bis
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización comunidad: **CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS** para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoria CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS (CIV 13000985, 13002468)**

Desvío al Sur: Tomar la Calle 55BIS al occidente, la Carrera 18 al sur, la Diagonal 54 al oriente, la Carrera 16 al norte y la Calle 54A al oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Para garantizar condiciones de seguridad vial durante la obra, se debe modificar temporalmente el sentido vial de la Calle 55BIS entre Carrera 15 y Carrera 15A, pasando de doble sentido, a único sentido de circulación oriente – occidente. Esta medida contará con señalización vertical y auxiliares de tránsito que guíen a los conductores durante la medida.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de julio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	José Hoyuela Propietario	79'048.917	Cr 15 No. 54A - 04	3163360920	—11—	
2	Julian Espejo Arrendatario	No suministra	Cr 15 No. 54A-30	—11—	—11—	Julian Espejo
3	Gabriel Silva Propietario	19'328.731	Cr 15 No. 54A-42	320 232 1974	—11—	
4	Mery Reyes Propietario	41.558125	Cr 15 No. 55-01	3116731385	—11—	
5	Alexandra Giraldo Encargada	39.851.584	Cr 15 No. 54A - 29	3013409361	—11—	
6	Jose Humberto Cormano Guarda Seguridad	4'577.488	Caseta Calle 54A con CRA 15	3138534271	—11—	
7	Juan Chaves Propietario	79143448	Cr 15 No. 54-50	No suministra	—11—	
8	Dany Rojas Propietario	52370598	Cr 15 No. 55-12	3165260000	—11—	
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/09/09 **HORA:** 1:20pm **LUGAR:** Cr 15 No 54A-29
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial: Colegio Integral Ervid. para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoria CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS (CIV 13000985, 13002468)**

Desvío al Sur: Tomar la Calle 55BIS al occidente, la Carrera 18 al sur, la Diagonal 54 al oriente, la Carrera 16 al norte y la Calle 54A al oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Para garantizar condiciones de seguridad vial durante la obra, se debe modificar temporalmente el sentido vial de la Calle 55BIS entre Carrera 15 y Carrera 15A, pasando de doble sentido, a único sentido de circulación oriente – occidente. Esta medida contará con señalización vertical y auxiliares de tránsito que guíen a los conductores durante la medida.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de julio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Blanca Echeverria Rectora	41494632	Cr 15 No. 54A-29	3013409361	col_ [illegible] hotmail.com	COLEGIO INTEGRAL [illegible]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/09/09 **HORA:** 1:25pm **LUGAR:** Cr 15 No. 54-55
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial: Dolce Romero para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS (CIV 13000985, 13002468)**

Desvío al Sur: Tomar la Calle 55BIS al occidente, la Carrera 18 al sur, la Diagonal 54 al oriente, la Carrera 16 al norte y la Calle 54A al oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Para garantizar condiciones de seguridad vial durante la obra, se debe modificar temporalmente el sentido vial de la Calle 55BIS entre Carrera 15 y Carrera 15A, pasando de doble sentido, a único sentido de circulación oriente – occidente. Esta medida contará con señalización vertical y auxiliares de tránsito que guíen a los conductores durante la medida.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de julio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Nelson Londoño Administrador	1096034122	Cr 15 No. 54-55	3133108049	—11—	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/09/09 **HORA:** 1:15 pm **LUGAR:** Cr 15 b. 54A-28
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización establecimiento comercial: Kuana Café para la implementación del PMT para Rehabilitación Vial de calzada en: **1. CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la Rehabilitación y/o reconstrucción de la vía, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio.

El procedimiento constructivo se desarrollará en una sola etapa, con cierre de calzada durante las 24 horas del día. Por esta razón, se implementarán las siguientes rutas de desvíos durante los cierres:

- **CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55BIS (CIV 13000985, 13002468)**

Desvío al Sur: Tomar la Calle 55BIS al occidente, la Carrera 18 al sur, la Diagonal 54 al oriente, la Carrera 16 al norte y la Calle 54A al oriente, empalmando con su recorrido habitual.

Para garantizar condiciones de seguridad vial durante la obra, se debe modificar temporalmente el sentido vial de la Calle 55BIS entre Carrera 15 y Carrera 15A, pasando de doble sentido, a único sentido de circulación oriente – occidente. Esta medida contará con señalización vertical y auxiliares de tránsito que guíen a los conductores durante la medida.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de calzada se realizarán con el cierre total de calzada, iniciando con la demolición, excavación y retiro del material existente, para la conformación de la nueva estructura que soportará la vía.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra. Se implementarán un punto de ingreso y salida de volquetas con señalización y auxiliares de tránsito de acuerdo con necesidad para asegurar la entrada y salida.

Teniendo en cuenta que se realizara cierre total de calzada y no se afectara el espacio público los peatones podrán continuar por los andenes existentes. Es importante recalcar que se mantendrán en excelentes condiciones los dispositivos de señalización y seguridad instalados para el manejo de peatones, teniendo en cuenta que es el componente más importante y vulnerable durante la ejecución de obras. Por ello, se implementarán senderos peatonales seguros de mínimo 1,20 m de ancho en las intersecciones.

Considerando las condiciones de cierre total de calzada, **no se podrá garantizar la entrada y salida de vehículos.** No obstante, se garantizará en todo momento el tránsito peatonal de la zona y el funcionamiento del equipamiento descrito en el encabezado.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de julio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra.

El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andres Rincon Barista	1020835263	Cr 15 D 54A-28	3123492108	Kuanacolombia@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO


NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







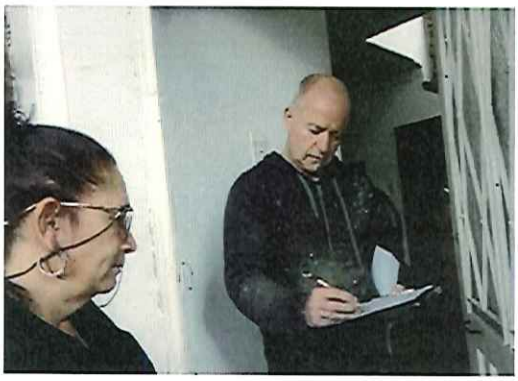

Observacion: Socialización PMT Carrera 15
CIV 13000985 13002468 Chapinero Occidental

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/14 **HORA:** 11:40 a.m. **LUGAR:** AK 14A No. 57-28
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización **Colegio Manuela Beltrán I.E.D. Sede A.** para la implementación del PMT para recuperación de espacio público con intervención de andenes **CALLE 57 ENTRE AVENIDA CARRERA 14 Y AVENIDA CARRERA 14A**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la conformación y reconstrucción del andén, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de andenes se ejecutará en una sola etapa de ejecución, con cierre total del andén norte las 24 horas y cierre parcial de calzada costado norte para el traslado del sendero peatonal a la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra.

Durante la construcción de los andenes se garantizará la circulación de los peatones sobre la calzada existente con la implementación de un sendero peatonal provisional de mínimo 1,20 m de ancho, el cual estará protegido por maletines y colombinas. Contará con el apoyo de señalización y un auxiliar de tráfico, quien controlará el paso seguro de los peatones una vez se presente el ingreso y/o salida de vehículos de la obra.

Teniendo en cuenta que las actividades se realizarán en el andén se requiere una zona para el cargue y descargue de materiales, la cual será en el carril occidental de la Avenida Carrera 14A entre Calle 57 y 30 m al Norte. Se ejecutará según concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) de la SDM.

No se presentan desvíos para el transporte público y el transporte particular teniendo en cuenta que quedará un carril habilitado para la circulación de los vehículos.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de julio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	ROSA ISBEL VARGAS G. D.D. Rectora	46661443	Cra 14A N° 57-28	305947-2267	iedmanuelabeltran13@educacionbogota.edu.co	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/16 **HORA:** 11:30am **LUGAR:** Ak 14A # 57-29
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización **Colegio Principado de Mónaco** para la implementación del PMT para recuperación de espacio público con intervención de andenes **CALLE 57 ENTRE AVENIDA CARRERA 14 Y AVENIDA CARRERA 14A**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la conformación y reconstrucción del andén, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de andenes se ejecutará en una sola etapa de ejecución, con cierre total del andén norte las 24 horas y cierre parcial de calzada costado norte para el traslado del sendero peatonal a la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra.

Durante la construcción de los andenes se garantizará la circulación de los peatones sobre la calzada existente con la implementación de un sendero peatonal provisional de mínimo 1,20 m de ancho, el cual estará protegido por maletines y colombinas. Contará con el apoyo de señalización y un auxiliar de tráfico, quien controlará el paso seguro de los peatones una vez se presente el ingreso y/o salida de vehículos de la obra.

Teniendo en cuenta que las actividades se realizarán en el andén se requiere una zona para el cargue y descargue de materiales, la cual será en el carril occidental de la Avenida Carrera 14A entre Calle 57 y 30 m al Norte. Se ejecutará según concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) de la SDM.

No se presentan desvíos para el transporte público y el transporte particular teniendo en cuenta que quedará un carril habilitado para la circulación de los vehículos.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de julio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Monica Palacios Directora	52224464	Kra. 14A No. 57-29	3105800 700	directoragenerall bogota@cpm.edu.co	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	2025/07/14 **HORA:** 11:50 a.m. **LUGAR:** AK 14A No 57-43
CONTRATO No.	**FDLT-552-2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
TEMA:	Socialización **Grupo Educativo Fortec** para la implementación del PMT para recuperación de espacio público con intervención de andenes **CALLE 57 ENTRE AVENIDA CARRERA 14 Y AVENIDA CARRERA 14A**
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**AUXILIAR SOCIAL SANDRA I. PERILLA F.**

Se realiza socialización del proyecto *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES,* contemplado en el Contrato FDLT-552-2024, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO TEUSAVIAL y supervisado por la interventoría CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.

Se especifica a los miembros de la comunidad que las actividades de obra consisten en la conformación y reconstrucción del andén, lo cual incluye el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.

Las actividades de rehabilitación y/o reconstrucción de andenes se ejecutará en una sola etapa de ejecución, con cierre total del andén norte las 24 horas y cierre parcial de calzada costado norte para el traslado del sendero peatonal a la calzada.

La implementación de los cierres se realizará con madera rolliza y polisombra, con el fin de mantener la seguridad del personal de obra y de los transeúntes que circulan por el área de influencia de la obra.

Durante la construcción de los andenes se garantizará la circulación de los peatones sobre la calzada existente con la implementación de un sendero peatonal provisional de mínimo 1,20 m de ancho, el cual estará protegido por maletines y colombinas. Contará con el apoyo de señalización y un auxiliar de tráfico, quien controlará el paso seguro de los peatones una vez se presente el ingreso y/o salida de vehículos de la obra.

Teniendo en cuenta que las actividades se realizarán en el andén se requiere una zona para el cargue y descargue de materiales, la cual será en el carril occidental de la Avenida Carrera 14A entre Calle 57 y 30 m al Norte. Se ejecutará según concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) de la SDM.

No se presentan desvíos para el transporte público y el transporte particular teniendo en cuenta que quedará un carril habilitado para la circulación de los vehículos.

Las actividades de obra anteriormente mencionadas se ejecutarán a partir del mes de julio de 2025 y durante los 4 meses siguientes, en función de las condiciones climatológicas que se presenten durante el desarrollo de la obra. El horario de trabajo será diurno y el cierre será durante las 24 horas del día.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Cesar Sanchez J.	79.347.132	C. 14 a # 57 - 43	3123588083	grupofundexperio@gmail.com	Cesar Sanchez
2	Rector					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 3







Observacion: Socialización PMT Barrio Chapinero Occidental CIV 13000826

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	

Contrato No.: _ 552-2024 COP (120683)	HORA INICIO: ___10:40 AM_____	Hoja 1 ___ de 8
FECHA: JULIO 28 DE 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 AM	Acta N° 3

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar.

2.- Socialización de canales de atención del contrato.

3.- Recomendaciones a la comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar:

CIV 13001326 Tramo calle 22 bis entre carreras 48 y 50, Barrio Ortezal, UPL Quinta Paredes. Via de emergencia por Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía Local.

El día 28 de julio de 2025, se inicia el proceso de socialización del contrato 552-2024, en el tramo ubicado en la calle 22 bis entre carreras 48 y 50 (Malla Vía Local), barrio Ortezal, UPL Quinta Paredes. Durante este proceso se informó a los ciudadanos residentes y comerciantes el nombre del contratista, denominado Consorcio Teusavial y la interventoría Consorcio Interteusaquillo JG, se menciona que los trabajos a ejecutar se harán a partir del jueves 31 de julio de 2025, con CIERRE A MEDIA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO (FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA).
Se socializa el esquema del PMT aprobado y se adjunta a la presente acta.

Se informa que el tiempo de ejecución del trabajo será de 1 (un) mes aproximadamente y con intervención diurna.

2.- Socialización de canales de atención del contrato

Se socializa los datos del punto PAC virtual: Celular: 301 907 2050 / Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com / Punto PAC presencial: Calle 39A No. 29-21 Barrio La Soledad

3.- Recomendaciones a la comunidad

Se realizan la siguientes recomendaciones a la comunidad:
1.- No ingresar a las zonas de trabajo las cuales se encontratrán aisladas durante la ejecución.
2.- Se recomienda atender la señalización informativa y reglamentaria dispuesta en el frente de obra.
3.-En caso de algún requerimiento de la comunidad por favor dirigirse al residente de obra, quien transmitira las inquietudes al área social,o a los canales de atención del contrato.
4.- Se recomienda el retiro de los vehículos de los garajes durante el tiempo de aplicación de carpeta asfáltica

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad no manifiesta ninguna inquietud, reciben la información a satisfacción.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NINGUNO	N/A	N/A

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA	Angela M. Quiroga	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

ANEXOS:	SI	X	NO	\	TIPO DE ANEXO: Listados de firmas, esquema PMT y registro fotográfico	CANTIDAD: 3

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	JULIO 28 DE 2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA				
LUGAR	CALLE 22 BIS ENTRE CARRERAS 48 Y 50 CIV 13001326	BARRIO	ORTAZAL	UPZ	QUITA PAREDES	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO


No	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	— 11 —	— 11 —	—	— 11 —	—	Ht	N	N	— 11 —	C 1 22BIS No 48-36	ORTAZAL	— 11 —	
2	CC	1019612606	Lina Henrique	—	Comunidad	H	Ht	N	N	3012220027	C 1 22BIS No 48-34	ORTAZAL	linahenrique@sms.i.cja	
3	CC	80415070	William Arioque	—	Comunidad	H	Ht	N	N	3008886326	C 1 22BIS No 48-32	ORTAZAL	chiguiin1@yahoo.com	
4	CC	— 11 —	— 11 —	—	Comunidad	—	Ht	N	N	— 11 —	C 1 22BIS No 48-30	ORTAZAL	— 11 —	
5	CC	80441880	Jesús Preciado		Comunidad	H	Ht	N	N	3114860606	C 1 22BIS No 48-28	ORTAZAL	plinio.picci1301@gmail.com	
6	CC	52'357907	Olga Córdoba	—	Comunidad	M	Ht	N	N	3114860609	C 1 22BIS No 48-26	ORTAZAL	— 11 —	
7	CC	— 11 —	Liliana Rojas	—	Comunidad	M	Ht	N	N	3001497240	C 1 22BIS No 48-24	ORTAZAL	— 11 —	
8	CC	11388759	Jose Bolleteros	—	Comunidad	H	Ht	N	N	3125175597	C 1 22BIS No 48-20	ORTAZAL	— 11 —	
9	CC	— 11 —	Orlando Martinez	—	Comunidad	H	Ht	N	N	2684471	C 1 22BIS No 48-65	ORTAZAL	— 11 —	
10	CC											ORTAZAL		
11	CC											ORTAZAL		
12	CC											ORTAZAL		
13	CC											ORTAZAL		
14	CC											ORTAZAL		
15	CC											ORTAZAL		

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


NOTAS

1. El acopio de material se realizara dentro de las zonas de obra.
2. Para carga y descarga de materiales se realizaran en horarios donde no se crucen con las horas pico de transito del sector. Los cierres para cargue y descargue no sera superiores a 1 hora,

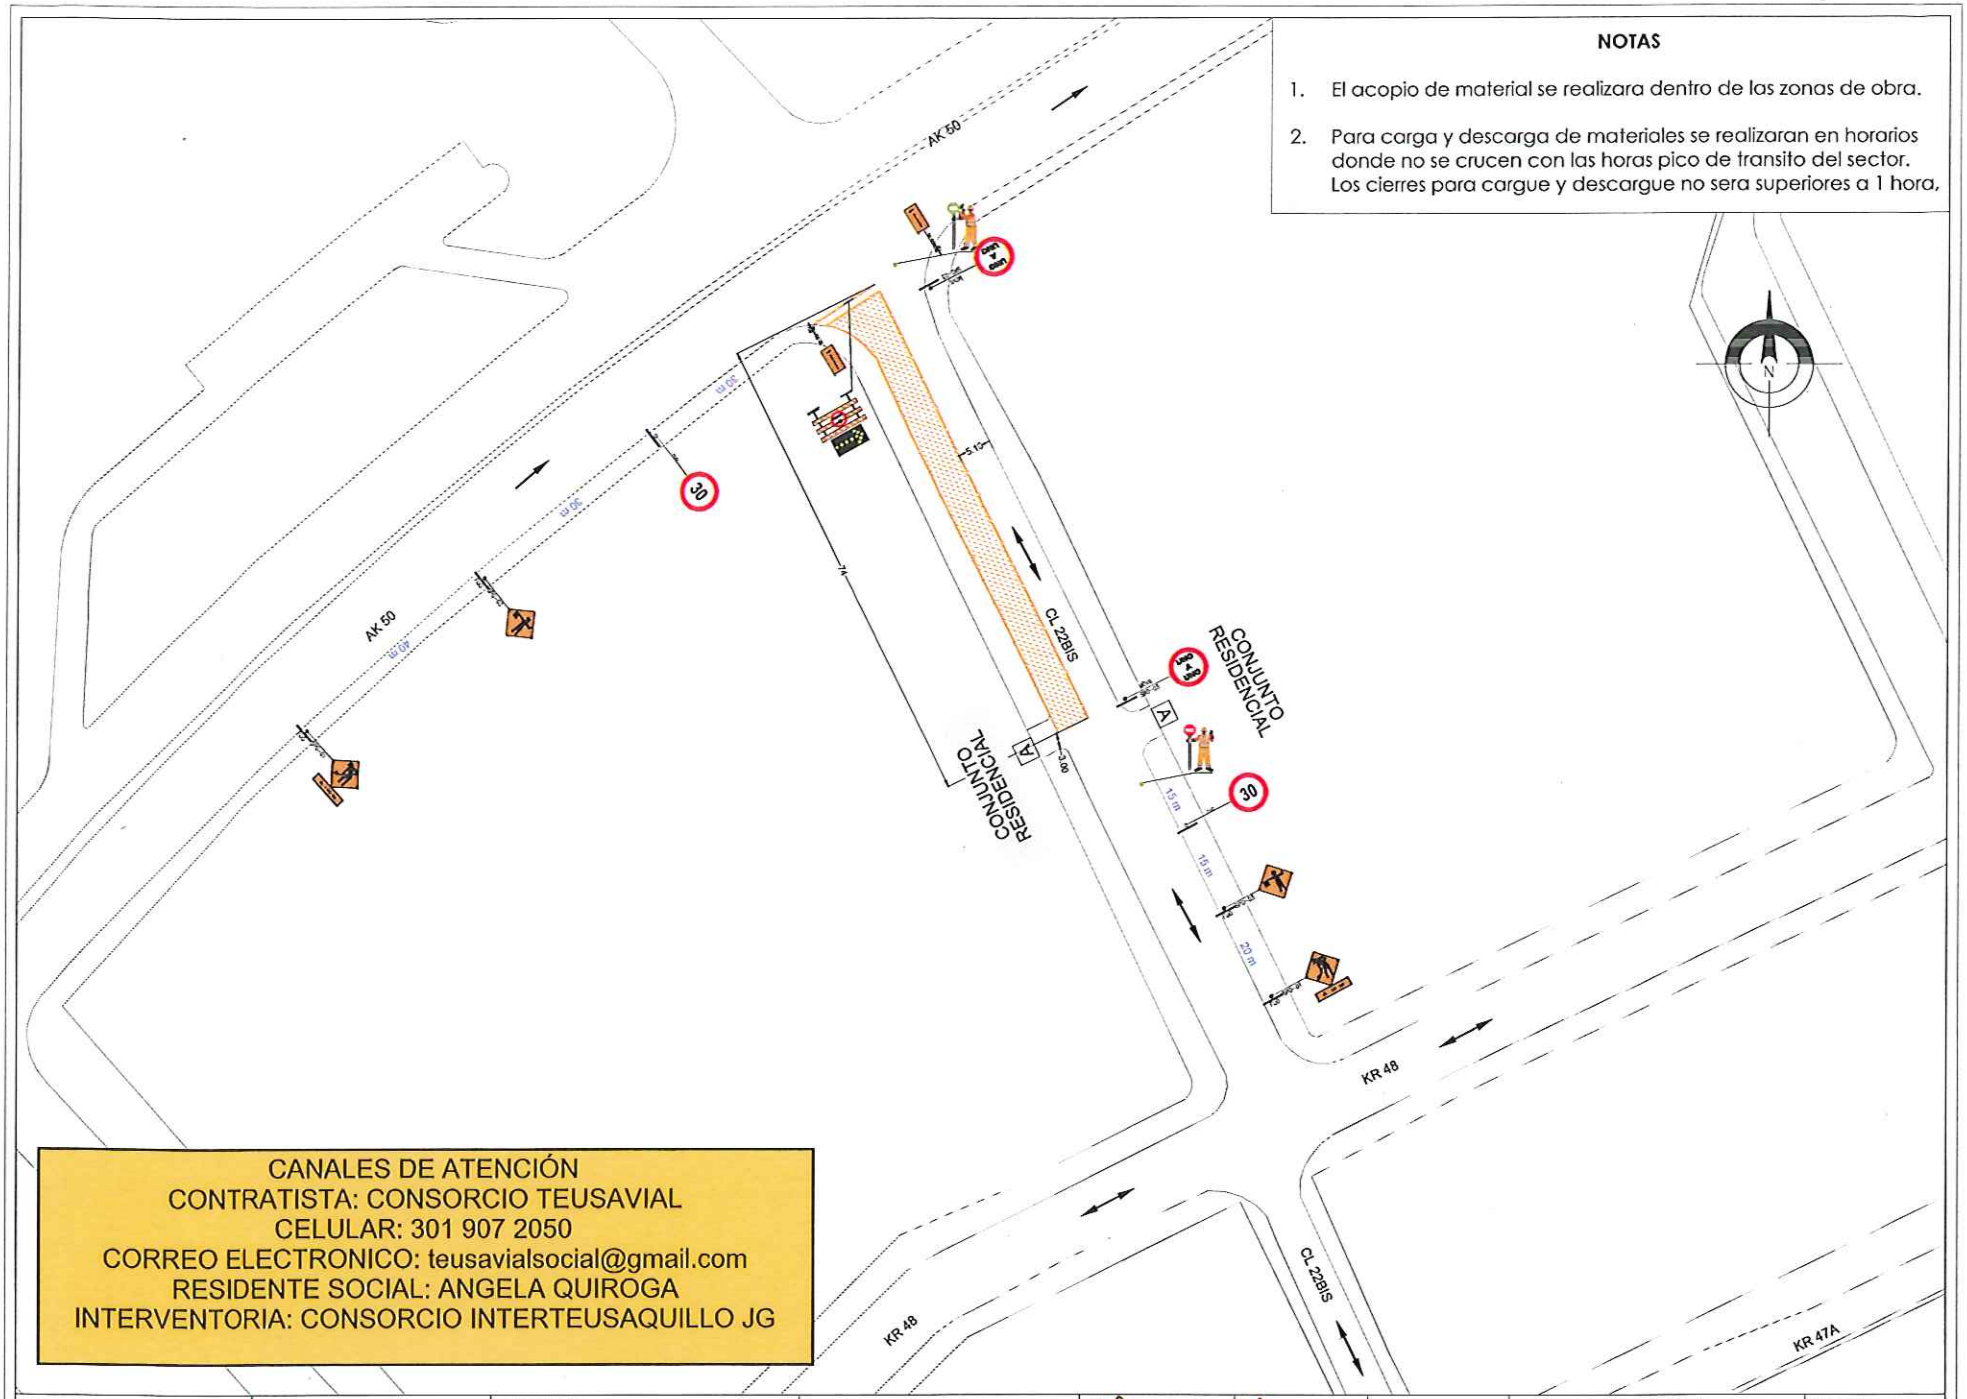


CANALES DE ATENCIÓN
CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL
CELULAR: 301 907 2050
CORREO ELECTRONICO: teusavialsocial@gmail.com
RESIDENTE SOCIAL: ANGELA QUIROGA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG


CONSORCIO VÍAS TEUSAQUILLO 2023	GSG INGENIERIA VIAL	CONTIENE: PMT PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA) POR ETAPAS NO SIMULTÁNEAS EN LA CL 22BIS ENTRE KR 48 Y AK 50 (CIV 13001326) ETAPA I	"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO."	CONVENCIONES	SEMAFOROS	HORARIO: 24 HORAS ESCALA : S/N PLANO 1 DE 4

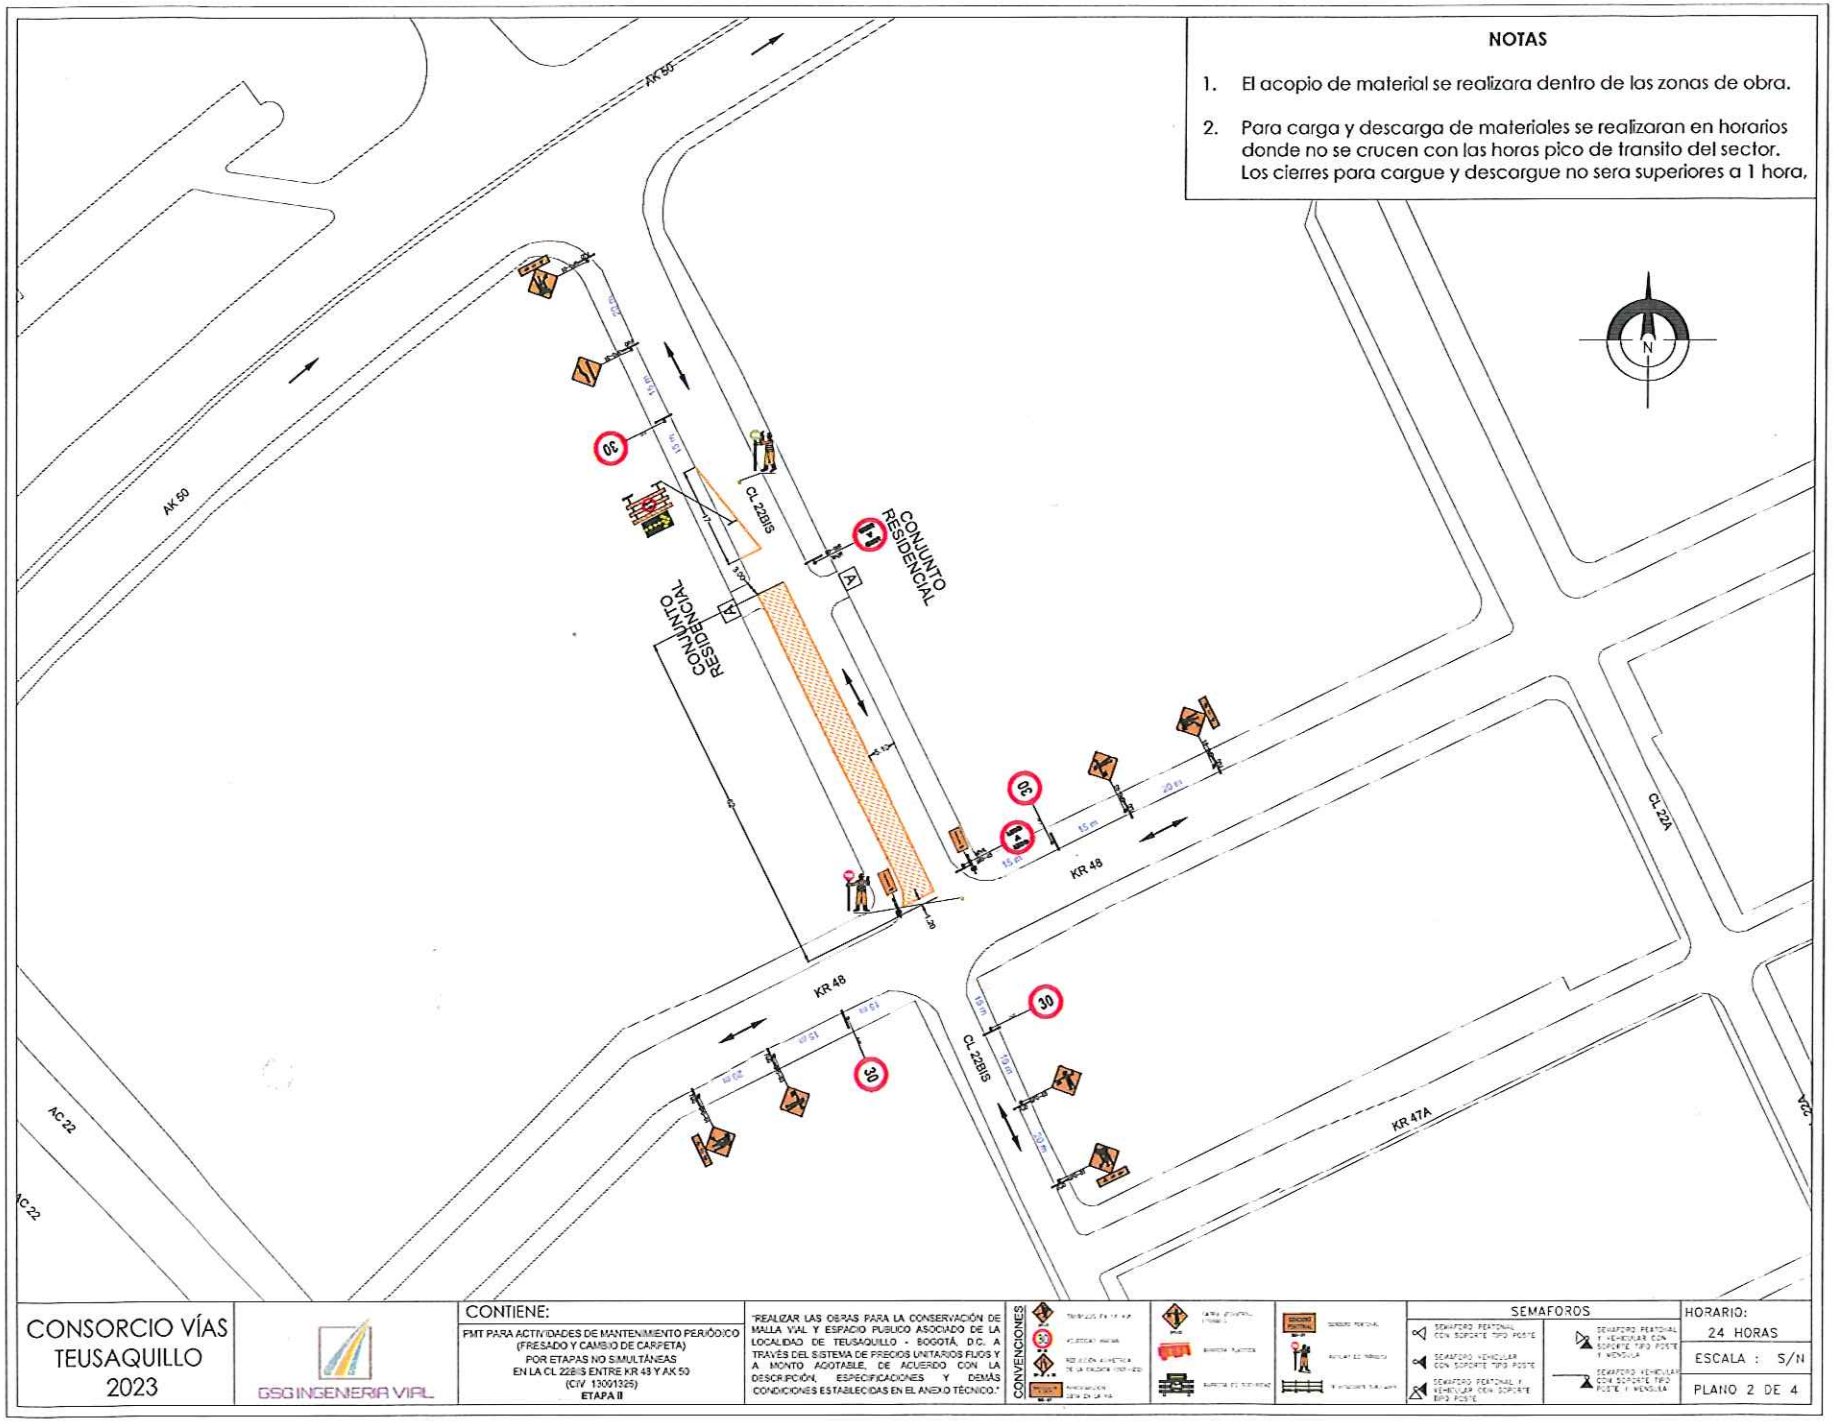

CONSORCIO VÍAS TEUSAQUILLO 2023	GSG INGENIERIA VIAL	CONTIENE: PMT PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA) POR ETAPAS NO SIMULTÁNEAS EN LA CL 228IS ENTRE KR 48 Y AK 50 (CIV 13091325) ETAPA II	"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO."	CONVENCIONES	SEMAFOROS	HORARIO: 24 HORAS ESCALA : S/N PLANO 2 DE 4

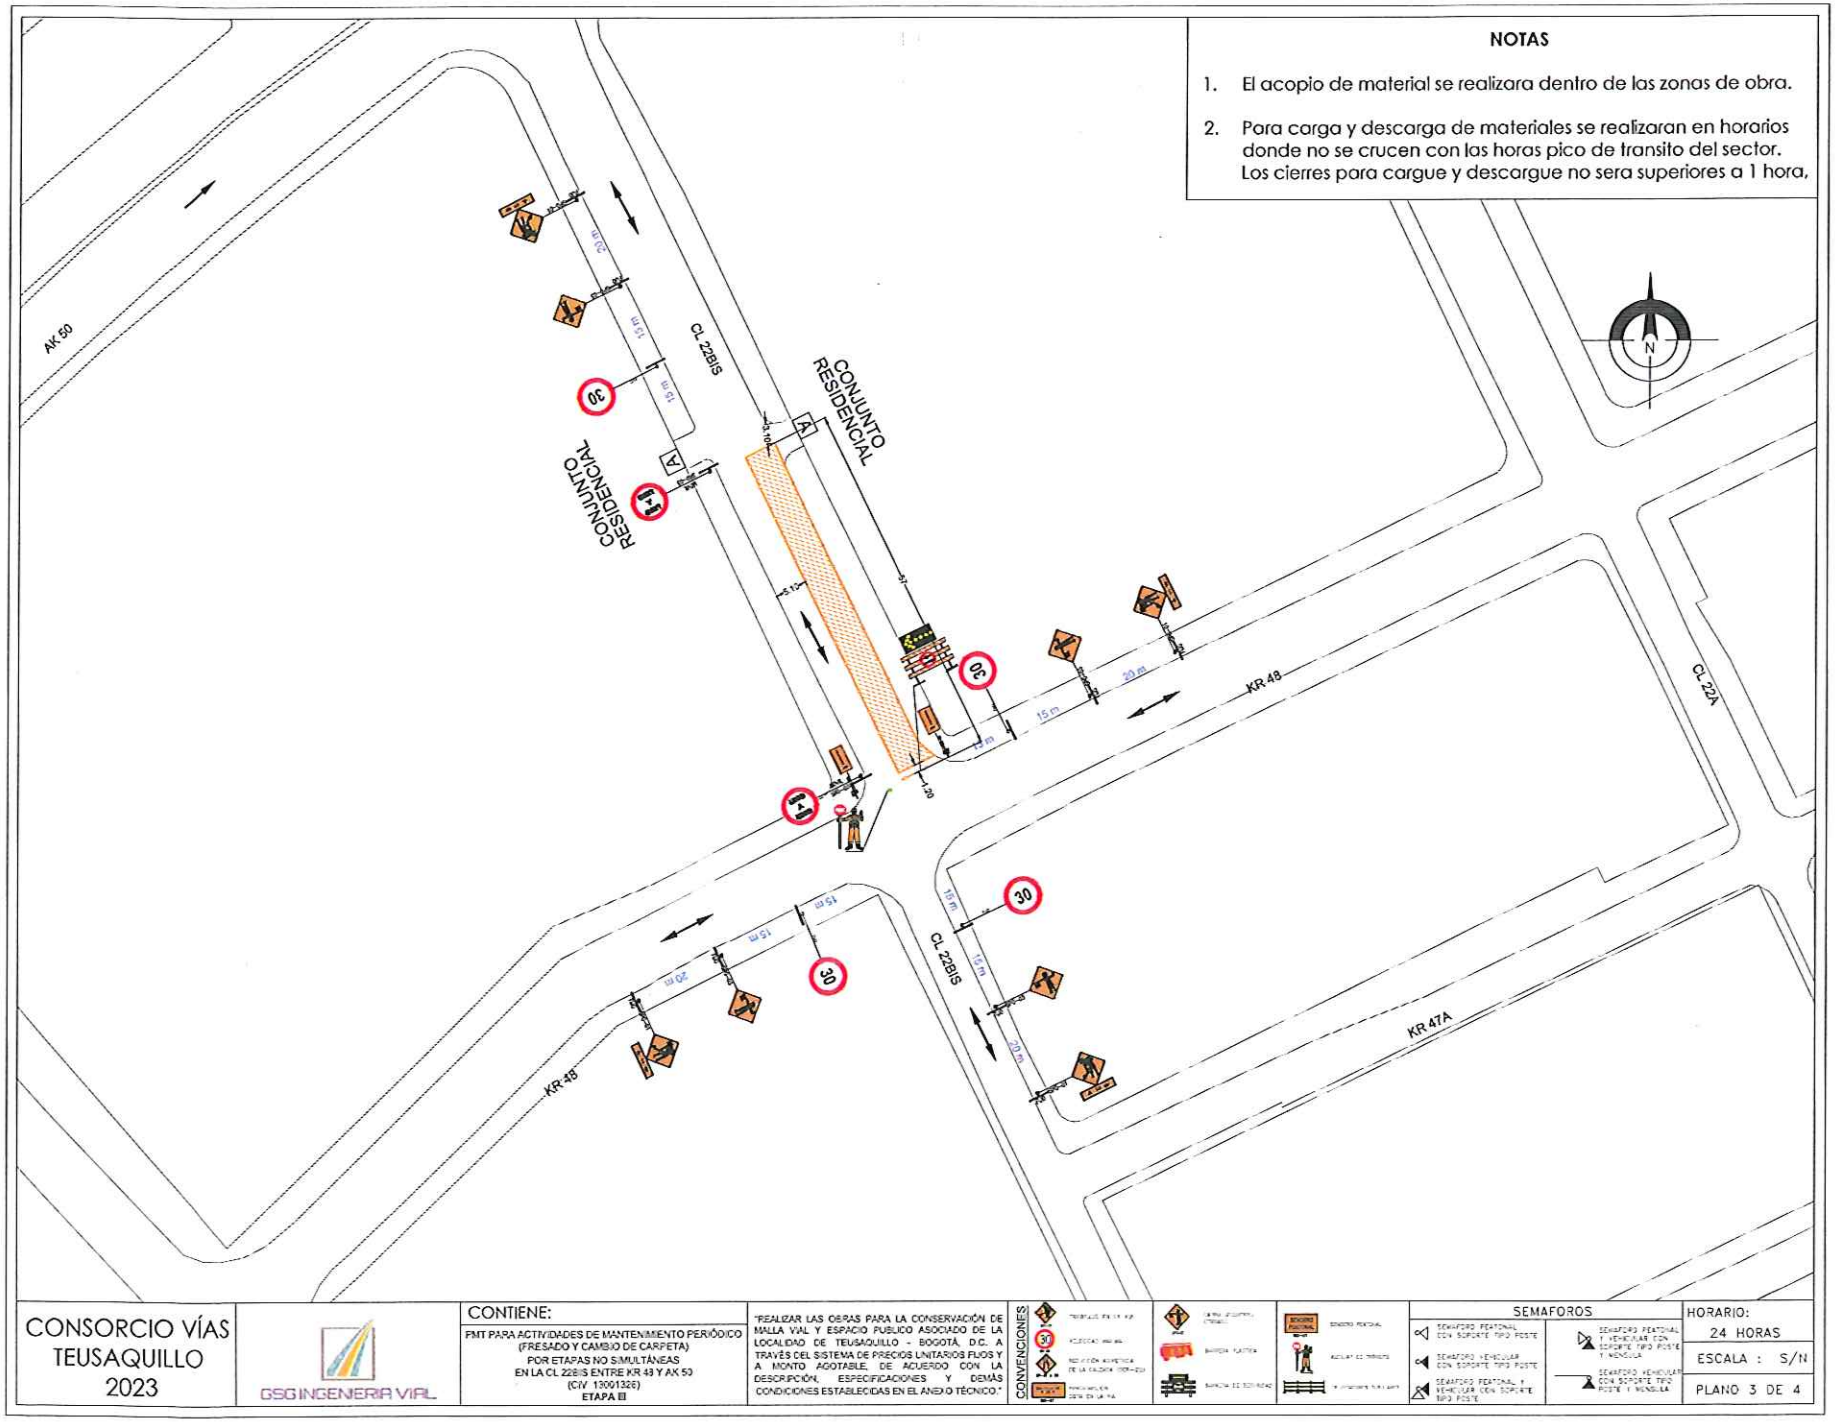

CONSORCIO VÍAS TEUSAQUILLO 2023	GSG INGENIERIA VIAL	CONTIENE: PMT PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA) POR ETAPAS NO SIMULTÁNEAS EN LA CL 22BIS ENTRE KR 48 Y AK 50 (CIV 13001326) ETAPA III	"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO."	CONVENCIONES	SEMAFOROS	HORARIO: 24 HORAS ESCALA : S/N PLANO 3 DE 4

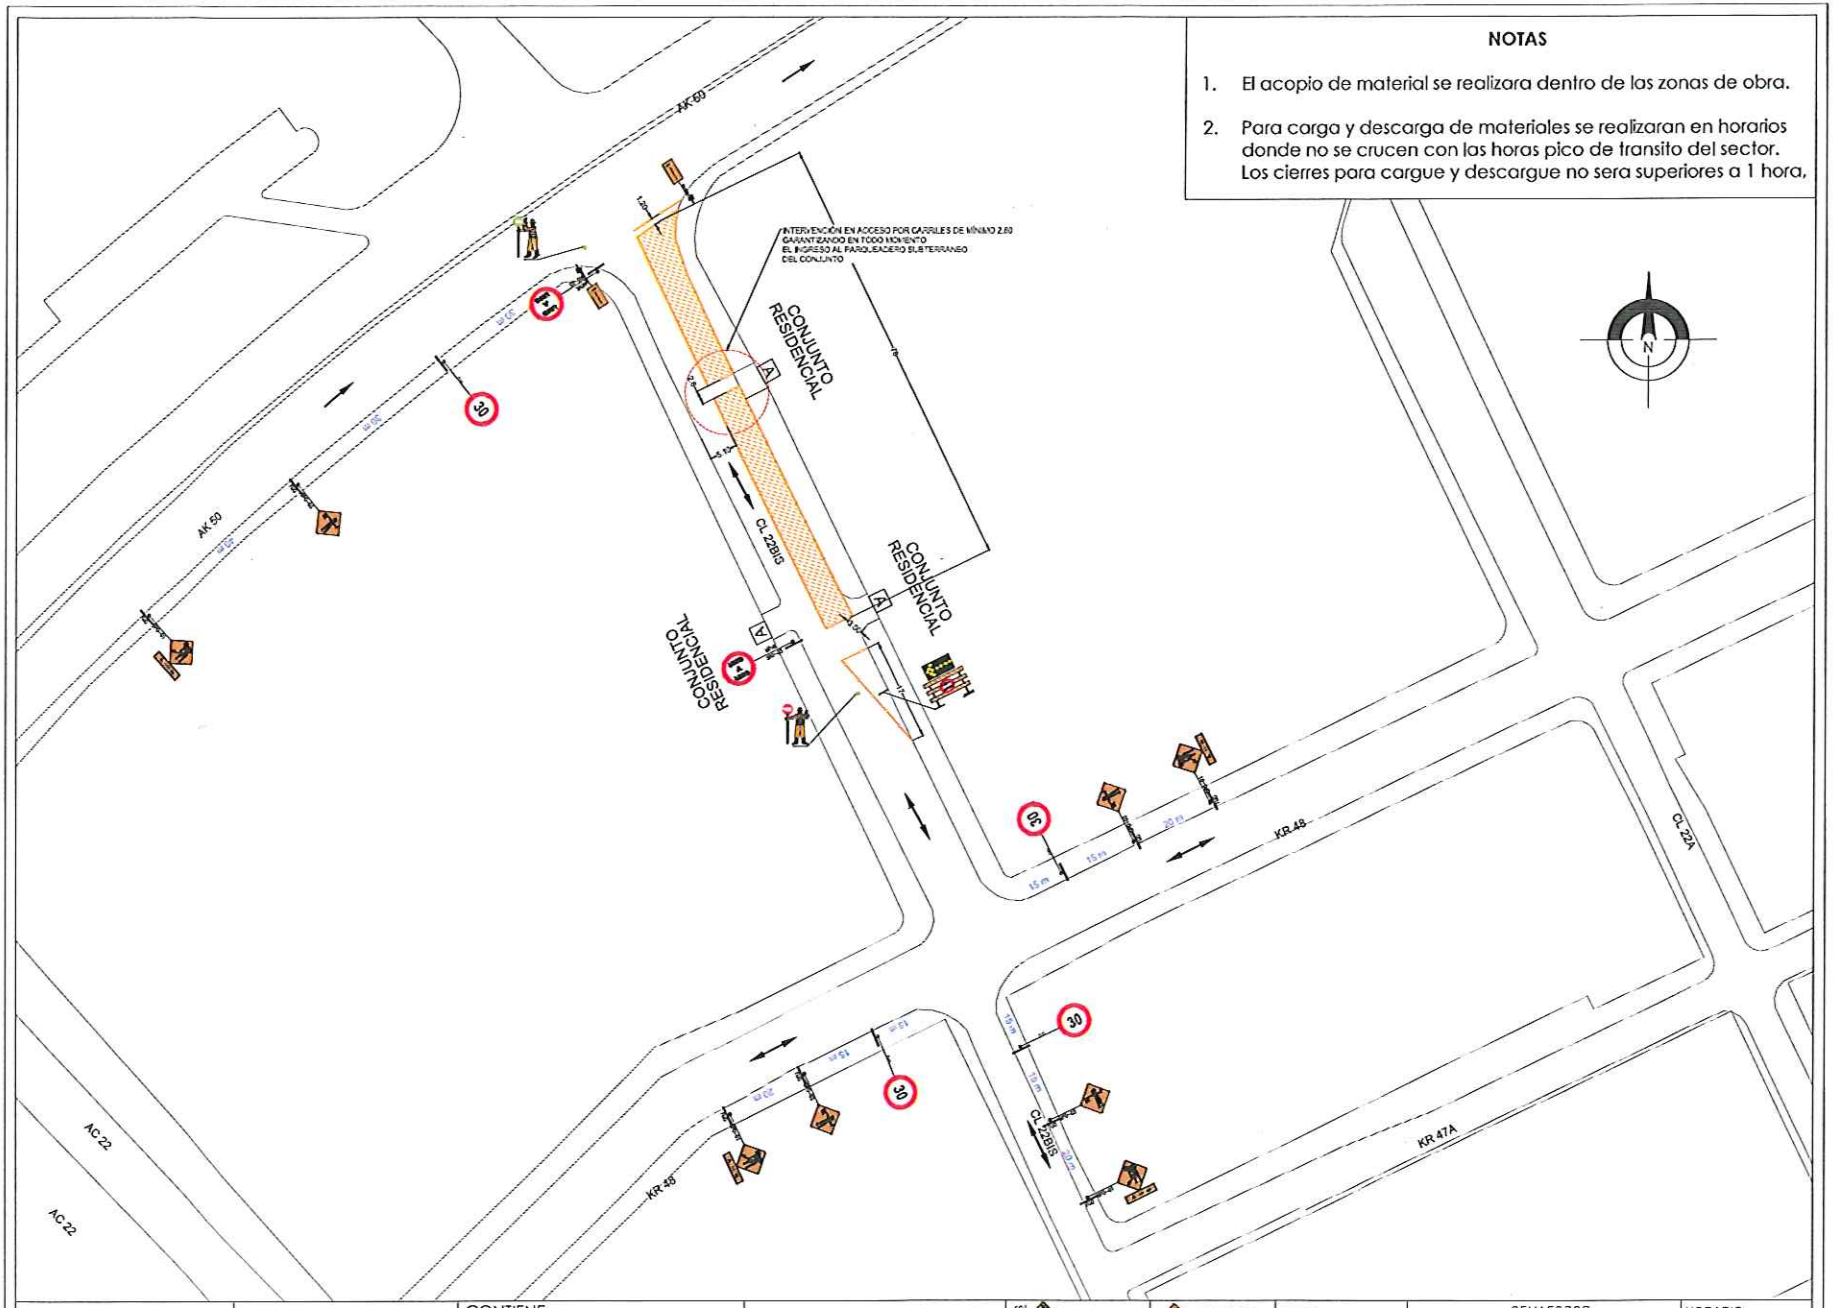
NOTAS
1. El acopio de material se realizara dentro de las zonas de obra.
2. Para carga y descarga de materiales se realizaran en horarios donde no se crucen con las horas pico de transito del sector. Los cierres para cargue y descargue no sera superiores a 1 hora,
INTERVENCIÓN EN ACCESO POR CARRILES DE MÍNIMO 2.60 GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL INGRESO AL PARQUEADERO SUBTERRANEO DEL CONJUNTO
CONJUNTO RESIDENCIAL
CONJUNTO RESIDENCIAL
CONJUNTO RESIDENCIAL
AK 60
AK 50
CL 228IS
KR 48
KR 47A
CL 22A
AC 22
AC 22
KR 46
N
CONSORCIO VÍAS TEUSAQUILLO 2023
GSG INGENIERIA VIAL
CONTIENE:
PMT PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA) POR ETAPAS NO SIMULTÁNEAS EN LA CL 228IS ENTRE KR 48 Y AK 50 (CIV 13091329)
ETAPA IV
"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO."
CONVENCIONES
SEMAFOROS
HORARIO:
24 HORAS
ESCALA : S/N
PLANO 4 DE 4

CONSORCIO TEUSAVIAL	Contrato No. 552-2024 COP (120683)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO


NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







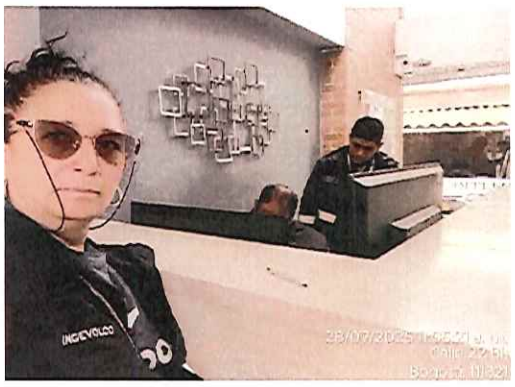

Observacion: Socialización inicio de obra
CIV 13001326 Barrio Ortezal

FORMATO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN POR SUSPENSIÓN ACCIDENTAL DE SERVICIO DE ENERGIA CON COMUNIDAD DEL BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN CIV 13000284

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)
FECHA: Julio 31 de 2025
HORA INICIO: 11:39 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:45 am
Hoja 1 de 3
Acta N°

PROYECTO:
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización suspensión temporal del servicio de energía

2. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El día 31 de julio de 2025, el equipo social del Consorcio Teusavial, realiza acercamiento al tramo (1-5) CIV 13000284 del barrio Nicolás de Federman, con el objeto de validar y corroborar con la comunidad de este tramo que, por labores inherentes a la obra y de manera accidental el día 29 de julio de 2025, se generó una ruptura en los cables de energía en el tramo descrito.

Se explica que desde el contratista con apoyo de una persona de la comunidad se generó el reporte a la empresa Codensa la situación sucedió hacia las 12:30 del medio día, la respuesta de la empresa Codensa fue rápida, teniendo en cuenta que, sobre las 2:30 p.m. el equipo técnico llegó al sitio e iniciaron actividades de reparación, donde se reestableció el servicio poco antes de las 4:00 p.m. del mismo día.

Por medio de la presente acta se hace énfasis en que las obras generan impactos, entre ellos la interrupción de servicios públicos como es este caso, ya que los cables de energía se afectaron de manera accidental. Desde el Consorcio Teusavial contratista de obra ofrece excusas por las incomodides que se han generado y se puedan generar hasta la finalización de esta obra, se recomienda mantener agua recogida en caso de alguna afectación o interrupción accidenal a la red de agua potable, en caso de presentar alguna inconformidad o solicitud por la ejecución de las obras, reiteramos y extendemos la invitación a utilizar los canales de atención dispuestos para atender sus peticiones, cabe señalar que en este tramo existe un comité de participación ciudadana quienes representan a esta comunidad y están pendientes también de trasmitir cualquier situación al contratista y generar una efectiva respuesta, se socializa los datos de teléfono y correo de atención a la comunidad. Teléfono: 3019072050 Correo: teusavialsocial@gmail.com

2. Cierre: luego de realizar la socialización se cierra el acta a conformidad de los que en ella intervinieron

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

No se generan

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
N/A	N/A	N/A

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Ing Andres Echandia.	residente	
Ing Sebastian Martinez	inspector	
David Plazas	comunidad	
Sandra I. Perla F.	Aux. Social	


FORMATO ACTA DE SOCIALIZACIÓN POR SUSPENSIÓN ACCIDENTAL DE SERVICIO DE ENERGIA CON COMUNIDAD DEL BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN CIV 13000284						ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14		**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		**VERSIÓN** 2.0		
	ELABORÓ		**RESPONSABLE**	**APROBÓ**		
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga		T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina		
CARGO	Residente Social		Residente Social	Residente Interventoría		
FIRMA	Angela M. Quiroga		Angela M. Quiroga	Luz Escobar		
ANEXOS:	**SI**	**X**	**NO**		**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**CANTIDAD:** 1

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	31 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 y 2

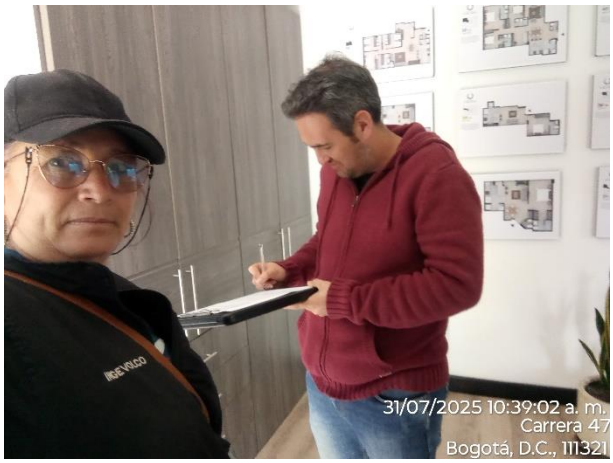



Observacion: Socialización con residente por suspensión accidental del servicio de energía.
Nicolás de Federmán tramo 1 CIV 13000284

Anexo 4
PSIS vigentes en el periodo

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Agencia Logo de Tecnología

FECHA		
01	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 36A No. 57A-08
TELÉFONO: 3203448431
PERSONA CONTACTO: HÉCTOR HERRERA
TRAMO: CIV 13000476 TRAMO 3

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volantes: canales de atención, volante de inicio de obra, levantamiento de actas de vecindad y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de los avance de la obra.

CIV 13000476
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 3

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
09	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 36A No. 57A-08
TELÉFONO:
PERSONA CONTACTO: HÉCTOR HERRERA
TRAMO: CIV 13000476 TRAMO 3

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	3
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volante de inicio de canales de atención, cierre de actas de vecindad, convocatoria reunión de finalización y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de los avance de la obra.

CIV 13000476
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 3

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Tesquillo

FECHA		
17	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 36A No. 57A-08
TELÉFONO:
PERSONA CONTACTO: HÉCTOR HERRERA
TRAMO: CIV 13000476 TRAMO 3

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volante de inicio de canales de atención, convocatoria reunión de finalización y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de los avance de la obra.

CIV 13000476
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 3

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
01	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa
DIRECCIÓN: Cr 14A No. 57-28
TELÉFONO: 305 754 2960
PERSONA CONTACTO:
TRAMO: CIV 13000826 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se instala punto satélita con volante de canales de atención, volante de inicio de actas de vecindad y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad sobre las actividades y los avances de la obra.

CIV 13000826
Barrio: Chapinero Occidental

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Unidad Local de Tránsito

FECHA		
07	07	**2025**

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CALLE 53B No. 27-31
TELÉFONO: 3102744509
PERSONA CONTACTO: FRANCISCO BETANCOUR
TRAMO: CIV 13000875 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de Convocatoria a reunión de inicio, Canales de Atención y Afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13000875
Barrio: Galerias

6. FIRMAS

Nombres y apellidos	T.S. Angela Maria Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
10	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CARRERA 35 No. 53-53
TELÉFONO: 312 348 3811
PERSONA CONTACTO: MARIA JOSE BUITRAGO
TRAMO: 13000864 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☒

5. OBSERVACIONES

Se desinstala punto satélite de información por terminación del tramo vial.

CIV 13000864
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Instituto Local de Tránsito

FECHA		
22	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CASETA CARRERA 47 CON CALLE 58
TELÉFONO: 312 476 7226
PERSONA CONTACTO: SIGIFREDO ANZOLA
TRAMO: CARRERA 47 ENTRE CALLES 58 Y 59

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información con volante de canales de atención y afiche, se verifica en buenas condiciones y se mantiene informada a la comunidad de los avances de la obra.

CIV 13000284
Barrio: Nicolás de Federmán Tramo 1

6. FIRMAS

Sigifredo Anzola	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar
Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
22	07	**2025**

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 27 No. 50-77
TELÉFONO: 3204956793
PERSONA CONTACTO: AMIR VERGEL
TRAMO: CIV 13001165 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de canales de atención y afiche, se evidencia en buenas condiciones, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13001165
Barrio: Alfonso López

6. FIRMAS

Amir Vergel.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
22	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CARRERA 19A NO. 61-67 65
TELÉFONO: 3124787494
PERSONA CONTACTO: CECILIA CARDENAS
TRAMO: CIV 13000336 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☐	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información evidenciando que se encuentra en buenas condiciones, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13000336
Barrio: San Luis

6. FIRMAS

Cecilia Cardenas
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista


FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
28	07	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

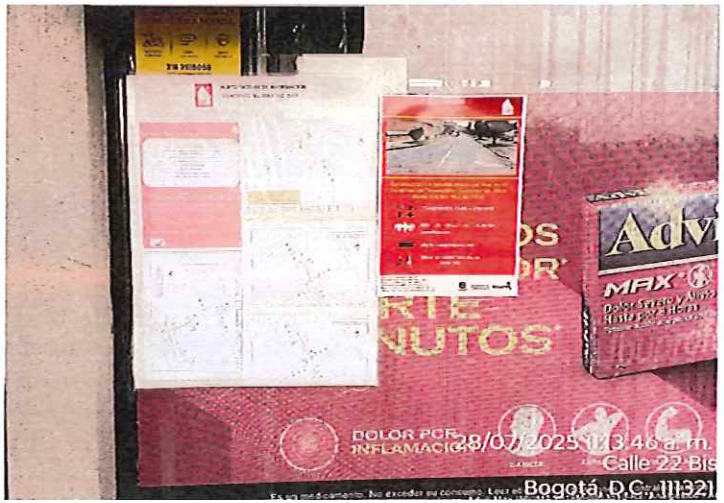

2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Droguería.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Farmacenter
DIRECCIÓN: Calle 22bis No. 48-28
TELÉFONO: 3057959527
PERSONA CONTACTO: Plinio Preciado
TRAMO: CIV 13001326 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	5
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se instala Punto Satélite de Información con volante de canales de atención, planos de PMT y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades a realizar y de avance de la obra.

CIV 13001326
Barrio: Ortezal Tramo 1

6. FIRMAS

Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

Anexo 5
Formato control entrega de piezas de divulgación de inicio de obra, volante, registro fotográfico tramo Nicolás de Federmán

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 17 LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD - VOLANTE No. 18 SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 01/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN CIV : 13000438

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Carlos Enrique Alvarez	Cr 36A No. 57A-64	3107906427	NICOLÁS DE FEDERMÁN	Carlos Enrique	2	— // —
2	Valentino Molina	Cr 36A No. 57A-15	3227676586	NICOLÁS DE FEDERMÁN	Valentino	2	— // —
3	— // —	Cr 36A No. 57A-05	— // —	NICOLÁS DE FEDERMÁN	— // —	2	Bajo puerta
4	Magda Fonseca	Cr 36A No 57-95	3107938852	NICOLÁS DE FEDERMÁN	MAGDA FONSECA	2	— // —
5				NICOLÁS DE FEDERMÁN			
6				NICOLÁS DE FEDERMÁN			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17					NOTA:		
18					4 volantes Actas	4	
19					4 volantes inicio Obra	4.	
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	8	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M Quiroga	LE Escobar



SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizará la ampliación de la intervención del tramo vial del Barrio Nicolás de Federman con CIV 13000438 (calzada occidental de la carrera 36A entre calles 57A y 57B) a través del contrato 552 de 2024 que tiene como objeto "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*", por tal motivo se solicita el retiro de los vehículos durante el tiempo de intervención; el cual será de un mes aproximadamente.

Fecha inicio: 03-07-2025

Lugar: Costado occidental carrera 36A entre calle 57A y 57B.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización inicio de obra Barrio Nicolás de Federmán.
CIV 13000438.

Anexo 6
Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de inicio, volante y registro fotográfico tramo Galerías

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: Volante Convocatoria Reunión de Inicio

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 07/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: GALERIAS CIV : 13000875

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Frank Poveda	Cll 53B Bis 27A-11-07-09	3102616304	GALERIAS		1	—11—
2	Francisco Betancour	Cll 53B Bis. 27-31	3102744507	GALERIAS		1	—11—
3	Cristian Sánchez	Cll 53B Bis. 27-23	3132840814	GALERIAS		1	—11—
4	Jose Jair Banon	Cll 53B - 27	3212477931	GALERIAS	José María	1	—11—
5	Fredy Cespedes	Cll 53B - Bis. 27-07	3177238012	GALERIAS		1	—11—
6	Gladys Niño	Cll 53B Bis. 27-10	3043261066	GALERIAS	Gladys Niño	1	—11—
7	Concepcion Poveda	Cll 53B Bis 27-24	3172637760	GALERIAS		1	—11—
8	—11—	Cll 53B Bis. 27-36	—11—	GALERIAS	—11—	1	Bajo puerta
9				GALERIAS			
10				GALERIAS			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS 8

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar



SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, que se realizará la intervención del tramo vial que comprende el (CIV 13000875, eje vial, calle 53 B entre carreras 27 y 27 A del barrio Galerías), a través del contrato 552 de 2024 que tiene como objeto "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*", por tal motivo se realizará la reunión de inicio de obra el día 08 de Julio de 2025 a las 3:00 p.m., en donde se dará a conocer las generalidades del contrato.

Fecha inicio: 08-07-2025

Lugar: Zona verde frente a la Parroquia Madre Salvador de la vía a intervenir Calle 53B con Carrera 27.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	07 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Convocatoria reunión de inicio
CIV 13000875 Galerias

Anexo 7
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante levantamiento actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Chapinero Occidental, Nicolás de Federmán

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD PRIMERA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** 01/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** CHAPINERO OCCIDENTAL **CIV :** 13000826

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Juan Camilo Quintero	Cr 14A No. 57-28	3057542960	CHAPINERO OCCIDENTAL		1	—
2				CHAPINERO OCCIDENTAL			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	1	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Quiroga	Luz Escobar



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad de la localidad del Barrio Chapinero Occidental que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizará la intervención del andén del tramo vial identificado con el CIV 13000826 (anden costado norte calle 57 entre carreras 14 y 14A), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 02 de julio de 2025, se realizarán las actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha inicio: 02-07-2025

Lugar: Área de intervención, Andén costado norte Calle 57 entre carreras 14 y 14A.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 3







Observacion: Socialización levantamiento de actas de vecindad de primera visita Barrio Chapinero Occidental. CIV 13000826.

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Tesaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 17 LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD - VOLANTE No. 18 SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 01/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN CIV : 13000438

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Carlos Enrique Alvarez	Cr 36A No. 57A-64	3107906427	NICOLÁS DE FEDERMÁN	Carlos Enrique	2	—11—
2	Valentino Molina	Cr 36A No. 57A-15	3227676586	NICOLÁS DE FEDERMÁN	Valentino	2	—11—
3	—11—	Cr 36A No. 57A-05	—11—	NICOLÁS DE FEDERMÁN	—11—	2	Bajo puerta
4	Magda Fonseca	Cr 36A No 57-95	3107938852	NICOLÁS DE FEDERMÁN	MAGDA FONSECA	2	—11—
5				NICOLÁS DE FEDERMÁN			
6				NICOLÁS DE FEDERMÁN			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17					NOTA:		
18					Volanter Actas	4	
19					Volanter Inicio Obra	4.	
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	8	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Quiroga	Luz Escobar



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad de la localidad del Barrio Nicolás de Federmán que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizará la intervención de la calzada del tramo vial identificado con el CIV 13000438 (costado occidental carrera 36A entre calles 57A y 57B), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 01 de julio de 2025, se realizarán las actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha inicio: 01-07-2025

Lugar: Área de intervención, Costado occidental de la carrera 36A entre calles 57A y 57B.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización levantamiento de actas de vecindad de primera visita Barrio Nicolás de Federmán. CIV 13000438.

Anexo 8
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante convocatoria reunión del comité ciudadano y registro fotográfico Nicolás de Federmán

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo


TIPO DE PIEZA: PIEZA INFORMATIVA DE CONVOCATORIA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE COMITÉ CIUDADANO

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 18/07/25

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN** **CIV : 13000284**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	COMUNIDAD CARRERA 47 ENTRE CALLES 58A Y 59	—11—	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	17	ENVIADO POR WHATSAPP
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	17	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar

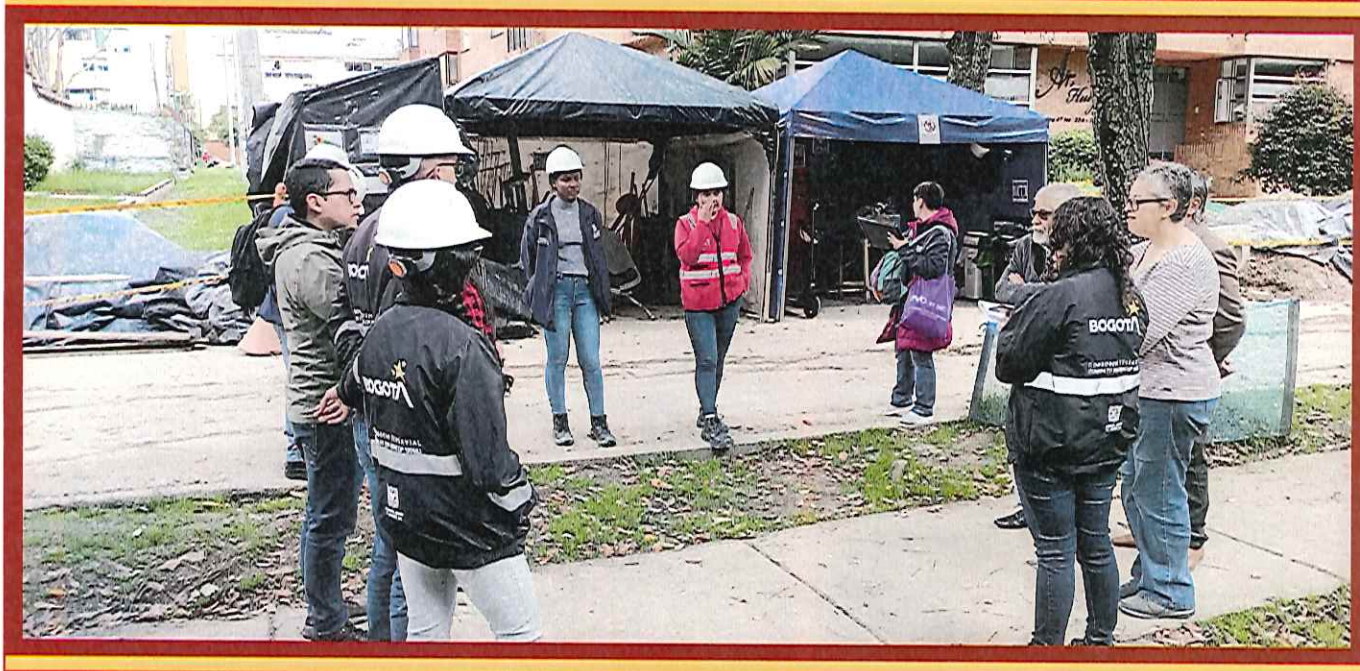

2ª REUNIÓN COMITÉ CIUDADANO

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, esta ejecutando los tramos viales del Barrio Nicolás de Federman con CIV 13000284 y CIV 13002498 (carrera 47 entre calles 58A y 59), a través del contrato 552 de 2024 que tiene como objeto "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*", por tal motivo se realizará la 2ª reunión de comité ciudadano el día 23 de julio de 2025 a las 9:00 a.m., en donde se dará a conocer los avances del contrato.

Fecha reunión: 23-07-2025

Lugar: Frente a la Esquina del parque de la carrera 47 con calle 58 A.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial


ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	18 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4

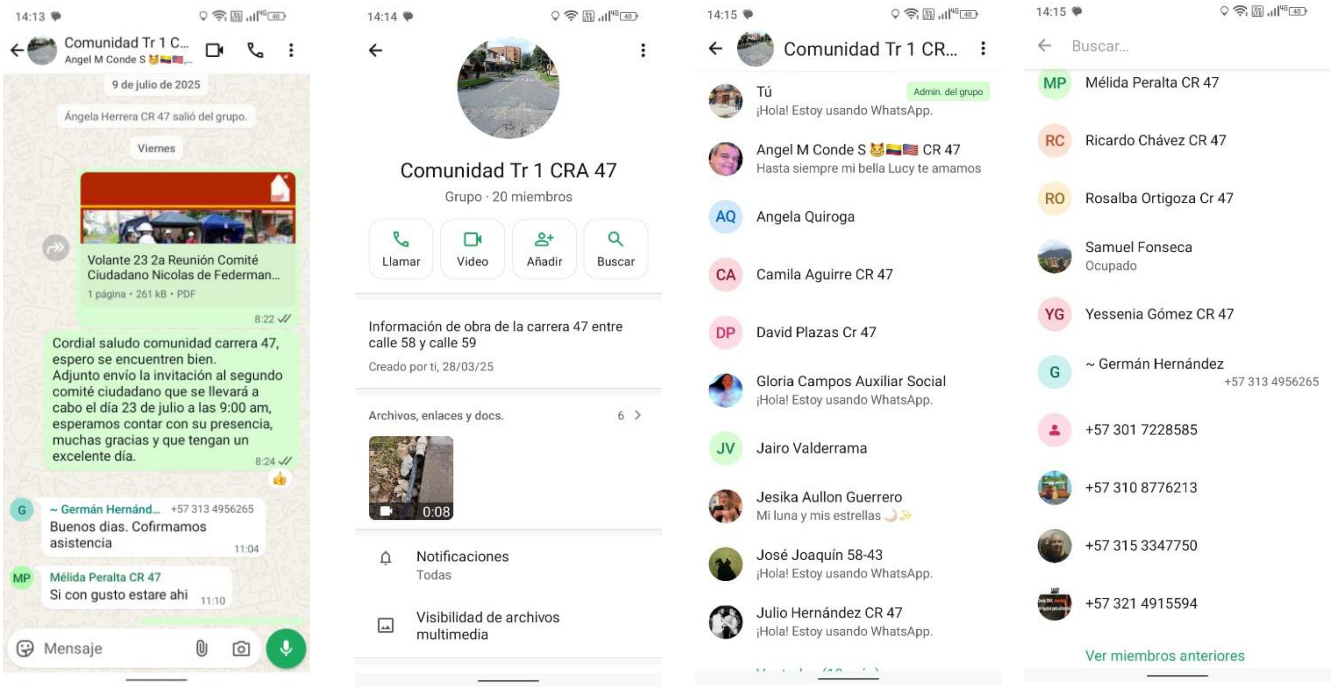

Observacion: Convocatoria por medio de WhatsApp a segunda reunión de participación ciudadana con comité ciudano Barrio Nicolás de Federmán.
CIV 13000284 Tramo 1

Anexo 9
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico Nicolás de Federmán

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Volante Cierre de Actor de Vecindad.

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 07/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN CIV : 13000864 TRAMO 2

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Elisman Benavidez	Cr 35 No. 53-78	3208853631	NICOLAS DE FEDERMAN	Elisman	2	— 11 —
2	Lilia Barreto	Calle 53A No. 35-10.	3229682304	NICOLAS DE FEDERMAN	..	1	— 11 —
3	Germán Villarreal	Calle 53 A No. 35-36	3012218615	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
4	— 11 —	Calle 53A No. 35-48	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
5	Campo Elias Heredia	Calle 53A No. 35-66	3102632583	NICOLAS DE FEDERMAN	Campo Elias Heredia	1	— 11 —
6	Luz Marina Baez	Cr 36 No. 53A-05	3108740938	NICOLAS DE FEDERMAN	Luz Marina Baez	1	— 11 —
7	Nathaly Sandoval	Cr 36 No. 53-65	3004869112	NICOLAS DE FEDERMAN	Nathaly S.	1	— 1
8	Patricia Gómez	Cr 36 No. 53-58	3142986499	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
9	Emanuel Rodriguez	Cr 36 No. 53-41	3160177008	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
10	— 11 —	Cll 53 No. 35-68	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
11	— 11 —	Calle 53A No. 35-83	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
12	Jorge Solarzano	Cll 53A No 35-51	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
13	— 11 —	Cll 53A No. 35-25	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
14	— 11 —	Cll 53A No. 35-23	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
15	— 11 —	Cr 35 No. 53-53	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
16				NICOLAS DE FEDERMAN			
17				NICOLAS DE FEDERMAN			
18				NICOLAS DE FEDERMAN			
19				NICOLAS DE FEDERMAN			
20				NICOLAS DE FEDERMAN			
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		16	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Nicolás de Federmán que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000864 (calle 53A entre carreras 35 y 36), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 07 de julio de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 07-07-2025

Lugar: Área intervenida, Calle 53A entre carreras 35 y 36.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	07 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega volante de cierre de actas de vecindad
CIV 13000864 Nicolás de Federmán Tramo 2

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO — Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Volante Cierre de Actas de Vecindad

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 09/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN CIV : 13000476 TRAMO 3

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Hector Herrera	Cr 36A No. 57A-08	3203446483	NICOLAS DE FEDERMAN		1	—
2	Marco Tulio Quemba	Cr3A No 57A-22	3157493953	NICOLAS DE FEDERMAN		3	—
3	Jairo Alfonso Pava	cr 36A No. 57-58	3102264554	NICOLAS DE FEDERMAN		1	—
4	Ana Rosa Cuervo	Ct 57B No. 35A-80	3143008993	NICOLAS DE FEDERMAN		1	—
5				NICOLAS DE FEDERMAN			
6				NICOLAS DE FEDERMAN			
7				NICOLAS DE FEDERMAN			
8				NICOLAS DE FEDERMAN			
9				NICOLAS DE FEDERMAN			
10				NICOLAS DE FEDERMAN			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	6	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Nicolás de Federmán que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000476 (carrera 36A entre calles 57A y 57B), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 07 de julio de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha inicio: 07-07-2025

Lugar: Área intervenida, Carrera 36A entre calles 57A y 57B.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega volante de cierre de actas de vecindad
CIV 13000476 Nicolás de Federmán Tramo 3

Anexo 10
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico Nicolas de Federmán tramo 2

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: PIEZA INFORMATIVA DE CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD DE SEGUNDA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** 09/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** NICOLÁS DE FEDERMAN **CIV :** 13000864

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	Clle 53A No. 35-38	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Drega de/ dsts).
2	— 11 —	cll 53A No. 35-48	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
3	— 11 —	cll 53A No. 35-25	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
4	Jorge Solorzano	cll 53A No. 35-51	3143759326	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	9	Apt 202-204 205-206 304, 305 306- Administración
5				NICOLAS DE FEDERMAN			
6				NICOLAS DE FEDERMAN			
7				NICOLAS DE FEDERMAN			
8				NICOLAS DE FEDERMAN			
9				NICOLAS DE FEDERMAN			
10				NICOLAS DE FEDERMAN			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	12	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Nicolás de Federmán que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000864 (calle 53A entre carreras 35 y 36), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 07 de julio de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 07-07-2025

Lugar: Área intervenida, Calle 53A entre carreras 35 y 36.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de volante de cierre de acta de vecindad segunda visita tramo 2

Anexo 11
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico Nicolas de Federmán tramo 2

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: PIEZA INFORMATIVA DE CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD DE TERCERA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** 11/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** NICOLÁS DE FEDERMAN **CIV :** 13000864

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	Cll 53A No. 35-48	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta.
2	— 11 —	Cll 53A No. 35-25	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta.
3	— 11 —	Cll 53A No. 35-51	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	5	Porteria
4				NICOLAS DE FEDERMAN			Sin datos. Apto. 202
5				NICOLAS DE FEDERMAN			204, 205, 206 Cadmar.
6				NICOLAS DE FEDERMAN			
7				NICOLAS DE FEDERMAN			
8				NICOLAS DE FEDERMAN			
9				NICOLAS DE FEDERMAN			
10				NICOLAS DE FEDERMAN			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		7	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio Nicolás de Federmán que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000864 (calle 53A entre carreras 35 y 36), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo el día 07 de julio de 2025, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 07-07-2025

Lugar: Área intervenida, Calle 53A entre carreras 35 y 36.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO


NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







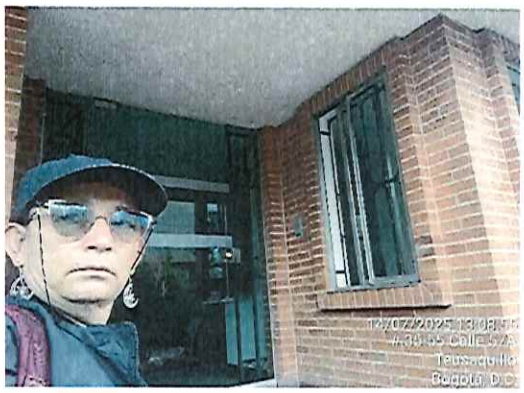

Observacion: Entrega de volante de cierre de acta de vecindad tercera visita tramo 2

Anexo 12
Formato control entrega de piezas de divulgación invitación a reunión de finalización, volante y registro fotográfico tramos 2 y 3 barrio Nicolás de Federmán

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Convocatoria Reunión de Finalización

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 09/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN CIV : 13000864 TRAMO 2

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Elisman Benavidez	Cr 35 D. 53-78	3208853631	NICOLAS DE FEDERMAN		2	— 11 —
2	Lilia Barreto	Calle 53A D. 35-10.	3229682304	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
3	Germán Villarreal	Calle 53 A D. 35-38	3017221861	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
4	— 11 —	Calle 53A D. 35-48	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
5	Campo Elías Heredia	Calle 53A D. 35-66	3102632583	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
6	Luz Marina Báez	Cr 36 D. 53A-05	3108740938	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
7	Nathaly Sandoval	Cr 36 D. 53-65	3004869111	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 1
8	Patricia Gómez	Cr 36 D. 53-58	3142986499	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
9	Emanuel Rodríguez	Cr 36 D. 53-41	3160177008	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
10	— 11 —	Cll 53 D. 35-68	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
11	— 11 —	Calle 53A D. 35-83	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
12	Jorge Solarzano	Cll 53A D. 35-51	3143759320	NICOLAS DE FEDERMAN		21	— 11 —
13	— 11 —	Cll 53A D. 35-25	— 11	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
14	— 11 —	Cll 53A D. 35-23	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
15	— 11 —	Cr 35 D. 53-53	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
16				NICOLAS DE FEDERMAN			
17				NICOLAS DE FEDERMAN			
18				NICOLAS DE FEDERMAN			
19				NICOLAS DE FEDERMAN			
20				NICOLAS DE FEDERMAN			
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS		36	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar



REUNIÓN FINALIZACIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizará la reunión de finalización y entrega del tramo vial del Barrio Nicolás de Federmán con CIV 13000864, el día 10 de Julio de 2025 a las 4:00 p.m., en donde se socializarán las actividades de rehabilitación realizadas.

Fecha: 10-07-2025
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Bahía calle 53A con carrera 36
CIV 13000864
Vía intervenida: Calle 53A entre carreras 35 y 36.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Convocatoria reunión de finalización
CIV 13000864 Nicolás de Federmán Tramo 2

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Convocatoria Reunión de (Inicio) Finalización

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 09/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN CIV : 13000476 TRAMO 3

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Hector Herrera	Cr 36A No. 57A-08	3203446827	NICOLAS DE FEDERMAN	Hector Herrera	1	— 11 —
2	Marco Tulio Quemba	Cr 3A No 57A-22	3157493953	NICOLAS DE FEDERMAN		3	— 11 —
3	Jairo Alfonso Pava	cr 36A No. 57-58	3102264554	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
4	Ana Rosa Cuervo	cl 57B No. 35A-80	3143008993	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
5	Magda Fonseca	Cr 36A No. 57-95	3107938852	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
6	— 11 —	cr 36A No. 57A-05	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
7	Valentina Molina	Cr 36A No. 57A-15	3227676586	NICOLAS DE FEDERMAN	Valentina	1	— 11 —
8	Carlos Enrique Alvarez	Cr 36A No 57A-64	3107906427	NICOLAS DE FEDERMAN	Carlos Enrique Alvarez	1	— 11 —
9				NICOLAS DE FEDERMAN			
10				NICOLAS DE FEDERMAN			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	8	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar



REUNIÓN FINALIZACIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizará la reunión de finalización y entrega del tramo vial del Barrio Nicolás de Federmán con CIV 13000476, el día 10 de Julio de 2025 a las 5:00 p.m., en donde se socializarán las actividades de rehabilitación realizadas.

Fecha: 10-07-2025
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Esquina carrera 36A con calle 57A con
CIV 13000476
Vía intervenida: Carrera 36A entre calles 57A y 57B.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO · BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega volante de convocatoria reunión de inicio
CIV 13000476 Nicolás de Federmán Tramo 3

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: PIEZA INFORMATIVA DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE FINALIZACIÓN TRAMO 2

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** 17/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** NICOLÁS DE FEDERMAN **CIV :** 13000864

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Benavides Clysman	CR 35 No. 53-78	3208853631	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
2		CL 53A No. 35-10 24		NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
3	— 11 —	CL 53A No. 35-38	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
4	— 11 —	CL 53A No. 35-48	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
5	Campo Elías	CL 53A No. 35-66	3102672583	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
6	— 11 —	CR 36 No. 53A-05	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
7	Camila Montoya	CR 36 No. 53-65	3222488766	NICOLAS DE FEDERMAN	Camila M6	1	— 11 —
8	— 11 —	CR 36 No. 53-55	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	En brazo
9	— 11 —	CR 36 No. 53-41	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	En brazo	1	— 11 —
10	Clyman Benavides	CL 53 No, 35-72	3208853631	NICOLAS DE FEDERMAN		1	— 11 —
11	— 11 —	CL 53 No. 35-68	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
12	— 11 —	CL 53A No. 35-83	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
13		CL 53A No. 35-51		NICOLAS DE FEDERMAN		11	— 11 —
14	— 11 —	CL 53A No. 35-25	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	— Bajo puerta
15	— 11 —	CL 53A No. 35-23	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	— 11 —	1	Bajo puerta
16	Amanda Zuluaga	CR 35 No. 53-53	— 11 —	NICOLAS DE FEDERMAN	Amanda Zul	1	— 11 —
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	26	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M.a Quiroga	Luz Escobar



REUNIÓN FINALIZACIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizará la reunión de finalización y entrega del tramo vial del Barrio Nicolás de Federmán con CIV 13000864, el día 18 de Julio de 2025 a las 4:00 p.m., en donde se socializarán las actividades de rehabilitación realizadas.

Fecha: 18-07-2025
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Bahía calle 53A con carrera 35
CIV 13000864
Vía intervenida: Calle 53A entre carreras 35 y 36.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ


CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	17 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4



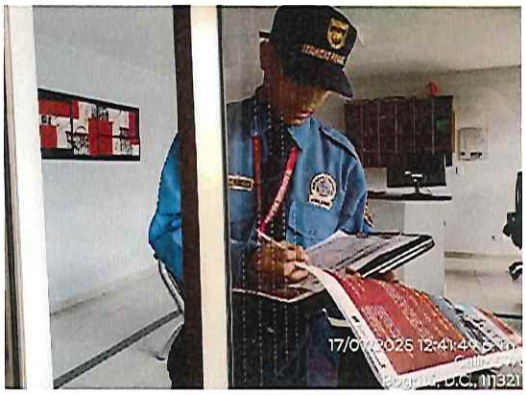





Observacion: Convocatoria reunión de finalización tramo 2

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: PIEZA INFORMATIVA DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE FINALIZACIÓN TRAMO 3

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** Julio 17/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** NICOLÁS DE FEDERMAN **CIV :** 13000476

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	[illegible]	Carrera 36A No. 57-58	3503[illegible]	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— " —
2	Hector Herrera	Carrera 36A No. 57A-08	3203446431	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— " —
3	— " —	Carrera 36A No. 57A-14/22 y Calle 57B No. 35A-81	— " —	NICOLAS DE FEDERMAN	— " —	3	Bajo puerta
4	Magda Fonseca	Carrera 36A No. 57-95	3107938852	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— " —
5	— " —	Carrera 36A No. 57A-05	— " —	NICOLAS DE FEDERMAN	— " —	1	Bajo puerta.
6	Valentina Molina.	Carrera 36A No. 57A-15	3227676586	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— " —
7	Carlos Alvarez	Carrera 36A No. 57A-64	3107906427	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— " —
8	Rosa Cuervo	Calle 57B No. 35A-80	— " —	NICOLAS DE FEDERMAN	[signature]	1	— " —
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	10	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	[signature]	[signature]



REUNIÓN FINALIZACIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizará la reunión de finalización y entrega del tramo vial del Barrio Nicolás de Federmán con CIV 13000476, el día 18 de Julio de 2025 a las 5:00 p.m., en donde se socializarán las actividades de rehabilitación realizadas.

Fecha: 18-07-2025
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Esquina carrera 36A con calle 57A
CIV 13000476
Vía intervenida: Carrera 36A entre calles 57A y 57B.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 3019072050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	17 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Convocatoria reunión de finalización tramo 3

Anexo 13
Formatos de control entrega de copias de actas de vecindad y registros fotográficos Nicolas de Federmán. Tramo 1 y 3, Galerías, Alfonso López y San Luis

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: COPIA DEACTA DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** 02/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** NICOLAS DE FEDERMAN **CIV :** 13000284

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	—11—	cr 47 No. 58A-81	—11—	NICOLAS DE FEDERMÁN	—11—	1	en buzon
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	1	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	2 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 3







Observacion: Entrega de copia de acta de vecindad.
Barrio Nicolás de Federmán tramo 1, CIV 13000284

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Entrega Copias de Actor de Vecindad

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 07/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: GALERIAS CIV : 13000875

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Frank Poveda	Cll 53B No 27A-11-07-09	3102616364	GALERIAS		1	— // —
2	Francisco Betancur	Cll 53B No. 27-31	3102744507	GALERIAS		1	— // —
3	Cristian Sánchez	Cll 53B No. 27-23	3132840814	GALERIAS		1	— // —
4	Jose Jair Bonon	Cll 53B - 27	3212477931	GALERIAS	Jose Maria	1	— // —
5	Fredy Cespedes	Cll 53B - No. 27-07	3177238012	GALERIAS		1	— // —
6	Gladys Niño	Cll 53B No. 27-10	3043261066	GALERIAS	Gladys Niño	0	— // —
7	Concepcion Poveda	Cll 53B No 27-24	3172637760	GALERIAS		0	— // —
8	— // —	Cll 53B No. 27-36	— // —	GALERIAS	— // —	0	— // —
9				GALERIAS			
10				GALERIAS			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS 5

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Quiroga	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	07 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de copias de actas de vecindad
CIV 13000875 Galerias

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Copias de Actas de Vecindad.

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 09/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: NICOLÁS DE FEDERMAN CIV : 13000476 TRAMO 3

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Hector Herrera	Cr 36A No. 57A-08	3203446821	NICOLAS DE FEDERMAN	Hector Herrera	1	
2	Marco Tulio Quembia	Cr 3A No 57A-22	3157493953	NICOLAS DE FEDERMAN		3	
3	Jairo Alfonso Pava	cr 36A No. 57-58	3102264554	NICOLAS DE FEDERMAN	Jairo Pava	1	
4	Ana Rosa Cuervo	Ct 57B No. 35A-80	3143008993	NICOLAS DE FEDERMAN	Ana Rosa Cuervo	1	
5				NICOLAS DE FEDERMAN			
6				NICOLAS DE FEDERMAN			
7				NICOLAS DE FEDERMAN			
8				NICOLAS DE FEDERMAN			
9				NICOLAS DE FEDERMAN			
10				NICOLAS DE FEDERMAN			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS 5

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela María Quiroga	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 3







Observacion: Entrega volante de copias de actas de vecindad
CIV 13000476 Nicolás de Federmán Tramo 3

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** FECHA 16/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: ALFONSO LOPEZ** CIV: 1300.1165

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Paola Bachiller	CR 27 No. 50-07	3183741505	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
2	— " —	CR 27 No. 50-07 APTO 201	— " —	ALFONSO LOPEZ	— " —	1	Bajo puerta
3	— " —	CR 27 No. 50-07 APTO 301	— " —	ALFONSO LOPEZ	— " —	1	Bajo puerta
4	Juan Chaparro	CR 27 No. 50-19	3142594984	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
5	Juan Chaparro	CR 27 No. 50-19 APTO 201	3142594984	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
6	Juan Chaparro	CR 27 No. 50-19 APTO 301	3142594984	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
7	Andres Rozo	CR 27 No. 50-27	3143125870	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
8	— " —	CR 27 No. 50-37 APTO 101	— " —	ALFONSO LOPEZ	— " —	1	Bajo puerta
9	David Barrios	CR 27 No. 50-37 APTO 201	3148447683	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
10	Mauricio Barros	CR 27 No. 50-43	3178554872	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
11	— " —	CR 27 No. 50-57/59	— " —	ALFONSO LOPEZ	— " —	1	Bajo Puerta
12	— " —	CR 27 No 50-57 APTO 304	— " —	ALFONSO LOPEZ	— " —	1	Bajo puerta
13	Daniela Alagura	CR 27 No. 50-61	3167586221	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
14	Rosa Garcia	CR 27 No. 50-67	3143979883	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
15	Amin Velgel	CR 27 No. 50-77	3204958793	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
16	Gloria Ospina	CL 51 No. 27-07	— " —	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
17	Cristian Diaz	CR 27 No. 50-08	— " —	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
18	Anadid Cancino	CR 27 No. 50-22	3229554210	ALFONSO LOPEZ		1	— " —
19	— " —	CR 27 No. 50-30/36	— " —	ALFONSO LOPEZ	— " —	1	Bajo puerta
20	— " —	CR 27 No. 50-42 FACHADA ZONAS COMUNES	— " —	ALFONSO LOPEZ	— " —	1	En Buzón
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	20	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	LE Escobar

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 16/07/2025

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: NICOLAS DE FEDERMAN** **CIV:** 13001165

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	CR 27 No. 50-42 APTO 201	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Buzón
2	— 11 —	CR 27 No. 50-42 APTO 202	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Buzón
3	— 11 —	CR 27 No. 50-42 APTO 302	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Buzón
4	Esneider León	CR 27 No. 50-52	3202909672	ALFONSO LOPEZ	[illegible]	1	— 11 —
5	— 11 —	CR 27 No. 50-58	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	en Buzón
6	— 11 —	CR 27 No. 50-68	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	Buzón puerta
7	Edwilio Urdaneta	CR 27 No. 50-78	3134191450	ALFONSO LOPEZ	[illegible]	1	— 11 —
8	— 11 —	CR 27 No. 50-84	— 11 —	ALFONSO LOPEZ	— 11 —	1	No da información
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	8	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	[signature]	[signature]

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de volante de copias de actas de vecindad CIV 13001165 Alfonso López

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Copias de actas de Vecindad

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 24/07/25

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: San Luis. CIV: 13000336

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1		Cr 20 No. 61-44		San Luis		1	Bajo puerta
2	Andrea del Pilar Vargas	Dg 61B No. 19A-27	3145840594	San Luis	Atiende desde el 2do piso	1	—11—
3	Daniel Mora	Dg 61B No. 19A-13	3138387913	San Luis	Daniel Mora G.	1	—11—
4	Cecilia Cárdenas	cr 19A No. 61-67/65	3124787494	San Luis	Cecilia Cárdenas	1	—11—
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS 4

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga.	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	24 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de copias de actas de vecindad.
CIV 13000336 barrio San Luis

Anexo 14
PQRSD No. 5

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 2	

FECHA			**SEGUIMIENTO No**	**CONTRATO CIN INTERVENTORÍA N°: 577 de 2024**	**CONTRATO 552-2024 COP (120683)**	**INICIO** **SEGUIMIENTO** **CIERRE**
DD	**MM**	**AA**				
2	7	2025				

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

DESCRIPCIÓN:
El día 26 de junio el señor Jhon Alexander Blandon, residente del apartamento 208 del predio ubicado en la Carrera 47 No. 58-40, durante el proceso de cierre de acta de vecindad, manifiesta presencia de afectación en el muro del costado sur de la alcoba en parte inferior.

PQRS No: 5	FECHA RADICACIÓN PQRS: 02 de julio de 2025 FECHA CIERRE PQRS: 02 de julio /2025 FECHA CIERRE COMPROMISO: No aplica	SEGUIMIENTO A PQRS 5	SEGUIMIENTO A ACTA 5

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
T.S. Ángela María Quiroga Galvis	52.753.727	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	
Aux. Social Sandra I. Perilla	52.104.995	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	
Ing. Sebastian Martínez	1072421390	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	
Jhon Alexander Blandon	1.015.397.916	C.C.	CIUDADANO	Jhon Alexander Blandon

OTRO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTO A LA ACTIVIDAD (En Caso de requerirse)



2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del propietario y/o Ciudadano:	Sr. Jhon Alexander Blandon
Dirección del inmueble y/o lugar de la PQRS:	Carrera 47 No. 58-40 apartamento 208
Correo electrónico:	johnalexbc@gmail.com
Teléfono fijo/ movil:	3107713366
Correo electrónico:	//
Nombre del propietario y/o Ciudadano :	//
Nombre del propietario y/o Ciudadano :	//
Nombre del propietario y/o Ciudadano :	//

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento No. 1 Junio 26 de 2025, el señor Jhon Alexander Blandon, residente del apartamento 208 del predio ubicado en la Carrera 47 No. 58-40, durante el proceso de cierre de acta de vecindad, manifiesta presencia de afectación en el muro del costado sur de la alcoba en parte inferior.

Se realiza visita al predio con el acompañamiento del ingeniero Sebastian Martínez, quien manifiesta que los daños mencionados por el propietario, en el muro del costado sur de la alcoba muestran fallas debidas a humedad, mas no grietas o fisuras generadas por la construcción o a los equipos y maquinaria utilizada por el Consorcio Teusavial. Se informa que en los diseños aprobados, se realizó una capa de excavación de 65cm , los cuales son mínimos y poco viable que pueda afectar una propiedad vecina a la intervención. Por tal motivo, el Consorcio Teusavial no se hace responsable por la afectación, aclarando que este tipo de afectación (levantamiento de pintura) se genera por humedad, mas no fisuras estructurales en el muros, columnas o vigas.

Seguimiento No. 2 Julio 02 de 2025, El Consorcio Teusavial realiza acercamiento al predio y ante la solicitud realizada por el propietario, se realiza el arreglo de la afectación a conformidad del peticionario y de esta manera se da cierre al acta de vecindad de inicio.

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 2	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO AL COMPROMISO**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de mayo de 2025.

ELABORÓ:

Andres Echandia
Nombre Ing. Andrés Echandía

Firma
Residente Técnico – Contratista

REVISÓ:

Nombre

Firma
Residente Técnico – Interventoría

ACOMPAÑÓ:

Luz Escobar
Nombre Luz Escobar Ospina

Luz Escobar
Firma
Residente Social – Interventoría

Angela Quiroga
Nombre Angela Maria Quiroga G.

Firma
Residente Social – Contratista

John Alexander Blandón C.
Nombre

c.c John Alexander Blandón C.
Firma
Propietario y/o Ciudadano(a)

IMPORTANTE: SI LA PRESENTE ACTA SE GENERÓ COMO COMPROMISO PARA CIERRE DE UNA PQRS, ESTA SE DEBE ANEXAR A LA RESPUESTA QUE SE VA A DAR AL PETICIONARIO



Foto No 1

Descripción: Afectación manifestada por propietario



Foto No 2

Descripción: Verificación afectación por parte del área técnica



Foto No 3

Descripción: Reparación de la afectación



Foto No 4

Descripción: Cierre de acta de vecindad



Foto No 3

Descripción: Cierre PQRSD

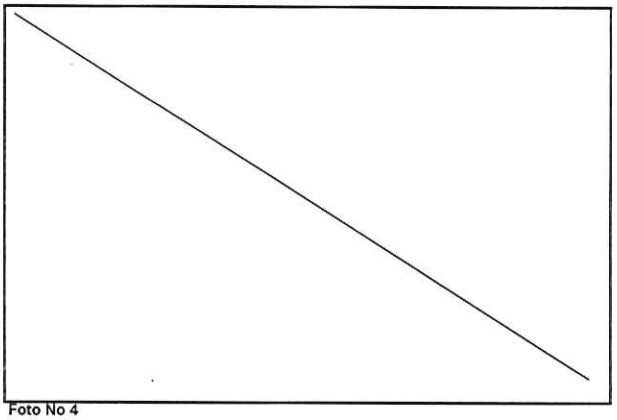


Foto No 4

Descripción:

Anexo 15
Acta de reunión de participación ciudadana comité ciudadano tramo 1 Nicolás de Federmán

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO NICOLÁS DE FEDERMAN TRAMO 1 - 5 CIV 13000284			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)		**HORA INICIO:**	9:10 a. m.	**Hoja** __1__ de __3___
FECHA:	23 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 9.56 a.m.		**Acta N°** **2**

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Intervención parte técnica del contratista
3. Intervención de la comunidad
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo, siendo el día 23 de julio de 2025 a las 9:10 a.m. la residente social del contratista Consorcio Teusavial, saluda a los miembros del comité ciudadano del barrio Nicolás de Federman Tramo 1 - 5 CIV 13000284 ubicado en la carrera 47 entre calles 58 y 59, y procede a preguntar si hay autorización para grabar la reunión, a lo cual de manera unánime, refieren estar de acuerdo.

Se da inicio a la reunión No. 2 de comité de participación ciudadano, se manifiesta que se va a dar a conocer el avance de la obra y se procede a presentar a los profesionales del área de infraestructura del FDLT, el ingeniero Carlos Durán y la Trabajadora Social Diana Silva; por parte de interventoría, el ingeniero Fredy Perdomo, residente técnico, la ingeniera Brenda Castillo, apoyo técnico y la residente social Luz Escobar. De parte del contratista se presenta al ingeniero Sebastián Martínez, la residente SST Tatiana Valdeleón, del área social la persona de apoyo Sandra Perilla y la residente social Angela Quiroga. Se explica a la comunidad que se va a dar un resumen de las actividades realizadas en el tramo y al finalizar se resolverán las inquietudes.

2. Toma la palabra el ingeniero Carlos Durán por parte del FDLT, quien refiere que este contrato fue suscrito en el mes de diciembre de 2024, su acta de inicio se firmó el 22 de enero del presente año refiere que inicialmente se realizó una etapa de diagnóstico y estudios y diseños.

La etapa diagnóstico, estudios y diseño se adelantó por parte del contratista de obra, el cual finalizó en el mes de marzo de 2025, por eso hasta el mes de abril se realizan las socializaciones y el inicio de actividades de obra en este sector.

En cuanto al avance de la obra se expone que el tramo 1 CIV 13000343, se encuentra finalizado, lo cual demuestro cumplimiento en su programación.

2. Toma la palabra el ingeniero Sebastián Martínez de parte del área técnica del contratista:
Explica que actualmente se están desarrollando actividades de instalación de red pluvial. Esta red pluvial viene más o menos hasta la mitad del segmento del tramo en un diámetro de 24 pulgadas, se adelantan tareas de protección de ductos y cruces de redes secas de telecomunicaciones como lo es de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB en el costado norte.
Se han iniciado actividades de llenado y la conformación de la estructura vial en este segmento, actualmente se tiene instalada la tubería de aguas lluvias.

El ingeniero expone a los asistentes que, hay presencia de un cruce de agua potable de 3 pulgadas, el cual también se le tiene que hacer cárcamo de protección porque viene entre la estructura del pavimento estipulada para el diseño, por lo cual se le hace el cárcamo. Se continua con actividad de cajeo o la excavación para la conformación estructural de la vía.

Continua el ingeniero Sebastián Martínez del Consorcio Teusavial indicando que, la red sanitaria está completamente terminada, se está instalando los pozos de conexión de aguas lluvias con el fin de poder conectar los sumideros existentes y dos más que se implementarán para evitar el encharcamiento preexistente en el costado oriental de la vía.

En cuanto al avance de la obra en este segmento vial se lleva un 12.5%, frente a un programado de 13%, se hace énfasis en que algunas actividades se realizan de manera manual, lo cual complejiza las operaciones, se explica también que en este segmento vial se realizará construcción de barrenos con el fin de mejorar la capacidad portante del suelo, y así mismo mejorar la estructura de la vía.

Se expone que desde el contratista con verificación y acompañamiento de la interventoría, el profesional forestal presentó un derecho de petición a la Secretaría Distrital de Ambiente, para hacerle seguimiento a las raíces de los arboles, ya que es necesario para evitar afectaciones a la vía.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

3. Preguntas de los asistentes:

Toma la palabra la señora Mélida Peralta por parte del comité quien pregunta si el tema de los árboles se ha debido tener en cuenta antes del inicio del contrato en su etapa de estudios previos.

Respuesta del ingeniero Carlos Durán del FDLT: explica que el manejo que se está dando obedece a un tema preventivo, ya que dentro objeto contractual del proyecto no tiene contemplada la tala de arboles, solo se notifica a la autoridad ambiental como medida informativa en caso de cualquier evento a futuro con el tema de los arboles dejando en claro que la obra no tuvo intervención en los individuos arbóreos presentes en este segmento vial, el objetivo con el derecho de petición es que la Secretaria de Ambiente realice seguimiento a los árboles en este sector, y que lo realice mediante visita de algún funcionario.

Continua el ingeniero Carlos Durán explicando que es importante tener en cuenta que, los arboles son susceptibles a estrés, el cual puede ser ocasionado por ruido, aguas del nivel freático entre otras variables, por ello se hace la notificación a la entidad ambiental, ya que desde el contratista se busca mitigar los impactos hacia las especies arbóreas, se aclara que no se tiene previsto realizar dentro de esta obra ninguna intervención a nivel de los arboles, en cuanto a cualquier procedimiento en los mismo deberá ser con autorización y bajo concepto de la Secretaria Distrital de ambiente.

2. El señor Germán Hernández, pregunta en los espacios del andén que da acceso al paso de los vehículos a las casas del costado occidental, hicieron una especie de empate desde el borde de la vía con lo que quedó de andén y hemos visto que se ha fisurado, refiere que sería conveniente realizar un arreglo

Respuesta del ingeniero Sebastián Martínez del contratista: explica que en la casa con nomenclatura 58 - 69. los propietarios, en el momento reciente de los arreglos en las rampas a dos días de fundido el arreglo, preguntaron que si podrían ingresar sus vehículos, a lo que se les indicó que no era el tiempo para ingresar el vehículo porque no estaba dando su resistencia. Sin embargo ingresaron los vehículos y por eso se fisuró esta rampa.

En este caso se acordó con la interventoría volver a realizar el arreglo en la parte de la rampa donde se generaron las fisuras, se hace especial énfasis para las futuras intervenciones en las rampas de acceso a los garajes, que tengan en cuenta los tiempos de fraguado del concreto para evitar nuevas afectaciones, esto aplica para el resto de rampas en este segmento vial, se socializa a los integrantes del comité ciudadano presentes en este espacio y solicita replicar la información al resto de vecinos.

3. La señora Mélida Peralta pregunta manifiesta que, hizo un comentario en el grupo del comité ciudadano, que había una fisura en el empate de un tubo, entonces me dijeron que no había problema porque había sido en la parte exterior y que no había sido afectado el resto del tubo. pregunta ¿si esto si quedó bien pegado o si se puede afectar prontamente?

Respuesta del ingeniero Sebastián Martínez del contratista: explica que la tubería que se usa ahora por norma se llama Novafort, es una tecnología nueva que es corrugada. Esta tubería corrugada tiene tres capas que la conforman. La exterior, tiene una capa corrugada que tiene como unas estrías. La intermedia que es una lámina normal de conformación recta y la interna es una lisa para evitar la conformación y la rugosidad del material que se va transportando entre ellos, sea agua lluvia o agua sanitaria con sedimentos.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO NICOLÁS DE FEDERMAN TRAMO 1 - 5 CIV 13000284			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	
Contrato No. CONVENIO IDU-CCP (120683)	**HORA INICIO:** 9:10 a. m.		**Hoja** __3__ de __3___
FECHA: 23 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 9.56 a.m.		**Acta N°** **2**

¿Qué pasa? Externamente, efectivamente, lo evidenció la señora Mélida, al momento de descargar el tubo se fracturó, se rompió una de las estrías de la campana pero internamente no tenía ningún inconveniente. Por lo cual se tomó efectivamente la decisión de que no era necesario cambiar el tubo, porque técnicamente no generaba ninguna afectación en la estabilidad y en su comportamiento hidráulico en la red.

4. El señor Julio Hernández pregunta:yo vi que desmontaron la alcantarilla que habían hecho y cortaron un segmento de tubo y parece que lo colocaron donde se presentó la fisura. ¿No sé si ese arreglo de ayer si corresponde a la misma inquietud que presentó la doctora Amelia o es otro?

Respuesta del ingeniero Sebastián Martínez del contratista: inicialmente en la esquina de la carrera 47 con calle 58A donde se hizo el pozo inicial estaban ubicados los sumideros que tenían existentes. La norma del acueducto dice que los sumideros deben ir conectados en flujo y que deben llegar a pozo. Por ese mismo sentido se tuvo que correr el pozo más hacia el costado sur para dos cosas.
Eso con el fin de evitar el tener que diseñar un sumidero adicional y que no cumpliera con lo que indica la norma. Entonces por ese sentido se corrió más el pozo para poder conectar en sentido del flujo y no que tuviéramos contradicciones con el acueducto. Pero no es el mismo punto que la señora nos decía de la fisura.

5. El señor José Gómez, manifiesta que el contratista avanza de manera correcta en la obra, indica que siempre hay personal en la obra realizando sus labores, lo cual es positivo para la comunidad ya que se ve el avance de la obra.

6. La señora Mélida Peralta pregunta ¿las tuberías que salen de las casas de desechos domiciliarias, eso lo abrieron y luego lo taparon otra vez, la tubería de aguas negras, están terminadas?

Respuesta del ingeniero Sebastián Martínez del contratista: explica que se renovó toda la red principal, que es a la que se conectan internamente, desde la caja de inspección hacia la red, ósea el hacia el tubo grande. indica que la domiciliaria de cada caja de inspección se renovó.

7. Los integrantes del comité preguntan por el tiempo restante de la obra.

Respuesta del ingeniero Sebastián Martínez del contratista: indica que aproximadamente faltarían dos meses por terminar la obra, si el clima sigue soleado y no hay impactos por las lluvias.


5. Cierre
La residente social Angela Quiroga da el agradecimiento a los miembros de la comunidad y solicita que sean multiplicadores de la información suministrada, indica que sigan manteniendo comunicación con el contratista a través de los medios dispuesto para la atención a la comunidad. Una vez atendidas las inquietudes se da por terminada la reunión.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Utilizar los medios de atención a la comunidad	Contratista	Abierta

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia.		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	X	NO		TIPO DE ANEXO: Reg. Fotográfico	CANTIDAD: 1

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA	JULIO 23 DE 2025	TEMA	SEGUNDA REUNIÓN COMITÉ CIUDADANO
LUGAR	CARRERA 47 CON CALLE 58A ESQUINA PARQUE	BARRIO	NICOLÁS DE FEDERMAN
UPZ	LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	19169383	Jose Gomez.		COMUNIDAD	M				3152362395	cra 47 #58-43	NICOLAS DE FEDERMAN	arq.josejota@yahoo.com	
2	CC	52086787	Cenaida Aguirre		Comunidad	F				3107571623	Kra 47#58A-89	NICOLAS DE FEDERMAN	comite.ciudadano	
3	CC	19148849	V. Julio Hernandez		comunidad	M				3112547180	cra 47#58A84	Federman	victorjulio.h12@gmail	
4	CC		Jerman Fernandez		Comunidad	M				3134956265	Kra 47 58-73	Federman	germanfg47@gmail	
5	CC	1022421350	Sebastian Martinez		Teusaquil	H				3204748863	—	—	—	
6	CC	1014240840	Tatiana Valdeón M		Teusaquil	M				3207367585	Cr 16 #160-23	Cigüeñas	sstaubual@gmail.com	
7	CC	52889629	Leo Escobar O.		InterTeusa	F				3001907205	C11 39A#29-21	Soledad	social.interteusaquillo jgc@gmail.com	
8	CC	41571947	Melida Perdomo		COMUNIDAD					3102383183	Cra47#58A-97	Nicolás	melidperdomo@hotmail	
9	CC	79 [illegible]	Carlos Ortiz		FDLT				V	3147214287	—	—	—	
10	CC	1124865477	Brenda Castillo		Interventoría	F				3226189442	Cra77 #78-05	Nicolas	—	
11	CC	52104995	Sandra I. Perilla		Teusaquil	M	HT	N	N.	3019072050	C11 39A No 29-21	Soledad	teusaquil social @gmail.com	
12	CC	79498674	FREDY PEDROMO		TEUSAQUEN					3019072050	C11 39A #29-21	Soledad	coordinacionCAIACTEF teusaquillo@gmail.com	
13	CC	1032399624	Diana Silva		FDLT.	F	—	—	—	3144212388	Teusaq.	N.F.	—	
14	CC	52753727	Angela Arroyo		Teusaquil	F				3144283866	Punto PAC	Soledad.	teusaquil social@gmail.com	
15	CC													

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Leo Escobar
Interventoría.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	Contrato No. 552-2024 COP (120683)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	23 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Segunda reunión de participación ciudadana

Anexo 16
Registro de asistencia y fotográfico de capacitación No. 6

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA	JULIO 23 DE 2025	TEMA	CAPACITACIÓN No. 6 CON TRABAJADORES DE OBRA TEMA: Comunicación Asertiva

LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	NICOLAS DE FEDERMAN GALERIAS - ALFONSO LÓPEZ	UPZ	La Esmeralda Galerías	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1073676976	Oscar Galzon Martinez	19	EPE					3073896578	Luis Carlos Galan	Luis Carlos Galan	obgalzon423@hotmail.com	
2	CC	1118843305	Oscar de Jesus	43						3044523234	Trenve 127#bsur	duedes	delimocontreras@gmail.com	
3	CC	1100946116	Kevin Cardozo Cuervo	18	BOG					3248484444				
4	CC	5382962	Jose Ricardo	30	EP									Jose M.
5	CC	1012360448	Jonathan Castaño P.	35	Teusavial					3157747564	Calle 57A #97B 55 sur	Bosa	Hotdiz@Hotmail.com	
6	CC	1033648521	JHOON ROMIREZ SANCHEZ	19	TEUSAVIAL					3169768289			sebastianosanchez-4760@gmail.com	
7	CC	70947/9	Humberto Chirinos	39	TEUSAVIAL					3225837773		Alfonzo Lopez		
8	CC	1052418471	Honotan calcna	36	EPE					3141360164		Olidomo		
9	CC	1023423141	Miguel Roa	32	EPI					3127748762		liberradores		
10	CC	5300663	Ronal Saldeo	37	EPI					3208296190		Villanueva	Saldeo Ronal 52@	
11	CC	1240640	Reinaldo Salas	32	Teusavial					3026069883		Paloma Alto	Salus Reinaldo 276@	
12	CC	52104995	Sandra I. Perilla		Teusavial					3132258659	cll 39A bis 29-21	Soledad		
13	CC	52971127	Sandra liliana vaca r.	43	Teusavial					3226158050			ciudad bolivar	
14	CC	79189712	FREDY HERNANDEZ	44	TEUSAV					3125401636	cra 22 #67-57 sur	San Fran		
15	CC		Victor Alberto Roje	50	EP ing-					3123469234	- - -	Bosa		

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Jair Escobar
Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	JULIO 23 DE 2025	TEMA	CAPACITACIÓN No. 6 CON TRABAJADORES DE OBRA TEMA: Comunicación Asertiva.

LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	NICOLAS DE FEDERMAN GALERIAS ALFONSO LOPEZ	UPZ	LA ESMERALDA GALERIAS	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	40552960	LUIS RIVERA		TEUZ					3224041014	CRA 72 # 31 BIS	CARACOLI		
2	CC	80 008614	RUVEIN RUBIO		TEUZ					3115748539		SIERRA M.		
3	CC	79896392	Edgar Castro		Teusa					3228271042		Molinos		
4	CC	5400718	Idalis Torrealba	21	TEUSA					3141016394		Santa Viviana		
5	CC	1233688505	Andres DAZA		TEUSA					3178742744		SOACHA		Andres DAZA
6	CC	1000000755	Lener Estiven Rodriguez	24	Teusaval					3226490166	Carrera 4A # 32-35	Perseverancia		
7	CC	1010200320	Julian Trujillo		Teusaval					3102231597		—		Julian Trujillo
8	CC	1014240890	Tatiana Valdebeñ	24	Teusaval					3209367525				
9	CC	1024592489	Andres Villegas							3102901477	Cra 37 # 42-45			Andres Villegas
10	CC	1006203859	Daniel Edwin sanchez							3207378859		Chapinero		Daniel
11	CC	1072455077	Andres Serna		teusa					3017736269	Calle 55 sur # 102-51	Usme		
12	CC	79955833	Jenis Caballero		teusaval					3158395634		Bosca		
13	CC	80265284	Humberto Vargas		teusaviel					3118021462		Operador		
14	CC	1775159	Alexis Pesusa		teusavial					3146690111		BOAL		
15	CC	1233490149	edwin stiven malambo		teusavial					3115492002			stivenmalambo,a@gmail.com	edwin malambo

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Luz Escobar
Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	23 de julio de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Capacitación No. 6 trabajadores de obra, frentes de trabajo Nicolás de Federmán, Galerías, Alfonso López
