
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Cant	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MANTENIMIENTO PLANETARIO DISTRITAL**		**148 días**	**lun 4/08/25**	**mié 25/02/26**	
2		**MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES**		**148 días**	**lun 4/08/25**	**mié 25/02/26**	
3		SEDE: PLANETARIO DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 1 SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN Capacidad: 77,75 M3 Material: CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo: Almacenamiento Agua Potable	1,00	1 día	lun 4/08/25	lun 4/08/25	
4		SEDE: PLANETARIO DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 2 SERVICIO 2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1) Capacidad: 77,75 M3 Material: CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo:	1,00	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	
5		Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros	94,08	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26	4CC-3 días
6		**PRELIMINARES**		**6 días**	**mié 1/10/25**	**mié 8/10/25**	
7		Localizacion y replanteo	144,35	3 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25	
8		Desmonte y retiro adoquin	2,00	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	7
9		Demolicion anden concreto e=0.10 incluye cargue y retiro	6,00	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	8CC
10		RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con Vale)	3,00	1 día	mié 8/10/25	mié 8/10/25	8;9;30
11		**OBRAS CIVILES**		**5 días**	**jue 9/10/25**	**mié 15/10/25**	
12		Adoquin arcilla español e= 6 cm sobre arena - Suministro e Instalación	2,00	2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25	10
13		Anden en concreto reforz e=.10 3000psi sin estr**	6,00	3 días	lun 13/10/25	mié 15/10/25	12
14		**ACABADOS**		**3 días**	**jue 9/10/25**	**lun 13/10/25**	
15		MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9 Pañete estructural liso sobreMuro 1:3e=0.03imperme	12,65	3 días	jue 9/10/25	lun 13/10/25	12CC
16		**VIDRIOS Y CARPINTERIA METALICA**		**13 días**	**mar 14/10/2**	**jue 30/10/25**	
17		Suministro e instalación de pasamanos doble tubular Inox Ø2" H= 0.90 - 0.70 m	10,80	8 días	mar 14/10/25	jue 23/10/25	15
18		suministro e instalación de estructura de exhibición para la pieza museográfica (proyector óptico mecánico) Incluye traslado y	1,00	5 días	vie 24/10/25	jue 30/10/25	17
19		**IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA**		**21 días**	**jue 9/10/25**	**jue 6/11/25**	
20		SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO D	25,00	10 días	jue 9/10/25	mié 22/10/25	43CC
21		SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO A	4,00	2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25	43CC
22		mantenimiento y limpieza de ventanería (primer piso)	186,92	5 días	vie 31/10/25	jue 6/11/25	18
23		**INSTALACIONE ELECTRICAS**		**15 días**	**mar 14/10/2**	**lun 3/11/25**	
24		SALIDA ILUMINACIÓN+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA	18,00	5 días	mar 14/10/25	lun 20/10/25	15
25		Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm	18,00	10 días	mar 21/10/25	lun 3/11/25	24
26		**ITEMS NO PREVISTOS**		**44 días**	**mié 1/10/25**	**lun 1/12/25**	
27		Sondeo de sifones de piso	5,00	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	10
28		Pulida, liimpieza y alistamiento superfie metalica para aplicacion de impermeabilizacion con poliurea	305,62	10 días	mié 1/10/25	mar 14/10/25	7CC
29		Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1,5mm, suministro e instalación	305,62	23 días	mié 15/10/25	vie 14/11/25	28
30		Desmonte de muro en drywall	12,65	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	7
31		Mejoramiento de bordillo para cajas de inspeccion en mamposteria, con acabado en pañete	1,00	1 día	jue 16/10/25	jue 16/10/25	13
32		Bordillo en Ladrillo para escalera de ingr	6,00	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	31
33		Pelado y reemboquillado de piso en baño	10,70	1 día	mar 21/10/2	mar 21/10/25	32
34		Mantenimiento de tuberia de gas para acometida	1,00	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	22
35		Mantenimiento, sellada y pulida de mesones de baños	9,08	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	33
36		Pulida y brillado de piso en marmol	125,65	10 días	mié 29/10/2	mar 11/11/25	35
37		Suministro e instalacion Puerta Melamina 100 X 235 cm Interdoors para	1,00	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	36
38		REPULIDA DE BANCAS EN MADERA NATURAL APLICACIÓN 3 CAPAS DE PRODUCTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE	125,00	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	36
39		Suministro e instalacion de listones nuevos de madera Sapan para bancas	15,00	5 días	vie 14/11/25	jue 20/11/25	37
40		Suministro e instalación de mueble en RH bajo lavamanos	1,86	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	39
41		Suministro e instalación de rejilla circular microperforada cal 1/8", de 0,40x0,80, acabado esmalte	8,00	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	40
42		Suministro e instalacion de 1 tapa de alfajor para tanque de .50x .50 cal 1/8"	1,00	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25	41
43		Suministro e instalación de Plataforma pasarela perimetral en domo, con pie de amigo en platina 3/8"x3" y lamina alfajor calibre 4mm, (incluye barandas en tubo redondo)	140,80	38 días	jue 9/10/25	lun 1/12/25	27CC
44		Resane filtración tuberia agua sobre muro	1,00	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	35
45		KIT de instalación Desagüe + sifon flexible para lavamanos	8,00	4 días	vie 31/10/25	mié 5/11/25	44
46		Mantenimiento en desagües de baños y griferias	3,00	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	44CC
47		Conexión de sanitario	1,00	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	46
48		Desmonte y reinstalacion de lavamanos a altura requerida por norma	1,00	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	47
49		Limpieza y pulida de letrero metálico de fachada (18 letras)	1,00	5 días	mié 29/10/25	mar 4/11/25	35
50		FIN		0 días	mié 25/02/2	mié 25/02/26	4

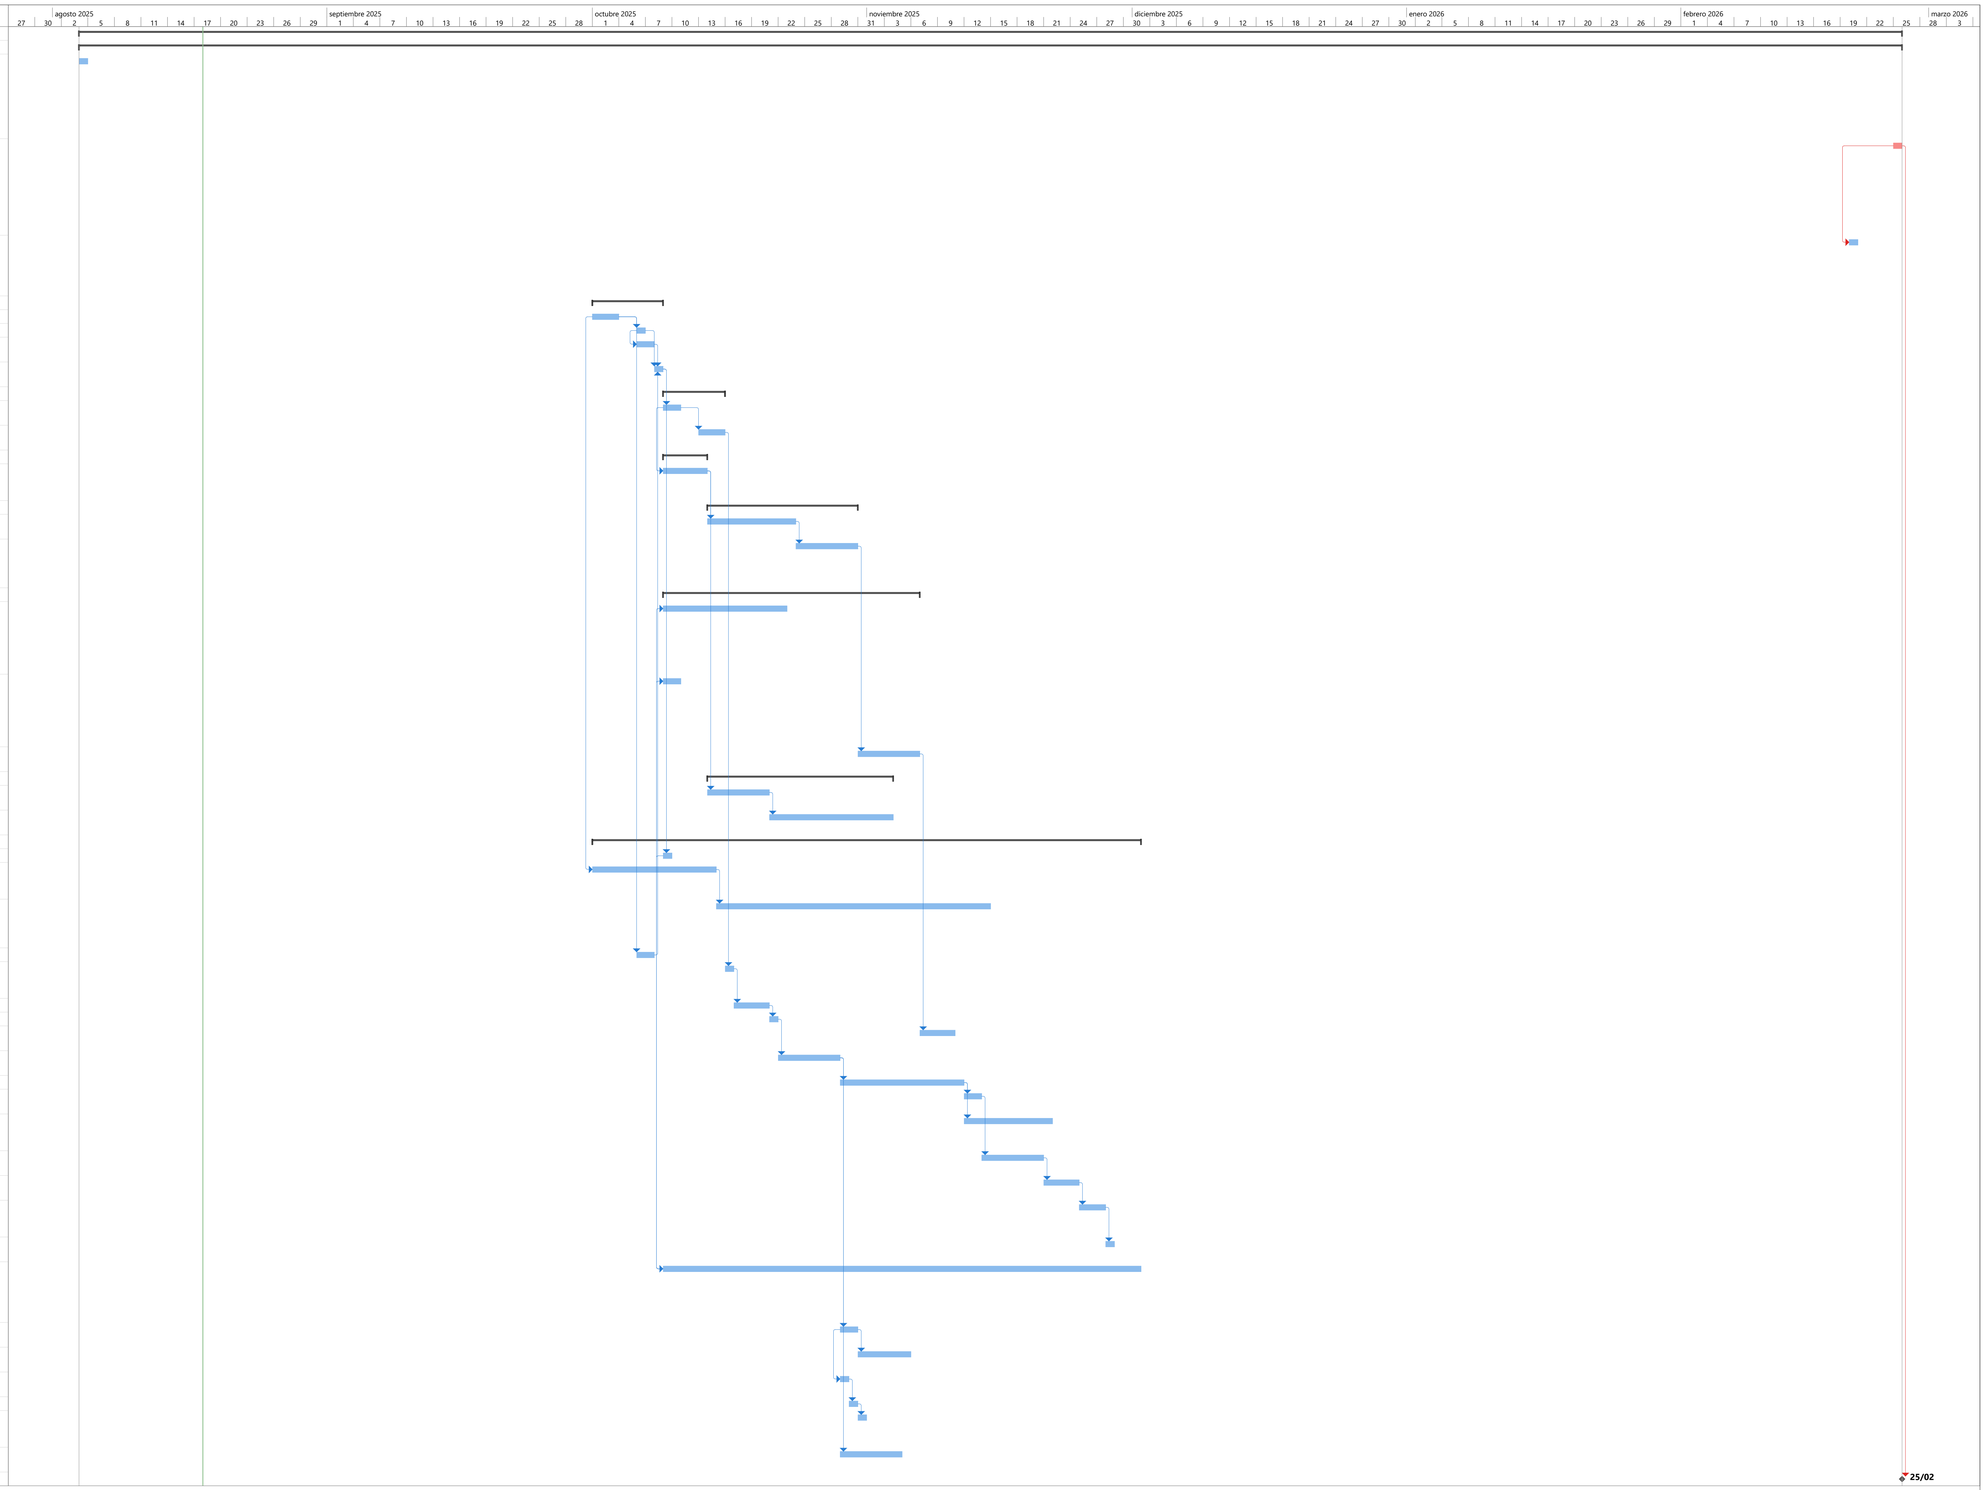

Proyecto: CRONOGRAMA EJEC
Fecha: lun 18/08/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
