

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Cant	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MANTENIMIENTO CASONA DE LA DANZA**		**43 días**	**mié 17/12/25**	**vie 13/02/26**	
2		**MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES**		**43 días**	**mié 17/12/25**	**vie 13/02/26**	
3		SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 1 SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN Capacidad: 2000 LITROS Material: PVC Ubicación: SUPERFICIAL Tipo:	8	1 día	mié 17/12/25	mié 17/12/25	
4		SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 2 SERVICIO 2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1) Capacidad: 2000 LITROS Material: PVC Ubicación:	8	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	5

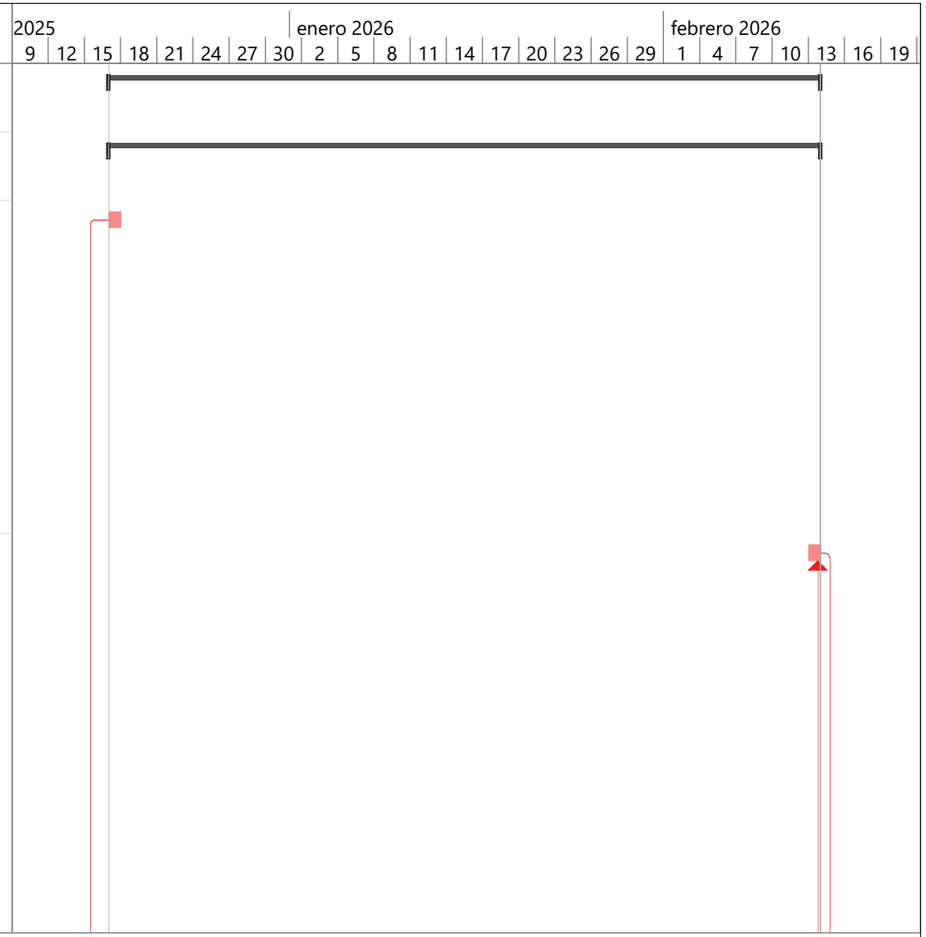

Proyecto: CRONOGRAMA CASO
Fecha: lun 18/08/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Cant	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
5		Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con	10,59	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	22
6		**PRELIMINARES**		**21 días**	**mié 17/12/2**	**mié 14/01/2**	
7		LOCALIZACION Y REPLANTEO	275,03	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	3CC
8		DEMOLIC.MURO LADRILLO + RECUPER.+	91,25	15 días	lun 22/12/25	vie 9/01/26	7
9		RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con	31,14	3 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26	8;11
10		**OBRA CIVIL**		**33 días**	**lun 22/12/25**	**mié 4/02/26**	
11		Desmonte y retiro de adoquin	95,03	8 días	lun 22/12/25	mié 31/12/25	8CC
12		Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF	91,25	15 días	lun 12/01/26	vie 30/01/26	8
13		AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio	95,03	20 días	jue 1/01/26	mié 28/01/26	11
14		Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2	95,03	5 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26	13
15		**PINTURA**		**5 días**	**lun 2/02/26**	**vie 6/02/26**	

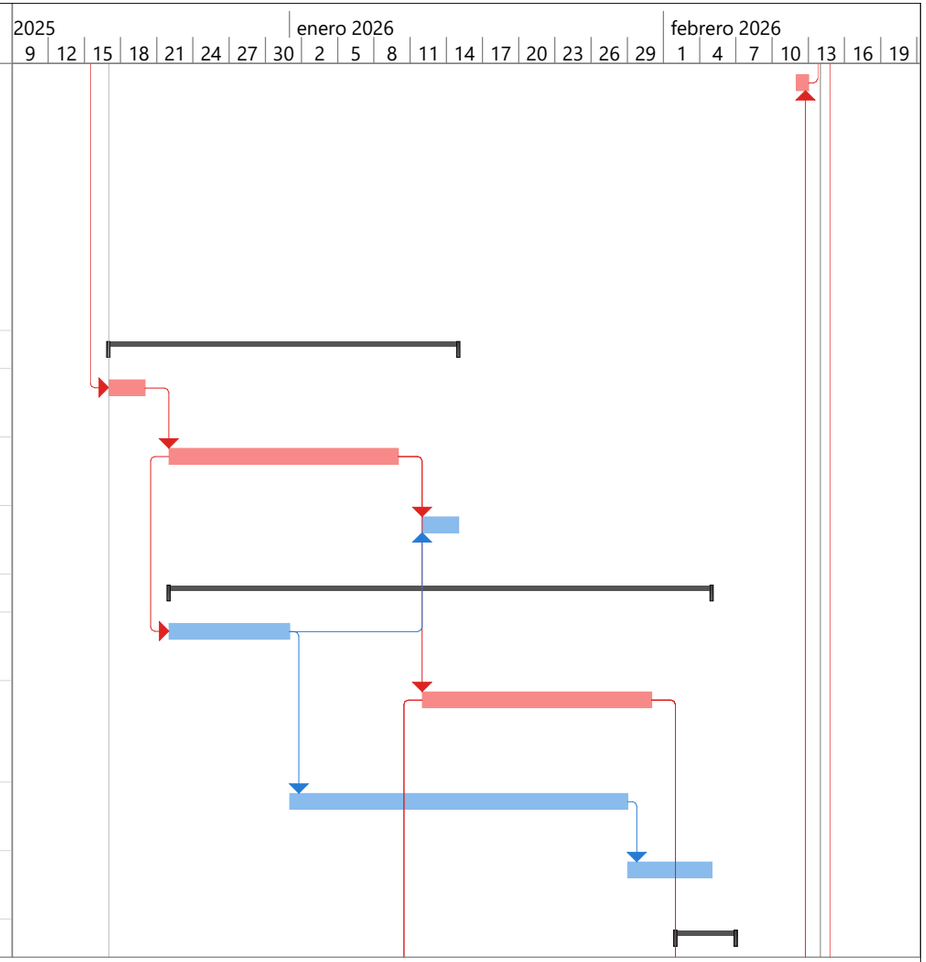

Proyecto: CRONOGRAMA CASO
Fecha: lun 18/08/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Cant	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
16		Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	10	5 días	lun 2/02/26	vie 6/02/26	12
17		**ITEMS NO PREVISTOS**		**23 días**	**lun 12/01/26**	**mié 11/02/2(**	
18		Mejoramiento de madera (pasamanos) , incluye lijado, pintura y	8,44	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	12
19		PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E	88	15 días	lun 12/01/26	vie 30/01/26	12CC
20		RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y BARNIZADO Y	180	20 días	lun 12/01/26	vie 6/02/26	19CC
21		Mantenimiento de ventaneria (Silicona y sellado)	124,65	5 días	lun 2/02/26	vie 6/02/26	12
22		Limpieza de canal metálic	27,4	3 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26	21
23		COLUMNAS DE CONCRETO 210 KG/CM2	2,70	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	24
24		ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2	459,00	3 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26	12CC
25		FIN		0 días	vie 13/02/26	vie 13/02/26	4

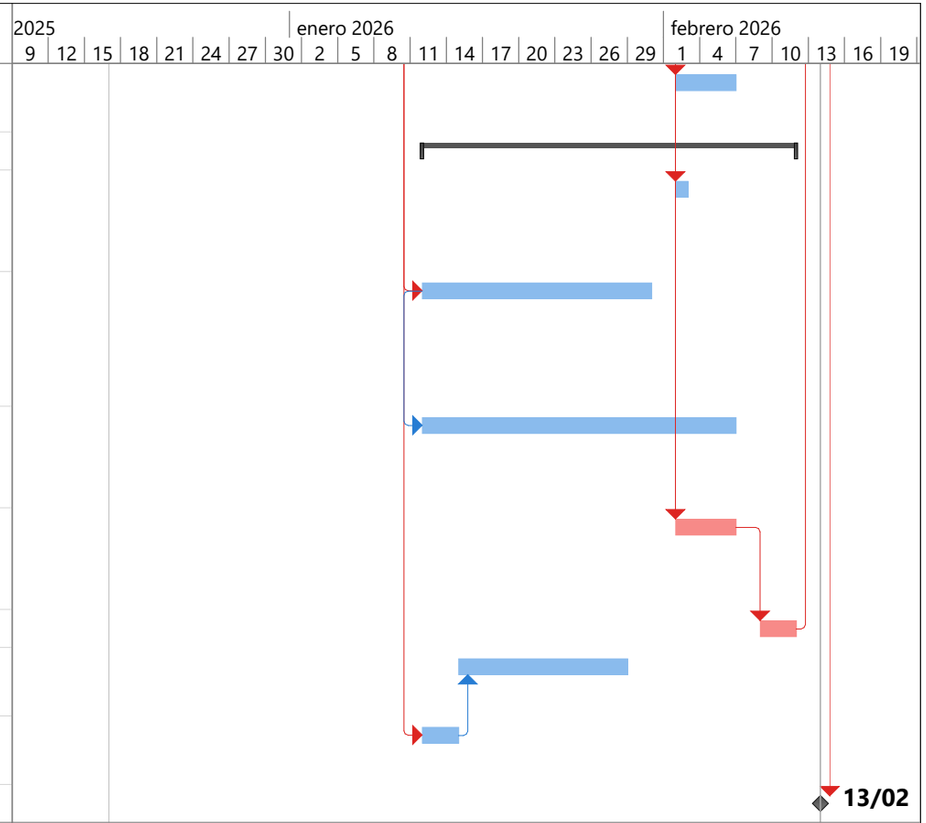

Proyecto: CRONOGRAMA CASO
Fecha: lun 18/08/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	
