
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	CANT	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MANTENIMIENTO CINEMATECA DISTRITAL**		**165 días**	**lun 14/07/25**	**vie 27/02/26**	
2		**MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES**		**30 días**	**mar 29/07/25**	**lun 8/09/25**	
3		SEDE: CINEMATECA DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 1 SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN Capacidad: 112,2 M3 Material:CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo: Almacenamiento Agua Potable	1,00	1 día	lun 14/07/25	lun 14/07/25	
4		SEDE: CINEMATECA DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 2 SERVICIO 2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1) Capacidad: 112,2 M3 Material:CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo: Almacenamient	1,00	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	
5		SEDE: CINEMATECA - TANQUE RCI - SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL (incluye herramientas, equipos y personal) Capacidad: 80 M3 Material: CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo: Almacenamiento Agua Potable	1,00	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26	4
6		**PRELIMINARES**		**13 días**	**mar 29/07/25**	**jue 14/08/25**	
7		Localizacion y replanteo	1840,83	13 días	mar 29/07/25	jue 14/08/25	
8		Desmonte de tuberia descolgada de 4"	39,5	8 días	vie 1/08/25	mar 12/08/25	7CC+3 días
9		Desmonte y retiro adoquin	18	2 días	vie 1/08/25	lun 4/08/25	8CC
10		Desmonte de Vidrios en Fachada incluye trabajo en alturas	144,59	5 días	mar 5/08/25	lun 11/08/25	9
11		RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con Vale)	41,00	10 días	vie 1/08/25	jue 14/08/25	8CC
12		**OBRAS CIVILES**		**13 días**	**vie 15/08/25**	**mar 2/09/25**	
13		Adoquin arcilla español e= 6 cm sobre arena - Suministro e Instalación	18	10 días	vie 15/08/25	jue 28/08/25	11
14		ACABADO ESMALTADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL	9	5 días	vie 22/08/25	jue 28/08/25	13CC+5 días
15		Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	8,3	3 días	vie 29/08/25	mar 2/09/25	13
16		**ACABADOS**		**39 días**	**mié 27/08/25**	**lun 20/10/25**	
17		CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación	286,91	30 días	mié 27/08/25	mar 7/10/25	25CC+1 día
18		ASEO GENERAL	455,36	5 días	mar 14/10/25	lun 20/10/25	42
19		**VIDRIOS Y CARPINTERIA METALICA**		**10 días**	**mié 3/09/25**	**mar 16/09/25**	
20		Suministro e instalación Ventana de VidrioTemplado10mm con marco en acero inoxidable calibre 18	127,59	10 días	mié 3/09/25	mar 16/09/25	17CC+5 días
21		Suministro e instalación Puerta VidrioTemplado 10mm incluye manija de Aluminio+cerradura +bisagra	17,00	10 días	mié 3/09/25	mar 16/09/25	20CC
22		**INSTALACIONES HIDRAULICASY SANITARIAS**		**3 días**	**mié 3/09/25**	**vie 5/09/25**	
23		Bajante PVC-ALL 6" (inc. uniones, sumin y pint**	21,73	3 días	mié 3/09/25	vie 5/09/25	20CC
24		**INSTALACIONES ELECTRICAS**		**34 días**	**mar 26/08/25**	**vie 10/10/25**	
25		SALIDA ILUMINACIÓN+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA	32,00	8 días	mar 26/08/25	jue 4/09/25	29FC+10 días
26		Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm	32,00	3 días	mié 8/10/25	vie 10/10/25	17
27		**ITEMS NO PREVISTOS**		**154 días**	**mar 29/07/25**	**vie 27/02/26**	
28		Desmonte de estructura de drywall y cielo raso en dryv	186,91	5 días	mar 29/07/25	lun 4/08/25	7CC
29		Desmonte de estructura de drywall	110,00	5 días	mar 5/08/25	lun 11/08/25	28
30		Desmonte de luminarias	22	3 días	mar 5/08/25	jue 7/08/25	28
31		Trasiego de materas	52	2 días	mar 29/07/25	mié 30/07/25	28CC
32		Desmonte de guardaescobas metalico en baños	64	2 días	mar 5/08/25	mié 6/08/25	29CC
33		Desmonte manto placa cubierta (sin cargue y retiro)	268,45	10 días	mar 19/08/25	lun 1/09/25	29FC+5 días
34		Suministro e instalacion de Madera sintética DECK WPC para exteriores	96,91	5 días	mar 2/09/25	lun 8/09/25	33
35		Suministro e instalacion de guardaescoba PVC	64,00	4 días	jue 7/08/25	mar 12/08/25	32
36		Suministro e instalación de marquesina en vidrio laminado 3+3 con estructura en aluminio	18,00	5 días	mié 17/09/25	mar 23/09/25	21
37		Instalacion de luminarias	54,00	10 días	lun 13/10/25	vie 24/10/25	26
38		Suministro e instalación de red PVC descolgada 4"	39,50	8 días	lun 27/10/25	mié 5/11/25	37
39		Sondeo de sifones de piso	3,00	1 día	mié 13/08/25	mié 13/08/25	35
40		Suministro e instalación de Grifería para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto	8,00	3 días	lun 25/08/25	mié 27/08/25	39FC+7 días
41		Pulida, liimpieza y alistamiento superfie metalica para aplicacion de impermeabilizacion con poliurea	1430,00	28 días	mar 19/08/25	jue 25/09/25	42CC+5 días
42		Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1,5mm, suministro e instalación	1813,83	45 días	mar 12/08/25	lun 13/10/25	33CC-5 días
43		Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	41,00	25 días	mar 29/07/25	lun 1/09/25	28CC
44		Mortero modific polimero reparac espesor 3mm	26,35	10 días	mar 2/09/25	lun 15/09/25	33
45		Pintura epóxica (Precio ICCU Soacha 18,26)	26,35	2 días	mar 16/09/25	mié 17/09/25	44
46		PUNTO SANITARIO PVC (4")	8,00	4 días	jue 28/08/25	mar 2/09/25	40
47		SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER (PRECIO IDRD 15927)	3,00	2 días	mié 10/09/25	jue 11/09/25	46FC+5 días
48		**FIN**		0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	5

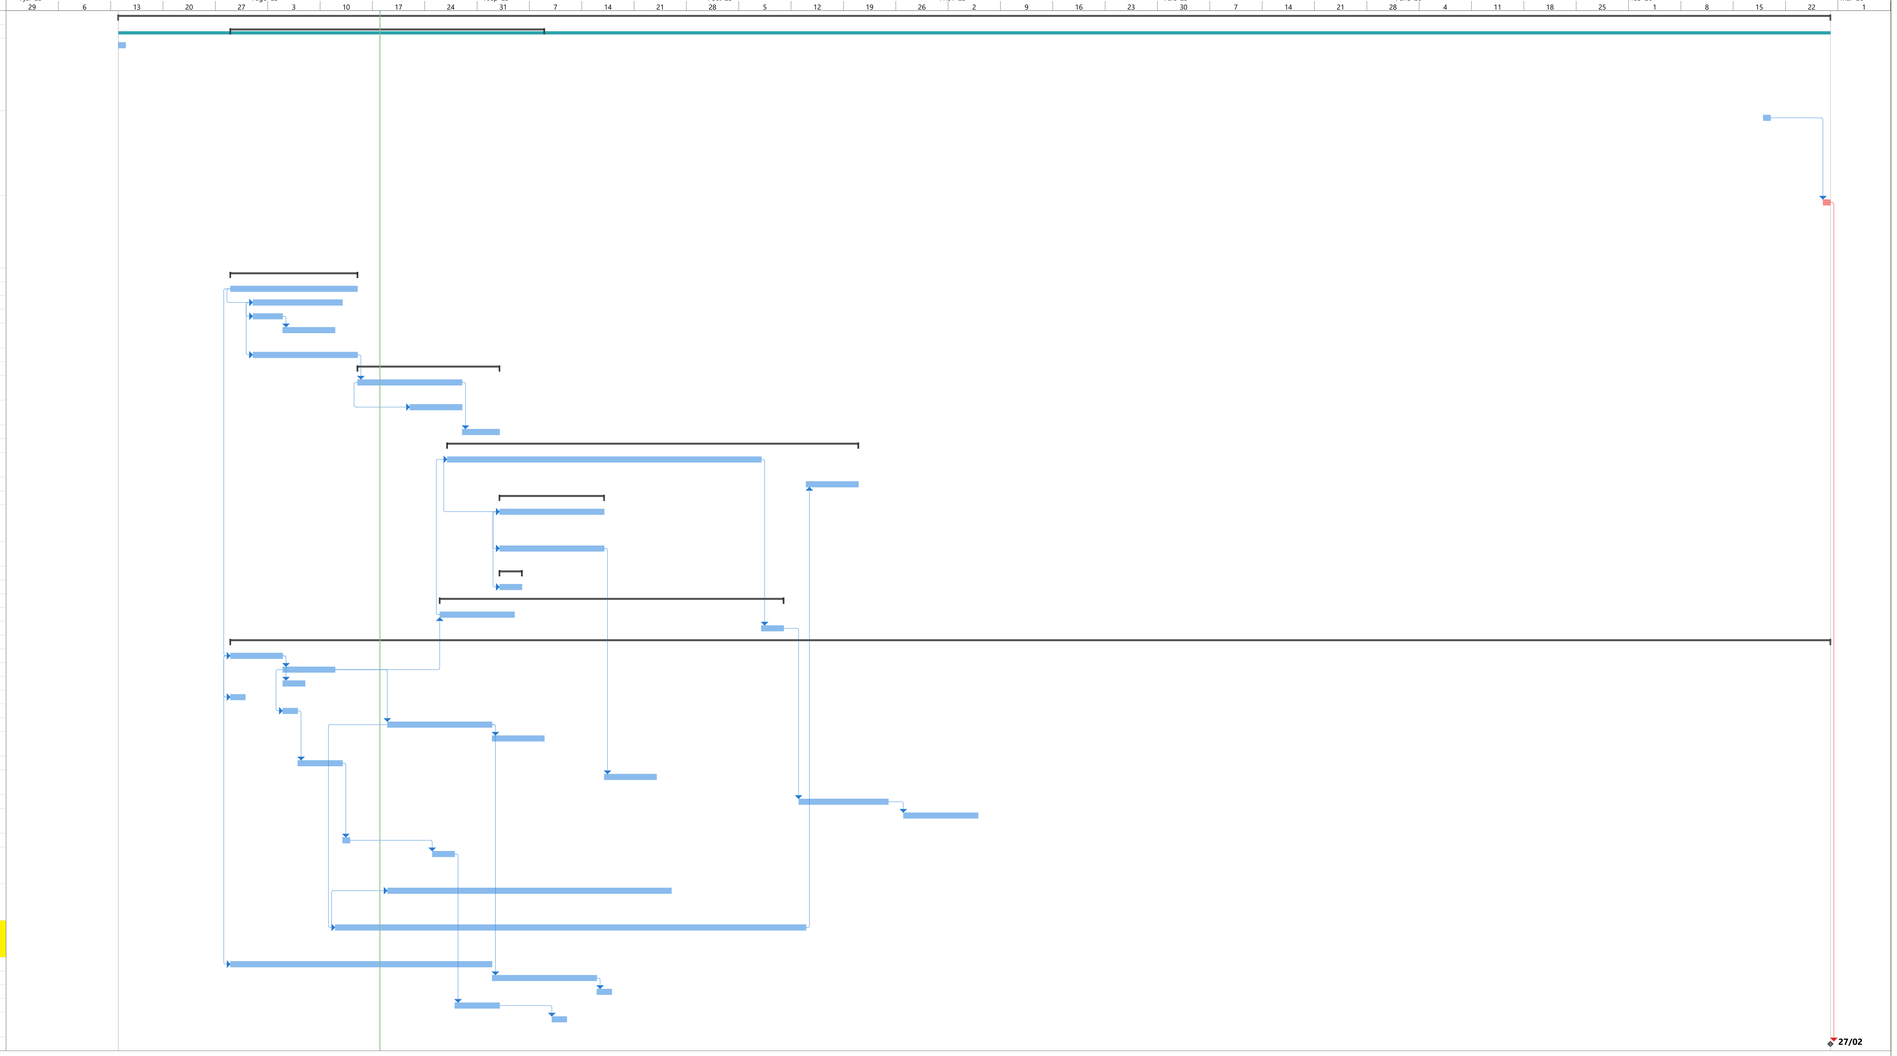

Proyecto: CRONOGRAMA EJEC
Fecha: lun 18/08/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
