CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076 de 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1

CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

INFORME MENSUAL No. 01 DE INTERVENTORÍA

Periodo: del 22 de enero al 21 de febrero del 2024

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Ing. Gloria Carolina Tejada Orozco Mat: 25202-339572CND	Ing. Víctor David Tierradentro Nova Mat: 25202-097990	Ing. Germán Corzo Upegui Mat: 25202-250038CND
CARGO: Residente de interventoría	**CARGO:** Director de interventoría	**CARGO:** Supervisor del contrato
Fecha: 05 de marzo de 2024	**Fecha:** 05 de marzo de 2024	**Fecha:** 05 de marzo de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEP-MIN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 4241-2023 — Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II
3745-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
4064-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
3569-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
3983-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
3533-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
4034-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
4067-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
3595-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
4029-2023 — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

Contrato de Interventoría No. 5076 de 2023 — Interventoría: CONSORCIO GUAVIAREJINT 150

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA (CAÑO FLAUTA/CAÑO BLANCO III/ NUEVO MILENIO/ LA ESPERANZA/ GUACAMAYAS/ SANTA CECILIA/ ORQUIDEAS/ CAÑO DORADO/ LA CARPA/ NUEVO TOLIMA) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1 — MES O PERIODO:

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEP-MIN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEP-MIN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEP-MIN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEP-MIN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEP-MIN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEP-MIN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEP-MIN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEP-MIN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEP-MIN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEP-MIN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEP-MIN-IN-2-FR-1 MEP-MIN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEP-MIN-IN-6-FR-1 MEP-MIN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEP-MIN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEP-MIN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfica (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEP-MIN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEP-MIN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEP-MIN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEP-MIN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEP-MIN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEP-MIN-IN-3-FR-1 MEP-MIN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEP-MIN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEP-MIN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre:
GERMÁN CORZO UPEGUI
Resolución de designación No.13 de fecha 5 enero 2024

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias : Interventor, Dirección Territorial

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES META

INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076 DE 2023

CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1

ESPECIFICAMENTE A LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No:	**3533 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA CORREGIMIENTO EL CAPRICHO**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE OBRA No:	**4034 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE OBRA No:	**4067 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE OBRA No:	**3595 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CARPA**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE OBRA No:	**3745 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE OBRA No:	**4241 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE OBRA No:	**4064 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE OBRA No:	**3569 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE OBRA No:	**3983 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE OBRA No:	**4029 de 2023**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Este documento ha sido entregado al Instituto Nacional de vías (INVIAS) y a las dependencias mencionadas a continuación. Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas al responsable de su elaboración para proceder a realizar su modificación.

DEPENDENCIA	ORIGINAL	COPIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)	1	1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) TERRITORIAL META		1
CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		1

1 Introducción

El proyecto que nos ocupa es de vital importancia para el desarrollo y la conectividad de los municipios de San José del Guaviare en el departamento del Guaviare.

El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), ha implementado el programa "La Paz Total y la Justicia Social". Este programa se inicia con el diálogo y la concertación con las comunidades, con el objetivo de construir desde y para la ciudadanía. El INVIAS brinda acompañamiento técnico, administrativo y contable desde sus Direcciones Territoriales.

El Instituto Nacional de Vías ha suscrito convenios solidarios con las Juntas u organismos de Acciones Comunales de las veredas:

- Vereda Caño flauta, Convenio 3533 de 2023.
- Orquídeas, Convenio 4034 de 2023
- Caño dorado, Convenio 4067 de 2023
- Vereda la carpa, Convenio 3595 de 2023
- Nuevo milenio, Convenio 3745 de 2023
- Caño Blanco III, Convenio 4241de 2023
- La esperanza, Convenio 4064 de 2023
- Guacamayas, Convenio 3569 de 2023
- Santa Cecilia, Convenio 3983 de 2023
- Nuevo Tolima, Convenio 4029 de 2023

Estos convenios buscan aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y las Juntas de Acción Comunal para el mantenimiento y mejoramiento vial. Es imperativo llevar a cabo labores de control y seguimiento para garantizar el éxito de este importante proyecto.

En este informe mensual No.1 del contrato No. **5076 de 2023** a cargo del **CONSORCIO GUAVIARE JINT 150** correspondiente al periodo del 22 de enero al 21 de febrero del 2024, se aborda el estado de las obras de los convenios (***3533 de 2023/ 4034 de 2023/ 4067 de 2023/ 3595 de 2023/ 3745 de 2023/ 4241 de 2023/ 4064 de 2023/ 3569 de 2023/ 3983 de 2023/ 4029 de 2023)*** desde múltiples perspectivas, incluyendo aspectos técnicos, económicos, financieros, presupuestales, legales y contractuales, además también se evalúan el estado del equipo, el personal y los materiales utilizados en la ejecución. También se destaca el avance en la realización de las obras y señala cualquier problema pendiente de solución que pueda afectar su desarrollo.

El día (22) de enero de 2024, por parte del INVIAS se da orden de reinicio de interventoría contratos No. 5076 de 2023, teniendo en cuenta que se han cumplido con los requisitos previos, para realizar el seguimiento a los contratos **(*3533 de 2023/ 4034 de 2023/ 4067 de 2023/ 3595 de 2023/ 3745 de 2023/ 4241 de 2023/ 4064 de 2023/ 3569 de 2023/ 3983 de 2023/ 4029 de 2023)***

2 Descripción del proyecto

Los proyectos a desarrollar se encuentran ubicados en la zona rural del municipio de SAN JOSÉ DEL GUAVIARE del departamento del GUAVIARE.

- Vereda caño flauta, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Caño Flauta cruce con la vía que conduce a la Macarena, Cachicamo, Puerto Nuevo, Chuapal y paraíso- Guaviare en las coordenadas Longitud -72,9848 Latitud 2,3755 y punto de referencia final el PR1+800 ubicado en la vía terciaria que comunica a la vereda la Carpa – Guaviare en las coordenadas Longitud 72,9765 Latitud 2,3893, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- Orquídeas, teniendo como punto de referencia inicial las siguientes coordenadas 2,409070316 y -72,89279653, a su vez teniendo como punto final las siguientes 2,416071448 y -72,90077494 , conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS, donde se identificaron las necesidades del corredor para garantizar la transitabilidad.

- Caño dorado, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.473262, longitud: -72.892751 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.480241, longitud: - 72.891572, dicho tramo ubicado en la vía cerro azul a vereda la carpa, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- Vereda la carpa, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.462448 longitud: -72.932411 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.453387, longitud: -72.947420, dicho tramo ubicado en la vía la carpa a la rompida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- Nuevo milenio, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.436901longitud: -72.457824 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.429311, longitud: -72.448267, de la vía que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda Nuevo Milenio conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- Caño blanco III: teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud: 2,553314 , Longitud: -72,316634 y punto de referencia final las coordenadas latitud: 2,557447, longitud: -72,332751, a 44 km del casco urbano, en la vía que viene de Caño Blanco II hacia Caño Blanco III, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- La esperanza: teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2,427334, longitud: -72,424483 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2,417161, longitud: -72,365771, de la vía que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda La Esperanza, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- Guacamayas, teniendo como punto de referencia inicial el PR latitud 2°26'25.75" N, longitud 72°30'5.19" O en el acceso a la Vereda Guacamayas y punto de referencia final el PR latitud 2°26'51.02" N longitud 72°29'2.75" O ubicado vía vereda Nuevo Milenio a vereda Puerto Flores, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- Santa Cecilia, teniendo como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y viniendo de la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'8.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

- Nuevo Tolima, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.448736 longitud: -72.732883 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2,454396 , longitud: -72,757259, dicho tramo ubicado en la vía principal de la Vereda Nuevo Tolima , conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del INVIAS.

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contrato del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placas huellas.

Los OAC deberán gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías – Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 LOCALIZACIÓN

San José del Guaviare es un municipio colombiano y la capital del departamento de Guaviare. Su formación comenzó en 1960, vinculada a las actividades colonizadoras de la región selvática y como núcleo de apoyo a las mismas. En 1976, recibió el estatus de municipio y desde entonces, su crecimiento demográfico ha sido rápido.

Datos relevantes sobre San José del Guaviare:

Superficie: El municipio abarca un área total de 16,178 km²12.

Altitud promedio: Se encuentra a 175 metros sobre el nivel del mar2.

Clima: San José del Guaviare tiene un clima tropical monzónico1.

Población (2018): El municipio cuenta con un total de 52,815 habitantes, de los cuales 45,705 viven en la zona urbana1.

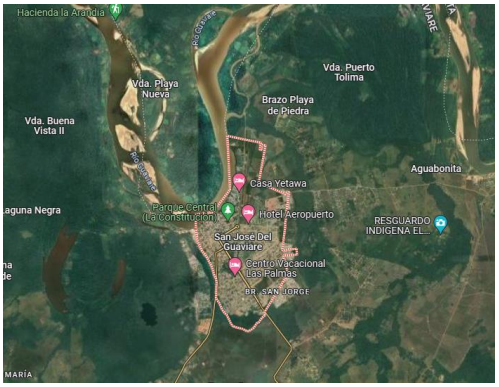


Imagen. 1 Localización municipio de San José del guaviare

2.1.1 Localización convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta

La vereda de Caño Flauta se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.378257 y longitud -72.983078, a 99 KM de la capital de San José del Guaviare.

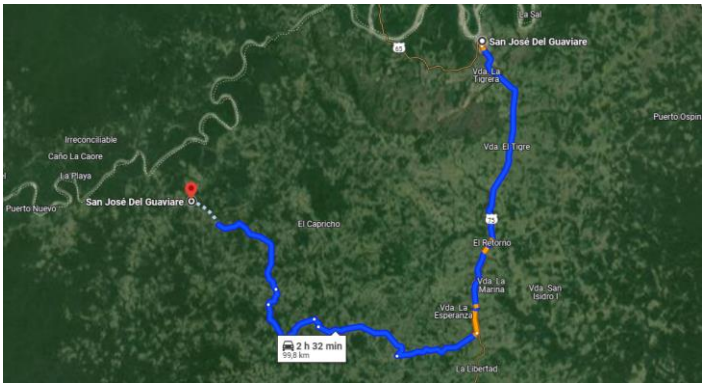


Imagen. 2 localización vereda caño flauta tomado de Google maps.

2.1.2 Localización convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas

La vereda Orquídeas se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.413487 y longitud, -72.894814 a 59 KM de la capital de San José del Guaviare

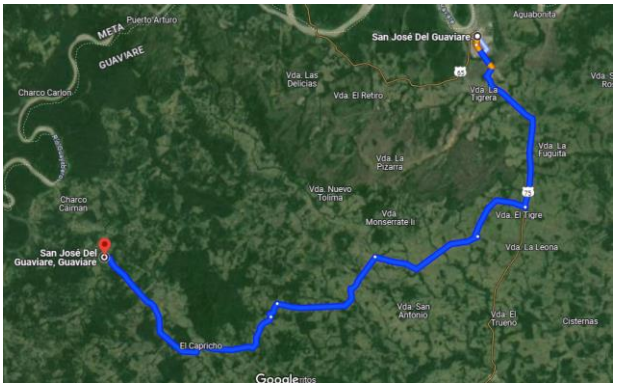


Imagen. 3 Mapa localización vereda orquídeas tomado de Google maps

2.1.3 Localización convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado

La vereda de Caño Dorado se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.479394 y longitud -72.898735, a 46.1 KM de la capital de San José del Guaviare.

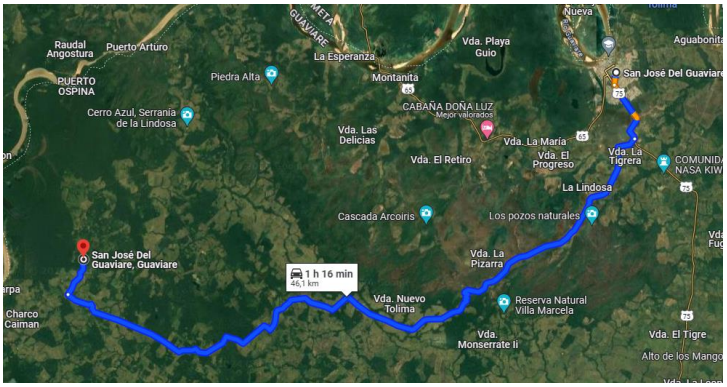


Imagen. 4 Mapa localización vereda caño dorado tomado de Google maps

2.1.4 Localización convenio 3595 de 2023 vereda la carpa

La Vereda La Carpa se encuentra dentro de la jurisdicción de San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare, Colombia. Este lugar está ubicado a orillas del río Guayabero, aproximadamente a dos horas en lancha desde la capital departamental, lo que equivale a una distancia de 48.8 kilómetros

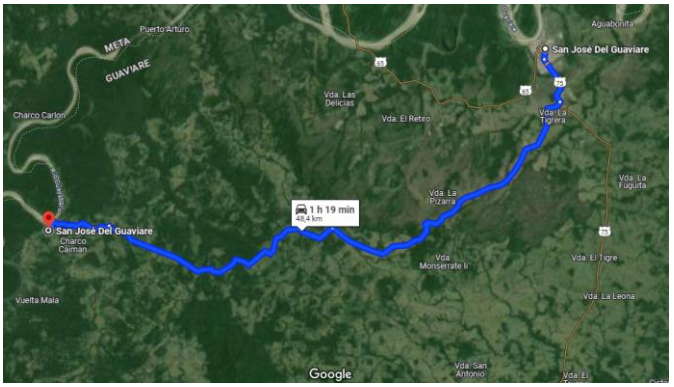


Imagen. 5 Mapa localización vereda la carpa tomado de Google maps.

2.1.5 Localización convenio 3745 de 2023 vereda Nuevo Milenio

La vereda de Nuevo Milenio se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.429429 y longitud -72.448563, a 34 KM de la capital de San José del Guaviare.

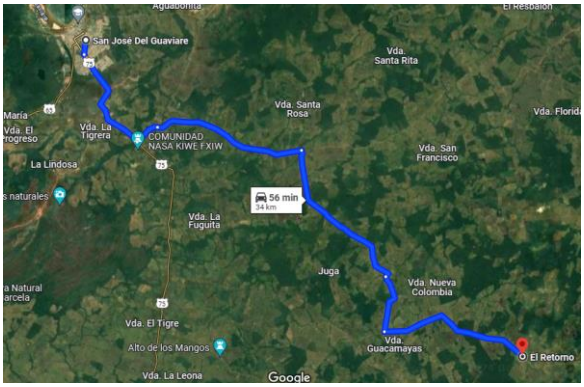


Imagen. 6 Mapa localización vereda nuevo milenio tomado de Google maps

2.1.6 Localización convenio 4241 de 2023 vereda Caño Blanco 3

La vereda de Caño Blanco III se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.556761 y longitud -72.314339, a 50.7 KM de la capital de San José del Guaviare.

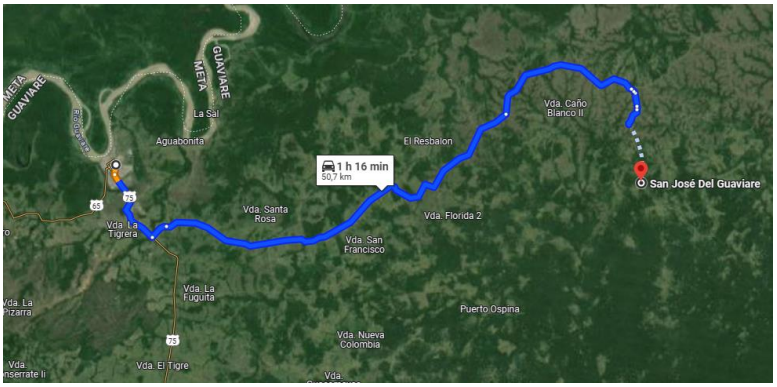


Imagen. 7 Mapa de localización vereda caño blanco III tomado de Google maps

2.1.7 Localización convenio 4064 de 2023 vereda la esperanza

La vereda de La Esperanza se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.4239160 y longitud -723826830, a 42 KM de la capital de San José del Guaviare

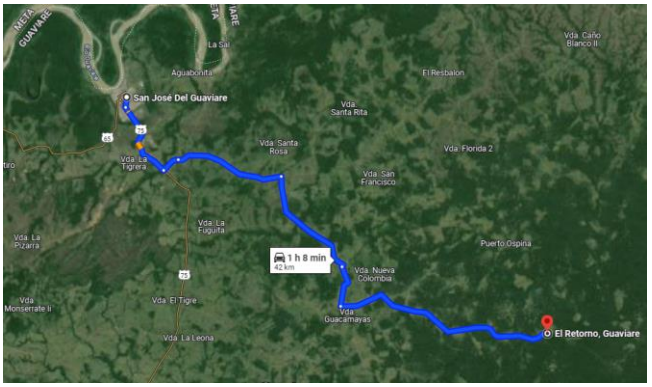


Imagen. 8 Mapa de localización vereda la esperanza tomada de Google maps

2.1.8 Localización convenio 3569 de 2023 vereda guacamayas

La vereda de Guacamayas se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.438843 y longitud -72.514587, a 27.1 KM de la capital de San José del Guaviare

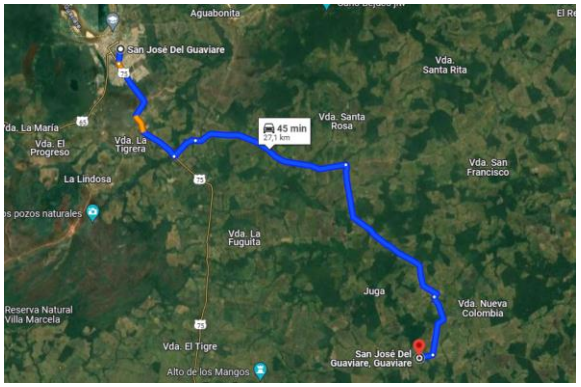


Imagen. 9 Mapa de localización vereda la esperanza tomada de Google maps

2.1.9 Localización convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia

La vereda de Santa Cecilia se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.460472 y longitud -72.455711, a 30.1 KM de la capital de San José del Guaviare.

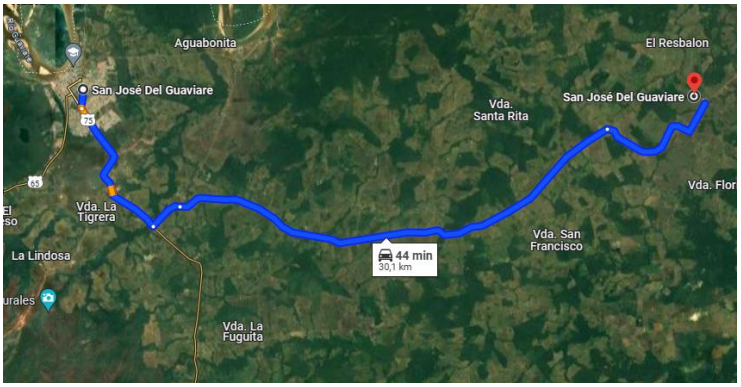


Imagen. 10 mapa de localización vereda la esperanza tomado de Google maps.

2.1.10 Localización convenio 4029 de 2023 vereda nuevo Tolima

La vereda de Nuevo Tolima se encuentra dentro de la jurisdicción de san José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, Colombia, este lugar está ubicado en las coordenadas, latitud 2.451227 y longitud -72.725967, a 20.9 KM de la capital de San José del Guaviare.

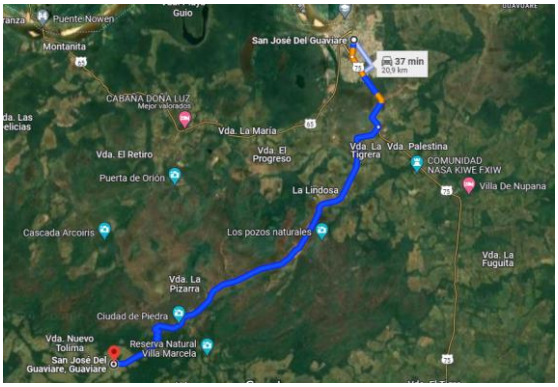


Imagen. 11 mapa de localización vereda nuevo Tolima tomado de Google maps.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO


En el desarrollo de los proyectos que benefician directamente a los usuarios de las vías secundarias y terciarias de las zonas rurales del municipio de san José del Guaviare, y el Capricho; Los principales beneficios del proyecto se centran en mejorar las condiciones de las vías de comunicación prioritarias en el municipio de San José del Guaviare. Estas vías son utilizadas de manera permanente para el transporte de productos comerciales, ganadería y agricultura en cada región. Este impacto positivo en la infraestructura vial contribuye significativamente al desarrollo general de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El presente apartado ofrece una evaluación detallada de las condiciones de las vías rurales en el municipio de San José del Guaviare, con el propósito de facilitar la ejecución de proyectos de mejoramiento vial en colaboración con el Instituto nacional de Vías (INVÍAS). Este análisis aborda la necesidad imperante de implementar soluciones como la construcción de placas huellas, box culverts y alcantarillas, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y garantizar una mayor seguridad y accesibilidad para las comunidades locales. El estudio identifica los desafíos actuales y las áreas prioritarias de intervención, sentando las bases para una gestión eficiente y coordinada en pos del desarrollo sostenible de la región.


2.3.1 Inventario y estado inicial de la vía Convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades

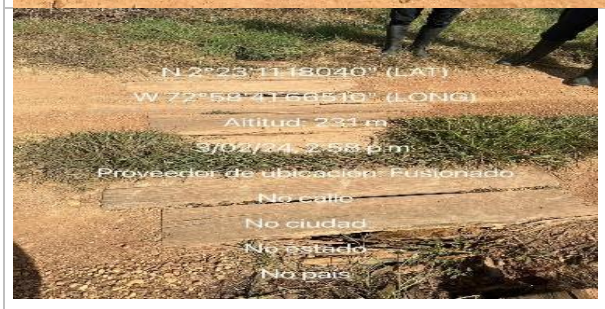	críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	
	
	

2.3.2 Inventario y estado inicial de la vía convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	

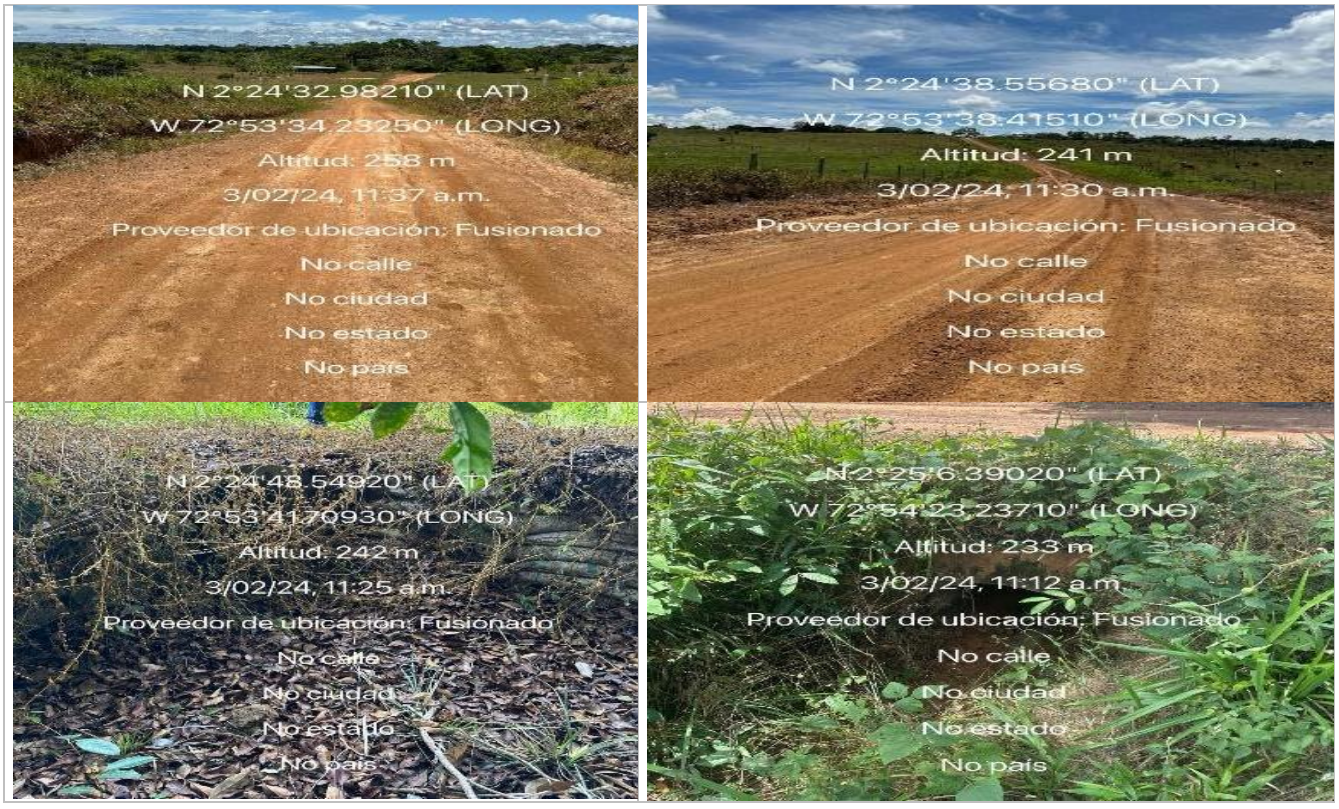

2.3.3 Inventario y estado inicial de la vía convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	
	

2.3.4 Inventario y estado inicial de la vía convenio 3595 de 2023 vereda la carpa

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	





2.3.5 Inventario y estado inicial de la vía convenio 3745 de 2023 vereda Nuevo Milenio

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	







2.3.6 Inventario y estado inicial de la vía convenio 4241 de 2023 vereda Caño Blanco 3

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	








2.3.7 Inventario y estado inicial de la vía convenio 4064 de 2023 vereda la esperanza

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas,

	con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	
	
	

2.3.8 Inventario y estado inicial de la vía convenio 3569 de 2023 vereda guacamayas

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de

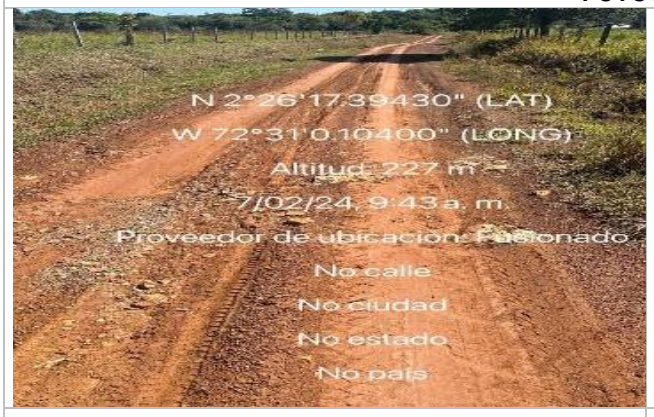	maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	
	

2.3.9 Inventario y estado inicial de la vía convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras
FOTOGRAFÍAS	







2.3.10 Inventario y estado inicial de la vía convenio 4029 de 2023 vereda nuevo Tolima

ESTADO DEL PAVIMENTO:	Trocha Carrozable
DRENAJE:	En el tramo de la vía se encuentran Box culverts y alcantarillas, en mal estado
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:	Señalizaciones de límites de vereda
ACCESIBILIDAD:	Motocicletas, camperos. Camión de dos ejes, volquetas o camiones de 3 ejes
IMPACTO AMBIENTAL	Fragmentación del hábitat, contaminación del agua, perdida de vegetación y deforestación
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	Épocas de lluvias: Aumento del caudal de agua en ríos y quebradas cercanas a las vías, el barro generado por las lluvias hace que esta sea resbaladiza, y difícil de transitar, especialmente para vehículos pesados y de tracción simple. Épocas de sequía: En las vías se forman grietas y baches.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO:	En el marco de la gestión de infraestructura vial en el departamento del Guaviare, la Gobernación ha implementado anualmente un plan de mantenimiento conocido como "Plan Verano". Este plan, diseñado para abordar las necesidades críticas de las vías rurales, consiste en el despliegue de maquinaria pesada hacia las diferentes veredas, con el objetivo de realizar actividades de perfilamiento y arreglo de las carreteras

FOTOGRAFÍAS	
	

2.4 Características técnicas del proyecto

2.4.1 Características técnicas del proyecto Convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción de seis alcantarillas.

2.4.2 Características técnicas del proyecto Convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y

	ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción de dos alantarillas y una placa huella en concreto de 100m

2.4.3 Características técnicas del proyecto Convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción de un box culvert y una placa huella en concreto de 80m

2.4.4 Características técnicas del proyecto Convenio 3595 de 2023 vereda la carpa

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita

	técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción de un box culvert

2.4.5 Características técnicas del proyecto Convenio 3745 de 2023 vereda Nuevo Milenio

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción de un box culvert 1x2 y una placa huella en concreto de 60m

2.4.6 Características técnicas del proyecto Convenio 4241 de 2023 vereda Caño Blanco 3

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del

	Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción de un box culvert y una placa huella en concreto de 80m

2.4.7 Características técnicas del proyecto Convenio 4064 de 2023 vereda la esperanza

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción de un box culvert y una placa huella en concreto de 50m

2.4.8 Características técnicas del proyecto Convenio 3569 de 2023 vereda guacamayas

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes

	para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción una placa huella en concreto de 120m

2.4.9 Características técnicas del proyecto Convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción un box culvert y una placa huella en concreto de 65m

2.4.10 Características técnicas del proyecto Convenio 4029 de 2023 vereda nuevo Tolima

ALCANCE DEL PROYECTO:	La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:	Construcción una placa huella en concreto de 120m

▪

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información general del contrato

3.1.1 Información general del convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta

CONTRATO DE OBRA No.	3533 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($174.962.471,00)
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA CORREGIMIENTO EL CAPRICHO NIT. 9012827

3.1.2 Información Contrato de obra: Convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas

CONTRATO DE OBRA No.	4034 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($218.498.554) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	NSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS NIT. 901.017.087-3.

3.1.3 Información Contrato de obra: Convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado

CONTRATO DE OBRA No.	4067 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($195.457.186,00)
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO NIT. 901.602.632-7.

3.1.4 Información Contrato de obra: Convenio 3595 de 2023 vereda la carpa

CONTRATO DE OBRA No.	3595 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($222.068.440) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CARPA NIT. 822.002.298-9.

3.1.5 Información Contrato de obra: Convenio 3745 de 2023 vereda Nuevo Milenio

CONTRATO DE OBRA No.	3745 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 204.844.167,00).
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO NIT. 901.280.747-1

3.1.6 Información Contrato de obra: Convenio 4241 de 2023 vereda Caño Blanco 3

CONTRATO DE OBRA No.	4241 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ($212.580.307,00) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III NIT. 901.525.843-4

3.1.7 Información Contrato de obra: Convenio 4064 de 2023 vereda la esperanza

CONTRATO DE OBRA No.	4064 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR:	DOSCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($201.000.789,00) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL

PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. . VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ NIT. 901.034.972-9.

3.1.8 Información Contrato de obra: Convenio 3569 de 2023 vereda guacamayas

CONTRATO DE OBRA No.	3569 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($199.076.790) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS NIT. 901.191.260-5.

3.1.9 Información Contrato de obra: Convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia

CONTRATO DE OBRA No.	3983 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($196.895.378,00).
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA NIT. 901.199.090-6.

3.1.10 Información Contrato de obra: Convenio 4029 de 2023 vereda nuevo Tolima

CONTRATO DE OBRA No.	4029 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN

	JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($210.449.188,00).
FORMA DE PAGO:	EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.1	4 MESES HASTA EL 30 DE ABRIL
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS NIT. 800.215.807-2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA NIT. 901.579.537-7

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

3.2.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de las alcantarillas priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.2.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de las alcantarillas y tramo de placa huella priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.2.3 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de la alcantarilla y el tramo de placa huella priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.2.4 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 3595 de 2023 vereda la carpa

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde la OAC propone cambiar el punto a intervenir, justificando que es de mayor prioridad para la comunidad intervenir el puente de madera que se encuentra en las coordenadas LAT: N2°27´37,60290" LONG : W72°56´5,54870", por lo cual se comprometen a realizar el balance de obra con el fin de intervenir este punto para su verficacion y aprobación por parte de la interventoría, se toma la georeferenciacion del sito a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal

3.2.5 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 3745 de 2023 vereda Nuevo Milenio

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de la alcantarilla y el tramo de placa huella priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.2.6 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 4241 de 2023 vereda Caño Blanco 3

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de la alcantarilla y el tramo de placa huella priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.2.7 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 4064 de 2023 vereda la esperanza

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde la OAC propone cambiar el tramo de placa huella en concreto por un segundo box culvert, justificando que es de mayor prioridad para la comunidad intervenir el puente de madera ubicado en las coordenadas que se encuentra en riesgo de colapsar en las coordenadas LAT: N2°25´21,82140" LONG : W72°23´47.96090", por lo cual se comprometen a realizar el balance de obra con el fin de intervenir este punto para su verificación y aprobación por parte de la interventoría, se toma la georeferenciacion del sito a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal

3.2.8 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 3569 de 2023 vereda guacamayas

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de un tramo de placa huella priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.2.9 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de un box culvert y una placa huella en concreto de 65m priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.2.10 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes convenio 4029 de 2023 vereda nuevo Tolima

Se realiza visita de campo en compañía de la OAC con el fin de conocer los puntos priorizados para la ejecución del proyecto, donde se evidencia la necesidad de la construcción de una placa huella en concreto de 65m priorizadas por el INVIAS, se toma la georeferenciacion de los sitos a intervenir. Además, se pone en conocimiento de los miembros de la junta de acción comunal el alcance físico del proyecto y los pasos a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Se realiza la solicitud a la OAC de envió de hojas de vida de personal calificado.

Se reciben, revisan y aprueban hojas de vida de personal.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

3.3.1 Seguimiento Ítems no previstos convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.2 Seguimiento Ítems no previstos convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.3 Seguimiento Ítems no previstos convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.4 Seguimiento Ítems no previstos convenio 3595 de 2023 vereda la carpa

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.5 Seguimiento Ítems no previstos convenio 3745 de 2023 vereda Nuevo Milenio

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.6 Seguimiento Ítems no previstos convenio 4241 de 2023 vereda Caño Blanco 3

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.7 Seguimiento Ítems no previstos convenio 4064 de 2023 vereda la esperanza

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.8 Seguimiento Ítems no previstos convenio 3569 de 2023 vereda guacamayas

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.9 Seguimiento Ítems no previstos convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.3.10 Seguimiento Ítems no previstos convenio 4029 de 2023 vereda nuevo Tolima

Hasta la fecha no se presentan Ítems no previstos, debido a que en estos momentos la obra está pasando por su parte previa administrativa, en la cual se están realizando los balances, cotizaciones materiales, maquinara, equipos y transporte, con el fin de conocer el alcance real del proyecto y ajustar el presupuesto.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

La interventoría se encuentra en el proceso de verificación y aprobación de cotizaciones presentadas por los convenios, es necesario e importante conocer el alcance real de la obra para que de esta manera se pueda iniciar la ejecución del proyecto. Se recalca la importancia de entregar los estudios previos realizados (estudio de suelo CBR y Topografía) con la finalidad de ser estudiados y aprobados, durante esta etapa la interventoría ha dado pleno acompañamiento a las juntas en el proceso de cotizaciones con el fin de trabajar en equipo y poder empezar la ejecución del proyecto en el menor tiempo posible.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA:

4.1.1 Informes Semanales convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta.

4.1.1.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPA-MNI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 1 de l 22/01/2024 al 28/01/2024 — Ultimo Informe Semanal SI: I I

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTERILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M

El proyecto por desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento de Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km del casco urbano y teniendo como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Vulnerado de la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'18.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3533-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.896.378,00	CONTRATO No.	3575-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.896.378,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 196.896.378		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.896.378	$ 196.896.378		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(El ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar cuadros en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 196.896.378,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 196.896.378,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor debe ratificar la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia, incluidos los estudios y diseños y demás productos contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252100975600 ND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.1.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMANINTSEM-01
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	4/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: .....

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal SI/ X

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTERILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M

El proyecto por desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km de la casco urbano y tenido como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y utilizado de la vereda Guacamayas hasta el punto de referencia final el PR latitud 2°27'3.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hasta la vereda Santa Cecilia.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3563-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.896.378,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.896.378,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 196.896.378		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.896.378	$ 196.896.378		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 196.896.378,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ ..... %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ ..... %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ ..... %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ ..... %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ ..... %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ .....

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 196.896.378,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

AMORTIZACIÓN	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ ..... %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ ..... %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ .....

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % .....
Meta Física Ejecutada % .....
Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia ini	Avance Metas	Trimestre ant sector 1*	Trimestre ant sector 2	Trimestre ant sector ini	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 de Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25200257560CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.1.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA CONTRATACION
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMANIN-15-FR-03
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	11/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CAÑO FLAUTA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS TIPO II Y 3 ALCANTARILLAS TIPO I

El proyecto para desarrollarse e intervenir ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Flauta, tomando como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Caño Flauta cruce con la ruta que conduce a la Macarena, Cachicamo, Puerto Nuevo, Chiripa y para llo-Guaviare en las coordenadas Longitud -72,9848 Latitud 2,3755 y punto de referencia final el PR1+800 ubicado en la ruta terciaria que comunica a la vereda la Carpa – Guaviare en las coordenadas Longitud 72,9765 Latitud 2,3893.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. ALVARO RAMIREZ BAZA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERIAS SAS (30%), JINTAS SAS (70%)		
CONTRATO No.	3503-2023	VALOR INICIAL:	$ 174.962.471,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 174.962.471,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 174.962.471		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 174.962.471	$ 174.962.471		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 174.962.471,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: .....
VALOR FACTURA: $ -

(En el cumplo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 174.962.471,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: .....
VALOR FACTURA: $ -

(En el cumplo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Viguenas	Viguenas Int	Avance Físico	Frente de sector 1	Frente de sector 2	Frente de sector Int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por frente o por sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ..... NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ..... NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ..... NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI ..... NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI ..... NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALEADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALEADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y LA INTERVENTORIA PARA PRESENTAR EL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEOREFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SESOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OBRA FALTA (CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS TIPO II Y 3 ALCANTARILLAS TIPO I).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con las tareas programadas vs metas físicas ejecutadas del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el lineamiento MEP-HUM1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN DE ALCANTARILLA (LAT: N 2° 22' 48,40660" LONG: W 72° 63' 63,12200")



UBICACIÓN DE ALCANTARILLA (LAT: N 2° 23' 0,83340" LONG: W 72° 63' 48,73660")



UBICACIÓN DE ALCANTARILLA (LAT: N 2° 23' 11,13040" LONG: W 72° 63' 41,66610")



UBICACIÓN DE ALCANTARILLA (LAT: N 2° 23' 12,72200" LONG: W 72° 63' 39,03710")



UBICACIÓN DE ALCANTARILLA (LAT: N 2° 23' 12,46410" LONG: W 72° 63' 34,80360")

FOTO 8

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID HERRADA HERRERA NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202057980CND

Original: Informes mensuales Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Consultor, Interventor y Director Territorial.

4.1.1.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL CONSORCIO GUAVIARE JINT	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS TIPO II Y 3 ALCANTARILLAS TIPO II

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José de Guaviare del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Flauta, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Caño Flauta

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. ALVARO RAMIREZ DAZA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTING SAS (70%)		
CONTRATO No.	3533-2023	VALOR INICIAL:	$ 174.962.471,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 174.962.471,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 174.962.471		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 174.962.471	$ 174.962.471		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la tabla anterior corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA ($):	$ 174.962.471,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 174.962.471,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor debe ajustar la meta física aprobada en el programa de obra por ubicación incluyendo los estudios y diseños y demás productos

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-0-5076-025-24:
- INGENIERA CIVIL: Astrid Carolina Vargas Buitrago.
- CONTADOR: Oscar Orlando Caicedo.
- MAESTRO DE OBRA: William Alexander Jimenez Gomez

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR RAÚL VIDIERRA DENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 25202097990CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.1.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA PUBLICA
INFORME BIMANUAL

CÓDIGO	MEP-MNT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	25/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: UNA PLACA HUELLA DE 1200 M

El proyecto para desarrollarse e iniciarse ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento del GUAVIARE, en la Vereda NUEVO TOLIMA, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.448736 longitud: -72.732883 y punto de referencia final en las coordenadas: Latitud: 2.454396, longitud: -72.757259, dicho tramo ubicado en la vía principal de la Vereda Nuevo Tolima

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. GABRIELA IDARRAGA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	4029-2023	VALOR INICIAL:	$ 210.449.188,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 210.449.188,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL EN CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 210.449.188		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 210.449.188	$ 210.449.188		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 210.449.188,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☐

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☐

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 210.449.188,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR
En el mes
Acumulado

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias int	Avance Físico	Trimestre y/o sector 1	Trimestre y/o sector 2	Trimestre y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A .....
EMISIONES:	SI		NO		N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A .....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO :

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA O RQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se ha definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las actividades descritas en el Instructivo MEPI-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITE DE OBRA NUEVO TOLIMA



COMITE DE OBRA NUEVO TOLIMA

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DEL INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25310257560CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad - Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.2 Informes Semanales convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas.

4.1.2.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA Y GERENCIA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MAN-INF-SEM
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	29/01/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 28/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS Y UNA PLACA HUELLA DE 100 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Orquideas teniendo punto de referencia inicial las siguientes coordenadas 2,409070316 y -72,89279653, así mismo teniendo como punto final las siguientes 2,416071448 y -72,90077494

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4034-2023	VALOR INICIAL:	$ 218.488.554,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 218.488.554,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 218.488.554		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 218.488.554	$ 218.488.554		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 218.488.554,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 218.488.554,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR FC	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia inicial	Avance Físico	Trimestre vencido anterior *	Trimestre vencido anterior 2	Trimestre vencido anterior inicial	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se irá diligenciando por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de los contratos de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-INN1-IN-15 de la Intranet de la entidad.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID TERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252120197960 ND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad - Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.2.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MSPI-MN-INFSEM-03
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4/02/2024 (Día Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS Y UNA PLACA HUELLA DE 100 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose de Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Orquideas teniendo punto de referencia inicial las siguientes coordenadas 2,409070316 y -72,89279653, a su vez teniendo como punto final las siguientes 2,416071448 y -72,900077494

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4034-2023	VALOR INICIAL:	$ 218.498.554,00	CONTRATO No.	SITS-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 218.498.554,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 218.498.554		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 218.498.554	$ 218.498.554		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la ultima casilla corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA ($):	$ 218.498.554,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 218.498.554,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Físicas (Programa de Obra) Líneas Base					Meta Físicas Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Físicas Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde a lo exigido en el pliego de condiciones.

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por ejecución incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de lo contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO MOYA
Matrícula Profesional No.: 25202057950CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.2.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL META
GESTIÓN SECTORIAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPLANIN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI/NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS Y UNA PLACA HUELLA DE 100 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Orquideas teniendo punto de referencia inicial las siguientes coordenadas 2,4090703 16 y -72,89279653, a su vez teniendo como punto final las siguientes 2,41607 1448 y -72,90007 7494

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS		
INTEGRANTES:	PDTE. CAMILO GALEANO CUBILLOS		
CONTRATO No.	4004-2023	VALOR INICIAL:	$ 218.488.554,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 218.488.554,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/07/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 218.488.554		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 218.488.554	$ 218.488.554		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 218.488.554,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 218.488.554,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	.....	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALEADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALEADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE BOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEO REFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SESO LICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OBRA O REQUIDEAS (CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS Y UNA PLACA HUELLA DE 100MI).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPHIM1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION APROX. INICIO DEL RAMO PLACA HUELLA (LAT: N 2° 24' 32,82210" LONG: W72°



LOCALIZACION APROX. FIN DEL RAMO PLACA HUELLA (LAT: N 2° 24'33,66820" LONG: W72°62'33,41610")



LOCALIZACION ALCANTARILLA (LAT: N 2° 24'43,64820" LONG: W72°62'41,70820")



LOCALIZACION ALCANTARILLA (LAT: N 2° 25'6,88020" LONG: W72° 64'28,28710")

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID HERRADA NIÑO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-97995 CND

Original: Interventoría de Interventoría. Grupo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Conservación, Contratista, Interventoría, Director Territorial.

4.1.2.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MNI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS Y UNA PLACA HUELLA DE 100 M

El proyecto para desarrollarse esta ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose de Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Orquideas teniendo punto de referencia inicial las siguientes coordenadas 2,4090703 16 y -72,8927 9653, a su

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
INTEGRANTES: PDTE. CAMILO GALEANO CUBILLOS
CONTRATO No. 4034-2023 VALOR INICIAL: $ 218.498.554,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 218.498.554,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150
INTEGRANTES: JPS INGENIERIA SAS (30%), INTING SAS (70%)
CONTRATO No. 5075-2023 VALOR INICIAL: $ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/03/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 218.498.554		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 218.498.554	$ 218.498.554		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 218.498.554,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 218.498.554,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Líneas Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Cantidad Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por ruta en la cual licitó los estudios y diseños y demás preliminares

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI	.....	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-0-6076-016-24:
- INGENIERO CIVIL: Diego Armando Velazco.
- CONTADOR: Yedmi Andrea Cárdenas Arenas.
- CONTADOR: Wilson Arnulfo Herrera Urrutia.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPIMN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HERNAN TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202057960CND

Original: Informe mensual de interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.2.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMANI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI/NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS Y UNA PLACA HUELLA DE 100 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Orquideas tomando punto de referencia inicial las siguientes coordenadas 2,4090703 16 y -72,89279653, a su vez tomando como punto final las siguientes 2,41607 1448 y -72,90007 7494

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS		
INTEGRANTES:	PDTE. CAMILO GALEANO CUBILLOS		
CONTRATO No.	4004-2023	VALOR INICIAL:	$ 218.488.554,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 218.488.554,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/07/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 218.488.554		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 218.488.554	$ 218.488.554		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 218.488.554,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 218.488.554,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector n	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO : .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA ORQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Este grama gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO VEREDA ORQUIDEAS



COMITÉ OPERATIVO VEREDA ORQUIDEAS



COMITÉ OPERATIVO VEREDA ORQUIDEAS

NOTA: Las cantidades y viabres consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DEL INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO MOYA Matrícula Profesional No.: 25202078960 ND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.3 Informes Semanales convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado.

4.1.3.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINT-INFSEM
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 28/01/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 28/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTERILLA Y UNA PLACA HUELLA DE TOM

proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento del GUAVIARE, en la Vereda CAÑO DORADO, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.473262, longitud: -72.892751 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.480241, longitud: --72.891572, dicho tramo ubicado en la faja de marginal derecha de la carpa

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4067-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.457.186,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195.457.186,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTEAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 195.457.186		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.457.186	$ 195.457.186		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA ($): $ 195.457.186,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 195.457.186,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORIVO	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* En la columna identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás actividades contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): ....
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEP-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DEL INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202057980CND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad - Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.3.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINF-INFSEMA
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	4/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 de l 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal ISI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTERILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 7 M

proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento del GUAVIARE, en la Vereda CAÑO DORADO, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.473262, longitud: -72.892751 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.480241, longitud: - 72.891572, dicho tramo ubicado en la ruta cerro azul a vereda la campa

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4057-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.457.136,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195.457.136,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 195.457.136		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.457.136	$ 195.457.136		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 195.457.136,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN $ %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 195.457.136,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia n+1	Avance Meta	Trimestre sector 1	Trimestre sector 2	Trimestre sector n+1	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por urgencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe indicar la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS. METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo IMEPI-IN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO MOYA
Matrícula Profesional No.: 25220257560CND

Original: Informe mensual de Interventor a Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.3.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS REGIONALES Y DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMANIN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 05/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI/NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 70 M

proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento de GUAVIARE, en la Vereda CAÑO DORADO, tomado como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.473262, longitud: -72.892751 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.480241, longitud: -72.891572, dicho tramo ubicado en la alcantarilla ubicada en la quebrada la carpa

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO		
INTEGRANTES:	PDTE. SANDRA MILENA JIMENEZ ROBLES		
CONTRATO No.	4067-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.457.186,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195.457.186,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTING SAS (70%)		
CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTEADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 195.457.186		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.457.186	$ 195.457.186		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195.457.186,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☐

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☐

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 195.457.186,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Ausencia o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias ant.	Avance Físico	Trimestre vs sector 1	Trimestre vs sector 2	Trimestre vs sector ant.	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el ausence físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ..... NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ..... NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ..... NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ..... NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEO REFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC CAÑO DORADO (CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 70 M).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema aquí debe será definido por el interventor de acuerdo con la meta física aprobada programada vs meta física ejecutada de la contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPHIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización inicio de placa huella (LAT: N 2° 28 31,13650" LONG: W 72° 53' 25,04080")



Ubicación de construccion de alcantarilla (LAT: N 2° 28' 40,94140" LONG: W 72° 53' 27,94140")

FOTOS

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202057960CND

Original Informe mensual de Interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.3.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 70 M

proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE de ldepartamento de lGUAVIARE, en la Vereda CAÑO DORADO, teniendo como punto de referencia lnicialen las coordenadas: latitud: 2.473262,

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. SANDRA MILENA JIMENEZ ROBLES			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTING SAS (70%)		
CONTRATO No.	4067-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.457.186,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195.457.186,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTEAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 195.457.186		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.457.186	$ 195.457.186		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 195.457.186,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 195.457.186,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Líneas Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por ubicada lacividad los estudios y diseños y demás productos

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-017-24:
- INGENIERO CIVIL: Gilberto Sanabria Velázquez.
- CONTADOR: Manyi Brigitte Almanza Navarro.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPHMN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 25302097990CND

Original: Informe mensual de Interventor a Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.3.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MER-ANT-HN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 de l 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI ✓ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 70 M

proyecto para desarrollarse en el tramo ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento de GUAVIARE, en la Vereda CAÑO DORADO, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.473252, longitud: -72.892751 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.480241, longitud: --72.891572, dicho tramo ubicado en la vía cerro azul la vereda la carpa

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. SANDRA MILENA JIMENEZ ROBLES			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	4057-2023	VALOR INICIAL:	$ 195.457.136,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195.457.136,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 195.457.136		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195.457.136	$ 195.457.136		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 195.457.136,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 195.457.136,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I.C	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO ....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA ORQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de los contratos de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEP-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO CAÑO DORADO



COMITÉ OPERATIVO CAÑO DORADO

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25210057560CND

Original informe mensual de Interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.4 Informes Semanales convenio 3595 de 2023 vereda la carpa.

4.1.4.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA GESTION PUBLICA
INFORME BIMANUAL

CÓDIGO	MEPMINT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	28/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 de 1 22/01/2024 al 28/02/2024 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal 54

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE Box Culvert 3X3 DOBLE LONGITUD 6M

proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda La Carpa teniendo punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.462448 longitud: -72.932411 y punto de referencia final en las coordenadas: Latitud: 2.453387 , Longitud: -72.947420, dicho tramo ubicado en la Ruta la carpa a la rompida.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARPA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3595-2023	VALOR INICIAL:	$ 222.068.440,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 222.068.440,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 222.068.440		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 222.068.440	$ 222.068.440		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 222.068.440,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el cuerpo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el cuerpo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 222.068.440,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I.C	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ..... Avance o Atraso Físico %: .....
Meta Física Ejecutada %: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Metas	Trimestre sector 1	Trimestre sector 2	Trimestre sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Este esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	FIRMA NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 252020579602 ND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad - Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.4.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MGP-MNT-INS-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/02/2024 (DD/MM/AAAA)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: .....

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 de l 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal ISI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE Box Culvert 3X3 DOBLE LONG DE 6M

proyecto para desarrollarse encontrado ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda La Carpa teniendo punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.462648 longitud: -72.932411 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.453387, longitud: -72.947420, dicho tramo ubicado en la vía la carpa la pomona.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARPA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3696-2023	VALOR INICIAL:	$ 222.068.440,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 222.068.440,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 222.068.440		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 222.068.440	$ 222.068.440		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 222.068.440,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ .....

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ .....

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 222.068.440,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: .....
Meta Física Ejecutada %: .....
Avance o Atraso Físico %: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencia inicial	Avance Físico	Trimestre anterior 1*	Trimestre anterior 2	Trimestre anterior inicial	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará las metas físicas aprobadas en el programa de obra por vigencia incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por ítem o ylo sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPHIN1-IN-15 de la Guía de interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DEL INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25212267960 ND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.4.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MN-INT-5-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	11/02/2024 (dd / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI X (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE Box Culvert 3X3 DOBLE LONG DE 6M

proyecto para desarrollarse en el corregimiento ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda La Carpa teniendo punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.462448 longitud: -72.932411 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.453387, longitud: -72.947420, dicho tramo ubicado en la vía la carpa a la trompida.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARPA		
INTEGRANTES:	PDTE. SIXTO ROJAS VALENCILLA		
CONTRATO No.	3595-2023	VALOR INICIAL:	$ 222.068.440,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 222.068.440,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (30%), INTINOSAS (70%)		
CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 222.068.440		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 222.068.440	$ 222.068.440		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA(A):	$	222.068.440,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA(B):	$	-	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 222.068.440,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO ....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PRO PUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEO REFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC LA CARPA (CONSTRUCCION DE Box Culvert 3X3 DOBLE LONG DE 6M).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema aquí debe ser diligenciado por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo IMEP-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



IDENTIFICACION DE SITIO A INTERVENIR (LAT: N2°27'37,60290" LONG :W72°56'5,64870")



IDENTIFICACION DE SITIO A INTERVENIR

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA: 
	NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO MOYA
	Matrícula Profesional No.: 25202267-56DCND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.4.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META. SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE Box Culvert 3X3 DOBLE LONG DE 6M

proyecto para desarrollarse en la vereda ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda La Carpa teniendo punto de referencia Inicial en las coordenadas: latitud: 2.462448 longitud: -72.932411 y punto

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARPA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PTE. SIXTO ROJAS VALENCIA LA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERIAS AS (80%) - INTING SAS (20%)		
CONTRATO No.	3596-2023	VALOR INICIAL:	$ 222.068.440,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO	$ 222.068.440,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 222.068.440		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 222.068.440	$ 222.068.440		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al saldo total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA ($):	$	222.068.440,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($):	$	-	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 222.068.440,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por ruta en la licitación de estudios y diseños y demás provisiones

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-018-24:
- INGENIERO CIVIL: Diego Armando Velazco.
- CONTADOR: Mayerli González Acevedo.
- MAESTRO DE OBRA: Cesar Ramiro Montenegro Ávila.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 2520209799DCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.4.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MN-INFS-FR-03
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	25/02/2024 (dd / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI X (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE Box Culvert 3X3 DOBLE LONG DE 6M

proyecto para desarrollarse en el corregimiento ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda La Carpa teniendo punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.462448 longitud: -72.932411 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.453387 , longitud: -72.947420, dicho tramo ubicado en la vía la carpa a la trompida.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARPA		
INTEGRANTES:	PDTE. SIXTO ROJAS VALENCILLA		
CONTRATO No.	3595-2023	VALOR INICIAL:	$ 222.068.440,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 222.068.440,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (30%), INTINCSAS (70%)		
CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 222.068.440		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 222.068.440	$ 222.068.440		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA(A):	$	222.068.440,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA(B):	$	-	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 222.068.440,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1*	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA ORQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se diligencia por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:  NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO MOYA Matrícula Profesional No.: 25202267-56DCND

Original: Informe mensual de Interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.5 Informes Semanales convenio 3745 de 2023 vereda Nuevo Milenio.

4.1.5.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MGP-MN1-4N-15-4R-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 de l 22/01/2024 al 28/01/2024 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE Box Culvert 1X2 LONG DE 7 M

proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Nuevo Milenio teniendo punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.436901 longitud: -72.457824 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.429311, longitud: -72.448267, de la cual que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda Nuevo Milenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3745-2023	VALOR INICIAL:	$ 204.844.167,00	CONTRATO No.	5015-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 204.844.167,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 204.844.167		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 204.844.167	$ 204.844.167		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 204.844.167,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 204.844.167,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IAC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Hasta:	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por la cual ha recibido los estudios y diseños y demás productos contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. Se debe incluir la información por tramo y/o sector.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo IMEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252202257960 ND

Original: Informe mensual de interventor a Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.5.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPMINF-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 4/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 29/01/2024 al ######## Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE Box Culvert 1X2 LONG DE 7M

proyecto para desarrollarse encontrara ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose de Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Nuevo Milenio teniendo punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.436901 longitud: -72.457824 y punto de referencia final en las coordenadas: Latitud: 2.429311 , longitud: -72.448267, de la ruta que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Ebus pasando por la Vereda Nuevo Milenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3745-2023	VALOR INICIAL:	$ 204.844.167,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 204.844.167,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 204.844.167		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 204.844.167	$ 204.844.167		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acorde a lo facturado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA ($):	$ 204.844.167,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 204.844.167,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Físicas (Programa de Obra) Línea Base					Meta Físicas Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por ubicación incluido los estudios y diseños y demás proyectos contemplados contractualmente y el avance físico semanal alcanzado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde a lo exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ..... NO	NA	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	NA	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ..... NO	NA	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	NA	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ..... NO	NA	.....
VERTIMIENTOS:	SI ..... NO	NA	.....
EMISIONES:	SI NO	NA	
OTROS (Especificar cual)	SI ..... NO	NA	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DEL INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202257560CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.5.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-ANT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	1/02/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 de l 5/02/2024 al 11/02/2024 Ultimo Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE BOX CULVERT 1X2 LONG DE 7 M Y PLACA HUELLA DE 60 ML

proyecto para desarrollarse encontrara ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose de Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Nuevo Milenio teniendo punto de referencia Inicial en las coordenadas: latitud: 2.436901 longitud: -72.457824 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.429311, longitud: -72.448267, de la ruta que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda Nuevo Milenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. ANA MIRIAM OSORIO GUEVARA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINGSAS (70%)		
CONTRATO No.	3745-2023	VALOR INICIAL:	$ 204.344.167,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 204.344.167,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 204.344.167		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 204.344.167	$ 204.344.167		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA(A): $ 204.344.167,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA(B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 204.344.167,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Ausencia o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEO REFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC NUEVO MILENIO (CONSTRUCCION DE BOX CULVERT 1X2 LONG DE 7M Y PLACA HUELLA DE 60M).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INICIO APROX DE TRAMO PLACA HUELLA (LAT: N 2° 25'42,78400" LONG: W72° 26'56,12770")



FINAL APROX DE TRAMO PLACA HUELLA (LAT: N 2° 25'46,23510" LONG: W72° 26'54,87200")



UBICACIÓN BOX CULVERT (LAT: N 2° 25'38,55440" LONG: W 72° 25'28,09750")

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÉCTOR DAVID TERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252035979600ND

Original: Informe mensual de Interventor a Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.5.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 de l 12/02/2024 al 18/02/2024. Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE BOX CULVERT 1X2 LONG DE 7M Y PLACA HUELLA DE 60 ML

proyecto para desarrollarse en el sector ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Nuevo Milenio la cual tiene como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.436901 y longitud: -72.457824 y

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. ANA MIRANO SORIO GUEVARA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTING SAS (70%)		
CONTRATO No.	3745-2023	VALOR INICIAL:	$ 204.844.167,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 204.844.167,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTEAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 204.844.167		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 204.844.167	$ 204.844.167		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 204.844.167,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 204.844.167,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por ruta en la cual incluido los estudios y diseños y demás preliminares

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-019-24:
- INGENIERO CIVIL: Edwin Alberto Muñoz Velosa.
- INGENIERO CIVIL: Fabian Arley Vargas Espinoza.
- CONTADOR: Sandy Johana Espitia.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR DARIO TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 252020197990CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial.

4.1.5.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINT-IN-IS-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	25/02/2024 (Dd / Mm / Aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN COREZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE BOX CULVERT 1X2 LONG DE 7 M Y PLACA HUELLA DE 60 ML

proyecto para desarrollarse en el sitio ubicado en la zona rural del Municipio de San Jose de Guaviare del Departamento de Guaviare, en la vereda Nuevo Milenio teniendo punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.436901 y longitud: -72.457824 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.429311, y longitud: -72.448267, de la vía que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda Nuevo Milenio.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. AMANUEL INOSORIO GUEVARA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	3745-2023	VALOR INICIAL:	$ 204.844.167,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 204.844.167,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTEADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 204.844.167		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 204.844.167	$ 204.844.167		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 204.844.167,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

RADO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el cuerpo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

RADO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el cuerpo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 204.844.167,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programada de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Viganuevo	Viganuevo int	Avance Meta	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificara las fisicas aprobadas en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO .....

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA ORQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-HINT-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO NUEVO MILENIO



COMITÉ OPERATIVO NUEVO MILENIO



COMITÉ OPERATIVO NUEVO MILENIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202057950CND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.1.6 Informes Semanales convenio 4241 de 2023 vereda Caño Blanco 3.

4.1.6.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMAN-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	28/01/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 de l 22/01/2024 al 28/01/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 BOX CULVERT 1X2 DE 5 M Y UNA PLACA HUELLA DE 80 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José de Guaviare del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Blanco II, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud: 2,553314 , Longitud: -72,316634 y punto de referencia final las coordenadas latitud: 2,557447 , Longitud: -72,332751, a 44 km del casco urbano, en la ruta que lleva de Caño Blanco II hacia Caño Blanco II.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4241-2023	VALOR INICIAL:	$ 212.580.307,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 212.580.307,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 212.580.307		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 212.580.307	$ 212.580.307		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA(A): $ 212.580.307,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 212.580.307,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 2520267956DCND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.1.6.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-ANT-INT-5-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	4/02/2024 (Día Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 BOX CULVERT 1X2 DE 5M Y UNA PLACA HUELLA DE 80 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José de Guaviare del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Blanco II, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud: 2,553314 , Longitud: -72,316634 y punto de referencia final las coordenadas latitud: 2,557447, longitud: -72,332751, a 44 km del casco urbano, en la ruta que viene de Caño Blanco II hacia Caño Blanco II.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4241-2023	VALOR INICIAL:	$ 212.580.307,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 212.580.307,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 212.580.307		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 212.580.307	$ 212.580.307		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde a lo ejecutado total en el mes)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA ($):	$ 212.580.307,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($):	$	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 212.580.307,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por lugar en la inclusión de estudios y diseños y demás prioridades contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde a lo exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Este esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de lo contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO MOYA
Matrícula Profesional No.: 25202057950CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.6.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA CONTRATACION PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	11/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS (

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN COREJO PEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 BOX CULVERT 1X2 DE 5 M Y UNA PLACA HUELLA DE 80 M

El proyecto para desarrollarse e intervenir ubicado en la zona rural del Municipio de San José de Guaviare del departamento del Guaviare, en la Vereda Caño Blanco II, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud: 2,553314 , Longitud: -72,316634 y punto de referencia final las coordenadas latitud: 2,557447 , Longitud: -72,332751, a 44 km del casco urbano, en la ruta que viene de Caño Blanco II hacia Caño Blanco II.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	P.D.T.E. JARAMILLO REINA MARIA			INTEGRANTES:	JOSE INGENIERIA SAS (30%), INTEVIAS SAS (70%)		
CONTRATO No.	424-2023	VALOR INICIAL:	$ 212.580.307,00	CONTRATO No.	507-5-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 212.580.307,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL EN CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 212.580.307		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 212.580.307	$ 212.580.307		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 212.580.307,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICADO FACTURADO EL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICADO FACTURADO EL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 212.580.307,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias n+1	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector n+1	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEOREFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC CAÑO BLANCO II (CONSTRUCCION DE 1 BOX CULVERT 1X2 DE SIM Y UNA PLACA HUELLA DE 80 M).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las actividades dadas en el instructivo MEP-HIN1-IN-15 de Hitos del Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inicio tramo de placa huella



fin tramo placa huella



Ubicación box culvert

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252020978900 MD

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.6.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 19/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024. Último Informe Semanal (SI / NO) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 BOX CULVERT 1X2 DE 5M Y UNA PLACA HUELLA DE 80 M

El proyecto para desarrollarse en el cual se ubicado en la zona rural del Municipio de San José de Guaviare del departamento de Guaviare, en la Vereda Caño Blanco II, teniendo como punto de referencia inicial las coordenadas latitud: 2,563314 , Longitud: -72,316634 y punto de referencia final las coordenadas latitud: 2,557447, longitud: -72,333751, a 4.4 km de la casco urbano, en la ruta que inicia en Caño Blanco I hacia Caño Blanco II.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. JAIME MORENO MORA			INTEGRANTES:	JES INGENIERIAS SAS (70%) , NTING SAS (30%)		
CONTRATO No.	4241-2023	VALOR INICIAL:	$ 212.580.307,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 212.580.307,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 212.580.307		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 212.580.307	$ 212.580.307		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 212.580.307,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 212.580.307,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Hasta:	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por ejecutar incluidos los estudios y diseños y demás productos.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-020-24:
- INGENIERO CIVIL: Jeiler Diaz .
- CONTADOR: Dayana Rey.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPHMN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR BRAVO TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252020917990CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.1.6.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO INTEGRAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA GESTIÓN PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINT-INTERFO
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/02/2024 (DD / MM / AA)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS I

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META. SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI / I

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNARES FUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 BOX CULVERT 1X2 DE 5M Y UNA PLACA HUELLA DE 30 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José de Guaviare, departamento de Guaviare, en la Vereda Caño Blanco II, tomando como punto de referencia inicial las coordenadas: latitud: 2,553314 , Longitud: -72,316634 y punto de referencia final las coordenadas: latitud: 2,557447, longitud: -72,332751, a 44 km del casco urbano, en la trocha que lleva de Caño Blanco II hacia Caño Blanco II.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO II		
INTEGRANTES:	PRESIDENTE: JAIME MEDINA		
CONTRATO No.	521-2023	VALOR INICIAL:	$ 212.580.307,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR RADICADOS:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 212.580.307,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE: [illegible]		
CONTRATO No.	5375-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR RADICADOS:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 212.580.307		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 212.580.307	$ 212.580.307		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 212.580.307,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 212.580.307,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia mes	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector mes	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por ubicación incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, LA OAC NO PRESENTO BALANCES DE OBRA NI COTIZACIONES PARA LA REALIZACION DE COMITÉ DE OBRA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZAR COMITÉ DE OBRA PARA REVISION DE BALANCE Y COTIZACIONES DE MATERIALES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de l contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Inicio tramo de placa huella	fin tramo placa huella	Ubicación box culvert

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 2520267560CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad, Contratista interventor y Dirección Territorial

4.1.7 Informes Semanales convenio 4064 de 2023 vereda la esperanza.

4.1.7.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MGPI-AN-I-INI-15-FR-03
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 de l 22/01/2024 al 28/01/2024 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT DE 1X1 DE 7M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento de GUAVIARE, en la Vereda LA ESPERANZA, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2,427334, longitud: -72,424483 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2,417161, longitud: -72,365771, de la ruta que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda La Esperanza,

El proyecto por desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento de Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km de casco urbano y teniendo como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Yuca hacia la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'8.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia,

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4064-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.000.789,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	31/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.000.789,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 201.000.789		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.000.789	$ 201.000.789		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde a lo ejecutado en la vigencia, total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.000.789,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 201.000.789,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física apoyada en el programa de obra por ejecutar incluido los estudios y diseños y demás prestables contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (x):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de los contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252020359600 IND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.7.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINFINTSEPRO
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	4/02/2024 (dd/mm/aa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT DE 1X1 DE 7 M

El proyecto para desarrollarse en el tramo ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento de IGUAVIARE, en la Vereda LA ESPERANZA, teniendo como punto de refe re ncia inicial el a las coordenadas: latitud: 2,427334, lo gitud: -7 2,424483 y punto de refe re ncia final en las coordenadas Latitud: 2,417161, lo gitud: -72,36577 1, de la vía que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda La Esperanza,

El proyecto por desarrollarse en el tramo ubicado en la zona rural del Municipio de San José de IGuaviare departamento del Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km de la casco urbano y tenienido como punto de refe re ncia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, lo gitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y utilizado de la vereda Guacamayas hacia el punto de refe re ncia final el PR latitud 2°27'8.82" N, lo gitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia,

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1054-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.000.789,00	CONTRATO No.	507-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.000.789,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 201.000.789		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.000.789	$ 201.000.789		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.000.789,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Girado $	$ 201.000.789,00
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

INDICADOR I.C	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Girado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1*	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector n	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por ugencia incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por ítem y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de lo contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252202057952CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.7.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MSPMINFIN-15-FR-0
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI ✓
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT DE 1X1 DE 7 MY PLACA HUELLA DE 50 ML

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento del GUAVIARE, en la Vereda LA ESPERANZA, tomando como punto de referencia la bitácora con las coordenadas: latitud: 2,427 334, longitud: -72,424483 y punto de referencia final con las coordenadas: Latitud: 2,417 161, longitud: -72,365771, de la vía que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda La Esperanza.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. JHON FREDY COTES PINTO			INTEGRANTES:	JES INGENIERIA SAS (50%), MCG SAS (50%)		
CONTRATO No.	106-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.000.789,00	CONTRATO No.	507-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.000.789,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 201.000.789		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.000.789	$ 201.000.789		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.000.789,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 201.000.789,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias ini	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector ini	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará en la física aprobada en el programa de obra por vigencia incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEOREFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC LA ESPERANZA (CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT DE 1X1 DE 7M Y PLACA HUELLA DE 50 ML).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-HMN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



localizacion de plancha huella (LAT: N 2° 25' 29, 05710" LONG : W72° 24'39,33530")



localizacion box culvert (LAT: N 2° 25' 46,08310" LONG : W72° 26'54,78540")



UBICACIÓN DE BOX PARA SOLICITUD DE CAMBIO DE ALCANCE(LAT: N 2° 25' 17,47500" LONG : W72° 24'41,04520")

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202267950CND

Original: Informe mensual de Interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.7.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MGP-MAN-IN-15-FR-03
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	13/03/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal si/no: SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN COBZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PARÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT DE 1X1 DE 7 M Y PLACA HUELLA DE 50 ML

El proyecto para desarrollarse e ionestra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE de l departamento de l GUAVIARE, e n la Vereda LA ESPERANZA, te niendo como punto de re ferencia inicial e n las coordenadas: latitud: 2,427334, longitud: -72,424483 y punto de re ferencia final e n las coordenadas Latitud: 2,417161, longitud: -72,395771, de la ruta que co ndu ce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda La Esperanza.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	EDITE JHON ELBER YOS RTEGA PINTO			INTEGRANTES:	JOSE INGENIERIAS&CONS. LTDA (50%) - JTINGSAS (50%)		
CONTRATO No.	405+2023	VALOR INICIAL:	$ 201.000.789,00	CONTRATO No.	507-5-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.000.789,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
Obra	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 201.000.789		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.000.789	$ 201.000.789		
Interventoría	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.000.789,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el ejemplo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el ejemplo de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 201.000.789,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR AIC	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias ini	Avance Físico	Tramo y/o sector 1*	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector ini	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencias incluidos los estudios y diseños y demás prestaciones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO NUMERO: SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO NUMERO: SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	.....	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	.....	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	.....	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	.....	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	.....	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OBRA MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-021-24:
- INGENIERO CIVIL: Jorge Eliecer Bernal.
- CONTADOR: Claudia Quiroga Cano.
- MAESTRO DE OBRA: Jorge Eliecer Bernal.

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INICIO DE OBRA MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-0032-24.

REMISIÓN DE DISEÑO DE VALLA INFORMATIVA MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-043-24.

REMISIÓN DE MODELOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-053-24.

SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO Y ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO MEDIANTE OFICIO CG-O-5076-069-24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEP-HAN-1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____
NOMBRE: VICTOR DAVID SERRADENEGRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-209758 CND

Original: Informe para el Interventor, Archivo de Gestión del Invías.
Copia: Líder Técnico, Sobrestante de Sostenibilidad, Gerencia, Interventor y Director Territorial.

4.1.7.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPHNM1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	25/02/2024 (Día | Mes | Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT DE 1X1 DE 7M Y PLACA HUELLA DE 50 ML

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento del GUAVIARE, en la Vereda LA ESPERANZA, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2,427334, longitud: -72,424483 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2,417161, longitud: -72,365771, de la vía que conduce de Guacamayas hacia la vereda Puerto Flores pasando por la Vereda La Esperanza.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. JHON FREDY CORTED PINTO			INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (30%), INTING SAS (70%)		
CONTRATO No.	4064-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.000.789,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.000.789,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 201.000.789		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.000.789	$ 201.000.789		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.000.789,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 201.000.789,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IAC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por ejecutar incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITEO PERATIVO EN LA VEREDA O REQUISITOS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA.

X. GRAFICA AVANCE META FÍSICA PROGRAMADA VS META FÍSICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo IEP HAM-I-M-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ DE OBRA LA ESPERANZA



COMITÉ DE OBRA LA ESPERANZA

FOTOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID HERRADA ENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-057-SSOCND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirector de Sostenibilidad, Contratista, Interventoría, Director Técnico.

4.1.8 Informe Semanal convenio 3569 de 2023 vereda guacamayas.

4.1.8.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMINT-INFSEM-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 28/01/2024 (Numeración consecutiva) Ultimo Informe Semanal 12 I-1

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (longitud aproximada 120 m)

El alcance de proyecto consiste en realizar la construcción de 120 m de placa huella en la vereda guacamayas en la vía comprendida entre guacamayas y trueno mirolindo - puerto flores, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3569-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.076.790,00	CONTRATO No.	5076-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.076.790,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 199.076.790		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.076.790	$ 199.076.790		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (1):	$ 199.076.790,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (2):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 159.076.790,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IVC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (Año)	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El ítem de la meta física es la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia (incluido los estudios y diseños y demás actividades contempladas contractualmente y el alcance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de l contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEP-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DEINTERVENTORIA
CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	FIRMA NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO MOVA Matricula Profesional No.: 25202057980CND

Original: Informe mensual de Interventor a Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.8.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEP-MAN-IN-15-FR-J
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	4/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI OBJETO TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (longitud aproximada 120 m)

El alcance de proyecto consiste en realizar la construcción de 120 m de placa huella en la vereda guacamayas en la vía comprendida entre guacamayas y nuevo milenio - puerto lores, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del instituto nacional de vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	568-2023	VALOR INICIAL:	$ 159.076.750,00
FECHA DE INICIO:	5/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 159.076.750,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	571-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.931.139,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.931.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSO POR VIGENCIA	$ -	$ 159.076.750		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 159.076.750	$ 159.076.750		
INTERVENTORIA	RECURSO POR VIGENCIA	$ -	$ 345.931.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.931.139	$ 345.931.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 159.076.750,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRUSO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ____ NO ____

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....
PERIODO FACTURADO: .....
VALOR FACTURA: $ -

(En el cuenta de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 159.076.750,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

AMORTIZACIÓN	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	% .....
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	% .....
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ____ NO ____

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....
PERIODO FACTURADO: .....
VALOR FACTURA: $ -

(En el cuenta de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % .....

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias ant	Avance Física	Inversión sector 1	Inversión sector 2	Inversión sector ant	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El inversor identificará metas físicas aprobadas en el programa de obra por vigencia incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por ítem y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DEPÓSITOS	
	PERMISO NUMERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO NUMERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

PAGUA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPIMN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 25202257950CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.8.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MIP-MAN-INTERVENTORÍA-FR-01
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/02/2024 (dd/mm/aaaa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META. SEMANA No.: 3 del 05/02/2024 al 11/02/2024. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN COZZO UPEGUI. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (longitud aproximada 1200 m)

El alcance de proyecto consiste en realizar la construcción de 1200 m de placa huella en la vereda guacamayas en la vía comprendida entre guacamayas y nuevo milenio - puerto flores, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIONCOMUNAL VEREDA GUACAMAYAS		
INTEGRANTES:	PDTE. JAIR TAPIERO MARULANDA		
CONTRATO No.	2569-2023	VALOR INICIAL:	$ 199'076.750,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199'076.750,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345'560.139,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345'560.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES EN CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 199'076.750		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199'076.750	$ 199'076.750		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345'560.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345'560.139	$ 345'560.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199'076.750,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ( ) NO ( )

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ( ) NO ( )

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 199'076.750,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

AMORTIZACIÓN	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programada de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias ant.	Avance Física	Inversión por sector 1	Inversión por sector 2	Inversión por sector ant.	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará las metas físicas aprobadas en el programa de obra por vigencia (incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTE DE DEMATERIALES

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ( ) NO ( ) DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI ( ) NO ( )

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ( ) NO ( )
LICENCIA AMBIENTAL: SI ( ) NO ( )

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cuál)	SI	NO	N/A	

PAGUA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEOREFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC GUACAMAYAS (CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 120 M).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PUNTO INICIAL PLACA HUELLA (LAT: N 2° 26'17,39430" LONG :W 72° 31'0,10400")



PUNTO FINAL DE PLACA HUELLA (LAT: N 2° 26'19,15250" LONG :W 72° 30'55,09060")

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 25202097990CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.8.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPHAN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (base ltd aproximada 120 m)

El alcance de proyecto consiste en realizar la construcción de 120m de placa huella en la vereda guacamayas en la vía comprendida entre guacamayas y nuevo milenio - puerto flores, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. JAIR TAPIERO IMARULANDA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTING SAS (70%)		
CONTRATO No.	3569-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.076.790,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.076.790,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTEAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 199.076.790		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.076.790	$ 199.076.790		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la tabla anterior corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (1): $ 199.076.790,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - ... %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (2): $ - ... %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - ... %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - ... %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - ... %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - ... %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - ... %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - ... %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - ... %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 199.076.790,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IAC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - ... %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - ... %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - ... %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - ... %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ... Avance o Atraso Físico %: ...
Meta Física Ejecutada %: ...

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Hasta:	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor debe ratificar la meta física aprobada en el programa de obra por ubicación incluyendo los estudios y diseños y demás productos

TRAMO Y/O SECTOR 1: ... TRAMO Y/O SECTOR 2: ...
TRAMO Y/O SECTOR (n): ...

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde a lo exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-0-5076-022-24:
- CONTADOR: Sandy Johana Espitia.
- CONTADOR: Yeimi Paola Guerrero Bernal.
- MAESTRO DE OBRA: Rene Méndez Varela.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252020097 99DCND

Original Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copias Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.8.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMANINFSEM
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	25/02/2024 (dd/mm/aa)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

SEMANA No.: 5 de l 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI/ I (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (cantidad aproximada 120 m)

El alcance de proyecto consiste en realizar la la construcción de 120 m de placa huella en la vereda guacamayas en la vía comprendida entre guacamaya y limonal ilo - puerto flores, de acuerdo a las especificaciones tecnicas de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de l Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. JAIR TAPIERO MARULANDA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (30%), JUTAS SAS (70%)		
CONTRATO No.	3999-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.076.750,00	CONTRATO No.	507-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.076.750,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL EL CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 199.076.750		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.076.750	$ 199.076.750		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.076.750,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 199.076.750,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I.C	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA ORQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO GUACAMAYAS



COMITÉ OPERATIVO GUACAMAYAS



COMITÉ OPERATIVO GUACAMAYAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DEL INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO MOYA Matrícula Profesional No.: 25202-257960 ND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.1.9 Informe Semanal convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia.

4.1.9.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MNI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 28/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 1 de l 22/01/2024 al 28/01/2024 — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO PAVON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTERILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M

El proyecto por desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento de Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km del casco urbano y tiene como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y ubicado de la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'8.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	3983-2023	VALOR INICIAL:	$	196.895.378,00	
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	196.895.378,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	SIES-2023	VALOR INICIAL:	$	345.960.139,00	
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	345.960.139,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
		VALOR AMORTIZADO:	$	-	
		SALDO POR AMORTEAR:	$	-	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 196.895.378		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.895.378	$ 196.895.378		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 196.895.378,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 196.895.378,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física / Programa de Obra / Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor debe ratificar la meta física aprobada en el programa de obra por ejecución física de los estudios y diseños y demás actividades contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (x):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252100975600 ND

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.9.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPMINI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 9/02/2024 (Día Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 del 29/01/2024 al ######## Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTERILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M

El proyecto por desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento de Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km de casco urbano y teniendo como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y ubicado de la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'8.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3963-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.895.378,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	31/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.895.378,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 196.895.378		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.895.378	$ 196.895.378		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (a):	$ 196.895.378,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (b):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 196.895.378,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IAC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia la cantidad de estudios y diseños y demás posibles contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (i):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde a lo exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ..... NO	NA	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	NA	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ..... NO	NA	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	NA	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ..... NO	NA	.....
VERTIMIENTOS:	SI ..... NO	NA	.....
EMISIONES:	SI NO	NA	
OTROS (Especificar cual)	SI ..... NO	NA	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DEL INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202257560CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.9.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMANIN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	11/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI [X] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARDS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M

El proyecto por desarrollarse en el vereda ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km del casco urbano y ha sido como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y ubicado de la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'8.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia,

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. Reinel Herreño			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	3563-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.896.378,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.896.378,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 196.896.378		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.896.378	$ 196.896.378		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA(A): $ 196.896.378,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA(B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	BI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 196.896.378,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I-C	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	BI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1*	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector n	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO : .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO : .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEOREFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC SANTA CECILIA (CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M)
CONTACTO CON REPRESENTANTE LEGAL O PRESIDENTE DE LA OAC

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo INEP-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INICIO APROX. TRAMO PLACA HUELLA (LAT: N 2° 26'25,57340" LONG : W72° 30'30,20050")



. TRAMO PLACA HUELLA (LAT : N 2° 27'37,73860" LONG : W72° 27



LOCALIZACION ALCANTARILLA (LAT : N 2° 27'21,25670" LONG : W72° 26'40,59250")

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matricula Profesional No.: 25210357960 ND

Original: Informe mensual de interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad. Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.9.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 19/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M

El proyecto por desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km de casco urbano y trasladado como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y ubicado de la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'8.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia,

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
INTEGRANTES: PDTE. Rehel Herrejo
CONTRATO No. 3583-2023 VALOR INICIAL: $ 196.895.378,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 196.895.378,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150
INTEGRANTES: JPS INGENIERIA SAS (30%), INTINGSAS (70%)
CONTRATO No. 5075-2023 VALOR INICIAL: $ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/03/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 196.895.378		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.895.378	$ 196.895.378		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 196.895.378,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 196.895.378,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por lo que incluirá los estudios y diseños y demás productos

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	.....	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-0-6076-023-24:
-INGENIERO CIVIL: Diego Alejandro Manrique
-CONTADOR: Sandy Johana Espitia.
-CONTADOR: Dolly Yorlev Arias Corredor.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 252020597960CND

Original Informe mensual de interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.9.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMANIN-15-FR-3
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	25/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI X
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARDS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA Y UNA PLACA HUELLA DE 65 M

El proyecto por desarrollarse en el vereda ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare, en la vereda Santa Cecilia a 31 km del casco urbano y ha sido como punto de referencia inicial el PR latitud 2°27'16.54" N, longitud 72°25'54.12" O, en el acceso de la Y uniendo de la vereda Guacamayas hacia el punto de referencia final el PR latitud 2°27'8.82" N, longitud 72°25'26.21" O, hacia la vereda Santa Cecilia,

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. Reinel Herreño			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	3563-2023	VALOR INICIAL:	$ 196.896.378,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.896.378,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 196.896.378		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.896.378	$ 196.896.378		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA(A): $ 196.896.378,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA(B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 196.896.378,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I-C	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector n	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA ORQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Este esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada de los contratos de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo IMEPI-MIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ OPERATIVO SANTA CECILIA



COMITÉ OPERATIVO SANTA CECILIA



COMITÉ OPERATIVO SANTA CECILIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25210257-SOCHO

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad - Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.10 Informe Semanal convenio 4029 de 2023 vereda nuevo Tolima.

4.1.10.1 SEMANA 1 (22 de enero al 28 de enero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPMINFIN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PAGINA	
	FECHA	28/01/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 1 de l 22/01/2024 al 28/01/2024 Último Informe Semanal SI/ Z (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: UNA PLACA HUELLA DE 1.2 KM

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento de GUAVIARE, en la Vereda NUEVO TOLIMA, tenido como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.448736 longitud: -72.732883 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2,454396, longitud: -72,757259, dicho tramo ubicado en la vía principal de la Vereda Nuevo Tolima

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4029-2023	VALOR INICIAL:	$ 210.449.188,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 210.449.188,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 210.449.188		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 210.449.188	$ 210.449.188		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 210.449.188,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 210.449.188,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se establecido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTACTO CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 252020579602 ND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad - Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.10.2 SEMANA 2 (29 de enero al 04 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MSPMANI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/02/2024 (dd / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 2 de l 29/01/2024 al 4/02/2024 Último Informe Semanal SI/NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: UNA PLACA HUELLA DE 120 M

El proyecto para desarrollarse encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE de departamento del GUAVIARE, en la Vereda NUEVO TOLIMA, tenido como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.448736 longitud: -72.732883 y punto de referencia final en las coordenadas: Latitud: 2,454396, longitud: -72,757259, dicho tramo ubicado en la vía principal de la Vereda Nuevo Tolima

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4029-2023	VALOR INICIAL:	$ 210.449.188,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 210.449.188,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL EN CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 210.449.188		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 210.449.188	$ 210.449.188		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 210.449.188,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI [ ] NO [ ]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 210.449.188,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia ini	Avance Físico	Trimestre sector 1*	Trimestre sector 2	Trimestre sector ini	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluidos los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	.....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO :

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS. METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPHIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA: [signature] NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 25202167960 IND

Original: Informe mensual de Interventoría: Archivo de Gestión de INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.1.10.3 SEMANA 3 (05 de febrero al 11 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MAN-INT-5-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	1 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 3 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: UNA PLACA HUELLA DE 1.20 M

El proyecto para desarrollarse se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento de GUAVIARE, en la Vereda NUEVO TOLIMA, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: Latitud: 2.448736 y Latitud: -72.732883 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2.454396, Latitud: -72.757259, dicho tramo ubicado en la vía principal de la Vereda Nuevo Tolima

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. GABRIELA IDARRAGA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	4029-2023	VALOR INICIAL:	$ 210.449.188,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 210.449.188,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 210.449.188		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 210.449.188	$ 210.449.188		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 210.449.188,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☐

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 210.449.188,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADORES	
En el mes	
Acumulado	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI ☐ NO ☐

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia int	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VISITA DE CAMPO CON LA OAC Y ING. CIVIL PROPUESTO PARA LA INTERVENCION.
TOMA DE GEO REFERENCIACION DE LOS PUNTOS A INTERVENIR.
ACLARACION DE DUDAS DEL PRESIDENTE DE JUNTA Y DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
SE SOLICITA EL ENVIO DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS.
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
IDENTIFICACION DE ALCANCE DEL CONTRATO DE LA OAC NUEVO TOLIMA (CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE 120 M).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REVISION PARA APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL TECNICO.
PROGRAMACION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se ha definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-IIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INICIO APROX. TRAMO DE PLACA HUELLA (LAT: N 2° 27'4,337 10" LONG : W72° 43'33,60110")



FIN APROX. DEL TRAMO DE PLACA HUELLA (LAT: N 2° 27'4,35150" LONG : W72° 43'37,94030")

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DEL INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VÍCTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202267SBOCND

Original Informe mensual de Interventor a Archivo de Gestión del INVIAS
Copia Unidad Ejecutora Subdirección de Sostenibilidad Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.10.4 SEMANA 4 (12 de febrero al 18 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPMAN-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 18/02/2024 (Día Mes Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 4 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: UNA PLACA HUELLA DE 120 M

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento del GUAVIARE, en la Vereda NUEVO TOLIMA, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.448736 longitud: -72.732883 y punto de referencia final en las coordenadas Latitud: 2,464396, longitud: -72,757259, dicho tramo ubicado en la vía principal de la Vereda Nuevo Tolima

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	P.D.TE. GABRIELA DARRAGA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERIA SAS (80%), INTING SAS (20%)		
CONTRATO No.	4029-20123	VALOR INICIAL:	$ 210.449.188,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 210.449.188,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTEAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 210.449.188		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 210.449.188	$ 210.449.188		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 210.449.188,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	$ 210.449.188,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: .....
Meta Física Ejecutada %: .....
Avance o Atraso Físico %: .....

Meta Física (Programa de Obra) Líneas Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia, la cual incluido los estudios y diseños y demás provisiones

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL DE LA OAC MEDIANTE OFICIO CG-0-5076-024-24:
-INGENIERO CIVIL: Diego Alejandro Manrique.
-INGENIERO CIVIL: Diego Alejandro Ceron.
-CONTADOR: Sandy Johana Espitia.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZACION DE COMITÉ OPERATIVO PARA APROBACION DE COTIZACIONES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA Matrícula Profesional No.: 252020979 9DCND

Original: Informe mensual de interventor a Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.1.10.5 SEMANA 5 (19 de febrero al 25 de febrero del 2024)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INGENIERIA REGIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MER-MNT-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	25/02/2024 (día/mes/año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No.: 5 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMAN CORZO UPEGUI GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: UNA PLACA HUELLA DE 120 M

El proyecto para desarrollarse e iniciarse ubicado en la zona rural del Municipio de SAN JOSE DE GUAVIARE del departamento del GUAVIARE, en la Vereda NUEVO TOLIMA, teniendo como punto de referencia inicial en las coordenadas: latitud: 2.448736 longitud: -72.732883 y punto de referencia final en las coordenadas: Latitud: 2.454396, longitud: -72.757259, dicho tramo ubicado en la vía principal de la Vereda Nuevo Tolima

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150		
INTEGRANTES:	PDTE. GABRIELA IDARRAGA			INTEGRANTES:	JPS INGENIERÍA SAS (30%), INTINO SAS (70%)		
CONTRATO No.	4029-2023	VALOR INICIAL:	$ 210.449.188,00	CONTRATO No.	5075-2023	VALOR INICIAL:	$ 345.960.139,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 210.449.188,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 345.960.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL EN CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 210.449.188		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 210.449.188	$ 210.449.188		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 345.960.139		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 345.960.139	$ 345.960.139		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Hacer cálculos en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 210.449.188,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPO'S	
Otorgado $	$ 210.449.188,00
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR	
En el mes	
Acumulado	

ANTICIPO'S	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencias	Vigencias int	Avance Físico	Trimestre y/o sector 1	Trimestre y/o sector 2	Trimestre y/o sector int	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO .....

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A .....
EMISIONES:	SI		NO		N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A .....

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO :

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REALIZACION DE COMITE OPERATIVO EN LA VEREDA O RQUIDEAS PARA REVISION DE BALANCE DE OBRA Y COTIZACIONES DE MATERIALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PRESENTACION Y APROBACION DE ORDENES DE COMPRA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se ha definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las actividades descritas en el Instructivo IMEPI-HIN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITE DE OBRA NUEVO TOLIMA



COMITE DE OBRA NUEVO TOLIMA

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DEL INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25310257560CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora - Subdirección de Sostenibilidad - Contratista Interventor y Dirección Territorial

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha no hay maquinaria, ni equipo presentando por el convenio, debido a que no se ha iniciado obra, visto que se está realizando todos los procedimientos administrativos necesarios para el inicio de obra.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Una vez entregada las hojas de vida de los profesionales del convenio con sus respectivos anexos y soportes, la interventoría aprueba las hojas de vida de la ingeniera residente, el maestro de obra y el contador, para ser parte del proyecto, sin embargo el personal que ha realizado el acompañamiento en la etapa de revisión y ajustes es la ingeniera residente de obra y la contadora. A la fecha no han presentado cuenta de cobro por sus honorarios

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Durante el periodo comprendido en el informe, no se ha realizado desembolsos.

4.5 Estado General del Tiempo

A la fecha del presente informe no se tiene registro de estado general del tiempo, debido a que aún no se inician las actividades en el lugar de la obra, se están llevando a cabo actividades de la parte administrativa de los convenios.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

El Organismo de Acción Comunal (OAC) desempeña un papel crucial en la ejecución de proyectos de construcción y desarrollo comunitario. En este contexto, se encarga de llevar a cabo los ensayos de materiales necesarios para garantizar la calidad y seguridad de las obras en curso. Estos ensayos se realizan de acuerdo con las normativas vigentes y el avance de la obra.

La interventoría CONSORCIO GUAVIARE JINT 150, como figura de control y supervisión, verifica meticulosamente los resultados de los ensayos y asegura que se cumplan los estándares establecidos. Además, se implementa un sistema de autocontrol para mantener la integridad y confiabilidad de los procesos.

A la fecha del presente informe no se han realizado ensayo de laboratorio, por lo cual no de lleva un seguimiento.Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

4.6.1 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 3533-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 174.962.471,00
VALOR ACUMULADO: $ 174.962.471,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5078-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 34.992.494,20	28	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 8.748.123,55	28	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 52.488.741,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100036849
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	133%	$ 232.000.000,00	28	9	2023	31	12	2023
Patronal	40%	$ 69.600.000,00	28	9	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	40%	$ 69.600.000,00	28	9	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	40%	$ 69.600.000,00	28	9	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009770 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR POLIZA SEGÚN PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.2 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) | 2 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 4034-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS ORQUIDEAS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 218.498.554,00
VALOR ACUMULADO: $ 218.498.554,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075-2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 43.699.710,80	23	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.924.927,70	23	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 65.549.566,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037056
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	106%	$ 232.000.000,00	23	10	2023	31	12	2023
Patronal	32%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	32%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	32%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009842 — OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR POLIZA SEGÚN PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría: VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.3 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 4067-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 195.457.186,00
VALOR ACUMULADO: $ 195.457.186,00 (incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.091.437,20	27	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.772.859,30	27	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 58.637.155,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037424
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	119%	$ 232.000.000,00	27	10	2023	31	12	2023
Patronal	36%	$ 69.600.000,00	27	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	36%	$ 69.600.000,00	27	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	36%	$ 69.600.000,00	27	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009933 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
se le notifico a la OAC que debe realizar la actualizacion de las polizas según prorroga No.1

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.4 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Convenio 3745 de 2023 Vereda Nuevo Milenio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 3745-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/4/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 210.449.188,00
VALOR ACUMULADO: $ 210.449.188,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 42.089.837,60	23	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.522.459,40	23	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 63.134.756,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037063
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	110%	$ 232.000.000,00	23	10	2023	31	12	2023
Patronal	33%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	33%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	33%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009846 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR POLIZA SEGÚN PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-067990

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. Convenio 3595 de 2023 Vereda la Carpa

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA	21 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 3595-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARPA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CARPA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 222.068.440,00
VALOR ACUMULADO: $ 222.068.440,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 44.413.688,00	5	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 11.103.422,00	3	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 66.620.532,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100036847
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	104%	$ 232.000.000,00	24	10	2023	31	12	2023
Patronal	31%	$ 69.600.000,00	24	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	31%	$ 69.600.000,00	24	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	31%	$ 69.600.000,00	3	11	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009768 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA POLIZA POR PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.6 Seguimiento Garantías y Seguros contrato de Obra Convenio 4241 de 2023 Caño Blanco III

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	21 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 4029-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION CAÑO BLANCO III

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BLANCO III DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 212.580.307,00
VALOR ACUMULADO: $ 212.580.307,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 42.516.061,40	3	11	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.629.015,35	3	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 63.774.092,10	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037327
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	109%	$ 232.000.000,00	3	11	2023	31	12	2023
Patronal	33%	$ 69.600.000,00	3	11	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	33%	$ 69.600.000,00	3	11	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	33%	$ 69.600.000,00	3	11	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009899 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA POLIZA POR PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.7 Seguimiento Garantías y Seguros contrato de Obra Convenio 4064 de 2023 La Esperanza

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEP-MN1-IN-16-FR-12 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 21 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 4064-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201.000.789,00
VALOR ACUMULADO: $ 201.000.789,00 (incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.200.157,80	26	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.050.039,45	26	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.300.236,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037059
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	115%	$ 232.000.000,00	26	10	2023	31	12	2023
Patronal	35%	$ 69.600.000,00	26	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	35%	$ 69.600.000,00	26	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	35%	$ 69.600.000,00	26	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009943 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA POLIZA POR PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.8 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Convenio 3569 de 2023 Vereda Guacamayas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 3569-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199.076.790,00
VALOR ACUMULADO: $ 199.076.790,00 (incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.815.358,00	11	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.953.839,50	11	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.723.037,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100036850
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	117%	$ 232.000.000,00	11	10	2023	31	12	2023
Patronal	35%	$ 69.600.000,00	11	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	35%	$ 69.600.000,00	11	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	35%	$ 69.600.000,00	11	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009771 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR POLIZA SEGÚN PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 3983-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 196.895.378,00
VALOR ACUMULADO: $ 196.895.378,00 (incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.379.075,60	18	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.844.768,90	18	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.068.613,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037003
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	118%	$ 232.000.000,00	18	10	2023	31	12	2023
Patronal	35%	$ 69.600.000,00	18	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	35%	$ 69.600.000,00	18	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	35%	$ 69.600.000,00	18	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009846 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA POLIZA POR PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.6.10 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra convenio 4029 de 2023 vereda Nuevo Tolima.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 4029-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 210.449.188,00
VALOR ACUMULADO: $ 210.449.188,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5075-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	%Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 42.089.837,60	23	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.522.459,40	23	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 63.134.756,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037063
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el hstituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	%Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones	110%	$ 232.000.000,00	23	10	2023	31	12	2023
Patronal	33%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023
contratistas y subcontratistas	33%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023
vehiculos propios y no propios	33%	$ 69.600.000,00	23	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV - 100009846 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el hstituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
SE LE NOTIFICO A LA OAC LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA POLIZA POR PRORROGA No. 01

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría VICTOR DAVID TIERRADENTRO NOVA
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Teniendo en cuenta las características de las obras a ejecutar, no se exige a la OAC presentar un plan de calidad, sin embargo, la interventoría se adoptará medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas mediante los convenios anteriormente mencionados.

Para los estudios topográficos se exigirá al OAC, adjuntar los certificados de calibración de los equipos con los cuales se realizaron los levantamientos topográficos y al final de la ejecución de la obra, se exigirá la entrega de planos RECORD de las obras realizadas en el marco de los convenios.

De acuerdo al diseño de mezcla previamente realizado por cada una de las OAC, se elaborarán tomas de resistencia a los concretos durante las fundiciones, para garantizar la resistencia del concreto clase D (3000 PSI), que se contempla para la obra, así mismo, se verificara en situ de manera permanente la relación agua cemento y grava que se está empleando.

4.8 Otros documentos seguimiento mensual

4.9 • Seguimiento a la inversión del Anticipo

Según la forma y características de los convenios no se contempla anticipos.

4.10 • Seguimiento Programa de Obra

A la fecha no se han presentado y aprobado programaciones de obra, esto hasta que no se tenga claro el balance real de costos del proyecto y sea aprobado por la interventora.

4.11 • Seguimiento Programa de Inversiones

A la fecha no se han presentado y aprobado programaciones de inversiones, esto hasta que no se tenga claro el balance real de costos del proyecto y sea aprobado por la interventoría.

4.12 • Actas de Reunión

Se adjuntan actas de reunión en **ANEXOS DEL CAPITULO 4.**

5 Información Contrato de Interventoría

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	5076 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.
CONTRATISTA	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150
LOCALIZACION	SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR	$ 345.960.139,00
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	23 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	24 DE ENERO DE 2024, 1 MES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	24 DE MARZO DE 2024
% DE EJECUCION FISICA	0,00%
% AVANCE FINANCIERO A LA FECHA	0,00%

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el periodo de tiempo comprendido por el informe se realizaron labores administrativas conjunto con las OAC las cuales se describen a continuación:

5.2.1 convenio 3533 de 2023 vereda caño flauta.

Se realizo visita a la vereda Caño Flauta junto con el presidente de la OAC, con el fin de identificar los sitios a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual contempla la construcción de seis alcantarillas, se aclaran las dudas respecto de alcance del proyecto, se solicita que sean remitidas las hojas de vida de personal requerido e iniciar con las solicitudes de cotizaciones de materiales, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra en el momento.

5.2.2 convenio 4034 de 2023 vereda orquídeas.

Se realiza visita de campo a la vereda Orquídeas, junto con el presidente de la OAC y integrantes del comité de participación ciudadana, con el fin de identificar los sitios a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual contempla la construcción de dos alcantarillas y 100 ml de placa huella, se aclaran las dudas respecto de alcance del proyecto y desvíos a realizar en la ejecución de las obras, se solicita que sean remitidas las hojas de vida de personal requerido e iniciar con las solicitudes de cotizaciones de materiales, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra en el momento.

5.2.3 convenio 4067 de 2023 Vereda Caño dorado.

Se realiza visita de campo a la vereda Caño Dorado, junto con el presidente, vicepresidente, fiscal de la OAC y un integrante del comité de participación ciudadana, con el fin de identificar los sitios a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual contempla la construcción de una alcantarillas y 70 ml de placa huella, se aclaran las dudas respecto de alcance del proyecto y requisitos del personal, se solicita que sean remitidas las hojas de vida de personal requerido, la presidenta informa que ya se encuentra realizando la actualización de cotizaciones, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra en el momento ya que no cuentan con ingeniero civil a la fecha.

5.2.4 Convenio 3745 de 2023 Vereda Nuevo Milenio.

Se realiza visita de campo a la vereda Nuevo Milenio, junto con la presidenta, vicepresidente, dos integrantes del comité de participación ciudadana y el ingeniero residente, con el fin de identificar los sitios a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual contempla la construcción de un Box Culvert y 60 ml de placa huella, se aclaran las dudas respecto de alcance del proyecto y requisitos del personal, expresan que ya enviaron las hojas de vida del personal al correo electrónico de la interventoría, se informa que deben realizar la actualización de las cotizaciones, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Contemplan fecha de inicio de obra para el 19 de febrero de 2024.

5.2.5 Convenio 3595 de 2023 Vereda la Carpa.

Se realiza visita de campo a la vereda La Carpa, junto con el presidente, tesorero y fiscal de la OAC y el ingeniero residente, con el fin de identificar el sitio a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual contempla la construcción de un Box Culvert, se aclaran las dudas respecto de alcance del proyecto ya cuentan con el personal requerido, se ve la necesidad de rediseñar con el fin de contemplar la construcción de box Culvert en el sitio que consideran de mayor relevancia. se solicita que sean remitidas las hojas de vida de personal requerido, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra en el momento.

5.2.6 Convenio 4241 de 2023 Caño Blanco III.

Se realiza visita de campo a la vereda Caño Blanco III, junto con el presidente, tres miembros del comité de participación ciudadana de la OAC y el ingeniero residente, con el fin de identificar el sitio a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual está claro e identificado por la OAC, informan que a la fecha no tienen hoja de vida de maestro. se solicita que sean remitidas las hojas de vida de personal requerido, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos. Informan que a la fecha no les han realizado el desembolso de los recursos del proyecto. La OAC se compromete a realizar el proceso de actualización de cotizaciones.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra en el momento ya que no han recibido desembolso de los recursos.

5.2.7 Convenio 4064 de 2023 La Esperanza.

Se realiza visita de campo a la vereda La Esperanza, junto con el presidente, vicepresidente, tres miembros del comité de participación ciudadana de la OAC y el ingeniero residente, con el fin de identificar el sitio a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual está claro e identificado por la OAC (un box Culvert y 50 ml de placa huella), la OAC solicita se puede cambiar el alcance por dos Box Culvert según la necesidad de la zona. informan que realizaron el envió de hojas de vida al correo de la interventoría., se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos. La OAC se compromete a realizar el proceso de actualización de cotizaciones.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra hasta recibir respuesta del cambio de alcance del proyecto.

5.2.8 Convenio 3569 de 2023 Vereda Guacamayas.

Se realiza visita de campo a la vereda Guacamayas, junto con el presidente y dos miembros del comité de participación ciudadana de la OAC, con el fin de identificar el sitio a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual está claro e

identificado por la OAC (120 ml de placa huella. informan que realizaron el envió de hojas de vida al correo de la interventoría., se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos. La OAC se compromete a realizar el proceso de actualización de cotizaciones.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra.

5.2.9 convenio 3983 de 2023 vereda santa Cecilia.

Se realiza visita de campo a la vereda Santa Cecilia, junto con el presidente, tres miembros del comité de participación ciudadana de la OAC, con el fin de identificar el sitio a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual está claro e identificado por la OAC. se solicita que sean remitidas las hojas de vida de personal requerido, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos. Informan que a la fecha no les han realizado el desembolso de los recursos del proyecto. La OAC se compromete a realizar el proceso de actualización de cotizaciones.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra en el momento ya que no han recibido desembolso de los recursos.

5.2.10 convenio 4029 de 2023 vereda Nuevo Tolima.

Se realiza visita de campo a la vereda Nuevo Tolima, junto con el presidente y dos miembros del comité de participación ciudadana de la OAC, con el fin de identificar el sitio a intervenir, determinar los alcances del convenio el cual está claro e identificado por la OAC (120 ml de placa huella). informan que a la fecha no tienen hoja de vida del ingeniero residente, se realiza la socialización del presupuesto aprobado y los gastos administrativos. La OAC se compromete a realizar el proceso de actualización de cotizaciones.

Se realiza un registro fotográfico y georreferenciación de los puntos a intervenir. Expresan que no tienen claro la fecha tentativa de inicio de obra.

5.3 Informes especialistas y profesionales

No se realizaron informes especializados en el periodo comprendido por el presente informe.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

A la fecha del presente informe no se presenta PAC

5.5 Informe matriz de riesgos.

No.	DESCRIPCION	APLICA	ASIGNACION	OBSERVACION
1	Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR	NO APLICA	Interventoría	Este riesgo es clase general, fuente externa, en etapa de selección-ejecución, riesgo 0, dado que, a la fecha no presenta impacto, además, en el plan de cargas se ajustó el presupuesto hasta la fecha de terminación
2	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del convenio solidario, de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las	NO APLICA	Interventoría	Este riesgo es clase general, fuente interna, en etapa ejecución. Riesgo 0, debido a que, el contrato de interventoría se prorrogó hasta el 24 de marzo del presente año, por lo que está activo, sin embargo, los

	causales previstas en el convenio o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR.			convenios están con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024.
3	Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por la OAC, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR	NO APLICA	Interventoría	Este riesgo es clase especifico, fuente interna, en etapa ejecución. Riesgo 0, debido a que, los convenios se encuentran en etapa de revisión, sin embargo, se ha evidenciado que las cotizaciones de materiales, equipos, transporte, mano de obra aumento, por el cambio de año y el nuevo IPC del año 2024, por lo cual se solicita cotizar nuevamente los materiales, equipos, transporte y mano de obra. la interventoría recomienda, que los presidentes junto con los profesionales asignados realicen los balances de obra para determinar el alcance real del proyecto; es de aclarar que, la interventoría realiza seguimiento semanal, mediante comités operativos y oficios.
4	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del convenio solidario, elaborados por la OAC. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	NO APLICA	Interventoría	Este riesgo es clase especifico, fuente interna, en etapa ejecución. Riesgo 0, debido a que, aun los convenios se encuentran en la etapa de revisión, mediante comités operativos se aprobaron el levantamiento topográfico, estudios de CBR y diseño de mezcla, y se realizaron los desembolsos a los proveedores, basados en los presupuestos ajustados de cada proyecto.
5	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes	NO APLICA	Interventoría	No se presenta este riesgo debido a que los diseños que se aprueban por parte de la interventoría tienen que estar basados estrictamente por la cartilla de obras menores de drenaje del INVIAS para su aprobación.

	realizados por la OAC. Riesgo que asume el INTERVENTOR			
6	Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal de la OAC, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que la OAC ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR	NO APLICA	Interventoría	No aplica ya que la OAC debe remitir hojas de vida de personal solicitado con sus soportes para la revisión y aprobación de la interventoría con cada una de las personas a contratar, donde se puede verificar que cumpla con el perfil exigido en las condiciones del contrato.
7	Riesgo por la la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por la OAC y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo de la OAC que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
9	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
10	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
11	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.

	efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.			
12	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada a la OAC y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
13	Riesgo presentado por la no oportuna suscripción del convenio solidario correspondiente a este proceso de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la suscripción de convenio y/o proceso de selección de la OAC, es un proceso independiente, que podría presentar demoras . Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
14	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
15	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
16	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor,	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se han presentado casos de personal con síntomas de enfermedades contagiosas.

	presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.			
17	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha dado inicio de obra por lo cual no se puede materializar este riesgo.
18	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha presentado casos de orden publico. Es de anotar que en las zonas de intervención se cuenta con grupos al margen de la ley.
19	Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	NO APLICA	Interventoría	A la fecha no se ha aprobado compras ni pagos.

6 Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría:

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Durante el periodo comprendido en este informe se contó con al servicio de alquiler de un vehículo tipo camioneta por un valor de cinco millones de pesos ($ 5.000.000,00). Se adjunta cuenta de cobro.

Ver formato en anexo capítulo 6.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver formato en anexo capítulo 6.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver formato en anexo capítulo 6.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver formato en anexo capítulo 6.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No aplica según el tipo de contrato que se manejó.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 • Seguimiento a la inversión del Anticipo

No se cuenta con anticipo por lo cual no aplica.

6.6.2 • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Ver formato en anexo capítulo 6.

7 Conclusiones y recomendaciones

7.1. Aunque no hubo avances físicos en la construcción durante el periodo de este informe si se llevaron a cabo actividades administrativas como:

Contratación de Personal: Durante el mes de febrero de 2024, se realizaron los procesos de selección y contratación de personal clave para el proyecto. Esto incluyó ingenieros, técnicos, operarios y otros roles necesarios para la ejecución exitosa de la obra.

Cotizaciones y Adquisiciones: Se dedicó tiempo a obtener cotizaciones para los materiales y equipos necesarios. Esto fue fundamental para planificar las compras y asegurar que los recursos estén disponibles cuando se inicie la construcción.

Se evaluaron proveedores y se tomaron decisiones basadas en criterios de calidad, costo y disponibilidad.

Elaboración de Documentación Técnica: Se avanzó en la redacción de documentos técnicos, como planos detallados, especificaciones de construcción y cronogramas.

La revisión y aprobación de estos documentos son pasos cruciales antes de iniciar la obra física.

Preparación del Sitio:

Aunque no se realizaron actividades de construcción propiamente dichas, se llevaron a cabo inspecciones del sitio para evaluar las condiciones del terreno y planificar la ubicación de las estructuras.

Se realizaron estudios topográficos y geotécnicos.

.

…

ANEXOS DEL CAPITULO 4.
ACTAS DE REUNION.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaracion de Dudas Antes de inicio del Proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del proyecto
* profesionales
* Fecha de inicio
* Cotizaciones
* Visita lugar de intervensiones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÒN

* Se realiza Reunión con el presidente de la junta de acción Comunal de la vereda caño Flauta y Se aclaran dudas

* Se informa y se aclara sobre el alcance del Proyecto, ellos confirman que tienen conocimiento del alcance del proyecto (6 alcantarillas y limpieza de 5)

* Sobre los profesionales: se encuentran en busqueda de un maestro de obra, ya cuentan con ingeniera civil y contadora. y queda pendiente Remitir esta información a la interventoria

* Fecha de inicio: No tienen clara la fecha de inicio de obra aún. ya que No cuentan con el Maestro de obra.

* Cotizaciones: Se recomienda a la junta de acción Comunal iniciar con las actividades de ejecución de obra.

* Se visita el lugar y ubicación de las alcantarillas a construir y se toma Registro fotográfico y Coordenadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alvaro Ramirez	presidente	J A C.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de Dudas Antes de inicio del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del proyecto
* Profesionales
* Fecha de inicio
* Cotizaciones
* Dudas de Via alternas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza Reunión con el Presidente de la Junta de acción Comunal de la vereda orquideas y se aclaran dudas y el Comité de participación ciudadana.

* Se informa y se aclara Sobre el alcance del proyecto ellos confirman y tienen Conocimiento del alcance del Proyecto (2 alcantarillas y 100 mL de placa Huellas) -No hay Objecion

* Sobre los profesionales están a la espera de la aprobación de los ingenieros civiles

* Sobre la Fecha de inicio de obra: No tienen claro la Fecha de inicio del proyecto ya que aún No cuentan con el profesional aprobado

* Se presentan dudas sobre cuantos trabajadores tienen que contratar

* Se presentan dudas si se debe Hacer un desvio a las vias alternas.

* Se recomienda descargar los documentos Como presupuesto y diseños para el correcto desarroyo del proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Camilo Guerrero	Presidente	Orquideas	
Jhon Raul	Lopez	comite	Jhon
			Wilder A Bohorquez
Wilder A Bohorquez	comite	comite	
Leonel Roldán	comite	orquideas	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA _____ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de dudas antes del inicio del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del proyecto
* Personal
* Fecha de inicio de la obra.
* Cotizaciones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* La junta de acción tiene claro el alcance del Proyecto (1 Alcantarilla y 70 m)

* Personal: la presidente tiene dudas sobre los Requisitos que debe cumplir el personal Queda como compromiso enviar los requerimientos del personal de la mano de obra No calificada

La p

* Fecha de inicio de la obra: Aún no tienen contemplada la fecha de inicio del Proyecto. Por qué No Encuentran Profesional: Ingeniero Civil

* Cotizaciones: La presidenta de la junta de acción Comunal informa que ya ha estado actualizando las Fechas de las cotizaciones

* Se realiza visita al lugar de intervensión y Se toman las coordenadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Martha Riveros	Vicepresidenta	caño dorado	Martha Riveros
Jose Isidro	Fiscal	Caño dorado	
Sandra jimenez	presidente	Caño dorado	
Yorman Alba Moreno	Comité Operativo	Caño Dorado	Jhorman Alba.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de dudas. Previo al inicio de la obra

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del proyecto
* profesionales
* Fecha de inicio
* cotizaciones
* Visita Lugar de intervensiones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/02/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* La presidente de la JAC tiene claro el alcance del proyecto (60m de placa Huella y 1 Box

* sobre las hojas de vida Aclara que ya se enviaron las hojas de vida al correo de la interventoría

* la fecha de inicio contemplada es el 19 de Febrero

* sobre las cotizaciones, se le informa que se deben realizar las cotizaciones, previo a la obtención de los materiales, y estas presentarlas al comité operativo junto a la interventoría para la aprobación

* visita al lugar a intervenir, se realiza visita al tramo de placa Huella y Box, definidos por la junta de acción comunal.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ana Miriam Osorio	Presidenta		Miriam Osorio
Ervin Novoa	Comited Participacion		Ervin N.
Julio Cesar Tavar B	Comite Participación		
Fabian Harley Vargas	Ing Residente	JAC Nuevo Milenio	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA la Carpa DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de Dudas Antes de inicio del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del proyecto
* Profesionales
* Fecha de inicio
* Cotizaciones
* Visita lugar de intervensiones
* Sugerencia: desvio

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/02/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza Reunión con El presidente de la junta y Se define el alcance. del proyecto: y se concluye que Solo se requiere un pontón

* En cuanto a los Profesionales: ya cuenta con todos los profesionales al servicio y Espera al inicio de obra

* Fecha de inicio: Aun No se contempla Fecha de inicio de obra

* Visita del lugar de intervensiones:

Se realiza visita al lugar de la intervensión y se encuentra qué el box Contemplado es muy poco O su capacidad es insuficiente para lo que se requiere

La Junta de acción Comunal junto a su profesional, sugieren que se realice un Rediseño y se reevalue el Alcance del proyecto y Asimismo el presupuesto. Y No se tiene claridad del tipo de estructura que se Contempló el proyecto. y queda como compromiso Por parte de la Junta de Acción Comunal Revisar la inforMa Ción que se encuentra en el Secop. y emitir un concepto

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Diego Armando Vargas Gomez	Ing. Residente	JAC Vda La Carpa	
HONORIO SUAREZ	TESORERO	JAC LA CARPA	
Raul Aguilar	Fiscal	JAC lacarpa	
Silvio Rojas Valenzuela	presidente	J.A.C lacarpo	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA _____ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de Dudas Antes del inicio del Proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del proyecto
* Profesionales.
* Fecha de inicio
* Cotizaciones
* Visita lugar de intervensiones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* la junta tiene claro el alcance del proyecto
* En cuanto a los profesional hace falta la Hoja de vida del Maestro
* Fecha de inicio: Se cita comité operativo Para el martes 3:00 p.m.
* Cotizaciones: la junta de acción comunal se Compromete a entregar cotizaciones y Ajuste del presupuesto el día ~~Jue~~ Martes
* Se realiza visita y (lugar) se ubica lugar donde se realizarán las intervenciones. y toma delas coordenadas de inicio del tramo Fin del tramo y Box Culvert

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES





FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose Giovanny	Comite		
nicolas Bohorquez			
Jaime Moreno	presidente		
Fernando Agudelo	comite tecnico		
Jerly Duque	Ing Civil		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA _____ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de dudas previo al inicio de obra

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del Proyecto
* Profesionales
* Fecha de inicio
* Cotizaciones
* Visita Lugar intervensiones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/02/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* la presidencia de la junta, tiene claro el alcance del proyecto (1Box y 50m de Placa Huella)
* Sobre las Hojas de vida, la JAC ya las envió al correo de la interventoría.
* la Fecha de inicio contemplada es el
* Sobre las cotizaciones, se les informa que se deben actualizar las cotizaciones
* Se realiza visita al lugar de las intervenciones
* la comunidad desea cambiar el alcance del proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Carlos Pinto Jhonston	Presidente		
Jose RAUL ECHEVERRI			RAUL
Yimi Alexander Peña	Vicepresidente		
Carlos Hely Pareja			
Felix Abelardo Barreto	comite Participacion		
Jorge Bayal	Ingeniero		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año) 07/02/24

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA _____DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de Dudas Antes del Inicio del Proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del Proyecto
* Profesionales
* Fecha de inicio.
* Cotizaciones.
* Visita lugar de intervensiones

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/02/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* Se Realiza reunión con el Presidente de la Junta de acción Comunal de la vereda Guacamayas y se aclaran dudas.

* Se informa y se aclara sobre el alcance del proyecto, ellos confirman que tienen Conocimiento del alcance del proyecto (120 m de placa Huella)

* Sobre los profesionales: ya cuentan con todos los profesionales.

* Fecha de inicio:

* Cotizaciones: se recomienda a la junta de acción Comunal iniciar con las actividades de ejecución de obra.

* Se realiza el lugar y ubicación del tramo de placa Huella., Se toma registro Fotográfico y Coordenadas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maria Evita M.	Comite Participacion	JAC. V Guacamayas	Maria M.
Luz Marina Carolenas	Comite Participacion	JAC. V Guacamayas	Luz Marina C.
Juri Tapiero Murulanda	Presidente	JAC. V Guacamayas	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año) 07/02/24

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA _____ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5076/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración de dudas antes del inicio del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Alcance del proyecto
* Profesionales

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/02/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Reynel Herrera	Presidente	Junta Accion Comunal	
Donaldo Piaviazo	Veedor	comite de participacion	
Yovanni Alvarado	Veedor		
Beganira Hernandez	Beedor	Ambientar	Beganira Hernandez

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXOS CAPITULO 6.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5076 de 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

CONTRATO DE OBRA No.	**CONTRATISTA:**
3533 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA CORREGIMIENTO EL CAPRICHO
4034 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
4067 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
3595 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARPA
3745 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
4241 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
4064 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
3569 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
3983 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
4029 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
VEHICULO	CAMIONETA 4X4 2000 C.C PLACA: JCR 010 MARCA: RENAULT DUSTER CILINDRAJE: 2000cc MODELO 2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Durante el periodo comprendido en este informe se contó con al servicio de alquiler de un vehículo tipo camioneta por un valor de cinco millones de pesos ($ 5.000.000,00). Se adjunta cuenta de cobro.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: 05-11-2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: David Tierradentro
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Firma
Nombre: German Corzo Upegui
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5076 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 de febrero de 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATISTA:
3533 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA CORREGIMIENTO EL CAPRICHO
4034 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS
4067 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
3595 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CARPA
3745 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO
4241 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III
4064 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ
3569 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS
3983 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA
4029 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMCAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																																		% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	David Tierradentro Nova	79789191	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 6.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150	$ 5.202.493,00	$ 362.100	V	SANITAS S.A	7918247321	$ 208.100	COLPENSIONES	7918247321	$ 884.600	$ 208.100			
2	Gloria Carolina Tejada	1019113980	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 5.150.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO GUAVIARE JINT 151	$ 5.715.000,00	$ 397.800	V	NUEVA EPS	7918468727	$ 228.600	PORVENIR	7918468727	$ 971.600	$ 228.600			
3	Carlos Alberto Hernandez	1014232291	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO GUAVIARE JINT 152	$ 2.700.000,00	$ 188.000	V	NUEVA EPS	7918468727	$ 108.000	PROTECCION	7918468727	$ 432.000	$ 108.000			
4	Oscar Osuna	79767223	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO GUAVIARE JINT 153	$ 2.275.374,00	$ 158.400	V	SANITAS S.A	7918247321	$ 91.100	COLPENSIONES	7918247321	$ 364.100	$ 91.100			
5																																																		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 16.050.000																																														

El Interventor adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: DAVID TIERRADENTRO NOVA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Firma
Nombre: GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5076-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No:	**CONTRATISTA:**
3533 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA CORREGIMIENTO EL CAPRICHO
4034 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS
4067 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
3595 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CARPA
3745 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO
4241 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANO BLANCO III
4064 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ
3569 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS
3983 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA
4029 DE 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1447423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 339.040.936	
		C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 6.919.203	
			TOTAL			$ 345.960.139	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 345.960.139**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**feb-24**	$ 40.880.800	$ 7.767.352	$ 48.648.152	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1447423 DE 29/12/2023	$ 297.311.987	$ 297.311.987		
TOTALES		**$ 40.880.800**	**$ 7.767.352**	**$ 48.648.152**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**	

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 1	$ 40.880.800	$ 7.767.352	$ 48.648.152
ACTA 2			
*			
VALOR TOTAL			**$ 48.648.152**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: David Tierradentro Nova
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-097990

Firma
Nombre: GERMÁN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **22/02/2024**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **META**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2793 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VILLA NUEVA JINT 024

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 345.960.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 345.960.139,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 34.596.013,90	27	12	2023		30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 69.192.027,80	27	12	2023		30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 69.192.027,80	27	12	2023		31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 103.788.041,70	31	12	2023		31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100.218.770

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **30/12/2023**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **22/02/2024**
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 34.596.013,90	27	12	2023		23	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 69.192.027,80	27	12	2023		23	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 69.192.027,80	27	12	2023		23	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 103.788.041,70	23	1	2023		23	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100.218.770

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 34.596.013,90	27	12	2023		24	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 69.192.027,80	27	12	2023		24	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 69.192.027,80	27	12	2023		24	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 103.788.041,70	24	3	2024		24	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100.218.770

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre **CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES**
Director de Interventoría
Interventoria: **CONSORCIO VILLANUEVA JINT 024**

Firma

Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-250038 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23/01/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **5076 DE 2023**

OBJETO:

"Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera Para Los Convenios Solidarios Suscritos Entre El Invias Y Los Organismos De Acción Comunal Para El Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Vías Terciarias Del Departamento De Guaviare En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total – Lote 1"

INTERVENTOR: **CONSORCIO GUAVIARE JINT 150**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**

RESOLUCIÓN No.: 13 DE 5/01/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: **4241-2023/3745-2023/4064-2023/3569-2023/3983-2023/3533-2023/4034-2023/4067-2023/3595-2023/4029-2023**

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III**
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO MILENIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAMAYAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA CECILIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO FLAUTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORQUIDEAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CARPA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de diciembre de 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Hasta 31 de diciembre de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 345.960.139,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 345.960.139,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2024						TOTAL	
											Ene 23-31		Feb 1-29		Mar 1-22			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Director de interventoría	$ 6.900.000,00	$ -	1,50	$ 10.350.000,00			-	$ -	0,20	$ 1.380.000	1,00	$ 6.900.000	0,30	$ 2.070.000	1,50	$ 10.350.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.150.000,00	$ -	2,00	$ 10.300.000,00			-	$ -	0,50	$ 2.575.000	1,00	$ 5.150.000	0,50	$ 2.575.000	2,00	$ 10.300.000
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 2.700.000,00	$ -	2,00	$ 5.400.000,00			-	$ -	0,50	$ 1.350.000	1,00	$ 2.700.000	0,50	$ 1.350.000	2,00	$ 5.400.000
4	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00	$ -	2,50	$ 9.375.000,00			-	$ -	0,50	$ 1.875.000	1,00	$ 3.750.000	1,00	$ 3.750.000	2,50	$ 9.375.000
5	1	Profesional Ambiental	$ 3.750.000,00	$ -	2,50	$ 9.375.000,00			-	$ -	0,50	$ 1.875.000	1,00	$ 3.750.000	1,00	$ 3.750.000	2,50	$ 9.375.000
	1	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**	$ 7.580.850,00	$ -	1,00	$ 7.580.850,00			-	$ -			0,50	$ 3.790.425	0,50	$ 3.790.425	1,00	$ 7.580.850
6	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.100.000,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.100.000,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Especialista en Ambiental	$ 6.100.000,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.100.000,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO																
12	1	Inspector	$ 2.000.000,00	$ -	20,00	$ 40.000.000,00			-	$ -	3,00	$ 6.000.000	10,00	$ 20.000.000	7,00	$ 14.000.000	20,00	$ 40.000.000
13	1	Inspector SST	$ 2.200.000,00	$ -	4,00	$ 8.800.000,00			-	$ -	1,00	$ 2.200.000	2,00	$ 4.400.000	1,00	$ 2.200.000	4,00	$ 8.800.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																
15	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000,00	$ -	2,00	$ 2.600.000,00			-	$ -	0,50	$ 650.000	1,00	$ 1.300.000	0,50	$ 650.000	2,00	$ 2.600.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 103.780.850**				$ -	$ 17.905.000		$ 51.740.425		$ 34.135.425		$ 103.780.850	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**2,36**	**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 244.922.806**				**$ -**	**$ 42.255.800**		**$ 122.107.403**		**$ 80.559.603**		**$ 244.922.806,00**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024						TOTAL	
											Ene 23-31		Feb 1-29		Mar 1-22			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

		VIATICOS																		
1	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	12,00	$ 2.400.000,00			-	$ -	2,00	$ 400.000	6,00	$ 1.200.000	4,00	$ 800.000	12,00	$ 2.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															☑	
2	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.000.000,00	Mes	2,00	$ 10.000.000,00			-	$ -	0,50	$ 2.500.000	1,00	$ 5.000.000	0,50	$ 2.500.000	2,00	$ 10.000.000
3	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	24,00	$ 14.400.000,00			-	$ -	4,00	$ 2.400.000	12,00	$ 7.200.000	8,00	$ 4.800.000	24,00	$ 14.400.000
4	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.000.000,00			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 6.000.000	1,00	$ 6.000.000	2,00	$ 12.000.000
5	1	Ensayos de laboratorios.	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	2,00	$ 1.200.000
6	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00			-	$ -	0,50	$ 400.000	1,00	$ 800.000	0,50	$ 400.000	2,00	$ 1.600.000
		OTROS COSTOS																
7	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.700.000,00			-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.350.000	1,00	$ 1.350.000	2,00	$ 2.700.000
8	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	2,00	$ 600.000
9	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	2,00	$ 600.000
10	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	2,00	$ 300.000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 45.800.000,00**				**$ -**	**$ 5.700.000**		**$ 23.050.000**		**$ 17.350.000**		**$ 45.800.000,00**
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ -				$ -	$ -		$ -		$ -		$ -
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 290.722.806,00**				**$ -**	$ 47.955.800		$ 145.157.403		$ 97.909.603		**$ 290.722.806**
	*	Provisión para frentes adicionales(D)				**$ -**				**$ -**	$ -		$ -		$ -		**$ -**
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 290.722.806,00**				**$ -**	$ 47.955.800		$ 145.157.403		$ 97.909.603		**$ 290.722.806**
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 55.237.333,00**				**$ -**	$ 9.111.602		$ 27.579.907		$ 18.602.825		**$ 55.237.333**
	*	Costo Total = (E) + (F)				**$ 345.960.139,00**				**$ -**	**$ 57.067.402**		**$ 172.737.310**		**$ 116.512.428**		**$ 345.960.139**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Teniendo en cuenta la proyeccion de la prorroga No 1 del Contrato de interventoria 2793 de 2023, hasta el 30 de julio de 2023, con el objeto de garantizar la continuidad en la vigilancia y supervisión a la ejecución del Contrato de Obra.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria: CONSORCIO GUAVIARE JINT 150

Firma
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula: **25202-250038 CND**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
