INGENIERIA Y SUMINISTROS

INFORME EJECTIVO ACTA PARCIAL No. 1

EL PRESENTE INFORME CORRESPONDE AL PERIODO ENTRE EL 08 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.



CONTRATO No. 002 DE 2025

CUYO OBJETO ES "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 313 DE 2024 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA."

INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B S.A.S
ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VILLA DE LEYVA- BOYACÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 5
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 5
2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 8
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3.2. ASPECTOS CONTRACTUALES. 8
3.3. ASPECTOS FINANCIEROS 9
3.4. PERSONAL DEL PROYECTO: 9
3.4.1. Personal autorizado por el cliente 9
3.4.2. Personal del contratista. 9
4. ACTIVIDADES 11
4.1. ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR. 11
4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA 15
4.2.1. Actividades realizadas red sanitaria 15
4.2.2. Registro fotográfico 32
4.2.3. Control clima 35
4.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 36
4.4. CONTROL DE CORRESPONDENCIA. 38
4.5. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES. 38
4.6. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA. 38
5. CONCLUSIONES 40

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato 8

Tabla 2 Supervisión del contrato No. 002 de 2025 9

Tabla 3 Personal contractual periodo 9

Tabla 4 Personal operativo contractual periodo 10

Tabla 5 Actividades y cantidades de obra a ejecutar – Alcantarillado residual 11

Tabla 6 Actividades y cantidades de obra a ejecutar – Alcantarillado pluvial 13

Tabla 7 Relación pólizas vigentes contrato de obra. 38

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Mapa de localización de Villa de Leyva en el departamento.. 6

Figura 2 Panorámica satelital del Perímetro y área proyecto. 6

LISTA DE ANEXOS

1. Seguridad y salud en el trabajo - SST
2. Bitácora de obra
3. Registro fotográfico
4. Control de correspondencia
5. Aprobación pólizas
6. Informe seguimiento de calidad.
7. Cronograma y flujo de inversión.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En el marco del Contrato de Obra No. 002 de 2025, celebrado entre el Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva – ESVILLA E.S.P. y la empresa Ingeniería y Suministros C&B S.A.S., identificado con NIT 901.428.270-9 y representado legalmente por el ingeniero Andrés Camilo Peña Sánchez, cuyo objeto es la "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 313 DE 2024 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA", se suscribió el Acta de Inicio el día 08 de julio de 2025, estableciendo un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario.

El valor del contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($484.718.056,04),** con cargo al rubro presupuestal 2.2.2.1.2.02.01.003.01, respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025050013.

La necesidad de esta intervención obedece al estado de deterioro de la red de alcantarillado sanitario existente, construida en materiales obsoletos y con diámetros insuficientes, lo que ha ocasionado rebosamientos, taponamientos y deficiencias en la evacuación de aguas residuales. A esto se suma la carencia de un sistema pluvial en la zona de intervención, lo que genera escorrentías superficiales y encharcamientos durante temporadas de lluvia, afectando la movilidad urbana, la infraestructura vial y la salubridad de los sectores residenciales aledaños.

Este proyecto responde a la necesidad de garantizar un servicio de alcantarillado eficiente y sostenible, en cumplimiento de los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y del Plan de Gestión y Resultados – PGR de ESVILLA E.S.P., mejorando la infraestructura sanitaria y contribuyendo a la calidad de vida de los habitantes del municipio.

El presente Informe Ejecutivo del Acta Parcial No. 1 corresponde al seguimiento técnico, administrativo y financiero del periodo comprendido entre el 08 de julio de 2025 y el 31 de agosto de 2025, con el fin de exponer los avances obtenidos frente al cronograma de obra, las actividades ejecutadas, las novedades surgidas y las medidas de supervisión adoptadas para el cumplimiento del objeto contractual.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El municipio de Villa de Leyva, declarado patrimonio histórico y cultural de la nación, cuenta con un sistema de alcantarillado que en diversos sectores presenta deficiencias hidráulicas, materiales obsoletos y diámetros insuficientes para la adecuada conducción de las aguas residuales. Estas condiciones han ocasionado rebosamientos, taponamientos y afectaciones a la movilidad urbana y a la salubridad pública, principalmente en los sectores de la Calle 11 entre carreras 6 y 8 y de la Carrera 8 entre calles 10 y 11.

Adicionalmente, en la zona de intervención no existe un sistema de alcantarillado pluvial eficiente, lo que genera escorrentías superficiales y encharcamientos durante la temporada de lluvias, con riesgo de afectación a viviendas, espacios públicos y vías de tránsito.

Con el fin de atender esta problemática prioritaria, el Municipio de Villa de Leyva suscribió el Contrato Interadministrativo No. 313 de 2024 con la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva – ESVILLA E.S.P., para aunar esfuerzos en la reposición y optimización de la red de alcantarillado sanitario y la construcción de la red pluvial. Posteriormente, se celebró el Contrato de Obra No. 002 de 2025 con la firma Ingeniería y Suministros C&B S.A.S., por un valor de $484.718.056,04 M/CTE y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, contados a partir del 8 de julio de 2025

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El municipio de Villa de Leyva se encuentra ubicado en la provincia de Ricaurte Alto, departamento de Boyacá, sobre la cordillera Oriental de los Andes colombianos, a una altitud promedio de 2.149 m.s.n.m., con una extensión de aproximadamente 128 km² y una temperatura media anual de 18 °C. Limita al norte con los municipios de Arcabuco y Gachantivá, al oriente con Chíquiza, al sur con Sáchica, y al occidente con Santa Sofía y Sutamarchán.


El área de intervención directa corresponde al casco urbano del municipio, específicamente:

- Calle 11 entre carreras 6 y 8, donde se realizará la reposición y optimización de la red de alcantarillado sanitario.
- Carrera 8 entre calles 10 y 11, donde se ejecutará la construcción del alcantarillado pluvial.

Estas obras impactarán de manera positiva en la movilidad urbana, la prevención de riesgos asociados a inundaciones y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios aledaños, contribuyendo al desarrollo ordenado y sostenible del municipio.

Figura 1.

Mapa de localización de Villa de Leyva en el departamento.

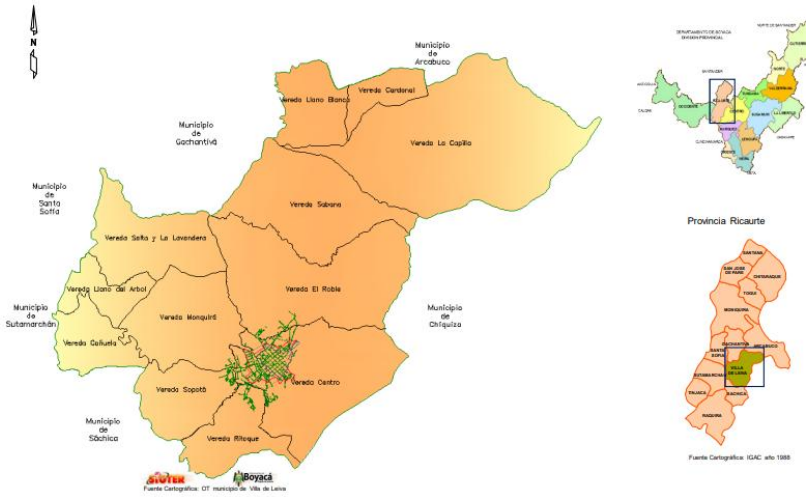

Fuente: *Tomado de* https://planeacion.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/VILLA-DE-LEIVA-VEREDAL.pdf

El siguiente esquema muestra la localización aproximada del proyecto.

Figura 2.

Panorámica satelital del Perímetro y área proyecto



Fuente: *Tomado de Google Earth Pro*

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla la reposición y optimización de la red de alcantarillado sanitario en la Calle 11 entre carreras 6 y 8, así como la construcción del alcantarillado pluvial en la Carrera 8 entre calles 10 y 11, en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá.

Las obras se ejecutarán en cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos por la Entidad Contratante, la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Villa de Leyva – ESVILLA E.S.P., dentro del marco del Contrato Interadministrativo No. 313 de 2024 suscrito con el Municipio de Villa de Leyva.

Este proyecto responde a la necesidad prioritaria de modernizar y fortalecer la infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial, ante el deterioro de las redes existentes, la insuficiencia de los diámetros instalados y los impactos en la salubridad pública y el desarrollo urbano.

En virtud del Contrato de Obra No. 002 del 24 de junio de 2025, suscrito entre ESVILLA E.S.P. y la firma Ingeniería y Suministros C&B S.A.S., se ejecutarán actividades de excavación, reposición de tuberías, construcción de estructuras de alcantarillado, sumideros, pozos de inspección y obras complementarias, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1.

Información general del contrato.

CONTRATO	No. 002 de 2025
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 313 DE 2024 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($484.718.056,04).
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA:	48.1%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($233,164,421.45)
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	08 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA - ESVILLA E.S.P
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S R/L ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ
INTERVENTORIA:	ARE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S R/L GABRIELA PACHÓN ÁLVAREZ
SUPERVISIÓN:	ING. CAMILO ANDRES BUITRAGO MUNEVAR

3.2. ASPECTOS CONTRACTUALES.

- El 8 de julio de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato, estableciendo como fecha de terminación el 7 de octubre de 2025.

- El 23 de julio de 2025 se suscribe Acta No. 1 de creación de ítems no previstos, correspondientes a obras adicionales en el contrato.

- El 1 de agosto de 2025 se suscribe Acta de modificación de cantidades de obra No. 1.

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

El contrato No. 002 de 2025, no conto con anticipo para su ejecución.

3.4. PERSONAL DEL PROYECTO:

Durante el período del presente informe, cada una de las entidades contó con un equipo de personas que se relaciona a continuación:

3.4.1. Personal autorizado por el cliente

Personal de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Villa De Leyva - ESVILLA E.S.P

Tabla 2.

Supervisión del contrato No. 002 de 2025.

CARGO	NOMBRE
Supervisor	**CAMILO ANDRES BUITRAGO MUNEVAR**

3.4.2. Personal del contratista.

Mano de obra calificada de INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S

Así mismo, se relaciona el personal contratado y empleado en el presente periodo para el desarrollo de las obras.

Tabla 3.

Personal contractual periodo

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA	1.098.697.084	RESIDENTE DE OBRA
2	MAUREN STEFANY CHACON FANDIÑO	1.002.699.974	INSPECTOR DE OBRA
3	EMMA LIZETH GARCIA BENITEZ	1.053.334.041	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4	ANDRES CAMILO PEÑA SANCHEZ	1.010.174.502	REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S

Ver Anexo 1.

Mano de obra operativa de INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S

Tabla 4.

Personal operativo contractual periodo

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	DEINER JOSÉ PEDROZO FRAGOZO	1.063.488.939	MAESTRO
2	OSCAR MORA MARTINEZ	1.050.846.480	AUXILIAR DE OBRA
3	MARLON DAVID TRUYOL TOLOZA	1.007.247.129	AUXILIAR DE OBRA
4	YONIS DE JESUS OROZCO MACHADO	9.195.761	AUXILIAR DE OBRA
5	JOVANIS RAFAEL TORRES ALVAREZ	1.063.483.496	AUXILIAR DE OBRA
6	DAVID EDUARDO ZAMBRANO CARREÑO	1.006.890.062	AUXILIAR DE OBRA
7	LUIS ALFREDO JIMENEZ ARRIETA	1.063.488.343	AUXILIAR DE OBRA
8	JAVIER SERVANDO CASTAÑEDA LOPEZ	1.124.072.410	AUXILIAR DE OBRA

Ver Anexo 1.

4. ACTIVIDADES

4.1. ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR.

Tabla 5.

Actividades y cantidades de obra a ejecutar – Alcantarillado residual

CONDICIONES ACTUALIZADAS – ALCANTARILLADO SANITARIO						
ITEM	**ITEM PTB 2023**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT**	**VR UNITARIO (COSTO DITECTO)**	**VR TOTAL (COSTO DIRECTO)**
1,00		**OBRAS PRELIMINARES**				
1,01	1.01.69	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	Metro cuadrado	143,57	$ 4.493	$ 645.060
				Sub Total Obra (A)	**$**	**645.060,01**
2,00		**EXCAVACIONES, CONFORMACION, NIVELACION Y CIMENTACION**				
2,01		ALCANTARILLADO				
2.01.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro cubico	326,84	$ 19.792,96	$ 6.469.131,05
2.01.02	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro cuadrado	89,41	$ 42.040,83	$ 3.758.870,61
2.01.03	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro cubico	0,00	$ 26.055,23	$ -
2.01.04	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro cubico	35,15	$ 64.546,54	$ 2.268.810,88
2.01.05	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	42,38	$ 123.572,76	$ 5.237.013,57
2.01.06	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro cubico	147,65	$ 120.637,51	$ 17.812.128,35
2.01.07	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro cubico	158,24	$ 102.476,51	$ 16.215.882,94
2.01.09	2,06,07	DEMOLICION POZOS DE INSPECCION	Unidad	3,00	$ 38.028,00	$ 114.084,00
2.01.10	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro cubico	44,52	$ 91.714,13	$ 4.083.113,07
2.01.11	1.01.15	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN	UNIDAD	1,00	$ 18.810,23	$ 18.810,23
2.01.12	3.12.04	TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS.	Metro cúbico	0,00	$ 2.312,50	$ -
				Sub Total Obra (A)	**$**	**55.977.844,70**
3,00		**ESTRUCTURAS**				
3,01		ALCANTARILLADO				

3.01.01	3.06.02	BARRIDO Y SOPLADO	Metro cuadrado	220,87	$ 1.862,85	$ 411.447,68
3.01.02		POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UNIDAD	3,00	$ 2.451.553,56	$ 7.354.660,68
3.01.03	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kilogramo	190,93	$ 7.002,12	$ 1.336.928,78
3.01.04	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro cúbico	1,36	$ 1.060.141,09	$ 1.441.791,88
3.01.05	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro cúbico	6,81	$ 516.357,47	$ 3.516.394,37
3.01.06	3.13.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro cuadrado	27,23	$ 8.393,42	$ 228.552,83
3.01.07	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)r	Metro cúbico	0,00	$ 696.589,21	$ -
				Sub Total Obra (A)	**$**	**14.289.776,22**
4,00		**REDES SANITARIAS**				
4,01	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Metro Lineal	115,20	$ 137.109,86	$ 15.795.055,87
4,02	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Metro Lineal	115,99	$ 202.745,55	$ 23.516.456,34
4,03	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Metro Lineal	106,25	$ 59.973,15	$ 6.372.147,19
4,04	2.06.04	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	Unidad	0,00	$ 431.887,66	$ -
				Sub Total Obra (A)	**$**	**45.683.659,40**
5,00		**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
5,01	NUEVO 1	CORTE Y RETIRO DE PIEDRA BOLA	Metro cuadrado	282,53	$ 37.487,00	$ 10.591.202,11
5,02	NUEVO 2	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN TIPO PIEDRA DE BOLA-INCLUYE BASE EN CONCRETO CLASE D Y MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:1	Metro cuadrado	304,40	$ 91.113,70	$ 27.735.010,28
				Sub Total Obra (A)	**$**	**38.326.212,39**
NP		**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP 1	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Unidad	25,00	$ 308.617,31	$ 7.715.432,75
NP2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	8.016,64	$ 2.312,50	$ 18.538.480,00
NP 3		CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA (PARA CONEXIÓN 10" x 6" (250MM x 160 MM))	Unidad	11,00	$ 530.501,34	$ 5.835.514,73
NP 4		CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION	Unidad	14,00	$ 643.274,49	$ 9.005.842,87

		TUBERIA (PARA CONEXIÓN 12" x 6" (315MM x 160 MM))				
				Sub Total Obra (A)	**$**	**41.095.270,35**

AJUSTE POR REDONDEO	$	-
COSTO DIRECTO	$	154.922.552,72
SUB-TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	$	41.095.270,35
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**196.017.823,07**
ADMINISTRACION (22%)	$	43.123.921,07
IMPREVISTOS (3%)	$	5.880.534,69
UTILIDAD (5%)	$	9.800.891,15
COSTO INDIRECTO	**$**	**58.805.346,92**
VALOR TOTAL	**$**	**254.823.169,99**

Tabla 6.

Actividades y cantidades de obra a ejecutar – Alcantarillado pluvial.

CONDICIONES CONTRACTUALES						
ITEM	**ITEM PTB 2023**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT**	**VR UNITARIO (COSTO DITECTO)**	**VR TOTAL (COSTO DIRECTO)**
1,00	**OBRAS PRELIMINARES**					
1,01	1.01.69	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	Metro cuadrado	163,88	$ 4.493	$ 736.293,17
				Sub Total Obra (A)	**$**	**736.293,17**
2,00		**EXCAVACIONES, CONFORMACION, NIVELACION Y CIMENTACION**				
2,01		ALCANTARILLADO PLUVIAL				
2.01.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro cubico	247,61	$ 19.792,96	$ 4.900.934,83
2.01.02	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro cuadrado	292,32	$ 42.040,83	$ 12.289.375,43
2.01.03	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro cubico	35,63	$ 26.055,23	$ 928.347,84
2.01.04	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro cubico	6,25	$ 64.546,54	$ 403.415,88
2.01.05	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	27,64	$ 123.572,76	$ 3.415.551,09
2.01.06	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR	Metro cubico	95,93	$ 120.637,51	$ 11.572.756,33

		(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)				
2.01.07	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro cubico	143,89	$ 102.476,51	$ 14.745.345,02
2.01.09	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro cubico	6,25	$ 91.714,13	$ 573.213,31
2.01.10	3.12.04	TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS.	Metro cubico	800,00	$ 2.312,50	$ 1.850.000,00
			Sub Total Obra (A)		**$**	**50.678.939,73**
3,00		**ESTRUCTURAS**				
3,01		ALCANTARILLADO				
3.01.01	3.06.02	BARRIDO Y SOPLADO	Metro cuadrado	127,90	$ 1.862,85	$ 238.258,52
3.01.02	2.05.05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	Unidad	3,00	$ 2.451.553,56	$ 7.354.660,68
3.01.03	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kilogramo	1209,74	$ 7.002,12	$ 8.470.744,65
3.01.04	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro cúbico	2,76	$ 1.060.141,09	$ 2.925.989,41
3.01.05	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro cúbico	11,08	$ 516.357,47	$ 5.721.240,77
3.01.06	1.02.08	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro cúbico	1,30	$ 495.243,91	$ 643.817,08
3.01.07	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)r	Metro cúbico	13,60	$ 696.589,21	$ 9.473.613,26
3.01.08	2.06.27	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO ENOBRA, INC. SUMINISTRO, FORM, REF Y CONST, INC	Unidad	5,00	$ 1.442.526,59	$ 7.212.632,95
3.01.09	3.13.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro cuadrado	27,23	$ 8.393,42	$ 228.552,83
			Sub Total Obra (A)		**$**	**42.269.510,14**
4,00		**REDES SANITARIAS**				
4,01	2.05.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA	Metro Lineal	163,28	$ 288.572,86	$ 47.118.176,58

		DE ALCANTARILLADO PVC D=16"				
4,02	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Metro Lineal	18,00	$ 137.109,86	$ 2.467.977,48
				Sub Total Obra (A)	**$**	**49.586.154,06**
5,00		**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
5,01	NUEVO 1	CORTE Y RETIRO DE PIEDRA BOLA	Metro cuadrado	221,21	$ 20.665,00	$ 4.571.304,65
5,02	NUEVO 2	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN TIPO PIEDRA DE BOLA-INCLUYE BASE EN CONCRETO CLASE D Y MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:1	Metro cuadrado	221,21	$ 114.468,00	$ 25.321.466,28
5,03	NUEVO 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN TIPO PIEDRA DE LABOR PLANA - ESPESOR MENOR A 10 CM - INCLUYE ACARREO DESDE EL ORIGEN A ESCUADRA (sin formato)	Metro cuadrado	18,00	$ 183.699,00	$ 3.306.582,00
5,04	NUEVO 4	DEMOLICIÓN PIEDRA LABOR	Metro cuadrado	18,00	$ 20.665,00	$ 371.970,00
				Sub Total Obra (A)	**$**	**33.571.322,93**
					AJUSTE POR REDONDEO	$ 0,01
					COSTO DIRECTO	$ 176.842.220,03
					VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 176.842.220,04**
					ADMINISTRACION (22%)	$ 38.905.288,41
					IMPREVISTOS (3%)	$ 5.305.266,60
					UTILIDAD (5%)	$ 8.842.111,00
					COSTO INDIRECTO	**$ 53.052.666,01**
					VALOR TOTAL	**$ 229.894.886,05**

VALOR PRESUPUESTO ALCANTARILLADO RESIDUAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($254.823.169,99)

VALOR PRESUPUESTO ALCANTARILLADO PLUVIAL: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS. ($229.894.886,05)

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (484.718.056,04)

4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA

4.2.1. Actividades realizadas red sanitaria

A la fecha se reportan las siguientes actividades ejecutadas y avaladas por la interventoría externa del proyecto:

- **Localización y replanteo redes hasta H=50 cm.**

Se ejecutó el replanteo topográfico de la red sanitaria hasta una profundidad de 50 cm, marcando ejes y cotas de diseño entre los tramos PS-543 a PS-336 y PS-336 a PS-335, garantizando alineación y pendientes según planos.



- **Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a máquina incluye cargue y acarreo libre de 5 km.**

Durante el periodo reportado se adelantaron las excavaciones en material común mediante el uso de maquinaria pesada, con el fin de conformar las zanjas necesarias para la instalación de la red de alcantarillado sanitario. Estas labores comprendieron la remoción, cargue y transporte del material excavado. La actividad se ejecutó controlando las profundidades de diseño y alineación de las zanjas. Así mismo, se realizaron ajustes manuales en sectores puntuales para garantizar la correcta nivelación y evitar interferencias con redes existentes.

El material producto de la excavación fue dispuesto de manera ordenada en los sitios autorizados, cumpliendo con las medidas ambientales y de seguridad en obra. Con esta actividad se habilitaron los tramos entre los pozos de inspección PS-543 a PS-336 y PS-336 a PS-335, asegurando las condiciones necesarias para la posterior instalación de la tubería sanitaria.



- **Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos**

Se realizó la instalación de entibados en madera en las excavaciones correspondientes a la red sanitaria, con el propósito de garantizar la estabilidad de las zanjas y la seguridad del personal de obra durante las labores de instalación de tubería.

El procedimiento contempló la colocación de tableros, largueros y puntales de madera de acuerdo con las dimensiones de las excavaciones, ajustándolos al terreno y a la profundidad requerida.

Esta actividad permitió controlar desplazamientos laterales del terreno, minimizar riesgos de derrumbes y cumplir con las medidas de seguridad industrial exigidas por la normatividad vigente, favoreciendo el adecuado desarrollo de los tramos entre los pozos de inspección PS-543 a PS-336 y PS-336 a PS-335.



- **Excavación manual en material común**

Se ejecutaron excavaciones manuales en material común en los sectores donde se identificaron interferencias con acometidas domiciliarias de agua potable, red de gas, red eléctrica, red telefónica, así como en las zanjas destinadas a las conexiones domiciliarias del alcantarillado sanitario.

El procedimiento manual se aplicó con el fin de prevenir daños a las redes de servicios existentes, garantizando la continuidad de estos y reduciendo riesgos para el personal y la comunidad. Estas labores permitieron precisar dimensiones y profundidades en áreas de difícil acceso, asegurando la correcta instalación de las tuberías y accesorios proyectados.


Con esta actividad se facilitó la conexión de la nueva red sanitaria a las acometidas domiciliarias, manteniendo la operatividad de los servicios públicos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.



- **Relleno arena de peña compactado con plancha vibradora**

Se efectuó la colocación de arena de peña en el fondo de las zanjas como cama de apoyo para la instalación de la tubería sanitaria, disponiendo un espesor uniforme de 15 cm de acuerdo con lo establecido en los planos y especificaciones del proyecto.

Esta actividad tuvo como finalidad proporcionar una base uniforme y estable que permita el correcto asentamiento de la tubería y contribuya a la durabilidad y funcionamiento del sistema de alcantarillado.

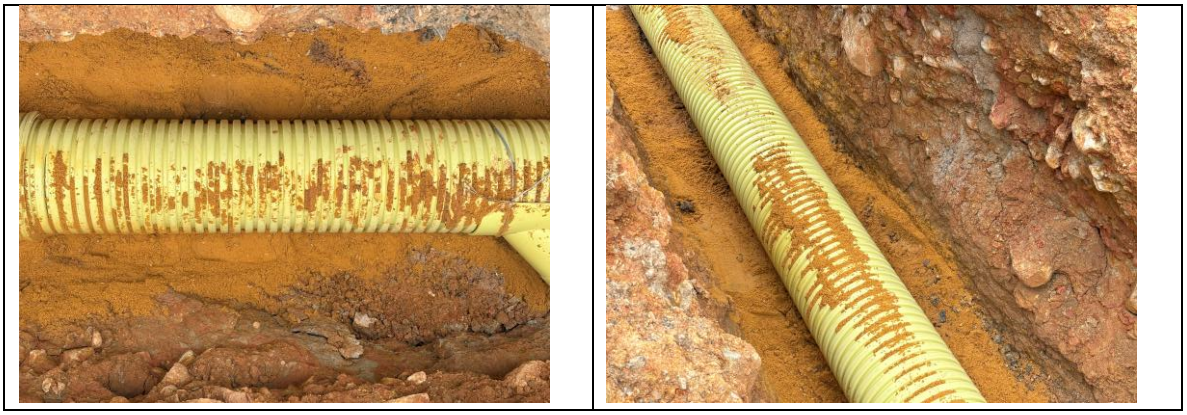





- **Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5km)**

Se realizó el suministro, transporte, extendida y compactación de material granular seleccionado, destinado a la conformación de la base estructural de las zanjas una vez instaladas las tuberías sanitarias. La actividad incluyó el acarreo libre hasta 5 km, cumpliendo con los espesores, alineación y nivelación requeridos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Con esta labor se garantizó la adecuada estabilidad y soporte estructural sobre la tubería instalada, favoreciendo la resistencia de la superficie de rodadura y el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.









- **Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5km)**

Se llevó a cabo el suministro, transporte, extendida y compactación de material granular seleccionado para la conformación de la subbase en las zanjas intervenidas, una vez instalada la red sanitaria. La actividad comprendió el acarreo libre hasta 5 km, garantizando el cumplimiento de espesores, nivelación y densidades exigidas en las especificaciones técnicas.

Este procedimiento permitió asegurar la estabilidad y soporte adecuado de la estructura del pavimento, favoreciendo la durabilidad de la superficie de rodadura y la correcta protección de las tuberías instaladas.









- **Excavación manual en material conglomerado**

Se realizaron excavaciones manuales en material conglomerado en los tramos donde fue necesario intervenir las acometidas domiciliarias. Debido a que el municipio de Villa de Leyva cuenta con vías en empedrado, fue indispensable efectuar el retiro cuidadoso de las piedras para permitir la apertura de las zanjas.

Durante la ejecución se presentaron sectores con presencia de rocas de gran tamaño, lo que requirió mayor esfuerzo operativo y control en la excavación para garantizar la seguridad del personal y la adecuada conformación de las zanjas. Estas labores aseguraron la correcta instalación de las conexiones domiciliarias y la continuidad del proyecto de alcantarillado sanitario.









- **Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"**

Se ejecutó el suministro e instalación de tubería en PVC sanitario de 10 pulgadas de diámetro en el tramo comprendido entre los pozos de inspección PS-543 y PS-336. La actividad incluyó el transporte, verificación de la tubería, su colocación en la zanja previamente preparada y el ensamble de campanas con sus respectivos empaques, garantizando la hermeticidad y alineación conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Con esta instalación se asegura la funcionalidad hidráulica y operativa del sistema sanitario, dando cumplimiento al diseño y a las normas de construcción vigentes para redes de alcantarillado.









- **Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=12"**

Se realizó el suministro e instalación de tubería en PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro en el tramo comprendido entre los pozos de inspección PS-336 y PS-335. Las labores incluyeron el transporte y verificación del material, la disposición de la tubería en la zanja preparada con su respectiva cama de apoyo, y el ensamble mediante campanas y empaques que garantizan la estanqueidad y continuidad de la red.

Con esta actividad se completó la instalación del tramo proyectado, asegurando el correcto funcionamiento hidráulico y estructural del sistema sanitario, en concordancia con los diseños y las especificaciones técnicas del contrato.









- **Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D= 6"**

Se efectuó el suministro e instalación de tubería en PVC sanitario de 6 pulgadas de diámetro para las acometidas domiciliarias, comprendidas entre las cajas de inspección y la red principal. Esta labor incluyó la verificación del material, el tendido en las zanjas previamente habilitadas y la unión de las tuberías mediante campanas con empaques, asegurando la hermeticidad y alineación de las conexiones.

Con esta actividad se garantizó la integración de los predios a la nueva red de alcantarillado sanitario, cumpliendo con los diseños y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.









- **Corte y retiro de piedra bola**

Se efectuó el corte y retiro de la capa de piedra bola del empedrado existente en la Calle 11, en el tramo comprendido entre los pozos de inspección PS-543 y PS-336, y PS-336 a PS-335, con el fin de habilitar las zanjas para la instalación de la red sanitaria y las acometidas domiciliarias.

El material retirado fue acopiado de manera ordenada para su posterior reutilización en la reposición, de acuerdo con las indicaciones de la interventoría y las especificaciones técnicas del proyecto.









- **Instalación de adoquín tipo piedra de bola-incluye base en concreto clase D y mortero impermeabilizado 1:1**

Se ejecutó la instalación del adoquín en piedra bola para la reposición del empedrado tradicional de la Calle 11, en el tramo intervenido entre los pozos de inspección PS-543 y PS-336, una vez finalizadas las labores de instalación de la red sanitaria.

La actividad comprendió la colocación de una base en concreto clase D, sobre la cual se dispuso la piedra bola con mortero impermeabilizado en proporción 1:1, asegurando su adecuada fijación, nivelación y acabado. Con ello se garantizó la restitución del pavimento en condiciones similares a las existentes, manteniendo la estética urbana propia del municipio de Villa de Leyva y cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto.



- **Cajas de inspección de 60x60x60 cm ladrillo**

Se construyeron cajas de inspección en ladrillo, destinadas a las acometidas domiciliarias en la Calle 11, entre los pozos de inspección PS-543 a PS-336 y PS-336 a PS-335.


Estas estructuras permiten el acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento de las conexiones, garantizando la operatividad y durabilidad del sistema sanitario. La construcción incluyó la respectiva base, muros en ladrillo a la vista, acabado interior y marco-tapa metálica, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.



- **Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).**

Se ejecutó el transporte de material de afirmado y/o granular con acarreo a una distancia superior a 5 km, conforme a las condiciones del proyecto. Posteriormente, el material fue instalado y compactado en las zanjas de la Calle 11, siguiendo los espesores y la sección de diseño establecidos en los planos.

Con esta actividad se garantizó la estabilidad estructural y soporte adecuado para la reposición del empedrado en piedra bola, asegurando la durabilidad del pavimento y la correcta protección de la red sanitaria instalada.

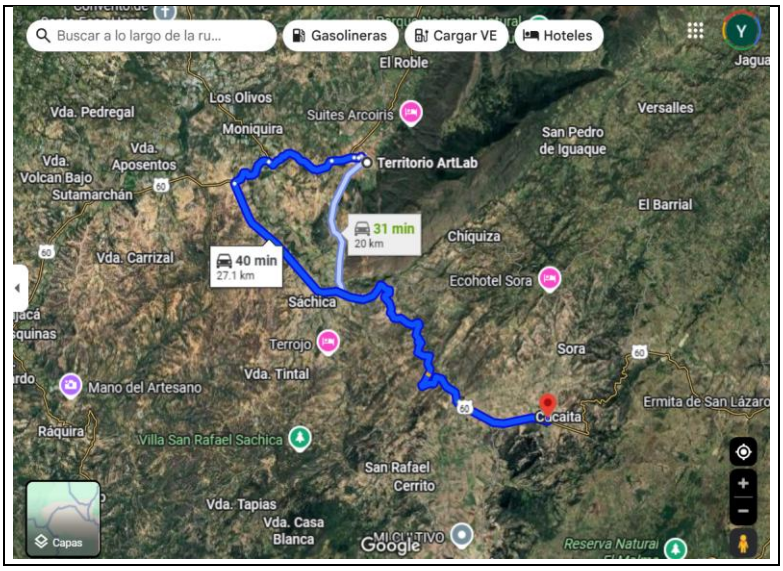

- **Conexión domiciliaria alcantarillado. inc. tubería y accesorios de conexión tubería (para conexión 10" x 6" (250mm x 160 mm))**

Se realizaron las conexiones domiciliarias de alcantarillado en la Calle 11, tramo comprendido entre los pozos de inspección PS-543 y PS-336, utilizando tubería en PVC y accesorios de empalme. Las uniones a la red principal de 10 pulgadas se efectuaron mediante la instalación de accesorios reductores a 6 pulgadas (250 mm x 160 mm), garantizando una conexión segura, hermética y alineada.

Con esta actividad se logró la integración de las acometidas domiciliarias al sistema sanitario, asegurando la continuidad hidráulica y cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto.







- **Conexión domiciliaria alcantarillado. inc. tubería y accesorios de conexión tubería (para conexión 12" x 6" (300mm x 160 mm))**

Se realizaron las conexiones domiciliarias de alcantarillado en la Calle 11, tramo comprendido entre los pozos de inspección PS-336 y PS-335, utilizando tubería en PVC y accesorios de empalme. Las uniones a la red principal de 12 pulgadas se efectuaron mediante la instalación de accesorios reductores a 6 pulgadas (300 mm x 160 mm), garantizando una conexión segura, hermética y alineada.

Con esta actividad se logró la integración de las acometidas domiciliarias al sistema sanitario, asegurando la continuidad hidráulica y cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto.









- **Bitácora de obra**

Se adjunta evidencia fotográfica de la bitácora de obra correspondiente al periodo reportado en el presente informe

Ver anexo 2.

C&B

4.2.2. Cantidades de obra ejecutadas hasta la fecha

CONDICIONES ACTUALIZADAS (MODIFICATORIO No. 01)							ACTA PARCIAL 1		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	ITEM PTB 2023	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VR UNITARIO (COSTO DITECTO)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	CANT	V. MODIFI	CANT	V. FIN
1.00		**OBRAS PRELIMINARES**								
1.01	1.01.69	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	Metro cuadrado	143.57	$ 4,493	$ 645,060	143.57	$ 645,060.01	143.57	$ 645,060.01
			Sub Total Obra (A)		**$**	**645,060.01**		**$ 645,060.01**		**$ 645,060.01**
2.00		**EXCAVACIONES, CONFORMACION, NIVELACION Y CIMENTACION**								
2.01		ALCANTARILLADO								
2.01.01	1.02.16	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro cubico	326.84	$ 19,792.96	$ 6,469,131.05	330.43	$ 6,540,187.77	330.43	$ 6,540,187.77
2.01.02	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro cuadrado	89.41	$ 42,040.83	$ 3,758,870.61	72.63	$ 3,053,425.48	72.63	$ 3,053,425.48
2.01.03	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro cubico	0.00	$ 26,055.23	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.01.04	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro cubico	35.15	$ 64,546.54	$ 2,268,810.88	41.97	$ 2,709,018.28	41.97	$ 2,709,018.28
2.01.05	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	42.38	$ 123,572.76	$ 5,237,013.57	40.61	$ 5,018,289.78	40.61	$ 5,018,289.78
2.01.06	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro cubico	147.65	$ 120,637.51	$ 17,812,128.35	132.64	$ 16,001,359.33	132.64	$ 16,001,359.33
2.01.07	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro cubico	158.24	$ 102,476.51	$ 16,215,882.94	218.33	$ 22,373,696.43	218.33	$ 22,373,696.43
2.01.09	2,06,07	DEMOLICION POZOS DE INSPECCION	Unidad	3.00	$ 38,028.00	$ 114,084.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.01.10	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro cubico	44.52	$ 91,714.13	$ 4,083,113.07	47.60	$ 4,365,592.59	47.60	$ 4,365,592.59
2.01.11	1.01.15	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN	UNIDAD	1.00	$ 18,810.23	$ 18,810.23	1.00	$ 18,810.23	1.00	$ 18,810.23
2.01.12	3.12.04	TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO	Metro cúbico	0.00	$ 2,312.50	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

		DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS.									
			Sub Total Obra (A)		**$**	**55,977,844.70**		**$ 60,080,379.89**		**$ 60,080,379.89**
3.00		**ESTRUCTURAS**									
3.01		ALCANTARILLADO									
3.01.01	3.06.02	BARRIDO Y SOPLADO	Metro cuadrado	220.87	$ 1,862.85	$ 411,447.68	0.00	$ -	0.00	$ -
3.01.02		POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UNIDAD	3.00	$ 2,451,553.56	$ 7,354,660.68	0.00	$ -	0.00	$ -
3.01.03	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kilogramo	190.93	$ 7,002.12	$ 1,336,928.78	0.00	$ -	0.00	$ -
3.01.04	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro cúbico	1.36	$ 1,060,141.09	$ 1,441,791.88	0.00	$ -	0.00	$ -
3.01.05	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Metro cúbico	6.81	$ 516,357.47	$ 3,516,394.37	0.00	$ -	0.00	$ -
3.01.06	3.13.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro cuadrado	27.23	$ 8,393.42	$ 228,552.83	0.00	$ -	0.00	$ -
3.01.07	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)r	Metro cúbico	0.00	$ 696,589.21	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
			Sub Total Obra (A)		**$**	**14,289,776.22**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
4.00		**REDES SANITARIAS**									
4.01	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Metro Lineal	115.20	$ 137,109.86	$ 15,795,055.87	115.20	$ 15,795,055.87	115.20	$ 15,795,055.87
4.02	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Metro Lineal	115.99	$ 202,745.55	$ 23,516,456.34	115.99	$ 23,516,456.34	115.99	$ 23,516,456.34
4.03	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Metro Lineal	106.25	$ 59,973.15	$ 6,372,147.19	32.60	$ 1,955,124.69	32.60	$ 1,955,124.69
4.04	2.06.04	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	Unidad	0.00	$ 431,887.66	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
			Sub Total Obra (A)		**$**	**45,683,659.40**		**$ 41,266,636.90**		**$ 41,266,636.90**
5.00		**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**									
5.01	NUEVO 1	CORTE Y RETIRO DE PIEDRA BOLA	Metro cuadrado	282.53	$ 37,487.00	$ 10,591,202.11	354.28	$ 13,280,894.36	354.28	$ 13,280,894.36

5.02	NUEVO 2	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN TIPO PIEDRA DE BOLA-INCLUYE BASE EN CONCRETO CLASE D Y MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:1	Metro cuadrado	304.40	$ 91,113.70	$ 27,735,010.28	238.73	$ 21,751,573.60	238.73	$ 21,751,573.60
Sub Total Obra (A)					**$**	**38,326,212.39**		**$ 35,032,467.96**		**$ 35,032,467.96**
NP		**ITEMS NO PREVISTOS**								
NP 1	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Unidad	25.00	$ 308,617.31	$ 7,715,432.75	18.00	$ 5,555,111.58	18.00	$ 5,555,111.58
NP2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	8016.64	$ 2,312.50	$ 18,538,480.00	8978.36	$ 20,762,457.50	8978.36	$ 20,762,457.50
NP 3		CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA (PARA CONEXIÓN 10" x 6" (250MM x 160 MM))	Unidad	11.00	$ 530,501.34	$ 5,835,514.73	12.00	$ 6,366,016.07	12.00	$ 6,366,016.07
NP 4		CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA (PARA CONEXIÓN 12" x 6" (315MM x 160 MM))	Unidad	14.00	$ 643,274.49	$ 9,005,842.87	15.00	$ 9,649,117.36	15.00	$ 9,649,117.36
Sub Total Obra (A)						**$ 41,095,270.35**		**$ 42,332,702.51**		**$ 42,332,702.51**
VALOR COSTO DIRECTO						**$ 196,017,823.07**		**$ 179,357,247.27**		**$ 179,357,247.27**
AIU (30%)						**$ 58,805,346.92**		**$ 53,807,174.18**		**$ 53,807,174.18**
VALOR TOTAL CONTRATO (SANITARIO)					**100%**	**$ 254,823,169.99**	**91.5%**	**$ 233,164,421.45**	**91.5%**	**$ 233,164,421.45**
VALOR TOTAL CONTRATO (SANITARIO + PLUVIAL)					**100%**	**$ 484,718,056.04**	**48.1%**	**$ 233,164,421.45**	**48.1%**	**$ 233,164,421.45**

4.2.3. Registro fotográfico

Dentro de los anexos al informe de obra se anexa el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el contrato durante el presente periodo.


Ver anexo 3.

4.2.4. Control clima

Utilizando la herramienta para la descarga de datos hidrometeorológicos proporcionada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, se verificó la precipitación total diaria de la estación 24015300 Villa de Leyva durante el mes de julio y agosto. Esta información fue contrastada con los datos disponibles en la página METEOBLU y lo registrada detalladamente en la bitácora de obra.

Gráfico 1.

Gráfico Precipitaciones(mm)/Día

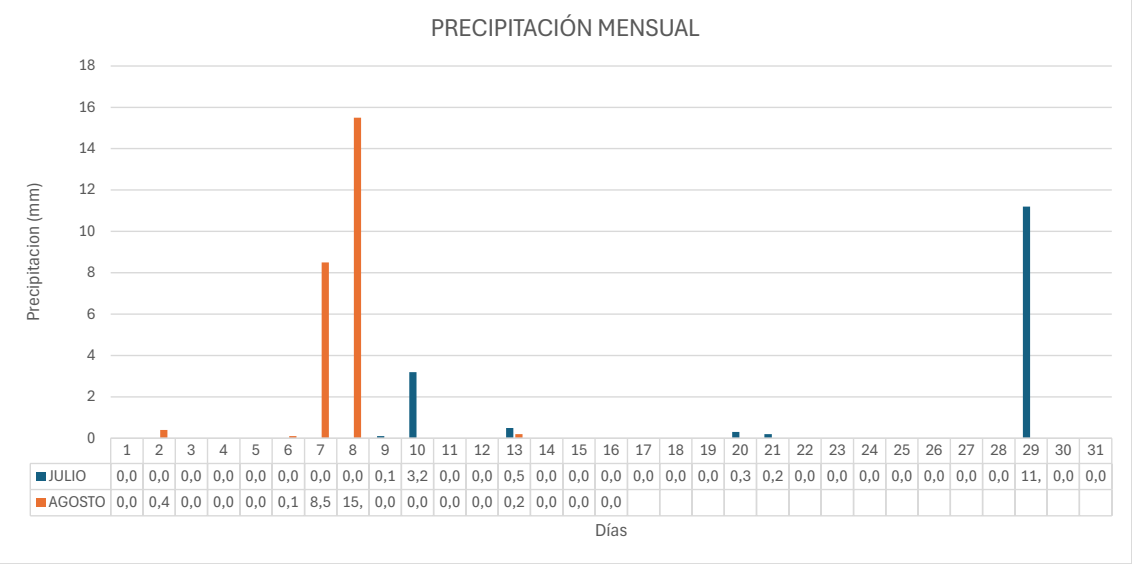


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JULIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,	0,0	0,0
AGOSTO	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	8,5	15,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0															

Fuente: Propia

Gráfico 2.

Archivo meteorológico de Villa de Leyva

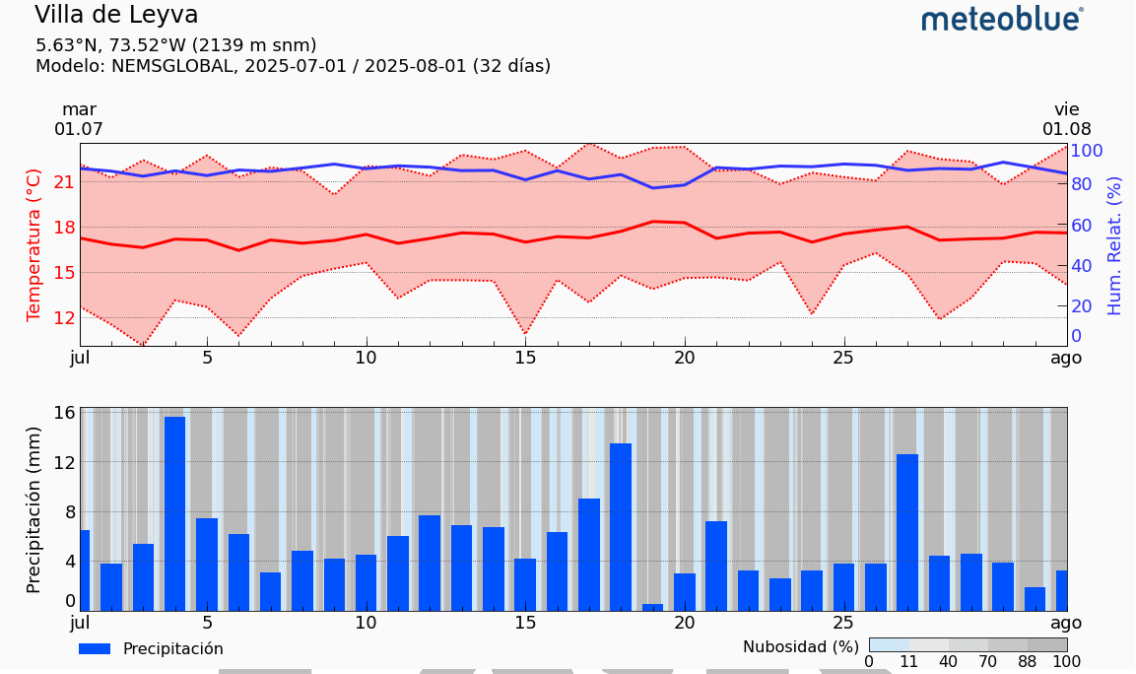

Fuente: Meteoblue

4.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


Se verificó el avance físico–financiero ejecutado desde el 08 de julio de 2025 (Acta de Inicio) hasta el 31 de agosto de 2025 (Semana 8), en comparación con la programación aprobada por la Interventoría. Durante la primera semana no se desarrollaron labores constructivas en campo, dado que se llevaron a cabo actividades administrativas y técnicas previas tales como levantamiento de actas de vecindad, socialización del proyecto, localización preliminar, gestiones de permisos y organización logística de obra. A partir de la segunda semana se dio inicio a la ejecución de obra, evidenciándose un avance progresivo que permitió recuperar el ritmo frente a lo programado. Al corte de la Semana 7, la obra registra un avance real acumulado de $233,164,421.45, frente a un avance programado de $217,771,880.25, lo que representa un desfase positivo de $15,392,541.20 (≈ +7.07%). Este comportamiento refleja que, aunque la ejecución física inició en la segunda semana, el proyecto se mantiene por encima de la línea base programada, garantizando el cumplimiento del cronograma establecido.

A continuación, se muestran unos gráficos del avance del proyecto semana a semana desde su inicio.

Ver anexo 4.

Gráfico 3.


Avance de obra en porcentaje

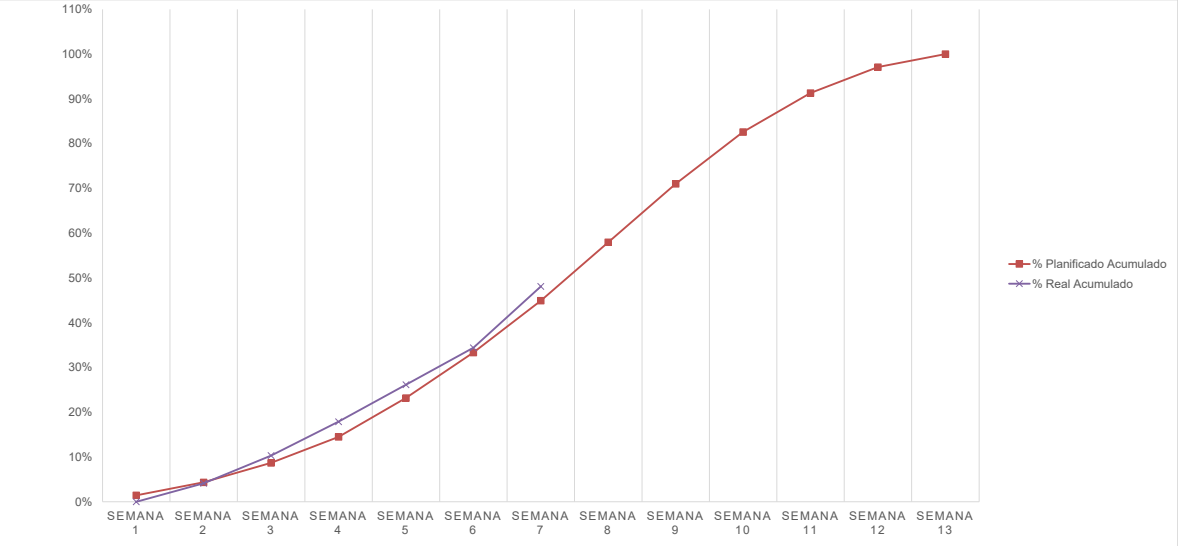

SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO
SEM 7 2025	48.1%

Gráfico 4.

Avance de obra en dinero

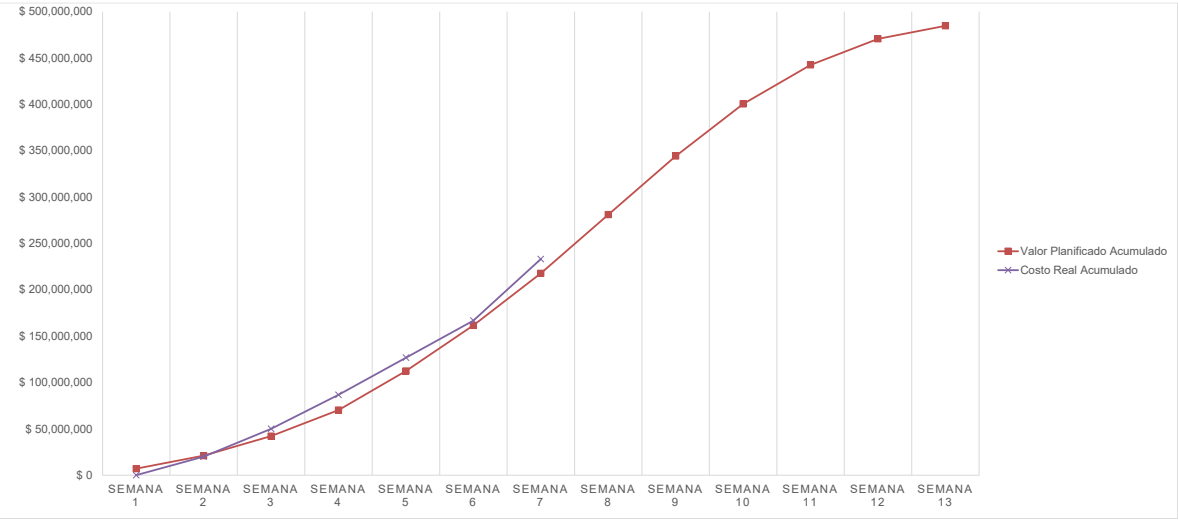

SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO
SEM 7 2025	$233.164.421,45

4.4. CONTROL DE CORRESPONDENCIA.

Anexo al presente informe se relaciona la correspondencia enviada por parte del contratista de obra para el periodo del presente informe.

Ver anexo 5.

4.5. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES.

Durante la ejecución del contrato no se realizaron solicitudes de multas y sanciones para el Contratista.

4.6. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se resumen las pólizas actualizadas, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad contratante.

Ver anexo 6.

Tabla 7.

Relación pólizas vigentes contrato de obra

PÓLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. B-100064034 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	24/06/2025	24/01/2026	$ 96.943.611,20	
	PRESTACIONES SOCIALES	24/06/2025	24/09/2028	$ 72.707.708,40	
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	24/06/2025	24/09/2030	$ 96.943.611,20	
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 100017516 ANEXO 0	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/06/2025	24/09/2025	$ 284.700.000,00	Deducible: 10.00% sobre el valor de la perdida- mínimo: 2.00 SMMLV.
	PATRONAL	24/06/2025	24/09/2025	$ 284.700.000,00	Deducible: 10.00% sobre el valor de la perdida- mínimo: 2.00 SMMLV.
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/06/2025	24/09/2025	$ 284.700.000,00	Deducible: 10.00% sobre el valor de la perdida- mínimo: 2.00 SMMLV.

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/06/2025	24/09/2025	$ 284.700.000,00	Deducible: 10.00% sobre el valor de la perdida- mínimo: 2.00 SMMLV.

C&B

5. CONCLUSIONES

- La obra presenta un avance acumulado del 48,10%, equivalente a $233,164,421.45 ejecutados, lo que representa un desempeño positivo del +7,07% frente al cronograma aprobado. Este resultado evidencia eficiencia en la ejecución, a pesar de que las labores constructivas iniciaron a partir de la segunda semana.}

- Se ejecutaron de manera adecuada las labores de excavación, entibado, rellenos, instalación de tuberías sanitarias (10”, 12” y 6”), construcción de cajas de inspección, conexiones domiciliarias y reposición de pavimento en piedra bola.

- Todas las actividades fueron supervisadas y avaladas por la interventoría, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando seguridad, estabilidad de excavaciones y funcionalidad de la red.

- Se suscribieron las actas de creación de ítems no previstos y modificación de cantidades, lo cual permitió ajustar el alcance del contrato sin afectar el ritmo de obra.

- La obra se ejecuta sin anticipo, demostrando capacidad de gestión financiera por parte del contratista.

- Se implementaron entibados en excavaciones, excavaciones manuales en zonas de interferencia y medidas preventivas en zonas con conglomerados y empedrado, garantizando la integridad de los trabajadores y la continuidad de los servicios existentes.

- El manejo de materiales excavados y el control de disposición de escombros se desarrollaron conforme a lo autorizado, minimizando impactos ambientales.

- Se adelantaron actividades de socialización y actas de vecindad, reduciendo riesgos de conflicto con la comunidad.

- Se encuentran vigentes y aprobadas las pólizas de cumplimiento, calidad, prestaciones sociales y responsabilidad civil, garantizando el respaldo legal y económico del contrato.

- Durante el periodo reportado no se presentaron causales de incumplimiento, ni se aplicaron multas o sanciones al contratista.

INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S
R/L. ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ
CONTRATO No. 002 DE 2025

ANEXO 1.
SEGUIMIENTO PLAN SST

JULIO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901428270
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA Y SUMINISTROS CYB SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 17 A 175 82 TO 2 IN 1503	TELÉFONO:	6587444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7981442665**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1682732503		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 113.900
230301	230301-PORVENIR	3	$ 341.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.700	$ 0	$ 341.700
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 113.900
SUBTOTALES:										**$ 569.500**	**$ 0**	**$ 569.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 28.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													**$ 142.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 142.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 248.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 248.000
SUBTOTALES:									**$ 248.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 248.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 142.500	$ 0	$ 142.500
SUBTOTALES:			**$ 142.500**	**$ 0**	**$ 142.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																						PENSIÓN									SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002699974
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAUREN STEFANY CHACON FANDINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MUZO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 5 N 5A 28	TELÉFONO:	3144343
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7976161615**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1681263534

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 8.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 449.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 449.100**

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053334041		GARCIA BENITEZ EMMA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ciudadela comfaboy bloque 2 apr 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7260799	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1695461280	9489434428	I	2025/08/12	2025/08/12	BANCOLOMBIA	0	$1,436,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$106,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$106,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$106,300		$0	$0
1	CC	1053334041	GARCIA EMMA	230201	30	$4,360,000	$697,600	EPS005	30	$4,360,000	$545,000	CCF24	30	$4,360,000	$87,200	14-23	30	$4,360,000	$106,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$106,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053334041		GARCIA BENITEZ EMMA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ciudadela comfaboy bloque 2 apr 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7260799	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1695461280	9489434428	I	2025/08/12	2025/08/12	BANCOLOMBIA	0	$1,436,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$697,600	$0	$0	$697,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$697,600	$0	$0	$697,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,300	$0	$0	$106,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$106,300	$0	$0	$106,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,200	$0	$0	$87,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$87,200	$0	$0	$87,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$545,000	$0	$0	$545,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$545,000	$0	$0	$545,000
TOTAL				1	$1,436,100	$0	$0	$1,436,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010174502		PEÑA SANCHEZ ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera8#4-32	BOYACA-BOYACA	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1682713612	9489074287	I	2025/08/04	2025/08/06	BANCOLOMBIA	2	$946,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																													
1	CC	1010174502 PEÑA ANDRES																	23030 1	30	EPS005	30		0	14-23	30	1.044%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010174502		PEÑA SANCHEZ ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera8#4-32	BOYACA-BOYACA	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1682713612	9489074287	I	2025/08/04	2025/08/06	BANCOLOMBIA	2	$946,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$700	$0	$512,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$700	$0	$512,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,500	$100	$0	$33,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$33,500	$100	$0	$33,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$600	$0	$400,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$600	$0	$400,600
TOTAL				**1**	**$945,500**	**$1,400**	**$0**	**$946,900**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-05, 06:40:25 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074403328

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 25/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Documento	CC1098697084	**Dirección**	CL 197 #27 C - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115111638
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098697084	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA	57	00	X																0	22	22	22	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.043.900	$ 167.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.043.900	$ 130.500	0,522	$ 1.043.900	$ 5.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.043.900	$ 1.043.900	$ 1.043.900	$ 0	$ 167.100	$ 130.500	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.100	$ 1.500	$ 304.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Luis Fernando Pachon Montero

Nº CEDULA: 1.016.074.569

CARGO: Maestro de obra

FECHA DE INGRESO: 18/07/2025

FECHA DE RECIBIDO: 18/07/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	/	1	N.A
2	Gafas	/	1	N.A
3	Protector auditivo	/	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	/	1	N.A
5	Guantes carnaza	/	1	N.A
6	Tapabocas	/	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	41	1	N.A
8				
9				
10				

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth Garcia

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: fernando P

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Estiven Delgado Perez
N° CEDULA: 1.055.246.246
CARGO: Aux. de obra
FECHA DE INGRESO: 18/07/2025
FECHA DE RECIBIDO: 18/07/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	/	1	N.A
2	Gafas	/	1	N.A
3	Protector auditivo	/	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	/	1	N.A
5	Guantes carnaza	/	1	N.A
6	Tapabocas	/	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	40	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth Garcia

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Estiven Delgado

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Jeison Mora Romero

Nº CEDULA: 1.057.015.239

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 18/07/2025

FECHA DE RECIBIDO: 18/07/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco		1	N.A
2	Gafas		1	NA
3	Protector auditivo		1	N.A
4	Guantes de nitrilo		1	N.A
5	Guantes carnaza		1	N.A
6	Tapabocas		1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	39	1	N.A
8				
9				
10				

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth Garcia

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Dionso Delgado florido

Nº CEDULA: 9.350.667

CARGO: Aux de obra

FECHA DE INGRESO: 18/07/2025

FECHA DE RECIBIDO: 18/07/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	/	1	N.A
2	Gafas	/	1	N.A
3	Protector auditivo	/	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	/	1	N.A
5	Guantes carnaza	/	1	N.A
6	Tapabocas	/	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	39	1	N.A
8				
9				
10				

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: dionso delgado

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Vicente Mesa

Nº CEDULA: 9.350.934

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 18/07/2025

FECHA DE RECIBIDO: 18/07/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	/	1	N. A
2	Gafas	/	1	N. A
3	Protector auditivo	/	1	N. A
4	Guantes de nitrilo	/	1	N. A
5	Guantes carnaza	/	1	N. A
6	Tapabocas	/	1	N. A
7	Botas con puntera de seguridad	38	1	N. A
8				N. A
9				N. A
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Vicente Mesa

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 18/07/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Luis Fernando Pachon Montero

N° CEDULA: 1016074569

CARGO: Maestro de obra

JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

* Mision
* Vision
* Objetivos
* Manual de funciones del cargo
* Responsabilidades del cargo
* Horarios
* Formatos / registros
* Herramientas de trabajo
* Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
* Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
* Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

fernando P.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth Garcia

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 18/07/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Abdul Estiven Delgado Perez

N° CEDULA: 1.055.246.246

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

* Mision
* Vision
* Objetivos
* Manual de funciones del cargo
* Responsabilidades del cargo
* Horarios
* Formatos / registros
* Herramientas de trabajo
* Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
* Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
* Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

Estiven Delgado
FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth García
ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA**		**REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO**
	CÓDIGO: SST-F- 04	**VERSIÓN: 01**	**FECHA: 2025**

FECHA DE REGISTRO: 18/07/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Yeison Mora Romero

N° CEDULA: 1.057.015.239

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Sierra Garcia

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

* Mision
* Vision
* Objetivos
* Manual de funciones del cargo
* Responsabilidades del cargo
* Horarios
* Formatos / registros
* Herramientas de trabajo
* Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
* Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
* Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth Garcia

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 18/07/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Wildou Dionso Delgado Florido

N° CEDULA: 9.350.667

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

* Mision
* Vision
* Objetivos
* Manual de funciones del cargo
* Responsabilidades del cargo
* Horarios
* Formatos / registros
* Herramientas de trabajo
* Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
* Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
* Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

dionso delgado
FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth García
ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 18/07/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Vicente Mesa

N° CEDULA: 9.350.934

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

* Mision
* Vision
* Objetivos
* Manual de funciones del cargo
* Responsabilidades del cargo
* Horarios
* Formatos / registros
* Herramientas de trabajo
* Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
* Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
* Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

Vicente Mesa

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth García

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	**FORMATO DE INSPECCIÓN HSE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**SST-F-06**
		VERSIÓN: 01
	SG - SST	**FECHA: JULIO 2025**

DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
1) Inspección No.	1
2) Nombre de quien registra la información	**3) Zona**
EMMA LIZETH GARCIA BENITEZ	obra
4) Tipo de sede	**5) Sede**
n.a	n.a

Valore en que nivel se encuentra el parámetro que esta evaluando de la siguiente manera:
NIVEL 1: Insatisfactorio (no se cumple, DEFICIENTE)
NIVEL 3: Aceptable (se cumple parcialmente, REGULAR)
NIVEL 5: Satisfactorio (se cumple, BUENO)

INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				
Parámetro de evaluación		**6) Calificación**	**Promedio**	**7) Observaciones**
Señalización	Cuentan con avisos preventivos en los lugares de trabajo.	regular		
	Cuentan con avisos informativos en los lugares de trabajo.	regular		
	Cuentan con avisos reglamentarios en los lugares de trabajo.	regular		
Elementos de Protección Personal - EPP	Los EPP apropiados para cada laborar que se realiza.	bueno		
	Los EPP se usan de manera adecuada.	bueno		
	Estado o condición de los EPP.	bueno		
Equipos y herramientas manuales	Cuentan con soportes de mantenimiento preventivo a herramientas y equipos.			
	Estado o condiciones de los las herramientas.			
	La maquinaria que usa tiene mecanismos que indique su marcha atrás.			
	Estado de limpieza y conservación de las herramientas.			
	Las herramientas cortantes o punzantes cuentan con mecanismos de protección.			
	Las herramientas y equipos se usan de manera adecuada.			
Residuos sólidos y peligrosos	Manejo adecuado de los residuos sólidos.	bueno		
	Cuentan con identificación de los recipientes.	bueno		
	Cuenta con un adecuado manejo de productos químicos.	**n.a**		
	Tiene disponibilidad de las Hojas de Seguridad de los insumos utilizados.	n.a		
	Hace una adecuada Disposición de madera, escombros, metales.	bueno		
	Cuenta con un sistema de orden y aseo.	bueno		
Documentación HE	Se da cumplimiento respecto a afiliaciones y aportes al sistema general se seguridad social (Administradora de Fondo de Pensiones - AFP, Entidad Promotora de Salud - EPS y Administradora de Riesgos Laborales - ARL) del mes en curso.	bueno		
	Cuenta con registro de inducciones, charlas y capacitaciones sobre impactos ambientales y riesgos laborales.	bueno		

8) OBSERVACIONES GENERALES

En el periodo informado no se realizaron actividades con herramienta menor, se realizo excavaciones mecanicas

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-F-08
		Versión:	1
	INSPECCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD	Fecha:	31/07/2025

Periodicidad de la inspección: semestral o anual

FECHA DE INSPECCIÓN: 31/07/2025
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: EMMA LIZETH GARCIA BENITEZ
AREA O SECCIÓN: Area de obra

Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior

Cantidad de extintores en la oficina: 1

Nº	CONCEPTO	EXTINTOR 1	EXTINTOR 2	EXTINTOR 3	EXTINTOR 4	EXTINTOR 5	EXTINTOR 6	EXTINTOR 7	EXTINTOR 8	EXTINTOR 9	EXTINTOR 10	OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO	PLAN DE TRABAJO	RESPONSABLE
		S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N			
2	¿Está el extintor en su lugar?	S												
3	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	S												
4	¿El extintor está completamente cargado y operable?	S												
5	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	S												
6	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	S												
7	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	S												
8	¿Tiene el sello de seguridad?	S												
9	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	S												
10	¿La pintura está en buen estado?	S												
11	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	S												
12	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	S												
13	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	S												
14	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	S												
15	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	S												
16	La lectura de presión está dentro del rango operable?	S												

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-F-07
		Versión:	1
	INSPECCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD	Fecha:	31/07/2025

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: **EMMA LIZETH GARCIA BENITEZ**

AREA O SECCIÓN: SITIO DE OBRA

TIPO DE BOTIQUÍN

ELEMENTO BOTIQUÍN TIPO A	UBICACIÓN	CANTIDAD FALTANTE	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Gasas Estériles Paquete (Paquete X 3, 20 Unidades)	BOTIQUIN	N.A	**DIC**-202**5**	**DIC**-202**5**	N.A
Bajalenguas (Paquete por 20)	BOTIQUIN	N.A			
Esparadrapo De Tela Rollo 4"	BOTIQUIN	N.A			
Venda Elástica 2 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Venda Elástica 3 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Venda Elástica 5 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Venda De Algodón 3 X 5 Yardas		N.A			
Venda De Algodón 5 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Yodopovidona (1 frasco 120 ml)	BOTIQUIN	N.A			
Solución Salina 250 Cc Ó 500 CC (2	BOTIQUIN	N.A			
Guantes para Exámen (Caja por 100)	BOTIQUIN	N.A			
Alcohol Antiséptico (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
Termómetro Digital (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
Tijeras (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
Esparadrapo De Tela Rollo 4" (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
ELEMENTO BOTIQUÍN TIPO B					
Venda Elástica 2 X 5 Yardas (2					
Venda Elástica 3 X 5 Yardas (2					
Venda Elástica 5 X 5 Yardas (2					
Venda De Algodón 3 X 5 Yardas (2					
Venda De Algodón 5 X 5 Yardas (2					
Gasas Estériles Paquete (Paquete X					
Apósito O Compresas No Estériles (4					
Esparadrapo De Tela Rollo 4" (2					
Bajalenguas (Paquete por 20, 2					
Solución Salina 250 Cc Ó 500 CC (5					
Yodopovidona (1 Galon)					
Guantes para Exámen (Caja por 100)					
Termómetro Digital (Unidad)					
Alcohol Antiséptico Frasco 275 ml					
Tijeras (Unidad)					
Tapabocas (Caja por 50)					
Collar Cervical Adulto (Unidad)					
Tabla Espinal Larga (Unidad)					
Inmovilizadores O Férula Miembros					
Inmovilizadores O Férula Miembros					
Tensiometro (1)					
Mascara para RCP (1)					

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: Julio de 2025

PROYECTO	Reposición y optimización de la red de alcan					FECHA	18/07/2025 - 21/07/2025						
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ]	Retroexcavadora [X]	Cargador [ ]	Minicargador [ ]	Piloteadora [ ]	Paladraga [ ]							
	Excavadora [ ]	Autohormigonera [ ]	Motoniveladora [ ]	Vibrocompactador [ ]	Otra [ ]								
PROPIETARIO	Ingeniera y Sumistro CGB SAS					OPERADOR	Mario Rodrigues Saenz						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor					C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante					C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor					C	C		
1.4	Verificar estado de las correas					C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire					C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua					C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite					C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico					C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico					C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos					C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos					C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)					C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero					C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas					C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces					C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas					C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos					C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco					C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo					C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos					C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)					C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)					C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples					C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape					C	C		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)					C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal					NA	NA		
2.2	Hidrolavadora					NA	NA		
2.3	Bomba sube-baja canal					N.A	N.A		
2.4	Tanque de agua					N.A	N.A		
2.5	Pala de carga					N.A	N.A		
2.6	Tambor					N.A	N.A		
2.7	Tablero de mezcla					N.A	N.A		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	SI		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	SI		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	SI		
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	SI		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA		Liceth Garcia
NOMBRE	Mario Rodrigues	Liceth Garcia B
C.C	7304848	1.053.334.041

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: Julio de 2025

PROYECTO	Reposición y optimización red alcantarillado					FECHA	22/07/2025		al	27/07/2025			
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer		Retroexcavadora		Cargador		Minicargador		Piloteadora		Paladraga		
	Excavadora		Autohormigonera		Motoniveladora		Vibrocompactador		Otra				
PROPIETARIO	Ingeniería y suministros CyP SAS					OPERADOR	Mario Rodriguez Saenz						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C			C			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C			C			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C			C			
1.4	Verificar estado de las correas	C	C			C			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C			C			
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C			C			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C			C			
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C			C			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C			C			
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C			C			
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C			C			
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C			C			
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C			C			
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C			C			
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C			C			
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C			C			
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C			C			
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C			C			
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C			C			
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C			C			
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C			C			
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C			C			
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C			C			
1.24	Verificar estado tubo de escape	C	C			C			
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C			C			

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal	NA	N.A			NA			
2.2	Hidrolavadora	NA	N.A			NA			
2.3	Bomba sube-baja canal	NA	N.A			NA			
2.4	Tanque de agua	NA	N.A			NA			
2.5	Pala de carga	NA	NA			NA			
2.6	Tambor	N.A	N.A			N.A			
2.7	Tablero de mezcla	N.A	N.A			N.A			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	S		
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	S		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA		Liceth Garcia
NOMBRE	Mario Rodriguez	Liceth Garcia B.
C.C	7.304.348	1.053.334.041

Scanned with CamScanner

INGENIERIA Y SUMINISTROS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: Julio de 2025

PROYECTO	Reposicion y optimizacion red alcantarillado					FECHA	28/07/2025 al 04/08/2025						
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer		Retroexcavadora		Cargador		Minicargador		Piloteadora		Paladraga		
	Excavadora		Autohormigonera		Motoniveladora		Vibrocompactador		Otra				
PROPIETARIO	Ingenieria y suministros Cy B SAS					OPERADOR	Mario Rodriguez Saenz						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C				C			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C				C			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C				C			
1.4	Verificar estado de las correas	C				C			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C				C			
1.6	Drenar filtro separador de agua	C				C			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C				C			
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C				C			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C				C			
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C				C			
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C				C			
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C				C			
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C				C			
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C				C			
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C				C			
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C				C			
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C				C			
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C				C			
1.19	Realizar engrase del equipo	C				C			
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C				C			
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C				C			
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C				C			
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	C				C			
1.24	Verificar estado tubo de escape	C				C			
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C				C			

2. AUTOHORMIGONERA		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Canal	NA				NA			
2.2	Hidrolavadora	NA				NA			
2.3	Bomba sube-baja canal	NA				NA			
2.4	Tanque de agua	NA				NA			
2.5	Pala de carga	NA				NA			
2.6	Tambor	NA				NA			
2.7	Tablero de mezcla	NA				NA			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	S		
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	S		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	[signature]	Liceth García
NOMBRE	Mario Rodriguez	Liceth García B.
C.C	7.304.848	1.053.334.041

Scanned with CamScanner

AGOSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901428270
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA Y SUMINISTROS CYB SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 17 A 175 82 TO 2 IN 1503	TELÉFONO:	6587444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7984359491**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1755315766		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.366.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.366.800	$ 0	$ 1.366.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 1.822.400**	**$ 0**	**$ 1.822.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPSIC4	EPSIC4-ANAS WAYUU EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 456.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 456.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 792.800	$ 792.800	$ 0	$ 0	$ 792.800
SUBTOTALES:									**$ 792.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 792.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	8	$ 456.000	$ 0	$ 456.000
SUBTOTALES:			**$ 456.000**	**$ 0**	**$ 456.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006890062	ZAMBRANO CARREÑO DAVID EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007247129	TRUYOL TOLOZA MARLON DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1050846480	MORA MARTINEZ OSCAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1063483496	TORRES ALVAREZ JOVANIS RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1063488343	JIMENEZ ARRIETA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1063488939	PEDROZO FRAGOZO DEINER JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124072410	CASTAÑEDA LOPEZ JAVIER SERVANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC4-ANAS WAYUU EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901428270
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA Y SUMINISTROS CYB SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 17 A 175 82 TO 2 IN 1503	TELÉFONO:	6587444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7984359491**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1755315766		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP										CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 9195761	OROZCO MACHADO YONIS DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01															230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	901428270	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.527.200

Planilla Pagada
achSOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002699974
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAUREN STEFANY CHACON FANDINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MUZO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 5 N 5A 28	TELÉFONO:	3144343
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985351265**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1748807709

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 8.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 414.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 414.400**

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053334041		GARCIA BENITEZ EMMA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ciudadela comfaboy bloque 2 apr 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7260799	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1761590319	9491587799	I	2025/09/09	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$1,352,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$22,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$22,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$22,800		$0	$0
1	CC	1053334041	GARCIA EMMA	230201	30	$4,360,000	$697,600	EPS005	30	$4,360,000	$545,000	CCF24	30	$4,360,000	$87,200	14-23	30	$4,360,000	$22,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$4,360,000	$697,600			$4,360,000	$545,000			$4,360,000	$87,200			$4,360,000	$22,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053334041		GARCIA BENITEZ EMMA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ciudadela comfaboy bloque 2 apr 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7260799	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1761590319	9491587799	I	2025/09/09	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$1,352,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$697,600	$0	$0	$697,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$697,600	$0	$0	$697,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,800	$0	$0	$22,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$22,800	$0	$0	$22,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,200	$0	$0	$87,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$87,200	$0	$0	$87,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$545,000	$0	$0	$545,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$545,000	$0	$0	$545,000
TOTAL				1	$1,352,600	$0	$0	$1,352,600

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010174502		PEÑA SANCHEZ ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera8#4-32	BOYACA-BOYACA	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1747910924	9491260654	I	2025/09/02	2025/09/03	BANCOLOMBIA	1	$946,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$33,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$33,500		$0	$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$33,500		$0	$0
1	CC	1010174502	PEÑA ANDRES	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-8	30	$3,200,000	$33,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$33,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010174502		PEÑA SANCHEZ ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera8#4-32	BOYACA-BOYACA	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1747910924	9491260654	I	2025/09/02	2025/09/03	BANCOLOMBIA	1	$946,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$400	$0	$512,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$400	$0	$512,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,500	$100	$0	$33,600
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	1	$33,500	$100	$0	$33,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$300	$0	$400,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$300	$0	$400,300
TOTAL				1	$945,500	$800	$0	$946,300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-05, 03:35:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075446395

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 05/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Documento	CC1098697084	**Dirección**	CL 197 #27 C - 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115111638
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098697084	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Déiner José Pedrozo Fragozo

Nº CEDULA: 1.063.488.939

CARGO: Muestro de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco		1	N.A
2	Gafas		1	N.A
3	Protector auditivo		1	N.A
4	Guantes de nitrilo		1	N.A
5	Guantes carnaza		1	N.A
6	Tapabocas		1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	43	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: D. pedrozo

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Oscar Mora Martinez

Nº CEDULA: 1050.846.480

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco		1	N. A
2	Gafas		1	N. A
3	Protector auditivo		1	N. A
4	Guantes de nitrilo		1	N. A
5	Guantes carnaza		1	N. A
6	Tapabocas		1	N. A
7	Botas con puntera de seguridad	39	1	N. A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jicefh Garcia

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Oscar Mora

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B SAS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Javier Servando Cañeda Lopez

Nº CEDULA: 1124072410

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	—	1	N.A
2	Gafas	—	1	N.A
3	Protector auditivo	—	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	—	1	N.A
5	Guantes carnaza	—	1	N.A
6	Tapabocas	—	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	38	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Javier

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Luis Alfredo Jimenez Arrieta

Nº CEDULA: 1063488343

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	—	1	N.A
2	Gafas	—	1	N.A
3	Protector auditivo	—	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	—	1	N.A
5	Guantes carnaza	—	1	N.A
6	Tapabocas	—	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	39	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Luis Jimenez

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Jovanis Rafael Torres Alvarez

Nº CEDULA: 1.063.483.496

CARGO: Aux de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	/	1	N.A
2	Gafas	/	1	N.A
3	Protector auditivo	/	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	/	1	N.A
5	Guantes carnaza	/	1	N.A
6	Tapabocas	/	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	39	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jovanis RTA

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: David Eduardo Zambrano Correño

Nº CEDULA: 1.006.890.062

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	/	1	N.A
2	Gafas	/	1	N.A
3	Protector auditivo	/	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	/	1	N.A
5	Guantes carnaza	/	1	N.A
6	Tapabocas	/	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	40	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Iceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Marlon David Truyol Toloza

Nº CEDULA: 1.007.247.129

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	—	1	N.A
2	Gafas	—	1	N.A
3	Protector auditivo	—	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	—	1	N.A
5	Guantes carnaza	—	1	N.A
6	Tapabocas	—	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	41	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth García

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Marlon T.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-05	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

NOMBRE TRABAJADOR: Yonis de Jesus Orozco Machado

Nº CEDULA: 9.199.761

CARGO: Aux. de obra

FECHA DE INGRESO: 01/08/2025

FECHA DE RECIBIDO: 01/08/2025

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	—	1	N.A
2	Gafas	—	1	N.A
3	Protector auditivo	—	1	N.A
4	Guantes de nitrilo	—	1	N.A
5	Guantes carnaza	—	1	N.A
6	Tapabocas	—	1	N.A
7	Botas con puntera de seguridad	40	1	N.A
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Liceth Garcia

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Yonis Orozco

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Jovanis Rafael Torres Alvarez

N° CEDULA: 1.063.483.496

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

Jovanis R T A

FIRMA DEL TRABAJADOR

Jieth García

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Marlon David Truyol Toloza

N° CEDULA: 1.007.247.129

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

MarlonT

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth García

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Yonis de Jesus Orozco Machado

N° CEDULA: 9.159.761

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

Yonis Orozco
FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth García
ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: David Eduardo Zambrano Correño

N° CEDULA: 1.006.890.062

CARGO: Aux. de Obra

JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Sierra García

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth García

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Luis Alfredo Jimenez Arrieta

N° CEDULA: 1063488343

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego fernando Sierra Garcia

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

Luis Jimenez
FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth Garcia
ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Javier Servando Castañeda Lopez

N° CEDULA: 1124072410

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Sierra Garcia

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth Garcia

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Oscar Mora Martinez

N° CEDULA: 1.050.846.480

CARGO: Aux. de obra

JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Sierra Garcia

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

Oscar Mora

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth García

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		REGISTRO DE INDUCCIÓN DE CARGO
	CÓDIGO: SST-F- 04	VERSIÓN: 01	FECHA: 2025

FECHA DE REGISTRO: 01/08/2025

NOMBRE TRABAJADOR: Deiner Jose Pedrozo Fragozo

N° CEDULA: 1.063.488.939

CARGO: Maestro de obra

JEFE INMEDIATO: Diego fernando Sierra Garcia

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía una orientacion general sobre las funciones que desempeñara, los fines o razon social de la empresa y la organizacion y estructura de esta. En la inducción al nuevo trabajador se dieron los siguientes temas:

TEMAS TRATADOS EN INDUCCION

- Mision
- Vision
- Objetivos
- Manual de funciones del cargo
- Responsabilidades del cargo
- Horarios
- Formatos / registros
- Herramientas de trabajo
- Identificación de Peligros y Riesgos de su puesto de trabajo
- Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
- Ubicación jerarquica

Yo como trabajador de Avellaneda ingenieria s.a.s., doy constancia de haber recibido la informacion necesaria para facilitar el proceso de adapatacion y cumplimiento de mis funciones.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Liceth Garcia

ENCARGADO DE LA INDUCCION

Scanned with CamScanner

CGB SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	**FORMATO DE INSPECCIÓN HSE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**SST-F-06**
		VERSIÓN: 01
	SG - SST	**FECHA: AGOSTO 2025**

DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
1) Inspección No.	1
2) Nombre de quien registra la información	**3) Zona**
EMMA LIZETH GARCIA BENITEZ	obra
4) Tipo de sede	**5) Sede**
n.a	n.a

Valore en que nivel se encuentra el parámetro que esta evaluando de la siguiente manera:
NIVEL 1: Insatisfactorio (no se cumple, DEFICIENTE)
NIVEL 3: Aceptable (se cumple parcialmente, REGULAR)
NIVEL 5: Satisfactorio (se cumple, BUENO)

INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				
Parámetro de evaluación		**6) Calificación**	**Promedio**	**7) Observaciones**
Señalización	Cuentan con avisos preventivos en los lugares de trabajo.	regular		
	Cuentan con avisos informativos en los lugares de trabajo.	regular		
	Cuentan con avisos reglamentarios en los lugares de trabajo.	regular		
Elementos de Protección Personal - EPP	Los EPP apropiados para cada laborar que se realiza.	bueno		
	Los EPP se usan de manera adecuada.	bueno		
	Estado o condición de los EPP.	bueno		
Equipos y herramientas manuales	Cuentan con soportes de mantenimiento preventivo a herramientas y equipos.			
	Estado o condiciones de los las herramientas.			
	La maquinaria que usa tiene mecanismos que indique su marcha atrás.			
	Estado de limpieza y conservación de las herramientas.			
	Las herramientas cortantes o punzantes cuentan con mecanismos de protección.			
	Las herramientas y equipos se usan de manera adecuada.			
Residuos sólidos y peligrosos	Manejo adecuado de los residuos sólidos.	bueno		
	Cuentan con identificación de los recipientes.	bueno		
	Cuenta con un adecuado manejo de productos químicos.	**n.a**		
	Tiene disponibilidad de las Hojas de Seguridad de los insumos utilizados.	n.a		
	Hace una adecuada Disposición de madera, escombros, metales.	bueno		
	Cuenta con un sistema de orden y aseo.	bueno		
Documentación HE	Se da cumplimiento respecto a afiliaciones y aportes al sistema general se seguridad social (Administradora de Fondo de Pensiones - AFP, Entidad Promotora de Salud - EPS y Administradora de Riesgos Laborales - ARL) del mes en curso.	bueno		
	Cuenta con registro de inducciones, charlas y capacitaciones sobre impactos ambientales y riesgos laborales.	bueno		

8) OBSERVACIONES GENERALES

En el periodo informado no se realizaron actividades con herramienta menor, se realizo excavaciones mecanicas

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-F-08
		Versión:	1
	INSPECCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD	Fecha:	30/08/2025

Periodicidad de la inspección: semestral o anual

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/08/2025
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: **EMMA LIZETH GARCIA BENITEZ**
AREA O SECCIÓN: Area de obra

Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior

Cantidad de extintores en la oficina: 1

Nº	CONCEPTO	EXTINTOR 1	EXTINTOR 2	EXTINTOR 3	EXTINTOR 4	EXTINTOR 5	EXTINTOR 6	EXTINTOR 7	EXTINTOR 8	EXTINTOR 9	EXTINTOR 10	OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO	PLAN DE TRABAJO	RESPONSABLE
		S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N			
2	¿Está el extintor en su lugar?	S												
3	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	S												
4	¿El extintor está completamente cargado y operable?	S												
5	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	S												
6	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	S												
7	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	S												
8	¿Tiene el sello de seguridad?	S												
9	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	S												
10	¿La pintura está en buen estado?	S												
11	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	S												
12	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).	S												
13	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?	S												
14	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).	S												
15	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	S												
16	La lectura de presión está dentro del rango operable?	S												

C&B SAS INGENIERIA Y SUMINISTROS	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Código:**	**SST-F-07**
		Versión:	**1**
	INSPECCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD	**Fecha:**	**30/08/2025**

PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN: **EMMA LIZETH GARCIA BENITEZ**

AREA O SECCIÓN: SITIO DE OBRA

TIPO DE BOTIQUÍN

ELEMENTO BOTIQUÍN TIPO A	UBICACIÓN	CANTIDAD FALTANTE	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Gasas Estériles Paquete (Paquete X 3, 20 Unidades)	BOTIQUIN	N.A	**DIC**-202**5**	**DIC**-202**5**	N.A
Bajalenguas (Paquete por 20)	BOTIQUIN	N.A			
Esparadrapo De Tela Rollo 4"	BOTIQUIN	N.A			
Venda Elástica 2 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Venda Elástica 3 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Venda Elástica 5 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Venda De Algodón 3 X 5 Yardas		N.A			
Venda De Algodón 5 X 5 Yardas (Unidad)		N.A			
Yodopovidona (1 frasco 120 ml)	BOTIQUIN	N.A			
Solución Salina 250 Cc Ó 500 CC (2	BOTIQUIN	N.A			
Guantes para Exámen (Caja por 100)	BOTIQUIN	N.A			
Alcohol Antiséptico (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
Termómetro Digital (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
Tijeras (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
Esparadrapo De Tela Rollo 4" (Unidad)	BOTIQUIN	N.A			
ELEMENTO BOTIQUÍN TIPO B					
Venda Elástica 2 X 5 Yardas (2					
Venda Elástica 3 X 5 Yardas (2					
Venda Elástica 5 X 5 Yardas (2					
Venda De Algodón 3 X 5 Yardas (2					
Venda De Algodón 5 X 5 Yardas (2					
Gasas Estériles Paquete (Paquete X					
Apósito O Compresas No Estériles (4					
Esparadrapo De Tela Rollo 4" (2					
Bajalenguas (Paquete por 20, 2					
Solución Salina 250 Cc Ó 500 CC (5					
Yodopovidona (1 Galon)					
Guantes para Exámen (Caja por 100)					
Termómetro Digital (Unidad)					
Alcohol Antiséptico Frasco 275 ml					
Tijeras (Unidad)					
Tapabocas (Caja por 50)					
Collar Cervical Adulto (Unidad)					
Tabla Espinal Larga (Unidad)					
Inmovilizadores O Férula Miembros					
Inmovilizadores O Férula Miembros					
Tensiometro (1)					
Mascara para RCP (1)					

INGENIERIA Y SUMINISTROS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: Julio de 2025

PROYECTO	Reposicion y optimizacion red alcantarill						FECHA	05/07/2025 – 11/08/2025					
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ]	Retroexcavadora [X]	Cargador [ ]	Minicargador [ ]	Piloteadora [ ]	Paladraga [ ]							
	Excavadora [ ]	Autohormigonera [ ]	Motoniveladora [ ]	Vibrocompactador [ ]	Otra [ ]								
PROPIETARIO	Ingenieria y Suministros CyB						OPERADOR	Mario Rodriguez Saenz					

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor		C	C	C	C			
1.2	Verificar nivel de refrigerante		C	C	C	C			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor		C	C	C	C			
1.4	Verificar estado de las correas		C	C	C	C			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire		C	C	C	C			
1.6	Drenar filtro separador de agua		C	C	C	C			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite		C	C	C	C			
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico		C	C	C	C			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico		C	C	C	C			
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos		C	C	C	C			
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos		C	C	C	C			
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)		C	C	C	C			
1.13	Verificar funcionamiento del tablero		C	C	C	C			
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas		C	C	C	C			
1.15	Verificar estado de baterias y luces		C	C	C	C			
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas		C	C	C	C			
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos		C	C	C	C			
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco		C	C	C	C			
1.19	Realizar engrase del equipo		C	C	C	C			
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos		C	C	C	C			
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)		C	C	C	C			
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)		C	C	C	C			
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples		C	C	C	C			
1.24	Verificar estado tubo de escape		C	C	C	C			
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)		C	C	C	C			

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal		NA	NA	NA	NA			
2.2	Hidrolavadora		NA	NA	NA	NA			
2.3	Bomba sube-baja canal		NA	NA	NA	NA			
2.4	Tanque de agua		NA	NA	NA	NA			
2.5	Pala de carga		NA	NA	NA	NA			
2.6	Tambor		NA	NA	NA	NA			
2.7	Tablero de mezcla		NA	NA	NA	NA			

El siguiente Item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	S		
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA		Liceth Garcia
NOMBRE	Mario Rodriguez	Liceth Garcia B
C.C	7.304.848	1053334041

Scanned with CamScanner

INGENIERIA Y SUMINISTROS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: Julio de 2025

PROYECTO	Reposicion y optimizacion red alcantar					FECHA	12/08/2025 a 18/08/2025						
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer		Retroexcavadora	X	Cargador		Minicargador		Piloteadora		Paladraga		
	Excavadora		Autohormigonera		Motoniveladora		Vibrocompactador		Otra				
PROPIETARIO	Ingeniería y Suministros CyP SAS					OPERADOR	Mario Rodriguez Saenz						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C			
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C			
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C			
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C			
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C			
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C			
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C			
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C			
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C			
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C			
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C			
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C			
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C			
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C			
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C			
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C			
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C			
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C			
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C			
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C			
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C			
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C			
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C			
1.24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C			
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C			

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Canal	NA	NA	NA	NA	NA			
2.2	Hidrolavadora	NA	NA	NA	NA	NA			
2.3	Bomba sube-baja canal	NA	NA	NA	NA	NA			
2.4	Tanque de agua	NA	NA	NA	NA	NA			
2.5	Pala de carga	NA	NA	NA	NA	NA			
2.6	Tambor	NA	NA	NA	NA	NA			
2.7	Tablero de mezcla	NA	NA	NA	NA	NA			

El siguiente Item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE				OBSERVACIONES
		SI		NO		
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S	1			
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S	1			
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	S	1			
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	S	1			

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA		Liceth Carola
NOMBRE	Mario Rodrigues	Liceth Garcia D
C.C	9.304.848	1.093.334.041

Scanned with CamScanner

INGENIERIA Y SUMINISTROS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: Julio de 2025

PROYECTO	Reposicion y optimizacion red alcantarillado					FECHA	26/08/2025 al 01/09/2025						
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ]	Retroexcavadora [X]	Cargador [ ]	Minicargador [ ]	Piloteadora [ ]	Paladraga [ ]							
	Excavadora [ ]	Autohormigonera [ ]	Motoniveladora [ ]	Vibrocompactador [ ]	Otra [ ]								
PROPIETARIO	Ingenieria y suministros C&B SAS					OPERADOR	Mario Rodriguez Baez						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C		C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C		C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C		C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C		C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C		C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C		C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C		C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C		C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C		C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C		C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C		C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C		C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C		C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C		C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C		C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C		C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C		C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C		C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo	C		C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C		C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C		C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C		C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	C		C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape	C		C	C	C	C		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C		C	C	C	C		

2. AUTOHORMIGONERA		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Canal	N.A		N.A	N.A	N.A	N.A		
2.2	Hidrolavadora	N.A		N.A	N.A	N.A	N.A		
2.3	Bomba sube-baja canal	N.A		N.A	N.A	N.A	N.A		
2.4	Tanque de agua	N.A		N.A	N.A	N.A	N.A		
2.5	Pala de carga	N.A		N.A	N.A	N.A	N.A		
2.6	Tambor	N.A		N.A	N.A	N.A	N.A		
2.7	Tablero de mezcla	N.A		N.A	N.A	N.A	N.A		

El siguiente Item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S I		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S I		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	S I		
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	S I		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA		Liceth Garcia
NOMBRE	Mario Rodriguez	Liceth Garcia B
C.C	7.304.818	1.053.334.041


Scanned with CamScanner

Curva S de Recursos

Proyecto:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 313 DE 2024 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.
ID:	INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S / R/L ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ C.C. 1.010.174.502 DE BOGOTÁ

Fecha de Inicio	8/07/2025	**Fecha Fin:**	7/10/2025	**Fecha de Corte:**	25/08/2025


	Año 2025												
	Semana 1	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 5**	**Semana 6**	**Semana 7**	**Semana 8**	**Semana 9**	**Semana 10**	**Semana 11**	**Semana 12**	**Semana 13**
Valor Planificado	$ 7,024,899.36	$ 14,049,798.73	$ 21,074,698.09	$ 28,099,597.45	$ 42,149,396.18	$ 49,174,295.54	$ 56,199,194.90	$ 63,224,094.27	$ 63,224,094.27	$ 56,199,194.90	$ 42,149,396.18	$ 28,099,597.45	$ 14,049,798.73
Valor Planificado Acumulado	$ 7,024,899.36	$ 21,074,698.09	$ 42,149,396.18	$ 70,248,993.63	$ 112,398,389.81	$ 161,572,685.35	$ 217,771,880.25	$ 280,995,974.51	$ 344,220,068.78	$ 400,419,263.68	$ 442,568,659.86	$ 470,668,257.31	$ 484,718,056.04
% Planificado Acumulado	1.45%	4.35%	8.70%	14.49%	23.19%	33.33%	44.93%	57.97%	71.01%	82.61%	91.30%	97.10%	100.00%
Costo Real	$ -	$ 20,013,429.07	$ 30,020,143.60	$ 36,691,286.62	$ 40,026,858	$ 40,026,858.13	$ 66,385,846						
Costo Real Acumulado	$ -	$ 20,013,429	$ 50,033,573	$ 86,724,859	$ 126,751,717	$ 166,778,576	$ 233,164,421						
% Real Acumulado	0.00%	4.13%	10.32%	17.89%	26.15%	34.41%	48.10%						

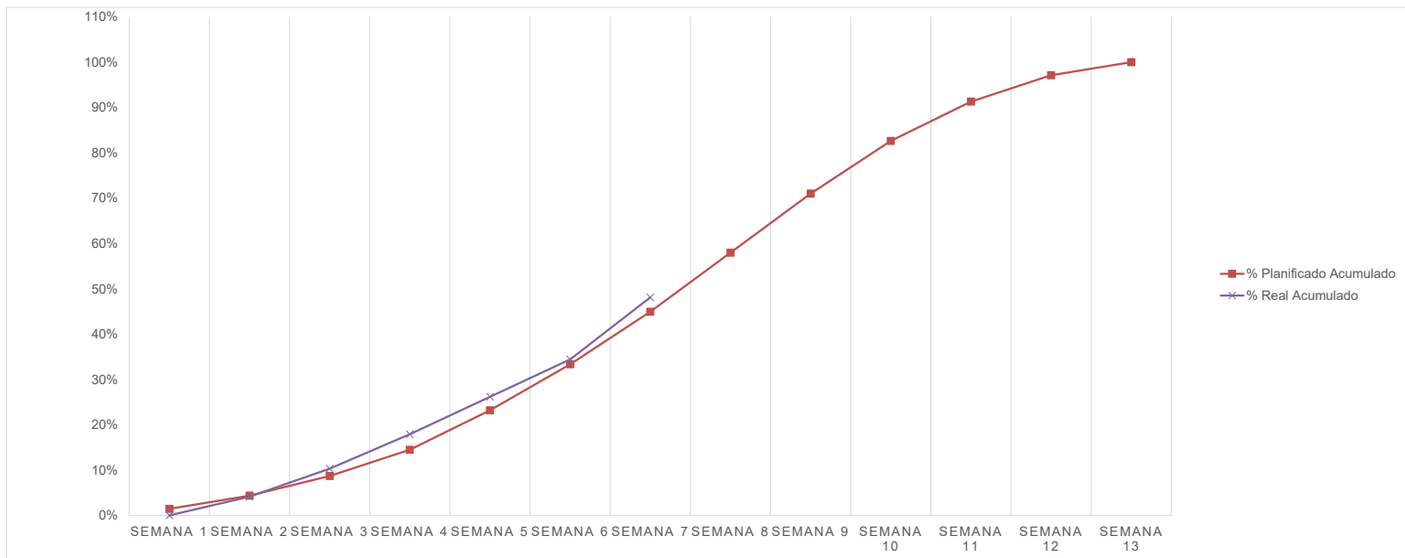

Curva S de Recursos

Proyecto:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 313 DE 2024 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.				
Contratista	INGENIERÍA Y SUMINISTROS C&B S.A.S / R/L ANDRÉS CAMILO PEÑA SÁNCHEZ C.C. 1.010.174.502 DE BOGOTÁ				
Fecha de Inicio		**Fecha Fin:**		**Fecha de Corte:**	25/08/2025

	Año 2025												
	Semana 1	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 5**	**Semana 6**	**Semana 7**	**Semana 8**	**Semana 9**	**Semana 10**	**Semana 11**	**Semana 12**	**Semana 13**
Valor Planificado	$ 7,024,899.36	$ 14,049,798.73	$ 21,074,698.09	$ 28,099,597.45	$ 42,149,396.18	$ 49,174,295.54	$ 56,199,194.90	$ 63,224,094.27	$ 63,224,094.27	$ 56,199,194.90	$ 42,149,396.18	$ 28,099,597.45	$ 14,049,798.73
Valor Planificado Acumulado	$ 7,024,899.36	$ 21,074,698.09	$ 42,149,396.18	$ 70,248,993.63	$ 112,398,389.81	$ 161,572,685.35	$ 217,771,880.25	$ 280,995,974.51	$ 344,220,068.78	$ 400,419,263.68	$ 442,568,659.86	$ 470,668,257.31	$ 484,718,056.04
Costo Real	$ -	$ 20,013,429.07	$ 30,020,143.60	$ 36,691,286.62	$ 40,026,858	$ 40,026,858.13	$ 66,385,846						
Costo Real Acumulado	$ -	$ 20,013,429	$ 50,033,573	$ 86,724,859	$ 126,751,717	$ 166,778,576	$ 233,164,421						

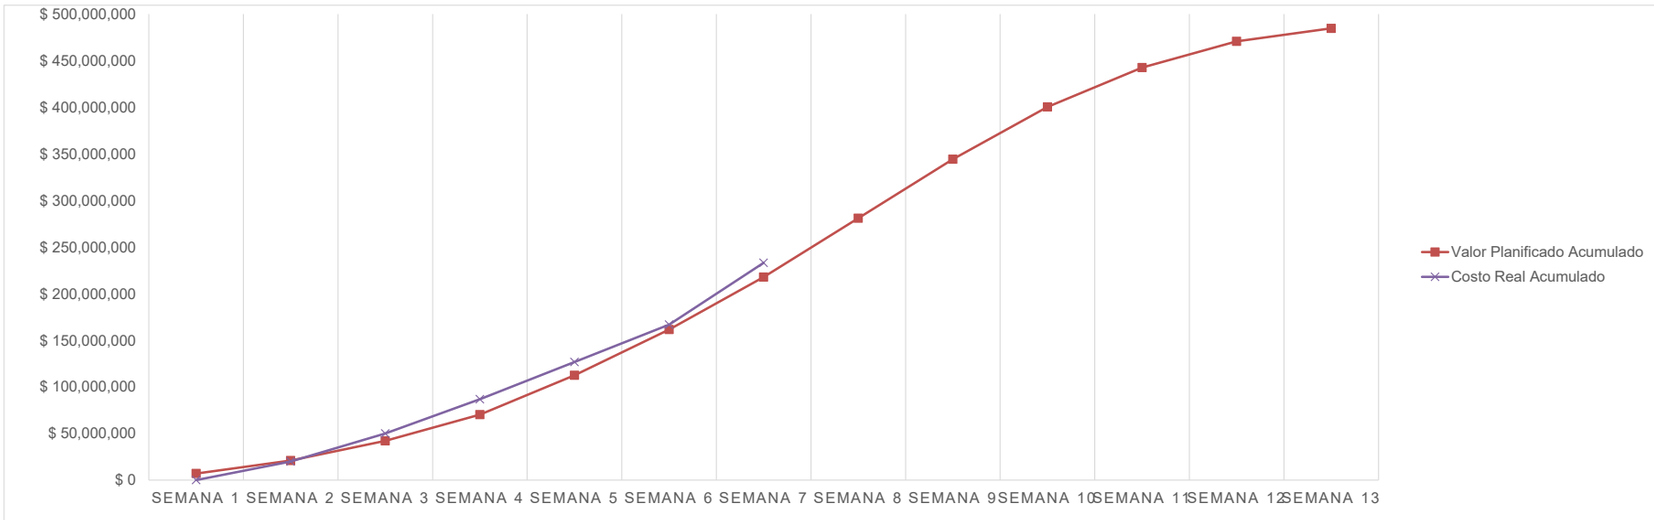

ANEXO 2. BITACORA DE OBRA

REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINUSTRATIVO No. 313 DE 2024 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.

SUPERVISOR: ING. CAMILO ANDRES BUITRAGO NUNEVAR
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA - ESVILLA E.S.P

CONTRATISTA: INGENIERIA Y SUMINISTROS C&B
R/L ANDRÉS CAMILO PEÑA SANCHEZ

CONTRATO No. 002 DE 2025

ACTA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

TERMINO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

INTERVENTOR: ARE INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
R/L. GABRIELA PACHON ALVAREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2025

BITACORA DE OBRA

VILLA DE LEYVA

2025

Scanned with CamScanner
