Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 250381 del 07.04.2025
Nombre o razón social contratista: MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S

NIT / C. C.: 901450468
Valor a cancelar: CINCO MILLONES PESOS ($ 5.000.000)

N° Factura o Cuenta de Cobro: 617
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 22/08/2025
Número Verificación Factura Preliminar: 5105632591
Período certificado: Desde 21/05/2025 hasta 21/06/2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2025	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	300	499	O21202020080585230-Servicios de sistemas de seguridad	1-100-F001-VA-Recursos distrito	5.000.000

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	72101509_-Mto_repar_equipo_sistema_protec_incendio	vr	1	4.201.681	4.201.681
				Subtotal	4.201.681
				IVA	798.319
				Total	5.000.000

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080585230	4.201.681	0
TOTALES	4.201.681	0

1. Servicio recibido:

De conformidad con lo establecido en el contrato No. 250381-2025 y en el cronograma de mantenimientos para el periodo comprendido entre el 21-05 al 21-06-2025, el contratista presto los servicios de: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH.

Dentro del periodo se realizó lo siguiente: un (1) mantenimiento preventivo según objeto contractual, para lo cual el contratista radico la siguiente factura con sus respectivos soportes: Factura No. 617 radicado 2025ER210686 del 22-08-2025, la documentación digital que se encuentran en los repositorios de la SDH dispuestos para tal fin.

2. Análisis Técnico y Financiero:

3. Constancia:

Con base en la certificación de Aportes Parafiscales firmada en Bogotá por el Representante Legal del contratista MULTISERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S. presentada para el trámite de pago junto a las planillas allegadas de pago, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 2260 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	**No. Compromiso**	250381 del 07.04.2025
Nombre o razón social contratista:	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S		
NIT / C. C.:	901450468		
Valor a cancelar:	CINCO MILLONES PESOS ($ 5.000.000)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	617		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	22/08/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105632591		
Período certificado:	Desde 21/05/2025 hasta 21/06/2025		

4. Área Responsable:

SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En Bogotá, a los 25.08.2025

Miguel Angel Quinche Chivata

Elaboró

MIGUEL ANGEL QUINCHE CHIVATA

Miguel Angel Quinche Chivata

Supervisor

MIGUEL ANGEL QUINCHE CHIVATA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vo. Bo. _____

Guillermo Alberto Suarez Pardo gasuarez@shd.gov.co

Apoyo técnico a la Supervisión

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA

CONTRATO No.	250381
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
DEP. DESTINO CONT	SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Señor(a) (es):
MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S
Identificación NIT 901450468
At: Representante Legal JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
Dirección CL 12 11 43
Teléfono 3003188545
Correo electrónico multisttsas@gmail.com
Ciudad BOGOTA, D.C.

ASUNTO: Proceso de contratación N°. SDH-SMINC-0009-2025

Me permito comunicarle que, de acuerdo con el resultado del informe de evaluación y verificación de requisitos habilitantes, la oferta económica y la recomendación efectuada por el comité evaluador mediante acta de fecha 01 de abril de 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda acepta su oferta presentada para el proceso del asunto.

La supervisión del contrato será ejercida por MIGUEL ANGEL QUINCHE CHIVATA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Las estipulaciones del contrato son las siguientes:

<table>
<tr><th colspan="2">ESTIPULACIONES CONTRACTUALES</th></tr>
<tr><td>1. OBJETO</td><td>PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH</td></tr>
<tr><td>2. VALOR</td><td>TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE($30.600.000)
, incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos
El valor se discrimina de la siguiente manera:
<table><tr><th>Vigencia (años)</th><th>Valor</th></tr><tr><td>No aplica</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3. FORMA DE PAGO</td><td>La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así:

Pagos mensuales, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en mantenimiento preventivo y/o correctivo, suministro de repuestos o elementos requeridos dentro el respectivo período.

El contratista debe adjuntar a la factura de cobro, (1) un informe de los servicios y actividades ejecutadas, (2) la solicitud de repuestos o materiales con la debida autorización del supervisor, (3) certificaciones de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar emitido por representante legal y/o revisor fiscal, (4) planillas de pago aportes parafiscales

Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera, de la Certificación de Cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato.</td></tr>
</table>

	Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se realizarán a través del Sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada
4. PLAZO DE EJECUCION	5 Mes(es) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.
5. VIGENCIA DEL CONTRATO	La vigencia será el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
6. CODIGO PRESUPUESTAL	O21202020080585230 — **No.CDP y fecha**: 300 28/02/2025
7. LIQUIDACION	Tracto Sucesivo — **Procede la Liquidación**: SI

8. GARANTIAS

8.1. El Contratista se obliga a constituir a favor de BOGOTÁ, D.C. – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA una garantía única, que ampare:

Amparo	Cobertura	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	30% del Valor Total del Contrato	Vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	10% del Valor Total del Contrato	Vigente por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Calidad del Servicios	20% del Valor Total del Contrato	Vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	20% del Valor Total del Contrato	Vigente a partir de la fecha de terminación del contrato y por seis (6) meses más.
Provisión de Repuestos	20% del Valor Total del Contrato	Vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

8.2. El contratista se obliga a constituir a favor de BOGOTÁ, D.C. – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA una póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por un monto equivalente a NO APLICA con vigencia igual al término de ejecución del contrato. La póliza debe contener los amparos establecidos en los numerales 5.8 de la invitación pública y 7.3 de los Estudios Previos del presente proceso.

9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO	Hacen parte del presente contrato todos los documentos expedidos en las etapas precontractual, contractual y en la liquidación del mismo cuando haya lugar a ella.

OTRAS ESTIPULACIONES

10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

1.Presentar para la suscripción del acta de inicio la siguiente documentación:

- Cronograma de mantenimiento preventivo para el plazo de ejecución del contrato.
- Certificación o soporte (planilla PILA) de pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.
- Carta de presentación del personal a ejecutar el servicio.

Debe contener como mínimo: Cargo, Nombre completo, datos de contacto o enlace administrativo (número telefónico, número celular y correo electrónico). Línea telefónica y número celular disponible (7 días por 24 horas) para el reporte de cualquier eventual necesidad de Secretaría Distrital de Hacienda.

- Hojas de Vida del personal, anexando la documentación y certificados solicitados

- Presentar el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos, determinando como mínimo cómo y a quien se efectúa la disposición y entrega de residuos. Debe estar avalado/firmado por el representante legal de la empresa
- Presentar copia del documento llamado “registro de generador de residuos peligrosos” del RUA-IDEAM actualizado y volverlo a presentar cada seis meses mientras dure el contrato.
- Plan de trabajo o panorama de riesgos, realizado por un profesional con licencia en salud ocupacional vigente, anexando copia de la licencia del profesional que avala los documentos, y el formato ATS que el contratista va a utilizar en la ejecución del contrato.,
- Protocolos de Bioseguridad.
- Certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, emitido por la aseguradora ARL.
- Certificación Bancaria de cuenta para efectuar los pagos.

2. Cumplir con la programación indicada en el cronograma.
3. Iniciar la rutina preventiva, previa presentación con el supervisor del contrato o quien haga sus veces, así mismo deberá finalizar la rutina presentando las planillas de inspección debidamente diligenciados
4. Diligenciar las planillas de inspección, pruebas y mantenimientos siguiendo los procedimientos y requisitos mínimos de la NFPA 72, y NFPA 25 y NFPA 13, para todos los equipos y componentes del sistema objeto de mantenimiento.
5. Realizar los mantenimientos correctivos que se requieran previa autorización del supervisor del contrato.
6. Presentar Informe de las actividades realizadas en el periodo. El informe debe contener registro de cada una de las actividades realizadas tanto preventivas, correctivas y emergencias que hayan podido surgir, debe incluir las labores programadas para ejecutar en el periodo inmediatamente posterior
7. Presentar informe individual con calificación de resultados y metas de mejora, para las rutinas que incluyan mediciones, diagnósticos con equipo especializado, pruebas y/o graficas de comparación
8. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta económica, durante la vigencia del contrato.
9. Asesorar técnicamente a la entidad contratante sobre las reformas o ajustes en que se deba incurrir para garantizar el correcto estado de la red contra incendios o la del sistema de detección de incendios.
10. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos y directrices de gestión ambiental establecidos en el presente Anexo Técnico.
11. Responder por daños que se generen a los bienes y/o inmuebles de las instalaciones de la Entidad, con ocasión y por razón de la ejecución del objeto del contrato. En el evento de presentarse daños a los bienes y/o inmuebles, el contratista debe reparar y/o reponer los bienes, dejando las instalaciones en el mismo estado que se encontraba al inicio de ejecución del contrato.
12. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato

11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.
2. Prestar el servicio objeto del presente contrato con estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico, así como en la propuesta presentada.
3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social., salud, pensiones , aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 , artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
5. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato electrónico, constituir las garantías pactadas en el mismo.
6. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.
7. Colaborar con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de mejor calidad.
8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.
9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
10. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor del contrato.

12. Presentar cuando sean requeridos los comprobantes de afiliación y pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del personal destinado a la prestación del servicio junto con el comprobante de pago del subsidio familiar y la afiliación a la A.R.L.
13. Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda y allegar certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas concordantes.
14. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso)
15. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 de 2012 el contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso.
16. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
18. Cumplir con las políticas y lineamientos señalados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) implementado por la Secretaría Distrital de Hacienda, si es del caso.
19. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Distrital 332 de 2020, en el sentido de: a) Prevenir el abuso y el acoso sexual, así como promover su denuncia, y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato, y b) hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009
20. Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados.

12. MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato se causará a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

13. PENAL PECUNIARIA: Si el Contratista no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, (Si el valor del amparo de cumplimiento se establece en el 20%, se debe ajustar el porcentaje al 10%) como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamación por los perjuicios ocasionados.

14. APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente por la Secretaría Distrital de Hacienda, descontando el valor de los pagos que ésta deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. Previa a la adopción de la decisión de imposición de la multa o de la cláusula penal pecuniaria se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

15. ESTAMPILLAS: Corresponde al Contratista el pago de: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017; b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005; c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y Acuerdo 669 de 2017; y d) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Cincuenta Años de Labor de la Universidad Pedagógica Nacional, de conformidad con el Acuerdo 568 de 2014 reglamentado por el Decreto 584 de 2014. (El literal d) sólo aplica para contratos de consultoría y obra)

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: El Contratista guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de la SECRETARÍA en desarrollo del objeto contractual.

17. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Secretaría con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: conciliación, amigable composición o transacción.

18. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El Contratista no podrá ceder ni subcontratar este contrato sin el consentimiento previo y escrito del DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA pudiendo ésta negar la autorización de cesión o del subcontrato.

19. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 adicionada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en los artículos 1º, 2º, 3º. 4º, 5, 84 parágrafo 2º y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

20. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para la ejecución del contrato se requerirá de la expedición del Registro Presupuestal, de la aprobación de las garantías, acreditar por parte del Contratista que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar; y de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución respectiva.

21. GASTOS: Serán por cuenta del Contratista todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus modificaciones.

22. IMPUESTOS: El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

23. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias.

24. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: El contratista se compromete en un esfuerzo conjunto con la SDH a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la prevención de corrupción en su gestión contractual, en el marco de los principios y normas constitucionales y en especial, en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011 “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública”, y artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020, para lo cual debe tener en cuenta lo siguiente: 1) no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. 2) Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. 3) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 4) No incurrir e falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. Si hay incumplimiento comprobado del presente compromiso por parte del contratista, es causal suficiente para iniciar el procedimiento indicado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y adicionalmente se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar.

25. SUSTITUCIÓN DEL SUPERVISOR: El supervisor designado en este contrato podrá ser sustituido temporalmente o de manera definitiva, mediante la realización del trámite correspondiente en el aplicativo BogData.

26. DECLARACIÓN DE NO TENER PROCESOS DE CARÁCTER ALIMENTARIO: El representante legal del contratista declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entiende prestada con la firma del presente contrato, que, a la fecha de suscripción del contrato, no tiene conocimiento de que cursen en su contra procesos de carácter alimentario en ningún juzgado y que en caso de que llegare a conocer proceso alguno cumplirá con todas sus obligaciones de familia.

27. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA



Firmado digitalmente por DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ

Diego Armando Chitiva Sánchez
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. GESTION CORPORATIVA

Elaboró	Jhon Mauricio Contreras Díaz	John Mauricio Contreras Díaz Firmado digitalmente por John Mauricio Contreras Díaz
Revisó	Fatty Marcela Castro Macias - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES	MARCELA CASTRO MACÍAS Firmado digitalmente por MARCELA CASTRO MACÍAS

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

Pública
223100-29 Acta de inicio del contrato.

CONTRATO N°:	250381
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH
CONTRATISTA:	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S
VALOR CONTRATO:	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE($30.600.000)
PLAZO:	5 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	21/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/09/2025
SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL QUINCHE CHIVATA-PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá, D.C., a los veintiún (21) día del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), se reunieron Miguel Angel Quinche Chivata en su calidad de Supervisor designado para la ejecución del contrato y JOHN CARLOS OSPINA TOVAR actuando en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de MULTISTT S.A.S, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación de real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por las garantías, según verificación del Supervisor deben ser ajustados teniendo en cuenta la fecha de suscripción de la presente acta, para lo cual el contratista se compromete a allegar los correspondientes anexos modificatorios en un plazo no superior a tres (3) días hábiles, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en el contrato.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 21/04/2025.

SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL QUINCHE CHIVATA-PROF ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	IIVERSITARIO - SUBD. Miguel Angel Quinche Chivata

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S
REPRESENTANTE LEGAL:	

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

Factura Electrónica de Venta MTT0 - 617

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080928877 de 03/10/2024 - 03/10/2026 autoriza MTT0-601 a MTT0-630

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/08/2025 14:54
Fecha de Vencimiento	19/09/2025 14:54
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	250381

Actividad Económica Principal 3 3 1 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

SIN VALIDAR

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901450468-1
Obligación	IVA
Email	financiera.multistt@gmail.com
Teléfono	3 0 0 3 1 8 8 5 4 5
Dirección Fiscal	CL 12 11 43 BRR CABALLERO Y GONGORA, ESPINAL, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nombre Comercial	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
NIT	899999061-9
Obligación	NO APLICA
Email	radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Teléfono	6013820660
Dirección	TV 18 BIS 38 41
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01_250381	RUTINA PREVENTIVA SEMANA SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS semana 3 (23 y 24 mayo), semana 4 (30 y 31 de mayo), semana 5 (6 Y 17 de junio), semana 6 (13 y 15 de junio), semana 7 (20 y 21 de junio)	5.0	EA	$235,294.12	IVA 19%	$1,176,470.59	$1,400,000.00
2	02_250381	RUTINA PREVENTIVA MENSUAL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS semana 6 (13 y 15 de junio)	1.0	EA	$840,336.13	IVA 19%	$840,336.13	$999,999.99
3	03_250381	RUTINA PREVENTIVA SEMANAL SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS semana 3 (23 y 24 mayo), semana 4 (30 y 31 de mayo), semana 5 (6 Y 17 de junio), semana 6 (13 y 15 de junio), semana 7 (20 y 21 de junio)	5.0	EA	$268,907.56	IVA 19%	$1,344,537.82	$1,600,000.00
4	04_250381	RUTINA PREVENTIVA TRIMESTRAL SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS semana 7 (20 y 22 de junio)	1.0	EA	$840,336.13	IVA 19%	$840,336.13	$999,999.99

4

Subtotal	$4,201,680.67
IVA 19%	$798,319.31
Total a Pagar	**$4,999,999.98**

Unidades de medida: EA = cada

Factura Electrónica de Venta MTT0 - 617

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080928877 de 03/10/2024 - 03/10/2026 autoriza MTT0-601 a MTT0-630

Actividad Económica Principal 3 3 1 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/08/2025 14:54
Fecha de Vencimiento	19/09/2025 14:54
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	250381

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SIN VALIDAR

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ESPINAL, TOLIMA, 21/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECN OLOGICOS SAS** con **NIT 901.450.468-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 166200161163

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JOHN CARLOS OSPINA TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.133.244 expedida en Espinal Tolima., en mi condición de Representante Legal de la empresa MULTISERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S. identificada con Nit. 901.450.468-1 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima con matrícula No. 00106373 de 29 de enero de 2021, me permito,

CERTIFICAR QUE:

La empresa ha realizado el pago a partir de la fecha de su constitución de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, incluidos los últimos seis (06) meses, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Espinal Tolima; a los veinte y un (21) día del mes de agosto (08) de dos mil veinte y cinco (2025).

Cordialmente,

Esp. JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
C.C. N°. 93.133.244 de Espinal Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
MULTISERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S.

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH.

TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH

Contrato Secop II: CO1.SLCNTR.14859433 de abril de 2025
Número del contrato: 250381

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH.

Elaborado por: Esp. John C. Ospina

Fecha: del 13 al 15 de de junio
Ciclo: Mensual


1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es presentar en forma documental las actividades ejecutadas, durante el mantenimiento preventivo y correctivo desarrollado en los Sistemas de Detección de Incendios de las TORRES A Y B del centro administrativo distrital CAD y de las sedes de la SDH

2. ALCANCE


El alcance del mantenimiento fue realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo según las especificaciones del anexo técnico y en cumplimiento con la normatividad expuesta en la norma NFPA 72 “Código nacional de alarmas de incendio y señalización”, Inspección prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua y la NFPA 25 y NFPA 13 “Sistemas de rociadores automáticos” Así como lo definido por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR10 en sus capítulos J y K. los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de detección y alarmas de incendio, así como al sistema de extinción de incendio por aguas presurizadas, adaptados en la edificación Centro Administrativo Distrital y las sedes a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda, que hacen parte integral del contrato.

3. UBICACIÓN

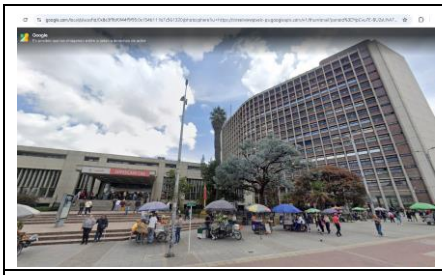



Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90





Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45

4. Personal y EPP

- El personal requerido en la ejecución de las actividades de mantenimiento es el solicitado por la entidad, previa autorización de la supervisión.

- EPP de acuerdo a las diferentes actividades realizadas dentro del objeto contractual y anexo técnico del mismo.

Para la labor del mantenimiento de los diferentes sistemas EPP del personal:

- Guantes de nylon recubiertos de nitrilo
- Casco (donde aplica)
- Monogafas de seguridad (donde aplica)
- Botas con protección de puntas de policarbonato dieléctricas
- Tapón Auditivo Reutilizable
- Pantalón en tela de algodón
- Camisa, Camibuso tipo polo en tela de algodón y Chalecos de identificación

HERRAMIENTA se utilizó:

- Llaves combinadas en diferentes medias calibradas en milímetros y pulgadas.
- Calibre manual de escala dual milímetros y pulgadas.
- Destornilladores punta estándar y Phillips.
- Alicate de electricista
- Alicate de corte diagonal
- Alicate de punta larga
- Pinza voltiamperimétrica
- Escalera plegable
- Manómetros
- Termómetro
- Blower

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

Como elementos consumibles:

- Liquido limpiador electrónico
- Paños de limpieza

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

El servicio de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periódicas contempladas en el manual emitido por el fabricante para mantenimiento y/o las labores expuestas y en la norma NFPA y los servicios básicos señalados en la tabla y/o programa de mantenimiento del Anexo Técnico contractual. Entiéndanse como labores preestablecidas que identifican y mantiene la maquinaria en función al tiempo y uso, basado en análisis “revisión - Inspección", ajuste, limpieza, lubricación, calibración y cambio de elementos por desgaste, preestablecidos o fungibles, según lo programado

5. CRONOGRAMA Y SEDES

CRONOGRAMA MENSUAL				MAY		MAY		JUN		JUN			JUN		
ITEM	SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	6	13	14		20	21	22
2	Rutina preventiva Mensual	5	UN							13	14	15			
ITEM	SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	7	13	14	15	20	21	
2	Rutina preventiva Trimestral	3	UN										20	21	22
3	Rutina preventiva Semestral	2	UN												

CONVENCIONES	
EJECUTADO	
PENDIENTE	
NOVEDAD	
FACTURADO	

SEDES

SEDES UTINAS SEMANALES SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS y SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	**DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO**	**RED CONTRA INCENDIOS "AGUAS PRESURIZADAS”**
Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	X	X
Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45	X	

5.1 EQUIPOS DETECCION INCENDIOS

MARCA	COMPONENTE	SERIE
HOCHIKI	PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE	FireNET®
HOCHIKI	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	ALN-V
HOCHIKI	SENSOR DE CALOR DE TEMPERATURA FIJA E INCREMENTO	ATJ-EA
HOCHIKI	BASE ANÁLOGA CON AISLADOR DE CORTO CIRCUITO	HSB-NSA-6
HOCHIKI	MÓDULO DE CONTACTO DE RESPUESTA RÁPIDA	DCP-FRCMA-I
HOCHIKI	MÓDULO DE DOBLE RELEVADOR	DCP-R2ML-I
HOCHIKI	MÓDULO DE SALIDA SUPERVISADA	DCP-SOM-AI
HOCHIKI	ESTACIÓN DE HALADO MANUAL	HPS-SAH
HOCHIKI	SIRENA CON LUZ ESTROBO	HE SERIES
HOCHIKI	MODULO INTEGRADOR BMS	HE SERIES

5.2 EJECUCIÓN

Realizamos el recorrido general por las instalaciones del SDH, realizando las siguientes actividades para los diferentes sistemas de DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS:

EQUIPOS A VERIFICAR DE ACUERDO A ANEXO TECNICO .

- PANEL CENTRAL (Equipo de Control y señalización)
- MODULO DE INTEGRACIÓN *

5.2.1 ACTIVIDADES A EJECUTAR

1. Inspección y medición de circuitos eléctrico y/o electrónicos
2. Revisar los parámetros de suministro correcto según el circuito eléctrico comercial
3. Revisar los parámetros de suministro correcto, según el circuito eléctrico de Baterías de respaldo
4. Limpieza, aspirado y reapriete de tornillería y terminales de conexión (*) Si aplica

Se realiza visita mensual periodica de acuerdo a anexo tecnico con el fin de revisar, diagnosticar, analizar y evaluar el sitema de Deteccion de incendios con que cuenta la Entidad Secretaria Distrital de Hacienda – Bogota D.C y las posibles fallas que pueda estar presentando.

Dando aplicabilidad a el anexo tecnico y la normatividad vigente como lo son:

NFPA 1: Se utiliza como un estándar de referencia para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios en Colombia..

NFPA 25: Norma de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua.

NFPA 70: Norma para la instalación segura de cableado y equipos eléctricos.

NFPA 72R: Norma que establece los estándares para el diseño, instalación, inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de alarma de incendios

NFPA 75: Norma establece los requisitos mínimos para la protección contra incendios de los equipos de tecnología de la información (TI) y las áreas de equipos de TI

NTC 1931 Establece los requisitos para las señales de seguridad contra incendios

5.2.2 EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINA MENSUAL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

Al momento de iniciar la Rutina de mantenimiento preventivo mensual corespondiente a la vigencia mayo-junio, se verifican las actividades a realizar

se realizaron las siguientes actividades al sistemas de deteccion de incendios de acuerdo a anexo tecnico y normas aplicables en el SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO.



PANEL CENTRAL
(Equipo de Control y señalización)
Y MODULO DE INTEGRACIÓN

5.2.3 NOVEDADES DEL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90

)



EQUIPO: Panel central (Equipo de Control y señalización)
modulo de integración

UBICACIÓN: Piso 2 Central de monitoreo

OBSERVACION: Mantenimiento preventivo Mensual

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realizan actividades correspondientes a el mantenimeinto preventivo semanal, los cuales son necesarios para el optimo funcionamiento del equipo.

RECOMENDACIÓN

Seguir con los mantenimientos periodicos.

Toda vez que las centrales contra incendios son un componente esencial en los sistemas de protección y detección, actuan como el “cerebro” del sistema al monitorear y controlar los dispositivos conectados (detectores de humo, estaciones manuales de alarma, y rociadores automáticos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90

PANEL CENTRAL ARCHIVO

(Equipo de Control y señalización)
















EQUIPO: Panel central
modulo de integración

UBICACIÓN: Archivo Central de monitoreo

OBSERVACION: Mantenimiento preventivo Mensual

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realizan actividades correspondientes a el mantenimeinto preventivo semanal, los cuales son necesarios para el optimo funcionamiento del equipo

RECOMENDACIÓN

Seguir con los mantenimientos periodicos.

Toda vez que las centrales contra incendios son un componente esencial en los sistemas de protección y detección, actuan como el “cerebro” del sistema al monitorear y controlar los dispositivos conectados (detectores de humo, estaciones manuales de alarma, y rociadores automáticos)

Se realizo las pruebas de funcionamiento los equipos quedan sin alarmamientos y sin fallos

6 SOLICITUDES

- Se solicita se nos proporcione el diagrama de la ubicación logica de los equipos correspondientes al mantenimiento.

  Para facilitar la ubicación de los fallos - bucles que presentan y se presenten a futuro durante el contrato.

- Ampliación en los accesos de la tarjeta, que puedan abrir todos los cuartos técnicos y demás áreas donde se encuentre instalado el sistema o en su defecto autorizar al personal de seguridad par que nos den ingreso y/o acompañamiento donde se requiera.

- Tramitar los ingresos a las áreas restringidas donde se encuentre instalado el sistema de Detección y Extinción de Incendios en las diferentes dependencias del edificio Torre A y Torre B, como ejemplo Concejo y Tesorería primer piso HSD

- Quedamos atentos a las acciones a tomar con relación a los correctivos

Cordialmente,

Esp. JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
T.P. 27985-93133244
C.C. 93.133.244 de Espinal Tolima
Representante Legal
MULTISTT SAS

Elaboro: John Ospina
Reviso: María Valencia

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-003	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA			V1
	REVISION Y PRUEBAS EQUIPOS CONTRAINCENDIOS	DOCUMENTO CONTROLADO		

CIUDAD Y DEPARTAMENTO	FECHA			HORA INGRESO	HORA SALIDA
	Día	Mes	Año		
BOGOTA D.C, Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	15	JUNIO	2025	10:00 a. m.	12:00M

TIPO DE MANTENIMIENTO	MENSUAL	PREDICTIVO ☐	PREVENTIVO ☒	CORRECTIVO ☐

TIPO DE EQUIPO	PANEL CENTRAL Y MODULO DE INTEGRACION		TIPO DE GAS REFRIGERANTE	
MARCA		MODELO		PLACA INVENTARIO	
SERIE		UBICACIÓN	CENTRAL DE MONITOREO ARCHIVO	
RESPONSABLE DEL EQUIPO			IDENTIFICACIÓN	

ELEMENTOS DE INSPECCION	Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **N:** no **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **S:** si	OBSERVACIÓN
GABINETES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Cuenta con Kit contraincendio	NA	
Manguera contraincendios y conexiones:	NA	
Lanza con Boquilla	NA	
Valvula controladora de flujo de agua	NA	
Extintor	NA	
Hacha	NA	
Cascos	NA	
Palas	NA	
Herramientas adicionales	NA	
HIDRANTES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Equipo cuenta con presion de agua	NA	
Equipo presenta fugas	NA	
CARRETES MANGUERAS		
Elemento se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Elemento	NA	
Elemento Cuenta con Manguera	NA	
Estado de la Manquera	NA	
ESTACION DE EMERGENCIA		
Detectores de Humo	B	
Detectores Termicos	B	
Luz sirena	B	
Luz Estroboscopica	B	
Modulos de monitoreos	B	Se realiza mantenimiento preventivo mensual al equipo
Equipo de control y señalizacion	B	OPTIMO
Equipos accesible y señalizado	B	accesible: Se encuentra detrás de un puesto de trabajo, señalizado: NO
Equipo completo	si	
Estado del Equipo	B	OPTIMO
Estado del Equipo	B	OPTIMO
CUARTO DE MAQUINAS		
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal inicio	NA	

Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba rincipal inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba principal final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey final	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías Inicio	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías final	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición de válvulas de paso	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente abierta	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente cerrada	NA	
Revision, verificacion, Inspección delnivel en tanque(s) de reserva agua para el sistema contra incendio	**NA**	
Revision, verificacion, inspeccion Des energizar bomba principal y bomba auxiliar	NA	
Revicion, verificacion, Limpieza de toma agua o filtro	NA	
Revision, verificacion, inspeccion secado de la tuberia	NA	
Revision, verificacion Aplique de pintura	NA	
Revision, verificacion Aplique de anticorrosivo tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tanques	NA	
ROCIADORES		
Inspección Visual General del Equipo	B	
Revision, verificacion limpieza del equipo	B	
Revision, verificacion Estado funcional del Equipo	B	**OPERATIVO**
Revision, verificacion obstrucciones del Equipo	B	
Revision, verificacion y comprobacion de altura del equipo	B	**ADECUADA**

Otros. ¿Cual?

OBSERVACIONES:

Responsable de la Inspeccion:		**Responsable del seguimiento:**
NOMBRE Y APELLIDO:	RONALDO CAMACHO	**NOMBRE Y APELLIDO**
IDENTIFICACIÓN:	9.432.026	**IDENTIFICACIÓN**
CARGO	TECNICO	**CARGO**

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-003	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA			V1
	REVISION Y PRUEBAS EQUIPOS CONTRAINCENDIOS	DOCUMENTO CONTROLADO		

CIUDAD Y DEPARTAMENTO	FECHA			HORA INGRESO	HORA SALIDA
	Día	Mes	Año		
BOGOTA D.C, Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	13	JUNIO	2025	9:00 a. m.	11:00AM

TIPO DE MANTENIMIENTO	MENSUAL	PREDICTIVO ☐	PREVENTIVO ☒	CORRECTIVO ☐

TIPO DE EQUIPO	PANEL CENTRAL Y MODULO DE INTEGRACION		TIPO DE GAS REFRIGERANTE	
MARCA		MODELO		PLACA INVENTARIO	
SERIE		UBICACIÓN	PISO 2 CENTRAL DE MONITOREO EDIFICIO SHD	
RESPONSABLE DEL EQUIPO			IDENTIFICACIÓN	

ELEMENTOS DE INSPECCION	Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **N:** no **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **S:** si	OBSERVACIÓN
GABINETES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Cuenta con Kit contraincendio	NA	
Manguera contraincendios y conexiones:	NA	
Lanza con Boquilla	NA	
Valvula controladora de flujo de agua	NA	
Extintor	NA	
Hacha	NA	
Cascos	NA	
Palas	NA	
Herramientas adicionales	NA	
HIDRANTES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Equipo cuenta con presion de agua	NA	
Equipo presenta fugas	NA	
CARRETES MANGUERAS		
Elemento se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Elemento	NA	
Elemento Cuenta con Manguera	NA	
Estado de la Manquera	NA	
ESTACION DE EMERGENCIA		
Detectores de Humo	B	
Detectores Termicos	B	
Luz sirena	B	
Luz Estroboscopica	B	
Modulos de monitoreos	B	Se realiza mantenimiento preventivo mensual al equipo
Equipo de control y señalizacion	B	OPTIMO
Equipos accesible y señalizado	B	accesible si, señalizado NO
Equipo completo	si	
Estado del Equipo	B	OPTIMO
Estado del Equipo	B	OPTIMO
CUARTO DE MAQUINAS		
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal inicio	NA	

Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba rincipal inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba principal final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey final	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías Inicio	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías final	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición de válvulas de paso	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente abierta	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente cerrada	NA	
Revision, verificacion, Inspección delnivel en tanque(s) de reserva agua para el sistema contra incendio	**NA**	
Revision, verificacion, inspeccion Des energizar bomba principal y bomba auxiliar	NA	
Revicion, verificacion, Limpieza de toma agua o filtro	NA	
Revision, verificacion, inspeccion secado de la tuberia	NA	
Revision, verificacion Aplique de pintura	NA	
Revision, verificacion Aplique de anticorrosivo tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tanques	NA	
ROCIADORES		
Inspección Visual General del Equipo	B	
Revision, verificacion limpieza del equipo	B	
Revision, verificacion Estado funcional del Equipo	B	**OPERATIVO**
Revision, verificacion obstrucciones del Equipo	B	
Revision, verificacion y comprobacion de altura del equipo	B	**ADECUADA**

Otros. ¿Cual?

OBSERVACIONES:

Responsable de la Inspeccion:		**Responsable del seguimiento:**
NOMBRE Y APELLIDO:	RONALDO CAMACHO	**NOMBRE Y APELLIDO**
IDENTIFICACIÓN:	9.432.026	**IDENTIFICACIÓN**
CARGO	TECNICO	**CARGO**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	250381
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/04/2025
FECHA DE INICIO:	21/04/2025
PLAZO:	5 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 21/05/2025 a 21/06/2025
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105632591/2025
SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL QUINCHE CHIVATA-PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.

2. Prestar el servicio objeto del presente contrato con estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico, así como en la propuesta presentada.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.

4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social., salud, pensiones , aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 , artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

5. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato electrónico, constituir las

garantías pactadas en el mismo.

6. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.

7. Colaborar con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de mejor calidad.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.

9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.

10. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor del contrato.

12. Presentar cuando sean requeridos los comprobantes de afiliación y pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del personal destinado a la prestación del servicio junto con el comprobante de pago del subsidio familiar y la afiliación a la A.R.L.

13. Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda y allegar certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas concordantes.

14. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso)

15. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 de 2012 el contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso.

16. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.

17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir

algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

18. Cumplir con las políticas y lineamientos señalados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) implementado por la Secretaría Distrital de Hacienda, si es del caso.

19. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Distrital 332 de 2020, en el sentido de: a) Prevenir el abuso y el acoso sexual, así como promover su denuncia, y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato, y b) hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009

20. Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones generales del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIALES

1. Presentar para la suscripción del acta de inicio la siguiente documentación:

- Cronograma de mantenimiento preventivo para el plazo de ejecución del contrato.
- Certificación o soporte (planilla PILA) de pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.
- Carta de presentación del personal a ejecutar el servicio.

Debe contener como mínimo: Cargo, Nombre completo, datos de contacto o enlace administrativo (número telefónico, número celular y correo electrónico). Línea telefónica y número celular disponible (7 días por 24 horas) para el reporte de cualquier eventual necesidad de Secretaría Distrital de Hacienda.

- Hojas de Vida del personal, anexando la documentación y certificados solicitados
- Presentar el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos, determinando como mínimo cómo y a quien se efectúa la disposición y entrega de residuos. Debe estar avalado/firmado por el representante legal de la empresa
- Presentar copia del documento llamado “registro de generador de residuos peligrosos” del RUA-IDEAM actualizado y volverlo a presentar cada seis meses mientras dure el contrato.
- Plan de trabajo o panorama de riesgos, realizado por un profesional con licencia en salud ocupacional vigente, anexando copia de la licencia del profesional que avala los documentos, y el formato ATS que el contratista va a utilizar en la ejecución del contrato.,
- Protocolos de Bioseguridad.
- Certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, emitido por la aseguradora ARL.
- Certificación Bancaria de cuenta para efectuar los pagos.

2. Cumplir con la programación indicada en el cronograma.

3. Iniciar la rutina preventiva, previa presentación con el supervisor del contrato o quien haga sus veces, así mismo

deberá finalizar la rutina presentando las planillas de inspección debidamente diligenciados

4. Diligenciar las planillas de inspección, pruebas y mantenimientos siguiendo los procedimientos y requisitos mínimos de la NFPA 72, y NFPA 25 y NFPA 13, para todos los equipos y componentes del sistema objeto de mantenimiento.

5. Realizar los mantenimientos correctivos que se requieran previa autorización del supervisor del contrato.

6. Presentar Informe de las actividades realizadas en el periodo. El informe debe contener registro de cada una de las actividades realizadas tanto preventivas, correctivas y emergencias que hayan podido surgir, debe incluir las labores programadas para ejecutar en el periodo inmediatamente posterior

7. Presentar informe individual con calificación de resultados y metas de mejora, para las rutinas que incluyan mediciones, diagnósticos con equipo especializado, pruebas y/o graficas de comparación

8. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta económica, durante la vigencia del contrato.

9. Asesorar técnicamente a la entidad contratante sobre las reformas o ajustes en que se deba incurrir para garantizar el correcto estado de la red contra incendios o la del sistema de detección de incendios.

10. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos y directrices de gestión ambiental establecidos en el presente Anexo Técnico.

11. Responder por daños que se generen a los bienes y/o inmuebles de las instalaciones de la Entidad, con ocasión y por razón de la ejecución del objeto del contrato. En el evento de presentarse daños a los bienes y/o inmuebles, el contratista debe reparar y/o reponer los bienes, dejando las instalaciones en el mismo estado que se encontraba al inicio de ejecución del contrato.

12. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones especiales del contrato y sus anexos. El cumplimiento de las condiciones técnicas fue verificadas y aprobadas por el ingeniero Guillermo Alberto Suarez Pardo designado por la Subdirección Administrativa y Financiera como apoyo técnico a la Supervisión.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	De conformidad con lo establecido en el contrato No. 250381-2025 y en el cronograma de mantenimientos para el periodo comprendido entre el 21-05 al 21-06-2025, el contratista presto los servicios de: PRESTAR

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
	LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH. Dentro del periodo se realizó lo siguiente: un (1) mantenimiento preventivo según objeto contractual, para lo cual el contratista radico la siguiente factura con sus respectivos soportes: Factura No. 617 radicado 2025ER210686 del 22-08-2025, la documentación digital que se encuentran en los repositorios de la SDH dispuestos para tal fin.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de CERO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 0) por concepto de la ejecución del contrato 250381.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
	TOTAL PAGADO	0

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	30.600.000	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	5.000.000
Valor total de pagos realizados	0	0	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	25.600.000
SUMAS IGUALES	30.600.000	0	30.600.000

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

NINGUNO

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

NINGUNA.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Con base en la certificación de Aportes Parafiscales firmada en Bogotá por el Representante Legal del contratista MULTISERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S. presentada para el trámite de pago junto a las planillas allegadas de pago, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 2260 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Hasta la fecha no hay modificaciones a la matriz de riesgos.

Para constancia se firma a los 25/08/2025.

SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL QUINCHE CHIVATA-PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Miguel Angel Quinche Chivata

Vo. Bo. _____
Guillermo Alberto Suarez Pardo gasuarez@shd.gov.co
Apoyo técnico a la Supervisión

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: maqc

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH.

TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH

Contrato Secop II: CO1.SLCNTR.14859433 de abril de 2025
Número del contrato: 250381

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH.

Elaborado por: Esp. John C. Ospina

Fecha: del 13 al 15 de de junio
Ciclo: Mensual


1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es presentar en forma documental las actividades ejecutadas, durante el mantenimiento preventivo y correctivo desarrollado en los Sistemas de Detección de Incendios de las TORRES A Y B del centro administrativo distrital CAD y de las sedes de la SDH

2. ALCANCE


El alcance del mantenimiento fue realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo según las especificaciones del anexo técnico y en cumplimiento con la normatividad expuesta en la norma NFPA 72 “Código nacional de alarmas de incendio y señalización”, Inspección prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua y la NFPA 25 y NFPA 13 “Sistemas de rociadores automáticos” Así como lo definido por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR10 en sus capítulos J y K. los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de detección y alarmas de incendio, así como al sistema de extinción de incendio por aguas presurizadas, adaptados en la edificación Centro Administrativo Distrital y las sedes a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda, que hacen parte integral del contrato.

3. UBICACIÓN

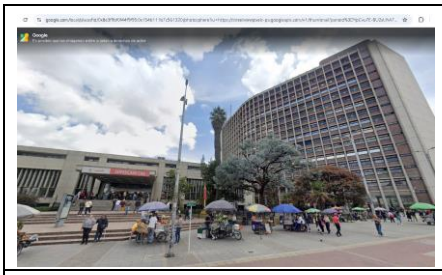



Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90





Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45

4. Personal y EPP

- El personal requerido en la ejecución de las actividades de mantenimiento es el solicitado por la entidad, previa autorización de la supervisión.

- EPP de acuerdo a las diferentes actividades realizadas dentro del objeto contractual y anexo técnico del mismo.

Para la labor del mantenimiento de los diferentes sistemas EPP del personal:

- Guantes de nylon recubiertos de nitrilo
- Casco (donde aplica)
- Monogafas de seguridad (donde aplica)
- Botas con protección de puntas de policarbonato dieléctricas
- Tapón Auditivo Reutilizable
- Pantalón en tela de algodón
- Camisa, Camibuso tipo polo en tela de algodón y Chalecos de identificación

HERRAMIENTA se utilizó:

- Llaves combinadas en diferentes medias calibradas en milímetros y pulgadas.
- Calibre manual de escala dual milímetros y pulgadas.
- Destornilladores punta estándar y Phillips.
- Alicate de electricista
- Alicate de corte diagonal
- Alicate de punta larga
- Pinza voltiamperimétrica
- Escalera plegable
- Manómetros
- Termómetro
- Blower

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

Como elementos consumibles:

- Liquido limpiador electrónico
- Paños de limpieza

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

El servicio de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periódicas contempladas en el manual emitido por el fabricante para mantenimiento y/o las labores expuestas y en la norma NFPA y los servicios básicos señalados en la tabla y/o programa de mantenimiento del Anexo Técnico contractual. Entiéndanse como labores preestablecidas que identifican y mantiene la maquinaria en función al tiempo y uso, basado en análisis “revisión - Inspección", ajuste, limpieza, lubricación, calibración y cambio de elementos por desgaste, preestablecidos o fungibles, según lo programado

5. CRONOGRAMA Y SEDES

CRONOGRAMA MENSUAL				MAY		MAY		JUN		JUN			JUN		
ITEM	SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	6	13	14		20	21	22
2	Rutina preventiva Mensual	5	UN							13	14	15			
ITEM	SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	7	13	14	15	20	21	
2	Rutina preventiva Trimestral	3	UN										20	21	22
3	Rutina preventiva Semestral	2	UN												

CONVENCIONES	
EJECUTADO	
PENDIENTE	
NOVEDAD	
FACTURADO	

SEDES

SEDES UTINAS SEMANALES SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS y SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	**DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO**	**RED CONTRA INCENDIOS "AGUAS PRESURIZADAS”**
Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	X	X
Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45	X	

5.1 EQUIPOS DETECCION INCENDIOS

MARCA	COMPONENTE	SERIE
HOCHIKI	PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE	FireNET®
HOCHIKI	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	ALN-V
HOCHIKI	SENSOR DE CALOR DE TEMPERATURA FIJA E INCREMENTO	ATJ-EA
HOCHIKI	BASE ANÁLOGA CON AISLADOR DE CORTO CIRCUITO	HSB-NSA-6
HOCHIKI	MÓDULO DE CONTACTO DE RESPUESTA RÁPIDA	DCP-FRCMA-I
HOCHIKI	MÓDULO DE DOBLE RELEVADOR	DCP-R2ML-I
HOCHIKI	MÓDULO DE SALIDA SUPERVISADA	DCP-SOM-AI
HOCHIKI	ESTACIÓN DE HALADO MANUAL	HPS-SAH
HOCHIKI	SIRENA CON LUZ ESTROBO	HE SERIES
HOCHIKI	MODULO INTEGRADOR BMS	HE SERIES

5.2 EJECUCIÓN

Realizamos el recorrido general por las instalaciones del SDH, realizando las siguientes actividades para los diferentes sistemas de DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS:

EQUIPOS A VERIFICAR DE ACUERDO A ANEXO TECNICO .

- PANEL CENTRAL (Equipo de Control y señalización)
- MODULO DE INTEGRACIÓN *

5.2.1 ACTIVIDADES A EJECUTAR

1. Inspección y medición de circuitos eléctrico y/o electrónicos
2. Revisar los parámetros de suministro correcto según el circuito eléctrico comercial
3. Revisar los parámetros de suministro correcto, según el circuito eléctrico de Baterías de respaldo
4. Limpieza, aspirado y reapriete de tornillería y terminales de conexión (*) Si aplica

Se realiza visita mensual periodica de acuerdo a anexo tecnico con el fin de revisar, diagnosticar, analizar y evaluar el sitema de Deteccion de incendios con que cuenta la Entidad Secretaria Distrital de Hacienda – Bogota D.C y las posibles fallas que pueda estar presentando.

Dando aplicabilidad a el anexo tecnico y la normatividad vigente como lo son:

NFPA 1: Se utiliza como un estándar de referencia para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios en Colombia..

NFPA 25: Norma de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua.

NFPA 70: Norma para la instalación segura de cableado y equipos eléctricos.

NFPA 72R: Norma que establece los estándares para el diseño, instalación, inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de alarma de incendios

NFPA 75: Norma establece los requisitos mínimos para la protección contra incendios de los equipos de tecnología de la información (TI) y las áreas de equipos de TI

NTC 1931 Establece los requisitos para las señales de seguridad contra incendios

5.2.2 EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINA MENSUAL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

Al momento de iniciar la Rutina de mantenimiento preventivo mensual corespondiente a la vigencia mayo-junio, se verifican las actividades a realizar

se realizaron las siguientes actividades al sistemas de deteccion de incendios de acuerdo a anexo tecnico y normas aplicables en el SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO.



PANEL CENTRAL
(Equipo de Control y señalización)
Y MODULO DE INTEGRACIÓN

5.2.3 NOVEDADES DEL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90

)



EQUIPO: Panel central (Equipo de Control y señalización)
modulo de integración

UBICACIÓN: Piso 2 Central de monitoreo

OBSERVACION: Mantenimiento preventivo Mensual

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realizan actividades correspondientes a el mantenimeinto preventivo semanal, los cuales son necesarios para el optimo funcionamiento del equipo.

RECOMENDACIÓN

Seguir con los mantenimientos periodicos.

Toda vez que las centrales contra incendios son un componente esencial en los sistemas de protección y detección, actuan como el “cerebro” del sistema al monitorear y controlar los dispositivos conectados (detectores de humo, estaciones manuales de alarma, y rociadores automáticos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90

PANEL CENTRAL ARCHIVO

(Equipo de Control y señalización)
















EQUIPO: Panel central
modulo de integración

UBICACIÓN: Archivo Central de monitoreo

OBSERVACION: Mantenimiento preventivo Mensual

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se realizan actividades correspondientes a el mantenimeinto preventivo semanal, los cuales son necesarios para el optimo funcionamiento del equipo

RECOMENDACIÓN

Seguir con los mantenimientos periodicos.

Toda vez que las centrales contra incendios son un componente esencial en los sistemas de protección y detección, actuan como el “cerebro” del sistema al monitorear y controlar los dispositivos conectados (detectores de humo, estaciones manuales de alarma, y rociadores automáticos)

Se realizo las pruebas de funcionamiento los equipos quedan sin alarmamientos y sin fallos

6 SOLICITUDES

- Se solicita se nos proporcione el diagrama de la ubicación logica de los equipos correspondientes al mantenimiento.

  Para facilitar la ubicación de los fallos - bucles que presentan y se presenten a futuro durante el contrato.

- Ampliación en los accesos de la tarjeta, que puedan abrir todos los cuartos técnicos y demás áreas donde se encuentre instalado el sistema o en su defecto autorizar al personal de seguridad par que nos den ingreso y/o acompañamiento donde se requiera.

- Tramitar los ingresos a las áreas restringidas donde se encuentre instalado el sistema de Detección y Extinción de Incendios en las diferentes dependencias del edificio Torre A y Torre B, como ejemplo Concejo y Tesorería primer piso HSD

- Quedamos atentos a las acciones a tomar con relación a los correctivos

Cordialmente,

Esp. JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
T.P. 27985-93133244
C.C. 93.133.244 de Espinal Tolima
Representante Legal
MULTISTT SAS

Elaboro: John Ospina
Reviso: María Valencia

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-003	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA			V1
	REVISION Y PRUEBAS EQUIPOS CONTRAINCENDIOS	DOCUMENTO CONTROLADO		

CIUDAD Y DEPARTAMENTO	FECHA			HORA INGRESO	HORA SALIDA
	Día	Mes	Año		
BOGOTA D.C, Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	15	JUNIO	2025	10:00 a. m.	12:00M

TIPO DE MANTENIMIENTO	MENSUAL	PREDICTIVO ☐	PREVENTIVO ☒	CORRECTIVO ☐

TIPO DE EQUIPO	PANEL CENTRAL Y MODULO DE INTEGRACION		TIPO DE GAS REFRIGERANTE	
MARCA		MODELO		PLACA INVENTARIO	
SERIE		UBICACIÓN	CENTRAL DE MONITOREO ARCHIVO	
RESPONSABLE DEL EQUIPO			IDENTIFICACIÓN	

ELEMENTOS DE INSPECCION	Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **N:** no **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **S:** si	OBSERVACIÓN
GABINETES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Cuenta con Kit contraincendio	NA	
Manguera contraincendios y conexiones:	NA	
Lanza con Boquilla	NA	
Valvula controladora de flujo de agua	NA	
Extintor	NA	
Hacha	NA	
Cascos	NA	
Palas	NA	
Herramientas adicionales	NA	
HIDRANTES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Equipo cuenta con presion de agua	NA	
Equipo presenta fugas	NA	
CARRETES MANGUERAS		
Elemento se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Elemento	NA	
Elemento Cuenta con Manguera	NA	
Estado de la Manquera	NA	
ESTACION DE EMERGENCIA		
Detectores de Humo	B	
Detectores Termicos	B	
Luz sirena	B	
Luz Estroboscopica	B	
Modulos de monitoreos	B	Se realiza mantenimiento preventivo mensual al equipo
Equipo de control y señalizacion	B	OPTIMO
Equipos accesible y señalizado	B	accesible: Se encuentra detrás de un puesto de trabajo, señalizado: NO
Equipo completo	si	
Estado del Equipo	B	OPTIMO
Estado del Equipo	B	OPTIMO
CUARTO DE MAQUINAS		
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal inicio	NA	

Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba rincipal inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba principal final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey final	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías Inicio	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías final	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición de válvulas de paso	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente abierta	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente cerrada	NA	
Revision, verificacion, Inspección delnivel en tanque(s) de reserva agua para el sistema contra incendio	**NA**	
Revision, verificacion, inspeccion Des energizar bomba principal y bomba auxiliar	NA	
Revicion, verificacion, Limpieza de toma agua o filtro	NA	
Revision, verificacion, inspeccion secado de la tuberia	NA	
Revision, verificacion Aplique de pintura	NA	
Revision, verificacion Aplique de anticorrosivo tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tanques	NA	
ROCIADORES		
Inspección Visual General del Equipo	B	
Revision, verificacion limpieza del equipo	B	
Revision, verificacion Estado funcional del Equipo	B	**OPERATIVO**
Revision, verificacion obstrucciones del Equipo	B	
Revision, verificacion y comprobacion de altura del equipo	B	**ADECUADA**

Otros. ¿Cual?

OBSERVACIONES:

Responsable de la Inspeccion:		**Responsable del seguimiento:**
NOMBRE Y APELLIDO:	RONALDO CAMACHO	**NOMBRE Y APELLIDO**
IDENTIFICACIÓN:	9.432.026	**IDENTIFICACIÓN**
CARGO	TECNICO	**CARGO**

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-003	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA			V1
	REVISION Y PRUEBAS EQUIPOS CONTRAINCENDIOS	DOCUMENTO CONTROLADO		

CIUDAD Y DEPARTAMENTO	FECHA			HORA INGRESO	HORA SALIDA
	Día	Mes	Año		
BOGOTA D.C, Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	13	JUNIO	2025	9:00 a. m.	11:00AM

TIPO DE MANTENIMIENTO	MENSUAL	PREDICTIVO ☐	PREVENTIVO ☒	CORRECTIVO ☐

TIPO DE EQUIPO	PANEL CENTRAL Y MODULO DE INTEGRACION		TIPO DE GAS REFRIGERANTE	
MARCA		MODELO		PLACA INVENTARIO	
SERIE		UBICACIÓN	PISO 2 CENTRAL DE MONITOREO EDIFICIO SHD	
RESPONSABLE DEL EQUIPO			IDENTIFICACIÓN	

ELEMENTOS DE INSPECCION	Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **N:** no **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **S:** si	OBSERVACIÓN
GABINETES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Cuenta con Kit contraincendio	NA	
Manguera contraincendios y conexiones:	NA	
Lanza con Boquilla	NA	
Valvula controladora de flujo de agua	NA	
Extintor	NA	
Hacha	NA	
Cascos	NA	
Palas	NA	
Herramientas adicionales	NA	
HIDRANTES		
Equipo se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Equipo	NA	
Equipo cuenta con presion de agua	NA	
Equipo presenta fugas	NA	
CARRETES MANGUERAS		
Elemento se encuentra ascequible y señalizado	NA	
Estado del Elemento	NA	
Elemento Cuenta con Manguera	NA	
Estado de la Manquera	NA	
ESTACION DE EMERGENCIA		
Detectores de Humo	B	
Detectores Termicos	B	
Luz sirena	B	
Luz Estroboscopica	B	
Modulos de monitoreos	B	Se realiza mantenimiento preventivo mensual al equipo
Equipo de control y señalizacion	B	OPTIMO
Equipos accesible y señalizado	B	accesible si, señalizado NO
Equipo completo	si	
Estado del Equipo	B	OPTIMO
Estado del Equipo	B	OPTIMO
CUARTO DE MAQUINAS		
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal inicio	NA	

Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba rincipal inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba principal final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba principal final	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey inicio	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey inicio	NA	
Inspección visual y toma de datos Eléctricos Bomba Jockey final	NA	
Inspección visual y toma de datos manometricos Bomba Jockey final	NA	
nspección visual y toma de datos Tableros de control Bomba Jockey final	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías Inicio	NA	
Revision, verificacion y toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías final	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición de válvulas de paso	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente abierta	NA	
Revision, verificacion, Inspección y confirmación válvulas de paso normalmente cerrada	NA	
Revision, verificacion, Inspección delnivel en tanque(s) de reserva agua para el sistema contra incendio	**NA**	
Revision, verificacion, inspeccion Des energizar bomba principal y bomba auxiliar	NA	
Revicion, verificacion, Limpieza de toma agua o filtro	NA	
Revision, verificacion, inspeccion secado de la tuberia	NA	
Revision, verificacion Aplique de pintura	NA	
Revision, verificacion Aplique de anticorrosivo tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tuberias	NA	
Revision, verificacion, inspeccion limpieza de corroccion tanques	NA	
ROCIADORES		
Inspección Visual General del Equipo	B	
Revision, verificacion limpieza del equipo	B	
Revision, verificacion Estado funcional del Equipo	B	**OPERATIVO**
Revision, verificacion obstrucciones del Equipo	B	
Revision, verificacion y comprobacion de altura del equipo	B	**ADECUADA**

Otros. ¿Cual?

OBSERVACIONES:

Responsable de la Inspeccion:		**Responsable del seguimiento:**
NOMBRE Y APELLIDO:	RONALDO CAMACHO	**NOMBRE Y APELLIDO**
IDENTIFICACIÓN:	9.432.026	**IDENTIFICACIÓN**
CARGO	TECNICO	**CARGO**

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SHD.

TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH

Contrato Secop II: CO1.SLCNTR.14859433 de abril de 2025
Número del contrato: 250381

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH.

Elaborado por: Esp. John C. Ospina

Fecha: del 22 de mayo al 22 de junio
Semanas 3 a la 7 de 2025


1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es presentar en forma documental las actividades ejecutadas, durante el mantenimiento preventivo y correctivo desarrollado en los Sistemas de Extinción de Incendios de las TORRES A Y B del centro administrativo distrital CAD y de las sedes de la SDH

2. ALCANCE


El alcance del mantenimiento fue realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo según las especificaciones del anexo técnico y en cumplimiento con la normatividad expuesta en la norma NFPA 72 “Código nacional de alarmas de incendio y señalización”, Inspección prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua y la NFPA 25 y NFPA 13 “Sistemas de rociadores automáticos” Así como lo definido por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR10 en sus capítulos J y K. los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de detección y alarmas de incendio, así como al sistema de extinción de incendio por aguas presurizadas, adaptados en la edificación Centro Administrativo Distrital y las sedes a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda, que hacen parte integral del contrato.

3. UBICACIÓN

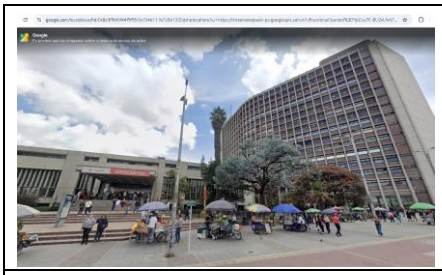



Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90




Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45

4. Personal y EPP

- El personal requerido en la ejecución de las actividades de mantenimiento es el solicitado por la entidad, previa autorización de la supervisión.

- EPP de acuerdo a las diferentes actividades realizadas dentro del objeto contractual y anexo técnico del mismo.

Para la labor del mantenimiento de los diferentes sistemas EPP del personal:

- Guantes de nylon recubiertos de nitrilo
- Casco (donde aplica)
- Monogafas de seguridad (donde aplica)
- Botas con protección de puntas de policarbonato dieléctricas
- Tapón Auditivo Reutilizable
- Pantalón en tela de algodón
- Camisa, Camibuso tipo polo en tela de algodón y Chalecos de identificación

HERRAMIENTA se utilizó:

- Llaves combinadas en diferentes medias calibradas en milímetros y pulgadas.
- Calibre manual de escala dual milímetros y pulgadas.
- Destornilladores punta estándar y Phillips.
- Alicate de electricista
- Alicate de corte diagonal
- Alicate de punta larga
- Pinza voltiamperimétrica
- Escalera plegable
- Manómetros
- Termómetro
- Blower

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

Como elementos consumibles:

- Liquido limpiador electrónico
- Paños de limpieza

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

El servicio de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periódicas contempladas en el manual emitido por el fabricante para mantenimiento y/o las labores expuestas y en la norma NFPA y los servicios básicos señalados en la tabla y/o programa de mantenimiento del Anexo Técnico contractual. Entiéndanse como labores preestablecidas que identifican y mantiene la maquinaria en función al tiempo y uso, basado en análisis “revisión - Inspección", ajuste, limpieza, lubricación, calibración y cambio de elementos por desgaste, preestablecidos o fungibles, según lo programado

5. CRONOGRAMA Y SEDES

CRONOGRAMA MENSUAL				MAY		MAY		JUN		JUN			JUN		
ITEM	SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	6	13	14		20	21	22
2	Rutina preventiva Mensual	5	UN							13	14	15			
ITEM	SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	7	13	14	15	20	21	
2	Rutina preventiva Trimestral	3	UN										20	21	22
3	Rutina preventiva Semestral	2	UN												

CONVENCIONES	
EJECUTADO	
PENDIENTE	
NOVEDAD	
FACTURADO	

SEDES

SEDES UTINAS SEMANALES SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS y SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	**DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO**	**RED CONTRA INCENDIOS "AGUAS PRESURIZADAS”**
Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	X	X
Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45	X	

5.1 EQUIPOS EXTINCION INCENDIOS

CONJUNTO	EQUIPOS QUE LO COMPONEN
	Bomba Principal

CUARTO DE MAQUINAS	Bomba Jockey
	Ramales principales de tuberías
	válvulas de paso
	Tanque
PUESTOS O TERMINAL DE CONTROL (22)	válvulas de paso
	Rociadores
	Gabinetes
	Drenaje
	Test
SIAMESAS (03)	Siamesas
GABINETES (72)	Gabinetes
ROCIADORES (3466)	Rociadores
TABLEROS DE CONTROL	Tableros de Control

5.2 EJECUCIÓN

Realizamos el recorrido general por las instalaciones del SDH, realizando las siguientes actividades para los diferentes sistemas de SISTEMA EXTINCION DE INCENDIO.

5.2.1 ACTIVIDADES A EJECUTAR

CUARTO DE MAQUINAS

1. Inspección visual y toma de datos Eléctricos y Manométricos de Bomba Principal (Datos en tablero de control) INICIAL - TRABAJO - FINAL
2. Inspección visual y toma de datos Eléctricos y Manométricos de Bomba Jockey (Datos en tablero de control) INICIAL - TRABAJO - FINAL
3. Toma de datos Manométricos en Ramales principales de tuberías INICIAL - TRABAJO - FINAL
4. Inspección y confirmación de la adecuada posición de válvulas de paso (Válvulas con normalidad cerradas y Válvulas normalmente abiertas)
5. Inspección del adecuado nivel en tanque(s) de reserva agua para el sistema contra incendios

PUESTOS O TERMINAL DE CONTROL (22)

1) Inspección visual y toma de datos Manométricos

2) Inspección y confirmación de la adecuada posición de válvulas de paso (Válvulas
normalmente cerradas y Válvulas normalmente abiertas) Rociadores, Gabinetes, Drenaje, Test

SIAMESAS

1) Inspección visual de estado, componentes y hermetismo

Se realiza visita semanal periodica de acuerdo a anexo tecnico con el fin de revisar, diagnosticar, analizar y evaluar el sitema de Deteccion de incendios con que cuenta la Entidad Secretaria Distrital de Hacienda – Bogota D.C y las posibles fallas que pueda estar presentando.

Dando aplicabilidad a el anexo tecnico y la normatividad vigente como lo son:



NFPA 1: Se utiliza como un estándar de referencia para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios en Colombia..
NFPA 25: Norma de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua.
NFPA 70: Norma para la instalación segura de cableado y equipos eléctricos.
NFPA 72R: Norma que establece los estándares para el diseño, instalación, inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de alarma de incendios
NFPA 75: Norma establece los requisitos mínimos para la protección contra incendios de los equipos de tecnología de la información (TI) y las áreas de equipos de TI
NTC 1931 Establece los requisitos para las señales de seguridad contra incendios


5.2.2 EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINA MENSUAL SISTEMA EXTICIÓN Y ALARMA DE INCENDIO



Al momento de iniciar la Rutina de mantenimiento preventivo semanal corespondiente a la vigencia mayo -junio, se verifican las actividades a realizar


se realizaron las siguientes actividades al sistemas de deteccion de incendios de acuerdo a anexo tecnico y normas aplicables en el SISTEMA EXTINCION DE INCENDIO

5.2.3 NOVEDADES DEL SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIO.

PISO	REGISTRO FOTOGRÁFICO Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	HALLAZGO	MEJORA
SOTANO HACIENDA	 	**EQUIPO:** soportes antisísmicos sin pintura **UBICACIÓN** zona de sótano-bodegas bajo edificio de hacienda. **OBSERVACIÓN** Continua con la misma observación de la semana 1, 2 soportes antisísmicos	**RECOMENDACION** Realizar mantenimiento al tubo soporte antisismico de acero 1” **INCLUIR:** • pintura anticorrosiva en color gris a tres manos • Pintura esmalte roja bermellón una man, en cumplimiento de la norma
SOTANO		**EQUIPO:** Estación manual control **UBICACIÓN:** sotano 1. **OBSERVACION** presenta falla	
P2 catastro supercade	  	**EQUIPO:** Rociador **UBICACIÓN:** Oficina de Subgerencia Ingenieria de Software **OBSERVACION:** obstrucción por capuchón protector **ACTIVIDAD DEJECUTADA** Retiro de capuchones	**RECOMENDACIÓN** Después de una actividad que requiera la instalación de los capuchones, retirar los capuchones, toda vez que en caso de urgencia, no es posible la activación de la misma sin antes retirar las obstrucciones. Lo que genera retrasos en la reacción y el plan de acción ante emergencia

P2 supercade DATACENTER	 	**EQUIPO:** Rociador **UBICACIÓN:** Supercade Datacenter **OBSERVACION:** Se encuentra dentro del cielo razo por tanto no cumple con la norma y no presenta funcionabilidad en caso de emergencia	**RECOMENDACIÓN** Realizar la reinstalacion del Rociador. En cumplimiento de la NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores
P01		*SEMANA 3 *SEMANA 4 *SEMANA 5 *SEMANA 6 *SEMANA 7 **UBICACIÓN:** Tesoreria **OBSERVACION** No fue posible el ingreso	**SOLICITUD** Se realicen los tramites de correos internos necesarios para que se peda ingresar a esta área.
P2 CONCEJO		**EQUIPO:** Rociador **UBICACIÓN:** Concejo piso 2 **OBSERVACION:** Se encuentra dentro del cielo razo por tanto no cumple con la norma y no presenta funcionabilidad en caso de emergencia	**RECOMENDACIÓN** Realizar la reinstalacion del Rociador. En cumplimiento de la NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores
P4		**EQUIPO:** GABINETE **UBICACIÓN:** Costado ingreso parqueadero semisotano **OBSERVACION:** se encuentra con ausencia de Martillo de emergencia	**RECOMENDACIÓN** Adquirrir el Martillo de emergencia en cumplimiento de la norma **NTC 1931** donde se manifiesta que "*se utiliza para romper el vidrio en caso de emergencia y acceder a los equipos*"

P10	   	**EQUIPO:** Sensores de humo **UBICACIÓN:** *****Modulo Direccion de Gestión Documental *Modulo 33 **OBSERVACION:** No evidencian sensado **ACTIVIDAD EJECUTADA** Se realiza revision, limpieza y pruebas de funcionamiento evidenciado que los 3 sensores no presentan sensado (fuera de funcionamiento)	**RECOMENDACIÓN** Realizar el cambio de los sensoresres de humo e instalar los nuevos
P11		*SEMANA 3 *SEMANA 4 **UBICACIÓN:** CUARTOS TECNICOS **OBSERVACION** no fue posible el ingreso al área de cuartos tecnicos	**SOLICITUD** Se realicen los tramites de internos necesarios para activacion de tarjertas de ingreso. A Baños privados y cuartos tecnicos
P12	  	**EQUIPO:** Rociador **UBICACIÓN:** *****Rociador baño hombre costado oriental**.** ***** Rociador cuarto de aseo **OBSERVACION:** *<u>Rociador baño hombre costado oriental.</u> se encuetnra ubicado dentro del cielo razo por tanto no cumple con la Norma *<u>Rociador cuarto de aseo</u> presenta Obstrucion y posible daño, ya que esta torcido	**RECOMENDACIÓN** Realizar la reinstalacion del Rociador. En cumplimiento de la NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores


P13		**EQUIPO:** Gabinete **UBICACIÓN:** Costado occidental piso 12 **OBSERVACION:** Instructivo de uso para gabinete contra incendioy falta una aviso funcion tecnica estaciones de control (valvulas)	**RECOMENDACIÓN** Se recomienda realizar suministro e instalación de señalización de Función del Gabinete Ejemplo:  
P13	 	**EQUIPO:** Rociador **UBICACIÓN:** Cafeteria **OBSERVACION:** Escudo del rociador presenta deterioro (corrosión**),** por tanto no cumple con la norma y no presenta funcionabilidad en caso de emergencia	**RECOMENDACIÓN** Realizar la reinstalacion del Rociador. En cumplimiento de la NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores
P14		*SEMANA 3 *SEMANA 4 **UBICACIÓN:** CUARTOS TECNICOS **OBSERVACION** no fue posible el ingreso al área de cuartos tecnicos	**SOLICITUD** Se realicen los tramites de internos necesarios para activacion de tarjertas de ingreso. A Baños privados y cuartos tecnicos

PISO	SEMANA	DEPENDENCIA SIN ACCESO Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90
16	6 Y 7	CONCEJO
14	3	CUARTOS TECNICOS
2	4, 5, 6 Y 7	CONCEJO
1	3, 4, 5, 6 Y 7	TESORERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO
CUARTO DE MAQUINA, PUESTOS O TERMINAL DE
CONTROL Y SIAMESAS





PISO	REGISTRO FOTOGRÁFICO ARCHIVO	HALLAZGO	MEJORA

ARCHIVO PANEL CENTRAL	     	**EQUIPO:** Panel central equipo de control y señalización, modulo de integración **UBICACIÓN:** Archivo Central de monitoreo **OBSERVACION:** Mantenimiento preventivo **ACTIVIDAD EJECUTADA** Se realizan actividades correspondientes a el mantenimeinto preventivo semanal, los cuales son necesarios para el optimo funcionamiento del equipo	. **RECOMENDACIÓN** Seguir con los mantenimientos periodicos. Toda vez que las centrales contra incendios son un componente esencial en los sistemas de protección y detección, actuan como el “cerebro” del sistema al monitorear y controlar los dispositivos conectados (detectores de humo, estaciones manuales de alarma, y rociadores automáticos)
ARCHIVO PANEL CENTRAL	 	**EQUIPO:** Tablero Cuarto de monitoreo **UBICACIÓN**: Archivo Central **OBSERVACION: RESPUESTA A ALARMA DE INCENDIOS** presenta falla en bucle 1 dic 32. **ACTIVIDAD EJECUTADA** Se realiza verificacion del sector donde se presenta el Bucle, se realiza se toma de voltaje y pruebas de funcionamiento en el sector del bucle y tablero. Se reinicia el sistema para reestablecerlo .	
MODULO 8		**EQUIPO:** Detector de Humo **UBICACIÓN:** **OBSERVACION:** obstrucción por capuchón protector **ACTIVIDAD DEJECUTADA** Retiro de capuchones	**RECOMENDACIÓN** Después de una actividad que requiera la instalación de los capuchones, retirar los capuchones, toda vez que en caso de urgencia, no es posible la activación de la misma sin antes retirar las obstrucciones. Lo que genera retrasos en la reacción y el plan de acción ante emergencia

DEPENDENCIA SIN ACCESO Archivo Hacienda	
MODULO	**SEMANA**
15ª	3,4,5,6 Y 7
15B	3,4,5,6 Y 7

TENER EN CUENTA : Los pisos que no se encuentran incluidos no presentan novedad alguna.

5.2.4 CORRECTIVOS

ITEM	EQUIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
4		MARTILLO DE FRAGMENTACION PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS	10
5		AVISO FUNCION TECNICA ESTACIONES DE CONTROL LETREROS RISER CAD 10 CM X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL, MATERIAL ARILICO FOSFORECENNTE	6
6		INSTRUCTIVO DE USO PARA GABINETE CONTRA INCENDIO	20

9	 	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA ½" X 100 FT UL/FM	40
10	 	TANQUE DE AGUA	**ENTIDAD** revisar última fecha de lavado de tanque, ya que una sedimentación alta puede obstruir la válvula cheque de tipo pie introducida en el tanque, la cual es la encargada de dar el paso para el suministro de agua en caso de una emergencia

6 SOLICITUDES

- Se solicita aampliación en los accesos de la tarjeta, que puedan abrir todos los cuartos técnicos y demás áreas donde se encuentre instalado el sistema o en su defecto autorizar al personal de seguridad par que nos den ingreso y/o acompañamiento donde se requiera.

- Tramitar los ingresos a las áreas restringidas donde se encuentre instalado el sistema de Detección y Extinción de Incendios en las diferentes dependencias del edificio Torre A y Torre B, como ejemplo Concejo y Tesorería primer piso HSD

- Quedamos atentos a las acciones a tomar con relación a los correctivos

Cordialmente,

Esp. JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
T.P. 27985-93133244
C.C. 93.133.244 de Espinal Tolima
Representante Legal
MULTISTT SAS

Elaboro: John Ospina
Reviso: María Valencia

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 8**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 23 DE MAYO DE 2025 | HECTOR LUIS GONZALEZ | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 9**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
	AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 10**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 23 DE MAYO DE 2025 | HECTOR LUIS GONZALEZ | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 11**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	no fue posible el ingreso al área de cuartos tecnicos
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
	AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025			HECTOR LUIS GONZALEZ								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones: B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	**RUTINA SEMANAL**	
1	**PISO 13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
2	**PISO 13**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
3	**PISO 13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

			TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
			AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
			INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:		23 DE MAYO DE 2025			HECTOR LUIS GONZALEZ								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**						
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**						
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	**RUTINA SEMANAL**						
1	**PISO 14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO						
2	**PISO 14**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO						
3	**PISO 14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO						

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	no fue posible el ingreso al área de cuartos tecnicos
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025			HECTOR LUIS GONZALEZ								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**	
1	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
2	**PISO 1**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
3	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 23 DE MAYO DE 2025 | HECTOR LUIS GONZALEZ | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 2**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	24 DE MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	PISO 2 HACIENDA	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025			HECTOR LUIS GONZALEZ								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**						
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones: B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**						
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**						
1	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO						
2	**PISO 3**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO						
3	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO						

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 23 DE MAYO DE 2025 | HECTOR LUIS GONZALEZ | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 4**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

			TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
			AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
			INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:		23 de mayo de 2025			HECTOR LUIS GONZALEZ								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**	
1	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
2	**PISO 5**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
3	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
	AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025			HECTOR LUIS GONZALEZ								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**				
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones: B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**				
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**				
1	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO				
2	**PISO 6**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO				
3	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO				

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 23 DE MAYO DE 2025 | HECTOR LUIS GONZALEZ | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 7**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 23 DE MAYO DE 2025 | HECTOR LUIS GONZALEZ | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 12**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

			TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
			AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
			INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN: 23 mayo de 2025 | HECTOR LUIS GONZALEZ | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 15**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	23 MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO16**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

			TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
			AREA OPERATIVA		VERSION	V2
			INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	24 DE MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO CADE CATASTRO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	24 DE MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO PLANEACION CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	24 DE MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	CADE																			VACIO UBICADO EN EL PASILLO DE INGRESO PARA PLANOTECA
3	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	#64	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
4	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
5	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
6	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	24 DE MAYO DE 2025			HECTOR LUIS GONZALEZ								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	**RUTINA SEMANAL**	
1	**SEMISOTANO PARQUEADEROS**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	**NO CUENTA CON MARTILLO DE FRAGMENTACION EN GABINETE UBICADO AL COSTADO DE LA PORTERÍA DE INGRESO AL SÓTANO.**
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

			TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
			AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
			INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:	24 DE MAYO DE 2025	HECTOR LUIS GONZALEZ	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**SOTANO**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO15**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

| | | | | | |

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	31 DE MAYO 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SOTANO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	SOPORTE ANTISISMICOS SIN PINTURA -ZONA BODEGAS

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 1**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	31 DE MAYO 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	45505	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	PISO 2 HACIENDA	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 2**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 3**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 4**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 5**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 6**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 7**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 8**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 9**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 10**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO11**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	no fue posible el ingreso al área de cuartos tecnicos
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO12**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	30 DE MAYO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO13**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO14**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	no fue posible el ingreso al área de cuartos tecnicos
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 30 de mayo de 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO16**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	31 DE MAYO 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO CADE CATASTRO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA			VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS			DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	31 DE MAYO 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO PLANEACION CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	31 DE MAYO 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	CADE																			VACIO UBICADO EN EL PASILLO DE INGRESO PARA PLANOTECA
3	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	#64	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
4	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
5	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
6	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 1**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	**no fue posible posible el ingreso a el area de Tesoreria**
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 2**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN** 1/03/2021
	AREA OPERATIVA		**VERSION** V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**

FECHA DE INSPECCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 3**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 4**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	**se encuentra con ausencia de Martillo de emergencia UBICACIÓN: al Costado de ingreso**
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 5**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 6**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 7**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 8**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:		06 DE JUNIO DE 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	**RUTINA SEMANAL**	
1	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
2	**PISO 9**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
3	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 10**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO11**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO12**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO13**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO14**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**														**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	**RUTINA SEMANAL**
1	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO15**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACION**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO16**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	CADE																			VACIO UBICADO EN EL PASILLO DE INGRESO PARA PLANOTECA
3	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	#64	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
4	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
5	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
6	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO CADE CATASTRO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	45505	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	PISO 2 HACIENDA	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**	
1	**SEGUNDO PISO PLANEACION CADE**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEMISOTANO PARQUEADEROS	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	NO CUENTA CON MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN EN GABINETE UBICADO AL COSTADO DE LA PORTERÍA DE INGRESO AL SÓTANO.
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	06 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SOTANO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	Estación manual control SOTANO 1 presenta falla
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	SOPORTE ANTISISMICOS SIN PINTURA -ZONA BODEGAS, HACIENDA

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	14 de junio 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 1**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	**no fue posible posible el ingreso a el area de Tesoreria**
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	14 de junio 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	PISO 2	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	PISO 2	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	PISO 2	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	14 de junio 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 3**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	14 de junio 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 4**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	**se encuentra con ausencia de Martillo de emergencia UBICACIÓN: al Costado de ingreso**
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:		14 de junio			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**	
1	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
2	**PISO 5**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	
3	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	14 de junio	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO

Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 6**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	14 de junio	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 7**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	14 de junio	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 9**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 13 junio de 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 10**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 13 junio de 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO11**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 13 junio de 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO12**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	13 junio de 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**														**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	**RUTINA SEMANAL**
1	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO13**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACION**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	13 junio de 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**														**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	**RUTINA SEMANAL**
1	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO14**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACION**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 13 junio de 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO15**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 13 junio de 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO16**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	15 junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	CADE																			VACIO UBICADO EN EL PASILLO DE INGRESO PARA PLANOTECA
3	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	#64	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
4	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
5	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
6	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:		15 junio de 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**	
1	**SEGUNDO PISO CADE CATASTRO**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	15 junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	45505	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	PISO 2 HACIENDA	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 15 junio de 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO PLANEACION CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	15 junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEMISOTANO PARQUEADEROS	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	NO CUENTA CON MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN EN GABINETE UBICADO AL COSTADO DE LA PORTERÍA DE INGRESO AL SÓTANO.
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:		15 junio de 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones:** **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**		
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**		
1	**SOTANO**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO		

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	**Estación manual control SOTANO 1 presenta falla**
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	**SOPORTE ANTISISMICOS SIN PINTURA -ZONA BODEGAS, HACIENDA**

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 14 de junio | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 8**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 1**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	**no fue posible posible el ingreso a el area de Tesoreria**
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 2**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN 1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 3**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 4**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	**se encuentra con ausencia de Martillo de emergencia UBICACIÓN: al Costado de ingreso**
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 5**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO

Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 6**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 7**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 8**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**			

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 9**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 10**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO11**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO12**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO13**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO14**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO15**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO16**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA			VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS			DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO CADE CATASTRO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	45505	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	PISO 2 HACIENDA	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de junio de 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO PLANEACION CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 21 de junio de 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	CADE																			VACIO UBICADO EN EL PASILLO DE INGRESO PARA PLANOTECA
3	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	#64	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
4	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
5	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
6	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
	AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:		21 de junio de 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones: B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**	
1	**SEMISOTANO PARQUEADEROS**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	**NO CUENTA CON MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN EN GABINETE UBICADO AL COSTADO DE LA PORTERÍA DE INGRESO AL SÓTANO.**
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SOTANO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	Estación manual control SOTANO 1 presenta falla
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	SOPORTE ANTISISMICOS SIN PINTURA -ZONA BODEGAS, HACIENDA

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SHD.

TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH

Contrato Secop II: CO1.SLCNTR.14859433 de abril de 2025
Número del contrato: 250381

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LAS TORRES A Y B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD Y DE LAS SEDES DE LA SDH.

Elaborado por: Esp. John C. Ospina

Fecha: 20, 21 y 22 de junio de 2025
Ciclo Trimestral de junio 2025


1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es presentar en forma documental las actividades ejecutadas, durante el mantenimiento preventivo y correctivo desarrollado en los Sistemas de Extinción de Incendios de las TORRES A Y B del centro administrativo distrital CAD y de las sedes de la SDH

2. ALCANCE


El alcance del mantenimiento fue realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo según las especificaciones del anexo técnico y en cumplimiento con la normatividad expuesta en la norma NFPA 72 “Código nacional de alarmas de incendio y señalización”, Inspección prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua y la NFPA 25 y NFPA 13 “Sistemas de rociadores automáticos” Así como lo definido por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR10 en sus capítulos J y K. los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de detección y alarmas de incendio, así como al sistema de extinción de incendio por aguas presurizadas, adaptados en la edificación Centro Administrativo Distrital y las sedes a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda, que hacen parte integral del contrato.

3. UBICACIÓN

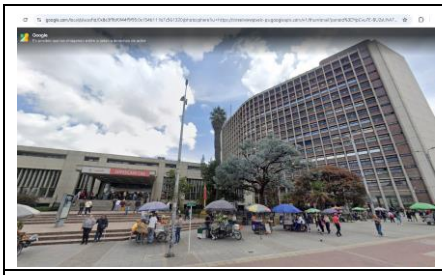



Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90




Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45

4. Personal y EPP

- El personal requerido en la ejecución de las actividades de mantenimiento es el solicitado por la entidad, previa autorización de la supervisión.

- EPP de acuerdo a las diferentes actividades realizadas dentro del objeto contractual y anexo técnico del mismo.

Para la labor del mantenimiento de los diferentes sistemas EPP del personal:

- Guantes de nylon recubiertos de nitrilo
- Casco (donde aplica)
- Monogafas de seguridad (donde aplica)
- Botas con protección de puntas de policarbonato dieléctricas
- Tapón Auditivo Reutilizable
- Pantalón en tela de algodón
- Camisa, Camibuso tipo polo en tela de algodón y Chalecos de identificación

HERRAMIENTA se utilizó:

- Llaves combinadas en diferentes medias calibradas en milímetros y pulgadas.
- Calibre manual de escala dual milímetros y pulgadas.
- Destornilladores punta estándar y Phillips.
- Alicate de electricista
- Alicate de corte diagonal
- Alicate de punta larga
- Pinza voltiamperimétrica
- Escalera plegable
- Manómetros
- Termómetro
- Blower

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

Como elementos consumibles:

- Liquido limpiador electrónico
- Paños de limpieza

Y demás necesarios de acuerdo al requerimiento en el mantenimiento preventivo o correctivo

El servicio de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periódicas contempladas en el manual emitido por el fabricante para mantenimiento y/o las labores expuestas y en la norma NFPA y los servicios básicos señalados en la tabla y/o programa de mantenimiento del Anexo Técnico contractual. Entiéndanse como labores preestablecidas que identifican y mantiene la maquinaria en función al tiempo y uso, basado en análisis “revisión - Inspección", ajuste, limpieza, lubricación, calibración y cambio de elementos por desgaste, preestablecidos o fungibles, según lo programado

5. CRONOGRAMA Y SEDES

CRONOGRAMA MENSUAL				MAY		MAY		JUN		JUN			JUN		
ITEM	SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	6	13	14		20	21	22
2	Rutina preventiva Mensual	5	UN							13	14	15			
ITEM	SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	Cantidad Rutinas (A)	UN	SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6			SEM 7		
1	Rutina preventiva Semanal	20	UN	23	24	30	31	6	7	13	14	15	20	21	
2	Rutina preventiva Trimestral	3	UN										20	21	22
3	Rutina preventiva Semestral	2	UN												

CONVENCIONES	
EJECUTADO	
PENDIENTE	
NOVEDAD	
FACTURADO	

SEDES

SEDES UTINAS SEMANALES SISTEMA DETECCION DE ALARMAS E INCENDIOS y SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS	**DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO**	**RED CONTRA INCENDIOS "AGUAS PRESURIZADAS”**
Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	X	X
Archivo General SDH Carrera 32 # 12-45	X	

5.1 EQUIPOS EXTINCION INCENDIOS

CONJUNTO	EQUIPOS QUE LO COMPONEN
CUARTO DE MAQUINAS	Bomba Principal
	Bomba Jockey
	Ramales principales de tuberías
	válvulas de paso
	Tanque
PUESTOS O TERMINAL DE CONTROL (22)	válvulas de paso
	Rociadores
	Gabinetes
	Drenaje
	Test
SIAMESAS (03)	Siamesas
GABINETES (72)	Gabinetes
ROCIADORES (3466)	Rociadores
TABLEROS DE CONTROL	Tableros de Control

5.2 EJECUCIÓN

Realizamos el recorrido general por las instalaciones del SDH, realizando las siguientes actividades para los diferentes sistemas de SISTEMA EXTINCION DE INCENDIO.

5.2.1 ACTIVIDADES A EJECUTAR

CUARTO DE MAQUINAS

1. Limpieza y engrase general de rodamiento de alivio en motor bomba principal.
2. Inyección de grasa en cabeza de toma fuerza bomba principal.
3. Limpieza y ajuste de bornera eléctrica de motor bomba principal

GABINETES

1. Inspección Visual de Gabinete y sus componentes: Manguera, Llave Espaner, Hacha, Extintor
2. Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"

3. Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½" 4) Revisar empaques de Rosca y Cabeza manguera
4. Aseo de Gabinete
5. Área de gabinete libre de obstáculos
6. Estabilidad, ajuste del Gabinete y las tuberías que llegan al mismo

ROCIADORES

1. Recorrido general visualizando el estado de los rociadores: - Libres de obstáculos que impidan el correcto funcionamiento - Comprobación de la altura ideal de trabajo

Se realiza visita periodica trimestral de acuerdo a anexo tecnico con el fin de revisar, diagnosticar, analizar y evaluar el sitema de Deteccion de incendios con que cuenta la Entidad Secretaria Distrital de Hacienda – Bogota D.C y las posibles fallas que pueda estar presentando.


Dando aplicabilidad a el anexo tecnico y la normatividad vigente como lo son:

NFPA 1: Se utiliza como un estándar de referencia para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios en Colombia..
NFPA 25: Norma de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua.
NFPA 70: Norma para la instalación segura de cableado y equipos eléctricos.
NFPA 72R: Norma que establece los estándares para el diseño, instalación, inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de alarma de incendios
NFPA 75: Norma establece los requisitos mínimos para la protección contra incendios de los equipos de tecnología de la información (TI) y las áreas de equipos de TI
NTC 1931 Establece los requisitos para las señales de seguridad contra incendios

5.2.2 EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINA TRIMESTRAL SISTEMA EXTICIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

Al momento de iniciar la Rutina de mantenimiento preventivo trimestral corespondiente a la vigencia mayo -junio, se verifican las actividades a realizar al sistema de deteccion de incendios de acuerdo a anexo tecnico y normas aplicables en el SISTEMA EXTINCION DE INCENDIO

Los acuales presentan los siguientes datos:

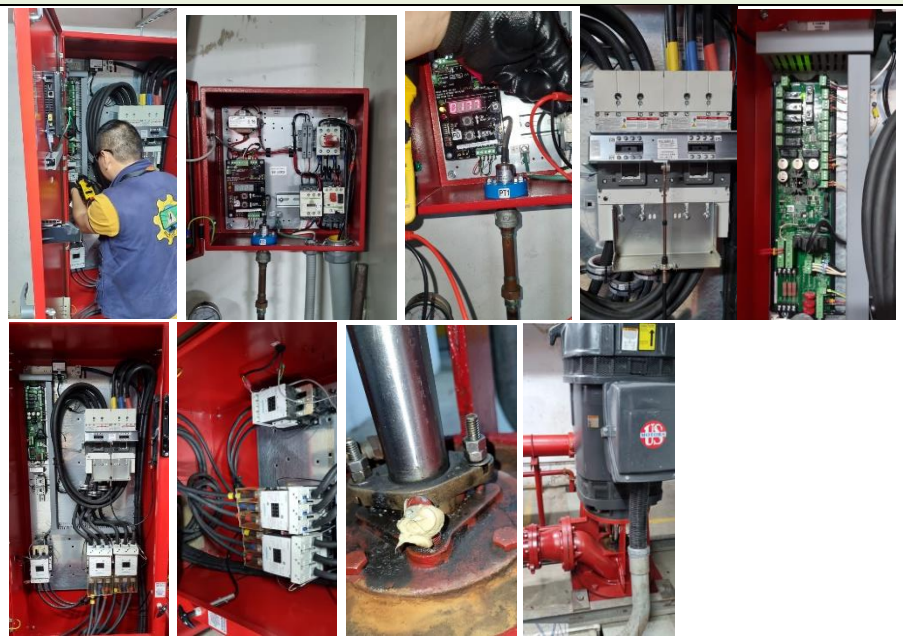DEPENDENCIA SIN ACCESO Edificio Centro Administrativo Distrital Torre "A" y Torre "B" Carrera 30 # 25-90	
CUARTO DE MAQUINAS	
Se realiza mantenimiento preventivo trimestral a equipos requidos de acuerdo a Anexo tecnico bajo las especificaciones descritas anteriormente. Donde se evidencia la funcionalidad y operatividad de los equipos .	
GABINETES	


SJ 1 1/2"×100FT SERVICE TEST PRESSURE
ZYfire SJ 1-1/2" × 30m
Service test to 250PSIG 09/2013



Se realiza mantenimiento preventivo trimestral a equipos requidos de acuerdo a Anexo tecnico bajo las especificaciones descritas anteriormente.





Donde se evidencia la funcionalidad y operatividad de los equipos .


Algunos equipos presentan las siguientes novedades:


- Los gabinetes ubicados en la zona Sotano 2 parqueadero : la manguera NO presenta sello de Ul/FM
- 10 Gabinetes Contraincendios No cuentan con martillo de fragmentacion
- 06 Estaciones de control No cuentan con avisos de funcion tecnica
- 20 Gabinetes Contraincendio No cuentan con instructivo de uso
- 40 gabinetes requieren manguera chaqueta sencilla ½" x 100 FT UL/FM

ROCIADORES



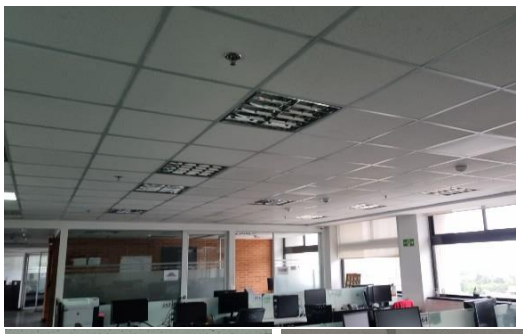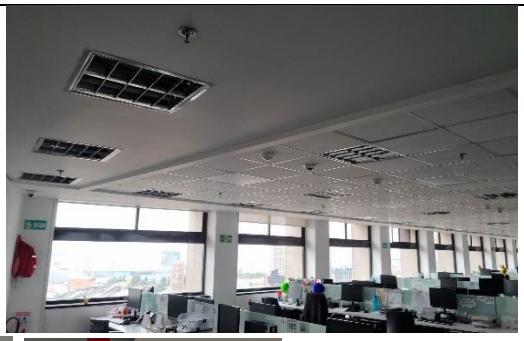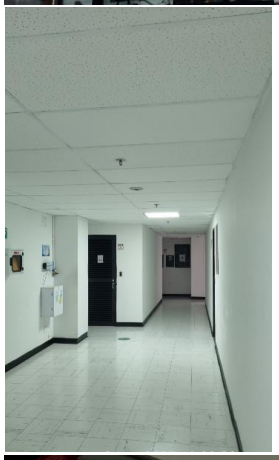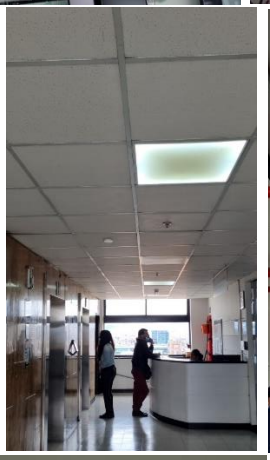


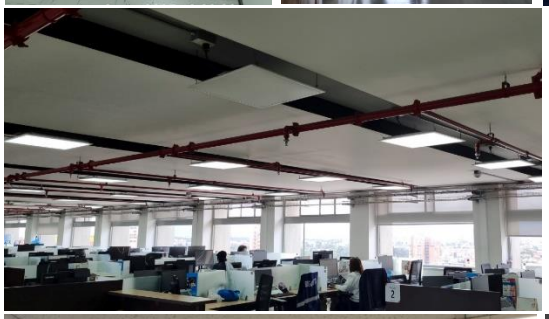

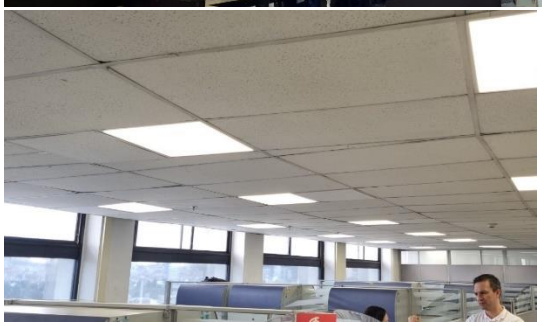
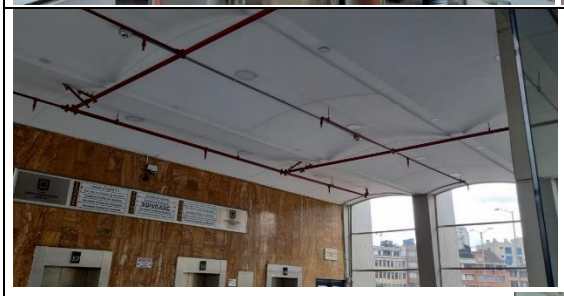










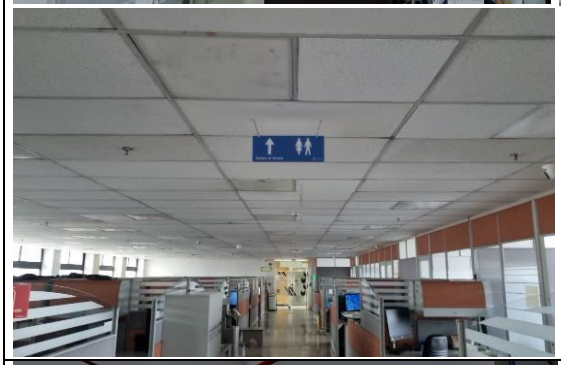










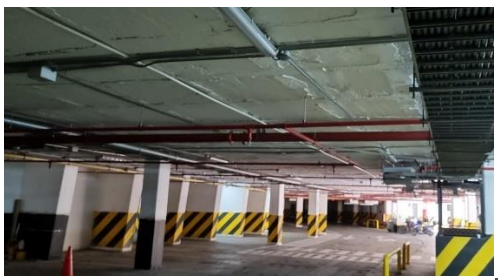

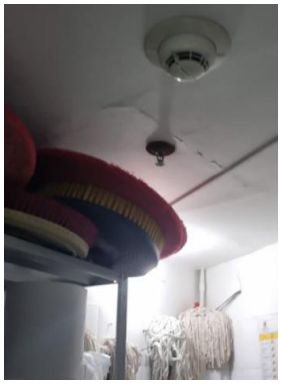

Se hace seguimiento inspeccion visual, verificación de alturas de los distintos rociadores, estado actual en su , mayoria en perfecto estado.

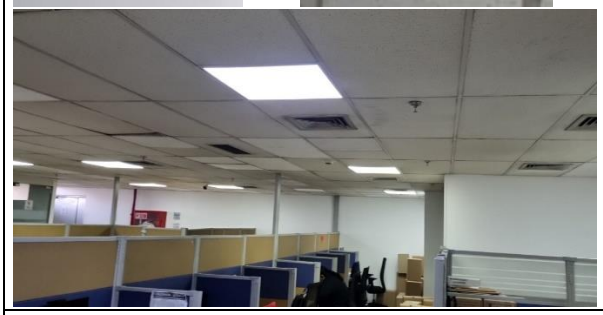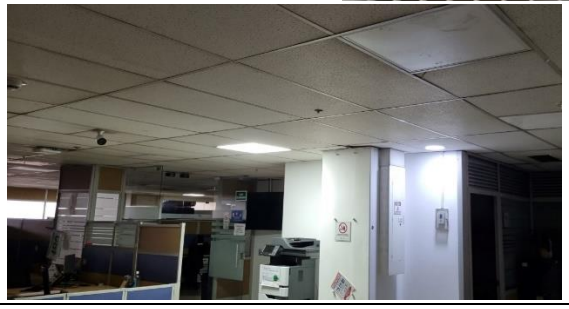Se debe nivelar el cielo raso en algunos sectores toda vez que los rociadores de esta área, se encuentran al mínimo permitido entre cielo raso y boquilla de rociador.

Como lo son en :

- Supercade Hacienda
- Piso 13 zona Cafeteria: Escudo del roceador presenta deterioro
- Piso 12 Rociador baño hombre costado oriental: Esta ubicado dentro del cielo razo
- Piso 12 Rociador cuarto de aseo : presenta Obstrucion y posible daño, ya que esta torcido
- Piso 02 Rociador Concejo : Esta ubicado dentro del cielo razo
- Supercade Piso 2 Rociador Datacenter : Esta ubicado dentro del cielo razo
- Supercade Piso 2 Rociador Catastro ubicado den la oficina de Subgerencia Ingenieria de Software: presenrta obstruccion constante

5 SOLICITUDES

- Se solicita aampliación en los accesos de la tarjeta, que puedan abrir todos los cuartos técnicos y demás áreas donde se encuentre instalado el sistema o en su defecto autorizar al personal de seguridad par que nos den ingreso y/o acompañamiento donde se requiera.

- Tramitar los ingresos a las áreas restringidas donde se encuentre instalado el sistema de Detección y Extinción de Incendios en las diferentes dependencias del edificio Torre A y Torre B, como ejemplo Concejo y Tesorería primer piso HSD

- Quedamos atentos a las acciones a tomar con relación a los correctivos

Cordialmente,

Esp. JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
T.P. 27985-93133244
C.C. 93.133.244 de Espinal Tolima
Representante Legal
MULTISTT SAS

Elaboro: John Ospina
Reviso: María Valencia

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 1**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 1**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	**no fue posible posible el ingreso a el area de Tesoreria**
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 2**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 2**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN 1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 3**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 3**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 4**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 4**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	**se encuentra con ausencia de Martillo de emergencia UBICACIÓN: al Costado de ingreso**
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 5**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 5**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO

Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 6**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 6**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 7**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 7**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**		

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 8**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 8**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**			

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 9**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 9**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 20 DE JUNIO DE 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO 10**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO 10**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO11**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO11**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO12**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO12**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO13**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO13**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO14**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO14**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE															OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO15**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO15**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2025	RONALDO CAMACHO	**CARGO:** TECNICO	**Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	**PISO16**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
3	**PISO16**	CO2	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACION
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	APROBÓ
0	1/03/2021	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1	10/08/2023	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2	25/04/2025	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA			VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS			DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NT: No Tiene NA: No Aplica — CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SEGUNDO PISO CADE CATASTRO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: S:si N:no NA: No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	45505	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	PISO 2 HACIENDA	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001**	**FECHA DE EMISIÓN**	**1/03/2021**
	AREA OPERATIVA		**VERSION**	**V2**
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		**DOCUMENTO CONTROLADO**	

FECHA DE INSPECCIÓN:		21 de junio de 2025			RONALDO CAMACHO								**CARGO:** TECNICO							**Vo.Bo COORDINADOR SST:**	
No. DE GABINETE	**UBICACIÓN**	**AGENTE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**FECHA RECARGA**	**Convenciones: B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica **CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE**															**OBSERVACIONES**	
					GABINETE	**SOPORTE PARA MANGUERA**	**MANGUERA**	**LLAVE SPANNER**	**HACHA**	**BOQUILLA CHORRO NIEBLA**	**CONEXIÓN DE AGUA**	**VÁLVULA DE SALIDA**	**SEÑALIZACIÓN**	**ACCESO Y VISIBILIDAD**	**CERRADURAS**	**VIDRIO**	**PUERTA**	**PINTURA**	**LIMPIEZA**	**RUTINA SEMANAL**	
1	**SEMISOTANO PARQUEADEROS**	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	**OBSERVACIÓN**
Inspección Visual General del Equipo	**SI**	
Limpieza Interna y Externa	**NA**	
Soplado del Equipo	**NA**	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	**SI**	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	**SI**	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	**SI**	**NO CUENTA CON MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN EN GABINETE UBICADO AL COSTADO DE LA PORTERÍA DE INGRESO AL SÓTANO.**
Revision y verificacion extintores	**SI**	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	**NA**	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	**SI**	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	**SI**	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	**SI**	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	**NA**	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	**SI**	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	**NA**	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	**SI**	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			**FECHA**		**REVISÓ**	**APROBÓ**
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

		TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
		AREA OPERATIVA		VERSION	V2
		INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de junio de 2025	RONALDO CAMACHO	CARGO: TECNICO	Vo.Bo COORDINADOR SST:

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	SOTANO	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	Estación manual control SOTANO 1 presenta falla
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	SOPORTE ANTISISMICOS SIN PINTURA -ZONA BODEGAS, HACIENDA

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN			FECHA		REVISÓ	APROBÓ
0			1/03/2021		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
1			10/08/2023		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
2			25/04/2025		COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Código: PGD-TIC-FOR-INCG-001	FECHA DE EMISIÓN	1/03/2021
	AREA OPERATIVA		VERSION	V2
	INSPECCIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS		DOCUMENTO CONTROLADO	

FECHA DE INSPECCIÓN: 21 de junio de 2025 | RONALDO CAMACHO | **CARGO:** TECNICO | **Vo.Bo COORDINADOR SST:**

Convenciones: **B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo **NT:** No Tiene **NA:** No Aplica

No. DE GABINETE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA	CONDICIONES Y ELEMENTOS DEL GABINETE														OBSERVACIONES
					GABINETE	SOPORTE PARA MANGUERA	MANGUERA	LLAVE SPANNER	HACHA	BOQUILLA CHORRO NIEBLA	CONEXIÓN DE AGUA	VÁLVULA DE SALIDA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO Y VISIBILIDAD	CERRADURAS	VIDRIO	PUERTA	PINTURA	LIMPIEZA	RUTINA SEMANAL
1	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
2	CADE																			VACIO UBICADO EN EL PASILLO DE INGRESO PARA PLANOTECA
3	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	#64	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
4	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
5	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO
6	CADE	ABC	10Lb	1/08/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	VENCE EN AGOSTO

DESCRIPCIÓN	Convenciones: **S:**si **N:**no **NA:** No Aplica	OBSERVACIÓN
Inspección Visual General del Equipo	SI	
Limpieza Interna y Externa	NA	
Soplado del Equipo	NA	
revision y verificacion válvulas y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
revision y verificacion tuberias y accesorios libres de oxidación, manipulación o daños	SI	
Revision y Verificacion ubicación correcta de los equipos	SI	
Revision y Verificacion gabinetes cuentan con todos los elementos requeridos	SI	
Revision y verificacion extintores	SI	
Revision Verificacion Extintores adecuados para el uso	NA	
Revision Verificacion señalizacion de valvulas en escaleras	SI	
Revision Verificacion estado valvulas de sectorizacion	SI	
Revision, Verificacion, Inspección y confirmación de la adecuada posición Manguera del gabinete	SI	
Revision y Verificacion Retimbrado Manguera inferior a 5 años	NA	
Revision y Verificacion fecha de fabricacion Manguera inferior a 20 años	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 1 ½"	SI	
Revision y Verificacion Comprobación de hermetismo de Válvula 2 ½"	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Revision y Verificacion empaques de Rosca y Cabeza manguera	SI	
Validar diámetros de válvulas para comprobación de hermetismo	NA	
Revision y Verificacion Estabilidad, ajuste del Equipo	SI	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450468	1	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 # 11- 43	ESPINAL-TOLIMA	2392208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1566556093	9487615099	E	2025/06/17	2025/06/19	BANCO DAVIVIENDA	2	$13,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93133244	OSPINA JOHN	25-14	1	$48,000	$7,700	EPS017	1	$48,000	$2,000	CCF48	1	$48,000	$2,000	14-23	1	$48,000	$1,200	1	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$48,000	$7,700			$48,000	$2,000			$48,000	$2,000			$48,000	$1,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$100	$0	$7,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,700	$100	$0	$7,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$100	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,200	$100	$0	$1,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,000	$100	$0	$2,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$2,000	$100	$0	$2,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,000	$100	$0	$2,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,000	$100	$0	$2,100
TOTAL				1	$12,900	$400	$0	$13,300

2025/06/19 04:11 PM

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-20, 04:20:03 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 78894367

Periodo Cotización 202506 **Periodo Servicio** 202507

Cliente:

PAGADA 2025-07-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MISION TEMPORAL LTDA				
Documento	NI 800136105	**Dirección**	CL 67 #7 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3581085		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	FLORES SERNA JAMES HUMBERTO	**Identificación**	CC 75094676		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93133244		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OSPINA TOVAR JOHN CARLOS	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 2.571.960	25-14		16 %	$ 3.498.988	$ 559.900	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 3.498.988	$ 140.000	$ 0	14-4	4	4.350 %	$ 3.498.988	$ 152.300	CCF50	4 %	$ 3.498.988	$ 140.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO TOLIMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 559.900	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 152.300	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 992.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901407023-6	COHIDREL INGINEERS SAS	Cr 24 # 45a - 45 sur	3202323742	cohidrel.ing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	87101720	$1.099.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	30.400	0		0		0	0	0	0	30.400	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	258.200	0	0	0	0	0	0		258.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	326.600	0	0	0	0	0	0		326.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	30.400	0	0	0	0	0	0		30.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	176.300				176.300	0	0	176.300			1.763	176.300	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	39.900	0	0	39.900	4
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	114.000	0	0	114.000	2

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901407023-6	COHIDREL INGINEERS SAS		Cr 24 # 45a - 45 sur	3202323742	cohidrel.ing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	87101720	$1.099.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	153.900	153.900
Pensión	3	615.200	615.200
Riesgos Laborales	1	176.300	176.300
CCF	2	153.900	153.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.099.300	1.099.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901407023-6	COHIDREL INGINEERS SAS		Cr 24 # 45a - 45 sur	3202323742	cohidrel.ing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	87101720	$1.099.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014229366	RUIZ CRUZ DIANA ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1039022919	FORONDA PULGARIN LEON BERNARDO	1	0			S		X															231001	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF03	189.800	7.600	0	0	0	0	0
3	CC	18514700	MORENO CORDOBA HOLMES ANTONIO	1	0			S		X															230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS041	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF03	189.800	7.600	0	0	0	0	0
4	CC	71879348	MOSQUERA CANO WILSON ALONSO	1	0			S		X															230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS041	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF03	569.400	22.800	0	0	0	0	0
5	CC	79684830	OBANDO CANO LUIS EDILSON	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF03	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	9432026	CAMACHO CACHAY RONALDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Factura Electrónica de Venta MTT0 - 617

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080928877 de 03/10/2024 - 03/10/2026 autoriza MTT0-601 a MTT0-630

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/08/2025 14:54
Fecha de Vencimiento	19/09/2025 14:54
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	250381

Actividad Económica Principal 3 3 1 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

SIN VALIDAR

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901450468-1
Obligación	IVA
Email	financiera.multistt@gmail.com
Teléfono	3 0 0 3 1 8 8 5 4 5
Dirección Fiscal	CL 12 11 43 BRR CABALLERO Y GONGORA, ESPINAL, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nombre Comercial	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
NIT	899999061-9
Obligación	NO APLICA
Email	radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Teléfono	6013820660
Dirección	TV 18 BIS 38 41
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01_250381	RUTINA PREVENTIVA SEMANA SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS semana 3 (23 y 24 mayo), semana 4 (30 y 31 de mayo), semana 5 (6 Y 17 de junio), semana 6 (13 y 15 de junio), semana 7 (20 y 21 de junio)	5.0	EA	$235,294.12	IVA 19%	$1,176,470.59	$1,400,000.00
2	02_250381	RUTINA PREVENTIVA MENSUAL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS semana 6 (13 y 15 de junio)	1.0	EA	$840,336.13	IVA 19%	$840,336.13	$999,999.99
3	03_250381	RUTINA PREVENTIVA SEMANAL SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS semana 3 (23 y 24 mayo), semana 4 (30 y 31 de mayo), semana 5 (6 Y 17 de junio), semana 6 (13 y 15 de junio), semana 7 (20 y 21 de junio)	5.0	EA	$268,907.56	IVA 19%	$1,344,537.82	$1,600,000.00
4	04_250381	RUTINA PREVENTIVA TRIMESTRAL SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS semana 7 (20 y 22 de junio)	1.0	EA	$840,336.13	IVA 19%	$840,336.13	$999,999.99

4

Subtotal	$4,201,680.67
IVA 19%	$798,319.31
Total a Pagar	**$4,999,999.98**

Unidades de medida: EA = cada

Factura Electrónica de Venta MTT0 - 617

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080928877 de 03/10/2024 - 03/10/2026 autoriza MTT0-601 a MTT0-630

Actividad Económica Principal 3 3 1 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/08/2025 14:54
Fecha de Vencimiento	19/09/2025 14:54
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	250381

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SIN VALIDAR
