Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-026245 Id: 608473
Folios: 1 Fecha: 10-09-2025 09:42:25
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario:

MEMORANDO

Para: Subdirección de Gestión Contractual

De: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES MES DE JULIO DE 2025 DEL CONVENIO 1988-21 AMBALEMA, TOLIMA

Cordial saludo,
En mi condición de supervisora, adjunto, para su archivo, los siguientes informes que corresponden al mes de JULIO de 2025:

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS				
NN.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	CAM/CIC /SACUDET E	MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS
1980-2021	Sacúdete Tipo 1	Ambalema	Tolima	INFORME DE JULIO 2025 MINISTERIO + SOPORTES– FOLIOS (71)

Total, folios (71)

Cordialmente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora de los convenios

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda/Apoyo a la supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1988 DE 2021**, MUNICIPIO DE **AMBALEMA - TOLIMA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 5 CON CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y CALLE 12, DEL BARRIO LA ESPERANZA AREA URBANA – AMBALEMA		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AMBALEMA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.680.000.000,0
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$121.267.797,0
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.801.267.797,0
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-10-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA QUINTERO	11/11/2021	21/11/2021
	YENIER HENAO MEJIA	22/11/2021	20/04/2023
	NORMAN EDUARDO ORTIZ	21/04/2023	27/04/2023
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/04/2023	05/06/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/06/2024	10/06/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/06/2024	30/06/2025
	TITO LORENZO LOVO	01/07/2025	21/07/2025
	JENNY PAOLA LAVAO	22/07/2025	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CAMILO GARCIA MEDINA	22/11/21	31/12/21
	CAMILO GARCIA MEDINA	18/04/22	31/04/2020
	Arq. DANIEL SUAREZ	1/04/2022	30/09/2022
	Arq. DANIEL SUAREZ	08/11/2022	31/12/2022
	Arq. DANIEL SUAREZ	01/04/2023	31/06/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	29/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/04/2024	30/04/2024
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	01/04/2024	31/12/2024
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	16/04/2025	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	52321	4/11/2021	
	27522	18/04/2022	
	3823	14/04/2023	
	33124	4/04/2024	
	35424	24/06/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	112121	18/04/2022	
	18822	16-01-2022	
	2223	14/04/2023	
	54224	04/04/2024	
	93324 (adición)	28/06/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-994000069130	22-11-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	22-NOVIEMBRE-2021		

FECHA D E MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 28/06/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION	**FECHA:** 30/11/2022
	TERCERA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACION	**FECHA:** 19/12/2023
	TERCERA MODIFICACIÓN Y PRIMERA ADICIÓN	**FECHA:** 27/06/2024
	CUARTA PRÓRROGA	**FECHA:** 29/07/2024
	QUINTA PRÓRROGA Y TERCERA MODIFICACION	**FECHA:** 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUPENSION	**FECHA:** 31/06/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA: 31/07/2023**
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	**FECHA: 31/08/2023**
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°3	**FECHA: 31/10/2023**
	REINICIO N°1	**FECHA: 01/12/2023**
	SEGUNDA SUPENSION	**FECHA: 24/04/2025**
	AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°2	**FECHA: 10/06/2025**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIF. SOLIDARIA N° 580 47 994000069130 ANEXO 7	
	1.CUMPLIMIENTO $250.000.000 DESDE 12/11/2021 HASTA 30/06/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$1.041.667.000,00	
VALOR INTERVENTORÍA	$83.333.000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$1.250.000.000	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1) UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$225.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. Suscripción del acta de inicio. **B**. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **C**. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000
ADICIÓN No. 1	Adición.	NO APLICA	21/03/2025	$ 430.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$820.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. **B**. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **C**. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y **D**. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000

TERCER DESEMBOLSO	**3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$205.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **B**. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **C**. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 225.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$00.0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	30/11/2022

PÓLIZA PRIMERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/06/2023

PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/12/2023

PÓLIZA REINICIO Y TERCERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/04/2025

PÓLIZA CUARTA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*

580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/06/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato 083 del 11 de abril del 2022	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA Representante Legal JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ		NIT. 901573308-1 CC. 1.020.757.338
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación inicial del contrato	25/11/2022	**Fecha de terminación actual del contrato**	20/07/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.552.100.309
FECHA DE LA PÓLIZA	DESDE 20/04/2022 HASTA 24/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato 087 del 18 de abril del 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 551.433.309
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		CC. 7.722.019
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación del contrato	25/11/2022		20/07/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	APORTÓ	NO APORTÓ
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JUNIO 2025	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: INF. SEMANAL No. 21 24/11/2024		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X MAYO 2025 $ 9.373.497,64 (DESPUES DEL EMBARGO) CUENTA $ 78.190.241,14 NUEVA CUENTA BANCO POPULAR BBVA	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**94%**
% EJECUTADO DE OBRA	**89%**

PERIODO: JULIO 2025
FECHA ACTA DE INICIO: 11/11/2021
AVANCE DE OBRA: 89%
VIGENCIA: 31/10/2025

GESTION DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO OBSERVACIONES:

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO:
NINGUNO

COMPONENTE TECNICO:

08/07/2025

Se remite correo electrónico al municipio solicitando la información de seguimiento y supervisión del municipio correspondiente al mes de junio de 2025.

15/07/2025

Se remite correo electrónico al municipio reiterando la información de seguimiento y supervisión del municipio correspondiente al mes de junio de 2025.

17/07/2025

El municipio, mediante correo electrónico, emite la información de seguimiento correspondiente del mes de junio, esto acompañando por el extracto bancario del mes de junio del banco BBVA el cual corresponde a la cuenta embargada del municipio.

18/07/2025

Conforme a lo tramitado para el pago exigible, vigencia expirada, del tercer desembolso al convenio se solicitó al municipio emitir la certificación bancaria actualizada de la entidad bancaria autorizada para la recepción de los recursos FONSECON, esto para reanudar el trámite del tercer desembolso y la petición del grupo financiero de la SPS. Cabe resaltar que este pago

ya cuenta con resolución de pago suscrita por la ordenadora del gasto del Ministerio del Interior.

Dada esta solicitud el municipio emite dicho documento.

22/07/2025

Una vez compilada la información de soporte del tercer desembolso constituido como una Vigencia Expirada-Pago exigible, se procedió a emitir correo electrónico al grupo financiero de la SPS, para que esto continúen con su gestión y tramites correspondiente ante esto.

24/07/2025

Se remite correo electrónico al municipio, agendando una reunión de seguimiento al convenio la cual se desarrollará el 29 de julio de 2025.

29/07/2025

Se desarrolló la reunión de seguimiento prevista, en la cual participaron municipio y supervisión del Ministerio del Interior. En dicha reunión se tocaron temas como el estado actual de las certificaciones RETIE/RETILAP, se notificó sobre lo adelantado para el proceso de pago de la vigencia expirada – pago exigible, y se conoció que el municipio tendrá una nieva secretaría de planeación a partir del 31 de julio de 2025, por lo tanto, se anticipó la solicitud de la designación, en el caso de que la secretaria fuera nombrada como supervisora del convenio interadministrativo 1988-21.

31/07/2025

En disposición a los compromisos pactados en la reunión de seguimiento se solicitó al municipio indagar sobre el proceso de certificación de RETIE/RETILAP, para lo cual, el municipio mediante copia de un correo electrónico emite un oficio instando al contratista de obra a dar una actualización de dichos procesos, esto como evidencia de su gestión.

COMPONENTE FINANCIERO:

A la fecha se realizado el primer desembolso al convenio por un valor de $225.000.000 M/L.

Es importante destacar que, aunque el segundo y tercer desembolso fueron tramitados mediante los radicados 2024-3-003122-031364 (Id: 430349) y 2024-3-003122-031769 (Id: 432168), correspondientes a los días 22 y 24 de octubre de 2024 respectivamente, ante los despachos del Ministerio del Interior, y estas realizaron las gestiones pertinentes, dichos pagos se constituyeron como una reserva presupuestal y vigencia expirada correspondientemente y a la fecha se han adelantado los trámites pertinentes dentro del ministerio para surtir con este proceso.

El 21 de marzo de 2025 se realizó el pago del SEGUNDO DESEMBOLSO – ADICIÓN correspondiente a $430.000.000 M/L y según afirmó la supervisión municipal, los pagos se efectuaron en el mes de abril de 2025.

Pese que el municipio emite los informes de financieros de diciembre de 2024, enero a mayo de 2025 y los extractos junto con los soportes de pagos, estos saldos no se podrán legalizar en su totalidad por parte del ministerio del interior, pues la cuenta primeras 2 cuentas de BBVA, aperturadas para el depósito de los recursos FONSECON fueron embargadas. Por lo tanto, los valores relacionados no corresponden a los pagos relacionados en el informe financiero del municipio y los extractos relacionados. Cabe resaltar que el municipio realizó la apertura de una nueva cuenta en la entidad bancaria BANCO POPULAR y en esta serán depositados los desembolsos faltantes.

Esto llevó a que el municipio use saldos de otros rubros para lograr compensar la exigencia financiera del proyecto, por lo tanto, una vez se aclare la situación por parte del municipio y que los pagos del Ministerio se efectúen, se podrá revisar los valores y saldos, y así, legalizar los recursos aportados.

El pasado 18 de julio de 2025, se remito al grupo financiero de la SPS información del tercer desembolso junto con la certificación bancaria actualizada para que estos reanuden su gestión y tramite del proceso, pues a esta fecha ya se cuenta con resolución de pago suscrita por la ordenadora del gasto del Ministerio del Interior. Este número de resolución no fue compartido por el grupo financiero.

COMPONENTE JURIDICO:

El convenio se encuentra en vigencia hasta el próximo 31 de octubre de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El convenio se encuentra suspendido.

Se concluyeron actividades diversas actividades que abarcan acabados, instalaciones eléctricas, movimientos de tierra, fundiciones estructurales y la recepción de materiales.

A la fecha están pendiente la consecución de las certificaciones RETIE/RETILAP y conexión eléctrica definitiva, además falta el arribo de los suministros de juegos infantiles y GYM Vital, estos hechos motivaron la solicitud ampliación No. 1 de suspensión no. 2, suscrita el 10 de junio de 2025. Estos hechos representan una ruta critica para la finalización efectiva del convenio, de tal manera que se están estudiando manera de instar a la empresa certificadora y obtener las certificaciones, pues según informó el municipio, el contratista de obra, surtió con todos los requisitos y no conformidades requeridas por la empresa certificadora de RETIE/RETILAP, ODIR CERTIFICACIONES S.A, en donde hace aproximadamente 5 meses recibieron la primera visita de inspección, y estos, subsanaron lo solicitado en su momento. Esto conforme a las fechas dadas por el contratista de obra:

- 11 de febrero de 2025, primera visita.
- 19 de febrero de 2025, documento con observaciones
- 04 de marzo de 2025, se emitieron la subsanación de las no conformidades a la empresa certificadora.

Para las próximas fases de obra, una vez agotada la suspensión convenida, priorizará la finalización de instalación de los suministros para generar el recibo y entrega a satisfacción del convenio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/04/2024	18/06/2024	03/10/2024 04/10/2024	21/11/2024 22/11/2024	24/04/2024 25/04/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora Convenio No 1988-21 Desde el 22/07/2025
Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

ARQ. JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA
***Elaboró:* Apoyo Profesional a la Supervisión 1988-21**
Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

ABG. TITO LORENZO LOVO CARRETERO
Subdirector de proyectos y supervisor (e) Convenio No 1988-21 Desde el 01/07/2025 hasta el 21/07/2025
Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

Outlook

Re: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO DEL 2025 AL CONVENIO 1988 - 21 AMBALEMA, TOLIMA

Desde Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Mar 8/07/2025 11:01 AM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

GRACIAS POR CONTACTARNOS!!!

El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., cualquier documento recibido con posterioridad, será radicado con fecha del siguiente día hábil, el único correo autorizado para recepción de memoriales es el institucional.

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

Igualmente puede enviar sus solicitudes a través de la pagina web de la Alcaldìa Municipal http://www.ambalema-tolima.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

--

EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura y TICS
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

Outlook

Re: REITERACIÓN No. 1, SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO DEL 2025 AL CONVENIO 1988 - 21 AMBALEMA, TOLIMA

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Jue 17/07/2025 3:18 PM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; contratacion contratacion <contratacion@ambalema-tolima.gov.co>

6 archivos adjuntos (10 MB)

ANEXOS JUNIO SACUDETE.pdf; extractos bancarios convenio 1988 de 2021- mayo 2025.pdf; informe financiero convenio 1988 de 2021- junio 2025.pdf; extractos bancarios convenio 1988 de 2021- junio 2025.pdf; informe financiero convenio 1988 de 2021- mayo 2025.pdf; INFORME JUNIO SACUDETE ESCANEADO.pdf;

Cordial saludo,

Señores
Ministerio del interior

Por medio de la presente me permito enviar el **informe de supervisión correspondiente al mes de junio de 2025**, derivado del **Convenio 1988 de 2021**, suscrito por la Alcaldía Municipal de Ambalema, Tolima.

Igualmente, se adjuntan los **anexos técnicos** relacionados con los avances administrativos desarrollados durante el mes de junio, entre los cuales se encuentran

1. Informe técnico presentado por la interventoría,
2. Documentos técnicos de soporte que evidencian la trazabilidad del proceso, el estado del trámite, y las observaciones pendientes en las instalaciones eléctricas del proyecto.

Adicionalmente, se adjuntan los siguientes documentos financieros correspondientes al mismo convenio:

- **Informe financiero** de los meses de mayo y junio de 2025.
- **Extractos bancarios** correspondientes a los mismos meses.

cordialmente;

Ing.Civil BRENDA CATALINA CÁRDENAS RAMÍREZ
Contratista adscrita a la Secretaria de Planeación
e Infraestructura y Tics, bajo contrato 106 del 16 de junio de 2025.

EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

El mar, 15 jul 2025 a las 13:43, Juan Sebastian Duque Sepulveda (<juan.duque@mininterior.gov.co>) escribió:

> Cordial Saludo.
>
> En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de 1988 de 2021, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de enviar la siguiente información:
>
> - INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL MES DE **JUNIO DE 2025.**
> - INFORMES FINANCIEROS DEL MES **JUNIO DE 2025.**
>
> esto anterior, para desarrollar el ejercicio de supervisión de manera eficiente y eficaz, así como lo mencionan las siguientes clausulas:
>
> > ***"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:*** *(…)**29)** Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. **30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **32)** Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del MUNICIPIO. **34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.**45)** Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. **"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:** (...)**2)** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.**3)** Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. **4)** Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.*

Agradecemos su gestión.

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente

Cuenta 500-806-07772-6 Página N° 001 de 001

Nombre: SACUDETE AL PARQUE-MUNICIPIO DE AMBALEMA Oficina: IBAGUE Ofi: 550

Dirección: CL 9 NO 2 52 CTRO Fecha de Corte

Ciudad: IBAGUE Desde 2025/06/01 Hasta 2025/06/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 03	2119	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 68	78,216,435 05
06 03	2121	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 69	78,217,183 74
06 04	2136	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 69	78,217,932 43
06 05	2122	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 70	78,218,681 13
06 06	2121	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 71	78,219,429 84
06 09	2117	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 72	78,220,178 56
06 09	2119	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 72	78,220,927 28
06 09	2120	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 73	78,221,676 01
06 11	0322	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 74	78,222,424 75
06 11	2116	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 75	78,223,173 50
06 12	2114	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 75	78,223,922 25
06 13	2113	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 76	78,224,671 01
06 16	2115	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 77	78,225,419 78
06 16	2115	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 77	78,226,168 55
06 16	2116	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 78	78,226,917 33
06 17	2111	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 79	78,227,666 12
06 18	2112	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 80	78,228,414 92
06 19	2115	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 80	78,229,163 72
06 20	2113	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 81	78,229,912 53
06 24	2123	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 82	78,230,661 35
06 24	2124	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 82	78,231,410 17
06 24	2125	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 83	78,232,159 00
06 24	2125	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 84	78,232,907 84
06 25	2240	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 85	78,233,656 69
06 26	2117	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 85	78,234,405 54
06 27	2119	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 86	78,235,154 40
06 27	2224	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 87	78,235,903 27
06 28	2225	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 87	78,236,652 14
06 29	2226	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 88	78,237,401 02
06 30	2227	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 89	78,238,149 91

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
78,215,686 37	0 00	22,463 54	78,226,168 83	0 00	78,238,149 91

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-06-2025	SIN MOVMNTOS PERIOD2025-06-012025-06-30	01-06-2025		

PERIODO: Desde 01-06-2025 **Hasta** 30-06-2025

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Saldo promedio del mes .00

Nuevo Saldo
.00

OFICINA	FECHA CORTE
AGENCIA MARIQUITA	30-06-2025

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0876	94	0200001295	2

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
27-06-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA	30-06-2025		94.00

PERIODO: Desde 01-06-2025 **Hasta** 30-06-2025

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
9,374,061.64	.00	94.00

Saldo promedio del mes 9,374,061.64

Nuevo Saldo 9,374,155.64

OFICINA	FECHA CORTE
AGENCIA MARIQUITA	30-06-2025

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0876	90	0200070194	2

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S): * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 876-001295 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 550-80607772-6 DEL BANCO: BANCO POPULAR

VALOR CONVENIO **$ 1,801,267,797.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,680,000,000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 121,267,797.00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1	**$ 225,000,000.00**
GIRO 2	**$ 430,000,000.00**
GIRO 3	$ 0.00
GIRO 4	$ 0.00
TOTAL GIRADO MINISTERIO	**$ 655,000,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 655,000,000.00** $ 655,000,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA	$ 1,125,000,000.00	$ 510,433,309.00	$ 1,635,433,309.00
C-002-2022 (Contrato 087 de 2022	JHON JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125,000,000.00	$ 40,834,488.00	$ 165,834,488.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,801,267,797.00**

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR PAGO
83	primer pago del contrato 083 (estudios y diseños)	1324	1324	06/09/2024		$ 83,332,999.89	$ 83,332,999.89
83	segundo pago del contrato 083 (construccion)	1325	1325	06/09/2024	$ 141,369,548.49	$ 37,934,797.11	$ 179,304,345.60
83	tercer pago del contrato 083 (construccion)	1553	1553	21/10/2024	$ 447,195,587.00		$ 447,195,587.00
87	primer pago interventoria tecnica	1920	1920	10/12/2024	$ 41,667,000.00		$ 41,667,000.00
83	cuarto pago del contrato 083 (construccion)	1921	1921	10/12/2024	$ 100,000,000.00		$ 100,000,000.00
87	segundo pago interventoria tecnica	520	520	07/04/2025	$ 37,250,246.40		$ 37,250,246.40
83	cuarto pago del contrato 083 (construccion) excedente	521	521	07/04/2025	$ 249,523,902.00		$ 249,523,902.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,017,006,283.89**	**$ 121,267,797.00**	**$ 1,138,274,080.89**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS
30/12/2021	24,502.00
31/01/2022	30,386.00
28/02/2022	9,127.00
31/03/2022	9,127.00
29/04/2022	9,127.00
31/05/2022	9,128.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

30/06/2022	9,128.00
30/07/2022	9,129.00
31/08/2022	9,129.00
30/09/2022	9,130.00
31/10/2022	9,130.00
30/11/2022	9,131.00
31/12/2022	9,131.00
31/01/2023	9,132.00
28/02/2023	9,133.00
31/03/2023	10,164.00
28/04/2023	11,132.00
31/05/2023	11,132.00
30/06/2023	11,133.00
31/07/2023	11,134.00
31/08/2023	11,134.00
29/09/2023	9,815.00
31/10/2023	7,177.00
30/11/2023	7,177.00
28/12/2023	7,178.00
31/01/2024	7,178.00
29/02/2024	7,178.00
31/03/2024	1,555.00
30/04/2024	1,555.00
31/05/2024	1,555.00
28/06/2024	1,555.00
31/07/2024	1,555.00
30/08/2024	440.00
30/09/2024	94.00
31/10/2024	94.00
29/11/2024	94.00
31/12/2024	777.86
31/01/2025	691.37
28/02/2025	633.56
31/03/2025	98,807.79
30/04/2025	81,479.39
31/05/2025	25,539.23
30/06/2025	22,557.54
TOTAL	**$ 475,988.97**

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S): * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 876-001295 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 550-80607772-6 DEL BANCO: BANCO POPULAR

VALOR CONVENIO **$ 1,801,267,797.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,680,000,000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 121,267,797.00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	**$ 225,000,000.00**
	GIRO 2	**$ 430,000,000.00**
	GIRO 3	$ 0.00
	GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO	**$ 655,000,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 655,000,000.00** $ 655,000,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA	$ 1,125,000,000.00	$ 510,433,309.00	$ 1,635,433,309.00
C-002-2022 (Contrato 087 de 2022	JHON JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125,000,000.00	$ 40,834,488.00	$ 165,834,488.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,801,267,797.00**

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR PAGO
83	primer pago del contrato 083 (estudios y diseños)	1324	1324	06/09/2024		$ 83,332,999.89	$ 83,332,999.89
83	segundo pago del contrato 083 (construccion)	1325	1325	06/09/2024	$ 141,369,548.49	$ 37,934,797.11	$ 179,304,345.60
83	tercer pago del contrato 083 (construccion)	1553	1553	21/10/2024	$ 447,195,587.00		$ 447,195,587.00
87	primer pago interventoria tecnica	1920	1920	10/12/2024	$ 41,667,000.00		$ 41,667,000.00
83	cuarto pago del contrato 083 (construccion)	1921	1921	10/12/2024	$ 100,000,000.00		$ 100,000,000.00
87	segundo pago interventoria tecnica	520	520	07/04/2025	$ 37,250,246.40		$ 37,250,246.40
83	cuarto pago del contrato 083 (construccion) excedente	521	521	07/04/2025	$ 249,523,902.00		$ 249,523,902.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,017,006,283.89**	**$ 121,267,797.00**	**$ 1,138,274,080.89**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS
30/12/2021	24,502.00
31/01/2022	30,386.00
28/02/2022	9,127.00
31/03/2022	9,127.00
29/04/2022	9,127.00
31/05/2022	9,128.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

30/06/2022	9,128.00
30/07/2022	9,129.00
31/08/2022	9,129.00
30/09/2022	9,130.00
31/10/2022	9,130.00
30/11/2022	9,131.00
31/12/2022	9,131.00
31/01/2023	9,132.00
28/02/2023	9,133.00
31/03/2023	10,164.00
28/04/2023	11,132.00
31/05/2023	11,132.00
30/06/2023	11,133.00
31/07/2023	11,134.00
31/08/2023	11,134.00
29/09/2023	9,815.00
31/10/2023	7,177.00
30/11/2023	7,177.00
28/12/2023	7,178.00
31/01/2024	7,178.00
29/02/2024	7,178.00
31/03/2024	1,555.00
30/04/2024	1,555.00
31/05/2024	1,555.00
28/06/2024	1,555.00
31/07/2024	1,555.00
30/08/2024	440.00
30/09/2024	94.00
31/10/2024	94.00
29/11/2024	94.00
31/12/2024	777.86
31/01/2025	691.37
28/02/2025	633.56
31/03/2025	98,807.79
30/04/2025	81,479.39
31/05/2025	25,539.23
TOTAL	**$ 475,988.97**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 1988 DEL 2021, MUNICIPIO AMBALEMA TOLIMA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JUNIO** DEL 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 5 con Carrera 4 entre Calles 11 y Calle 12, del barrio la esperanza área urbana del Municipio de Ambalema Tolima Coordenadas: 4°46´59"N 74°45´47"W		
BENEFICIARIO:	AMBALEMA TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.680.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 121.267.797
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 1.801.267.797
FECHA SUSCRIPCIÓN	10-11-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16-07-2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARCO TULIO VELASQUEZ PULIDO – ALCALDE MUNICIPAL, AMBALEMA-TOLIMA.		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**INGENIERO CIVIL, SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS**	**DESDE**	**HASTA**
	JUAN ALEXANDER ROA LOZANO	03/01/2020	06/12/2021
	JUAN APONTE	14/12/2021	05/08/2022
	EVARISTO RAUL RESTREPO ESTRADA	08/08/2022	02/09/2022
	ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO	05/09/2022	13/02/2023
	EDWIN MAURICIO VARON CABEZAS	21/02/2023	31/12/2023
	MARCO TULIO VELASQUEZ	01/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EDNNA ROCIO RAMIREZ	21/02/2024	ACTUAL
	BRENDA CATALINA CARDENAS	16/06/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 1036 No. 1035 No. 404 No. 409 No. 1034	28/06/2024 28/06/2024 11/03/2022 18/03/2022 28/06/2024	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 127 No. 288 No. 549 No. 664	21/01/2022 10/03/2022 28/05/2024 28/06/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-47-994000069130	12/11/2021 DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11/11/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PLAZO INICIAL	31/05/2022	
	PRIMERA PRÓRROGA	30/11/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 30/06/2023	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 31/07/2024	
	CUARTA PRORROGA	FECHA: 31/12/2024	
	QUINTA PRORROGA	FECHA: 31/03/2025	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: 31/05/2023	
	AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01	FECHA: 31/07/2023	
	AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01	FECHA: 31/08/2023	
	AMPLIACIÓN 03 SUSPENSIÓN 01	FECHA: 31/10/2023	
	REINICIO 01	FECHA: 01/12/2023	
	SUSPENSION 02	FECHA: 24/02/2025	
	REINICIO 02	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 20/05/2022 FECHA: 20/04/2022 FECHA: 20/11/2027		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUOTA DE GERENCIA** (Cuando aplique)	$ 41.667.000,00		
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000,00		
VALOR INTERVENTORÍA OBRA	$ 83.333.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 510.433.309,00		
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 40.834.488,00		

2. **ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	1. Cronograma contemplado en el # 2 de las obligaciones del Municipio 2. Acta de Inicio 3. Certificado de s.s. Parafiscales 4. Certificado Cuenta de Ahorros 5. Asignación supervisión	NO APLICA	12/07/2021	$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO (Adición)	1. Póliza de la adición 2. Aprobación de póliza por parte del ministerio 3. Cronograma actualizado	NO APLICA	21/03/2025	$ 430.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	1. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y 4. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME: 1				$ 655.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 262.637.345,49

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-47-994000069130	Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra y calidad del Servicio	$ 360.253.559,40	12/11/2021	30/06/2025
580-47-994000069130	Predios Laborales y operaciones, contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios	$ 300.000.000	12/11/2021	30/06/2025

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ *Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	083 del 11 de marzo del 2022		$ 83.333.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	27/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 83.333.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022, 15/08/2024, 16/08/2024		

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	087 del 18 de Marzo del 2022		$ 41.667.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 41.667.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022, 17/07/2024, 15/08/2024, 27/09/2024.

➢ *Contrato de Ejecución de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	083 del 11 de Marzo del 2022		$ 1.041.667.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 510.433.309,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.552.100.309,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022, 15/08/2024		

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	087 del 18 de marzo del 2022		$ 83.333.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	28/06/2024		$ 40.834.488,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Revisò: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 124.167.488,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia	
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241	
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022, 17/07/2024, 15/08/2024, 27/09/2024.	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO DEL 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA **(INFORME No.21 CORTE AL 24 de noviembre del 2024)**		X
INFORME FINANCIERO	MAYO DEL 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Cuenta BBVA: $ 9.373.873,64 + Cuenta popular: $ 78.190.241,14	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%
% EJECUTADO DE OBRA	89.00%

5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

- **EQUIPO DE TRABAJO**

El siguiente cuadro corresponde al personal profesional que realizó los diseños para el proyecto **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"**:

ACTIVIDAD	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Levantamientos Topográficos	SANDOR HERNAN TRUJILLO	Topógrafo	TP-01-3751
Estudios de Suelos	JOSE MARTIN CALDERON	Geólogo	TP-25202-58533
Diseños Arquitectónicos	MARYSELL BARRERA TOVAR	Arquitecto	A 25022009-33751269
Diseños Estructurales	ANDRES FELIPE DE JESUS MUÑOZ	Ing. ESP. EN ESTRUCTURAS	TP-25202-261771 CND
Diseños Eléctricos	JAIBER PORTELA TORRES	Ing. Eléctrico	RS205-4332

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cardenas Ramirez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramirez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramirez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobò: Dra. Ednna R. Ramirez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Diseños Hidrosanitarios	ROBERTO CASTAÑEDA PRADO	Ing. Civil	TP-700202-281558 TLM
Presupuesto - APU	JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ	Ing. Civil	25-202-275791 CND

A la fecha el proyecto se encuentra en estado del cierre financiero de debido a que una vez actualizado el presupuesto este arrojo un valor adicional de **$ 551.267.797,00**, por lo cual el Municipio de Ambalema se encuentra realizando los tramites respectivos, con el fin de lograr gestionar los recursos necesarios para realizar los adicionales a los respectivos contratos de obra e interventoría.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

A la fecha en que se entrega este informe desde la secretaria de hacienda municipal informan lo siguiente:

El día 24 de mayo del 2024 se envía oficio con fecha 23 de mayo del año en curso, con el asunto solicitud exoneración gravámenes financieros marcación de inembargabilidad de cuenta bancaria, El día 04 de junio del 2024 se recibe la repuesta de BBVA oficio con fecha 31 de mayo del año en curso con el asunto a la respuesta del oficio enviado por la secretaria de hacienda del 27 de mayo del 2424 solicitud de la devolución de los recursos retenidos por embargos aplicado a la cuenta corriente adscrita al convenio.

El día 24 de junio del 2024 se reúnen en Ambalema Tolima el interventor del contrato, el contratista de obra y la supervisión de los contratos derivados del convenio 1988-2021, por motivos del reinicio número 1 a la suspensión número 1 del 22 de julio del 2022, el día 26 de junio del 2024 se aprueba en el secop II la primera adición en valor al convenio 1988-2021 y el día 28 de junio se realiza la modificación y adición al valor de los contratos derivados del convenio 1988-2021.

Anexo a este documento de informe de supervisión se adjunta: copia de las ordenes de pagos realizados al contratista de las obras del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: la etapa de los estudios y diseños se encuentra en el 100% de ejecución, desde el pasado 24 de junio se firmó el reinicio a los contratos derivados y se inició la etapa de ejecución y construcción.

Por medio de las funciones como supervisión a cargo de la oficina de planeación y la información entregada por la interventoría se han realizado las siguientes actividades y alcanzado un buen % de avance según lo programado vs el ejecutado:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCUION DE OBRA	100.00%
% EJECUTADO DE EJECUCION DE OBRA	89.00%

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

❖ **Programación de obra**: Teniendo en cuenta el reinicio de la obra y que las actividades de ejecución de la obra inician el 2 de julio los contratistas realizan la siguiente reprogramación.

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V PROGRAMADO	V P.ACOMULADO	% PROGRAMAD	% P. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.079.808,00	$ 22.079.808,00	1,42%	1,42%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.539.381,00	$ 107.052.026,00	2,81%	6,90%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.619.983,00	$ 138.672.009,00	2,04%	8,94%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.689.346,00	4,00%	12,93%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.800,00	$ 363.132.146,00	10,47%	23,40%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.935.956,00	$ 397.068.102,00	2,19%	25,59%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 85.816.426,00	$ 482.884.528,00	5,53%	31,12%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.193.192,00	$ 563.077.720,00	5,17%	36,29%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 27.301.270,00	$ 590.378.990,00	1,76%	38,05%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.191.606,00	$ 618.570.596,00	1,82%	39,86%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 24.906.871,00	$ 643.477.467,00	1,61%	41,47%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 21.651.662,00	$ 665.129.129,00	1,40%	42,87%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 43.732.827,00	$ 708.861.956,00	2,82%	45,69%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 179.060.648,00	$ 887.922.604,00	11,54%	57,23%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 418.202.313,00	$ 1.306.124.917,00	26,95%	84,18%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 85.130.178,00	$ 1.391.255.095,00	5,49%	89,67%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 83.079.284,00	$ 1.474.334.379,00	5,35%	95,02%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 52.870.916,00	$ 1.527.205.295,00	3,41%	98,43%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 24.919.451,00	$ 1.552.124.746,00	1,61%	100,04%
TOTAL			$ 1.552.124.746,00			

❖ **Avances realizados por el contratista de obra**

CONTRATO DE OBRA N° 083 de 2022

ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	100.00%
% DE OBRA EJECUTADO:	89.00%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 1.635.433.309,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 1.464.240.212,73

OBSERVACIONES: se evidencia un atraso del -5.34%

❖ **Avances realizados por la interventoría:**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 087 de 2022

ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	100.00%
% DE OBRA EJECUTADO:	89.00%

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

FINANCIERO PROGRAMADO:	**$ 165.834.488,00**
FINANCIERO EJECUTADO	$ 110.509.064,32


LAS OBSERVACIONES:

DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES ADMINISTRATIVOS:


- Se dio continuidad al seguimiento de la solicitud de ampliación del plazo de suspensión del convenio No. 1988 de 2021, radicada por el municipio de Ambalema el 29 de mayo de 2025 mediante oficio SPIT No. 047 – 2025, la cual está en proceso de evaluación por parte de la entidad contratante.
- El 6 de junio de 2025, la administración municipal emitió el oficio SPIT No. 050, solicitando al contratista y a la interventoría información actualizada sobre la trazabilidad de los trámites de certificación RETIE y RETILAP, así como del proceso de conexión definitiva ante el operador de red CELSIA.
- Como respuesta, la interventoría presentó informe técnico en el que se detallan las gestiones adelantadas por el contratista CONSORCIO SACÚDETE AMBALEMA, incluyendo:
- Visitas técnicas del ente certificador ODIR CERTIFICACIONES S.A.S. realizadas entre febrero y mayo de 2025.
- Subsanación progresiva de observaciones de no conformidad.
- Estado actual del trámite, el cual se encuentra en fase de evaluación final dentro del expediente ODIR-008376, a la espera del dictamen de cumplimiento.
- Indicación de que la conexión definitiva ante CELSIA está sujeta a la expedición de dichos certificados.
- Se anexaron además documentos técnicos relevantes, mediante los cuales se da cuenta de la trazabilidad del proceso, el estado actual del trámite, y las observaciones técnicas aún pendientes en las instalaciones eléctricas del proyecto.
- Desde la administración municipal se continuó realizando seguimiento técnico y documental al cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del contratista, con el fin de garantizar la culminación del proceso de certificación eléctrica, requisito indispensable para la entrega del proyecto.

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramirez. – Apoyo A la Gestiòn de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramirez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramirez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramirez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

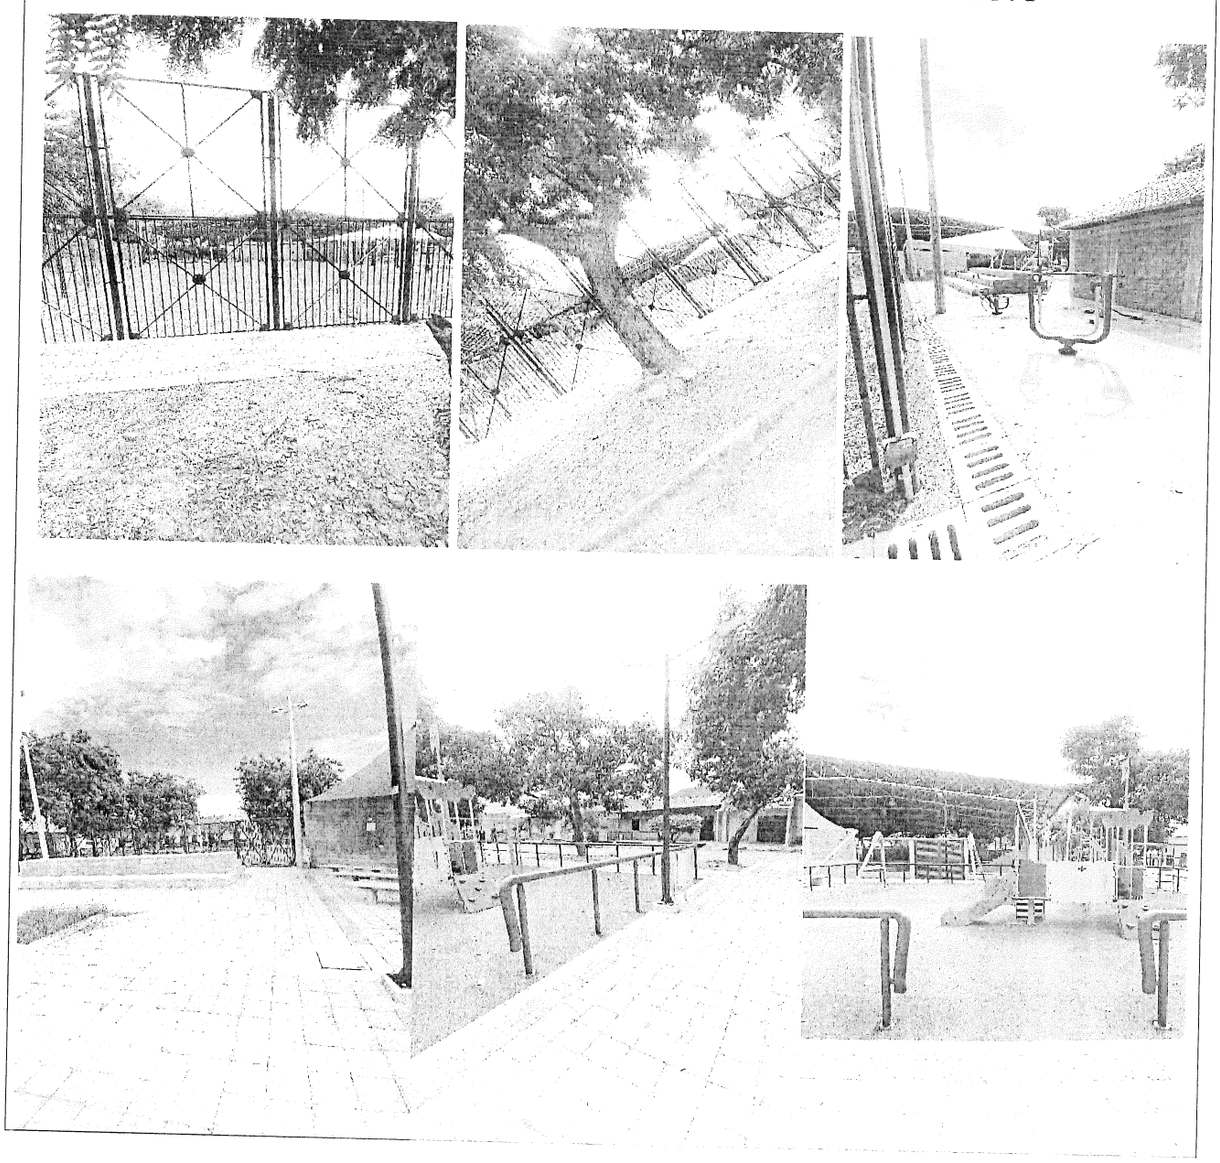

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

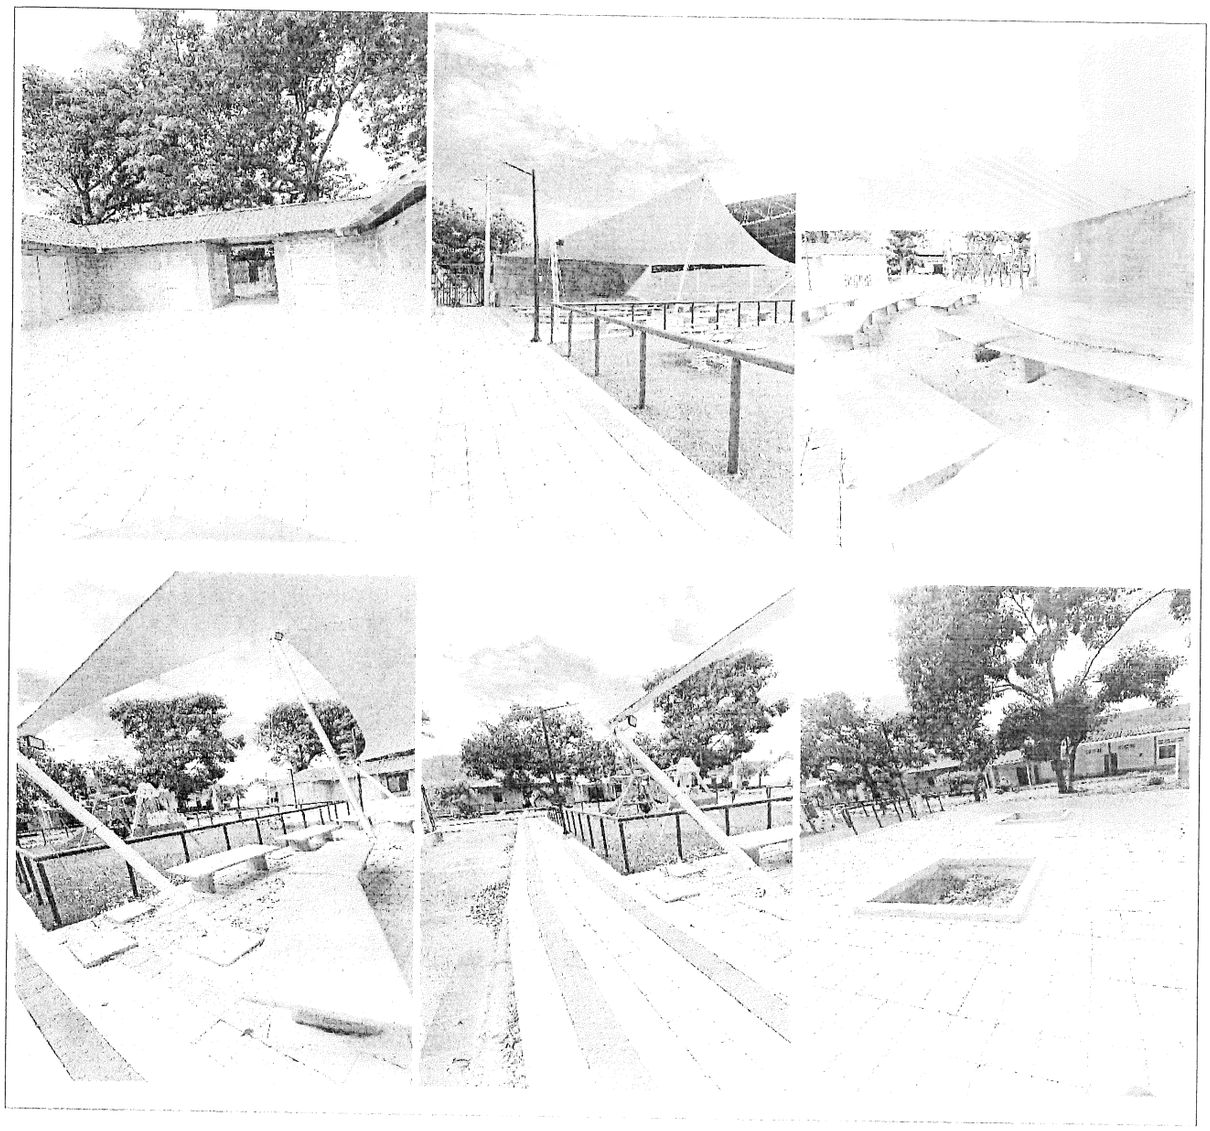

7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

04/06/2025	12/06/2025	17/06/2025	25/06/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

8. SUPERVISOR

Ambalema, 15 de julio de 2025 EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Apoyo a la Supervisión del Convenio No. 1988 DEL 2021 Secretaria de Planeación e Infraestructura y tics Municipio de Ambalema	
Ambalema, 15 de julio de 2025 MARCO TULIO VELASQUEZ PULIDO Supervisor del Convenio No. 1988 DEL 2021 Alcalde Municipio de Ambalema	

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas Ramírez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Brenda Catalina Cárdenas Ramírez – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Revisó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ
Ingeniero Civil
TP. 70202 222387 TLM

Ambalema (T.), 25 de junio de 2025

Doctora
EDNNA ROCÍO RAMÍREZ RAMÍREZ
Secretaria de Planeación, Infraestructura y TIC
Municipio de Ambalema – Tolima
E. S. D.

Asunto: Respuesta a solicitud de información sobre trazabilidad y soportes de trámites RETIE y RETILAP – Contrato de Obra 083 de 2022

Cordial saludo,

En calidad de interventor del Contrato de Obra No. 083 de 2022, cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA – TOLIMA", me permito dar respuesta a su requerimiento radicado mediante oficio SPIT No. 050 del 6 de junio de 2025, mediante el cual se solicita información actualizada y soportes relacionados con el proceso de certificación RETIE y RETILAP, así como de la conexión definitiva ante el operador de red.

Con base en la documentación remitida por el contratista **CONSORCIO SACÚDETE AMBALEMA**, me permito informar lo siguiente:

1. Cronología de actuaciones adelantadas

- **11 de febrero de 2025**: Primera visita técnica del ente certificador **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.**
- **18 de febrero de 2025**: Se reciben observaciones de no conformidad.
- **25 de febrero de 2025**: Subsanación de las observaciones iniciales.
- **31 de marzo de 2025**: Segunda visita técnica.
- **25 de abril de 2025**: Se remiten nuevas observaciones por parte del certificador.

- **02 de mayo de 2025**: Se presentan evidencias de subsanación.
- **25 de mayo de 2025**: Se envían soportes finales y se está a la espera del dictamen de cumplimiento por parte de ODIR CERTIFICACIONES.

2. Estado actual del proceso de certificación RETIE y RETILAP

Mediante comunicación oficial del 18 de mayo de 2025, la empresa **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.** certifica que el proceso se encuentra en fase de evaluación de cierre de no conformidades, dentro del expediente ODIR-008376. Se está a la espera de la emisión del dictamen final de cumplimiento.

3. Gestiones ante el operador de red – CELSIA

- El contratista informa que en **noviembre de 2024** se radicó la solicitud de prefactibilidad y documentación técnica ante CELSIA.
- Este trámite se encuentra pendiente de reactivación, condicionado a la obtención de las certificaciones RETIE/RETILAP.

4. Informe técnico del certificador

Se anexa informe fotográfico en el cual se identifican observaciones técnicas en las instalaciones eléctricas, entre ellas:

- Ausencia de diagramas unifilares legibles.
- Inconsistencia en código de colores y calibre de protecciones.
- Falta de rotulado e identificación de tableros y circuitos.
- Irregularidades en la instalación de tomas, tableros y puesta a tierra.

5. Anexos entregados por el contratista

En atención a su solicitud, se **anexan a la presente comunicación los siguientes soportes entregados por el contratista de obra**:

- Oficio de respuesta del Consorcio Sacúdete Ambalema sobre trazabilidad del proceso.

- Certificación expedida por ODIR CERTIFICACIONES S.A.S. del estado actual del trámite.
- Informe fotográfico con observaciones de las visitas técnicas.

6. Conclusión como interventoría

El proceso de certificación RETIE y RETILAP se encuentra en su etapa final de revisión, y está condicionado a la emisión del dictamen de cumplimiento por parte de ODIR CERTIFICACIONES. La conexión eléctrica definitiva ante el operador CELSIA depende de este trámite. Se evidencia por parte del contratista la atención progresiva a las observaciones emitidas, y desde la interventoría se ha verificado y hecho seguimiento a la gestión.

Se continuará ejerciendo vigilancia técnica y documental hasta la culminación del proceso y la obtención de los certificados respectivos.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Interventor.

CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA

NIT. 901.573.308-1

AMBALEMA, 19 DE JUNIO DE 2025

SEÑORES:
MUNICIPIO DE AMBALEMA
Departamento del Tolima

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 083 – 2022 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA.”

OFI – No. 006 – 084 – 2022

Asunto: Requerimiento de avance de certificación RETIE y RETILAP.

Respetados señores,

En atención a su requerimiento sobre el estado de avance del trámite de certificación RETIE y RETILAP del proyecto "SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA", nos permitimos informar la secuencia de hechos que han pasado con relación al proceso:

El día 11 de febrero del 2025 se realizó la visita del profesional certificador encargado de verificar que las instalaciones cumplieran con los requisitos del *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas* (RETIE) en Colombia, donde verifico el diseño, ejecución, materiales utilizados, realizo pruebas y mediciones.

Posteriormente con base en la inspección el día 18 de febrero del 2025 no remitieron el dictamen de cumplimiento o no conformidad, estas observaciones se corrigieron en la semana siguiente y se programó la segunda visita del profesional certificador para el día 31 de marzo del 2025.

En la segunda visita del profesional donde repitió el proceso anteriormente mencionado, se realizaron unos requerimientos diferentes de los iniciales, los cuales nos los remitieron nuevamente hasta el día 25 de abril de 2025, estos fueron atendidos de inmediato y fueron enviadas las evidencias el día 02 de mayo del 2025.

A estas últimas correcciones se le realizo un par de observaciones muy específicas, las cuales se atendieron, se envió de nuevo la evidencia el 25 de mayo del 2025, a la fecha estamos esperando la respuesta y aprobación del trámite del ente certificador **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.** ya que se cumplió a cabalidad con las subsanaciones.


CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA

NIT. 901.573.308-1

Por otra parte, en el mes de noviembre del 2024 se radico la prefactibilidad y documentación pertinente ante CELSIA, se está esperando la certificación del tramite RETIE Y RETILAP, para continuar con el trámite ante el operador de energía.

Agradecemos su atención y comprensión.

Atentamente,



JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ
Representante Legal
CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA

INFORME DE FOTOS PARA CORRECIONES RETIE Y RETILAP

1. NO SE EVIDENCIA DIAGRAMA UNIFILTAR EN TABLERO, NI NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN DE TABLERO, NI IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y CÓDIGO DE COLORES NO CORRESPONDE CON EL NIVEL DE TENSIÓN

   TENSIÓN GABINETE DE MEDIDA EL DIAGRAMA UNIFILAR ENVIADO NO ES LEGIBLE (FAVOR ENVIARME LA FOTO COMO FOTOGRAFÍA Y QUE SEA LEGIBLE EL DIAGRAMA UNIFILAR)


GABINETE DE MEDIDA EL DIAGRAMA UNIFILAR ENVIADO NO ES LEGIBLE (FAVOR ENVIARME LA FOTO COMO FOTOGRAFÍA Y QUE SEA LEGIBLE EL DIAGRAMA UNIFILAR) DEBIDO A QUE ALGUNOS CONDUCTORES SON EN ALUMINIO la norma dice “Sobre el cuerpo del dispositivo o equipo para uso directo con conductores de aluminio, se debe fijar un rotulado de advertencia en fondo de color amarillo y letra negra, en el cual se informe al usuario que el reemplazo de dicho dispositivo o equipo debe hacerse con uno apto para conexión de aluminio. El código de colores no corresponde según el nivel de tensión.  En la protección del lado izquierdo se ve salir azul-amarillo y es al contrario la protección monofásica se ve salir azul, debería ser amarillo.	 

Las protecciones no son legibles para ver la protección y el calibre de los conductores se requiere otra fotografía que sea legible el amperaje de las protecciones pero por lo que se logra identificar (PUEDE QUE ESTE ERRADO) PROTECCIÓN IZQUIERDA CALIBRE #8 EN COBRE CON PROTECCIÓN 50A(PROTECCIÓN SOBREDIMENSIONADA) PROTECCIÓN MEDIO CALIBRE #8 EN ALUMINIO CON PROTECCIÓN 50A(PROTECCIPON SOBREDIMENSIONADA) PROTECCIÓN DERECHA TOTALMENTE NO LEGIBLE LAS PROTECCIONES NO ESTÁN IDENTIFICADAS	 

TABLERO CAFETERIA (TABLERO 1)

El código de colores está incorrecto el código de colores debe ser amarillo desde el gabinete principal e igual en este.

No se proyecta en fase amarilla debido a la sobrecarga que por si ya tiene.

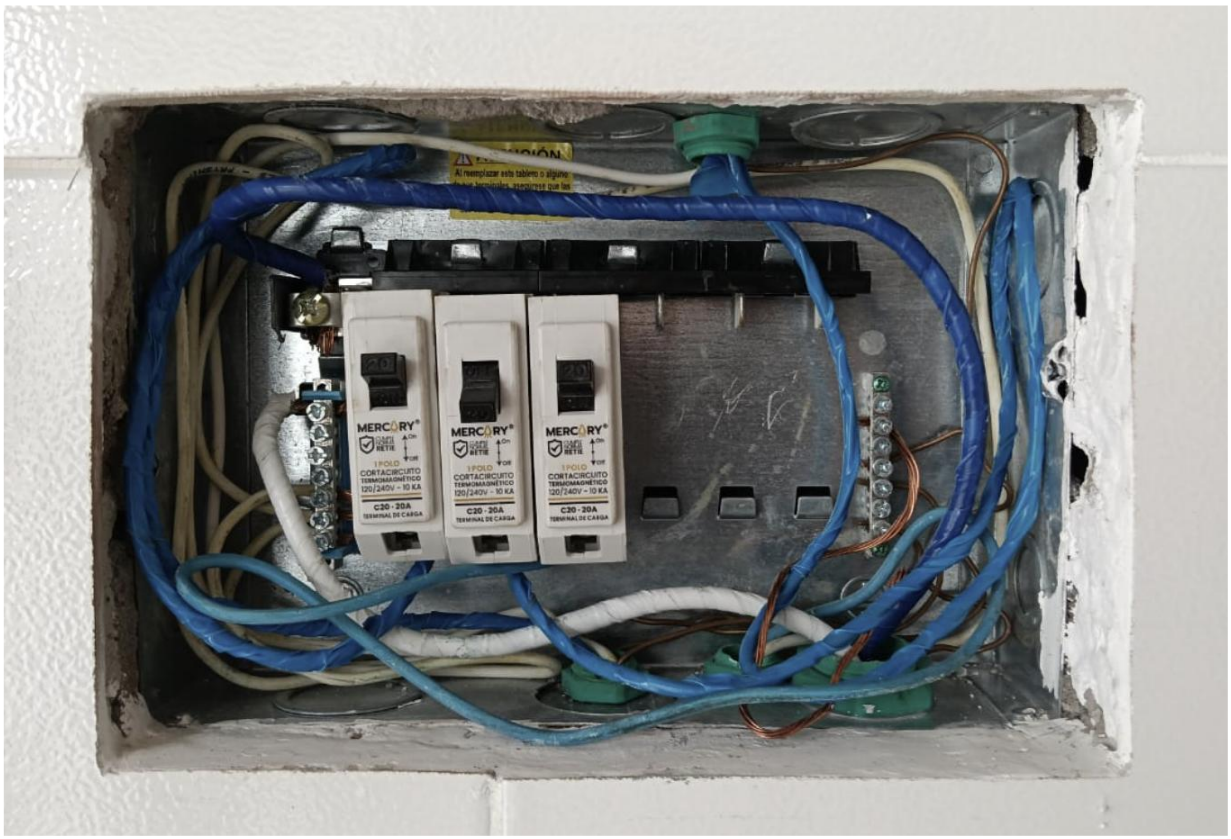








TABLERO SALA DE JUNTAS

Diagrama unifilar no es legible, y aunque no sea legible se alcanza a evidenciar que tiene 5 protecciones y en el unifilar lo que se alcanza a ver es que solo hay 2

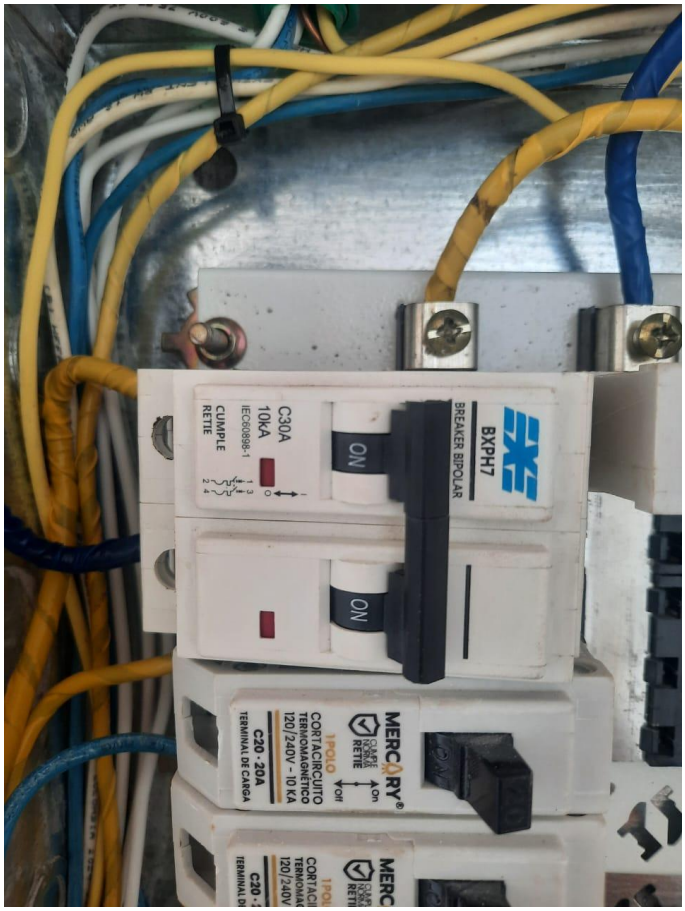

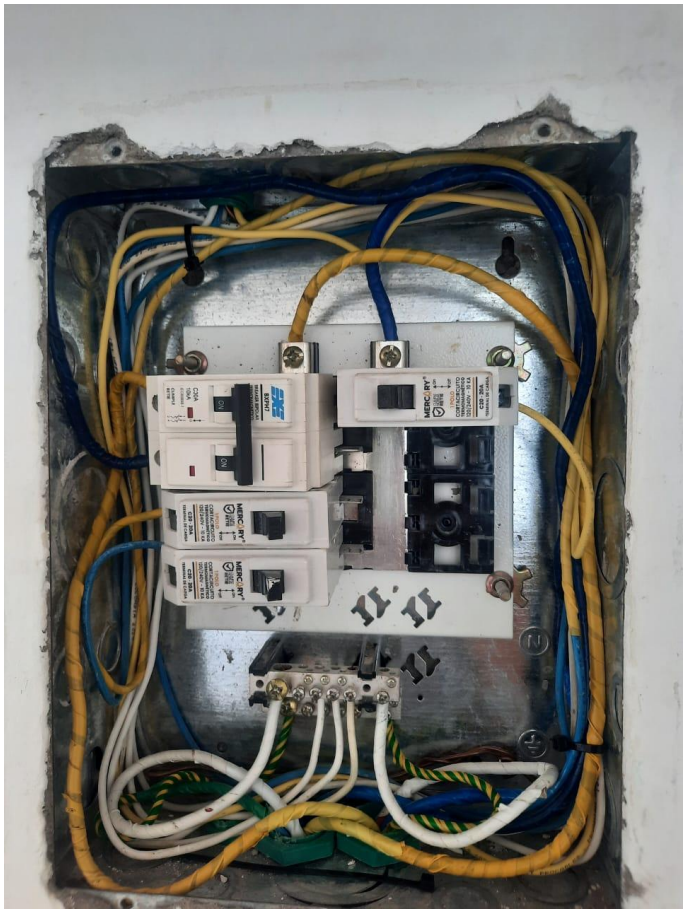


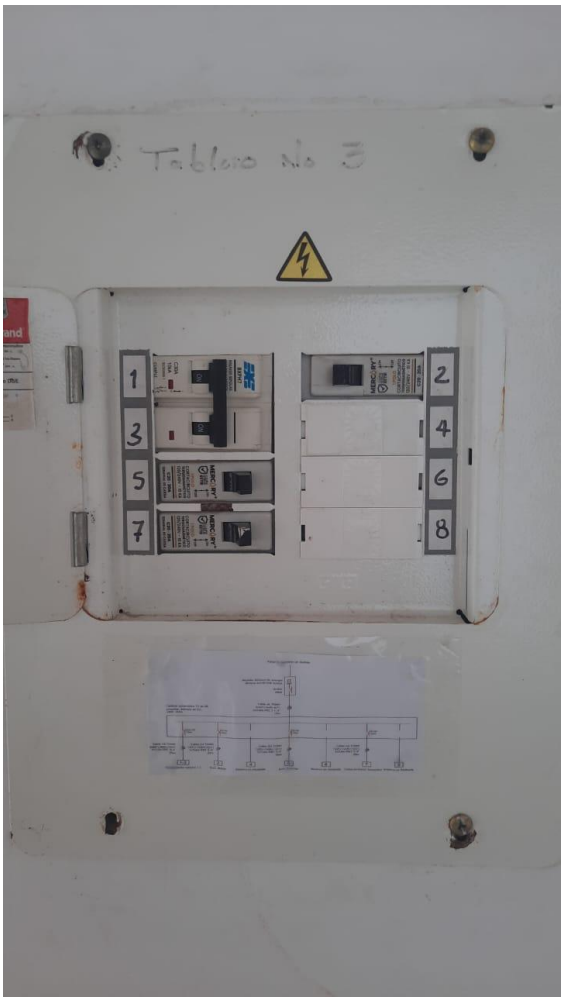



TABLERO AUDITORIO (TABLERO 3)

Aunque no se logra evidenciar el diagrama unifilar porque no es legible se evidencia que este tiene 4 protecciones y en sitio hay 5 protecciones

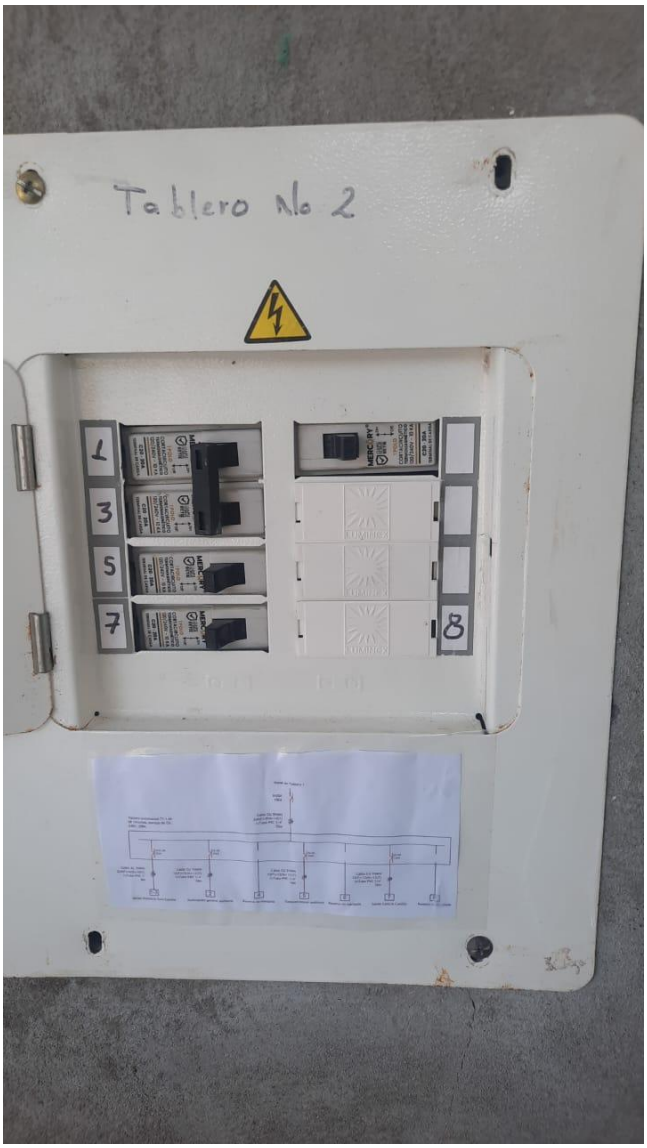





CONTROL TABLERO LUCES CANCHA (Tablero3)

NO SE ENVIÓ DIAGRAMA UNIFILAR, NI FOTOS POR DENTRO, NI MARCACIÓN DEL TABLERO, NI IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS


220 V
PRECAUCION
ENCENDIDO
ADVERTENCIA
RETIE

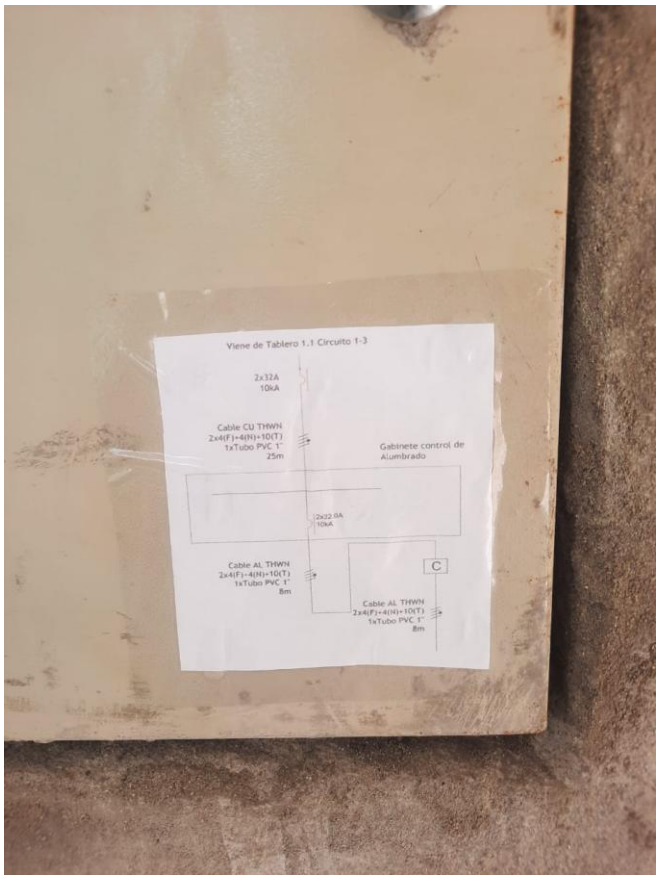
Viene de Tablero 1.1 Circuito 1-3
2x32A
10kA
Cable CU THWN
2x4(F)+4(N)+10(T)
1xTubo PVC 1"
25m
Gabinete control de
Alumbrado
2x22.6A
10kA
Cable AL THWN
2x4(F)+4(N)+10(T)
1xTubo PVC 1"
8m
C
Cable AL THWN
2x4(F)+4(N)+10(T)
1xTubo PVC 1"
8m

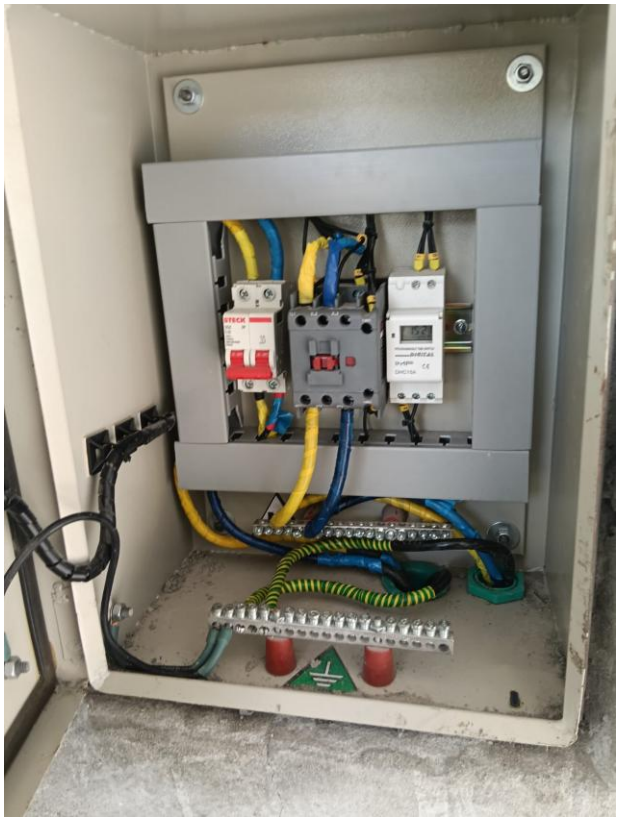

SE EVIDENCIA TOMA EN LAVAPLATOS QUE NO CUENTA CON 15 CENTÍMETROS LOSCONDUCTORES, Y CAJAS NO ESTÁN ATERRIZADAS (ADEMÁS CUENTAN CON SUCIEDAD)







LAS MEDICIONES SON TOMADAS CON EL METRO QUE NO ES , ADEMÁS SOLO SEEVIDENCIA UNA CAJA , Y NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS














NO SE EVIDENCIA FOTOGRAFÍA DE LA TAPA DE LA CAJA DE INSPECCIÓN DE LA TIERRA, ESTA SE DEBE MEDIR QUE DE MÍNIMO 30X30 CMS CON EL METRO MENCIONADO ARRIBA, TAMBIÉN UNA ALTURA DE 15CMS DE LA SUPERFICIE A LA PUNTA DE LAVARILLA, NO SE NOTA LA FORMA DE SOLDADURA O CONECTOR DE LA TIERRA Y ELCONDUCTOR






OTRAS FOTOS

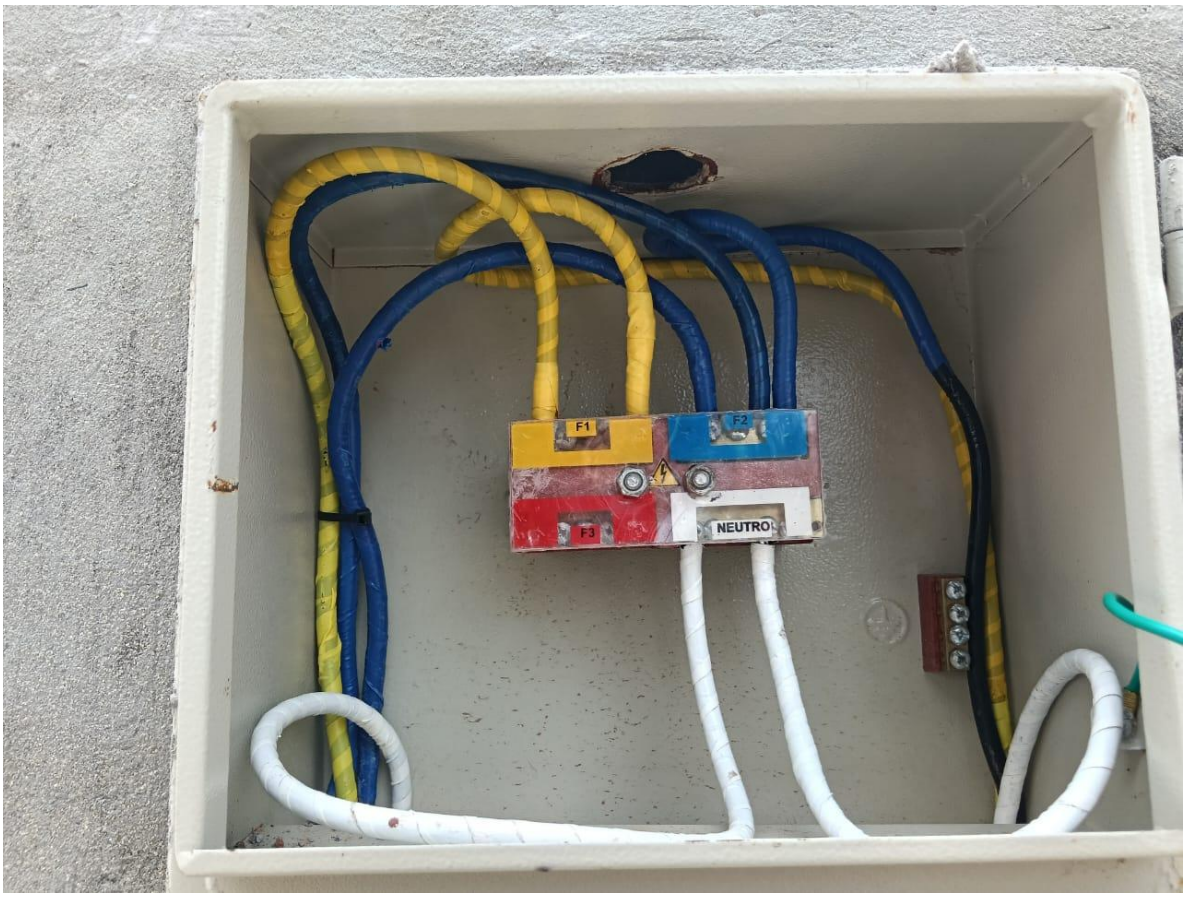







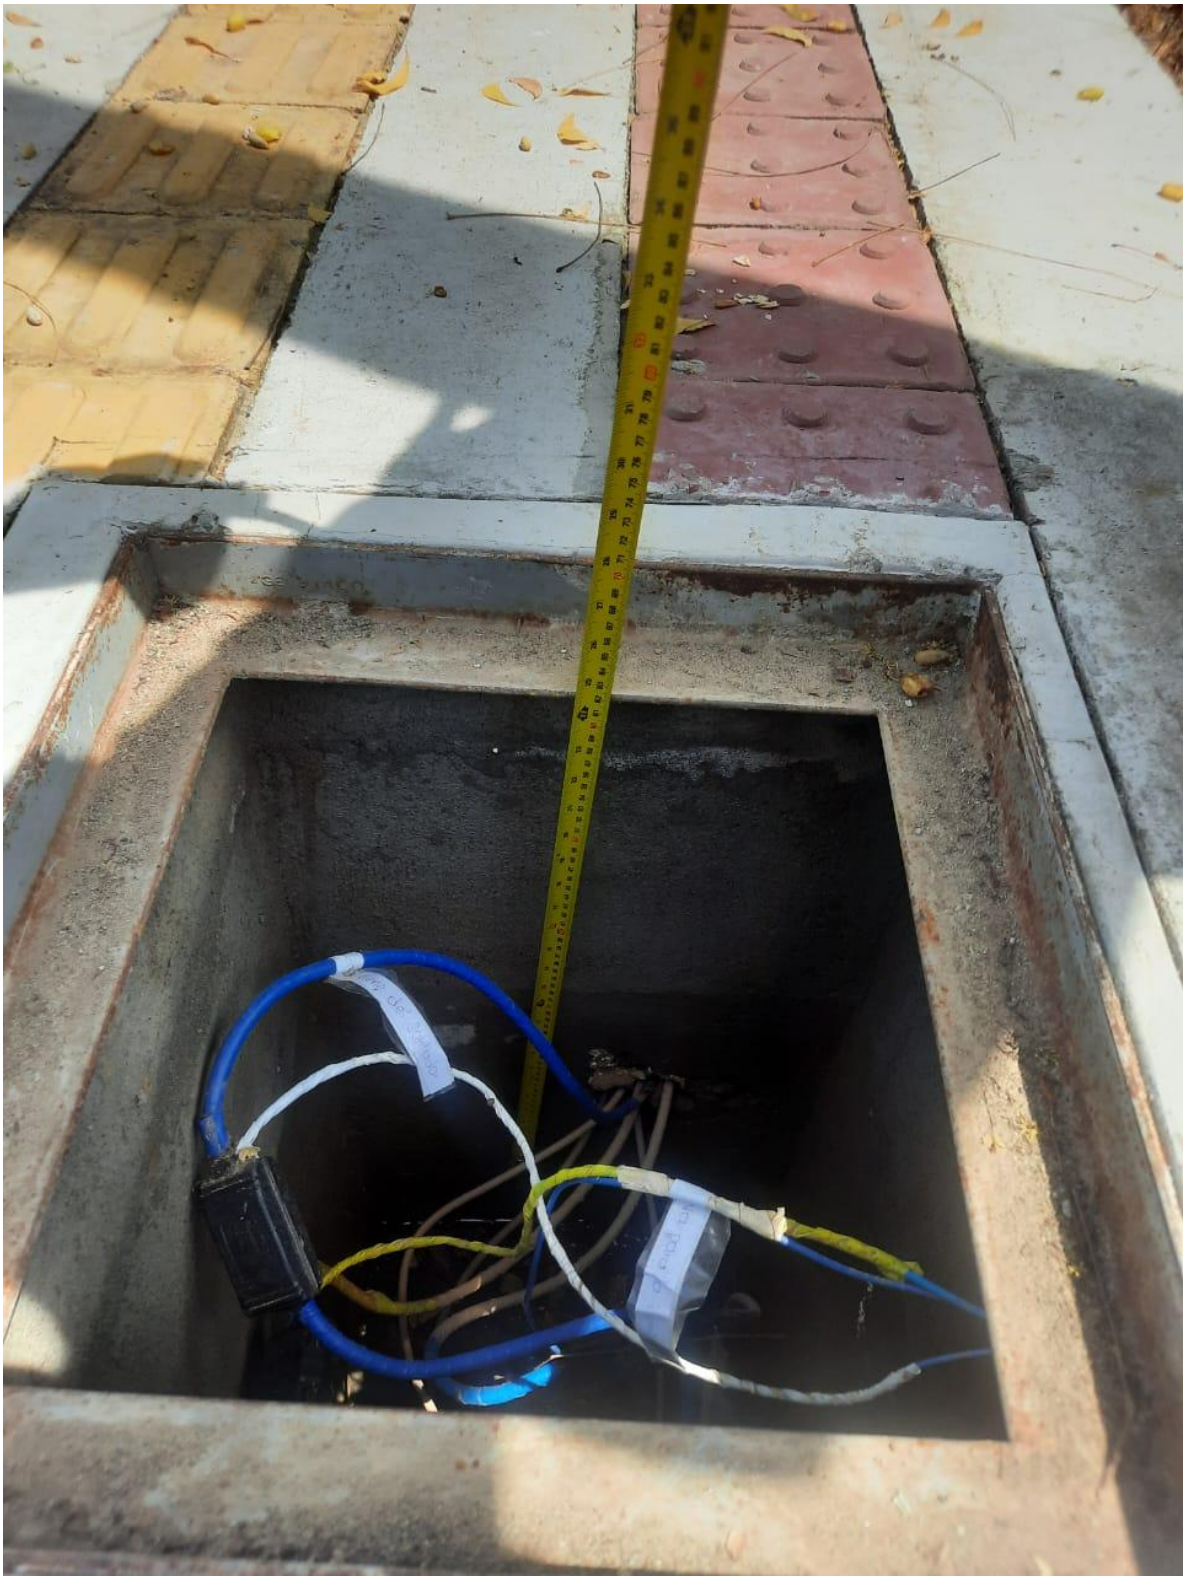




Bucaramanga, 18 de mayo de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ODIR CERTIFICACIONES S.A.S hace constar por solicitud del interesado CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA identificado con Nit, 9015733081, se inició visita para certificación RETIE Y RETILAP el día 11/02/2025, por lo tanto se encuentra en proceso y en espera de cierre de las NC para emisión de dictamen ,proyecto ODIR-008376 SACUDETE AL PARQUE AMBALEMA TOLIMA Ubicado en Calle 11 # 4 – 05 Ambalema, Tolima.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 18 días del mes de mayo del año 2025.

Atentamente:



Ing. Nolber Peñaranda Vargas
Director Técnico
ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.
NIT: 901.124.247-3

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
30-05-2025	ABONO INTERESES GANADOS	31-05-2025		94.00

PERIODO: Desde 01-05-2025 **Hasta** 31-05-2025

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
9,373,967.64	.00	94.00

Saldo promedio del mes 9,373,967.64

Nuevo Saldo 9,374,061.64

OFICINA	FECHA CORTE
AGENCIA MARIQUITA	31-05-2025

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0876	90	0200070194	1

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-05-2025	SIN MOVMNTOS PERIOD2025-05-012025-05-31	01-05-2025		

PERIODO: Desde 01-05-2025 **Hasta** 31-05-2025

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Saldo promedio del mes .00

Nuevo Saldo
.00

OFICINA	FECHA CORTE
AGENCIA MARIQUITA	31-05-2025

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0876	94	0200001295	1

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente		Cuenta	500-806-07772-6	Página N°	001 de 001
Nombre:	SACUDETE AL PARQUE-MUNICIPIO DE AMBALEMA	Oficina:	IBAGUE		Ofi: 550
Dirección:	CL 9 NO 2 52 CTRO	Fecha de Corte			
Ciudad:	IBAGUE	Desde	2025/05/01	Hasta	2025/05/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2117	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	1,068 39	78,191,309 53
05 02	2233	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	1,068 41	78,192,377 94
05 03	2235	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	1,068 42	78,193,446 36
05 04	2236	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	1,068 44	78,194,514 80
05 05	2113	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	1,068 45	78,195,583 25
05 06	2128	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	1,068 46	78,196,651 71
05 07	2115	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	1,068 48	78,197,720 19
05 08	2113	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 51	78,198,468 70
05 09	2123	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 52	78,199,217 22
05 10	2125	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 52	78,199,965 74
05 11	2126	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 53	78,200,714 27
05 12	2115	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 54	78,201,462 81
05 13	2115	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 54	78,202,211 35
05 14	2112	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 55	78,202,959 90
05 15	2111	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 56	78,203,708 46
05 16	2113	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 57	78,204,457 03
05 17	2114	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 57	78,205,205 60
05 18	2116	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 58	78,205,954 18
05 19	2113	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 59	78,206,702 77
05 20	2113	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 59	78,207,451 36
05 21	2111	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 60	78,208,199 96
05 22	2119	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 61	78,208,948 57
05 23	2116	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 62	78,209,697 19
05 24	2117	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 62	78,210,445 81
05 25	2118	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 63	78,211,194 44
05 26	2113	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 64	78,211,943 08
05 27	2113	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 64	78,212,691 72
05 28	2135	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 65	78,213,440 37
05 29	2130	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 66	78,214,189 03
05 30	2116	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 67	78,214,937 70
05 31	2117	IBAGUE	N/C.INTERESES	550P563COP 00002	0 00	748 67	78,215,686 37

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
78,190,241 14	0 00	25,445 23	78,202,974 52	0 00	78,215,686 37

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S A S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@ bancopopular.com .co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 -83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www .defensorialg .com .co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Outlook

Re: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA APERURADA DEL CV 1988 DE 2021, AMBALEMA, TOLIMA.

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Vie 18/07/2025 6:13 PM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (375 KB)
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA SACUDETE.pdf;

Buenas tardes envió la certificación de cuenta bancaria del SACUDETE

EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

El vie, 18 jul 2025 a las 14:28, Juan Sebastian Duque Sepulveda (<juan.duque@mininterior.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Conforme a lo refereniado en el asunto, solicitamos de manera atenta emitir la certificación bancaria actualizada, de la entidad bancaria autorizada para la recepción de los recursos FONSECON, esto para reanudar el tramite del tercer desembolso, el cual ya cuenta con resolución de pago susrita por la ordenadora del gasto del Ministerio del Interior. Agradecemos atender esta solicitud con celeridad y quedamos atentos.
>
> Cordialmente,



Interior

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

banco popular

OFICINA SUCURSAL IBAGUE

CERTIFICA QUE:

La Cuenta de Ahorros N°**500-806-07772-6** denominada **SACUDETE AL PARQUE-MUNICIPIO DE AMBALEMA,** identificado con el **Nit. 800.100.048-4,** con fecha de apertura el **2024/08/12,** la cual se encuentra en estado **ACTIVA.**

El banco popular no asume ninguna responsabilidad por uso indebido que se dé a este documento que se expide únicamente a título informativo con destino al **INTERESADO,** por solicitud del titular.

Se expide en Ibagué a los 18 días del mes de Julio de 2.025

Diana María Cuéllar Suárez
Asistente Administrativa
Oficina Ibagué -550
Banco popular

DIANA MARIA CUELLAR SUAREZ
Asistente Administrativo

MONICA D.

Powered by CamScanner

Outlook

RE: DESEMBOLSO cv 1988-21 AMBALEMA, TOLIMA VIGENCIA EXPIRADA $820.000.000 M/L

Desde Cesar Javier Camargo Bustos <cjavier.camargo@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 22/07/2025 11:56 AM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Gracias Juan Sebastian, documentación recibida

De: Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Enviado: martes, 22 de julio de 2025 11:18 a. m.
Para: Cesar Javier Camargo Bustos <cjavier.camargo@mininterior.gov.co>
Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>
Asunto: DESEMBOLSO cv 1988-21 AMBALEMA, TOLIMA VIGENCIA EXPIRADA $820.000.000 M/L

Buenos días Cesar,

Te remito lo remito lo referenciado para tu gestión y tramite, se adjunta:

- Certificación bancaria actualizada (pagina 5 en el pdf de anexos)
- Memorando a contractual, con el cual fue radicado el año pasado.
- Memorando a financiera, con el fue radicado el año pasado.

Agradecemos la gestión y quedamos atentos a cualquier solicitud extra.

Cordialmente,

Interior

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

Outlook

Accepted: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CV 1988-21 AMBALEMA, TOLIMA. @ mar 29 de jul de 2025 8am - 8:30am (COT) (juan.duque@mininterior.gov.co)

Organizer	Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 2 semanas (Mar 29/07/2025, 'de' 8:00 AM a 8:30 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aceptada
Asistentes necesarios	Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima, Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima, Contactenos Secretaria de Gobierno - Ambalema, Andres Mauricio Duran Duglas, Angie Vannessa Venegas Serrano, Jenny Paola Lavao Pastrana
Mensaje enviado	Jue 24/07/2025 5:23 PM

1 archivo adjunto (4 KB)

invite.ics;

Planeacion ambalema-tolima.gov.co has accepted this invitation.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 256 610 365 599 9
Código de acceso: ti39Ws6e

Para organizadores: Opciones de la reunión
[https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png]
MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

When

martes 29 de jul de 2025 · 8am – 8:30am (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

juan.duque@mininterior.gov.co - organizer
Planeacion ambalema-tolima.gov.co - creator
viviendayobras viviendayobras
angie.venegas@mininterior.gov.co
jenny.lavao@mininterior.gov.co
Alcaldia Ambalema Tolima
Andres Mauricio Duran Duglas
View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

Outlook

RE: ACTA DE REUNIÓN CV 1988 - 21 AMBALEMA, TOLIMA 29 DE JULIO 2025

Desde Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 30/07/2025 4:56 PM
Para Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>; Contactenos Secretaria de Gobierno - Ambalema <alcaldia@ambalema-tolima.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (690 KB)
ANEXO7. ACTA REUNIÓN 29-07-25 AMBALEMA, TOLIMA 1988-21 Y APROBACIÓN.pdf;

Interior

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

De: Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Enviado: miércoles, 30 de julio de 2025 11:36 a. m.
Para: Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>; Contactenos Secretaria de Gobierno - Ambalema <alcaldia@ambalema-tolima.gov.co>
Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>
Asunto: ACTA DE REUNIÓN CV 1988 - 21 AMBALEMA, TOLIMA 29 DE JULIO 2025

Buenas dias,

Mediante la presente, me permito emitir lo referenciado en el asunto para su conocimiento y fines pertientes en marco del convenio 1988 de 2021, Ambalema, Tolima.

Cordialmente,



ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

ACTA No.	004-1988-21
FECHA	29/07/2025
CIUDAD	BOGOTA, Oficina de Subdirección de proyectos para la seguridad. Mininterior. (virtual)
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1988 DE 2021, AMBALEMA, TOLIMA
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA"*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	89%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO AL CONVENIO.

PARTES

Ministerio del Interior.	**Municipio.**
Nombre: JENNY PAOLA LAVAO Cargo: SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR.	Nombre: EDNNA RAMÍREZ Cargo: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Nombre: JUAN SEBASTIÁN DUQUE Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Nombre: CATALINA CARDENAS Cargo: APOYO SUPERVISION MUNICIPIO
Nombre: ANGIE VANNESSA VENEGAS Cargo: APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN.	
Contratista De Obra.	**Interventoría.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00: am del 29 de julio de 2025, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 1988 de 2021, que tiene como objeto realizar un proyecto Sacúdete al Parque tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima, así mismo atendiendo el Numeral.

> *"**30)** Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes"*

Por lo tanto, se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
   2.1 Actualización procesos RETIE/RETILAP.
   2.2 Notificación de la reanudación del proceso del tercer desembolso.
   2.3 Cambio a la supervisión municipal a partir del 31 de julio de 2025
3. Compromisos
4. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. **Presentación de los asistentes**

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio y Ministerio del Interior. Se registra en la parte superior de esta acta.

2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento.

2.1 Actualización procesos RETIE/RETILAP.

Conforme a la última comunicación del 05 de junio de 2025, se solicitó allegar la información en cuanto a la trazabilidad de los procesos RETIE/RETILAP, por lo tanto, se solicita una actualización de los que se adelantado:

El 6 de junio de 2025, se reiteró mediante oficio al contratista una actualización de los procesos. El 18 de junio de 2025 el contratista de obra y de interventoría emitieron un comunicado en donde anexaron el cronograma de actividades de la certificación, la cual se indica que esta en un proceso de revisión final.

A la fecha no se ha tenido actualizaciones de esto, por lo tanto, se solicita al municipio instar al contratista y conocer el estado actual de el proceso.

Se sugiere al municipio, advertir al contratista mediante una notificación de presunto incumpliendo, que la omisión de información acarrea procesos sancionatorios por el incumpliendo de contrato, dispuesto a las leyes 1150 y 1470.

2.2 Notificación de la reanudación del proceso del tercer desembolso.

El 21 de julio de 2025, se tramitó la actualización de la certificación bancaria del municipio, la cual se solicitó el pasado 18 de julio de 2025 al municipio mediante correo electrónico. Una vez adquirido la actualización, se procedió con la remisión del archivo documental del desembolso al grupo financiero de la subdirección de proyectos, esto por directriz de la secretaría general del Ministerio, pues ya se cuentan con las resoluciones de pagos suscritas por la ordenadora del gasto para continuar con el proceso. A la fecha se cuenta con CDP, resolución y se está generando el RP, según informa el grupo financiero. Se realizará seguimiento al proceso y se informará las novedades transcurridas de esto.

2.3 Cambio a la supervisión municipal a partir del 31 de julio de 2025.

Conforme a las comunicaciones efectuadas con el municipio, se conoció el cambio de personal técnico que esta cursando el ente territorial, por lo tanto, el próximo 31 de julio de 2025, entrará a ocupar el rol de secretaría de planeación una nueva profesional. Dado esto, se solicita la actualización de la designación del supervisor del convenio, o que se informe si el representante legal del municipio seguirá ejerciendo este rol dentro del desarrollo del convenio.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	**COMUNICACIONES AL CONTRATISTA CERTIFICACIONES RETIE RETILAP**	**31 DE JULIO 2025**

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI4NmMyYzAtZjZhYS00ZDI1LWIyYjMtOWQwYjQxZGUxNjdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%22441bdcd0-92a3-4a59-8a11-64be36c1de13%22%7d

Interior

ID	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO O ROL EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO.	CORREO ELÉCTRONICO	¿APRUEBA LO TERMINOS PACTADOS EN EL ACTA DE REUNIÓN?
1	JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPULVEDA	1094928096	MININTERIOR	APOYO TECNICO	JUAN.DUQUE@MININTERIOR.GOV.CO	SI
2	Jenny Paola Lavao Pastrana	1018470931	Mininterior	Supervisora	Jenny.lavao@mininterior.gov.co	SI
3	Ednna Rocío Ramírez Ramírez	1110497656	Alcaldía de ambalema	Secretaria de planeación e infraestructura y tics	planeacion@ambalema-tolima.gov.co	SI
4	Brenda Catalina Cardenas Ramirez	1005848360	Alcaldia de Ambalema	Apoyo de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS Ambalema Tolima	catalina.ingcivil@gmail.com	SI
5	Angie Vannessa Venegas Serrano	1010191030	Ministerio del Interior	Contratista	angie.venegas@mininterior.gov.co	SI

Outlook

Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Jue 31/07/2025 5:33 PM
Para Residente de Obra 1 JR FONSECA ING <residente1.jrfonsecaing@gmail.com>; Johan Oñate <johanjaviero@gmail.com>
CC Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022.pdf;

Ambalema Tolima; julio 30 del 2025 SPIT No. 74

Señores
CONSORCIO SACÚDETE AMBALEMA
R.L. José Rubén Fonseca López

Asunto: Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022

Cordial saludo:

En atención al **Contrato de Obra Pública No. 083 de 2022**, cuyo objeto es *"Realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto Sacúdete al Parque ubicado en el municipio de Ambalema, Tolima"*, y **dando cumplimiento al compromiso adquirido durante la reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior realizada el día 29 de julio de 2025**, me permito solicitar al contratista información actualizada a la fecha sobre el estado de las gestiones adelantadas para la obtención de los certificados **RETIE y RETILAP**, así como sobre el cumplimiento de las observaciones técnicas previamente identificadas en el informe de revisión de la instalación eléctrica.

Cabe señalar que, conforme a las comunicaciones previas del **5 y 6 de junio de 2025**, se reiteró la solicitud de información sobre la trazabilidad de dichos procesos. El día **18 de junio de 2025**, el contratista y la interventoría remitieron un cronograma de actividades en el que se informaba que el proceso de certificación se encontraba en revisión final. **A la fecha, no se han recibido actualizaciones adicionales**.

De manera específica, se requiere:

1. Confirmar si ya se encuentran **subsanadas las observaciones técnicas formuladas** en el informe correspondiente, relacionadas con deficiencias en la instalación eléctrica, rotulación, protecciones, sistemas de puesta a tierra y demás aspectos señalados por la interventoría.
2. Entrega de **soportes técnicos y fotográficos legibles**, que evidencien la corrección de cada uno de los puntos observados.
3. Informe detallado sobre el **estado actual del trámite de certificación RETIE y RETILAP**, indicando si ya fueron obtenidas, o en su defecto, en qué fase se encuentra el proceso ante los respectivos organismos certificadores.

Finalmente, se recuerda que la **omisión en la entrega de esta información puede constituir un presunto incumplimiento contractual**, conforme a lo dispuesto en las Leyes **1150 de 2007** y **1474 de 2011**, lo cual podría dar lugar a actuaciones administrativas y contractuales por parte de la entidad contratante.

Agradeciendo su atención y compromiso con el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos para el correcto funcionamiento del proyecto, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JlWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

Ambalema Tolima; julio 30 del 2025 SPIT No. 74

Señores
CONSORCIO SACÚDETE AMBALEMA
R.L. José Rubén Fonseca López

Asunto: Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022

Cordial saludo:

En atención al **Contrato de Obra Pública No. 083 de 2022**, cuyo objeto es *"Realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto Sacúdete al Parque ubicado en el municipio de Ambalema, Tolima"*, y **dando cumplimiento al compromiso adquirido durante la reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior realizada el día 29 de julio de 2025**, me permito solicitar al contratista información actualizada a la fecha sobre el estado de las gestiones adelantadas para la obtención de los certificados **RETIE y RETILAP**, así como sobre el cumplimiento de las observaciones técnicas previamente identificadas en el informe de revisión de la instalación eléctrica.

Cabe señalar que, conforme a las comunicaciones previas del **5 y 6 de junio de 2025**, se reiteró la solicitud de información sobre la trazabilidad de dichos procesos. El día **18 de junio de 2025**, el contratista y la interventoría remitieron un cronograma de actividades en el que se informaba que el proceso de certificación se encontraba en revisión final. **A la fecha, no se han recibido actualizaciones adicionales**.

De manera específica, se requiere:

1. Confirmar si ya se encuentran **subsanadas las observaciones técnicas formuladas** en el informe correspondiente, relacionadas con deficiencias en la instalación eléctrica, rotulación, protecciones, sistemas de puesta a tierra y demás aspectos señalados por la interventoría.
2. Entrega de **soportes técnicos y fotográficos legibles**, que evidencien la corrección de cada uno de los puntos observados.
3. Informe detallado sobre el **estado actual del trámite de certificación RETIE y RETILAP**, indicando si ya fueron obtenidas, o en su defecto, en qué fase se encuentra el proceso ante los respectivos organismos certificadores.

Proyecto y Elaboro: Ing. Civil Brenda Catalina Cardenas Ramirez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Aprobó y Reviso: Dra. Ednna R. Ramirez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Finalmente, se recuerda que la **omisión en la entrega de esta información puede constituir un presunto incumplimiento contractual**, conforme a lo dispuesto en las Leyes **1150 de 2007** y **1474 de 2011**, lo cual podría dar lugar a actuaciones administrativas y contractuales por parte de la entidad contratante.

Agradeciendo su atención y compromiso con el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos para el correcto funcionamiento del proyecto, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

EDNNA ROCIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura y Tics

Proyecto y Elaboro: Ing. Civil Brenda Catalina Cardenas Ramirez. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Aprobó y Reviso: Dra. Ednna R. Ramírez R. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas
