Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	SEPTIEMBRE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1640 del 23 de junio de 2021

Respetados Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS COLES-MATEGUADUA-SAN LORENZO-**PACORA**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.01 Km.

1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO NO.	CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS– CONTRATO DE OBRA LP-MP-002-2021		
CONTRATISTA:	SICON INGENIERIA SAS	NIT:	900.416.129-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y		

	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO CONVENIO:	18 DE MARZO DE 2021	SRT 13347	SRT
VALOR INICIAL CONVENIO:	$ 490.000.000,00		
VALOR ADICIONES CONVENIO:	$ 50.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 50.000.000,00		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 540.000.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL CONVENIO:	31 de diciembre de 2021		
TOTAL PRÓRROGAS CONVENIO:	1		
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre 2022		
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN CONVENIO:	31 de diciembre 2022		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
020210935				$ 490.000.000,00	$ 0	$ 490.000.000,00
		SGP	2.3.3.05.02.0 03.03.01	$50.000.000,00		$50.000.000,00
TOTAL				$ 540.000.000,00	$0	$ 540.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURAD

			DEL ANTICIPO	**O**
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N. A	N. A	N. A	N. A
Acta de Ajuste ___ No.	N. A	N. A	N. A	N. A

1.4. **AVANCE DEL CONVENIO**

Según el informe de interventoría No. __ de fecha, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 540.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 540.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 540.000.000,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 540.000.000,00	100%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**

...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1660 de 2021		
CONTRATISTA:	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	804.010.528-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 1".		
FECHA DE INICIO:	06/12/2021	No. De Oficio:	SVR 68749 de 06/12/2021
VALOR INICIAL:	$587.372.599,00		
VALOR ADICIONES:	$50.000.000		
ADICIÓN 1:	$50.000.000		
ADICIÓN N:	N.A		
VALOR ACTUAL:	$637.372.599,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 246.795.209,50		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 246.795.209,50		

SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2021
TOTAL PRÓRROGAS:	7 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	31 de mayo de 2022
PRÓRROGA 2:	31 de julio de 2022
PRÓRROGA 3:	31 de Agosto de 2022
PRÓRROGA 4:	15 de Octubre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de Octubre de 2022

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
898221	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 563.875.715,84	$ 574.422.230,83	$ 0,00
898221	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 23.496.883,16	$ 0	$ 12.950.368,17
1036822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 0	$40.000.000,00
1036822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 0	$2.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 12.995.218	$ 2.469.091,42	$ 0	$ 15.464.309,42
Acta Mensual de Costos No. 3	$39.483.876,00	$7.501.936,44	$23.492.906,22	$46.985.812,44
Acta Mensual de Costos No. 4	$77.415.440,00	$14.708.933,60	$46.062.186,80	$92.124.373,60
Acta Mensual de Costos No. 5	$65.445.326,00	$12.434.611,94	$38.939.968,97	$77.879.937,94

Acta Mensual de Costos No. 6	$63.221.757,00	$12.012.133,83	$37.616.945,42	$75.233.890,83
Acta Mensual de Costos No. 7	$63.361.410,00	$12.038.667,90	$56.550.058,43	$75.400.077,90
Acta Mensual de Costos No. 8	$58.906.210,00	$11.192.179,90	$44.133.143,67	$70.098.389,90
Acta Mensual de Costos No. 9	$55.283.538,00	$10.503.872,22	$0,00	$65.787.410,22
Acta Mensual de Costos No. 10	$46.594.982,00	$8.853.046,58	$0,00	$55.448.028,58

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 10 De fecha 30 de septiembre de 2022 para el período SEP-2022 el contrato reporta un avance de 90.12% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE

Total, inversión programada: $ 574.422.230,83 (90.12%)
Total, inversión ejecutada: $ 574.422.230,83 (90.12%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en

COMITÉ	COMITÉ		trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2021	17	Prorroga No 1	Aprobada
10/05/2022	27	Prorroga No 2	Aprobada
10/06/2022	29	Prorroga No 3	Aprobada
24/08/2022	32	Prorroga No 4	Aprobada

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$58.737.259,90	96-44-101166309 Anexo 9	06-12-2021	01-12-2022
Buen Manejo Anticipo	$246.795.209,50	96-44-101166309 Anexo 9	06-12-2021	01-12-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$117.474519,80	96-44-101166309 Anexo 9	06-12-2021	31-05-2025
Calidad del Servicio	176.211779,70	96-44-101166309 Anexo 9	11-02-2022	11-02-2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...


3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Actividades de Obra acumuladas al mes de septiembre de 2022:

El contrato de obra tiene un avance ejecutado en el mes de septiembre del 90% con respecto a un 100% programado, termino el contrato en total se ejecutaron:

Placa huella 404 ml
Mantenimiento periódico 932 ml

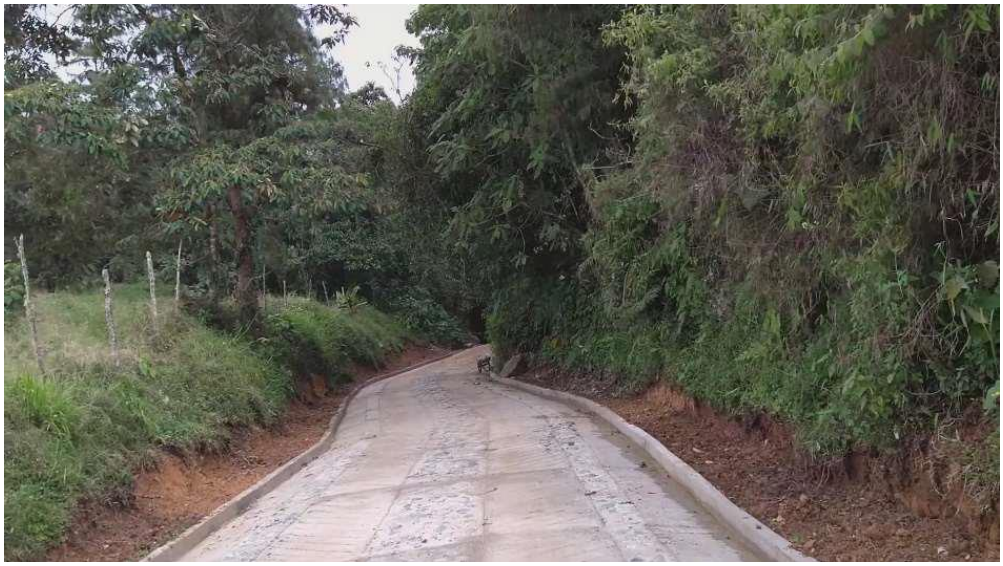

Placa huella terminada



Mantenimiento periódico realizado

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del convenio 2039-2020. 28 de septiembre del 2022

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
T.P 0708-0906 CPITV
SUPERVISORA DEL CONVENIO
