Ingeniero
**JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO. |
| **Periodo:** | FEBRERO 2022 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 1640 del 23 de junio de 2021 |

Respetados Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** LAS COLES-MATEGUADUA-SAN LORENZO-PACORA

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 14.01 Km.

# 1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO NO.** | CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS– CONTRATO DE OBRA LP-MP-002-2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | SICON INGENIERIA SAS | NIT: | 900.416.129-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO CONVENIO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” | | |
| **OBJETO CONTRATO:** | REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | | |
| **FECHA DE INICIO CONVENIO:** | 18 DE MARZO DE 2021 | SRT 13347 | SRT |
| **VALOR INICIAL CONVENIO:** | $ 490.000.000,00 | | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 519.377.996,00 | | |
| **VALOR ADICIONES CONVENIO:** | $ 50.000.000 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 50.000.000,00 | | |
| **ADICIÓN 2:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 540.000.000 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL CONVENIO:** | 31 de diciembre de 2021 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS CONVENIO:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 31 de diciembre 2022 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN CONVENIO:** | 31 de diciembre 2022 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020210935 | | | | $ 490.000.000,00 | $ 0 | $ 490.000.000,00 |
| | | SGP | 2.3.3.05.02.003.03.01 | $50.000.000,00 | | $50.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 540.000.000,00 | $0 | $ 540.000.000,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N. A | N. A | N. A | N. A |

1.4. **AVANCE DEL CONVENIO**

Según el informe de interventoría No. __ de fecha, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 540.000.000,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 540.000.000,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 540.000.000,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | N/A |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 540.000.000,00 | 100% |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | N/A |
| **Amortizado** | N/A |
| **Saldo** | N/A |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** __/__/_____

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1660 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S | NIT: | 804.010.528-6 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S | | |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 1". | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 06/12/2021 | No. De Oficio: | SVR 68749 de 06/12/2021 |
| **VALOR INICIAL:** | $587.372.599,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N.A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N.A | | |
| **ADICIÓN N:** | N.A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $587.372.599,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 246.795.209,50 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 23.492.906,22 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 223.302.303,2 |
| **PLAZO INICIAL:** | 31 de diciembre del 2021 |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 |
| **PRÓRROGA 1:** | 31 de mayo de 2022 |
| **PRÓRROGA 2:** | N.A |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | N.A |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 898221 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 563.875.715,84 | $ 46.985.812,44 | $ 501.425.593,98 |
| 898221 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 23.496.883,16 | $ 0 | $ 23.496.883,16 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Acta Mensual de Costos No. 2 | $ 12.995.218 | $ 2.469.091,42 | $ 0 | $ 15.464.309,42 |
| Acta Mensual de Costos No. 3 | $39.483.876,00 | $7.501.936,44 | $23.492.906,22 | $46.985.812,44 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 28 de febrero de 2022 para el período FEB-2022 el contrato reporta un avance de26.31% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 69.555.093,02 26.31%
Total, inversión ejecutada: $ 69.555.093,02 26.31%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | 17 | PRORROGA No 1 | Aprobada |
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $58.737.259,90 | 96-44-101166309 Anexo 6 | 06-12-2021 | 01-12-2022 |
| Buen Manejo Anticipo | $246.795.209,50 | 96-44-101166309 Anexo 6 | 06-12-2021 | 01-12-2022 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $117.474519,80 | 96-44-101166309 Anexo 6 | 06-12-2021 | 31-05-2025 |
| Calidad del Servicio | 176.211779,70 | 96-44-101166309 Anexo 6 | 11-02-2022 | 11-02-2025 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** __/__/_____
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

**Actividades de Obra acumuladas al mes de febrero de 2022:**

El contrato de obra tiene orden de inicio a partir del 01 de febrero presentando al mes objeto del presente informe un avance $ 9.369.654,00 del 1,83% frente a un 6,73% de obra programado.


Actividades realizadas

El contratista adelanta la exploración geotécnica de acuerdo con lo requerido por la cartilla del programa "Colombia Rural" (PR2+030, PR3+164, PR5+500 y PR6+958)

Se realiza nivelación de la calzada, y se continúa con el suministro e instalación de la subbase en el Tramo 4. (PR6+930 al PR6+986)




Network time is not synchronized
Local: 23/02/2022, 11:47:51 AM GMT-5

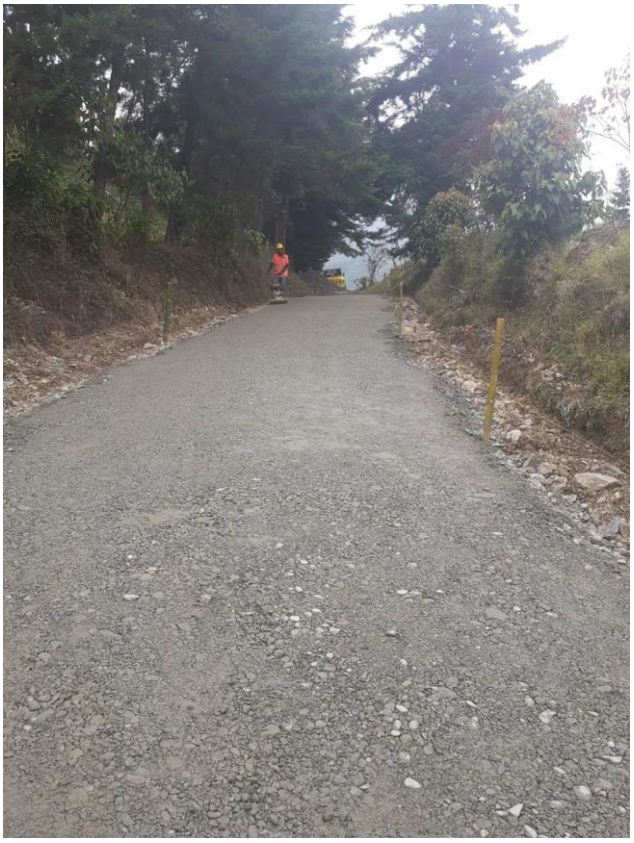

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

**LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO**
**T.P 0708-0906 CPITV**
SUPERVISORA DEL CONVENIO
