Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

# INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL No. 02

# DEL CONTRATISTA

## PERIODO 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2025

## CONTRATO No. IPVO 010 DE 2025

## "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

TIERRASUA
¡Conectamos región!

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios


## 1. INTRODUCCIÓN.

Teniendo en cuenta las actividades contratadas para el **"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "**, a continuación, se presenta informe de ejecución mensual No. 02 de las actividades ejecutadas con el fin de poner en su conocimiento las mismas.

### 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO

#### 1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto para la dotación de la nueva plaza de mercado se desarrolla en el casco urbano entre las carreras 20 y 20a Municipio de Paipa con calle 28.

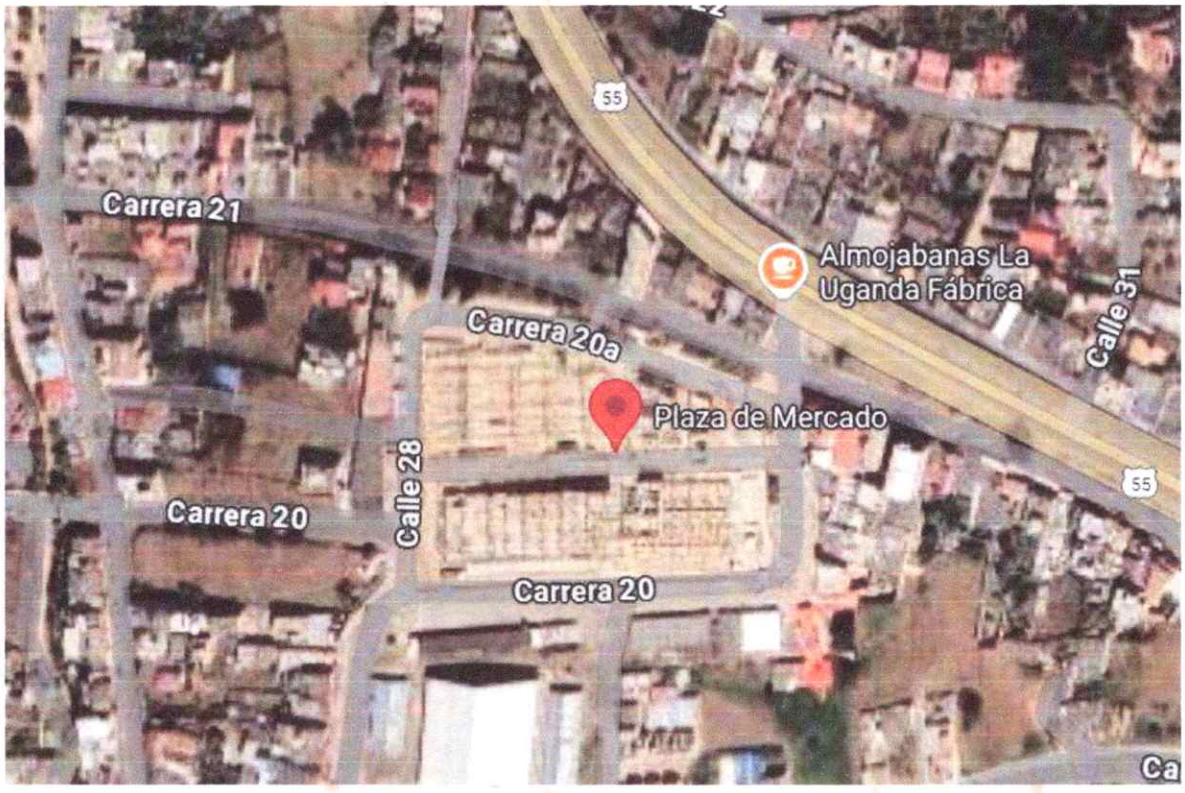

La intervención que se realiza corresponde a un contrato de suministro para la dotación de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paipa – Boyacá, con espacios adecuados y dotados para la exhibición y comercialización de productos agrícolas, pecuarios, gastronómicos, de artesanías, entre otros.

Con la ejecución de este proyecto se dotará la nueva plaza de mercado con mobiliario adecuado para que esta cumpla con normas sanitarias y ambientales para la comercialización de productos en condiciones adecuadas, mejorar la comercialización y abastecimiento alimentario formal y organizadamente.

## 1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NO.** | IPVO 010 - 2025 |
| **CONTRATANTE** | TIERRASUA S.A.S. |
| **CONTRATISTA** | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.477.852.194,00) |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 16 DE JUNIO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL** | TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

1.3. **CONTROL ADMINISTRATIVO:** Relación el personal que intervino en la ejecución del contrato y realizo el suministro e instalación de mobiliario.

| PERSONAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BOHORQUEZ CORREAL JUAN FERNANDO | CC 6770634 |
| TORRES CASALLAS LUIS GERARDO | CC 6771244 |
| PITA MATTA WILLIAM VICENTE | CC 7175899 |
| MORENO CARDENAS DANIEL ARMANDO | CC 7176322 |
| SANCHEZ MARIN WILMAR YAIR | CC 7185639 |
| CARABALLO TRESPALACIOS TOMAS ALFONSO | CC 9269039 |
| SANABRIA PAEZ NELLY ROCIO | CC 40044228 |
| CASTELLANOS AMAYA JUAN CAMILO | CC 1049608041 |
| JIMENEZ TORRES JUAN PABLO | CC 1049645401 |
| MARTINEZ GUAYACAN EDUAR MAURICIO | CC 1049656945 |
| CARDENAL ALFONSO EDWIN GUIOVANY | CC 1051568585 |
| COY RUSSI ZAMIR ESAU | CC 1026557583 |
| SILGADO BELEÑO BRAYAN | CC 1052414353 |
| CELY PEDRAZA ANA ZULEIMI | CC 1057579207 |
| CASTRO NEME JAIME | CC 3002697 |
| CORREALES ROJAS JORGE ANDRES | CC 7187441 |
| DIAZ CONCICION RICHARD YAMID | CC 74372076 |
| DIAZ CONCICION GABRIEL DANILO | CC 74376020 |
| DIAZ SEGURA VICTOR LEONARDO | CC 74378336 |
| GUTIERREZ SOLER NELSON ENRIQUE | CC 80881015 |

**1.4. CONTROL LEGAL:** Actas generadas en la ejecución del proyecto, a la fecha se ha suscrito únicamente acta de inicio, el contrato se ha venido ejecutado sin contratiempos e imprevistos que pudiesen generar suspensión o prorrogas a la fecha.

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

| INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. 010 de 2025 | |
|---|---|
| CONTRATISTA | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S |
| NIT | 800.130.904-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL |
| C.C. No. | 6.770.634 de Tunja |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA |
| VALOR | MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($1.477.852.194,00) |
| PLAZO DEL CONTRATO | TRES (03) MESES |
| ACTA DE INICIO | 16 DE JUNIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE SEPTEMBRE DE 2025 |

## 1.5. CONTROL DE GARANTIAS:

Póliza de Cumplimiento Aseguradora Solidaria de Colombia No. 600-47-994000076393

Anexo 0

| GARANTÍAS | VALOR | VIGENCIA | | PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.477.852.194,00 | | | |
| Cumplimiento del contrato | $147.785.219,40 | 12/06/2025 | 15/03/2026 | Diez (10) % del valor total del contrato |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $591.140.877,60 | 12/06/2025 | 15/03/2026 | 100% del valor del anticipo |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | $147.785.219,40 | 12/06/2025 | 15/09/2028 | Diez (10) % del valor total del contrato |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $147.785.219,40 | 12/06/2025 | 15/09/2025 | Diez (10) % del valor total del contrato |

## 1.6. ANEXOS:

**1.6.1.** Contrato firmado por las partes
**1.6.2.** Acta de inicio firmada por las partes
**1.6.3.** Póliza de garantías exigidas
**1.6.4.** Aprobación de pólizas.
**1.6.5.** Correspondencia enviada y recibida a la fecha

## 2. CONTROL TÉCNICO.

Se relaciona avance en la ejecución a la fecha de corte del presente informe.

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | AVANCE ACTA PARCIAL No. 01 | | | AVANCE CUMPLIMIENTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 1.1 | BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 80 cm, Ancho: 55 cm, Largo: 180 cm PESO: 322Kg | UNIDAD | 3,00 | $ 5.850.040,00 | $ 17.550.120,00 | 3,00 | $ 5.850.040,00 | $ 17.550.120,00 | 100% |
| 1.2 | BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 45 cm, Ancho: 50 cm, Largo: 180 cm. PESO: 286 Kg | UNIDAD | 3,00 | $ 5.255.040,00 | $ 15.765.120,00 | 3,00 | $ 5.255.040,00 | $ 15.765.120,00 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | MATERA EN CEMENTO TIPO JARDINERA Fabricada en cemento con medidas generales de 100 cm largo x 30 cm ancho x 30 cm alto. Montada sobre basé en ángulo metálico y rodachinas – 2 rodachinas con freno y 2 sin freno. (Incluye tierra abonada y plantas adultas) Planta ref.: Costilla de Adán (1) - Planta ref.: oreja de elefante (1) - Planta ref.: Diefenbaquia Maculata (1) - Planta ref.: Anturio cristalino (1). Cuatro plantas por matera.- La garantía exigida será aplicable exclusivamente al mueble y su estructura (matera en cemento), entendiendo que la durabilidad y estado de las plantas dependerá directamente del cuidado, riego y mantenimiento | UNIDAD | 8,00 | $ 1.743.350,00 | $ 13.946.800,00 | 8,00 | $ 1.743.350,00 | $ 13.946.800,00 | **100%** |
| 1.4 | Mesa fija tipo picnic: en estructura metálica y tapa en acero inoxidable con sillas fijas capacidad de 4 personas (Incluye parasol desmontable elaborado en material lona de alta resistencia color a definir). | UNIDAD | 8,00 | $ 5.493.040,00 | $ 43.944.320,00 | 8,00 | $ 5.493.040,00 | $ 43.944.320,00 | **100%** |
| 1.5 | Batam - módulo de exhibición desarmable y movible sobre rodachinas: elaborado en tubo HR calibre 16 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m Acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de dos (2) exhibidores laterales y dos (2) exhibidores superiores desmontables por sistema de clip o similar, malla tipo exhibidora "comercial" con marco de tubo galvanizado ¾" color a acabado en pintura electrostática color a elegir medidas: 75 x 100cm acabado pintura electrostática, Dos (2) exhibidores principales uno frontal y otro transversal desmontables por sistema de clip o similar, elaborados en malla tipo exhibidora "comercial" con marco de tubo galvanizado ¾" color a elegir medidas: FRONTAL Y TRANSVERSAL 175 x 68cm acabado pintura electrostática color a elegir. Tapas de módulos laterales en tablero de melamina laminado colores a elegir cantos rígidos sin esquinas. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Travesaños principales para armado elaborados en tubo HR calibre 16 cuatro (5) unidades largo total 180cm acabado color negro en pintura electrostática. (No requiere tornillería para su armado) Incluye maleta fabricada en lona con las dimensiones apropiadas para que el módulo una vez desarmado pueda ser empacado para su fácil almacenamiento sin que quede forzado al momento de cerrar. Sistema de cierre de la maleta puede ser con cremallera o velcro. | UNIDAD | 30,00 | $ 4.123.350,00 | $ 123.700.500,00 | - | $ 4.123.350,00 | $ - | **0%** |
| 1.6 | CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura HR calibre 20, Medidas largo: 3.10 altura: 1.70m con dos apoyos soldados según diseño, elaborados en tubo HR 10x10 calibre 18 para asegurar a antepecho con platina | UNIDAD | 14,00 | $ 2.633.470,00 | $ 36.868.580,00 | 14,00 | $ 2.633.470,00 | $ 36.868.580,00 | **100%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tipo abrazadera 20cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ½#. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a laestructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rigido color negro instalada con tornillo | | | | | | | | |
| 1.7 | CENEFA SUPERIOR -intermedias PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura metálica HR calibre 18, Medidas largo: 2.85 altura: 0.83m con dos platinas superiores para apoyo de 10cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ½#. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rígido color negro instalada con tornillo | UNIDAD | 11,00 | $ 2.557.310,00 | $ 28.130.410,00 | 11,00 | $ 2.557.310,00 | $ 28.130.410,00 | **100%** |
| 1.8 | Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable Las dimensiones de la tolva inferior son 125 cm de largo x 30 cm de altura y 45 cm de fondo aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). El recubrimiento en madera y fórmica se debe hacer en las cuatro caras de la tolva inferior, excluyendo la base de la misma. la madera puede ser RH y los colores de la fórmica se pueden decidir con la supervisión. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1.5" acabado en pintura electrostática color a elegir Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, instaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cmx130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostática colores vivos según diseño. | UNIDAD | 29,00 | $ 4.120.970,00 | $ 119.508.130,00 | 29,00 | $ 4.120.970,00 | $ 119.508.130,00 | **100%** |
| 1.9 | Góndola de sobreponer para frutas y verduras: Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir y 5 ganchos soldados a estructura principal Largo 1.75m x 0.56m altura 1.30m (incluye pata antideslizante en goma o similar) - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. recubierta en sus 5 caras incluyendo la base en madera y fórmica colores a elegir. - Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 170cm x 48cm altura de la tolva 10 cm aprox. | UNIDAD | 44,00 | $ 3.461.710,00 | $ 152.315.240,00 | 44,00 | $ 3.461.710,00 | $ 152.315.240,00 | **100%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Góndola exhibidora para frutas y verduras de locales sin mesón fijo: Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable 304 satinado calibre 20 dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica colores a elegir. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco según diseño. elaborado en madera acabada en fórmica colores a elegir. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir. | UNIDAD | 25,00 | $ 6.130.880,00 | $ 153.272.000,00 | 25,00 | $ 6.130.880,00 | $ 153.272.000,00 | **100%** |
| 1.11 | GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS Y ESPECIAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 25 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 20 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva inferior. Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 15 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva superior. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). | UNIDAD | 2,00 | $ 6.783.000,00 | $ 13.566.000,00 | 2,00 | $ 6.783.000,00 | $ 13.566.000,00 | **100%** |
| 1.12 | MÓDULO EXHIBIDOR PARA VIVERO- Fabricado en estructura metálica tubo cuadrado 4x4 acabado con pintura electrostática color a elegir. Módulo de 2.00 m de frente, 1.50 metros de fondo y altura =1.70m. Estructura según diseño con capacidad para 3 cajones de 1.92 m de largo, 0.70m de fondo altura = 15cm fabricados en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés natural. Tapas y base para espacio de almacenamiento posterior (0.75 x 2.00m – 2 unidades) (0.50 x 2.00m – 2 unidades) y tapa superior 0.30 x 2.00m – 1 unidad | UNIDAD | 1,00 | $ 2.415.700,00 | $ 2.415.700,00 | - | $ 2.415.700,00 | $ - | **0%** |
| 1.13 | Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1'' con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales | UNIDAD | 3,00 | $ 2.707.250,00 | $ 8.121.750,00 | 3,00 | $ 2.707.250,00 | $ 8.121.750,00 | **100%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,8metros de alto, por 1,99 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entrepaños según diseño | | | | | | | | |
| 1.14 | MODULO EN VIDRIO TEMPLADO TIPO ISLA CERRADA. Fabricado en vidrio templado transparente 10mm. Medidas generales: 4.00 m de largo x 2.50m de ancho, altura=2.30m cuatro (4) caras. Incluida Una (1) puerta en vidrio templado 10mm - 1.00mx2.30m. Instalados sobre perfil "eFe", Estructura de soporte con siete tubos verticales en acero inoxidable, brida y tapa-brida para anclaje a piso con chazo expansivo. Conectores tipo moneda en acero inoxidable entre vidrios. | UNIDAD | 1,00 | $ 36.152.200,00 | $ 36.152.200,00 | 1,00 | $ 36.152.200,00 | $ 36.152.200,00 | **100%** |
| 1.15 | MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03 fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido termo fundido. Un (1) módulo en L tipo bodega con dos (2) puertas correderas en madera RH con riel DUCCASI y dos puertas en madera Rh Según diseño. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½'' o 1" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 1,35 metros de alto, por 3,40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. Cada mueble incluye Una pieza elaborada tubo galvanizado de 1.5" calibre 18 - altura desde piso = 1.95m doblado a 90° extiende 1.00m – fijado a pared con abrazaderas metálicas, chazo y tornillo. | UNIDAD | 11,00 | $ 8.675.100,00 | $ 95.426.100,00 | 11,00 | $ 8.675.100,00 | $ 95.426.100,00 | **100%** |
| 1.16 | MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR Y BODEGA 3 MÓDULOS_02 fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Dos (2) módulos tipo bodega cada uno con dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1'' con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales 1,96 metros de ancho, 1,90 metros de alto y 0,60 metros de profundidad. Según Diseño | UNIDAD | 1,00 | $ 8.068.200,00 | $ 8.068.200,00 | 1,00 | $ 8.068.200,00 | $ 8.068.200,00 | **100%** |
| 1.17 | MUEBLE MOSTRADOR EN MELAMINA_01 fabricado en madera Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Vidrio frontal de 5 milímetros, vidrio templado de 8 milímetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.18 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco 5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar y dos (2) puertas correderas de madera Rh con riel DUCCASI. Según Diseño | UNIDAD | 14,00 | $ 2.677.500,00 | $ 37.485.000,00 | 14,00 | $ 2.677.500,00 | $ 37.485.000,00 | **100%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | MUEBLE TIPO VITRINA EXHIBIDORA MUSEO. Un (1) mueble fabricado en tubo cuadrado de 1´´ acabado con pintura electrostática sobre base en tubo rectangular 10x5cm con platinas para fijar a piso con chazo expansivo y entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales 5,44 metros de largo, por 3,52 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Mueble con 4 puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI para la cara posterior y tapa en acrílico transparente para la cara frontal. Según Diseño | UNIDAD | 1,00 | $ 24.276.000,00 | $ 24.276.000,00 | - | $ 24.276.000,00 | $ - | 0% |
| 1.19 | Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1´´ con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 0,8metros de alto, por 2,70 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entrepaños según diseño | UNIDAD | 1,00 | $ 3.558.100,00 | $ 3.558.100,00 | 1,00 | $ 3.558.100,00 | $ 3.558.100,00 | 100% |
| 1.20 | Canastilla tipo panera elaborada en mimbre natural; con medidas de 40 cms largo x 25 cms de ancho y 15 cms de altura. Con forro lavable para almacenamiento de alimentos. | UNIDAD | 120,00 | $ 185.283,00 | $ 22.233.960,00 | 120,00 | $ 185.283,00 | $ 22.233.960,00 | 100% |
| 1.21 | CARRO PARA VENTA TINTOS Y OTROS VARIOS. SEGÚN DISEÑO Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir. Modulo inferior medidas generales 1.50m de largo x 0.70m de fondo, altura 0.82 - un (1) cajón sobre riel estándar 0.47m ancho 0.55m fondo 0.15 altura. dos(2) puertas correderas en madera Rh sobre riel Ducassi y una puerta vatiente en madera Rh con visagras. (incluye cerraduras para cajón - 3 unidades). Todo montado sobre base completa metálica acabado con pintura electrostática - 2 Ruedas de Bicicleta Rin 16' y 2 Rodachines de carga con freno, manija para empujar fabricada en acero inoxidable. Módulo superior fijo medidas generales 1.03m x 0.55 ancho 0.50 de fondo, con 3 entrepaños en madera Rh de 15mm - Según diseño. 2 puertas en vidrio 5mm 0.60 altura 0.25 ancho. vidrio frontal 5mm. Techo entamborado Rh según diseño. Iluminación por lámpara led recargable de fácil monte y desmonte en techo.- El módulo incluye vitrina faborada en acero inoxidable ref. 304 cal 18 medidas: frente 0.45m, fondo 0.45m altura: 0.40m. frente inclinado en vidrio templado 5mm. Dos puertas corredizas elaboradas en acero inoxidable ref. 304 calibre 18. pata antideslizante en goma. | UNIDAD | 3,00 | $ 9.401.000,00 | $ 28.203.000,00 | - | $ 9.401.000,00 | $ - | 0% |
| 1.22 | ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estantería exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15 milímetros con pintura poliuretano referencia a elegir, soporte en tubo cuadrado de 1´´ con pintura electroestática a elegir. Medidas generales 1.10 metros de alto, por 0.85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. Según | UNIDAD | 10,00 | $ 1.594.600,00 | $ 15.946.000,00 | 10,00 | $ 1.594.600,00 | $ 15.946.000,00 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diseño. Instalación a pared con brida, chazo y tornillo. Una (1) ceneta vertical en madera Rh | | | | | | | | |
| 1.23 | MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lámina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir. Medidas generales 1.86 metros de largo, 0.70m de altura y 0.60 metros de profundidad. Tres puertas y tres cajones según diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad. Medidas 38x50 - altura 22.8 cm incluye Grifería para lavaplatos tipo monocontrol vertical en Acero Inoxidable de 37.5 cm de altura 22 cm cuello. Según diseño. Mesón en melamina Rh de 15mm acabado en fórmica F8 | UNIDAD | 5,00 | $ 4.760.000,00 | $ 23.800.000,00 | 5,00 | $ 4.760.000,00 | $ 23.800.000,00 | **100%** |
| 1.24 | MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA_04 fabricado en madera Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de PRIMAVERA O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Vidrio frontal de 5 milímetros, vidrio templado de 8 milímetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco (5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar, dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI, una (1) puerta con bisagra. Según Diseño | UNIDAD | 4,00 | $ 4.224.500,00 | $ 16.898.000,00 | 4,00 | $ 4.224.500,00 | $ 16.898.000,00 | **100%** |
| 1.25 | VITRINA TIPO MOSTRADOR elaborado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1.92 metros de alto, por 1.17 metros de ancho y 0.52 metros de profundidad. 9 entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño | UNIDAD | 6,00 | $ 3.950.800,00 | $ 23.704.800,00 | 6,00 | $ 3.950.800,00 | $ 23.704.800,00 | **100%** |
| 1.26 | Banca para mesa comedor fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés de cinco patas (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en **barniz poliéster mate** para madera, esquinas redondeadas. 180cm largo x 40cm ancho altura= 40 cm, con apoyo central (5 patas). Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad | UNIDAD | 70,00 | $ 1.260.210,00 | $ 88.214.700,00 | - | $ 1.260.210,00 | $ - | **0%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | BARRA - 1 BANCA INTEGRADA (2 izquierdas y 2 derechas) según diseño, fabricado en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés origen controlado y estructura metálica. Madera color natural café Roble acabado en pintura poliéster mate que provee mayor resistencia a la fricción, impactos, luz solar y humedad. Medidas: 5,50m largo total x 30 cm de ancho. DOS ALTURAS - una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra=1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica en tubo cuadrado 4x4 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m. platinas para fijar a piso con chazo expansivo | UNIDAD | 4,00 | $ 9.418.850,00 | $ 37.675.400,00 | - | $ 9.418.850,00 | $ - | 0% |
| 1.28 | BARRA - 2 BANCAS INTEGRADAS según diseño, fabricado en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés origen controlado y estructura metálica. Madera color natural café Roble acabado en pintura poliéster mate que provee mayor resistencia a la fricción, impactos, luz solar y humedad. Medidas: 7,00m largo total x 30 cm de ancho. DOS ALTURAS - una barra y dos bancas integradas al costado derecho e izquierdo. Altura final de la barra=1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica en tubo cuadrado 4x4 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m. Platinas para fijar a piso con chazo expansivo | UNIDAD | 1,00 | $ 10.472.000,00 | $ 10.472.000,00 | - | $ 10.472.000,00 | $ - | 0% |
| 1.29 | Butaca baja tradicional en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa). | UNIDAD | 84,00 | $ 204.561,00 | $ 17.183.124,00 | 84,00 | $ 204.561,00 | $ 17.183.124,00 | 100% |
| 1.30 | Butaco alto para barra con espaldar. Fabricado en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 74 cm, sin tapizar. Apoya pies en tubo de acero cold rolled pintura electroestática negro. Medidas generales 99cm x 48,8cm x 50cms. | UNIDAD | 30,00 | $ 730.660,00 | $ 21.919.800,00 | - | $ 730.660,00 | $ - | 0% |
| 1.31 | Butaco bajo para barra con espaldar. Fabricado en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 64 cm, sin tapizar. Apoya pies en tubo de acero cold rolled pintura electroestática negro. Medidas generales 89cm x 48,8cm x 50cms. | UNIDAD | 20,00 | $ 655.452,00 | $ 13.109.040,00 | - | $ 655.452,00 | $ - | 0% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | Butaco Rústico Mobiliario Barra-bar 89 Cm Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 70 cm, altura máxima espaldar 89cm, sin tapizar. Medidas generales 32cm (diámetro tapa). | UNIDAD | 26,00 | $ 240.380,00 | $ 6.249.880,00 | 26,00 | $ 240.380,00 | $ 6.249.880,00 | **100%** |
| 1.33 | Mesa comedor de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas 180cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad | UNIDAD | 35,00 | $ 2.403.800,00 | $ 84.133.000,00 | - | $ 2.403.800,00 | $ - | **0%** |
| 1.34 | Mesa auxiliar INFANTIL redonda de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color café roble natural, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas diámetro 70cm, Altura= 50 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 2 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad. | UNIDAD | 2,00 | $ 1.047.200,00 | $ 2.094.400,00 | - | $ 1.047.200,00 | $ - | **0%** |
| 1.35 | Mesa CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad | UNIDAD | 10,00 | $ 1.577.940,00 | $ 15.779.400,00 | - | $ 1.577.940,00 | $ - | **0%** |
| 1.36 | SILLA PARA CAFETERÍA 80X49X55 SIN BRAZOS color GRIS, fabricada en polipropileno y base en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 4 patas - con esquinas redondeadas. Incluye deslizadores de silicona en las patas para protección de la silla del desgaste en la fricción con el piso. (incluye accesorios para su armado) | UNIDAD | 40,00 | $ 496.230,00 | $ 19.849.200,00 | 40,00 | $ 496.230,00 | $ 19.849.200,00 | **100%** |
| 1.37 | SILLA PARA COMEDOR 80X49X55 CON BRAZOS color NEGRO, fabricada en polipropileno y base en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 4 patas - con esquinas redondeadas. Incluye deslizadores de silicona en las patas para protección de la silla del desgaste en la fricción con el piso. (incluye accesorios para su armado) | UNIDAD | 70,00 | $ 528.360,00 | $ 36.985.200,00 | 70,00 | $ 528.360,00 | $ 36.985.200,00 | **100%** |
| 1.38 | Silla para comedor infantil con espaldar. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, | UNIDAD | 8,00 | $ 485.520,00 | $ 3.884.160,00 | - | $ 485.520,00 | $ - | **0%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | esquinas redondeadas Altura H asiento 34 cm, sin tapizar. Medidas generales 44cm x 48,8cm x 50cms. | | | | | | | | |
| 1.39 | ISLAS DE TRABAJO 6 PUESTOS SENCILLOS 120° DIMENSIONES PUESTO DE TRABAJO 120X60 CM DIMENSIONES GENERALES 3.60 metros * 1.20 metros. CM madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección . Incluye canaleta y troqueles incluye instalación | UNIDAD | 2,00 | $ 5.271.700,00 | $ 10.543.400,00 | 2,00 | $ 5.271.700,00 | $ 10.543.400,00 | 100% |
| 1.40 | MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 Características: Elaborada en Vidrio templado espesor 8 mm, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes en Lamina Cold rolled. Papel Tipo Vinilo Color a Elección. Dim: 0,6 x 0.45 Mts. | UNIDAD | 6,00 | $ 296.310,00 | $ 1.777.860,00 | 6,00 | $ 296.310,00 | $ 1.777.860,00 | 100% |
| 1.41 | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS (UN SOFÁ DE DOS PUESTOS – DOS POLTRONAS – UNA MESA AUXILIAR) Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés Tejida en mimbre natural, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera. ESPECIFICACIONES SOFÁ – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 1.50 largo x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES POLTRONA – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 0.75 ancho x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES MESA AUXILIAR: Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés, base y patas en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés, cantos redondeados largo:0.75m ancho: 0.45m altura 0.45m | UNIDAD | 1,00 | $ 10.710.000,00 | $ 10.710.000,00 | 1,00 | $ 10.710.000,00 | $ 10.710.000,00 | 100% |
| 1.42 | Lampara (artesanal) elaborada en mimbre natural. Medidas: diámetro 50cm altura 50cm. Incluye: (Portalampara Socket 40W Para Foco Base Y Cable E27 1ml - enchufe para tomacorriente con polo a tierra) Inlcuye bombillo vintage tipo bombona luz led cálida 280lm potencia 4,3W) | UNIDAD | 60,00 | $ 540.260,00 | $ 32.415.600,00 | 60,00 | $ 540.260,00 | $ 32.415.600,00 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **$ 1.477.852.194,00** | **$ 1.021.975.094,00** |
| **VALOR TOTAL AVANCE ACTA PARCIAL No. 01** | | **$ 1.021.975.094,00** |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO - PRESENTE ACTA 40% | | $ 408.790.037,60 |
| **VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 - MENOS AMORTIZACIÓN** | | **$ 613.185.056,40** |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

2.1. **Porcentaje de avance físico del contrato:** A corte 30 de julio el avance de ejecución del contrato es del **69.15%** correspondiente a mil veintiún millones novecientos setenta y cinco mil noventa y cuatro pesos ($1.021.975.094,00) m/cte, cabe resaltar que el avance es una proyección de cantidades realmente ejecutadas y las mismas se encuentran sujeto a revisión y aprobación y recibido a satisfacción por parte de la supervisión del contrato.

3. **ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO:** Descripción actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del 01 de julio al 31 de julio de 2025, registro fotográfico.

**ITEM 1.1 BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR**





**ITEM 1.2 BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR**




Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

| | |
|---|---|
| | |

**ITEM 1.3 MATERA EN CEMENTO TIPO JARDINERA**










**ITEM 1.4 MESA FIJA TIPO PICNI**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios





**ITEM 1.6 CENEFA SUPERIOR DOBLE APOYO**

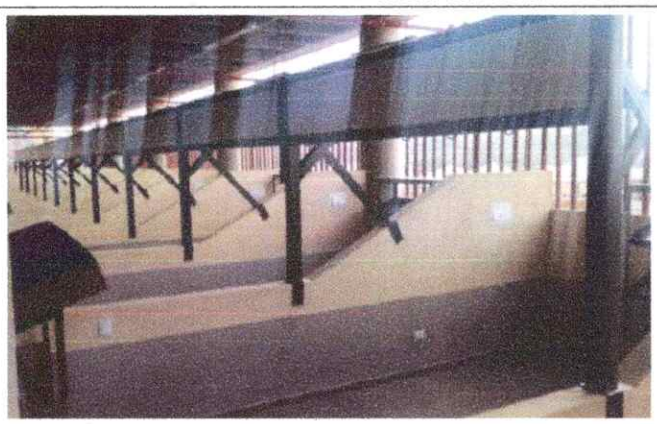



**ITEM 1.7 CENEFA SUPERIOR INTERMEDIAS**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios







**ITEM 1.8 ESTANTE EXHIBIDOR DE CANASTILLAS**





**ITEM 1.9 GÓNDOLA DE SOBREPONER PARA FRUTAS Y VERDURAS**

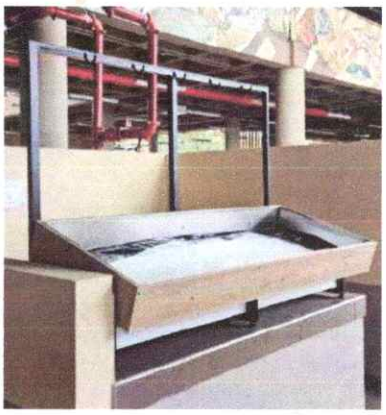

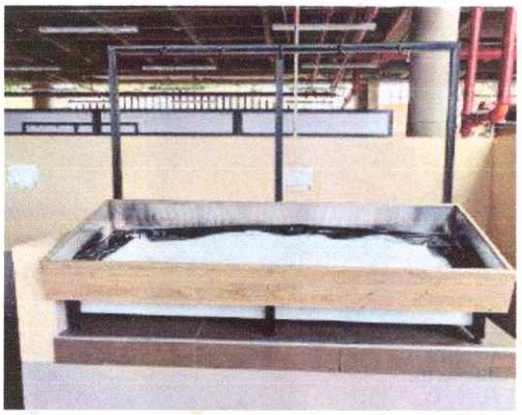




**ITEM 1.10 GÓNDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURA**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios



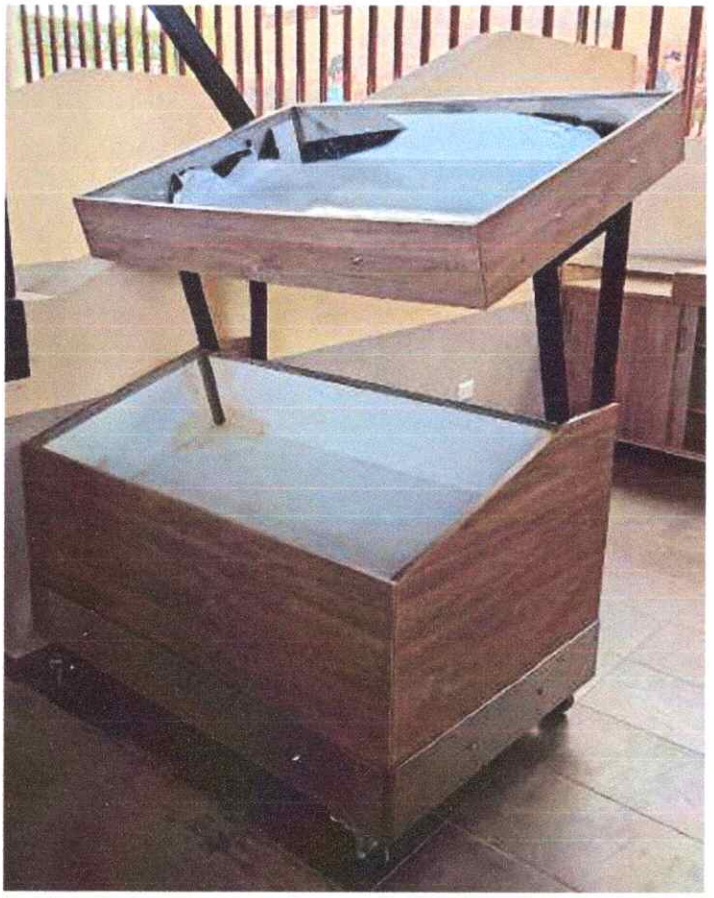

**ITEM 1.11 GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS Y ESPECIAS.**





Megaproyectos
Mobiliario & Diseno de espacios

**ITEM 1.13 MODULO TIPO EXHIBIDOR**



**ITEM 1.14 ISLA DE VIDRIO**





**ITEM 1.15 MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2**






**ITEM 1.16 MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR Y BODEGA 3**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios



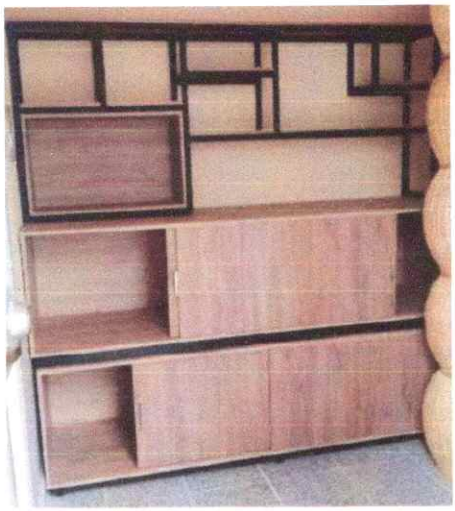

**ITEM 1.17 VITRINA MOSTRADOR**









**ITEM 1.20 CANASTILLA TIPO PANERA**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios





**ITEM 1.22 ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED**





**ITEM 1.23 MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL AMSIJOS**






Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios





**ITEM 1.24 MUEBLE VITRINA MOSTRADOR**



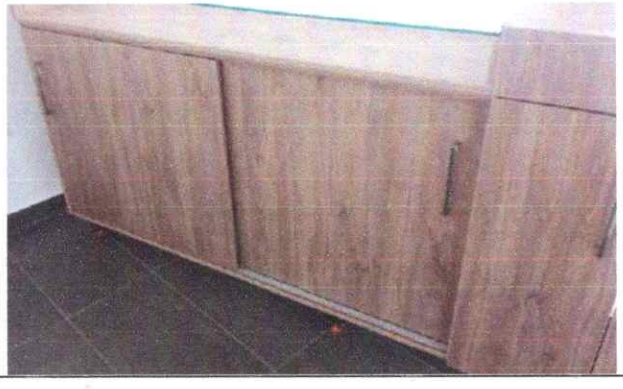





**ITEM 1.25 VITRINA TIPO MOSTRADOR**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios







**ITEM 1.29 BUTACA BAJA TRADICIONAL EN MADERA**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseno de espacios





**ITEM 1.32 BUTACO RUSTICO**





**ITEM 1.36 SILLA PARA CAFETERIA SIN BRAZOS**





**ITEM 1.37 SILLA PARA COMEDOR CON BRAZOS**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios






**ITEM 1.39 ISLAS DE TRABAJO 6 PUESTOS**







**ITEM 1.40 MAMPARA EN VIDRIO LAMINADO**





Megaproyectos
Mobiliario & Diseno de espacios

| ITEM 1.41 JUEGO DE SALA 4 PIEZAS (UN SOFÁ DE DOS PUESTOS – DOS POLTRONAS – UNA MESA AUXILIAR) |
|---|
|  |
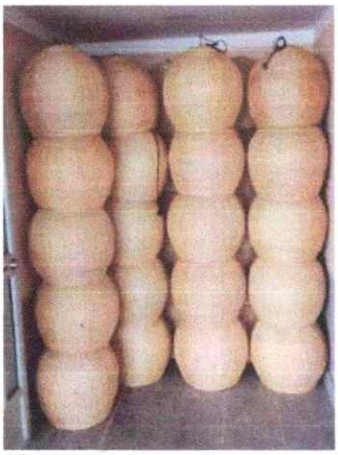
| ITEM 1.42 LAMPARA ARTESANAL EN MIMBRE NATURAL | |
|---|---|
|   |  |
|  |  |

# SOPORTE DE LA ENTREGA DEL MOBILIARIO

| | CHECKLIST SUMINISTRO E INSTALACIÓN | CÓDIGO: GPDI-FR-0924-20 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: V-00 |
| | | Página: 1 de 1 |

| CONTRATO | IPVO-010-2025 |
|---|---|

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD RECIBIDA | INSTALADO | | CUMPLE FICHA TÉCNICA | | | OBSERVACIONES | FECHA VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | SI | NO | N/A | | |
| 1.1 | BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 80 cm, Ancho: 55 cm, Largo: 180 cm PESO: 322Kg | 3 | 3 | x | | x | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.2 | BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 45 cm, Ancho: 50 cm, Largo: 180 cm. PESO: 286 Kg | 3 | 3 | x | | x | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.3 | MATERA EN CEMENTO TIPO JARDINERA Fabricada en cemento con medidas generales de 100 cm largo x 30 cm ancho x 30 cm alto. Montada sobre base en ángulo metálico y rodachinas – 2 rodachinas con freno y 2 sin freno. (Incluye tierra abonada y plantas adultas) Planta ref.: Costilla de Adán (1) - Planta ref.: oreja de elefante (1) - Planta ref.: Diefenbaquia Maculata (1) - Planta ref.: Anturio cristalino (1). Cuatro plantas por matera.- La garantía exigida será aplicable exclusivamente al mueble y su estructura (matera en cemento), entendiendo que la durabilidad y estado de las plantas dependerá directamente del cuidado, riego y mantenimiento | 8 | 8 | x | | x | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Mesa fija tipo picnic: en estructura metálica y tapa en acero inoxidable con sillas fijas capacidad de 4 personas (incluye parasol desmontable elaborado en material lona de alta resistencia color a definir). | 8 | 8 | x | | x | | | SE MEJORA LA ESPECIFICACIÒN DE LA MESA<br>DIMENSIONES GENERALES SUPERFICIE 1.00 MT DE LARGO* 0.60 MT DE FONDO<br>DIMENSIONESGENERALESSILLAS<br>1.00 MT DE LARGO * 0.40 MT DE FONDO<br><br>Estructura: fabricada en tubo redondo de 1 1/2" HR en 1,8mm soldada con MIG pulido y pintado en pintura horneada electrostática, bandejas de soporte para sentadero y mesa en lamina acero inox 304 satina con dobles en sus bordes y soportes y soportes internos para darle rigidez y soporte todo soldado con M.G.<br>PARASOL EN LONA SOMBRILLA DE 2.40 HEXAGONAL en lona americana y estructura metálica. | 31/07/2025 |
| 1.6 | CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura HR calibre 20, Medidas largo: 3.10 altura: 1.70m con dos apoyos soldados según diseño, elaborados en tubo HR 10x10 calibre 18 para asegurar a antepecho con platina tipo abrazadera 20cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ½". Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rígido color negro instalada con tornillo | 14 | 14 | X | | | | X | En visita tecnica realizada a sitio, se evidencio que el espacio fisico disponible para la instalacion del suministro correspondiente a estructuras de cenefa y cenefas no corresponde a las dimensiones establecidas inicialmente en la ficha tecnica contratada. Durante la revision en campo, se constato que el area real destinada para dicho mobiliario es inferior en ancho a lo contemplado inicialmente, por tal razon y con el fin de permitir la correcta instalacion del suministro, fue necesario ajustar el ancho tanto de las estructuras de soporte como de las cenefas para que se adaptaran a las condiciones reales del sitio. Se acalara que esta modificacion no afecta las demas caracteristicas tecnicas, funcionales ni esteticas del producto contratado. El material, acabados, tipo de instalacion y demas especificaciones se mantiene conforme a lo estipulado inicialmente, el ajuste corresponde exclusivamente a una necesidad de adaptacion espacial, garantizando asi la operatividad del suministro, adicional se cambia el color de la cenefa a blanco. | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | CENEFA SUPERIOR -intermediasPARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura metálica HR calibre 18, Medidas largo: 2.85 altura: 0.83m con dos platinas superiores para apoyo de 10cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ¼". Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rígido color negro instalada con tornillo | 11 | 11 | X | | | | X | En visita tecnica realizada a sitio, se evidencio que el espacio fisico disponible para la instalacion del suministro correspondiente a estructuras de cenefa y cenefas no corresponde a las dimensiones establecidas inicialmente en la ficha tecnica contratada. Durante la revision en campo, se constato que el area real destinada para dicho mobiliario es inferior en ancho a lo contemplado inicialmente, por tal razon y con el fin de permitir la correcta instalacion del suministro, fue necesario ajustar el ancho tanto de las estructuras de soporte como de las cenefas para que se adaptaran a las condiciones reales del sitio. Se acalara que esta modificacion no afecta las demas caracteristicas tecnicas, funcionales ni esteticas del producto contratado. El material, acabados, tipo de instalacion y demas especificaciones se mantiene conforme a lo estipulado inicialmente, el ajuste corresponde exclusivamente a una necesidad de adeptacion espacial, garantizando asi la operatividad del suministro.Adicional se cambia el color de la cenefa a blanco. | 31/07/2025 | ✓ |
| 1.8 | Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable Las dimensiones de la tolva inferior son 125 cm de largo x 30 cm de altura y 45 cm de fondo aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4" Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). El recubrimiento en madera y fórmica se debe hacer en las cuatro caras de la tolva inferior, excluyendo la base de la misma. la madera puede ser RH y los colores de la fórmica se pueden decidir con la supervisión. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1.5" acabado en pintura electrostática color a elegir Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, instaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cmx130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostática colores vivos según diseño. | 29 | 29 | X | | X | | | Se mejora la especificación del mueble ampliando la medida del estante para poder manipular y modular las canastillas para exhibición de productos. | 31/07/2025 | ✓ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | Góndola de sobreponer para frutas y verduras: Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir y 5 ganchos soldados a estructura principal Largo 1.75m x 0.56m altura 1.30m (incluye pata antideslizante en goma o similar) - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. recubierta en sus 5 caras incluyendo la base en madera y fórmica colores a elegir. - Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 170cm x 48cm altura de la tolva 10 cm aprox. | 44 | 44 | X | | | | X | Del total de 44 unidades de gondolas de frutas suministradas e instaladas, fue necesario modificar 16 unidades debido a que, en visita tecnica realizada a sitio, se evidencio que los mesones sobre los cuales se instalarian presentan dimensiones variables con respecto a lo proyectado inicialmente en el diseño, por esta razon, se procedio a ajustar las medidas de dichas 16 unidades a las dimensiones reales de los mesones existentes, especificamente en su ancho, con el fin de garantizar su correcta instalacion y funcionalidad. Adicional se mejora la especificación del mueble modulando el ensamble de la tolva superior desplazando un poco hacia atrás para facilitar la manipulación de las canastillas en la tolva inferior. | 31/07/2025 |
| 1.10 | Góndola exhibidora para frutas y verduras de locales sin mesón fijo: Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable 304 satinado calibre 20 dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4" Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en formica colores a elegir. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco según diseño, elaborado en madera acabada en fórmica colores a elegir. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir | 25 | 25 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.11 | GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS Y ESPECIAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 25 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 20 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva inferior. Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 15 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva superior. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir. Montada sobre Rodachinas Industrial 4" Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). | 2 | 2 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 0,8metros de alto, por 1,99 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entrepaños según diseño | 3 | 3 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.14 | MODULO EN VIDRIO TEMPLADO TIPO ISLA CERRADA. Fabricado en vidrio templado transparente 10mm, Medidas generales: 4.00 m de largo x 2.50m de ancho, altura=2.30m cuatro (4) caras. Incluída Una (1) puerta en vidrio templado 10mm - 1.00mx2.30m. Instalados sobre perfil "eFe", Estructura de soporte con siete tubos verticales en acero inoxidable, brida y tapa-brida para anclaje a piso con chazo expansivo. Conectores tipo moneda en acero inoxidable entre vidrios. | 1 | 1 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.15 | MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03 fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido termo fundido. Un (1) módulo en L tipo bodega con dos (2) puertas correderas en madera RH con riel DUCCASI y dos puertas en madera Rh Según diseño. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" o 1" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 1,35 metros de alto, por 3,40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. Cada mueble Incluye Una pieza elaborada tubo galvanizado de 1.5" calibre 18 - altura desde piso = 1.95m doblado a 90° extiende 1.00m – fijado a pared con abrazaderas metálicas, chazo y tornillo. | 11 | 11 | X | | X | | | Las 11 unidades de mobiliario correspondiente deberion ser ajustadas en sitio debido a condiciones físicas no contempladas en los planos iniciales, durante la revision en sitio, se evidencio que el area destinada para estos muebles cuenta con columnas redondas que imposibilitan la instalacion con las dimensiones originalmente contratadas. Por lo tanto, fue necesario realizar ajustes individuales a cada mueble, permitiendo que se adapten a la forma circular de dichas columnas, garantizando así una correcta instalacion y continuidad en el uso del espacio. Adicionalmente, se constato que el area disponible presentaba dimensiones inferiores a las proyectadas en el diseño original, lo que tambien obligo a reducir las dimensiones generales del mobiliario, sin afectar su funcionalidad ni materiales. | 31/07/2025 |
| 1.16 | MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR Y BODEGA 3 MÓDULOS_02 fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Dos (2) módulos tipo bodega cada uno con dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales 1,95 metros de ancho, 1,90 metros de alto y 0,60 metros de profundidad. Según Diseño | 1 | 1 | x | | x | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | MUEBLE MOSTRADOR EN MELAMINA_01 fabricado en madera Rh de 15 milimetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rigido. Vidrio frontal de 5 milimetros, vidrio templado de 8 milimetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.18 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco (5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar y dos (2) puertas correderas de madera Rh con riel DUCCASI. Según Diseño | 14 | 14 | x | | x | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.19 | Un modulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1" con entre paños en Rh 15mm según diseño. Medidas generales 0.8 metros de alto x 2.70 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. | 1 | 1 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.20 | Canastilla tipo panera elaborada en mimbre natural; con medidas de 40 cms largo x 25 cms de ancho y 15 cms de altura. Con forro lavable para almacenamiento de alimentos. | 120 | 120 | | X | X | | | El suministro aun no ha sido instalado, dado que se trata de un elemento vulnerable a su perdida, daño o sustraccion se dejara instalado de manera anticipada en el sitio, por esta razon, el elemento fue acopiado y almacenado en un lugar seguro, la instalacion definitiva se realizara una vez se haya completado el entorno requerido y se cuente con las condiciones necesarias que aseguren su conservacion y funcionalidad. | 31/07/2025 |
| 1.22 | ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estantería exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15 milimetros con pintura poliuretano referencia a elegir, soporta en tubo cuadrado de 1" con pintura electroestática a elegir. Medidas generales 1.10 metros de alto, por 0.85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. Según Diseño. Instalación a pared con brida, chazo y tornillo. Una (1) cenefa vertical en madera Rh | 10 | 10 | X | | X | | | Se mejora la especificación del mueble adicionando estructura a la parte posterior con el fin de mejorar la estabilidad y poder instalado con mayor facilidad al muro, en base a la estructura y entrepaños que lo componen. | 31/07/2025 |
| 1.23 | MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15 milimetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rigido. Elementos decorativos en lámina MDF de 15 milimetros con pintura poliuretano color a elegir. Medidas generales 1.86 metros de largo, 0.70m de altura y 0.60 metros de profundidad. Tres puertas y tres cajones según diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad. Medidas 38x50 - altura 22.8 cm incluye Griferia para lavaplatos tipo monocontrol vertical en Acero Inoxidable de 37.5 cm de altura 22 cm cuello. Según diseño. Mesón en melamina Rh de 15mm acabado en fórmica F8 | 5 | 5 | X | | | | X | Estos muebles fueron recibidos, sin embargo, durante la verificacion tecnica se evidencio que la altura contemplada inicialmente resultaba insuficiente para su uso funcional y ergonomico en el sitio de instalacion, por lo anterior y con el fin de garantizar la correcta operacion y adecuacion al espacio, se procedio aumentar la altura del mueble en 20 cm, manteniendo el mismo diseño, materiales y demas especificaciones tecnicas establecidas en la ficha tecnica contratada. | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA_04 fabricado en madera Rh de 15 milimetros referencia Brooklyn de PRIMAVERA O SIMILAR, herrajerias de trabajo pesado y canto PVC rigido. Vidrio frontal de 5 milimetros, vidrio templado de 8 milimetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco (5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar, dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI, una (1) puerta con bisagra. Según Diseño | 4 | 4 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.25 | Vitrina tipo mostrados en melamina fabricado en madera Rh de 15mm referencia broklyn de primavera con herrajeria de trabajo pesado y canto rigido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15mm con pintura en poliuretano, vidrio frontal de 5mm y colombina publicitaria MDF con pintura poliuretano, incluye juego de ruedas con dos frenos, medidas generales 1.92 metros de alto x 1,17 metros de ancho y 0.52 metros de profundidad, 9 entre paños en madera Rh 15 mm con tope frontal para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5m segun diseño | 6 | 6 | X | | X | | | Se modulo las perforaciones de soportes de entrepaños ajustando la inclinación de los entrepaños con el fin de hacerlos más útiles para los usuarios | 31/07/2025 |
| 1.29 | Butaco baja tradicional en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa). | 84 | 84 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.32 | Butaco Rústico Mobiliario Barra-bar 89 Cm Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 70 cm, altura máxima espaldar 89cm, sin tapizar. Medidas generales 32cm (diámetro tapa). | 26 | 26 | | x | x | | | Se recibe a conformidad, se instalara al finalizar el contrato | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | SILLA PARA CAFETERÍA 80X49X55 SIN BRAZOS color GRIS, fabricada en polipropileno y base en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 4 patas - con esquinas redondeadas. Incluye deslizadores de silicona en las patas para protección de la silla del desgaste en la fricción con el piso. (incluye accesorios para su armado) | 40 | 40 | X | | | | X | Se recibe a conformidad cumpliendo con todas las indicaciones excepto el color ya que por disponibilidad en el mercado el color suministrado es amarillo, pero esto no afecta su funcionalidad ni afecta en nada de ficha técnica. | 31/07/2025 |
| 1.37 | SILLA PARA COMEDOR 80X49X55 CON BRAZOS color NEGRO, fabricada en polipropileno y base en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 4 patas - con esquinas redondeadas. Incluye deslizadores de silicona en las patas para protección de la silla del desgaste en la fricción con el piso. (incluye accesorios para su armado) | 70 | 70 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |
| 1.39 | ISLAS DE TRABAJO 6 PUESTOS SENCILLOS 120" DIMENSIONES PUESTO DE TRABAJO 120X60 CM DIMENSIONES GENERALES 3.60 metros * 1.20 metros. CM madera aglomerada de 25 mm enchapada en melamínico F8 color a elección . Incluye canaleta y troquales incluye instalación | 2 | 2 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 Caracteristicas: Elaborada en Vidrio templado espesor 8 mm, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes en Lamina Cold rolled. Papel Tipo Vinilo Color a Elección. Dim: 0,6 x 0.45 Mts. | 6 | 6 | X | | X | | | Se mejora las especificaciones y dimensiones de la mampara a 1.10 cm de largo aumentando la dimensión dando más cobertura a la división de la isla de trabajo<br>y mejorando la especificación, el largo propuesto de 0,60 no garantiza privacidad a los puestos de trabajo. | 31/07/2025 |
| 1.41 | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS (UN SOFÁ DE DOS PUESTOS – DOS POLTRONAS – UNA MESA AUXILIAR) Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés Tejida en mimbre natural, sellado y acabado en barniz poliéster mata para madera. ESPECIFICACIONES SOFÁ – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 1.50 largo x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES POLTRONA – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 0.75 ancho x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES MESA AUXILIAR: Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés, base y patas en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés, cantos redondeados largo:0.75m ancho: 0.45m altura 0.45m | 1 | 1 | X | | X | | | Se recibe a conformidad | 31/07/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | Lampara (artesanal) elaborada en mimbre natural. Medidas: diámetro 50cm altura 50cm. Incluye: (Portalampara Socket 40W Para Foco Base Y Cable E27 1ml - enchufe para tomacorriente con polo a tierra) Incluye bombillo vintage tipo bombona luz led cálida 280lm potencia 4,3W) | 60 | 60 | X | | | | X | | 31/07/2025 |

CONTRATISTA:

NOMBRE: Fernando Rodriguez

CÉDULA: 6.770.634

CARGO: Repres. Legal

FIRMA:

APOYO A LA SUPERVISIÓN: NOMBRE: NAIRO ADOLFO PRIETO SUAREZ

CÉDULA: 74243283 MONIQUIRA

CARGO: SUPERVISOR GENERAL

FIRMA:

APOYO A LA SUPERVISIÓN: NOMBRE: Karen Dayana Florez Diaz

CÉDULA: 1.052.410.270

CARGO: RL INCOL INGENIERIA SAS

FIRMA:

| | ACTA DE ENTREGA | CÓDIGO: GPDI-FR-0924-23 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: V-00 |
| | | Página: 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | IPVO-010-2025 | **RESPONSABLE DE ENTREGA** | FERNANDO BOHORQUEZ |
| **FECHA DE ENTREGA** | 31/07/2025 | **RESPONSABLE DE RECEPCIÓN** | ANDRES GUERRERO GUIO |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE MOBILIARIO**

***CONTRATO No. IPVO-010-2025***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 1 | *Foto No* | 2 |
| *Lugar:* | Primer piso entrada principal | *Lugar:* | Primer piso entrada bomberos |
| *Ítem:* | 1.01 | *Ítem:* | 1.01 |
| *cantidad* | 1 | *Cantidad* | 1 |
| *Descripción:* | BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 80 cm, Ancho: 55cm, Largo: 180 cm. PESO: 322kg. | *Descripción:* | BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 80 cm, Ancho: 55cm, Largo: 180 cm. PESO: 322kg. |







***CONTRATO No. IPVO-010-2025***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 3 | *Foto No* | 4 |
| *Lugar:* | Primer piso esquina locales comerciales exterior | *Lugar:* | Primer piso entrada principal |
| *Ítem:* | 1.01 | *Ítem:* | 1.02 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 80 cm, Ancho: 55cm, Largo: 180 cm. PESO: 322kg. | *Observaciones:* | BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR (URBANISMO) Fabricación en hormigón y concreto gris. Color madera para cabados del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 45 cm, Ancho 50 cm, Largo: 180 cm PESO: 286 KG. |







***CONTRATO No. IPVO-010-2025***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 5 | *Foto No* | 6 |
| *Lugar:* | Primer piso entrada a bomberos | *Lugar:* | primer piso esquina locales comerciales exterior |
| *Ítem:* | 1.2 | *Ítem:* | 1.2 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR (URBANISMO) Fabricación en hormigón y concreto gris. Color madera para cabados del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 45 cm, Ancho 50 cm, Largo: 180 cm PESO: 286 KG. | *Descripción:* | BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR (URBANISMO) Fabricación en hormigón y concreto gris. Color madera para cabados del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 45 cm, Ancho 50 cm, Largo: 180 cm PESO: 286 KG. |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Foto No | 7 | Foto No | 8 |
| Lugar: | Segundo piso zona gastronomica | Lugar: | Primer piso, Cafeterias exteriores |
| Item: | 1.03 | Item: | 1.04 |
| Cantidad: | 8 | Cantidad: | 8 |
| Descripción: | MATERA EN CEMENTO TIPO JARDINERA Fabricada en cemento con medidas generales de 100 cm largo x 30 cm ancho x 30 cm alto. Montada sobre base en ángulo metálico y rodachines - 2 rodachines con freno y 2 sin freno (Incluye tierra abonada y plantas adultas) Planta ref.: Anturio cristalino (1). Cuatro plantas por matera. | Observaciones: | Mesa fija tipo picnic: en estructura metálica y tapa en acero inoxidable con silla fija capacidad 4 personas (Incluye parasol desmontable elaborado en material lona de alta resistencia color beige y café ) |

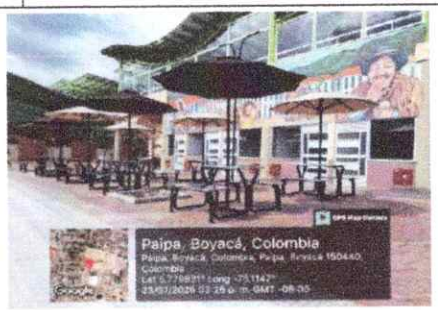



**CONTRATO No. IPVO-010-2025**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Foto No | 9 | Foto No | 10 |
| Lugar: | Primer piso | Lugar: | Primer piso locales de madera y vivero |
| Item: | 1.6 | Item: | 1.6 |
| Cantidad: | 14 | Cantidad: | 2 |
| Descripción: | Las 14 unidades de cenefas superior de doble apoyo, seran instaladas en tres puntos especificos dentro de la plaza, distribuidas: 1 unidad en el local de vivero, 1 unidad en el local de madera, 6 unidades en los locales de arroberas(correspondiente a 6 locales individuales intercalados) 6 unidades en los locales de frutas y legumbres ( correspondientes a 6 locales individuales intercalados). A continuacion, se anexa plano en planta en el que se indica la ubicacion exacta de las unidades de cenefa. Asimismo, en el presente documento, en las columnas siguientes, se presenta el desglose de ubicacion agrupado por los tres puntos especificos mencionados. | Descripción: | CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÒN FIJO. Elaborada en estructura metálica galvanizada calibre 20, Medidas largo: 3,10 altura: 1,70cm con dos apoyos soldados según diseño, elaborados en tubo galvanizado 10x10 calibre 18 para asegurar a antepecho con platina tipo abrazadera 20 cm longitu y perforaciones para tornillo pasante de 1/2". Incluye dos líneas de ganchos (Uno en frente y otro en el respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tenga capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas. largo 2.70m alto 0.40m con canto rigido instalado con tornillo. |



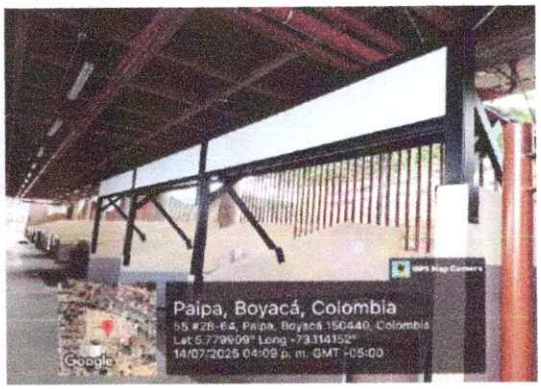


**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Foto No | 11 | Foto No | 12 |
| Lugar: | Primer piso locales de arroberas | Lugar: | Primer piso locales de frutas y legumbres |
| Item: | 1.6 | Item: | 1.6 |
| Cantidad: | 6 | Cantidad: | 6 |
| Descripción: | CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÒN FIJO. Elaborada en estructura metálics galvanizada calibre 20, Medidas largo: 3,10 altura: 1,70cm con dos apoyos soldados según diseño, elaborados en tubo galvanizado 10x10 calibre 18 para asegurar a antepecho con platina tipo abrazadera 20 cm longitu y perforaciones para tornillo pasante de 1/2". Incluye dos líneas de ganchos (Uno en frente y otro en el respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tenga capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas. largo 2.70m alto 0.40m con canto rigido instalado con tornillo. | Descripción: | CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÒN FIJO. Elaborada en estructura metálics galvanizada calibre 20, Medidas largo: 3,10 altura: 1,70cm con dos apoyos soldados según diseño, elaborados en tubo galvanizado 10x10 calibre 18 para asegurar a antepecho con platina tipo abrazadera 20 cm longitu y perforaciones para tornillo pasante de 1/2". Incluye dos líneas de ganchos (Uno en frente y otro en el respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tenga capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas. largo 2.70m alto 0.40m con canto rigido instalado con tornillo. |

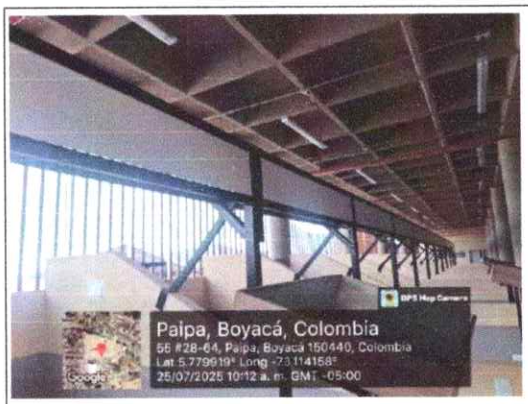






**CONTRATO No. IPVO-010-2025**


| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 13 | *Foto No* | 14 |
| *Lugar:* | Primer piso | *Lugar:* | Primer piso local de canastos |
| *Ítem:* | 1.7 | *Ítem:* | 1.7 |
| *Cantidad:* | 11 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | Las 11 unidades de cenefas superior de doble apoyo, seran instaladas en tres puntos especificos dentro de la plaza, distribuidas: 1 unidad en el local de canastos, 5 unidades en los locales de arroberas(correspondiente a 5 locales individuales intercalados) 5 unidades en los locales de frutas y legumbres ( correspondientes a 5 locales individuales intercalados). A continuacion, se anexa plano en planta en el que se indica la ubicacion exacta de las unidades de cenefa. Asimismo, en el presente documento, en las columnas siguientes, se presenta el desglose de ubicacion agrupado por los tres puntos especificos mencionados. | *Descripción:* | CENEFA SUPERIOR -intermedias- PARA LOCALES SIN MESÒN FIJO. Elaborada en estructura metálics galvanizada calibre 20, medidas largo: 2.85 altura: 0.83m con dos platinas superiores para apoyo de 10cm longitud y perforaciones para tornillo pasante 1/2". Incluye dos líneas de ganchos (Uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rigido color negro instalada con tornillo. |



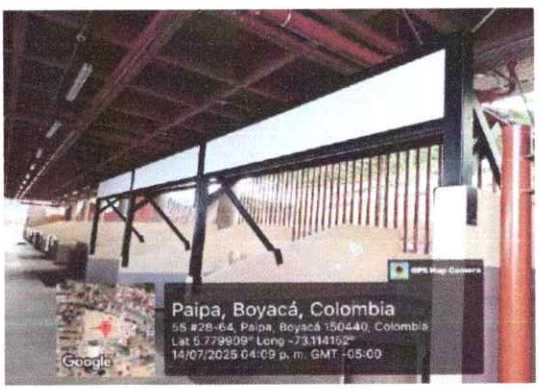


**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 15 | *Foto No* | 16 |
| *Lugar:* | Primer piso locales de arroberas | *Lugar:* | Primer piso locales de frutas y legumbres |
| *Ítem:* | 1.7 | *Ítem:* | 1.7 |
| *Cantidad:* | 5 | *Cantidad:* | 5 |
| *Descripción:* | CENEFA SUPERIOR -intermedias- PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura metálics galvanizada calibre 20, medidas largo: 2.85 altura: 0.83m con dos platinas superiores para apoyo de 10cm longitud y perforaciones para tornillo pasante 1/2". Incluye dos líneas de ganchos (Uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rigido color negro instalada con tornillo. | *Descripción:* | CENEFA SUPERIOR -intermedias- PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura metálics galvanizada calibre 20, medidas largo: 2.85 altura: 0.83m con dos platinas superiores para apoyo de 10cm longitud y perforaciones para tornillo pasante 1/2". Incluye dos líneas de ganchos (Uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rigido color negro instalada con tornillo. |

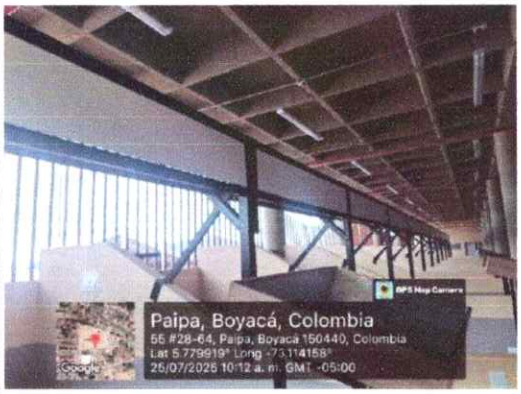





***CONTRATO No. IPVO-010-2025***

| | |
|---|---|
| *Foto No* | 17 |
| *Lugar:* | Primer piso |
| *Ítem:* | 1.08 |
| *Cantidad* | 29 |
| *Descripción:* | Se deja constancia de que la ubicación de las 29 unidades de estantes exhibidores de canastillas se distribuye en cuatro puntos específicos, de acuerdo con la organización funcional del espacio y las necesidades operativas identificadas. Las ubicaciones definidas son las siguientes: 11 locales destinados a arroberas 11 locales sin meson asignados para frutas y legumbres 3 locales correspondientes al grupo de especias y granos 2 unidades pendientes por ubicacion, a la espera de confirmacion por parte del area de agricultura. Asimismo, se anexa plano en planta donde se representa graficamente la ubicacion de cada una de las unidades mencionadas, permitiendo su trazabilidad en sitio. De igual forma, se deja evidencia fotografica organizada en las columnas siguientes, correspondiente a cada uno de los cuatro puntos mencionados, con el fin de respaldar la instalacion y distribucion realizada. |



***CONTRATO No. IPVO-010-2025***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 18 | *Foto No* | 19 |
| *Lugar:* | Primer piso Locales de articulos de madera y canastos | *Lugar:* | Primer piso locales sin meson de frutas y legumbres |
| *Ítem:* | 1.08 | *Ítem:* | 1.08 |
| *Cantidad:* | 2 | *Cantidad:* | 11 |
| *Descripción:* | Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INGERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 30 cm aprox. Montada sobre Rodachines industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Recubierta con marco elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1,5" acabado en pintura electrostática blanca Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, intaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cm x 130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostatica colores vivos, según diseño. | *Descripción:* | Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INGERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 30 cm aprox. Montada sobre Rodachines industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Recubierta con marco elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1,5" acabado en pintura electrostática blanca Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, intaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cm x 130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostatica colores vivos, según diseño. |






**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 20 | *Foto No* | 21 |
| *Lugar:* | Primer piso locales sin meson de arroberas | *Lugar:* | Primer piso locales de granos, especias y productos avicolas |
| *Item:* | 1.08 | *Item:* | 1.08 |
| *Cantidad:* | 11 | *Cantidad:* | 3 |
| *Descripción:* | Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INGERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 30 cm aprox. Montada sobre Rodachines industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Recubierta con marco elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1,5" acabado en pintura electrostática blanca Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, intaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cm x 130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostatica colores vivos, según diseño. | *Descripción:* | Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INGERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 30 cm aprox. Montada sobre Rodachines industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Recubierta con marco elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1,5" acabado en pintura electrostática blanca Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, intaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cm x 130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostatica colores vivos, según diseño. |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 22 | *Foto No* | 23 |
| *Lugar:* | Sin ubicación | *Lugar:* | Primer piso locales sin meson costado norte y sur bloques A y B |
| *Item:* | 1.08 | *Item:* | 1.09 |
| *Cantidad:* | 2 | *Cantidad:* | 44 |
| *Descripción:* | Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INGERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 30 cm aprox. Montada sobre Rodachines industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Recubierta con marco elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura principal elaborada en ángulo metálico 1,5" acabado en pintura electrostática blanca Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, intaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cm x 130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostatica colores vivos, según diseño. | *Descripción:* | Se deja constancia de que la ubicación de las 44 unidades de gondolas de sobre poner se distribuye en cuatro puntos especificos, de acuerdo con la organización funcional del espacio y las necesidades operativas identificadas. Las ubicaciones definidas son las siguientes: 11 locales destinados a tuberculos al detal costado sur , 11 locales sin meson asignados a tuberculos al detal costado norte, 11 locales correspondientes al grupo de viveres, 11 locales sin meson de frutas y verduras Asimismo, se anexa plano en planta donde se representa graficamente la ubicacion de cada una de las unidades mencionadas, permitiendo su trazabilidad en sitio. De igual forma, se deja evidencia fotografica organizada en las columnas siguientes, correspondiente a cada uno de los cuatro puntos mencionados, con el fin de respaldar la instalacion y distribucion realizada. |








**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Foto No | 24 | Foto No | 25 |
| Lugar: | Primer piso locales sin meson tuberculos sur | Lugar: | Primer piso locales sin meson tuberculos norte |
| Ítem: | 1.09 | Ítem: | 1.09 |
| Cantidad: | 11 | Cantidad: | 11 |
| Descripción: | Gondola de sobreponer para frutas y verduras: Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostatica color a elegir y 5 ganchos soldados a estructura principal largo 1.75m x 0.56 m altura de 1.30m (incluye pata antideslizante en goma o similar) tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva de 16cm aprox. recubierta en sus 5 caras incluyendo la base en madera y formica colores a elegir. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 170cm x 48cm altura de la tolva 10cm aprox. | Descripción: | Gondola de sobreponer para frutas y verduras: Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostatica color a elegir y 5 ganchos soldados a estructura principal largo 1,75m x 0.56 m altura de 1.30m (incluye pata antideslizante en goma o similar) tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva de 16cm aprox. recubierta en sus 5 caras incluyendo la base en madera y formica colores a elegir. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 170cm x 48cm altura de la tolva 10cm aprox. |



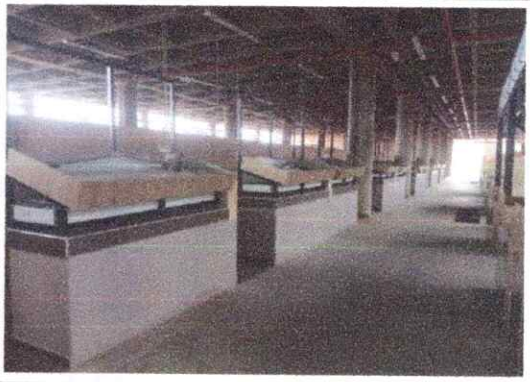


| | | | |
|---|---|---|---|
| Foto No | 26 | Foto No | 27 |
| Lugar: | Primer piso locales de viveres | Lugar: | Primer piso locales sin meson frutas y verduras |
| Ítem: | 1.09 | Ítem: | 1.09 |
| Cantidad: | 11 | Cantidad: | 11 |

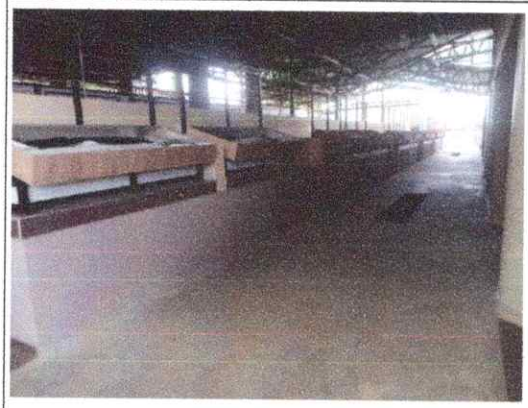




**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Foto No | 28 | Foto No | 29 |
| Lugar: | Primer piso | Lugar: | Primer piso locales de arroberas sin meson |
| Ítem: | 1.10 | Ítem: | 1.10 |
| Cantidad: | 25 | Cantidad: | 11 |
| Descripción: | Se deja constancia de que la ubicación de las 25 unidades de gondolas exhibidoras para frutas y verduras se distribuye en dos puntos específicos, de acuerdo con la organización funcional del espacio y las necesidades operativas identificadas. Las ubicaciones definidas son las siguientes: 11 locales destinados a arroberas 11 locales sin meson asignados para frutas y legumbres 3 unidades pendientes por ubicacion, a la espera de confirmacion por parte del area de agricultura. Asimismo, se anexa plano en planta donde se representa graficamente la ubicacion de cada una de las unidades mencionadas, permitiendo su trazabilidad en sitio. De igual forma, se deja evidencia fotografica organizada en las columnas siguientes, correspondiente a cada uno de los dos puntos mencionados, con el fin de respaldar la instalacion y distribucion realizada. | Descripción: | Góndola exhibidor para frutas y verduras de locales sin mesón fijo: Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable 304 satinado calibre 20 dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre rodachinas industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 km (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm , altura de la tolva 13cm aprox. Recubierta con marco y base elaborada en madera acabada en fórmica colores vivos según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25cm aprox. Recubierta con marco según diseño. Elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática blanca. |

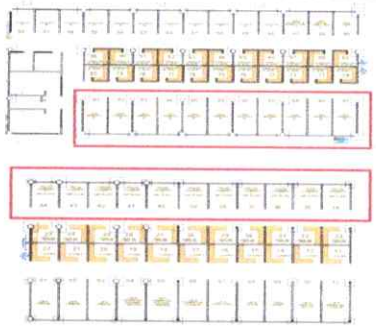

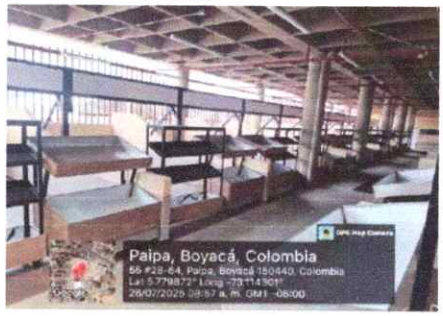


**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 30 | *Foto No* | 31 |
| *Lugar:* | Primer piso locales frutas y verduras sin meson | *Lugar:* | Sin ubicación |
| *Ítem:* | 1.10 | *Ítem:* | 1.10 |
| *Cantidad:* | 11 | *Cantidad:* | 3 |
| *Descripción:* | Góndola exhibidor para frutas y verduras de locales sin mesón fijo: Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable 304 satinado calibre 20 dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre rodachinas industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 km (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm , altura de la tolva 13cm aprox. Recubierta con marco y base elaborada en madera acabada en fórmica colores vivos según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 121cm x 81cm, altura de la tolva 25cm aprox. Recubierta con marco según diseño. Elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática blanca. | *Descripción:* | Góndola exhibidor para frutas y verduras de locales sin mesón fijo: Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable 304 satinado calibre 20 dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre rodachinas industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 km (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm , altura de la tolva 13cm aprox. Recubierta con marco y base elaborada en madera acabada en fórmica colores vivos según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 121cm x 81cm, altura de la tolva 25cm aprox. Recubierta con marco según diseño. Elaborado en madera acabada en fórmica colores vivos. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática blanca. |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 32 | *Foto No* | 33 |
| *Lugar:* | Primer piso locales de granos y especias | *Lugar:* | Segundo piso zona gastronomica, modulo de vidrio templado |
| *Ítem:* | 1.11 | *Ítem:* | 1.13 |
| *Cantidad:* | 3 | *Cantidad:* | 3 |
| *Descripción:* | GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS Y ESPECIAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones 125cm cm x 85cm altura de la tolva 25cm aprox. Recubierta con marco y base elaborada en madera acabana en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 20 cm para generar 8 espacios contenedores de grano. Según diseño. Tapa tipo corrediza fabricada en acrilico trasnparente 7mm de hojas para tolva inferior. Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable altura 15cm para generar 8 espacios contenedores de grano. Según diseño. Tapa tipo corrediza fabricada en acrilico transparente 7mm dos hojas para tolva superior. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado 4x4 acabado en pintura electrostática negro. Montada sobre Rodachinas industrial 4' Imsa capacidad de carga 115kg (2 con freno) | *Descripción:* | MODULO TIPO EXHIBIDOR fabricado en tubo cuadrado de 1" con entrepaños en Rh 15 mm Según diseño. Medidas generales 0.8 metros de alto por 1.99 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entre paños según diseño |








**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 34 | *Foto No* | 35 |
| *Lugar:* | Segundo piso zona gastronomica | *Lugar:* | Primer piso local N° 48 artesanias |
| *Item:* | 1.14 | *Item:* | 1.15 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | |
| *Descripción:* | MÓDULO EN VIDRIO TEMPLADO TIPO ISLA CERRADA. Fabricado en vidrio templado transparente con marcos. Medidas generales: 4.00 m de largo x 2.50 m de ancho, altura = 2.30m cuatro (4) caras. Incluida Una (1) puerta en vidrio templado 10mm - 10cmx2.30m. Instalados sobre perfil "eFe", Estructura de acero con siete tubos verticales en acero inoxidable, brida y tapa-brida para anclaje a piso con chazo expansivo. Conectores tipo moneda en acero inoxidable entre vidrios. | *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. |

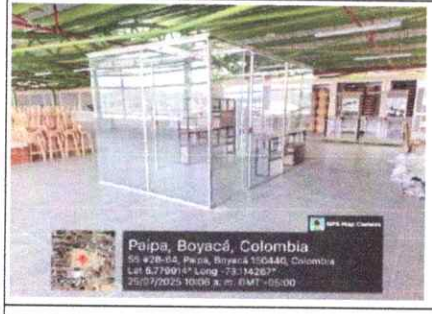





**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 36 | *Foto No* | 37 |
| *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N° 49 | *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N· 50 |
| *Item:* | 1.15 | *Item:* | 1.15 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1,35 metros de alto, por 3,40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. | *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. |






| CONTRATO No. IPVO-010-2025 | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 38 | *Foto No* | 39 |
| *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N- 51 | *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N- 52 |
| *Item:* | 1.15 | *Item:* | 1.15 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. | *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. |
| |  | |  |

| CONTRATO No. IPVO-010-2025 | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 40 | *Foto No* | 41 |
| *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N-53 | *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N-54 |
| *Item:* | 1.15 | *Item:* | 1.15 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. | *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. |
| |  | |  |

| CONTRATO No. IPVO-010-2025 | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 42 | *Foto No* | 43 |
| *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N-55 | *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N-56 |
| *Item:* | 1.15 | *Item:* | 1.15 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. | *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 44 | *Foto No* | 45 |
| *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N-57 | *Lugar:* | Primer piso local de artesanias N-58 |
| *Item:* | 1.15 | *Item:* | 1.15 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milimetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. | *Descripción:* | MÓDULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03<br>Fabricado en melamina Rh de 15 milimetros referencia Brooklyn de Primavera o similar, herrajes de trabajo pesado y canto PVC flexible. Un (1) módulo en L tipo similar, dos (2) puertas correderas con riel DUCCASI y dos entrepaños. Según diseño Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño.<br>Medidas generales: 1.35 metros de alto, por 3.40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. |








**CONTRATO No.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 46 | *Foto No* | 47 |
| *Lugar:* | Segundo piso local N° 113 Artesanias | *Lugar:* | Primer piso locales de artesanias, madera, canastos y vivero |
| *Item:* | 1.16 | *Item:* | 1.17 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 14 |
| *Descripción:* | MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR Y BODEGA 3 MODULOS_02 fabricado en melamina Rh de 15 mm referencia brooklyn de primavera o similar, herrajerias de trabajo pesado y canto PVC rigido. Modulos tipo bodega cada uno con dos puertas corredizas en madera Rh con riel DUCCASI, un modulo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1" con entrepaños en Rh 15mm segun diseño. medidas generales 1.96metros de ancho, 1.90 metros de alto y 0.60 metros de profundidad. | *Descripción:* | MUEBLE MOSTRADOR EN MELAMINA, fabricado en madera Rh de 15mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajerias de trabajo pesado y canto PVC rigido. Vidrio fornal de 5mm vidrio templado de 8mm para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. medidas generales 1.05 metros de alto por 1.18 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye 5 entre paños de madera con lope frontal, un cajon con riel estandar y dos puertas correderas en madera con riel DUCASSI. |

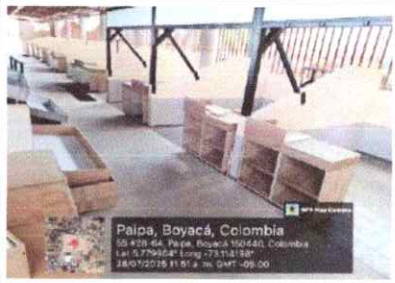


**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 48 | *Foto No* | 49 |
| *Lugar:* | Segundo piso zona gastronomica, se dejan provisional en el modulo de vidrio | *Lugar:* | Segundo piso local de amasijo N° 105 |
| *Item:* | 1.20 | *Item:* | 1.22 |
| *Cantidad:* | 120 | *Cantidad:* | 2 |
| *Descripción:* | Canastilla tipo panadera elaborada en mimbre natural; con medidas de 40 cm largo x 25 cm de ancho y 15 cm de alto. Con forro lavable para almacenamiento de alimentos. | *Descripción:* | ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estanteria exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15mm con pintura poliuretano, soporte en tubo cuadrado de 1" con pintura electrostatica a elegir, medidas generales 1.10 metros de alto por 0.85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. Instalacion a pared, cenefa vertical en madera |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 50 | *Foto No* | 51 |
| *Lugar:* | Segundo piso local de amasijo N° 106 | *Lugar:* | Segundo piso local de amasijo N°107 |
| *Item:* | 1.22 | *Item:* | 1.22 |
| *Cantidad:* | 2 | *Cantidad:* | 2 |
| *Descripción:* | ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estanteria exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15mm con pintura poliuretano, soporte en tubo cuadrado de 1" con pintura electrostatica a elegir, medidas generales 1.10 metros de alto por 0,85 metros de ancho y 0,30 metros de profundidad. instalacion a pared, cenefa vertical en madera | *Descripción:* | ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estanteria exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15mm con pintura poliuretano, soporte en tubo cuadrado de 1" con pintura electrostatica a elegir, medidas generales 1.10 metros de alto por 0,85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. instalacion a pared, cenefa vertical en madera |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 52 | *Foto No* | 53 |
| *Lugar:* | Segundo piso local de amasijo N° 108 | *Lugar:* | Segundo piso local de amasijo N°109 |
| *Item:* | 1.22 | *Item:* | 1.22 |
| *Cantidad:* | 2 | *Cantidad:* | 2 |
| *Descripción:* | ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estanteria exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15mm con pintura poliuretano, soporte en tubo cuadrado de 1" con pintura electrostatica a elegir, medidas generales 1.10 metros de alto por 0,85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. instalacion a pared, cenefa vertical en madera | *Descripción:* | ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estanteria exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15mm con pintura poliuretano, soporte en tubo cuadrado de 1" con pintura electrostatica a elegir, medidas generales 1.10 metros de alto por 0,85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. instalacion a pared, cenefa vertical en madera |








**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 54 | *Foto No* | 55 |
| *Lugar:* | Segundo piso local de amasijos N°105 | *Lugar:* | Segundo piso local de amasijos N° 106 |
| *Item:* | 1.23 | *Item:* | 1.23 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL DE AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajeria de trabajo pesado y canto rigido, Elementos decorativos en lamina MDF de 15 mm con pintura poliuretano, medidas generales 1.83m de largo, 0.90m de altura y 0.60 m de profundidad. Tres puertas y tres cajones segun diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad medidas de 55x43 cm altura de 22 cm incluye griferia para lavaplatos tipo monocontrol. | *Descripción:* | MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL DE AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajeria de trabajo pesado y canto rigido, Elementos decorativos en lamina MDF de 15 mm con pintura poliuretano, medidas generales 1.83m de largo, 0,90m de altura y 0.60 m de profundidad. Tres puertas y tres cajones segun diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad medidas de 55x43 cm altura de 22 cm incluye griferia para lavaplatos tipo monocontrol. |

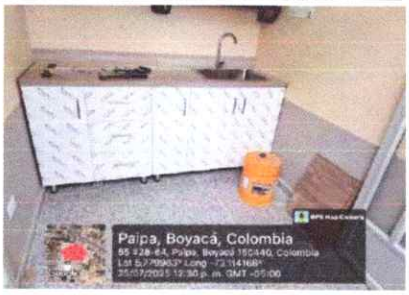





**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 56 | *Foto No* | 57 |
| *Lugar:* | Segundo piso local de amasijos N°107 | *Lugar:* | Segundo piso local de amasijos N°108 |
| *Ítem:* | 1.23 | *Ítem:* | 1.23 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL DE AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajeria de trabajo pesado y canto rigido, Elementos decorativos en lamina MDF de 15 mm con pintura poliuretano, medidas generales 1.83m de largo, 0.90m de altura y 0.60 m de profundidad. Tres puertas y tres cajones segun diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad medidas de 55x43 cm altura de 22 cm incluye griferia para lavaplatos tipo monocontrol. | *Descripción:* | MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL DE AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajeria de trabajo pesado y canto rigido, Elementos decorativos en lamina MDF de 15 mm con pintura poliuretano, medidas generales 1.83m de largo, 0.90m de altura y 0.60 m de profundidad. Tres puertas y tres cajones segun diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad medidas de 55x43 cm altura de 22 cm incluye griferia para lavaplatos tipo monocontrol. |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 58 | *Foto No* | 59 |
| *Lugar:* | Segundo piso local de amasijos N° 109 | *Lugar:* | Primer piso zona de cafetorias local N°120 |
| *Ítem:* | 1.23 | *Ítem:* | 1.24 |
| *Cantidad:* | 1 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL DE AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajeria de trabajo pesado y canto rigido, Elementos decorativos en lamina MDF de 15 mm con pintura poliuretano, medidas generales 1.83m de largo, 0.90m de altura y 0.60 m de profundidad. Tres puertas y tres cajones segun diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad medidas de 55x43 cm altura de 22 cm incluye griferia para lavaplatos tipo monocontrol. | *Descripción:* | MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA fabricado en madera Rh de 15 mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajerias de trabajo pesado y canto PVC rigido. Vidrio frontal de 5mm vidrio templado de 8mm para superficie superior, incluye juego de ruedas con dos frenos. medidas generales 1.05 metros de alto por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco entrepaños en madera, cajon con riel, dos puertas correderas, un puerta con bisagra. |






**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| Foto No | 60 | Foto No | 61 |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Primer piso zona de cafeterias Local N° 121 | Lugar: | Primer piso zona de cafeterias local N° 122 |
| Ítem: | 1.24 | Ítem: | 1.24 |
| Cantidad: | 1 | Cantidad: | 1 |
| Descripción: | MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA fabricado en madera Rh de 15 mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajerias de trabajo pesado y canto PVC rigido. Vidrio frontal de 5mm vidrio templado de 8mm para superficie superior, incluye juego de ruedas con dos frenos. medidas generales 1.05 metros de alto por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco entrepaños en madera, cajon con riel, dos puertas correderas, un puerta con bisagra. | Descripción: | MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA fabricado en madera Rh de 15 mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajerias de trabajo pesado y canto PVC rigido. Vidrio frontal de 5mm vidrio templado de 8mm para superficie superior, incluye juego de ruedas con dos frenos. medidas generales 1.05 metros de alto por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco entrepaños en madera, cajon con riel, dos puertas correderas, un puerta con bisagra. |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| Foto No | 62 | Foto No | 63 |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Primer piso zona de cafeterias local N° 123 | Lugar: | Segundo piso zona gastronomica (modulo de vidrio templado) |
| Ítem: | 1.24 | Ítem: | 1.19 |
| Cantidad: | 1 | Cantidad: | 1 |
| Descripción: | MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA fabricado en madera Rh de 15 mm referencia broklyn de primavera o similar, herrajerias de trabajo pesado y canto PVC rigido. Vidrio frontal de 5mm vidrio templado de 8mm para superficie superior, incluye juego de ruedas con dos frenos. medidas generales 1.05 metros de alto por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco entrepaños en madera, cajon con riel, dos puertas correderas, un puerta con bisagra. | Descripción: | Un modulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1" con entre paños. En RH 15mm, medidas generales 0.8 metros de alto x 2.70 metros de largo, y 0.30 metros de profundidad. |






**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| Foto No | 64 | Foto No | 65 |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Segundo piso zona gastronomica locales de amasijos | Lugar: | Primer piso zona minoristas ( se dejan provisionalmente en el local 044, ya que es un producto de facil acceso y para que no se pierdan mientras se entrega la totalidad del contrato se dispone de ese lugar) |
| Ítem: | 1.25 | Ítem: | 1.29 |
| Cantidad: | 6 | Cantidad: | 84 |
| Descripción: | VITRINA TIPO MOSTRADOR, elaborado en melamina Rh de 15 mm referencia broklyn de primavera, herrajeria de trabajo pesado y canto rigido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15mm con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal 5mm y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1.92 metros de alto x por 1.1.7 metros de ancho y 0.52 metros de profundidad. 9 entre paños en madera Rh 15mm con tope frontal para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm | Descripción: | Butaca baja traidicional en madera. Fabricado en madera natural pino, sellado y acabado en barniz poliester mate de madera, esquinas redondeadas altura 0.47 cm sin tapizar diametro 0.32 cm. |






**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 66 | *Foto No* | 67 |
| *Lugar:* | provisional mente se van a dejar en el segundo piso de la zona gastronomica, mientras se finaliza el contrato | *Lugar:* | Se dejan provisionalmente en el segundo piso de zona gastronomica, mientras se instalan las mesas |
| *Item:* | 1.32 | *Item:* | 1.36 |
| *Cantidad:* | 26 | *Cantidad:* | 40 |
| *Descripción:* | Butaco rustico mobiliario barra- bar 89cm madera. Fabricado en madera natural, altura 70cm con espaldar 89cm sin tapizar, diametro asiento 32cm | *Descripción:* | SILLA PARA CAFETERIA 80X49X55 SIN BRAZOS, El color cambio ya que se definio que el color gris no estaba disponible en el mercado por lo tanto quedo de color amarillo, |







**CONTRATO No. IPVO-010-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 68 | *Foto No* | 69 |
| *Lugar:* | Se dejan provisionalmente en el segundo piso de zona gastronomica mientras se instalan las mesas | *Lugar:* | Segundo piso aula aprende y emprende (rad abrigo) |
| *Item:* | 1.37 | *Item:* | 1.39 |
| *Cantidad:* | 70 | *Cantidad:* | 2 |
| *Descripción:* | SILLA PARA COMEDOR 80X49X55 CM CON BRAZOS, color negro. | *Descripción:* | ISLAS DE TRABAJO 6 PUESTOS SENCILLOS 120° DIMENSIONES PUESTO DE TRABAJO 120X60 CM DIMENSIONES GENERALES 3.60 m x 1.20 m madera aglomerada de 25mm enchapada en melamina incluye canaleta y troqueles incluye instalacion. |







| CONTRATO No. IPVO-010-2025 | | | |
|---|---|---|---|
| *Foto No* | 70 | *Foto No* | 71 |
| *Lugar:* | Segundo piso aula aprende y emprende (red abrigo) | *Lugar:* | segundo piso zona gastronomica costado sur |
| *Item:* | 1.40 | *Item:* | 1.41 |
| *Cantidad:* | 6 | *Cantidad:* | 1 |
| *Descripción:* | MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO, 4+4 caracteristicas, elaborada en vidrio templado espesor 8mm sistema de fijacion a puesto de trabajo mediante herrajes en lamina cold rolled papel tipo vinilo color blanco gris, dimensiones 0,6 x 0.45 m | *Descripción:* | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS (UN SOFA DOS PUESTOS- DOS POLTRONAS- UNA MESA AUXILIAR) fabricada en madera natural cedro, tejida en mimbre natural, sellado y acabado en barniz poliester mate para madera, especificaciones sofa con brazos, estructura madera cedro 1.50 de largo x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45, con espaldar, poltrona con brazos estructura en madera natural, cojin asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera, especificaciones mesa auxiliar, fabricada en madera natural largo de 0.75m ancho 0.45 altura 0.45m |






| CONTRATO No. IPVO-010-2025 | |
|---|---|
| *Foto No* | 72 |
| *Lugar:* | Se dejan provisional en el segundo piso zona de smasiljos mientras se define instalacion |
| *Item:* | 1.42 |
| *Cantidad:* | 60 |
| *Descripción:* | LAMAPARA, (artesanal) elaborada en mimbre natural. Medidas diametro de 50cm incluye portalampara de 40w, enchufe de toma corriente con polo a tierra, incluye bombillo vintage tipo bombona luz led calida 280lm potencia 4.3w |

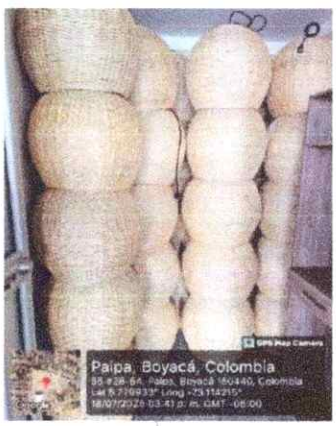






**ELABORO:** **ANDRES GUERRERO GUIO**
C.C: 7.178.031
CARGO: SUPERVISOR DE PROYECTOS
EMRESA: INCOL INGENIEROS SAS

**REVISO Y APROBO: NAIRO ADOLFO PRIETO SUAREZ**
C.C: 74'243.283 DE MONIQUIRÁ
CARGO: SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS
EMRESA: INCOL INGENIEROS SAS

Megaproyectos
Mobiliario & Diseno de espacios

## 4. Control Grafico del avance

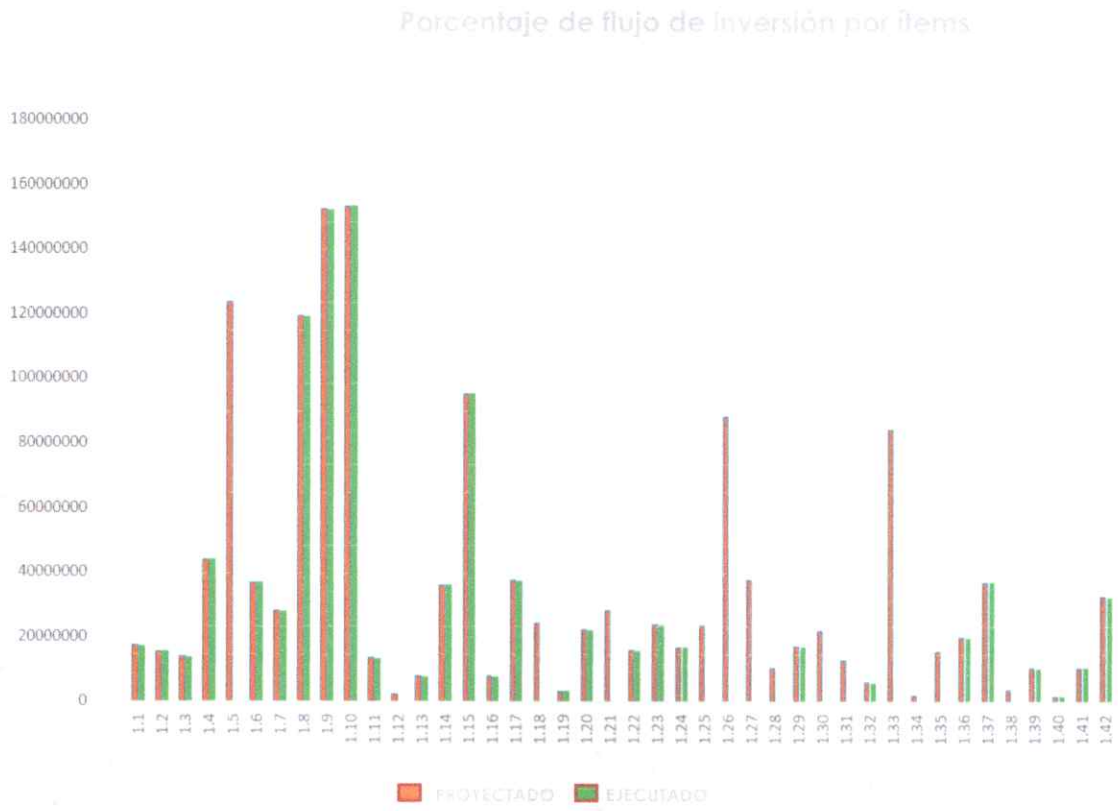


| ID | PROYECCIONES | JUNIO | JULIO | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALOR PROYECTADO | $ - | $ 1.477.852.194 | 100% |
| 2 | VALOR EJECUTADO | $ - | $ 1.021.975.094 | 69% |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseno de espacios

PROYECCIONES




De acuerdo con el valor proyectado a ejecutarse para el mes de julio el cual se consideró la ejecución del cien por ciento (100%) en base al cronograma presentado a la supervisión, mediante la documentación que hace parte de la solicitud de anticipo, el cual fue programado por parte del CONTRATISTA, se ejecuta un cumplimiento para el cierre de julio del sesenta y nueve punto quince por ciento (69,15 %), se presentaron imprevistos en base al volumen de mobiliario que se requiere fabricar.

El atraso en la entrega del treinta punto ochenta y cinco por ciento (30.85%) restante de la proyección de ejecución se solventara estos se solventara del 01 al 16 de agosto del presente año, si bien se presenta un atraso del 30,85% según la justificación antes mencionada el plazo de ejecución del contrato es de tres (03) meses contados a partir del acta de inicio, por lo tanto me encuentro dentro de los términos de entrega para entrega de la totalidad de los bienes contratados.

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

## 5. Control presupuestal y Financiero

Se adjunta al presente informe registro presupuestal asociado al contrato.

SPGR

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHincay | NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 03-150008 | TIERRAGUA S.A.S. |
| Fecha y Hora Informe | 2025-05-13 11:56 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 225 | Fecha Registro: | 2025-05-13 | Unidad - Subunidad ejecutora: | 03-150008 TIERRAGUA S.A.S. | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0.00 |
| Valor Inicial: | 1.477.852.194.00 | Valor Total Operaciones: | | 0.00 | Valor Actual: | 1.477.852.194.00 | Saldo x Obligar: | | 1.477.852.194.00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 800130404 | Razon Social: | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA. S.A.S. | | | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | |
| Numero: | 010097259 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 7160233 | Nombre: | JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL | | Cargo: | GERENTE | | | |
| **CAJA MENOR** | | | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | |
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | IPV-9102023 | Tipo: | CONTRATO | Fecha: | 2025-05-12 |
| **VIGENCIA ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| Proviene Vigencia Anterior: | | NO | CDP: | | Compromiso: | | Obligación: | | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 03-150008 TIERRAGUA S.A.S. | 00AR-1709-1100-2025-00410-0012 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Nación | AR15000 | CSF | 2025-05-13 | 1.477.852.194,00 | 0.00 | | |
| | | | | | Total: | 1.477.852.194,00 | 0.00 | 1.477.852.194.00 | 1.477.852.194.00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

SPGR

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante: MHincoy NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-150008 TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Solicitud: 2025-06-10 11:56 a. m.

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-150008 | TIERRASUA S.A.S | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2025-06-20 | 591.140.877,60 | 591.140.877,60 | NINGUNO |
| 03-150008 | TIERRASUA S.A.S | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2025-07-21 | 246.308.699,00 | 246.308.699,00 | NINGUNO |
| 03-150008 | TIERRASUA S.A.S | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2025-08-21 | 246.308.699,00 | 246.308.699,00 | NINGUNO |
| 03-150008 | TIERRASUA S.A.S | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2025-09-21 | 246.308.699,00 | 246.308.699,00 | NINGUNO |
| 03-150008 | TIERRASUA S.A.S | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2025-10-13 | 147.785.219,40 | 147.785.219,40 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


## 6. Detalle del plan de inversión de anticipo

Se allega relación de facturas y soportes donde se evidencia el control de ejecución total del cien por ciento (100%) del anticipo y como se evidencia supera el valor total del anticipo, así como concepto de cada uno de los rubros de los bienes adquiridos.

| ID | ANTICIPO | VALOR | % |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR DE ANTICIPO | $ 591.140.877,60 | 100,00% |
| 2 | TOTAL INVERSIÓN GIROS | $ 602.489.017,00 | 101,92% |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

## INVERSIÓN ANTICIPO

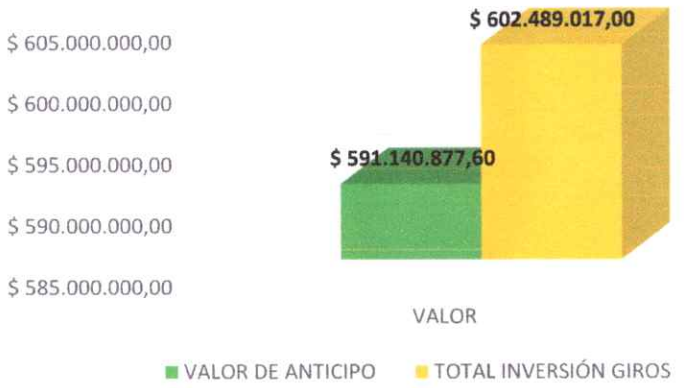


| No. | FECHA | NIT | NOMBRE PROVEEDOR | RUBRO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/06/2025 | 1.156.755 | RICARDO TOBO | VIDRIOS | 12.056.001 |
| 2 | 24/07/2025 | 1.156.755 | RICARDO TOBO | VIDRIOS | 17.952.200 |
| 3 | 24/06/2025 | 4.119.859 | RICARDO SAMACA | ESTRUCTURAS METALICAS | 9.100.000 |
| 4 | 27/06/2025 | 7.169.842 | NELSON YOVANNI VARGAS | MADERAS | 2.772.000 |
| 5 | 28/07/2025 | 7.169.842 | NELSON YOVANNI VARGAS | MADERAS | 2.772.000 |
| 6 | 28/07/2025 | 7.187.819 | LUIS DIAZ | ESTRUCTURAS METALICAS | 3.050.000 |
| 7 | 28/07/2025 | 1.049.617.911 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | ESTRUCTURAS METALICAS | 6.900.000 |
| 8 | 28/07/2025 | 21.022.942 | GLORIA MILLAN | VIVERO | 1.328.000 |
| 9 | 10/07/2025 | 800.242.106 | SODIMAC COLOMBIA SAS | GRIFERIAS | 439.499 |
| 10 | 1/07/2025 | 800.242.106 | SODIMAC COLOMBIA SAS | GRIFERIAS | 234.499 |
| 11 | 7/07/2025 | 804.008.926 | VERAMON SAS | CONCRETOS | 13.646.000 |
| 12 | 27/06/2025 | 811.028.650 | MADECENTRO SAS | MADERAS | 18.456.472 |
| 13 | 4/07/2025 | 811.028.650 | MADECENTRO SAS | MADERAS | 6.804.888 |
| 14 | 30/07/2025 | 811.028.650 | MADECENTRO SAS | MADERAS | 1.360.511 |
| 15 | 30/07/2025 | 811.028.650 | MADECENTRO SAS | MADERAS | 26.863.079 |
| 16 | 13/06/2025 | 860.025.998 | INCAP SAS | PEGANTE | 2.263.207 |
| 17 | 19/06/2025 | 860.025.998 | INCAP SAS | PEGANTE | 3.042.009 |
| 18 | 3/07/2025 | 1.049.639.291 | CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE | MADERAS | 13.915.300 |
| 19 | 3/07/2025 | 1.049.639.291 | CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE | MADERAS | 26.301.100 |
| 20 | 21/07/2025 | 1.049.639.291 | CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE | MADERAS | 13.483.600 |
| 21 | 23/07/2025 | 1.049.639.291 | CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE | MADERAS | 579.987 |
| 22 | 23/07/2025 | 1.049.639.291 | CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE | MADERAS | 578.999 |
| 23 | 25/07/2025 | 1.049.639.291 | CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE | MADERAS | 1.093.999 |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4/08/2025 | 1.049.639.291 | CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE | MADERAS | 3.200.299 |
| 25 | 24/07/2025 | 901.282.548 | GABO REPARA SAS | GODOLAS Y CENEFAS | 220.447.500 |
| 26 | 24/07/2025 | 900.592.894 | CARPAS CUBRIARTEC SAS | PICNIC | 34.272.000 |
| 27 | 23/07/2025 | 901.540.118 | CUBRITEC SAS | PICNIC | 8.389.500 |
| 28 | 17/06/2025 | 901.540.118 | CARPAS CUBRIARTEC SAS | MADERA | 46.385.000 |
| 29 | 14/07/2025 | 900.303.178 | MOBILIARIO METALICO | ESTRUCTURAS METALICAS | 45.571.288 |
| 30 | 7/07/2025 | 900.868.270 | PROVEFABRICA SAS | SILLAS | 21.430.080 |
| 31 | 24/07/2025 | 1.010.220.521 | MARIA FERNANDA CUBILLOS | MIMBRE | 37.800.000 |
| | | | | **TOTAL GIROS** | **602.489.017** |
| | | | | **ANTICIPO RECIBIDO** | **591.140.877** |
| | | | | **EJECUCIÓN** | **100%** |

Se allegan planillas de aportes a seguridad social del personal que intervino en la ejecución del contrato durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025

Cordialmente.

**JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREL**
**REP. LEGAL DE FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.**

Representación gráfica

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RT1708**

## TOBO SANTIAGO RICARDO - ALL GLASS

**NIT** 1156755-6
**Tipo de contribuyente:** Persona Natural
**Tipo de responsabilidad:** R-99-PN (No aplica – Otros)
**Régimen fiscal:** Impuesto sobre las ventas – IVA
**Actividades económicas:** 4752
**Municipio:** Duitama (Boyacá)
**Dirección:** KM 5 VIA DUITAMA - PAIPA
**Correo:** glasstor@hotmail.com
**Teléfono:** 3103417261

**CUFE:** 7f7bdfe2cd76887fa687d6ae0adc80b435f2c6523274f7ffb858e2eee8f0fc30107f85a3ce006ee2d15c6e370658ac32

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de emisión**<br>2025-06-14 | **Fecha y hora de autorización**<br>2025-06-14 09:55:00 | **Prefijo**<br>RT | **Tipo de operación**<br>Estandar |
| **Fecha de vencimiento**<br>2025-06-14 | **Medio de pago**<br>Transferencia Débito Interbancario | **Forma de Pago**<br>Contado | |
| **Orden de referencia**<br>- | | | |

### Adquiriente

**Nombres y apellidos:** FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento**<br>NIT - 800130904-2 | **Tipo de persona**<br>Persona Jurídica | **Régimen fiscal**<br>No responsable de IVA | **Tipo de responsabilidad**<br>R-99-PN (No aplica – Otros) |
| **Departamento**<br>Boyacá | **Municipio**<br>Tunja | **Dirección**<br>AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA | **Teléfono**<br>7407810 |
| **Correo**<br>info@megaproyectos.com.co | | | |

### Detalle de los productos y/o servicios facturados

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U. de Med. | Valor unitario | Dcto | IVA | INC | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1000 | SUMINISTRO CRISTAL TEMPLADO 10MM Y 8MM CON ACCESORIOS | 1,00 | METRO CUADRADO | $10.131.093,00 | 0% | 19% | | $10.131.093,00 |

**Total Items: 1**

**Observaciones**
-

| | | |
|---|---|---|
| Moneda | | COP |
| **Subtotal bruto** | = | **$10.131.093,00** |
| Descuentos | - | $0,00 |
| Recargos | + | $0,00 |
| **Subtotal neto** | = | **$10.131.093,00** |
| Impuesto IVA (19%) | + | $1.924.907,67 |
| **Subtotal más impuestos** | = | **$12.056.000,67** |
| **Total deducciones** | = | **$0,00** |
| **Total a pagar** | = | **$12.056.000,67** |

**Número de autorización:** 18764090592288
**Rango Autorizado:** desde RT 1693 hasta RT 2000
**Expedida:** 2025-03-17 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2025-09-17

**Firma Digital:**

Wi5BDg3joFTqPkdz7pM1WceebZYHNuhq7lcsA+DnOB4g1BjVWWRb+wh/LR6+5PnKBWBg1uDYJXgBXDmts+nGIT1RsbmQ2IwHxEDVJI1y2Jb43UOZIRkvIOamqsYgBEHeabRzBMcLZVChGTbTu7vEtdsIv5XJqAmBeHAJADzPLrUnXJEcsqXu7r2M5s5mK99T9LLs6KikfTnxuEANBeMWYPGzQfq9/hpUvsVMxxIOHVgfJIUGOZUWHLZIMJtJXboes0OBHmsx7s5OnSOxsnu2YY5eNG1riMCBgtE+E3sdIbyNmcS9f7jtofPjmjbgauQdGy7G6/7RTuO==

Representación gráfica

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RT1713**

## TOBO SANTIAGO RICARDO - ALL GLASS

**NIT** 1156755-6
**Tipo de contribuyente:** Persona Natural
**Tipo de responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Régimen fiscal:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**Actividades económicas:** 4752
**Municipio:** Duitama (Boyacá)
**Dirección:** KM 5 VIA DUITAMA - PAIPA
**Correo:** glasstor@hotmail.com
**Teléfono:** 3103417261

**CUFE:** 61158f477129c9cedbfa6ea9fb98ebb3b1af9aa8a5262803b6072151de67957ee91d107dd7fae91b0704c10204e63cf8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de emisión**<br>2025-07-24 | **Fecha y hora de autorización**<br>2025-07-24 19:42:56 | **Prefijo**<br>RT | **Tipo de operación**<br>Estandar |
| **Fecha de vencimiento**<br>2025-07-24 | **Medio de pago**<br>Transferencia Débito Interbancario | **Forma de Pago**<br>Contado | |
| **Orden de referencia**<br>- | | | |

### Adquiriente

**Nombres y apellidos:** FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento**<br>NIT - 800130904-2 | **Tipo de persona**<br>Persona Jurídica | **Régimen fiscal**<br>No responsable de IVA | **Tipo de responsabilidad**<br>R-99-PN (No aplica - Otros) |
| **Departamento**<br>Boyacá | **Municipio**<br>Tunja | **Dirección**<br>AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA | **Teléfono**<br>7407810 |
| **Correo**<br>info@megaproyectos.com.co | | | |

### Detalle de los productos y/o servicios facturados

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U. de Med. | Valor unitario | Dcto | IVA | INC | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1000 | SUMINISTRO CRISTAL TEMPLADO 8MM, 10MM Y CRISTAL CRUDO 5MM | 1,00 | METRO CUADRADO | $15.085.882,00 | 0% | 19% | | $15.085.882,00 |

**Total Items: 1**

**Observaciones**
-

| | | |
|---|---|---|
| Moneda | | COP |
| **Subtotal bruto** | = | **$15.085.882,00** |
| Descuentos | - | $0,00 |
| Recargos | + | $0,00 |
| **Subtotal neto** | = | **$15.085.882,00** |
| Impuesto IVA (19%) | + | $2.866.317,58 |
| **Subtotal más impuestos** | = | **$17.952.199,58** |
| **Total deducciones** | = | **$0,00** |
| **Total a pagar** | = | **$17.952.199,58** |

**Número de autorización:** 18764090592288
**Rango Autorizado:** desde RT 1693 hasta RT 2000
**Expedida:** 2025-03-17 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2025-09-17
**Firma Digital:**

weJV4BrDw53Z3LG0QvXOU13NjRzesmE+QBVG65W2w5hTB1Tx26qDWKsJMJL0aNY4LvsNBtLiO6WubauOjtCO3psQiZCkrt5bhp8pvQ9YJMbGP0DGTZF7A4JVkALlbs1+GL1EWCWXxBBNtv1RLykIGPVzpqvPlEoxrBFTOHFrZ1dX4rw32C9Hs+JJVL5hDxH4eDA9UK8Zp7ufYxrZZm+5bHQnXhaexy+dlqpUwzRFvSbZCsNDv9s1zrCLq0kfMN20MO64A+Jq6yAy+qvBU0EJTrIBPMd1yRA16E0Fs7fV621OTyAkMxvzbEFEKtQBO35TcTl7uqUTA1F5TbHPBA==

| | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A-S | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE MATERIALES | Pagina 1 de 1<br>Codigo:<br>Version: 3 |
|---|---|---|---|

NIT. 800.130.904-2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | RICARDO SAMACA | N. VENDEROR | RICARDO | REQUISICION No | NA | ORDEN No |
| DIRECCION | CL 5 SUR 8 - 22 | NIT PROVEEDOR | 4119859 | TELEFAX | 3202396231 | **Q-496** |
| CIUDAD | TUNJA | SITIO DE ENTREGA | TUNJA | FECHA DE LLEGADA | 25/07/2025 | |
| FECHA SOLICITUD | 21/07/2025 | FECHA PROGRAMADA | 25/07/2025 | QUIEN TRANSPORTA | EMPRESA | PROVEEDOR |

| CANT. | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | PEDIDO | INSPECCION DE PRODUCTO | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ESTRUCTURA DE CARRO PARA VENTA TINTOS<br>Todo montado sobre base completa metálica acabado con pintura electrostática, incluye 2 Ruedas Rin 16" y 2 Rodachines de carga con freno, manija para empujar fabricada en acero inoxidale. | | | 1.700.000 | 5.100.000 |
| 1 | ESTRUCTURA MUSEO Un (1) mueble fabricado en tubo cuadrado de 1'' acabado con pintura electrostática sobre base en tubo rectangular 10x5cm | | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **CONFIRMAR PLANTILLA, PLANOS Y MEDIDAS FINALES CON COORDINADOR DE PRODUCCION JUAN CAMILO CASTELLANOS CEL. 3174401193** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERIFICACION DE LA RECEPCION DEL MATERIAL | SUB-TOTAL | | **9.100.000** |
| | DESCUENTO | | |
| OBSERVACIÓN | SUBTOTAL | | **9.100.000** |
| | RF | **3,50%** | **0** |
| | IVA | **19%** | **0** |
| | VALOR NETO | | **9.100.000** |

| ELABORO | APROBO |
|---|---|
| **WILMAR YAIR SANCHEZ** | **FERNANDO BOHORQUEZ** |

FAVOR ADJUNTAR FACTURA
**FORMA DE PAGO:**

megaproyectos

**FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**
NIT : 800130904- 2
AV NORTE 50 39
6087407810
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

CDSE - 651

Fecha y Hora de Documento

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2025-06-27 | 17:34:19 |
| Expedición | 2025-06-27 | 17:34:28 |
| Vencimiento | 2025-06-27 | |

**Señores** NELSON YOVANI VARGAS BERNAL
**NIT** 7,169,842 - 7
**Dirección** MZ 3 CASA 4 PINOS DE ORIENTE
**Teléfono** 3158113089
**Ciudad** TUNJA-BOYACA - COLOMBIA **Factura Proveedor** 005-8719

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335500000 | TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS | | ,00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,800,000.00 |
| SERVICIOS 1% | 28,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.772.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**
Otros 2.772.000,00 Cuota 1 P - 005- 651 Vence el 2025-06-27

**VALOR EN LETRAS**
Dos Millones Setecientos Setenta Y Dos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764078899311 **aprobado en** 2024-09-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CDSE **desde el número** 424 **al** 1000

CUDS: bf6284089b186007358824a0904441b9d04e255851be4296859062924 97ed50cdbccd5f200dec8abfcd91d6045e51639e



Fabricante del Software: Sigo S.A.S. Nit 830048146-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnologico: Sigo S.A.S. Nit 830048146-8

megaproyectos

**FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**
NIT : 800130904- 2
AV NORTE 50 39
6087407810
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

CDSE - 678

Fecha y Hora de Documento

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2025-07-28 | 08:42:14 |
| Expedición | 2025-07-28 | 08:42:24 |
| Vencimiento | 2025-07-28 | |

**Señores** NELSON YOVANI VARGAS BERNAL
**NIT** 7,169,842 - 7
**Dirección** MZ 3 CASA 4 PINOS DE ORIENTE
**Teléfono** 3158113089
**Ciudad** TUNJA-BOYACA - COLOMBIA **Factura Proveedor** 005-8759

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7335500000 | TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS | | .00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,800,000.00 |
| SERVICIOS 1% | 28,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.772.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**
Otros 2.772.000,00 Cuota 1 P - 005- 678 Vence el 2025-07-28

**VALOR EN LETRAS**
Dos Millones Setecientos Setenta Y Dos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | Aprobado por | Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764078899311 **aprobado en** 2024-09-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CDSE **desde el número** 424 **al** 1000

CUDS :6b8879 1f675f44a9 8672 06c0a9ad8f2be88ce fb2a055e 7011a9dd1ced90c5f354ebc721be9 1190 99d 43d 5080 fc73b0d



Fabricante del Software : Sigo S.A.S - Nit 830 048 146 8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnologico: Sigo S.A.S Nit 830 048 146 8

megaproyectos

**FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**
NIT : 800130904- 2
AV NORTE 50 39
6087407810
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

CDSE - 680

Fecha y Hora de Documento

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2025-07-28 | 09:45:48 |
| Expedición | 2025-07-28 | 09:46:01 |
| Vencimiento | 2025-07-28 | |

| | |
|---|---|
| **Señores** | LUIS EDUARDO DIAZ LOPEZ |
| **NIT** | 7.187.819 - 3 |
| **Dirección** | CRA 2 S 4H 20 MZ C BL 11 |
| **Teléfono** | 3223689788 |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 005-8781

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010031000292 | FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS TIERRA SUA (M.O) | UN | 15.00 | 203.333,33 | 3.050.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3.050.000,00 |
| **Total a Pagar** | **$ 3.050.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Proveedores 3.050.000,00 Cuota 1 P - 005- 680 Vence el 2025-07-28

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Cincuenta Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Aprobado por

Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764078899311 **aprobado en** 2024-09-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CDSE **desde el número** 424 **al** 1000

CUDS: 8492a2813aeeda4ae1bb1ba9f8ac40f8ec26c4caa443254 96d8b2b6af09deb0ebe9e f82c3d248 2557 dda de02 d26 956 0951



Fabricante del Software Sigo S.A.S Nit 830 048 145 8, Nombre del Software Sigo Pyme Proveedor tecnologico Sigo S.A.S Nit 830 048 145 8

megaproyectos
FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA S.A.S
NIT 800.130.904-2

**FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**
NIT : 800130904- 2
AV NORTE 50 39
6087407810
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA

**Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

**CDSE - 681**

**Fecha y Hora de Documento**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-07-28 | 09:51:53 |
| **Expedición** | 2025-07-28 | 09:52:04 |
| **Vencimiento** | 2025-07-28 | |

**Señores** JOSE LUIS RODRIGUEZ ALVARADO
**NIT** 1,049,617,911 - 3
**Dirección** DG 17 B 18 30
**Teléfono** 3133297160
**Ciudad** TUNJA-BOYACA - COLOMBIA **Factura Proveedor** 005-8763

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010031000292 | FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS TIERRA SUA (M.O) | UN | 17.00 | 405,882.35 | 6,900,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,900,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 6.900.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Otros 6.900.000,00 Cuota 1 P - 005- 681 Vence el 2025-07-28

**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Novecientos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR** | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764078899311 **aprobado en** 2024-09-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CDSE **desde el número** 424 **al** 1000

CUDS :3566c1d6683c18dbc0dd0ef23cc3159b23e6b30567443b72db302d12c1d96100da6902dd67b77d284adfccb4c9c98f69

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
e31c0486f50381c2557294fca852eaa42d298f613e15a48a8338db276ecb4c95987c1bd36fdae238767018d9e5ba11dd

**Número de Factura:** 108
**Fecha de Emisión:** 10/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 10/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Débito Ahorro
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MILLAN AGUDO GLORIA SOFIA
**Nombre Comercial:** MILLAN AGUDO GLORIA SOFIA
**Nit del Emisor:** 21022942
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 0130

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Paipa
**Dirección:** KM 1 VIA PAIPA - TUNJA VDA SATIVA
**Teléfono / Móvil:** 3118194076
**Correo:** sofyama@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800130904
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Tunja
**Dirección:** AV NORTE 50 39 BARRIO LA GRANJA
**Teléfono / Móvil:** 6087407810
**Correo:** info@megaproyectos.com.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 259 | COSTILLA ADAN | 94 | 8,00 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 160.000,00 |
| 2 | 260 | OREJA DE ELEFANTE | 94 | 8,00 | $ 26.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 208.000,00 |
| 3 | 261 | DIEFANBAQUIA MALULADA | 94 | 8,00 | $ 26.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 208.000,00 |
| 4 | 263 | ANTURIO CRISTAL | 94 | 8,00 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 440.000,00 |
| 5 | 264 | TIERRA PREPARADA BULTO | 94 | 16,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 192.000,00 |
| 6 | 265 | TRANSPORTE | 94 | 1,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 120.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
10/07/2025 19:54:34
**Documento validado por la DIAN:**
10/07/2025 19:54:35
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1328000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1328000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 1328000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 1328000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.328.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.328.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 1.328.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 1.328.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764094541047 Rango desde: 105 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-18

HOMECENTER SODIMAC corona

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 22144569544

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. | **Fecha de Expedición** | 2025/07/01 06:05:27 |
| **NIT** | 800.130.904-2 | **Fecha de Vencimiento** | 2025/07/31 |
| **Dirección** | AV NORTE CR 6 No 50 39 | **Fecha de Validación** | 2025/07/01 |
| **Teléfono** | 57-8-7407810 | **Fecha de Compra** | 2025/07/01 |
| **Correo** | facturactscolombia@homecenter.co | **Remisión de Entrega** | |
| **Dirección de Entrega** | | **Ciudad de Entrega** | |
| **Forma de Pago** | Contado | **Nro O/C** | |
| **Plazo** | 30 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | COP |
| **Nro. Interno** | 76727672 | **Medio de Pago** | TARJETA DEBITO |
| **CUFE** | faf4042f4af1eb934a69161fe8bdafea8dfe4aab4e516515eb3776ed9acc5208f5f4f5569352d9ebab2806aab0ea08ff | | |
| **Observaciones** | / horario_entrega=Otro horario-Lunes a Viernes de 8:00am a 4:00pm;restriccion=Sin restricción vehicular;protocolo=Sin protocolo;observacion=Recibe pedido Sr Edwin Cardenal, celular 313 2260534. Direccion real de entrega Av Norte Carrea 6 No 50-39 | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 626629 | MP GRIFERIA ADVANCE | 92.352,94 | 461.764,70 | 20,01 | 92.436,97 | 369.327,73 | 19,00 | 70.172,27 | 439.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $ | 461.764,70 |
| **DESCUENTO** | $ | 92.436,97 |
| **SUB.TOTAL** | $ | 369.327,73 |
| **IVA** | $ | 70.172,27 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | $ | 439.500,00 |

**SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 439.500,00**

**OBSERVACIONES:** / horario_entrega=Otro horario-Lunes a Viernes de 8:00am a 4:00pm;restriccion=Sin restricción vehicular;protocolo=Sin protocolo;observacion=Recibe pedido Sr Edwin Cardenal, celular 313 2260534. Direccion real de entrega Av Norte Carrea 6 No 50-39

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079391961 del 12/09/2024, Prefijo 2214, Rango 4555156 hasta 54533334 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026 Tienda Tunja.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 890.933.534-0

HOMECENTER SODIMAC corona

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 22144569548

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. | **Fecha de Expedición** | 2025/07/01 06:30:37 |
| **NIT** | 800.130.904-2 | **Fecha de Vencimiento** | 2025/07/31 |
| **Dirección** | AV NORTE CR 6 No 50 39 | **Fecha de Validación** | 2025/07/01 |
| **Teléfono** | 57-8-7407810 | **Fecha de Compra** | 2025/07/01 |
| **Correo** | facturactscolombia@homecenter.co | **Remisión de Entrega** | |
| **Dirección de Entrega** | | **Ciudad de Entrega** | |
| **Forma de Pago** | Contado | **Nro O/C** | |
| **Plazo** | 30 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | COP |
| **Nro. Interno** | 76730478 | **Medio de Pago** | TARJETA DEBITO |
| **CUFE** | 00dd62a6ee6ae9c0ff988e22210b88766048780920532b69852beccf263265592e93aac1e9c7f2c15a3d18c9a27fd64d | | |
| **Observaciones** | / horario_entrega=Cualquier horario;restriccion=Sin restricción vehicular;protocolo=Sin protocolo;observacion=Retira pedido Sr Edwin Cardenal, celular 313 2260534. Direccion real de entrega Av Norte Carrea 6 No 50-39 | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 312215 | KIT INSTALACION LAV | 39.411,76 | 197.058,82 | 0,00 | 0,00 | 197.058,82 | 19,00 | 37.441,18 | 234.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $ | 197.058,82 |
| **DESCUENTO** | $ | 0,00 |
| **SUB.TOTAL** | $ | 197.058,82 |
| **IVA** | $ | 37.441,18 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | $ | 234.500,00 |

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 234.500,00**

**OBSERVACIONES:** / horario_entrega=Cualquier horario;restriccion=Sin restricción vehicular;protocolo=Sin protocolo;observacion=Retira pedido Sr Edwin Cardenal, celular 313 2260534. Direccion real de entrega Av Norte Carrea 6 No 50-39

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079391961 del 12/09/2024, Prefijo 2214, Rango 4555156 hasta 54533334 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026 Tienda Tunja.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente titulo valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 890.933.534-0

VERAMON S.A.S
Nit. 804.008.926-8

# VERAMON S.A.S

NIT : 804,008,926 - 8
LOTE ANILLO VIAL 20-03 VIA GIRON
FLORIDABLANCA-SANTANDER - COLOMBIA
6185839 3178929477
marketing@arteconcreto.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2395 Tarifa 6,00

**FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FE 858**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-07-07 14:14:50
**Expedición** 2025-07-07 16:35:10
**Vencimiento** 2025-07-07

**Cliente** FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
**NIT** 800,130,904 - 2
**Dirección** AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA
**Ciudad** TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
**Correo** info@megaproyectos.com.co

**Vendedor** VERAMON S.A.S
**Teléfono** 6087407810
**Centro Costo** 43

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040001000002 | BANCA HOPPER CON ESPALDAR | UND | 3.00 | 1.639.495,80 | 4,918,487.39 |
| 2 | 0040001000002 | BANCA HOPPER SIN ESPALDAR | UND | 3.00 | 1.333.613,45 | 4,000,840.34 |
| 3 | 0040001000001 | BASE PERSONALIZADA 10CMX30CMX100CM 3,50KG | UND | 8.00 | 150.420,17 | 1,203,361.34 |
| 4 | 0040001000002 | MATERA PERSONALIZADA 30CMX30CMX100CM 67KG | UND | 8.00 | 168.067,23 | 1,344,537.83 |

**Total Items** 4

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 11,467,226.90 |
| **IVA** | **19%** | 2,178,773.10 |
| **Total a Pagar** | | **$ 13.646.000,00** |

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contado | Anticipado Clientes | Transferencia Débito Bancaria | 6.823.000,00 | |
| Credito | Credito Clientes | Crédito Ach | Cuota 2 F - 004- 858 Vence el 2025-07-07 | 6.823.000,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Trece Millones Seiscientos Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S

COTIZACION ART-379-2025-V4

CONTRATO DE SUMINISTRO No.FB&CIA-005/2025.

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN CONCRETO ARQUITECTONICO PREFABRICADO.

ESTADO DE CUENTA
ANTICIPO: $6.823.000
CUENTA POR PAGAR: $6.823.000

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764081214586 **aprobado en** 2024-10-08 **hasta el** 2026-10-08, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 601 **al** 1000

CUFE :9e46677ddbca55ee1b23b6d6f761f139ab435572dd9a96c38857b1e77644a5986ff26a913b96829ca284c69a9cf94da4

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MADECENTRO

# MADECENTRO COLOMBIA SAS

NIT: 811028650-1

Carrera 6 a N 51 - 13 Tunja Tunja

**PBX:** (8) 749 09 28

**FAX:** 313 347 31 51

**E-mail:** ventas.facturae@madecentro.co

**CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998 CONVENIO 45103**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. C29-204307**

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998

CONVENIO 45103

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 2002-12-26

AUTORRETENEDORES RES. No. 09661 DEL 2008-10-07

Resol No.18764070925213 Facturación del C29-203751 al C29-210000 Fecha 2024-05-18 hasta 2025-11-18

SEÑORES

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S

NIT 800130904-2 7407810
CR 6 50 39
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S
Tunja

| FECHA DE ENTREGA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| DIA MES AÑO<br>27 06 2025 10:05 AM | DIA MES AÑO<br>11 08 2025 |
| REMISION No. | VENDEDOR |
| | GARCIA LARGO DIANA MARCELA |
| MEDIO DE PAGO | FORMA DE PAGO |
| Transferencia Crédito | Crédito Plazo 45 días |

CUFE: 765980f48d10b513667eb1d4700bfce1b20cac1f3f5e29e886afad537c691c474a20568ad352169ec3602d115dcce080

Representación gráfica factura electrónica

| N° ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNIRARIO | % DSCTO | IVA | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGCNEL7825 | MDP NOVOPAN LIJ 2.15X2.44X0.025 | 80.00 | UNIDAD | 289,358.94 | 33.00 | 2,946,831.44 | 15,509,639.18 |
| 2 | ACARREOS | ACARREO CLIENTE | 1.00 | UNIDAD | 1.06 | 0.00 | 0.20 | 1.06 |

Total Items: 2

PAGUESE ANTES DE 7 DIA 7 MES 2025 AÑO

OBTENGA UN DESCUENTO DE 3% 465289.2072

OBSERVACIONES: 302178840 FDC 302 178840

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 23,148,716.26 |
| TOTAL DSCTO | 7,639,076.02 |
| SUB-TOTAL | 15,509,640.24 |
| IVA 19% | 2,946,831.64 |
| INC Bolsas | 0.00 |
| **VR. NETO** | **18,456,471.88** |

RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)

NIT/C.C. DIA MES

Manual de producto: https://bit.ly/3qTxjWD

PROVEEDOR TECNOLÓGICO BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

Linea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2025-06-27 10: 05:04 - Fecha Validación Dian: 2025-06-2710:05:06

© Copyright 2025. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.

MADECENTRO

# MADECENTRO COLOMBIA SAS

NIT: 811028650-1

Carrera 6 a N 51 - 13 Tunja Tunja

**PBX:** (8) 749 09 28

**FAX:** 313 347 31 51

**E-mail:** ventas.facturae@madecentro.co**CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998 CONVENIO 45103**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. C29-204322**

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998

CONVENIO 45103

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 2002-12-26

AUTORRETENEDORES RES. No. 09661 DEL 2008-10-07

Resol No.18764070925213 Facturación del C29-203751 al C29-210000 Fecha 2024-05-18 hasta 2025-11-18

SEÑORES

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S

NIT 800130904-2 7407810
CR 6 50 39
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S
Tunja

| FECHA DE ENTREGA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| DIA MES AÑO<br>04 07 2025 2:26 PM | DIA MES AÑO<br>18 08 2025 |
| REMISION No. | VENDEDOR |
| | GARCIA LARGO DIANA MARCELA |
| MEDIO DE PAGO | FORMA DE PAGO |
| Transferencia Crédito | Crédito Plazo 45 días |

CUFE: 2e0d3796f020e5220f59ce54ee60963b6435b66daae71eb3165ace2260a121e95f3c7bdb5bac9f99d9496b555230837f

Representación gráfica factura electrónica

| N° ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNIRARIO | % DSCTO | IVA | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGPMEBS215 | AGLO BLANCO S. 2.15X2.44X0.015 | 20.00 | UNIDAD | 197,636.14 | 5.00 | 713,466.47 | 3,755,086.66 |
| 2 | AGPMRBS215 | AGLO RH BLANCO S.2.15X2.44X0.015 | 10.00 | UNIDAD | 206,663.70 | 5.00 | 373,027.98 | 1,963,305.15 |
| 3 | ACARREOS | ACARREO CLIENTE | 1.00 | UNIDAD | 1.06 | 0.00 | 0.20 | 1.06 |

Total Items: 3

PAGUESE ANTES DE 14 DIA 7 MES 2025 AÑO

OBTENGA UN DESCUENTO DE 3% 171551.7861

OBSERVACIONES: 302179695 FDC 302 179695

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 6,019,360.86 |
| TOTAL DSCTO | 300,967.99 |
| SUB-TOTAL | 5,718,392.87 |
| IVA 19% | 1,086,494.65 |
| INC Bolsas | 0.00 |
| **VR. NETO** | **6,804,887.52** |

RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)

NIT/C.C. DIA MES

Manual de producto: https://bit.ly/3qTxjWD

PROVEEDOR TECNOLÓGICO BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

Linea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2025-07-04 02: 26:28 - Fecha Validación Dian: 2025-07-0402:26:30

© Copyright 2025. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.

MADECENTRO

# MADECENTRO COLOMBIA SAS

NIT: 811028650-1

Carrera 6 a N 51 - 13 Tunja Tunja

**PBX:** (8) 749 09 28

**FAX:** 313 347 31 51

**E-mail:** ventas.facturae@madecentro.co

**CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998 CONVENIO 45103**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. C29-204350**

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998

CONVENIO 45103

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 2002-12-26

AUTORRETENEDORES RES. No. 09661 DEL 2008-10-07

Resol No.18764070925213 Facturación del C29-203751 al C29-210000 Fecha 2024-05-18 hasta 2025-11-18

SEÑORES

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S

NIT 800130904-2 7407810
CR 6 50 39
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S
Tunja

| FECHA DE ENTREGA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| DIA MES AÑO<br>30 07 2025 11:10 AM | DIA MES AÑO<br>13 09 2025 |
| REMISION No. | VENDEDOR |
| | GARCIA LARGO DIANA MARCELA |
| MEDIO DE PAGO | FORMA DE PAGO |
| Transferencia Crédito | Crédito Plazo 45 días |

CUFE: 2844a821bb2220570731a8dcded9ddc6f5f19da6c57448f5749aa5f2f9ba6de7d302d8737f3dadc6b430252ce16186e5

Representación gráfica factura electrónica

| N° ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNIRARIO | % DSCTO | IVA | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNRMCY615 | PELIKAN RH MACAD S/P 2.15X2.44X0.015 | 43.00 | UNIDAD | 459,881.63 | 20.00 | 3,005,786.33 | 15,819,928.07 |
| 2 | AGNRTAS215 | PELIKANO RH TAUPE 2C SF 2.15X2.44X0.015 | 9.00 | UNIDAD | 459,881.63 | 20.00 | 629,118.07 | 3,311,147.74 |
| 3 | ACARREOS | ACARREO CLIENTE | 1.00 | UNIDAD | 1.06 | 0.00 | 0.20 | 1.06 |
| 4 | AGNEMCY106 | PELIKANO MACAD 1/S 2.15X2.44X0.006 | 20.00 | UNIDAD | 215,183.74 | 20.00 | 654,158.57 | 3,442,939.84 |

Total Items: 4

PAGUESE ANTES DE 9 DIA 8 MES 2025 AÑO

OBTENGA UN DESCUENTO DE 3% 677220.5013

OBSERVACIONES: 302180660 FDC 302 180660

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 28,217,520.62 |
| TOTAL DSCTO | 5,643,503.91 |
| SUB-TOTAL | 22,574,016.71 |
| IVA 19% | 4,289,063.17 |
| INC Bolsas | 0.00 |
| **VR. NETO** | **26,863,079.88** |

RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)

NIT/C.C. DIA MES

Manual de producto: https://bit.ly/3qTxjWD

PROVEEDOR TECNOLÓGICO BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

Linea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2025-07-30 11: 10:12 - Fecha Validación Dian: 2025-07-3011:10:14

© Copyright 2025. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.

MADECENTRO

# MADECENTRO COLOMBIA SAS

NIT: 811028650-1

Carrera 6 a N 51 - 13 Tunja Tunja

**PBX:** (8) 749 09 28

**FAX:** 313 347 31 51

**E-mail:** ventas.facturae@madecentro.co

**CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998 CONVENIO 45103**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. C29-204352**

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 25863354998

CONVENIO 45103

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 2002-12-26

AUTORRETENEDORES RES. No. 09661 DEL 2008-10-07

Resol No.18764070925213 Facturación del C29-203751 al C29-210000 Fecha 2024-05-18 hasta 2025-11-18

SEÑORES

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S

NIT 800130904-2 7407810
CR 6 50 39
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S A S
Tunja

| FECHA DE ENTREGA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| DIA MES AÑO<br>30 07 2025 12:39 PM | DIA MES AÑO<br>13 09 2025 |
| REMISION No. | VENDEDOR |
| | GARCIA LARGO DIANA MARCELA |
| MEDIO DE PAGO | FORMA DE PAGO |
| Transferencia Crédito | Crédito Plazo 45 días |

CUFE: 52a9740d4b1bbb5f9879180a86694c3f0254553017b02163860ddc0d4956a40caddcfe2c8c75bbd75a01e3791cd281ee

Representación gráfica factura electrónica

| N° ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNIRARIO | % DSCTO | IVA | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPADEMAC-12 | TAPA TOR ADHESIVO MACADAMIA X 40 UNIDS | 10.00 | UNIDAD | 2,705.09 | 22.00 | 4,008.94 | 21,099.70 |
| 2 | HRE220-40 | RIEL EXT TOTAL LIVIANO 35X400MM 20KG | 100.00 | UNIDAD | 7,569.94 | 22.00 | 112,186.51 | 590,455.32 |
| 3 | HBM186-01 | BIS. 186 PARCHE 35 MM 4H | 200.00 | UNIDAD | 3,408.53 | 22.00 | 101,028.83 | 531,730.68 |
| 4 | ACARREOS | ACARREO CLIENTE | 1.00 | UNIDAD | 1.06 | 0.00 | 0.20 | 1.06 |

Total Items: 4

PAGUESE ANTES DE 9 DIA 8 MES 2025 AÑO

OBTENGA UN DESCUENTO DE 3% 34298.6028

OBSERVACIONES: 302180635 FDC 302 180635

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 1,465,751.96 |
| TOTAL DSCTO | 322,465.20 |
| SUB-TOTAL | 1,143,286.76 |
| IVA 19% | 217,224.48 |
| INC Bolsas | 0.00 |
| **VR. NETO** | **1,360,511.24** |

RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)

NIT/C.C. DIA MES

Manual de producto: https://bit.ly/3qTxjWD

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

Linea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2025-07-30 12: 39:45 - Fecha Validación Dian: 2025-07-3012:39:51

© Copyright 2025. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. INC 31593**

INCAP S.A
NIT. 860.025.998-3

Cra 72 # 62-27 Sur Bogota - Colombia
Celulares: 3002171521 - 3112723707
Fijo:(601)7761800
Correo: incapsa@incap.com.co
www.grupoincap.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES REGIMEN COMUN-SOMOS AUTORETENEDORES RES333 DE MARZO 11 DE 1986 COD ACT ICA 2029-4690 TARIFA 11.04/1000 GRAN CONTRIBUYENTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA RES.DDI-023769 29-11-2021

Cliente:FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
Nit:800130904-2
Dirección: AK 6 NORTE # 50 - 39
Teléfono: 7442684
Ciudad:TUNJA
Dir. Entrega: AK 6 NORTE # 50 - 39
Ciudad Entrega:TUNJA

Fecha: 13-06-25 13:07
Fecha Vencimiento: 28-07-2025
Ped.Softland:I-030961 Ped:147259
Orden de Compra: Q 471
Vendedor 14 / 040
Forma de Pago:CREDITO 45 DIAS

| Item | Codigo | U.Med | Descripcion | Cantidad | IVA | Valor U. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111120527 | UN | INCASPRAY II X 4.5 GL | 5.00 | 19 % | 255,631.00 | 1,278,155.00 |
| 2 | 1111511127 | UN | INCAFOM 8000 D X 4.5 GL | 1.00 | 19 % | 207,900.00 | 207,900.00 |
| 3 | 1111511127 | UN | INCAFOM 8000 D X 4.5 GL | 1.00 | 19 % | 207,900.00 | 207,900.00 |
| 4 | 1111511127 | UN | INCAFOM 8000 D X 4.5 GL | 1.00 | 19 % | 207,900.00 | 207,900.00 |

No. Items 4

**OBSERVACIONES:** **PESO:** 15.00

Nuestros envases 4gl. 4.5gl y 53 gl correspon a 3,785 LITROS

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 45/100 CTS

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 1,901,855.00 |
| DESCUENTO % | 0.00 |
| SUBTOTAL | 1,901,855.00 |
| FLETES | 0.00 |
| IVA 19% | 361,352.45 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| TOTAL | 2,263,207.45 |

DATOS PARA CONSIGNAR

| BANCO | CUENTA | TIPO |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | 10814022416 | CORRIENTE |
| DAVIVIENDA | 004900067291 | AHORROS |

AUTORIZACIÓN DIAN No: 18764076081651 DEL 30/07/2024 HASTA 30/07/2026
AUTORIZADO DESDE INC-22001 HASTA INC-50000

Los envases de 53-15-8 gal. son retornable. Si no son devueltos serán facturados

RECIBIDA Y ACEPTADA. Art 2 ley 1231 de 2008. No se aceptan devoluciones despues de 10 dias calendario siguientes a la recepcion de la factura la cual se considera irrevocablemente aceptada
NOMBRE

C.C:
FECHA:
SELLO:

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 621 y S.S del codigo del comercio ) 2. Se entiende que la persona firmante esta autorizada por el comprador, quien se obliga a responder a la deuda aqui contenida la mora en el pago causa intereses a la tasa maxima permitida.3. Esta presta merito ejecutivo

FIRMA AUTORIZADA INCAP

NumFac: INC31593FecFac: 2025-06-13HorFac: 13:07:12-05:00NitFac: 860025998DocAdq: 800130904ValFac: 1901855.00ValIva: 361352.45ValOtroIm: 0.00ValTolFac: 2263207.45CUFE:https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d619d2bd9494fde06bfa2ee7f8000cfadd778921a457c55e53972bb10e7030b03ab4fed41e91be273f76f0839ea45766

ORIGINAL

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. INC 31776**

INCAP S.A
NIT. 860.025.998-3

Cra 72 # 62-27 Sur Bogota - Colombia
Celulares: 3002171521 - 3112723707
Fijo:(601)7761800
Correo: incapsa@incap.com.co
www.grupoincap.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES REGIMEN COMUN-SOMOS AUTORETENEDORES RES333 DE MARZO 11 DE 1986 COD ACT ICA 2029-4690 TARIFA 11.04/1000 GRAN CONTRIBUYENTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA RES.DDI-023769 29-11-2021

Cliente:FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
Nit:800130904-2
Dirección: AK 6 NORTE # 50 - 39
Teléfono: 7442684 Ciudad:TUNJA
Dir. Entrega: AK 6 NORTE # 50 - 39
Ciudad Entrega:TUNJA

Fecha: 19-06-25 13:08
Fecha Vencimiento: 03-08-2025
Ped.Softland:I-030961 Ped:147259
Orden de Compra: Q 471
Vendedor 14 / 040
Forma de Pago:CREDITO 45 DIAS

| Item | Codigo | U.Med | Descripcion | Cantidad | IVA | Valor U. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111120527 | UN | INCASPRAY II X 4.5 GL | 10.00 | 19 % | 255,631.00 | 2,556,310.00 |

No. Items 1

**OBSERVACIONES:** **PESO:** 149.50

Nuestros envases 4gl. 4.5gl y 53 gl correspon a 3,785 LITROS

Son: TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHO PESOS CON 89/100 CTS

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BRUTO | | 2,556,310.00 |
| DESCUENTO | % | 0.00 |
| SUBTOTAL | | 2,556,310.00 |
| FLETES | | 0.00 |
| IVA 19% | | 485,698.90 |
| RETEFUENTE | | 0.00 |
| TOTAL | | 3,042,008.90 |

DATOS PARA CONSIGNAR

| BANCO | CUENTA | TIPO |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | 10814022416 | CORRIENTE |
| DAVIVIENDA | 004900067291 | AHORROS |

AUTORIZACIÓN DIAN No: 18764076081651 DEL 30/07/2024 HASTA 30/07/2026
AUTORIZADO DESDE INC-22001 HASTA INC-50000

Los envases de 53-15-8 gal. son retornable. Si no son devueltos serán facturados

RECIBIDA Y ACEPTADA. Art 2 ley 1231 de 2008. No se aceptan devoluciones despues de 10 dias calendario siguientes a la recepcion de la factura la cual se considera irrevocablemente aceptada
NOMBRE

C.C:
FECHA:
SELLO:

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 621 y S.S del codigo del comercio ) 2. Se entiende que la persona firmante esta autorizada por el comprador, quien se obliga a responder a la deuda aqui contenida la mora en el pago causa intereses a la tasa maxima permitida.3. Esta presta merito ejecutivo

FIRMA AUTORIZADA INCAP

NumFac: INC31776FecFac: 2025-06-19HorFac: 13:08:44-05:00NitFac: 860025998DocAdq: 800130904ValFac: 2556310.00ValIva: 485698.90ValOtroIm: 0.00ValTolFac: 3042008.90CUFE:https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=722fe7383bb092ccaf3193da5d3540beb68de77f35be00069d9f311e4b0ce4e2572ae59c57b1abe5cad29dc34b1ead09

ORIGINAL

FORMADERA
HERRAJES Y ACCESORIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FVEL 419**

CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE
Nit: 1049639291-1 Responsable de IVA.

CR 15 23 60 TUNJA BOYACA Tel. 3045228891

Adquiriente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Identific. NIT 800130904-2 Tels:
Direccion AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA

Fecha Jul-03-2025
Forma y metodo de pago CONTADO BANCOLOMBIA
Vencimiento Jul-03-2025

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17150 | LAMINA NANOTECH BLANCO BRILLANTE 18X280 | | 19 | 3.00 | 571,428.57 | 1,714,285.72 |
| 2 | 00017 | PRIMACOR BROOKLYN OAK EST 15X244X183 | | 19 | 12.00 | 250,252.10 | 3,003,025.21 |
| 3 | 17033 | TABLERO PRIMACOR TAROA ST 15X1830X2440 | | 19 | 25.00 | 250,252.10 | 6,256,302.52 |
| 4 | 8017 | CANTO TAROA RIGIDO DE 19 PRO | | 19 | 150.00 | 1,218.49 | 182,773.11 |
| 5 | 00011 | CANTO FLORMORADO DE 19 PRO | | 19 | 200.00 | 1,218.49 | 243,697.48 |
| 6 | 7127 | CANTO BLANCO SEMIRIGIDO DE 22 NANOTEC | | 19 | 80.00 | 3,668.07 | 293,445.38 |

Total items : 6

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | Subtotal | 11,693,529.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 11,693,529.42 | 2,221,770.58 | Iva/Inc | 2,221,770.58 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764083078080 de Nov-08-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-08-2026 Rango: FVEL 101-500

**TOTAL$ 13,915,300.00**

Son: TRECE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: c3d31ce68dbec51ec5f44fd29b746c41e9ddbff6bb25031e49ec7ba75803fe49e04f2fd757d3ec40103910eb1491955d
Fecha generación: 2025-07-03T12:06:00 Fecha expedición: 2025-07-03T12:06:25 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

491

FORMADERA
HERRAJES Y ACCESORIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FVEL 420**

CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE
Nit: 1049639291-1 Responsable de IVA.

CR 15 23 60 TUNJA BOYACA Tel. 3045228891

Adquiriente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Identific. NIT 800130904-2 Tels:
Direccion AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA

Fecha: Jul-03-2025
Forma y metodo de pago: CONTADO BANCOLOMBIA
Vencimiento: Jul-03-2025

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17042 | MELAMINA RH 1.83X2.44 15MM TAROA | | 19 | 17.00 | 281,512.60 | 4,785,714.28 |
| 2 | 00017 | PRIMACOR BROOKLYN OAK EST 15X244X183 | | 19 | 7.00 | 250,252.10 | 1,751,764.71 |
| 3 | 00067 | PRIMACOR BROOKLYN OAK RH DE 15X244X183 | | 19 | 30.00 | 281,512.61 | 8,445,378.15 |
| 4 | 17054 | MELAMINA TAROA 183X244X6 | | 19 | 12.00 | 155,462.19 | 1,865,546.22 |
| 5 | 00057 | PRIMACOR BROOKLYN OAK EST 6X244X183 | | 19 | 4.00 | 155,462.19 | 621,848.74 |
| 6 | 7114 | TAPATORNILLO SAGANO X 50 | | 19 | 30.00 | 1,428.57 | 42,857.14 |
| 7 | 1025 | HOJA TAPATORNILLOS AMARETTO X 50 UN | | 19 | 30.00 | 1,428.57 | 42,857.14 |
| 8 | 00011 | CANTO FLORMORADO DE 19 PRO | | 19 | 300.00 | 1,218.49 | 365,546.22 |
| 9 | 8017 | CANTO TAROA RIGIDO DE 19 PRO | | 19 | 150.00 | 1,218.49 | 182,773.11 |
| 10 | 00017 | PRIMACOR BROOKLYN OAK EST 15X244X183 | | 19 | 15.00 | 250,252.10 | 3,753,781.51 |
| 11 | 8017 | CANTO TAROA RIGIDO DE 19 PRO | | 19 | 100.00 | 1,218.49 | 121,848.74 |
| 12 | 00061 | CANTO AMARETO DE 19 RIGIDO PRO | | 19 | 100.00 | 1,218.49 | 121,848.74 |

Total items : 12

RECARGOS DESCUENTOS

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | 22,101,764.70 | 4,199,335.30 |

Subtotal 22,101,764.70
Iva/Inc 4,199,335.30

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764083078080 de Nov-08-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-08-2026 Rango: FVEL 101-500

**TOTAL$ 26,301,100.00**

Son: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIEN PESOS mcte.

CUFE: 8de6c7922266989df94e474ad5276f22c47020ff5ae024f06f41ab6fb3db29b743b40b0305517f9dda9c2e96789b8ac0
Fecha generación: 2025-07-03T13:58:00 Fecha expedición: 2025-07-03T13:58:56 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FORMADERA
HERRAJES Y ACCESORIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
**FVEL 442**

CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE
Nit: 1049639291-1 Responsable de IVA.

CR 15 23 60 TUNJA BOYACA Tel. 3045228891

Adquiriente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Identific. NIT 800130904-2 Tels:
Direccion AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA

Fecha Jul-21-2025
Forma y metodo de pago CONTADO BANCOLOMBIA
Vencimiento Jul-21-2025

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17033 | TABLERO PRIMACOR TAROA ST 15X1830X2440 | | 19 | 25.00 | 250,252.10 | 6,256,302.52 |
| 2 | 8017 | CANTO TAROA RIGIDO DE 19 PRO | | 19 | 400.00 | 1,218.49 | 487,394.96 |
| 3 | 00061 | CANTO AMARETO DE 19 RIGIDO PRO | | 19 | 300.00 | 1,218.49 | 365,546.22 |
| 4 | 00017 | PRIMACOR BROOKLYN OAK EST 15X244X183 | | 19 | 12.00 | 250,252.10 | 3,003,025.21 |
| 5 | 8017 | CANTO TAROA RIGIDO DE 19 PRO | | 19 | 900.00 | 1,218.49 | 1,096,638.65 |
| 6 | 00061 | CANTO AMARETO DE 19 RIGIDO PRO | | 19 | 100.00 | 1,218.49 | 121,848.74 |

Total items : 6

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | Subtotal | 11,330,756.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 11,330,756.30 | 2,152,843.70 | Iva/Inc | 2,152,843.70 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764083078080 de Nov-08-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-08-2026 Rango: FVEL 101-500

**TOTAL$ 13,483,600.00**

Son: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: c68f7a16e3041eb10663cee8c9b958d03f9324041c877d35ee7000bc0db4a10eaf41816cf07e9e243e9387548fe3c8b7
Fecha generación: 2025-07-21T01:57:00 Fecha expedición: 2025-07-21T14:14:32 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FORMADERA
HERRAJES Y ACCESORIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
**FVEL 447**

CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE
Nit: 1049639291-1 Responsable de IVA.

CR 15 23 60 TUNJA BOYACA Tel. 3045228891

Adquiriente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Identific. NIT 800130904-2 Tels:
Direccion AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA
Tunja - Boyacá

Fecha Jul-23-2025
Forma y metodo de pago CONTADO BANCOLOMBIA
Vencimiento Jul-23-2025

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00061 | CANTO AMARETO DE 19 RIGIDO PRO | | 19 | 400.00 | 1,218.49 | 487,394.96 |

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 487,394.96 | 92,605.04 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 487,394.96 |
| Iva/Inc | 92,605.04 |
| **TOTAL$** | **580,000.00** |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764083078080 de Nov-08-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-08-2026 Rango: FVEL 101-500

Son: QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS mcte.

CUFE: e19770a2cb2aa2e7f34996b82a249bb1e1a6fdd9772c73483fd7a059d009e62e9e495d83ff0f18d8e202285525474e75
Fecha generación: 2025-07-23T08:05:00 Fecha expedición: 2025-07-23T08:05:35 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FORMADERA
HERRAJES Y ACCESORIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FVEL 448**

CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE
Nit: 1049639291-1 Responsable de IVA.

CR 15 23 60 TUNJA BOYACA Tel. 3045228891

Adquiriente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Identific. NIT 800130904-2 Tels:
Direccion AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA

Fecha: Jul-23-2025
Forma y metodo de pago: CONTADO BANCOLOMBIA
Vencimiento: Jul-23-2025

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16004 | SIS. CORREDIZO DUCASSE D52 | | 19 | 6.00 | 20,168.07 | 121,008.40 |
| 2 | 16010 | GUIA AL D52 DUCASSE - 2 M (1 GUIA) | | 19 | 8.00 | 13,529.41 | 108,235.29 |
| 3 | 16008 | RIEL AL D52 DUCASSE - 2 M (1 RIEL) | | 19 | 8.00 | 9,159.66 | 73,277.31 |
| 4 | 16011 | GUIA AL D52 DUCASSE - 3 M (1 GUIA) | | 19 | 2.00 | 20,252.10 | 40,504.20 |
| 5 | 16009 | RIEL AL D52 DUCASSE - 3 M (1 RIEL) | | 19 | 2.00 | 13,781.51 | 27,563.02 |
| 6 | 10044 | CAZUELA RECTANGULAR ALUMINIO NEGRA | | 19 | 12.00 | 9,663.87 | 115,966.39 |

Total items : 6

RECARGOS DESCUENTOS

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | 486,554.61 | 92,445.39 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 486,554.61 |
| Iva/Inc | 92,445.39 |
| **TOTAL$** | **579,000.00** |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764083078080 de Nov-08-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-08-2026 Rango: FVEL 101-500

Son: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS mcte.

CUFE: 5060e879d579a964b503ac24d28232d676e5a6aaa53e3b43d3ca2b0ee626d1c43355fb84ee6084cb30ed777c14814a8b
Fecha generación: 2025-07-23T16:25:00 Fecha expedición: 2025-07-23T16:25:42 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FORMADERA
HERRAJES Y ACCESORIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
**FVEL 454**

CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE
Nit: 1049639291-1 Responsable de IVA.

CR 15 23 60 TUNJA BOYACA Tel. 3045228891

Adquiriente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Identific. NIT 800130904-2 Tels:
Direccion AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA

Fecha: Jul-25-2025
Forma y metodo de pago: CONTADO BANCOLOMBIA
Vencimiento: Jul-25-2025

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7114 | TAPATORNILLO SAGANO X 50 | | 19 | 20.00 | 1,764.71 | 35,294.12 |
| 2 | 1025 | HOJA TAPATORNILLOS AMARETTO X 50 UN | | 19 | 10.00 | 1,428.57 | 14,285.72 |
| 3 | 17042 | MELAMINA RH 1.83X2.44 15MM TAROA | | 19 | 3.00 | 289,915.97 | 869,747.90 |

Total items : 3

RECARGOS DESCUENTOS

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | 919,327.74 | 174,672.26 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 919,327.74 |
| Iva/Inc | 174,672.26 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764083078080 de Nov-08-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-08-2026 Rango: FVEL 101-500

**TOTAL$ 1,094,000.00**

Son: UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

CUFE: c48e0b9d260c27e685288e65723185da326b30ac891f3d71df0a0a78c425364da17de9969a04815f0f9970828ee17fb1
Fecha generación: 2025-07-25T16:00:00 Fecha expedición: 2025-07-25T16:00:29 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FORMADERA
HERRAJES Y ACCESORIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
**FVEL 464**

CAMILO ANDRES VILLA BUSTAMANTE
Nit: 1049639291-1 Responsable de IVA.

CR 15 23 60 TUNJA BOYACA Tel. 3045228891

Adquiriente FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Identific. NIT 800130904-2 Tels:
Direccion AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA

Fecha Forma y metodo de pago
Ago-04-2025 CONTADO BANCOLOMBIA

Vencimiento
Ago-04-2025

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00104 | PRIMACOR TAROA RH DE 15 X244Z183 | | 19 | 3.00 | 289,831.93 | 869,495.80 |
| 2 | 00105 | CANTO TAROA DE 40 RIGIDO | | 19 | 15.00 | 4,537.82 | 68,067.23 |
| 3 | 17033 | TABLERO PRIMACOR TAROA ST 15X1830X2440 | | 19 | 7.00 | 250,252.10 | 1,751,764.71 |

Total items : 3

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 2,689,327.74 | 510,972.26 | Subtotal | 2,689,327.74 |
| | | | | | Iva/Inc | 510,972.26 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764083078080 de Nov-08-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-08-2026 Rango: FVEL 101-500

**TOTAL$ 3,200,300.00**

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 820eae4a922ca69dc2dab71a7e70fc2da655406c23b8fa82c1d98579d85985ddab361c4004dcd6912701156e100c593c
Fecha generación: 2025-08-04T15:44:00 Fecha expedición: 2025-08-04T15:44:50 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1




**GABO REPARA S.A.S**
***!SI ALGO FALLA, USTED NOS LLAMA!***
NIT: 901282548-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 21 12 71, Duitama, Boyacá, Colombia
Tel. 3125887680
Email. gaboreparasas@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764082063441 válida desde 2024-10-23 hasta 2026-10-23 rango desde FEG-501 hasta FEG-1000.
Correo: gaboreparasas@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S |
| **NIT :** | 800130904-2 |
| **Dirección:** | AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA, Tunja, Boyac??, Colombia |
| **Teléfono:** | 3158264003 |
| **Email:** | info@megaproyectos.com.co |
| **Tipo de negociación:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito |
| **Fecha de Pago:** | 28/07/2025 |
| **Total de Lineas:** | 4 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FEG - 555** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **07:26:53** |
| **FECHA FIRMADO:** | **24/07/2025 12:26:56** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 24 | 07 | 2025 | 28 | 07 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 9 | CARPINTERÍA METÁLICA<br>CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES<br>SIN MESÓN FIJO. | WSD | 14,00 | $1.300.000,00 | IVA | 19% | $3,458,000.00 | 0,00 | $18.200.000,00 |
| 2 | 9 | CARPINTERÍA METÁLICA<br>CENEFA SUPERIOR -intermedias- PARA LOCALES<br>SIN MESÓN FIJO | WSD | 11,00 | $1.300.000,00 | IVA | 19% | $2,717,000.00 | 0,00 | $14.300.000,00 |
| 3 | 9 | CARPINTERÍA METÁLICA<br>GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS<br>DE LOCALES SIN MESÓN FIJO | WSD | 25,00 | $3.500.000,00 | IVA | 19% | $16,625,000.00 | 0,00 | $87.500.000,00 |
| 4 | 9 | CARPINTERÍA METÁLICA<br>Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas | WSD | 29,00 | $2.250.000,00 | IVA | 19% | $12,397,500.00 | 0,00 | $65.250.000,00 |

**Notas:**

**SON:** (doscientos veinte millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos pesos )
**CUFE:** d7b915a48967df7a08bdbf3a0183b035a8ebe746ef86e633c946f5ed6ea22b66414b3b61c48d4c3e22771a793e42dcfe

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $185.250.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $35.197.500,00 |
| **Total:** | $220.447.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $185.250.000,00 | 19,00% | $35.197.500,00 |

**Firma Digital:** ILOrPkFEp6TSd/i+LFx3+wObfvDyKBROKvmHV8BVwA/yeM7OhF2tSCI3Oo9tYXDO
mAMMtpwQmH0ctoFXd2ki76O5d/D1N3O6bE7nluKJ8vba+Q2Cu6
0ENh66QE0/XkY9 JO3xSeEGuQ2tdxs9ykojBiC4hGM6NIG7CmzUJzeruE4ylgWKa9LnWqdsV4mp4Njk IOcW8cvFFlPt9+KaZY/iU0a8SLpwXBr0QvN
1nMyAn518pxliDxKUzy7hQc+t2jW9 oMEIB6GptSiEvGmtKi8DbfCTg9DtkTIZp9XWnkAK9lK+quR73ADnjhoS1piwXhsS laPhdymPHA6gHZsPxsQG
8Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ee2d9072e98eb1a439cee6cd9aed2c5a70ee8c479e9676219b6c617cf1c0fcc9fd4f06d931c048439aa352a3958806ae

**Número de Factura:** CUBR-1425
**Fecha de Emisión:** 24/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 01/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CARPAS CUBRIARTEC SAS
**Nombre Comercial:** CARPAS CUBRIARTEC SAS
**Nit del Emisor:** 900592894
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1392;2511

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 7 81 B 03 TO 6 AP 105
**Teléfono / Móvil:** 3125737145
**Correo:** recepcionfacturascubriartecsas@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800130904
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Tunja
**Dirección:** AV NORTE 50 39
**Teléfono / Móvil:** 3158264003
**Correo:** INFO@MEGAPROYECTOS.COM.CO

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 5500 | SUMINISTRO DE MESAS TIPO PICNIC CON PARA SOL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS COTIZACION | NIU | 8,00 | $ 3.600.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.472.000,00 | 19.00 | | | $ 28.800.000,00 |

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|
| 1 | $ 14.400.000,00 | 27/06/2025 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
24/07/2025 16:45:03
**Documento validado por la DIAN:**
24/07/2025 16:45:03
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 28800000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 28800000 |
| IVA | | 5472000 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 5472000 |
| **Total neto factura (=)** | | 34272000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 34272000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 14400000 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 28.800.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 28.800.000,00 |
| IVA | | 5.472.000,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 5.472.000,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 34.272.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $34.272.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 14.400.000,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764096052614 Rango desde: 1425 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-07-24

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
299aa2686dbfaaf840c6f8dc9c9763523e8c6d7d8bcc714b2bd679f5998fafa0e9bb1347371ca98f7d5be18043f778b5

**Número de Factura:** CBRT-112
**Fecha de Emisión:** 23/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 31/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CUBRITEC SAS
**Nombre Comercial:** CUBRITEC SAS
**Nit del Emisor:** 901540118
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1392;4330

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 80 D 7 B 83 TO 6 AP 1302
**Teléfono / Móvil:** 3504928187
**Correo:** facturascubritecsas@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800130904
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Tunja
**Dirección:** AV NORTE 50 39 BR LA GRANJA
**Teléfono / Móvil:** 3158264003
**Correo:** info@megaproyectos.com.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 2000 | COMBO PARASOL TIPO SOMBRILLA MESA Y SUS 4 SILLAS | NIU | 3,00 | $ 2.350.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.339.500,00 | 19.00 | | | $ 7.050.000,00 |

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|
| 1 | $ 4.000.000,00 | 24/06/2025 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
23/07/2025 12:02:34
**Documento validado por la DIAN:**
23/07/2025 12:02:34
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 7050000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 7050000 |
| IVA | 1339500 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 1339500 |
| **Total neto factura (=)** | 8389500 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 8389500 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 4000000 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 7.050.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 7.050.000,00 |
| IVA | 1.339.500,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 1.339.500,00 |
| **Total neto factura (=)** | 8.389.500,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 8.389.500,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 4.000.000,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764087674034 Rango desde: 110 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-01-24

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **SUMINISTRO** |
| **NÚMERO DE CONTRATO** | **FB&CIA-008/2025** |
| **CONTRATANTE** | **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** |
| **NIT** | **800.130.904-2** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACION** | **C.C No. 6.770.634 DE TUNJA** |
| **CONTRATISTA** | **CARPAS CUBRIARTEC SAS** |
| **NIT** | **900.592.894-1** |
| **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** | **JOSE JULIAN ALBERTO PEDREROS RODRIGUEZ** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACION** | **C.C No. 80.730.398 DE BOGOTÁ** |
| **OBJETO** | **SUMINISTRO DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS EN MADERA NATURAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COTIZACIÓN** |
| **VALOR** | **CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($110.396.300) MCTE IVA INCLUIDO** |
| **PLAZO** | **30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** |
| **FECHA** | **17 DE JUNIO DE 2025** |

Entre los suscritos, **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL**, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Tunja, con cédula de ciudadanía N.° 6.770.634 expedida en Tunja, actuando en calidad de Representante Legal de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS.**, con domicilio en la ciudad de Tunja y con NIT. N° 800.130.904-2, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE** de una parte y de la otra **JOSE JULIAN ALBERTO PEDREROS RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 80.730.398 de Bogotá D.C, actuando en calidad de Representante Legal de **CARPAS CUBRIARTEC SAS** con domicilio en Bogotá D.C y con NIT 900.592.894-1 quien en adelante se denominará, **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, regido por las siguientes clausulas: **PRIMERA. - OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga para con **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** al **"SUMINISTRO DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS EN MADERA NATURAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COTIZACIÓN** " cumpliendo la exactitud en las medidas de cada uno de las medidas y materiales de acuerdo a la ficha técnica **PARAGRAFO I:** El contratista recibió y revisó los planos y diseños y especificaciones técnicas del contrato, los cuales hacen parte del mismo. **PARAGRAFO II:** Hace parte integral del contrato la cotización de fecha 11 de junio de 2025 presentada por el **CONTRATISTA**. **PARAGRAFO III** Los valores de la propuesta comercial incluyen el IVA a la tarifa general del 19%.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca para mesa comedor fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés de cinco patas (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. 180cm largo x 40cm ancho altura= 40 cm, con apoyo central (5 patas). Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad | 70 | $ 430.000 | $ 30.100.000 |
| 2 | Butaca baja tradicional en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa). | 84 | $ 115.000 | $ 9.660.000 |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Butaco alto para barra con espaldar. Fabricado en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 74 cm, sin tapizar. Apoya pies en tubo de acero cold rolled pintura electroestática negro. Medidas generales 99cm x 48,8cm x 50cms. | 30 | $ 260.000 | $ 7.800.000 |
| 4 | Butaco bajo para barra con espaldar. Fabricado en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 64 cm, sin tapizar. Apoya pies en tubo de acero cold rolled pintura electroestática negro. Medidas generales 89cm x 48,8cm x 50cms. | 20 | $ 260.000 | $ 5.200.000 |
| 5 | Butaco Rústico Mobiliario Barra-bar 89 Cm Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 70 cm, altura máxima espaldar 89cm, sin tapizar. Medidas generales 32cm (diámetro tapa). | 26 | $ 220.000 | $ 5.720.000 |
| 6 | Mesa comedor de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas 180cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad | 35 | $ 810.000 | $ 28.350.000 |
| 7 | Mesa auxiliar INFANTIL redonda de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color café roble natural, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas diámetro 70cm, Altura= 50 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 2 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad. | 2 | $ 330.000 | $ 660.000 |
| 8 | Mesa CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad | 10 | $ 360.000 | $ 3.600.000 |
| 9 | Silla para comedor infantil con espaldar. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 34 cm, sin tapizar. Medidas generales 44cm x 48,8cm x 50cms. | 8 | $ 210.000 | $ 1.680.000 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 92.770.000 |
| IVA 19% | $ | 17.626.300 |
| TOTAL | $ | 110.396.300 |

**SEGUNDA. - VALOR, FORMA, REQUISITOS Y LUGAR DE PAGO:** Para todos efectos fiscales el valor del contrato asciende a la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($109.309.500) MCTE IVA INCLUIDO - FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** cancelará al Contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: **CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($46.385.000)**

**MCTE**. en calidad de anticipo al previo perfeccionamiento del mismo, una vez presentados los siguientes documentos. **a)** Factura de venta o cuenta de cobro b) acreditación del revisor fiscal o contador público o de su representante legal donde conste que se encuentra a paz y salvo al régimen de seguridad social y aportes parafiscales de todos sus trabajadores **c)** la acreditación de haber constituido las garantías referidas en la cláusula octava y el restante correspondiente a **SESENTA Y CUATRO MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS ($64.011.300) MCTE.** mediante entregas actas parciales recibidas a satisfacción por parte del contratante, una vez presentada la factura, con los requisitos legales, acta de recibo a satisfacción y pago de parafiscales del periodo de pago. De igual forma se realizarán las retenciones y descuentos de ley aplicables para el presente tipo de contrato. (Retención en la fuente 2,5%), El valor final del contrato será el resultado de las cantidades ejecutadas d) de acuerdo a la forma de pago establecida. **TERCERA. – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO:** El lugar de entrega y ejecución del contrato será en la ciudad de Paipa (Boyacá). El plazo de ejecución del contrato objeto del presente contrato es de treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATANTE no reconocerá valor alguno por los costos en que haya incurrido el CONTRATISTA asociados a la ejecución del contrato, cuando estos se hayan generado con anterioridad al cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato, o con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución. El Contratista deberá suscribir el contrato, presentar las pólizas de garantía única. **CUARTA. -OBLIGACIONES DE LAS PARTES: I) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** 1. Suministrar toda la información requerida en la documentación como obligaciones posteriores a la suscripción del contrato. 2. Presentar en el plazo establecido los documentos y cumplir con los requisitos de Orden Técnico. 3. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad industrial e higiene. 4. Entregar los elementos objeto del presente contrato. 5. Garantizar la calidad de los elementos que se van a entregar.5. Garantizar el cumplimiento en Seguridad y Salud en el trabajo del personal que empleo para el desarrollo del contrato. **II) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** En cumplimiento del objeto del contrato el CONTRATANTE se obliga: **1)** Pagar oportunamente a EL CONTRATISTA sus servicios de conformidad con la cláusula segunda del presente contrato y **2)** Ejercer la supervisión al presente contrato a través del funcionario designado. **3)** entregar al CONTRATISTA los espacios habilitados libres de escombros, material de obra y todo obstáculo que retrase la ejecución del contrato **QUINTA. -CLASE DE VINCULACION:** El presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA y las personas que este ocupe, y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del mismo. Siendo, así las cosas, el contratista, es el único responsable frente a las personas que ocupe, por seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales y frente a terceros, por cualquier indemnización. **SEXTA. -CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El contratista no podrá ceder ni subcontratar el suministro del objeto del presente Contrato sin previa autorización por parte del contratante. **SÉPTIMA. -MODIFICACION, TERMINACIÓN E INTERPRETACION UNILATERALES Y CADUCIDAD:** Este contrato se regirá por lo establecido en los códigos Civil y de Comercio. **OCTAVA. -GARANTIAS:** El contratista deberá constituir a favor del **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** una póliza única otorgada a través de una compañía de seguros o Entidad bancaria cuya póliza matriz este aprobada por la superintendencia bancaria que ampare: **1. De buen manejo y correcta inversión del anticipo:** por el cien (100%) del valor del anticipo y por una vigencia igual al término de ejecución del contrato. **2 cumplimiento del contrato** por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato, por el término del mismo y cuatro (04) meses más. **3 salarios y prestaciones sociales** equivalente al diez (10%) del valor del contrato por el termino de ejecución y tres (3) años más. **4 calidad bienes suministrados y correcto funcionamiento.** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato deberá extenderse por el término del contrato y dos años más contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final. Esta garantía se otorgará para todos los defectos que resulten por mala calidad de los bienes. **NOVENA. -SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **DECIMA -SUPERVISION:** Se realizará control de calidad por el personal delegado por el contratante. **DECIMA PRIMERA. -NORMATIVIDAD APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** El presente contrato se regirá por las normas comerciales y civiles pertinentes, de ser necesario se remitirá al Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Tunja. **DECIMA SEGUNDA. -INDEMNIDAD:** El Contratista declara mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamación, demanda, acción legal o queja de cualquier índole que sea fortuita para el contratista, no relacionado con ocasión de la ejecución del contrato. **DÉCIMA TERCERA. -LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro de los 30 días siguientes a la terminación del contrato y suscripción del acta de recibo final. **DÉCIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y DOMICILIO:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere de: 1. Perfeccionamiento. **DÉCIMA QUINTA. REGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN:** El presente contrato está sometido en todo a la LEY COLOMBIANA.

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

| | |
|---|---|
| **DÉCIMA SEXTA. MERITO EJECUTIVO:** En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible para LAS PARTES. | |
| **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** | **CARPAS CUBRIARTEC SAS** |
| Rep. Legal: Juan Fernando Bohórquez Correal<br>Identificación Rep. Legal: 6.770.634 de Tunja<br>Dirección: Avenida Norte No. 50 - 39 Tunja<br>Teléfono: 3158264003<br>Email: info@megaproyectos.com.co | Rep. Legal: José Julián Pedreros Rodríguez<br>Identificación Rep. Legal: C.C: 80.730.398 de Bogotá D.C<br>Dirección: Carrera 80D – 7B – 83 torre 6 apto 1302<br>Celular: 3504928187<br>Email: cubritec@hotmail.com |
| En constancia se firma hoy 17 de junio de 2025, en el Municipio de Tunja, en dos ejemplares idénticos. | |
| EL CONTRATANTE,<br>JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL<br>Firmado digitalmente por JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL<br>Fecha: 2025.06.17 08:51:37 -05'00'<br>**JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL**<br>C.C No. 6.770.634 de Tunja<br>Representante Legal de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S** | EL CONTRATISTA,<br>**JOSÉ JULIÁN PEDREROS RODRÍGUEZ**<br>C.C No. 80.730.398 de Bogotá<br>Representante Legal de **CARPAS CUBRIARTEC SAS** |
| **Elaboró: FABIO DUQUE** | **Revisó: FERNANDO BOHORQUEZ** |

**MOBILIARIO METALICO SAS**
**Nit: 900.303.178-8**
**IVA REGIMEN COMUN**
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 3110 Tarifa ICA 11.04X1000 CIIU 3110

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN No 18764090361700
VIGENCIA DEL 12/03/2025 AL 12/03/2026
AUTORIZA DESDE 36084 HASTA 37000

MOBILIARIO METALICO SAS

**FV - ELECTRONICA**
**No.** FE 36409

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S (1306) NIT: 800130904-2

AVENIDA NORTE # 50-39 / Tel: 7407810
TUNJA (BOYACÁ) Medio de Pago: Consiganción bancaria

**Fecha Y Hora Expedicion** 14/07/2025 02:33 PM
**Fecha Vencimiento** 13/08/2025
**Forma de Pago** 50% ANTI 50% 30 F.F.
**Orden Compra** Q-485

| # | CODIGO | COLOR | ARTICULO DESCRIPCION | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8231606913 | BLMIMA | COSTADO SENC 60cm FTE X 69 ALTO KLASS | 40.00 | 123,900 | 4,956,000 |
| 2 | 8231606913 | GRTORN | COSTADO SENC 60cm FTE X 69 ALTO KLASS | 30.00 | 123,900 | 3,717,000 |
| 3 | 8231606913 | NEGMTX | COSTADO SENC 60cm FTE X 69 ALTO KLASS | 30.00 | 123,900 | 3,717,000 |
| 4 | 8231606913 | GRGRTE | COSTADO SENC 60cm FTE X 69 ALTO KLASS | 10.00 | 123,900 | 1,239,000 |
| 5 | 8231126913 | NEGMTX | COSTADO SENC 120cm FTE X 69 ALTO KLASS | 6.00 | 153,700 | 922,200 |
| 6 | 6142100901 | GRTORN | CAJONERA 2*1 F-37 DEP | 30.00 | 296,800 | 8,904,000 |
| 7 | 6142100901 | BLMIMA | CAJONERA 2*1 F-37 DEP | 20.00 | 296,800 | 5,936,000 |
| 8 | 6142100901 | NEGMTX | CAJONERA 2*1 F-37 DEP | 30.00 | 296,800 | 8,904,000 |

MERCANCIA ENTREGADA CON REMISIONES 230612

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38,295,200 |
| MAS IVA 19% | 7,276,088 |
| TOTAL FACTURA | 45,571,288 |
| RETEFUENTE | 957,380 |
| RETEN / IVA | 0 |
| RETEN / ICA | 0 |
| NETO A PAGAR | 44,613,908 |

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO PESO S M/CTE

1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor Ley 1231 de 2008 que modifica articulo 774 y sucesivos del codigo del comercio
2. El no pago de esta factura en al fecha de vencimiento ocaciona intereses de mora a la tasa maxima legal

Software FACTORY - SISTEMAS PRODUCTIVOS SAS - NIT: 800.075.664-4
Proveedor Tecnológico: FACTURA1 SAS - NIT:900.875.062-6

**FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA**

| B. CAJA SOCIAL | B. BOGOTA: |
|---|---|
| CTA CTE 21003125075 | CTA CTE 274036821 |

El Receptor tiene 48 horas para Aceptar y/o Rechazar este documento.
Despues de este tiempo, se entiende como ACEPTADA



Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2025-07-14 14:33:41-05:00

CUFE 0fab561d56c17e280117c53b80bb9bac4b1b226eeb557ed769dd50aee7b5ed3e2333ac50108401db03ecc84cbbac9094

**PROVEFABRICA S.A.S.**
NIT: 900.868.270-2
IVA RÉGIMEN COMÚN
Autorización Numeración de Facturación DIAN
Según Formulario No. 18764087310337 del 17/01/2025 hasta
17/01/2027 del TEN 1 al TEN 100000 Vigencia 24 meses
No somos Grandes contribuyentes. Somos Autorretenedores a
título del impuesto sobre la Renta según resolución No. 010243

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. TEN-8413**

DEUDORES: FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
DIRECCION: AV NORTE 50 39 BRR LA GRANJA
NIT/CC: 800130904
TELEF: 3202319508
COD. VEND: 44 LAURA ISABEL JOJOA CABRERA

TRM:
OC:

TENJO 8413

| *FECHA DE EMISIÓN* | *FECHA VENCIMIENTO* |
|---|---|
| 07/07/2025 | 07/07/2025 |

*HORA DE EMISIÓN*
4:29:19 p.m.

FORMA DE PAGO Contado
MEDIO DE PAGO Consignación bancaria

CUFE: 3d628e62fa21c0b9b98852d7b34bd07d2d8729ff1463095f670539506e2d517a1895e74aae5fca8a50fb47d2a01f316c

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | U/M | CANT. | %IVA | V.IVA | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B521540 | SILLON GTE DELPHI II SYCHRO BR. REG NYLON | NIU | 10,00 | 19 | 501.160,87 | 263.768,88 | 2.637.688,80 |
| 2 | B531635 | SILLON PTE DELPHI SYCHRO BRAZO 3D NYLON | NIU | 5,00 | 19 | 275.286,52 | 289.775,28 | 1.448.876,40 |
| 3 | B520635 | SILLA EJEC SLIM BASCULANTE BASE NYLON | NIU | 5,00 | 19 | 243.738,06 | 256.566,38 | 1.282.831,90 |
| 4 | B535360 | SILLON PSTE SLIM SYNCRO MALLA BR 3D BASE NYLON | NIU | 3,00 | 19 | 211.550,22 | 371.140,74 | 1.113.422,22 |
| 5 | C340983 | SILLA DISEÑO TURIA MOSTAZA ESTR. MADERA MSA | NIU | 40,00 | 19 | 660.868,03 | 86.956,32 | 3.478.252,80 |
| 6 | C341550 | SILLA DISEÑO LUNA NEGRA EST MADERA | NIU | 64,00 | 19 | 1.493.345,28 | 122.808,00 | 7.859.712,00 |
| 7 | A120200VP | NEUMATICO SECRETARIA VP | NIU | 20,00 | 19 | 35.660,42 | 9.384,32 | 187.686,40 |

**VALOR LETRAS** SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS Y NOVENTA Y DOS CENTAVOS

| | | |
|---|---|---|
| | **EMISOR**<br>**FIRMA AUTORIZADA**<br><br>PROVEFABRICA S.A.S | **COMPRADOR**<br>** ACEPTO LA FACTURA Y DEJO CONSTANCIA DE SU RECIBO ASÍ COMO DE LAS MERCANCIAS O PRODUCTOS.**<br><br>FIRMA Y SELLO<br>NOMBRE<br>CÉDULA<br>FECHA DE RECIBO |

| | | |
|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | $ | 18.008.470,52 |
| **IVA** | $ | 3.421.609,40 |
| **RETEFUENTE** | $ | 0,00 |
| **RETEIVA** | $ | 0,00 |
| **RETEICA** | $ | 0,00 |
| **TOTAL** | $ | 21.430.079,92 |

Fecha y hora Validacion: 07/07/2025 4:45:54 p.m.

Debido a que la ejecución del negocio se llevó a cabo en TENJO -Cundinamarca, el deudor se obliga a realizar las retenciones y pagos de impuestos le exija las autoridades municipales.

En lo pertinente a esta factura se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho , según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido a emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción en virtud de lo establecido por el artículo 743 del Código de Comercio. Así mismo, reconoce haber recibido real y materialmente la mercancia o producto contratado. A partir del vencimiento, esta factura causará los intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. El deudor reconoce y acepta que el presente documento presta mérito ejecutivo en su contra en los terminos del artículo 422 del C.G.P.



Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de .APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

# MARIA FERNANDA CUBILLOS BARRERA

Actividad Económica Principal 8299
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FEVR - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094062841 de 05/06/2025 - 05/06/2027 autoriza FEVR-1 a FEVR-10000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 24/07/2025 12:12 |
| Fecha de Vencimiento | 27/07/2025 12:12 |
| Fecha de Validación | 24/07/2025 12:12 |
| Forma de Pago | Crédito 3 DÍAS |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | MARIA FERNANDA CUBILLOS BARRERA |
| Nombre Comercial | CASA MIMBRE |
| CC | 1010220521 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | mariafernandacubillos021@gmail.com |
| Teléfono | 3022514864 |
| Dirección | CL 143 47 41 |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | Y CIA S.A.S FERNANDO BOHORQUEZ |
| Nombre Comercial | MEGAPROYECTOS |
| NIT | 800130904 |
| Obligación | IVA |
| Email | info@megaproyectos.com.co |
| Teléfono | |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET ALMANZA | JUEGO DE SALA 4 PIEZAS (UN SOFÁ DE DOS PUESTOS – DOS POLTRONAS – UNA MESA AUXILIAR) Fabricada en madera natural flor morado; Tejida en mimbre natural, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera. ESPECIFICACIONES SOFÁ – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 1.50 largo x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES POLTRONA – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 0.75 ancho x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES MESA AUXILIAR: Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés, base y patas en madera natural flor morado, cantos redondeados largo:0.75m ancho: 0.45m altura 0.45m | 1 | ZZ | $4,800,000.00 | | $4,800,000.00 | $4,800,000.00 |

CUFE: 368ffcd951fabdc67271befe4bfdec09cdc081b7289c72797e6bf12b771d23cc245cae457f031ca051c353dcfb18c536

# MARIA FERNANDA CUBILLOS BARRERA

Actividad Económica Principal 8299
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FEVR - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094062841 de 05/06/2025 - 05/06/2027 autoriza FEVR-1 a FEVR-10000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 24/07/2025 12:12 |
| Fecha de Vencimiento | 27/07/2025 12:12 |
| Fecha de Validación | 24/07/2025 12:12 |
| Forma de Pago | Crédito 3 DÍAS |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CANASTILLA ARTESANAL | Canastilla tipo panera elaborada en mimbre natural; con medidas de 40 cms largo x 25 cms de ancho y 15 cms de altura. Con forro lavable para almacenamiento de alimentos. | 120 | ZZ | $115,000.00 | $13,800,000.00 | $13,800,000.00 |
| 3 | LÁMPARA ARTESANAL TEJIDA EN MIMBRE NATURAL | Lámpara (artesanal) tejida en mimbre natural. Medidas: diámetro 50cm; altura 50cm. Incluye: (Porta-lámpara socket 40W Para Foco Base Y Cable E27 1ml - enchufe para tomacorriente con polo a tierra. | 60 | ZZ | $320,000.00 | $19,200,000.00 | $19,200,000.00 |

3

| | |
|---|---|
| Subtotal | $37,800,000.00 |
| Total a Pagar | $37,800,000.00 |

Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 368ffcd951fabdc67271befe4bfdec09cdc081b7289c72797e6bf12b771d23cc245cae457f031ca051c353dcfb18c536

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 1 de 3 |

Tunja 10 de julio de 2024

**ERIKA LORENA ALDANA MENDIVELSO**
**SUPERVISORA DELEGADA TIERRASUA**

**IPUO-088-2025-OF-028**

**REFERENCIA:** IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

**ASUNTO:** REPORTE DE NOVEDAD AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN EN SITIO DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC.1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**, en calidad de apoyo a la supervisión, me permito informar que con base al desarrollo de actividades del proyecto cuyo objeto "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", el dia de hoy jueves 10 de julio de 2025 se evidencio afectaciones producto a la ruptura del registro de la red hidráulica del LOCAL N°107 – AMASIJOS – SEGUNDO PISO – BLOQUE A – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ, generando así inundaciones en la zonas aferentes y posibles daños a los muebles suministrados e instalados derivados de los contratos **IPVO-010-2025** cuyo objeto es SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y **IPVO-013-2025** cuyo objeto es SUMINISTRO DE EQUIPOS OPERATIVOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA DOTACIÓN PLAZA DE MERCADO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA


A continuación, se presenta registro fotográfico de la afectación para su conocimiento.


Paipa, Boyacá, Colombia
55 #28-64, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779933° Long -73.114204°
10/07/2025 08:56 a. m. GMT -05:00


Paipa, Boyacá, Colombia
55 #28-64, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779939° Long -73.114287°
10/07/2025 08:56 a. m. GMT -05:00


Paipa, Boyacá, Colombia
55 #28-64, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779928° Long -73.114212°
10/07/2025 08:56 a. m. GMT -05:00


Paipa, Boyacá, Colombia
55 #28-64, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779916° Long -73.114268°
10/07/2025 08:56 a. m. GMT -05:00

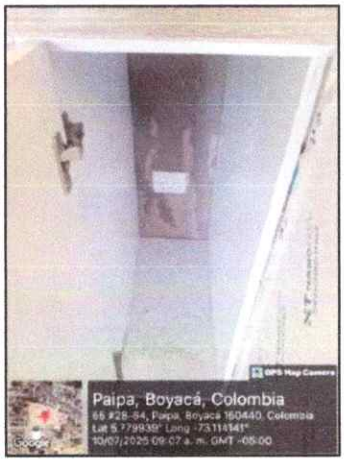
Paipa, Boyacá, Colombia


Paipa, Boyacá, Colombia
55 #28-64, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779973° Long -73.114167°
10/07/2025 09:03 a. m. GMT -05:00

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 3 de 3 |




Por lo tanto, se informa a la entidad **TIERRASUA**, en su calidad de supervisión general, para que realice el traslado correspondiente y adopte las acciones necesarias a fin de mitigar una posible afectación al mobiliario instalado.

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-028

**KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ**
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 1 de 2 |

Tunja 22 de julio de 2025

JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
**RL. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S**

**IPUO-088-2025-OF-037**

**REFERENCIA:** IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

**ASUNTO:** SOLICITUD RADICACION INFORME DE EJECUCION MENSUAL NO.1 CONTRATO IPVO-010-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC.1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**. En calidad de apoyo a la supervisión del proyecto cuyo objeto es la "Dotación de la Plaza de Mercado del Municipio de Paipa, en el Departamento de Boyacá".

Me permito solicitar el informe mensual de ejecución No.1 del periodo 16 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025 del **contrato IPVO-010-2025** cuyo objeto es *"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*. El cual deberá de contener la siguiente información:

1. ADMINISTRATIVO
   - Contrato firmado por las partes
   - Acta de inicio
   - Póliza de garantías exigidas

2. TECNICO
   - Descripción de las actividades realizadas durante el periodo (anexar registro fotográfico)

- Presentar el plan de inversión de anticipo (aprobado por el apoyo a la supervisión para desembolso del mismo)
- Presentar el cronograma de ejecución (aprobado por el apoyo a la supervisión para desembolso de anticipo)
- Presentar soportes del plan de inversión de anticipo (facturas de compra a proveedores de materia prima, accesorios e insumos)

3. FINANCIERO
   - Valor financiero ejecutado
   - Relación del valor del contrato vs relación valor de anticipo
   - Presentar la relación de avance o atraso según cronograma de actividades a corte del periodo del informe

4. SEGURIDAD SOCIAL
   - Presentar la seguridad social del personal (planillas paga a corte de junio)

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-037

**KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ**
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 1 de 2 |

Tunja 23 de julio de 2025

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
**SUPERVISOR**

**IPUO-088-2025-OF-042**

**REFERENCIA:** IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

**ASUNTO:** SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC.1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**. Me permito informar que, durante la visita técnica realizada el día de ayer en compañía del supervisor de agricultura y contratista responsable del suministro e instalación de las góndolas de sobre poner para frutas y verduras correspondientes al item 1.09 del contrato IPVO-010-2025, se evidencio que las dimensiones de las góndolas contratadas no se ajustan a las medidas reales del mesón en donde deben ser instaladas.

A raíz de esta situación, se identifico la necesidad de modificar 16 de las 44 unidades contratadas, con el fin de garantizar su correcta instalación y funcionalidad dentro del espacio disponible. Y por tal motivo, la empresa INCOL GENIEROS SAS envió un oficio el día de ayer notificando la novedad presentada en sitio mediante el oficio IPUO-088-2025-OF-036-RADICACION DE NOVEDAD PRESENTADA CONTRATO IPVO-010-2025

El día de hoy, el contratista remitió un oficio solicitando aprobación de dicho ajuste. Sin embargo, me permito aclarar que la aprobación de esta modificación no es competencia del apoyo a la supervisión, sino que debe ser revisada y autorizada directamente por parte de TIERRASUA SAS, como entidad responsable del proyecto.

Por tanto, solicito amablemente su revisión y pronunciamiento frente a esta solicitud, a fin de proceder conforme a los lineamientos contractuales y técnicos establecidos.

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 2 de 2 |

Para verificación de la solicitud realizada por el contratista a este oficio anexamos oficio allegado por el contratista del contrato IPVO-010-2025.

Quedo atenta a cualquier orientación adicional y a la decisión que se emita al respecto.

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-042

**KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ**
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 1 de 2 |

Tunja 23 de julio de 2025

JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
**RL. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S**

**IPUO-088-2025-OF-043**

**REFERENCIA:** IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

**ASUNTO:** SOLICITUD ARREGLO MUROS DIVISORIOS

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC.1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**. En calidad de apoyo a la supervisión del proyecto cuyo objeto es la "Dotación de la Plaza de Mercado del Municipio de Paipa, en el Departamento de Boyacá".

Por medio del presente me permito dejar constancia de que, en el marco de las obligaciones del contrato IPVO-010-2025, el día 18 de junio de 2025 fueron entregados los espacios correspondientes de la plaza de mercado, con el fin de adelantar las actividades de suministro e instalación de mobiliario pactadas contractualmente.


Así mismo, se deja constancia de que, para la fecha del 28 de junio de 2025, se dio inicio a las labores de suministro e instalación de las cenefas, durante la ejecución de este ítem, se evidenciaron afectaciones en los muros divisorios, particularmente en los acabados de los filos.

Teniendo en cuenta que la actividad de instalación ha finalizado, y considerando que dichas afectaciones fueron ocasionadas durante el proceso de intervención, solicito de manera formal que se proceda con la reparación inmediata de los muros, devolviéndolos como se entregaron al inicio de la actividad.

Se requiere que esta actividad se inicie a la mayor brevedad posible y que se informe por escrito el cronograma estimado de reparación.

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 2 de 2 |

Se adjunta evidencia fotográfica

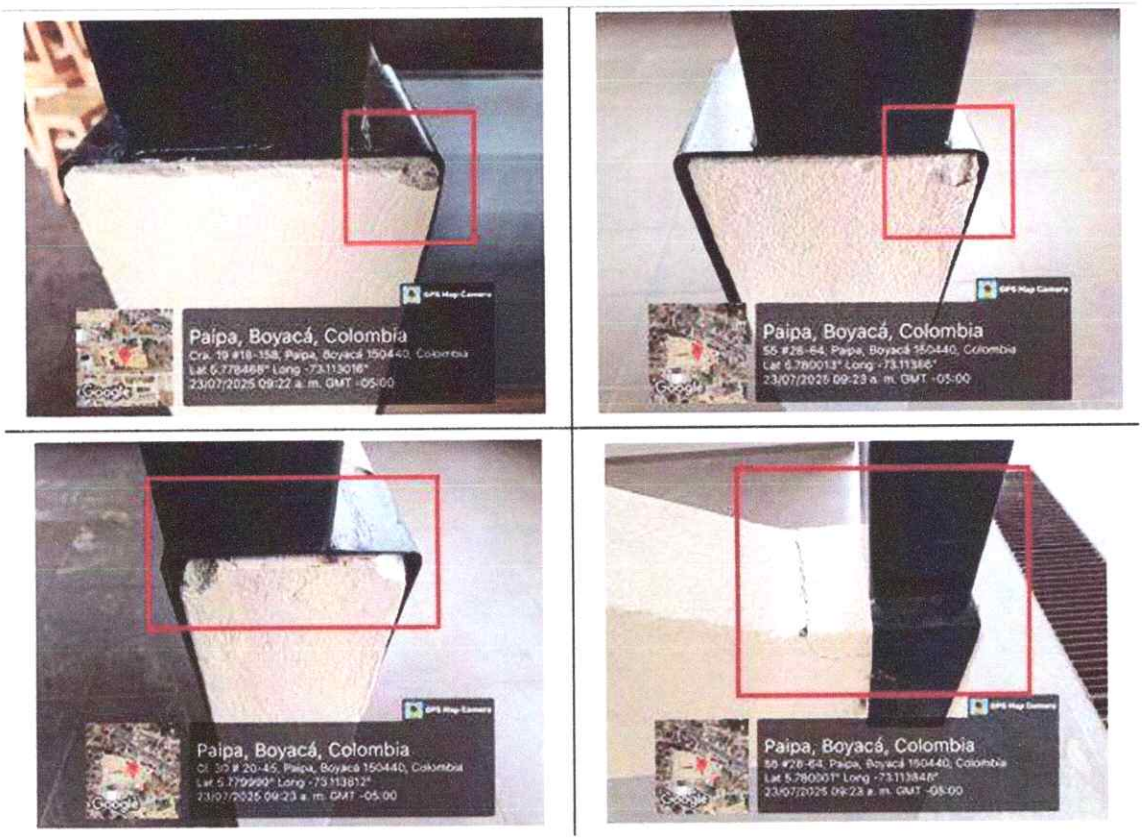


Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-043

**KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ**
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025

CALLE 73A N°1A ESTE – 02 TUNJA
BLOQUE 4 – APTO 502
3006264033
3105740450
3153349142
incol.ingenierossas@gmail.com

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

FB&CIASAS 007-2025

Tunja, 23 de julio de 2025

Ingeniera
**KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ**
**INCOL INGENIEROS S.AS.**
**Calle 73ª NO. 1ª Este 02**
**Ciudad**

**REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

**ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD ARREGLO MUROS**

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja, actuando en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, por medio de la presente, me permito dar respuesta al requerimiento para el arreglo de muros.

De acuerdo con las afectaciones reportadas en los muros sobre los cuales fueron instaladas las cenefas, se realizaran los respectivos arreglos disponiendo del personal necesario para tal fin.

Se iniciaran estos arreglos el día de mañana 24 de julio e irán hasta el 26 de julio, con el fin de dejar en las condiciones que nos fueron entregadas.

Cordialmente,

**Firma Representante Legal**
**Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal**
**Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja**

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

FB&CIASAS 011-2025

Tunja, 08 de septiembre de 2025

Ingeniera
**JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**
**TIERRASUA S.A.S.**
**Calle 19 No. 9 - 35 PISO 10 OFICINA 01**
**Ciudad**

**REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO ACTA FINAL**

Respetado ingeniero

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja, actuando en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, por medio de la presente, me permito presentar documentación para tramite de cuenta del contrato de la referencia correspondiente al acta final, para lo cual me permito allegar:

- Certificación de Cumplimiento. (Impreso y digital)
- Informe de avance del contratista. (Impreso y digital)
- Cuenta de cobro o factura. (Impreso y digital)
- Acta de inicio. (Impreso y digital)
- Copia del RP (digital).
- Copia del contrato (digital).
- Certificación bancaria, vigencia 3 meses. (Impreso y digital)
- Acta de aprobación de pólizas (digital).
- Certificado de existencia y representación legal. (digital)
- Planilla de aportes a Seguridad Social. (Impreso y digital)
- RUT. (Impreso y digital)
- Soportes informe acta final. (Impreso y digital)

Cordialmente,

**Firma Representante Legal**
**Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal**
**Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja**

RECIBÍ
JUAN E. GUERRERO
F: 08-SEPT. 2025
H: 10:55 a.m

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

FB&CIASAS 006-2025

Tunja, 23 de julio de 2025

Ingeniera
**KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ**
**INCOL INGENIEROS S.AS.**
**Calle 73ª NO. 1ª Este 02**
**Ciudad**

**REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

**ASUNTO: VALIDACIÓN MEDIDAS MESONES Y AUTORIZACIÓN AJUSTE DE MEDIDAS.**

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja, actuando en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, por medio de la presente, me permito comunicar que de acuerdo con la instalación programada el día 22 de julio del presente, del ítem 1.09 Góndolas de sobreponer en los mesones ubicados en el primer piso de la plaza de mercado de Paipa, se pudo evidenciar que 16 de los 44 mesones no se ajustan al largo de la Góndola fabricada.

Teniendo en cuenta que la Góndola de sobreponer ítem 1.09 fue fabricada de acuerdo a la medida contractual y estipulada en el contrato de la referencia (largo 1.75m), es necesario ajustar dichas dimensiones en la estructura de la Góndola de acuerdo a la medida de los mesones, así:

| No. | MEDIDA GÓNDOLA DE SOBREPONER PARA FRUTAS Y VERDURAS | MEDIDA MESON ACTUAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.40M | 0.35M |
| 2 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| 3 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| 4 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.50M | 0.25M |
| 5 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.40M | 0.35M |
| 6 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| 7 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| 8 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| 9 | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| **11** | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| **12** | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| **13** | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| **14** | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| **15** | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |
| **16** | LARGO: 1.75M | LARGO:1.65M | 0.10M |

De acuerdo a lo anterior solicitamos amablemente su autorización para fabricar las góndolas de acuerdo a la medida del mesón verificada en obra sin que esto afecte presupuestalmente el contrato en cuanto al ítem 1.09: "Góndola de sobreponer para frutas y verduras: Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir y 5 ganchos soldados a estructura principal Largo 1.75m x 0.56m altura 1.30m (incluye pata antideslizante en goma o similar) - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. recubierta en sus 5 caras incluyendo la base en madera y fórmica colores a elegir. - Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 170cm x 48cm altura de la tolva 10 cm aprox". Para el contrato IPVO - 010-2025 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" y/o se indique como debemos proceder.

Cordialmente,

**Firma Representante Legal**
**Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal**
**Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja**

| | | |
|---|---|---|
| INCOL INGENIEROS | **INCOL INGENIEROS SAS**<br>INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA<br>901.847.609-9 | **CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00<br>**VERSIÓN:** V-00<br>Página 1 de 4 |

Tunja 24 de julio de 2025

JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
**RL. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S**

**IPUO-088-2025-OF-047**

**REFERENCIA:** IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

**ASUNTO:** REQUISITOS PARA INFORME MENSUAL

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC.1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**. En calidad de apoyo a la supervisión del proyecto cuyo objeto es la "Dotación de la Plaza de Mercado del Municipio de Paipa, en el Departamento de Boyacá".

En ejercicio de las funciones asignadas en calidad de interventor del contrato de referencia, me permito indicarle los requisitos mínimos que debe contener el informe mensual de avance, el cual debe ser presentado de forma oportuna, clara y completa, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad contratante y con el fin de permitir un adecuado seguimiento y control del proyecto.

A continuación, se detallan los componentes que debe incluir el informe:

1. **Información general del proyecto**
   - Ubicación detallada (Municipio, dirección si aplica)
   - Descripción general de la intervención (Tipo de suministro o servicio)

2. **Información general del contrato:**

   Presentar una tabla con la siguiente información

- Numero de contrato
- Contratante
- Contratista
- Objeto
- Valor del contrato
- Fecha de contrato
- Fecha de acta de inicio
- Plazo inicial

## 3. Control administrativo

- Personal de obra no calificada (Relación de nombres, cedula y fecha en sitio de trabajo)

## 4. Control legal

- Actas generadas con fecha y descripción (Ejemplo)

| **INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. 010 de 2025** | |
|---|---|
| CONTRATISTA | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S |
| NIT | 800.130.904-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL |
| C.C. No. | 6.770.634 de Tunja |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA |
| VALOR | MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($1.477.852.194,00) |
| PLAZO DEL CONTRATO | TRES (03) MESES |
| ACTA DE INICIO | 16 DE JUNIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE SEPTEMBRE DE 2025 |

- Control de pólizas

| **Objeto de la Póliza** | **Cumplimiento** | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza** | | | |
| **Compañía de seguros** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **VALOR ASEGURADO** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- Control de correspondencia recibida y enviada con sus respectivos radicados y fechas.

**5. Control técnico**

- Presupuesto ejecutado a la fecha del corte del informe
- Porcentaje de avance fisico del contrato
- Control grafico del avance ( Barras, curvas u otro medio representativo) para ello debera de graficar datos de proyeccion (según cronograma radicado para anticipo) la cual se llamara avance proyactado y sobre esa misma grafica debera encontrarse los resultados del avance financiero ejecutado.

**6. Actividades ejecutadas en el contrato**

- Descripcion detallada por item del presupuesto, según ejecucion realizada durante el periodo. A compañada de registro fotografico.

**7. Control presupuestal y financiero**

- Certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales asociados al contrato

**8. Detalle de plan de inversion**

- Relacion de gastos realizados con el anticipo
- Soportes contables y facturas
- Relacion detallada de bienes adquiridos o actividades financiadas con el anticipo
- Saldo del anticipo a la fecha

**9. Calidad del suministro**

- Especificaciones tecnicas reales de los bienes suministrados

Se solicita que el informe mensual teniendo en cuenta el acta de inicio de su contrato el cual fue el dia 16 de junio de 2025, requerimos se haga entrega de un primer informe a corte de 30 de junio 2025 según apliquen los requerimientos anteriormente menciados.

El segundo informe seria a corte de 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025.

Por ultimo, requerimos que los informes mensuales sean radicado los tres (3) primeros dias de cada mes.

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-047

**KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ**
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025
